	NOMBRE DEL PROYECTO		CONTRATISTA: CONSTRUVERTICAL SAS	Valor Inicial:	$ 23,909,183	ACTA DE OBRA Nro.1	
	ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.			Plazo Inicial:	3 meses		
			SUPERVISOR: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO - DESur	Valor Adicional:	$ -	Valor Final:	$ 23,909,183
				Plazo Adicional:	-	Plazo Final:	3 meses

CONDICIONES LABORALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES 1						ACTA N°1.												
			CANT. TOTAL			ACTA MODIFICACIÓN No.1			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRA		OBRA ORD.+OBRA ADI.+OBRA EXT.		ACUMULADA (o.ord.+o.e)		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UN.	T.CANT.	P.UNITARIO	VR TOTAL	Cant	+/-	Valor Total($)	Cant	Valor Total($)		CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	Valor($)	CANT.	TOTAL
1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 2,387,832.00			$ -		$ 2,387,832			$ 2,387,832		$ -		$ -		$ 2,387,832		$ 2,387,832		$ -
1.1	Demolicion de atraque de caja fuerte en concreto reforzado de espesor hasta 30 cm y dimensiones de 1.2 m x 1.2m en sus 5 caras. Incluye corte con pulidora, demolicion con machin electrico, equipos de seguridad y toda la herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad, empacada del material proveniente de la demolicion en costales, cargue y transporte interno hasta el sitio donde indique la supervicion, incluye botada.	UN	1.00	$ 1,867,832	$ 1,867,832	0.00	-	$ -	1.00	$ 1,867,832	1.00	1.00	$ 1,867,832	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,867,832	1.00	$ 1,867,832	0.00	$ -
1.2	Retiro de caja fuerte, incluye corte de anclajes con pulidora, y transporte interno hasta el sitio donde indique la supervisión, no incluye disposicion final	UN	1.00	$ 280,000	$ 280,000	0.00	-	$ -	1.00	$ 280,000	1.00	1.00	$ 280,000	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 280,000	1.00	$ 280,000	0.00	$ -
1.3	RETIRO DE PUERTA BLINDADA METALICA (marco y ala) con ancho de 80cm. Incluye canchas y cortes con pulidora para demolicion de anclajes perimetrales al muro.	UN	1.00	$ 240,000	$ 240,000	0.00	-	$ -	1.00	$ 240,000	1.00	1.00	$ 240,000	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 240,000	1.00	$ 240,000	0.00	$ -
2	MUROS				$ 1,883,190			$ -		$ 1,883,190			$ 1,683,118		$ -		$ -		$ 1,683,118		$ 1,683,118		$ 200,073
2.1	Resane de muros interiores con mortero 1:4 sobre cualquier tipo de material como ladrillo interior, bloque de concreto y concreto vaciado. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparacion de la superficie, equipos de seguridad y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad	M2	30.00	$ 35,958	$ 1,078,740	0.00	-	$ -	30.00	$ 1,078,740	24.60	24.60	$ 884,567	0.00	$ -	0.00	$ -	24.60	$ 884,567	24.60	$ 884,567	5.40	$ 194,173
2.2	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 muros revocados o en concreto vaciado, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, equipos de seguridad,color a definir según aprobación de la supervisión.	M2	30.00	$ 26,815	$ 804,450	0.00	-	$ -	30.00	$ 804,450	29.78	29.78	$ 798,551	0.00	$ -	0.00	$ -	29.78	$ 798,551	29.78	$ 798,551	0.22	$ 5,899
3	CERRAJERIA				$ 5,584,000			$ -		$ 5,584,000			$ 5,584,000		$ -		$ -		$ 5,584,000		$ 5,584,000		$ -
3.1	Suministro, transporte e instalacion de reja metalica de seguridad para proteccion bajo cubierta, con dimensiones de 2.25m x 1.45 m conformada por angulos perimetrales en 1"- 1/2 x 1/4" y varillas lisa de 3/4" para refuerzo transversal. Incluye soldaduras, platinas de anclaje con chazos expansivos, pintura anticorrosivo y esmalte base aceite de acabado color negro mate, equipos y personal certificado para trabajo en alturas y demas herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad	UN	1.00	$ 4,700,000	$ 4,700,000	0.00	-	$ -	1.00	$ 4,700,000	1.00	1.00	$ 4,700,000	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,700,000	1.00	$ 4,700,000	0.00	$ -
3.2	Mantenimiento correctivo de puerta metálica blindada (marco y ala) de ancho 80 cm, incluye instalacion, preparacion de la superficie, resanes, lijada, reemplazo de elementos deteriorados, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1.00	$ 884,000	$ 884,000	0.00	-	$ -	1.00	$ 884,000	1.00	1.00	$ 884,000	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 884,000	1.00	$ 884,000	0.00	$ -
4	REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES				$ 8,679,228			$ -		$ 8,679,228			$ 6,321,141		$ -		$ -		$ 6,321,141		$ 6,321,141		$ 2,358,087
4.1	S.T.I. de salida para camara de CCTV en EMT para ser instalada sobrepuesta. Incluye: Camara CAMARA TURBO SMP DOMO ANTIVANDALICA EXIR 2.8 /3.6 /6 0.01 LUX IR40m IP67 METAL IDXVISION. Caja plastica 10x10, Tuberia EMT de 3/4", Entrada a caja EMT, marcación, cable UTP 4 pares cat 6A.	UN	1.00	$ 592,100	$ 592,100	0.00	-	$ -	1.00	$ 592,100	1.00	1.00	$ 592,100	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 592,100	1.00	$ 592,100	0.00	$ -
4.2	S.T.I. de salida para salida para tomacorriente regulado doble 120V, 15A (NEMAS-15R NARANJA) para ser instalado de manera sobrepuesta en tuberia EMT. Incluye: aparato toma naranja regulada, caja 12x12x5 metalica con troquel de toma, conectores, marcación, cable de cobre 3#12AWG- LS-HF-FR, entrada a caja EMT, elementos de sujecion y demas accesorios necesariospara su correcta instalacion y funcionamiento.	UN	2.00	$ 175,280	$ 350,560	0.00	-	$ -	2.00	$ 350,560	2.00	2.00	$ 350,560	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 350,560	2.00	$ 350,560	0.00	$ -
4.3	S.T.I. de salida para datos sencilla en EMT para ser instalada sobrepuesta. Incluye: Caja metalica 12x12x5 con troquel de datos, Tuberia EMT de 3/4", face plate, Jack RJ-45 cat 6A, Entrada a caja EMT, marcación, cable UTP 4 pares cat 6A.	UN	1.00	$ 165,450	$ 165,450	0.00	-	$ -	1.00	$ 165,450	1.00	1.00	$ 165,450	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 165,450	1.00	$ 165,450	0.00	$ -
4.4	Suministro, transporte e instalacion de tablero de 6 circuitos bifasico para ser instalado de manera sobrepuesta en cuarto tecnico para instalar los breaker de los ciruitos regulados	UN	1.00	$ 343,788	$ 343,788	0.00	-	$ -	1.00	$ 343,788	1.00	1.00	$ 343,788	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 343,788	1.00	$ 343,788	0.00	$ -
4.5	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico enchufable monopolar de 1x20A-10KA, para proteccion de circuitos regulados	UN	2.00	$ 38,930	$ 77,860	0.00	-	$ -	2.00	$ 77,860	2.00	2.00	$ 77,860	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 77,860	2.00	$ 77,860	0.00	$ -
4.6	Suministro e instalacion de acometida alimentador de tablero normal a ups y de ups a tablero regulado en cable encauchetado 3x10AWG, incluye: 1 mt de cable encauchetado 3x10AWG, prensaestopa, toma aerea con polo a tierra, clavija de caucho con polo a tierra, conctores, Marcacion, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UN	5.00	$ 65,302	$ 326,510	0.00	-	$ -	5.00	$ 326,510	5.00	5.00	$ 326,510	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 326,510	5.00	$ 326,510	0.00	$ -

	NOMBRE DEL PROYECTO		CONTRATISTA: CONSTRUVERTICAL SAS	Valor Inicial:	$ 23,909,183	ACTA DE OBRA Nro.1	
	ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.	DESUr		Plazo Inicial:	3 meses		
			SUPERVISOR: EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO - DESur	Valor Adicional:	$ -	Valor Final:	$ 23,909,183
				Plazo Adicional:	-	Plazo Final:	3 meses

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES 1						ADI	ACTA N°1.								ACUMULADA (o.o+o.a+a.o)		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
			CANT. TOTAL			ACTA MODIFICACIÓN No.1			CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRA		OBRA ORD.+OBRA ADI.+OBRA EXT.					
ITEM	ACTIVIDAD	UN.	T.CANT.	P.UNITARIO	VR TOTAL.	Cant	+/-	Valor Total($)	Cant	Valor Total($)			CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	Valor($)	CANT.	TOTAL
4.7	Suministro e instalación de ramal en cable 1N°12 + 1N°12 + 1N°12(T) CABLE CU – LS, FF, FR, para alimentadores parciales de circuitos que incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M	74.00	$ 18,200	$ 1,346,800	0.00	-	$ -	74.00	$ 1,346,800	31.00	31.00	$ 564,200	0.00	$ -	0.00	$ -	31.00	$ 564,200	31.00	$ 564,200	43.00	$ 782,600
4.8	Suministro de cable 4 pares UTP cat 6A TIPO leyton o equivalente blindado.	M	23.00	$ 9,400	$ 216,200	0.00	-	$ -	23.00	$ 216,200	23.00	23.00	$ 216,200	0.00	$ -	0.00	$ -	23.00	$ 216,200	23.00	$ 216,200	0.00	$ -
4.9	Suministro, transporte e instalacion de Tuberia EMT ϕ3/4". Incluye, 1 mt de tuberia EMT de 3/4", uniones, curvas, adaptadores, grapas, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M	74.00	$ 38,240	$ 2,829,760	0.00	-	$ -	74.00	$ 2,829,760	32.80	32.80	$ 1,254,273	0.00	$ -	0.00	$ -	32.80	$ 1,254,273	32.80	$ 1,254,273	41.20	$ 1,575,487
4.10	Suministro, transporte e instalacion de UPS de 2KVA, incluye, equipo de respaldo de alimentacion ininterrumpida UPS marca HIKVISION 2000VA entrada de 110V y salida de 120V, conexión y puesta en servicio	UN	1.00	$ 2,430,200	$ 2,430,200	0.00	-	$ -	1.00	$ 2,430,200	1.00	1.00	$ 2,430,200	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,430,200	1.00	$ 2,430,200	0.00	$ -
COSTO DIRECTO					**$ 18,534,250**			**$ -**		**$ 18,534,250**			**$ 15,976,091**		**$ -**		**$ -**		**$ 15,976,091**		**$ 15,976,091**		**$ 2,558,159**
ADMINISTRACIÓN				**24%**	**$ 4,448,220**			**$ -**		**$ 4,448,220**			**$ 3,834,262**		**$ -**		**$ -**		**$ 3,834,262**		**$ 3,834,262**		**$ 613,954**
UTILIDAD				**5%**	**$ 926,713**			**$ -**		**$ 926,713**			**$ 798,805**		**$ -**		**$ -**		**$ 798,805**		**$ 798,805**		**$ 127,908**
COSTO TOTAL					**$ 23,909,183**			**$ -**		**$ 23,909,183**			**$ 20,609,158**		**$ -**		**$ -**		**$ 20,609,158**		**$ 20,609,158**		**$ 3,300,025**

RESUMEN		
COSTO DIRECTO		$ 18,534,250
ADMINISTRACION	24%	$ 4,448,220
UTILIDAD	5%	$ 926,713
COSTO TOTAL		$ 23,909,183
TOTAL EJECUTADO ACTA DE OBRA N°1		$ 20,609,158
PORCENTAJE EJECUTADO		86.2%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3,300,025

AMORTIZACIÓN ANTICIPO X DESCUENTO PAGO ANTICIPADO ____ (Seleccionar el caso que aplique, con base en la forma de pago)	
ANTICIPO	$ -
PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR ACTA (Sin amortizar)	$ 20,609,158.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% (De la presente acta)	$ -
VALOR RESTANTE POR AMORTIZAR	$ -
VALOR ACTA	$ 20,609,158.00

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE DESUR

MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ GARZÓN
Representante Legal Construvertical sas

NATALIA PORRAS CORTINEZ
Supervisora Interventoria DESUR

NOTAS:

1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

2. El interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
1.1	Demolicion de atraque de caja fuerte en concreto reforzado de espesor hasta 30 cm y dimensiones de 1.2 m x 1.2m en sus 5 caras. Incluye corte con pulidora, demolicion con machin electrico, equipos de seguridad y toda la herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad, empacada del material proveniente de la demolicion en costales, cargue y transporte interno hasta el sitio donde indique la supervicion, incluye botada.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													

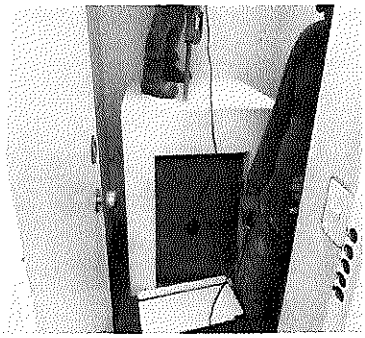





Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO EXISTENTES				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										**1.00**

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

CONSTRUVERTICAL


OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.


ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
1.2	Retiro de caja fuerte, incluye corte de anclajes con pulidora, y transporte interno hasta el sitio donde indique la supervision, no incluye disposicion final	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													



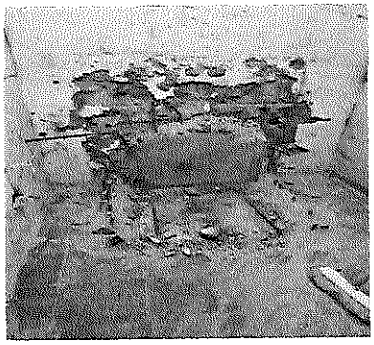

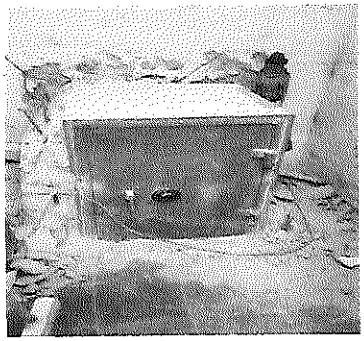

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			RETIRO DE CAJA FUERTE EXISTENTE				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras C

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
1.3	RETIRO DE PUERTA BLINDADA METALICA (marco y ala) con ancho de 80cm. Incluye canchas y cortes con pulidora para demolicion de anclajes perimetrales al muro.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													





Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			RETIRO DE PUERTA BLINDADA EXISTENTE				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS ORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL


OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	30.00
2.1	Resane de muros interiores con mortero 1:4 sobre cualquier tipo de material como ladrillo interior, bloque de concreto y concreto vaciado. incluye suministro y transporte de los materiales, preparacion de la superficie, equipos de seguridad y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	30.00
M2		Saldo por Ejecutar	5.40

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	24.60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30/11/2025												
24.60												

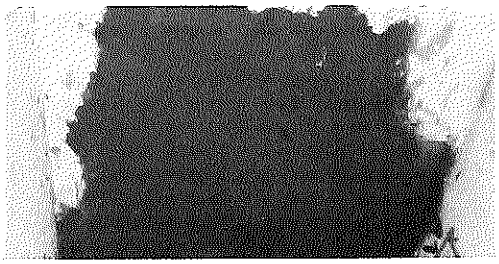

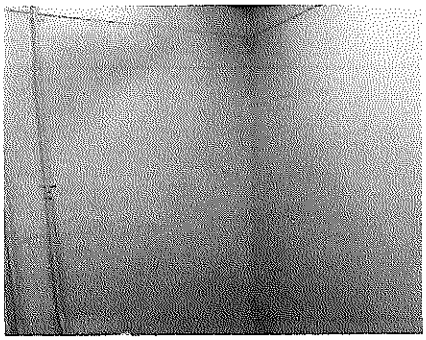

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			RESANE DE MUROS PERIMETRALES INTERNOS	2.3		3.00	2.00	13.80
						1.50		3.00	2.00	9.00
						0.60		3.00	1.00	1.80
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										24.60

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.


ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	30.00
2.2	*Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 muros revocados o en concreto vaciado, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, equipos de seguridad,color a definir según aprobación de la supervisión.*	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	30.00
M2		Saldo por Ejecutar	0.22

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	29.78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30/11/2025												
29.78												





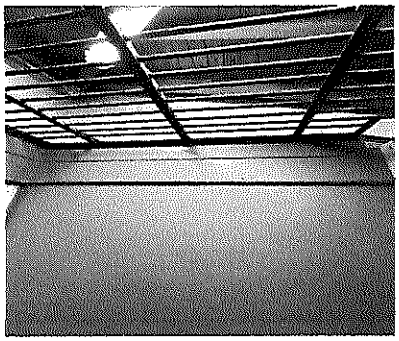

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			PINTURA DE MUROS PERIMETRALES INTERNOS CAJA FUERTE	2.3		3.00	2.00	13.80
						1.50		3.00	2.00	9.00
						0.60		3.00	1.00	1.80
					PINTURA DE MURO PERIMETRAL EXTERNO	1.85		2.80	1.00	5.18
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										29.78

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
3.1	Suministro, transporte e instalacion de reja metalica de seguridad para proteccion bajo cubierta, con dimensiones de 2.25m x 1.45 m conformada por angulos perimetrales en 1"- 1/2 x 1/4" y varillas lisa de 3/4" para refuerzo transversal, Incluye soldaduras, platinas de anclaje con chazos expansivos, pintura anticorrosivo y esmalte base aceite de acabado color negro mate, equipos y personal certificado para trabajo en alturas y demas herramienta necesaria para la correcta ejecucion de la actividad	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													





Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			INSTALACION DE REJA METALICA DE PROTECCION				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur	CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"	CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.	ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
3.2	Mantenimiento correctivo de puerta metálica blindada (marco y ala) de ancho 80 cm, incluye instalacion, preparacion de la superficie, resanes, lijada, reemplazo de elementos deteriorados, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													







Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			MANTENIMIENTO DE PUERTA BLINDADA				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
4.1	S.T.I. de sálida para camara de CCTV en EMT para ser instalada sobrepuesta. Incluye: Camara CAMARA TURBO 5MP DOMO ANTIVANDALICA EXIR 2.8 /3.6 /6 0.01 LUX IR40m IP67 METAL HIKVISION, Caja plastica 10x10, Tuberia EMT de 3/4", Entrada a caja EMT, marcación, cable UTP 4 pares cat 6A.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													





Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			INSTALACION DE CAMARA CON SALIDA				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	2.00
4.2	S.T.I. de sálida para salida para tomacorriente regulado doble 120V, 15A (NEMA5-15R NARANJA) para ser instalado de manera sobrepuesta en tuberia EMT. Incluye: aparato toma naranja regulada, caja 12x12x5 metalica con troquelde toma, conectores, marcación, cable de cobre 3#12AWG- LS-HF-FR, entrada a caja EMT, elementos de sujecion y demas accesorios necesariospara su correcta instalacion y funcionamiento.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	2.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
2.00													

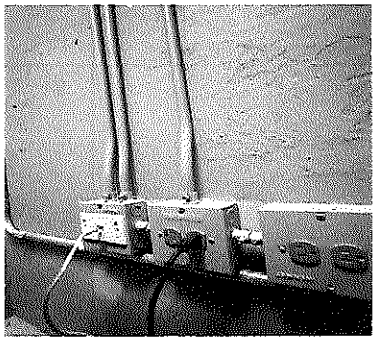

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			INSTALACION DE TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE				2.00	2.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										**2.00**

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
4.3	S.T.I. de sálida para datos sencilla en EMT para ser instalada sobrepuesta. Incluye: Caja metalica 12x12x5 con troquel de datos, Tuberia EMT de 3/4", face plate, Jack RJ-45 cat 6A, Entrada a caja EMT, marcación, cable UTP 4 pares cat 6A.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													

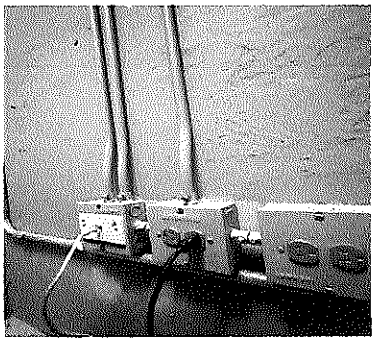

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			SALIDA DE DATOS				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
4.4	Suministro, transporte e instalacion de tablero de 6 circuitos bifasico para ser instalado de manera sobrepùesta en cuarto tecnico para instalar los breaker de los cicuitos regulados	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													

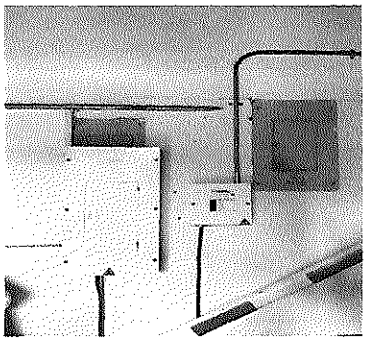

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			TABLERO DE 6 CIRCUITOS				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	2.00
4.5	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico enchufable monopolar de 1x20A-10KA, para proteccion de circuitos regulados	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	2.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	2.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
2.00													

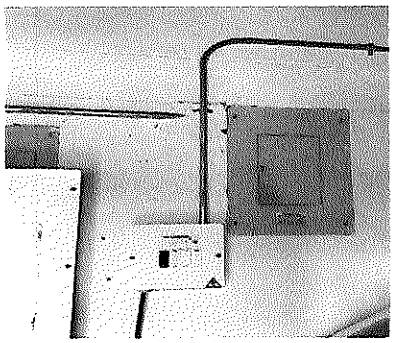

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			INSTALACION INTERRUPTORES				2.00	2.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										2.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	5.00
4.6	Suministro e instalacion de acometida alimentador de tablero normal a ups y de ups a tablero regulado en cable encauchetado 3x10AWG, incluye: 1 mt de cable encauchetado 3x10AWG, prensaestopa, toma aerea con polo a tierra, clavija de caucho con polo a tierra, conctores, Marcacion, elementos de sujecion y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	5.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	5.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
5.00													

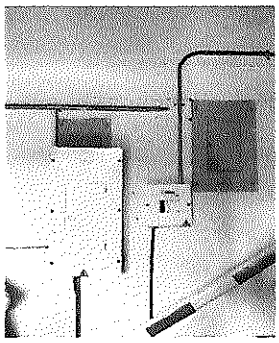





Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			ACOMETIDA PARA RED REGULADA				5.00	5.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										5.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	74.00
4.7	Suministro e instalación de ramal en cable 1N°12 + 1N°12 + 1N°12(T) CABLE CU – LS, HF, FR, para alimentadores parciales de circuitos que incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	74.00
M		Saldo por Ejecutar	43.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	31.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
31.00													

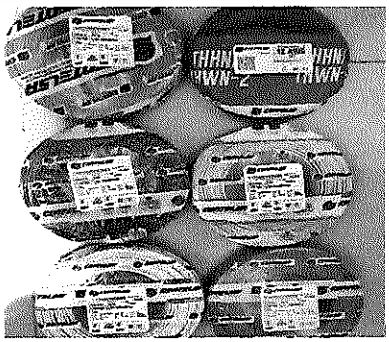

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			CABLEADO ELECTRICO				31.00	31.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										31.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	23.00
4.8	Suministro de cable 4 pares UTP cat 6A TIPO leviton o equivalente blindado.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	23.00
M		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	23.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
23.00													

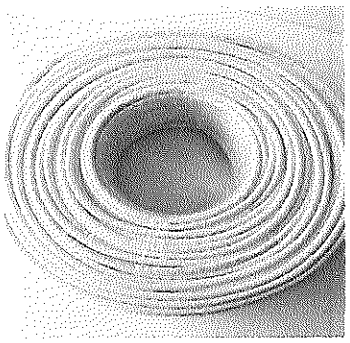



Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			CABLEADO PARA DATOS				23.00	23.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										23.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.


ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	74.00
4.9	Suministro, transporte e instalacion de Tubería EMT Ø3/4". Incluye, 1 mt de tuberia EMT de 3/4", uniones, curvas, adaptadores, grapas, marcacion y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	74.00
M		Saldo por Ejecutar	41.20

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	32.80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
32.80													





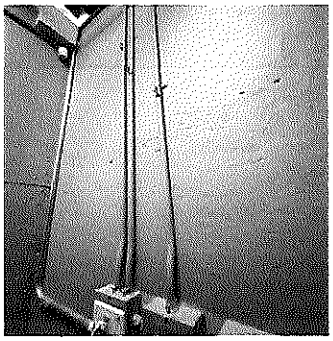

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			TUBERIA EMT 3/4				32.80	32.80
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										32.80

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras C

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"


CONSTRUVERTICAL

OBJETO: ADECUACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASETA DE ESTACIÓN DEL PEAJE DEL ESCOBERO – ALTO DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, INCLUYENDO TODAS LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-0895-25.

ACTA #1

Item No.	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
4.10	Suministro, transporte e instalacion de UPS de 2KVA, incluye. equipo de respaldo de alimentacion ininterrumpida UPS marca HIKVISION 2000VA entrada de 110V y salida de 120V, conexión y puesta en servicio	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1.00
UN		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum.	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30/11/2025													
1.00													

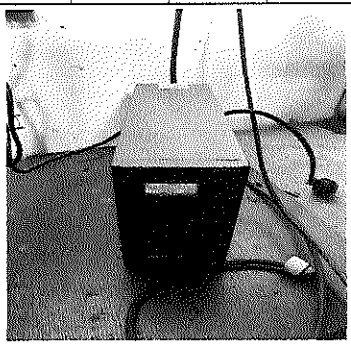

Registro Fotográfico/Plano/Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Frente	Nivel	Otro	Detalle	Largo [m]	Ancho [m]	Altura [m]	Cantidad	Total
1	30/11/2025	PEAJE EL ESCOBERO			INSTALACION DE UPS				1.00	1.00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE OBRA Nro. 1										1.00

CONSTRUVERTICAL S.A.S
JUAN JOSE TORRES WEST
CONTRATISTA

Natalia Porras

DESur
NATALIA PORRAS CORTINEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA
