No. 20250012553812473 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-BRIM1-BFLIM16-SCBFLIM16-SETIC-29.25

Tubor D.P 27 de Noviembre del 2025

Señor Capitán de Fragata.
JAVIER ALBERTO URIBE LARROTA.
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1
Troncal de Occidente Km2 Via Corozal - Sincelejo
Corozal - Sucre

Asunto: Solicitud prorroga Contrato No. 044-ARC-CBCAI1-2025

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Fragata, Comandante Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1, con el fin de informar y solicitar prorroga acuerdo la solicitud de la empresa ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS., cuyo objetivo es "MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato (**CONTRATO NO. 044-ARC-CBCAI1-2025**) y la oferta presentada el día 13 de Noviembre del 2025.

En el cual, el contratista manifiesta una solicitud de prórroga de quince (15) días calendario al plazo de ejecución contractual, debido a que, aunque el contrato inició formalmente el 13 de noviembre de 2025 con fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de 2025, durante la gestión inicial para la subcontratación del mantenimiento de la torre de comunicaciones en la Base de Turbo – Antioquia se presentaron cotizaciones que superaban el valor del contrato y otros oferentes no radicaron propuesta formal, lo que retrasó la operación hasta concretar la contratación del señor Óscar Eduardo Palacio Jiménez, iniciando actividades materiales el 25 de noviembre de 2025 tras cumplir trámites de afiliación, disponibilidad de personal y formalización administrativa; adicionalmente, para la correcta y segura ejecución del objeto contractual se requiere la adquisición e instalación de materiales especializados provenientes de Bogotá, entre ellos sistema de pararrayos, puesta a tierra, un rollo de guaya de aproximadamente 280 metros, 54 grapas y 9 templadores, cuya gestión logística incide directamente en los tiempos de ejecución; la ampliación solicitada no implica costos adicionales, no modifica el valor contractual y se fundamenta en criterios técnicos, jurídicos y operativos que garantizan la adecuada ejecución del contrato, por lo cual se solicita establecer como nueva fecha de terminación el 13 de diciembre de 2025, con el fin de culminar satisfactoriamente todas las actividades previstas. Por lo anterior se solicita lo siguiente:

1. Conceder una prórroga hasta el 13 de diciembre del 2025 para el cumplimiento total de los trabajos.
2. Mediante su conducto, se solicita adelantar las reuniones pertinentes para verificar
3. Solicitar que, una vez evaluada la solicitud de prórroga, se expida el acto administrativo correspondiente, con el fin de formalizar la ampliación del plazo contractual.

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

Considerando lo expuesto por la empresa contratista se solita ampliar el plazo de ejecución.

Respetuosamente,

Julián Ma Arteaga

Suboficial Tercero ARTEAGA GUERRERO JULIÁN MAURICIO
Supervisor del Contrato No. 044-ARC-CBCAI1-2025.

Anexo: Oficio 01-2025 de Fecha 27 de noviembre del 2025- ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS (03 folios).

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Avenida la Playa Sector Punta las Vacas- Turbo Antioquia, Colombia.
www.armada.mil.co – julian.arteaga@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

Bogotá D.C., noviembre 27 de 2025

Señores:
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – se denominará BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1
S3 ARTEAGA GUERRERO JULIAN
Supervisor del contrato
Ciudad

Oficio: 01-2025

Ref.: CONTRATO No. 044-ARC-CBCAI1-2025 "MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

ASUNTO: SOLICITUD DE **PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL**..

Respetado Sargento:

La empresa **ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS S.A.S.**, en calidad de contratista del contrato de la referencia, se permite solicitar respetuosamente **prórroga del plazo de ejecución contractual**, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. **Antecedentes contractuales**

- El contrato inició formalmente el **13 de noviembre de 2025**, conforme a la carta de aceptación.
- El plazo pactado es de **un (1) mes**, por lo cual la fecha inicial de terminación sería el **12 de diciembre de 2025**.

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16115121
Número del contrato	044-ARC-CBCAI1-2025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	13 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(28/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	1 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(28/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


- No obstante, en atención a la proximidad del vencimiento del plazo y al desarrollo real de las actividades, se hace necesaria la presente solicitud.

2. **Hechos que fundamentan la solicitud**

- El día **14 de noviembre de 2025**, los señores **Robinson Palacios Romaña**, identificado con C.C. 8.427.685, y **Rubén Darío Palacios Romaña**, identificado con C.C. 71.981.726, se

desplazaron a la **Base de Turbo – Antioquia** con el fin de gestionar la subcontratación del mantenimiento de la torre de comunicaciones a intervenir.

- En dicha visita, el profesional consultado presentó una cotización cuyo valor superaba ampliamente el valor total del contrato, razón por la cual no fue viable adelantar la contratación bajo dichas condiciones.

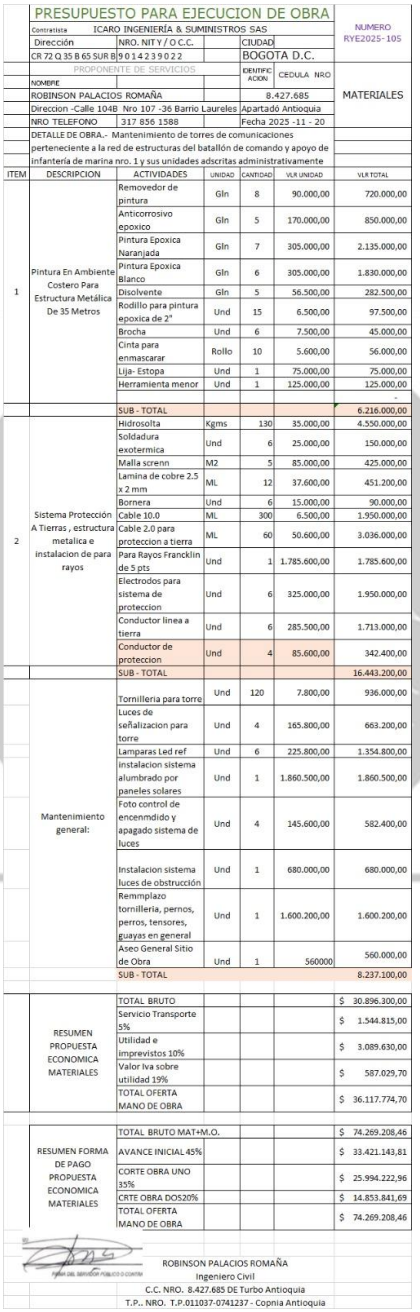

PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE OBRA

Contratista	ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS					NUMERO RYE2025-105
Dirección	NRO. NIT Y/O C.C.		CIUDAD			
CR 72 Q 35 B 65 SUR B	901423902 2		BOGOTA D.C.			
PROPONENTE DE SERVICIOS			IDENTIFICACION	CEDULA NRO		
NOMBRE						
ROBINSON PALACIOS ROMAÑA			8.427.685			MATERIALES
Direccion -Calle 104B Nro 107 -36 Barrio Laureles			Apartadó Antioquia			
NRO TELEFONO	317 856 1588		Fecha 2025 -11 - 20			
DETALLE DE OBRA.- Mantenimiento de torres de comunicaciones perteneciente a la red de estructuras del batallón de comando y apoyo de infantería de marina nro. 1 y sus unidades adscritas administrativamente						

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIDAD	VLR TOTAL
1	Pintura En Ambiente Costero Para Estructura Metálica De 35 Metros	Removedor de pintura	Gln	8	90.000,00	720.000,00
		Anticorrosivo epoxico	Gln	5	170.000,00	850.000,00
		Pintura Epoxica Naranjada	Gln	7	305.000,00	2.135.000,00
		Pintura Epoxica Blanco	Gln	6	305.000,00	1.830.000,00
		Disolvente	Gln	5	56.500,00	282.500,00
		Rodillo para pintura epoxica de 2"	Und	15	6.500,00	97.500,00
		Brocha	Und	6	7.500,00	45.000,00
		Cinta para enmascarar	Rollo	10	5.600,00	56.000,00
		Lija- Estopa	Und	1	75.000,00	75.000,00
		Herramienta menor	Und	1	125.000,00	125.000,00
						-
		SUB - TOTAL				6.216.000,00
2	Sistema Protección A Tierras , estructura metalica e instalacion de para rayos	Hidrosolta	Kgms	130	35.000,00	4.550.000,00
		Soldadura exotermica	Und	6	25.000,00	150.000,00
		Malla screnn	M2	5	85.000,00	425.000,00
		Lamina de cobre 2.5 x 2 mm	ML	12	37.600,00	451.200,00
		Bornera	Und	6	15.000,00	90.000,00
		Cable 10.0	ML	300	6.500,00	1.950.000,00
		Cable 2.0 para proteccion a tierra	ML	60	50.600,00	3.036.000,00
		Para Rayos Francklin de 5 pts	Und	1	1.785.600,00	1.785.600,00
		Electrodos para sistema de proteccion	Und	6	325.000,00	1.950.000,00
		Conductor linea a tierra	Und	6	285.500,00	1.713.000,00
		Conductor de proteccion	Und	4	85.600,00	342.400,00
		SUB - TOTAL				16.443.200,00
	Mantenimiento general:	Tornilleria para torre	Und	120	7.800,00	936.000,00
		Luces de señalizacion para torre	Und	4	165.800,00	663.200,00
		Lamparas Led ref	Und	6	225.800,00	1.354.800,00
		instalacion sistema alumbrado por paneles solares	Und	1	1.860.500,00	1.860.500,00
		Foto control de encenmdido y apagado sistema de luces	Und	4	145.600,00	582.400,00
		Instalacion sistema luces de obstrucción	Und	1	680.000,00	680.000,00
		Remmplazo tornillería, pernos, perros, tensores, guayas en general	Und	1	1.600.200,00	1.600.200,00
		Aseo General Sitio de Obra	Und	1	560000	560.000,00
		SUB - TOTAL				8.237.100,00

RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES	TOTAL BRUTO	$ 30.896.300,00
	Servicio Transporte 5%	$ 1.544.815,00
	Utilidad e imprevistos 10%	$ 3.089.630,00
	Valor Iva sobre utilidad 19%	$ 587.029,70
	TOTAL OFERTA MANO DE OBRA	$ 36.117.774,70

RESUMEN FORMA DE PAGO PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES	TOTAL BRUTO MAT+M.O.	$ 74.269.208,46
	AVANCE INICIAL 45%	$ 33.421.143,81
	CORTE OBRA UNO 35%	$ 25.994.222,96
	CRTE OBRA DOS20%	$ 14.853.841,69
	TOTAL OFERTA MANO DE OBRA	$ 74.269.208,46

ROBINSON PALACIOS ROMAÑA
Ingeniero Civil
C.C. NRO. 8.427.685 DE Turbo Antioquia
T.P.. NRO. T.P.011037-0741237 - Copnia Antioquia

- Posteriormente se tuvo acercamiento con el señor **Carlos Enrique Navales Rojas**, quien finalmente no presentó cotización formal.
- Finalmente, se logró contratar al señor **Oscar Eduardo Palacio Jiménez**, con quien fue posible estructurar técnica y económicamente la ejecución del mantenimiento requerido.

- Las actividades de obra iniciaron materialmente el **martes 25 de noviembre de 2025**, debido a los trámites necesarios para afiliación a seguridad social, formalización contractual, disponibilidad de personal y demás requisitos legales y administrativos.

3. **Justificación técnica**

Para la correcta y segura ejecución del mantenimiento de la torre de comunicaciones, se requiere la adquisición e instalación de materiales especializados, entre ellos:

- Sistema de **pararrayos** y **puesta a tierra**.
- Materiales que deben ser enviados desde la ciudad de **Bogotá**, incluyendo:
    - **Un (1) rollo de guaya de aproximadamente 280 metros**, teniendo en cuenta que las **9 guayas instaladas** tienen una longitud aproximada de **30 metros cada una**.
    - **54 grapas**.
    - **9 templadores**.

El suministro, transporte e instalación de estos elementos es indispensable para garantizar la estabilidad estructural, el cumplimiento de normas técnicas y la seguridad operativa de la torre.

4. **Justificación jurídica y financiera**

- La prórroga solicitada **no implica adición presupuestal**, modificación del valor contractual ni reconocimiento de mayores costos para la Entidad.
- La solicitud se fundamenta en el principio de **planeación y eficiencia contractual**, buscando asegurar la correcta ejecución del objeto del contrato en condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento técnico.
- La ampliación del plazo se ajusta a lo permitido por la normatividad contractual vigente, toda vez que se trata de circunstancias operativas y logísticas debidamente justificadas.

5. **Solicitud**

Con fundamento en lo anterior, **respetuosamente solicitamos una prórroga de quince (15) días calendario**, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el **13 de diciembre de 2025**, con el fin de culminar satisfactoriamente todas las actividades previstas, sin generar costos adicionales para la Entidad.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información o documentación adicional que se requiera.

Cordialmente,

Carlos Andrés Lopez

FIRMA DEL PROPONENTE
CARLOS ANDRÉS LÓPEZ GARZÓN
C.C. 80.833.037 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ICARO INGENIERÍA & SUMINISTROS SAS
NIT: 901.423.902-2
