CONSORCIO VR RUU

BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

INFORME SEMANAL

FECHA	NOVIEMBRE 2025	PERIODO No. 30	18/11/2025	AL	22/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C**


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**25 de diciembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:	**25 de diciembre de 2025**
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)
PLAZO PRORROGA 1:	Tres Meses (3)			PLAZO PRORROGA 1:	Tres Meses (3)
PLAZO TRANSCURRIDO:	247	EQUIVALE AL	90%	PLAZO TRANSCURRIDO:	247
VALOR INICIAL :				VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):	$ 3.348.072.000,00
VALOR TOTAL				VALOR TOTAL	sd

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	275
Tiempo transcurrido	247
Faltante	28


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
90,51%	90,51%	0,00%	0,00%	90,51%	90,51%	0,00%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

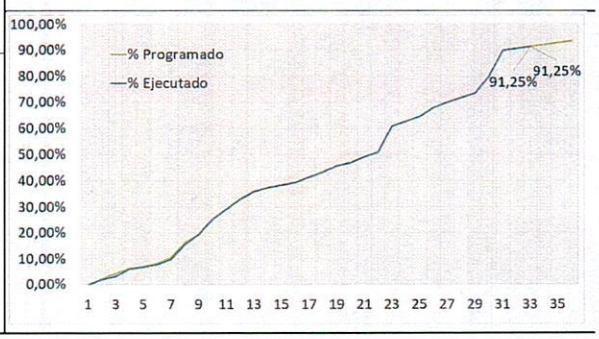

3. ACTIVIDADES

FRENTE: 1 MARRUECOS

Personal Total: 3 **Oficial:** 1 **Ayudante:** 2 **Maquinaria:** 2 **Equipos:** Retroexcavadora

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18005087-18005094	70%	70%

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION A PUNTO DE ACOPIO.	1. SE PROGAMA CARGUE DE RCD Y DESCARGA DE MATERIALES .
2. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	3. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
4. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	
5. SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA.	

REGISTRO FOTOGRAFICO







SEÑALIZACIÓN AUXILIAR VIAL SENDERO PEATONAL



REUION EXTRAORDINARIA


FRENTE 2. PIJAOS


Personal Total: 3	Oficial: 1	Ayudante: 2	Maquinaria: 2	Equipos: Minicarador y Vibrocompactador, Retroexcavadora

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18003163	92%	92%

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN), EN LAS DIRECCIONES 36A-70 Y 36A77.	1. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
2. SE REALIZA EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, EN LA DIRECION 36A-76.	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. SE REALIZA INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, EN LA DIRECCION 36A-76.	3. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
4. SE REALIZA EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, EN LAS DIRECCIONES 36A-63, 36A-69, 36A-76.	4. SE PROGRAMA INSPECCIONES PREOPERACIONALES SST Y AMBIENTALES.
5. SE REALIZA LA INSTLACION DE TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	
6. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	
7. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
8. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

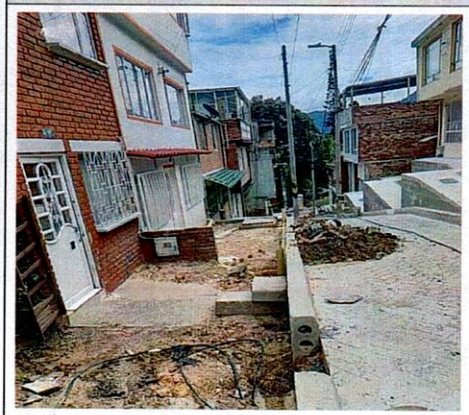

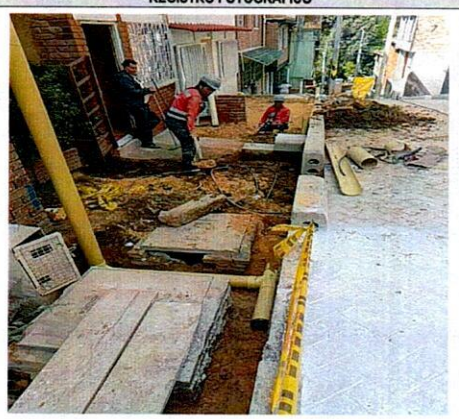



EXCAVACION MANUAL, INSTALACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE MUERO EN BLOQUE.







INSPECCION CAMPAMENTO, CAPACITACIONES

FRENTE 3. HOSPITAL DE SAN CARLOS

Personal Total: 3 **Oficial:** 1 **Ayudante:** 2 **Maquinaria:** 2 **Equipos:** Minicargador

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18001971	90%	90%

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI), ENTRE LAS DIRECCIONES K0+000-K0+060.	1. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
2. SE REALIZA SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI), ENTRE LA ABSCISA K0+000-K0+060.	2. RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
3. SE REALIZA INSTLACION DE SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE, ENTRE LAS ABSCISAS K0+000-K0+060.	3. SE PROGAMA CARGUE DE RCD Y DESCARGA DE MATERIALES .
4. SE REALIZA INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye tuberia PF, registros y accesorios, longitud promedio de 6.5m, incluye cajilla en polipropileno para medidor), ENTRE LAS DIRECCIONES 31F-46, 31F-42, 31F-36, 31F-32, 31F-26, 31F-22, 31F-02.	4. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
5. SE REALIZA CARGUE DE RCD.	5. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
6. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	6. SE PROGRAMA INSPECCIONES PREOPERACIONALES SST Y AMBIENTALES.
7. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
8. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	
9. ENTREGA DE VOLANTES.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



BORDILLO PREFABRICADO Y SUBBASE PEATONAL







ORDEN Y ASEO, AUXILIAR VIAL, SENDERO EATONAL



ENTREGA DE VOLANTES


FRENTE 4. MARCO FIDEL SUAREZ

Personal Total: 3	Oficial: 1	Ayudante: 2	Maquinaria: 2	Equipos: Retroexcavadora

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18003049	57%	57%

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. ADITIVO LIQUIDO IONICO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBBASE GRANULAR RECICLADA + CEMENTO 5%, ENTRE LAS ABSCISAS K0+000-K0+130.	1. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
2. SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI), ENTRE LAS ABSCISAS K0+020-K0+130.	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE).	
4. SE REALIZA CARGUE DE RCD.	
5. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	
6. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
7. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

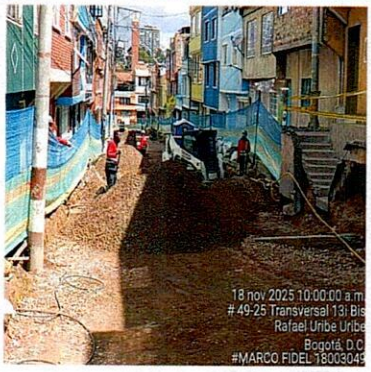



INSTALACION DE SARDINEL Y ADITIVO LIQUIDO PARA BASE ESTABILIZADA.









INSPECCION SENDERO PEATOAL, ORDEN Y ASEO

FRENTE 5. MOLINOS SUR CIV 18005161

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA.	

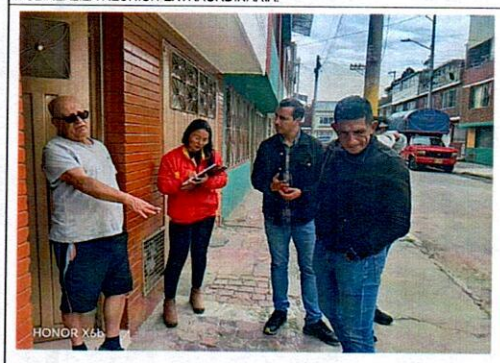

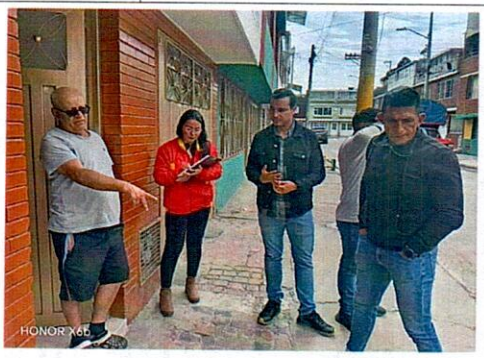



REUNION EXTRAORDINARIA

PERSONAL CONTRATISTA:

Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Tècnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Tècnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Tránsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 18 al 22 de noviembre se presentaron dias soleados, con lluvias moderadas

	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Firma:		
Nombre:	FARLEY ANDREA LARRARTE	JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

CONSORCIO VR RUU

BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

INFORME SEMANAL

FECHA	NOVIEMBRE 2025	PERIODO No. 31	24/11/2025	AL	29/11/2025

OBJETO DEL CONTRATO	**"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÒN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE E EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE - BOGOTÁ D.C**


CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	745 de 2024			CONTRATO No.:	748 de 2024
INTERVENTOR CONTRATISTA	INTER VIAS ARM 24			CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)
PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DI	Un Mes (01)			PLAZO FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Un Mes (01)
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)			PLAZO FASE II - EJECUCIÓN:	Seis Meses (6)
FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**			FECHA DE INICIACIÓN:	**25 de marzo de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**24 de septiembre de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**25 de diciembre de 2025**			FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:	**25 de diciembre de 2025**
PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)			PLAZO INICIAL:	Seis Meses (6)
PLAZO PRORROGA 1:	Tres Meses (3)			PLAZO PRORROGA 1:	Tres Meses (3)
PLAZO TRANSCURRIDO:	254	EQUIVALE AL	92%	PLAZO TRANSCURRIDO:	254
VALOR INICIAL :				VALOR INICIAL :	$ 6.117.748.360,00
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):	$ 3.348.072.000,00
VALOR TOTAL				VALOR TOTAL	sd

2. AVANCE DE OBRA

2.1. CONTROL DE TIEMPO EN OBRA

Tiempo total Contractual	275
Tiempo transcurrido	254
Faltante	21


2.2. FLUJO INVERSÓN DEL CONTRATO



2.3. PORCENTAJE PROGRAMACION DE OBRA

ACUMULADO SEMANA ANTERIOR		PRESENTE CORTE		ACUMULADO TOTAL		DIFERENCIA
% PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	
91,25%	91,25%	0,89%	0,89%	92,14%	92,14%	0,89%

CURVA (S) AVANCE DE OBRA SEMANAL

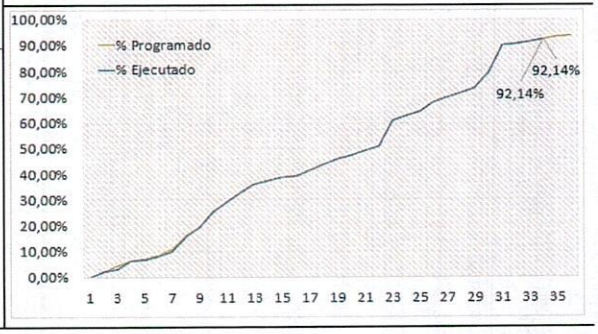

3. ACTIVIDADES


FRENTE: 1 MARRUECOS

Personal Total: 3 **Oficial:** 1 **Ayudante:** 2 **Maquinaria:** 2 **Equipos:** Retroexcavadora

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18005087-18005094	72%	72%


3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA EXCAVACIO MANUAL, INSALACION DE SUBBASE GRANULAR E INSTALACION DE SARDINEL.	1. SE PROGAMA CARGUE DE RCD Y DESCARGA DE MATERIALES .
2. RE REALIZA CONTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION, LALS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS SE REALIZARO EN EL CIV 18005094 Y 18005087	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION A PUNTO DE ACOPIO.	3. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
4. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	
5. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
6. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	
7. SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

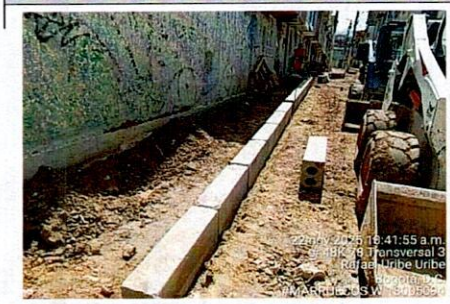



INSTALACION DE SARDINEL

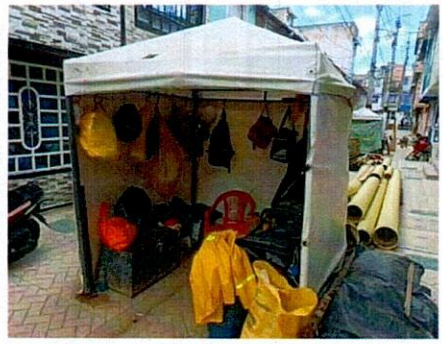
ORDEN Y ASEO, CAMPAMENTO



FRENTE 2. PIJAOS

Personal Total:	3	**Oficial:**	1	**Ayudante:**	2	**Maquinaria:**	2	**Equipos:**	**Minicarador y Vibrocompactador, Retroexcavadora**

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18003163	94%	94%

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZA DE TODO EL SEGMENTO VIAL, SE INICIA LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MANUAL PARA ISTALACION DE AGUA POTABLE.	1. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
2. SE REALIZA NIVLACION DE CAJAS DE INSPECCION, E INSTALACION DE CAJILLAS COSTADO DERECHO, SE VERIFICAN NIVELES DE LA ABSCISA K0+060-K0+070.	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. SE REALIZA INSTLACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+060-K0+070.	3. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
4. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	4. SE PROGRAMA INSPECCIONES PREOPERACIONALES SST Y AMBIENTALES.
5. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
6. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

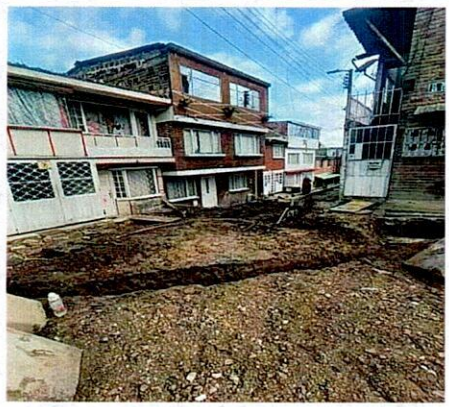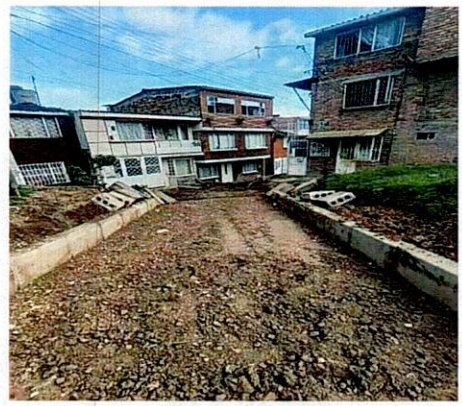INSTALACION DE CONCRETO.







INSPECCION, ORDEN Y ASEO, CAPACITACION


FRENTE 3. HOSPITAL DE SAN CARLOS


Personal Total: 3	Oficial: 1	Ayudante: 2	Maquinaria: 2	Equipos: Minicargador

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18001971	92%	92%


3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA FUNDIDA DE ANDEN CONCRETO DE 3000 PSI, COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+000-K0+060.	1. SE PROGRAMA CHARLA INFORMATIVA
2. SE REALIZA CORTES DE EMPALME PARA ASFALTO Y VERIFICACION DE NIVELES.	2. RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
3. SE REALIZA REMATES DE OBRA, JORNADA DE ORDEN Y ASEO Y LIMPIEZZA DE TODO EL SEGMENTO VIAL.	3. SE PROGAMA CARGUE DE RCD Y DESCARGA DE MATERIALES .
3. SE REALIZA CARGUE DE RCD.	4. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
4. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	5. SE PROGRAMA INSPECCIONES PREOPERACIONALES SST Y AMBIENTALES.
5. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	6. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
6. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	
7. SE REALIZA REUNION EXTRAORDINARIA.	


REGISTRO FOTOGRAFICO

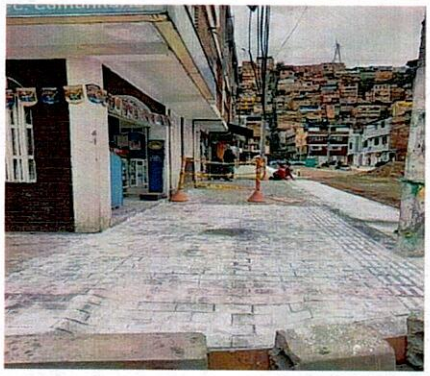

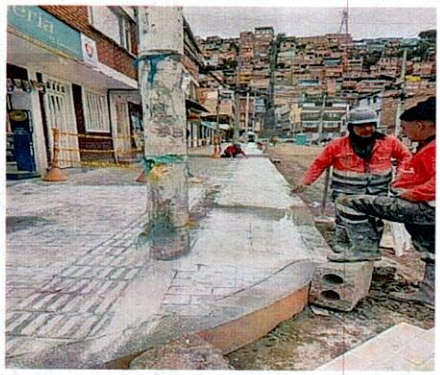

BORDILLO PREFABRICADO Y SUBBASE PEATONAL

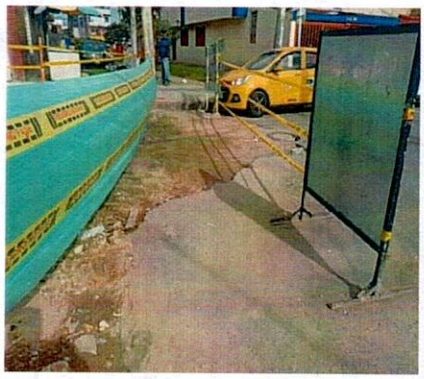

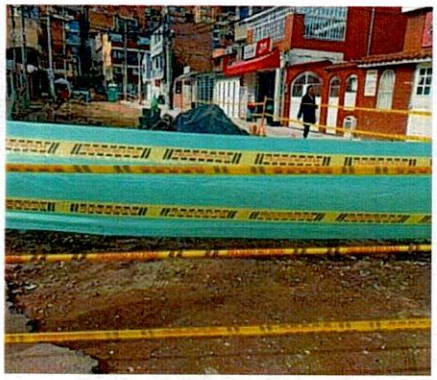



CENDERO PEATONAL, CERRAMIENTO, PROTECCION DE MATERIAL







REUNION EXTRAORDINARIA.

FRENTE 4. MARCO FIDEL SUAREZ


Personal Total: 3 **Oficial:** 1 **Ayudante:** 2 **Maquinaria:** 2 **Equipos:** Retroexcavadora

CIV	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
18003049	72%	72%


3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA EXCAVACION MANUAL CON LA INSTLACION DE SUBBASE GRANULAR CON SU RESPECTIVA COMPACTACION, POSTERIOR A ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA INSTALACION DE SARDINEL	1. SE PROGRAMA VERIFICACION DE SEÑALZACION SST PREVENTIVA
2. EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE).	2. SE PROGRAMA PROTECCION DE MATERIALES Y RCD.
3. SE REALIZA CARGUE DE RCD.	
4. SE REALIZA INSTALACION Y VERIFICACION DE CAMPAMENTO DE OBRA.	
5. SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO ECOLOGICO	
6. SE REALIZA INSTALACION DE STIKERS MOVILES A MAQUINARIA Y EQUIPOS.	
7. SE REALIZA TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ACTAS DE RAMPA .	

REGISTRO FOTOGRAFICO




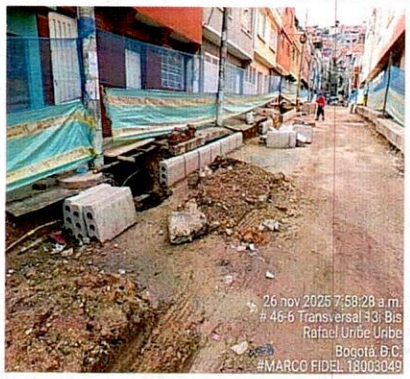

INSTALACION DE SARDINEL

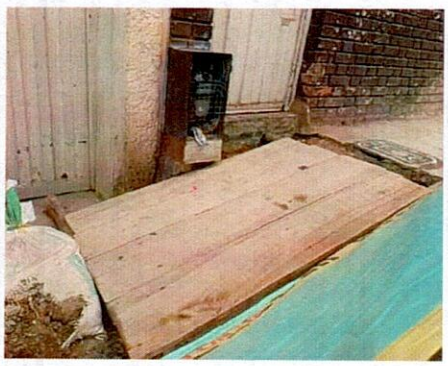



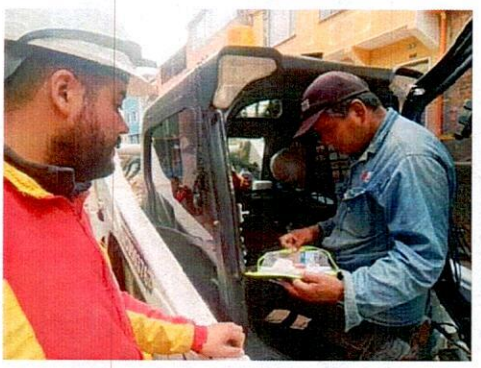

PLAFON, CERRAMIENTO, PREOPERACIONAL






ACTAS DE RAMPA

FRENTE 5. PIJAOS CIV 18003163

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS	3.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. SE REALIZA RECORRIDO DE FRENTE DE OBRA.	



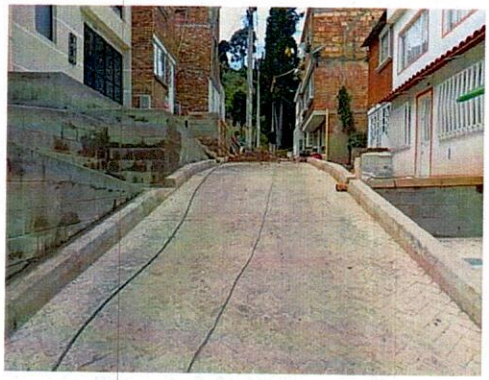

RECORRIDO DE FRENTE DE OBRA

PERSONAL CONTRATISTA:

Director de Obra: Andres Felipe Echandia
Residente Tècnico: Carlos Mauricio Castaño Londoño
Residente Tècnico: Sandra Marina Cuestas
Especialista en Estructuras: Ana Milena Olarte
Especialista en Redes Hidrosanitarias: Lisandro Nuñez Galeano
Especialista en Costos y Presupuestos: Monica Vanesa Galindo
Especialista en Pavimentos: Juan Ricardo Troncoso
Especialista en Trànsito y Transporte: Carlos Andres Muñoz Leon
Residente SST: Diana Coral
Residente Ambiental: Oscar Alejandro Santamaria
Residente Social: Martha Isabel Coral
Topográfo: Albaro Andres Valderrama
Inspector de Obra: Jennifer Adriana Quiroga Torralba
Inspector de Obra: Andrea Carolina Martin Cruz

NOVEDADES: N.A

ASPECTO CLIMA : Del 24 al 30 de noviembre se presentaron dias soleados, con lluvias moderadas

	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Firma:		
Nombre:	FARLEY ANDREA LARRARTE	JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ANEXO 5.

CUADRO DEL TIEMPO.

CONSORCIO VR RUU

FORMATO DE CONTROL DE TIEMPO

CONTRATO: COP 748 DE 2024

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

PERIODO LABORADO		Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025																														
No.	*ESTADO DEL TIEMPO*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1	*SECO - SOLEADO*	4		4	8	4	4	4	8					4	4						4	8	8		4				8	4	
2	*NUBLADO*	4				4		4			8	4	8			4			4	4					4			8		4	
3	*LLUVIAS MODERADAS*														4	4			4	4	4					8	4				
4	*LLUVIAS INTENSA*			4			4					4		4													4				

NOTA: EN CADA CASILLA SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO.

OBSERVACIONES	1. El dia 1 de noviembre de 2025, se presenta en horas de la mañana clima nublado y en la tarde clima soleado seco.
	2. El dia 3 de noviembre de 2025, se presenta en horas de la mañana clima seco soleado y en la tarde lluvias intensas.
	3. El dia 4 de noviembre de 2025, se presenta durante todo el dia clima seco soleado.
	4. El dia 5 de noviembre de 2025, se presenta en la mañana clima nublado, y en la tarde clima seco soleado.
	5. El dia 6 de noviembre de 2025, se presentan lluvias intensas en horas de la mañana y en la tarde clima nublado.
	6. El dia 7 de noviembre de 2025, se presentan en horas de la mañana clima nublado y en la tarde clima seco soleado.
	7. El dia 8 de noviembre de 2025, se presentan en horas de la mañana y en la tarde clima seco soleado.
	8. El dia 10 de noviembre de 2025, se presenta clima nublado durante todo el dia.
	9. El dia 11 de noviembre de 2025, se presenta en horas de la mañana clima nublado y en la tarde luvias intensas.
	10. El dia 12 de noviembre de 2025, se presenta clima nublado durante todo el dia.
	11. El dia 13 de noviembre de 2025, se presenta lluvias intensas en horas de la mañana y en la tarde clima seco soleado.
	12. EL dia 14 de noviembre de 2025, se presenta en la mañana clima seco soleado y en la tarde clima con lluvias moderadas.
	13. El dia 15 de noviembre de 2025, se presenta durante todo el dia clima nublado con lluvias moderadas.
	14. El dia 18 de noviembre de 2025, se presenta en la mañana clima nublado y en la tarde lluvias moderadas.
	15. El dia 19 de noviembre de 2025, se presenta en la mañana clima nublado y en la tarde lluvias moderadas.
	16. El dia 20 de ncoviembre de 2025, se presenta clima con lluvias moderadas en horas de la mañana y en la tarde clima seco soleado.
	17. El dia 21 de noviembe de 2025, se presenta clima seco soleado durante todo el dia.
	18. El dia 22 de noviembre de 2025, se presenta clima seco soleado durante todo el dia.
	19. El dia 24 de noviembre de 2025, se presenta clima nublado en la mañana y en la tarde seco soleado.
	20. El dia 25 de noviembre de 2025, se presenta clima con lluvias moderadas durante todo el dia.
	21. EL dia 26 de noviembre de 2025, se presenta clima con lluvias intensas en la mañana y en la tarde lluvias moderadas.
	22. El dia 27 de noviembre de 2025, se presenta clima nublado durante todo el dia.
	23. El dia 28 de noviembre de 2025, se presenta clima seco soleado durante todo el dia.
	24. El dia 29 de nooviembre de 2025, se presenta clima seco solado en horas de la mañana y en la tarde clima nublado.
	25. El dia 30 de noviembre de 2025, se presenta clima seco soleado durante todo el dia.

ANEXO 6.

REGISTRO FOTOGRÀFICO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO LA ESPERANZA

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DELA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

COP 748 de 2024 FDLRUU

CONSORCIO VR RUU

Fotos de la intervencion


Calle 49B sur desde Carrera 5P hasta Carrera 5N - CIV 18005087

ANTES





DURANTE

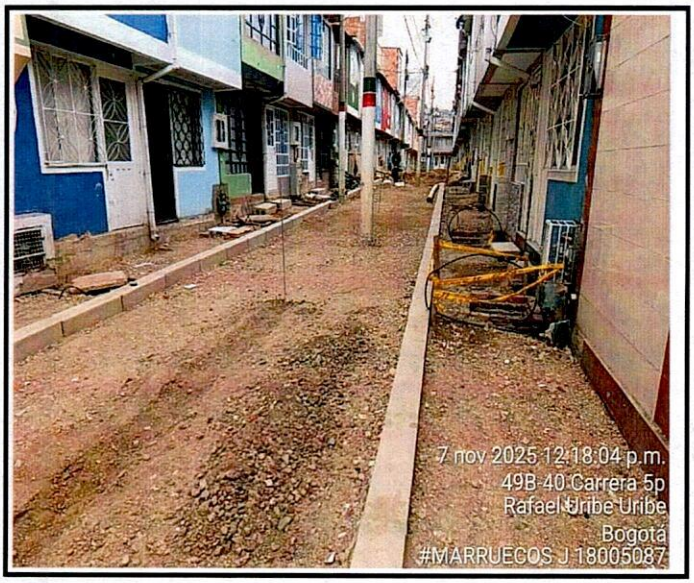




7 nov 2025 12:18:18 p.m.
49B-40 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARRUECOS J 18005087


7 nov 2025 12:18:32 p.m.
52 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARRUECOS J 18005087


Nov 4, 2025 2:05:26 PM
5N-40 Calle 49b Bis Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
MARRUECOS
CIV 18005027
SAN AGUSTIN
LA PIGOTA
Google

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO LA ESPERANZA

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DELA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.


COP 748 de 2024 FDLRUU

CONSORCIO VR RUU

Fotos de la intervencion

Calle 49B bis sur desde Carrera 5P hasta Carrea 5N CIV 18005094

ANTES

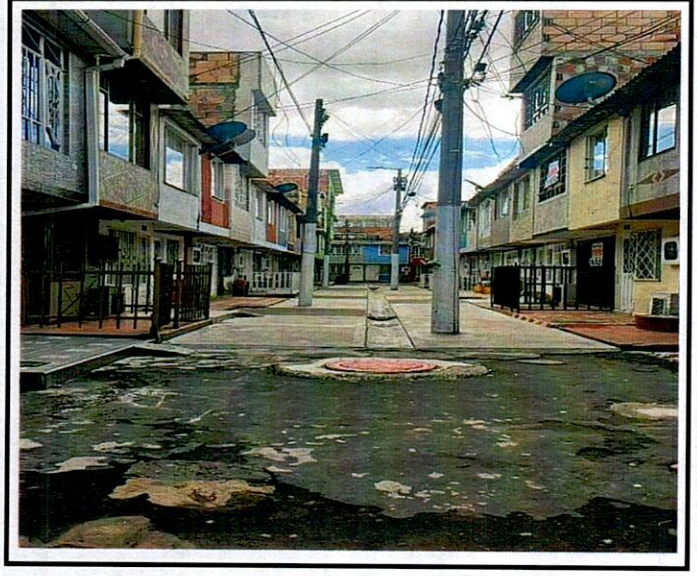



DURANTE






7 nov 2025 11:55:32 a.m.
49B-40 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARRUECOS W 18005094


7 nov 2025 11:55:41 a.m.
49B-40 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARRUECOS W 18005094


7 nov 2025 11:56:09 a.m.
5-72 Calle 49c Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARRUECOS W 18005094


Nov 5, 2025 10:59:19 AM
49B-40 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
MARRUECOS
CIV- 18005094
SAN AGUSTIN
LA PICOTA


Nov 5, 2025 10:59:19 AM
49B-40 Carrera 5p
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
MARRUECOS
CIV- 18005094
SAN AGUSTIN
LA PICOTA


Nov 4, 2025 4:22:32 PM
5-72 Calle 49c Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
MARRUECOS
CIV- 18005094
SAN AGUSTIN
LA PICOTA


Nov 4, 2025 8:03:05 AM
-5, -72 Calle 49c Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
MARRUECOS
CIV: 18005094
SAN AGUSTIN
LA PICOTA
Google

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO LA ESPERANZA

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DELA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

COP 748 de 2024 FDLRUU

CONSORCIO VR RUU

Fotos de la intervencion

Transversal 13G bis desde DG 46 sur hasta Diagonal 49A bis sur - CIV 18003049


ANTES





DURANTE




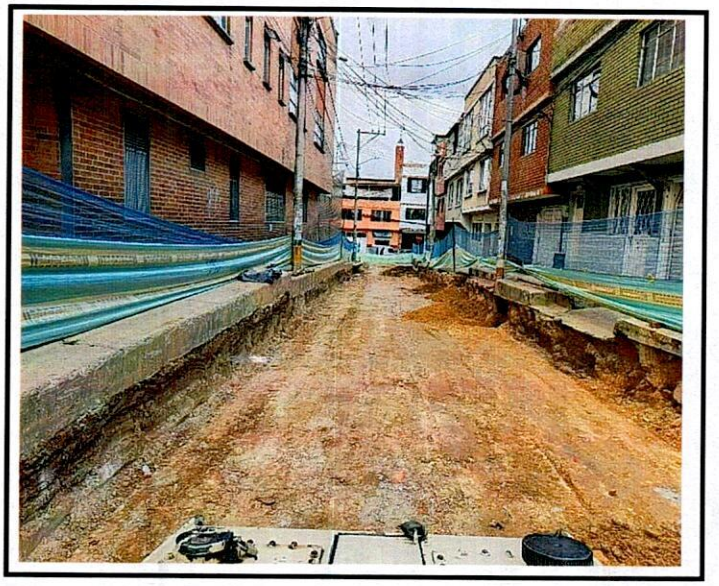




5 nov 2025 4:59:00 p.m.
46-16 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049


5 nov 2025 4:59:18 p.m.
46-20 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049

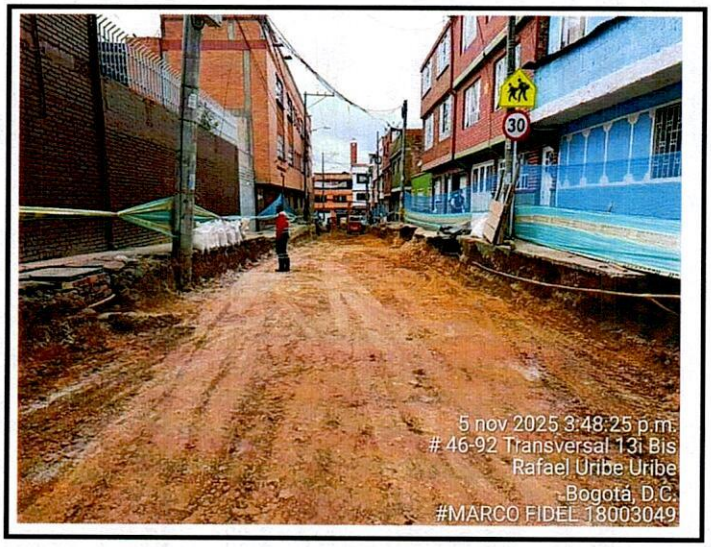
30
5 nov 2025 3:48:25 p.m.
46-92 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049






5 nov 2025 9:31:59 a.m.
46-86 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049


5 nov 2025 8:10:59 a.m.
49-19 Transversal 16d
Rafael Uribe Uribe
Bogotá
#MARCO FIDEL 18003049













10 nov 2025 8:18:48 a.m.
46-30 Transversal 131 Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049


Bobcat


Bobcat






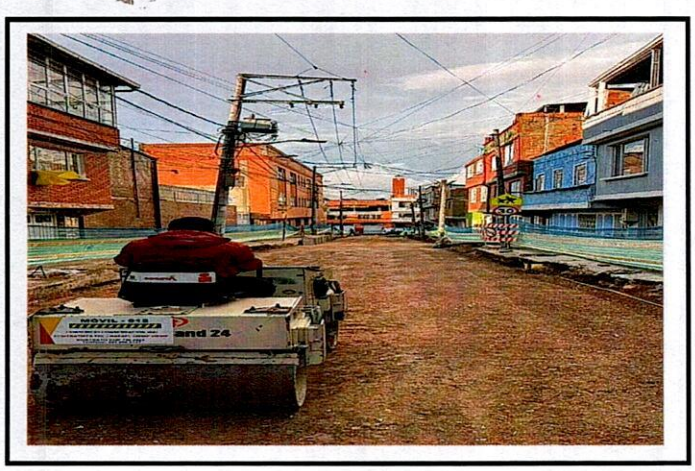







12 nov 2025 3:43:33 p.m.
46-92 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049

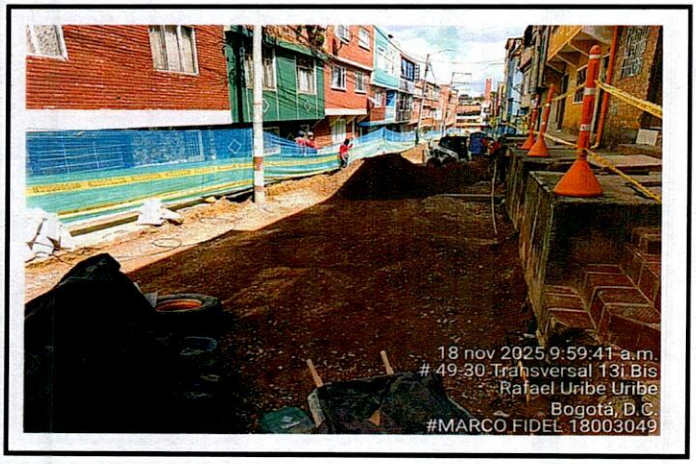
18 nov 2025 9:59:41 a.m.
49-30 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049

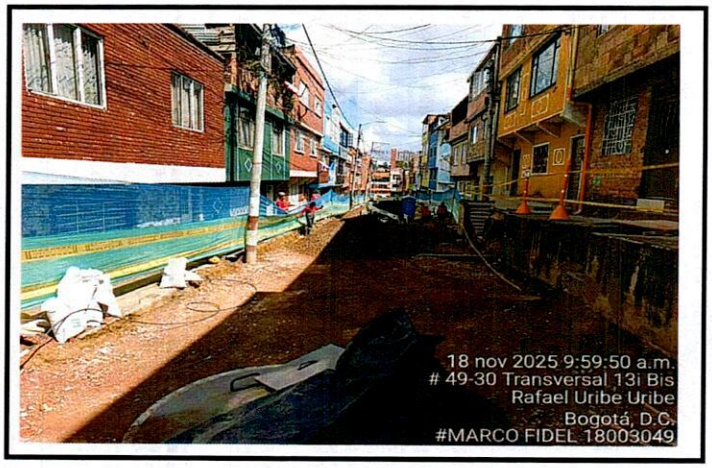
18 nov 2025 9:59:50 a.m.
49-30 Transversal 13i Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá, D.C.
#MARCO FIDEL 18003049

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO LA ESPERANZA

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DELA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

COP 748 de 2024 FDLRUU


CONSORCIO VR RUU

Fotos de la intervencion

Carrera 11 desde Calle 36A Bis sur hasta Calle 36B sur - CIV 18003163

ANTES



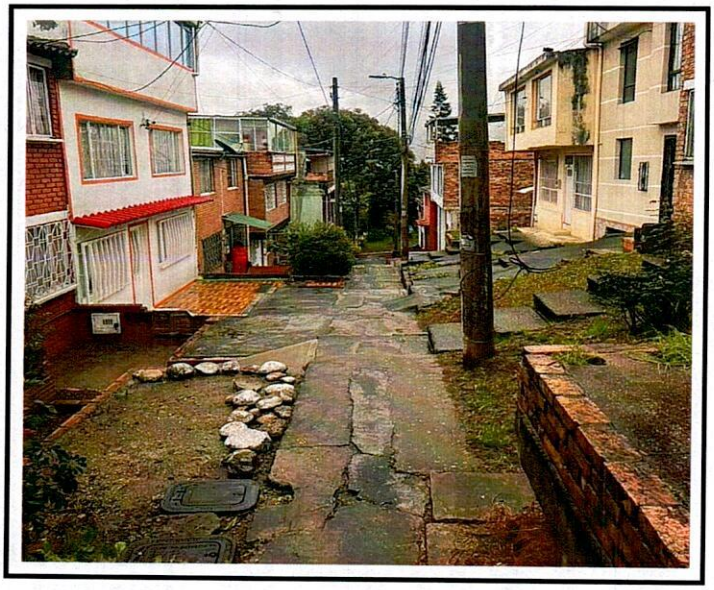

DURANTE





















ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO LA ESPERANZA

EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PUBLICO Y LOS PUENTES DELA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

COP 748 de 2024 FDLRUU

CONSORCIO VR RUU

Fotos de la intervencion


Carrera 13 desde calle 31F sur hasta calle 32 sur - CIV 18001971

ANTES







DURANTE

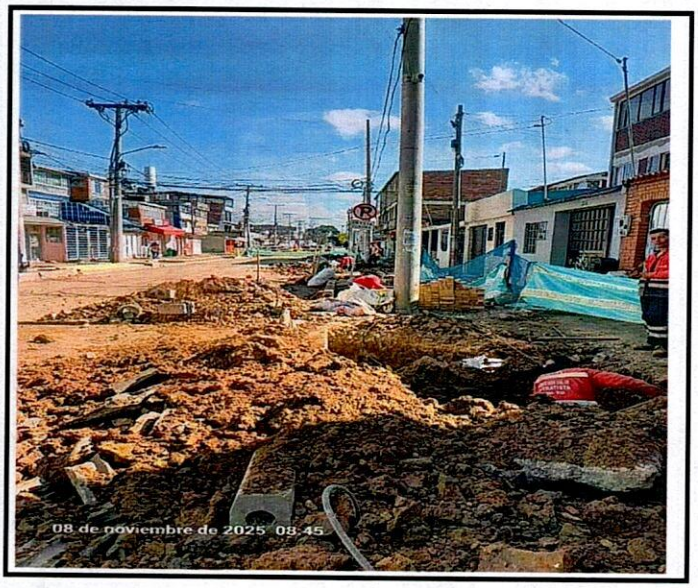

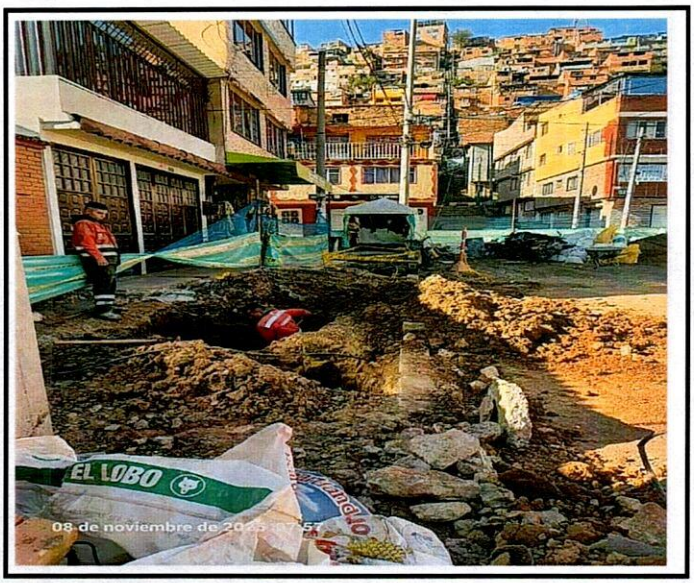


EL LOBO

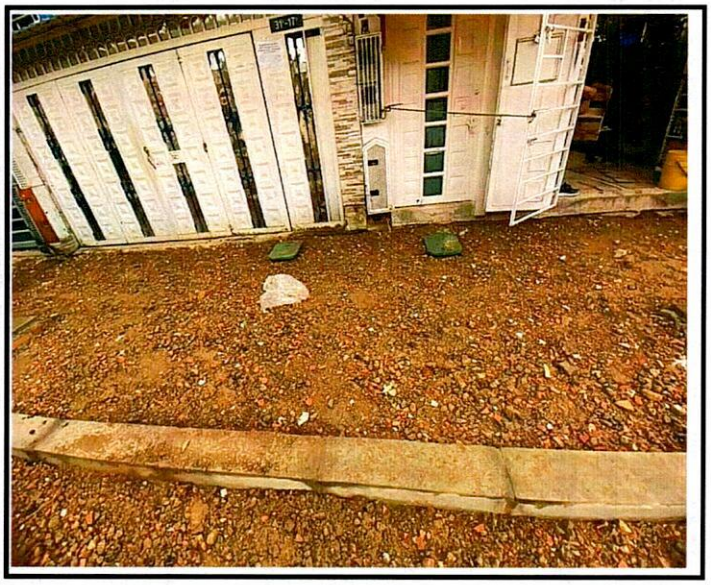
















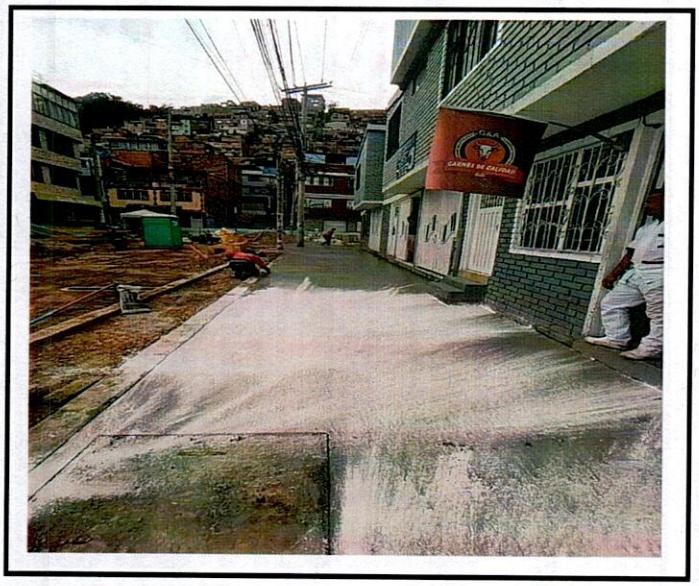


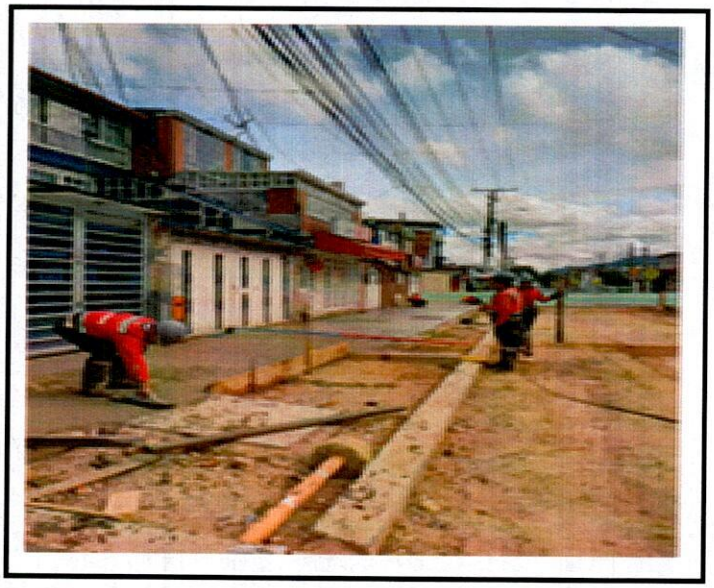





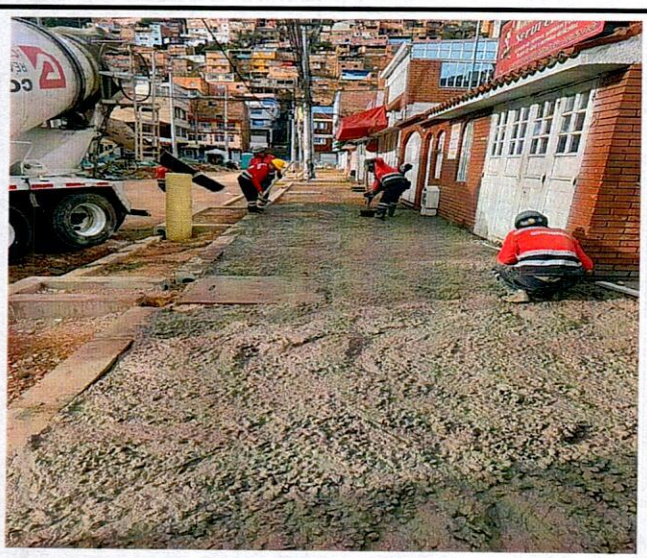

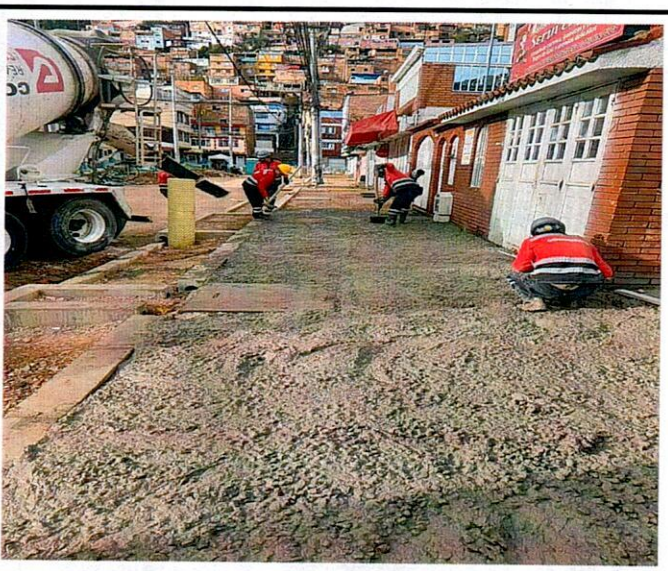

ANEXO 7.

BITÁCORAS DE OBRA.

Hospital de San Carlos

18001971

Scanned with CamScanner

01/11/2025	Actividad: se realiza Demolición manual de concreto en andon del costado derecho en el civ: 18001971 personal: 13 al 2 oficiales 3 Ayudantes 1 operador 1 Inspector SST 1 Topografo 1 Inspector obra maquinaria: 1 minicargador Res Infon
02/11/2025	Actividad: se realiza excavación manual para los cajas de Inspección en el costado derecho, se realiza demolición manual de concreto en andon en el civ: 18001971 personal: 1 Oficial 2 Ayudante 1 Inspector obra Res Infon
03/11/2025	Actividad: se realiza excavación manual para las cajas de Inspección en el costado derecho, se realiza demolición manual de concreto en andon en el civ: 18001971 personal: 1 oficial 3 Ayudantes 1 Inspector obra Res Infon

04/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual de onde del costado derecho, se realiza llenos de material pétreo de onden en el costado izquierdo en el civil 8001971
personal: 1 Boal
1 oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Res Interv

05/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual de anden del costado derecho, se realiza excavación manual para la instalación A-80 en el civil 8001971
personal: 1 Boal
1 oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Res Interv

06/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual de anden del costado derecho, se realiza Instalación de A-80 en el costado izquierdo en el civil 8001971
personal: 1 Boal
1 oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Res Interv

07/11/2025 Actividad: se realiza nivelación e instalación de castillos, se realiza nivelación de cajas de Inspección en el CIV: 18001971

personal: 1 Boal
1 Oficial
1 operador
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Maquinaria:
1 Minicargador

ARC

Res Interv

08/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual para cajas de Inspección en el costado derecho en el CIV: 18001971

personal: 1 Boal
1 Oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

ARC

Res Interv

10/11/2025 Actividad: se realiza Fundida en dado costado Izquierdo concreto PSI-3000 del K6+660-K6+660 en el CIV: 18001971

personal: 1 Boal
3 Oficiales
5 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Res Interv

ARC

Scanned with CamScanner

11/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual para cajas de Inspección, se realiza mampostería de cajas de Inspección en el costado derecho en el civil 800 la 71

personal: 1 Boal
1 oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 topografo
1 Inspector obra

Res Interv

12/11/2025 Actividad: se realiza excavación manual para cajas de Inspección, se realizo mampostería de cajas de Inspección en el costado derecho en el civil 800 la 71

personal: 1 Boal
1 oficial
4 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Topografo
1 Inspector obra

Res Interv

13/11/2025 Actividad: se realiza llenos de material recebo alrededor de las cajas de Inspección en el costado derecho en el civil 800 la 71

personal: 1 Boal
2 oficiales
4 Ayudantes
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Maquinaria:
1 Minicargador
Res Interv

14/11/2025 Actividad: se realiza, llenos de orden con material PÉT, se realiza manposteria de cajas de Inspección y llenos alrededor con recebo en el costado derecho, se realiza limpieza en el segmento vial en el civil 8001971

personal: 1 Boal
2 oficiales
5 Ayudantes
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Minicargador

ARC

Res Interv

15/11/2025 Actividad: se realiza llenos de orden con material PÉT, en el costado derecho en el civil 8001971

personal: 1 Boal
2 oficiales
2 Ayudantes
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Minicargador

ARC

Res Interv

16/11/2025 Actividad: se verifica niveles de sardinel para la reinstalación de sardinel a lo costado derecho en el civil 8001971

personal: 1 Boal
2 oficiales
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Res Interv

ARC

Scanned with CamScanner

19/11/2025 Actividad: Se realizo instalación de Bordillo 1-80 costado derecho en el civil 800 3179
Personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra
ARC
Res Inter

20/11/2025 Actividad: se realiza instalación y nivelación de cajas de inspección y de cajillos en el civil 800 3179
Personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra
ARC
Res Inter

21/11/2025 Actividad: Se realiza instalación y nivelación de cajas de Inspección y de cajillos en el civil 800 3179
Personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra
ARC
Res Inter V

22/11/2025 Actividad: Se realiza Fundida de concreto 3000 PSI en el ondén del costado derecho del Kot 000 - Kot 060

Scanned with CamScanner

en el civil 8003179
Personal: 1 Boal
5 Ayudantes
3 Oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra ADC
Res Interv

24/11/2025 Actividad: se realiza Fundido de orden concreto PSI-3000 en el costado derecho del Foto 60-Foto 60 en el civil 8003179
Personal: 1 Boal
5 Ayudantes
3 Oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra ADC
Res Interv

25/11/2025 Actividad: se realiza verificación de niveles para la nivelación de los pozos de los pozos residuales en el civil 8003179
Personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Maquinaria:
1 Mini cargador
ADC
Res Interv

26/11/2025 Actividad: se realiza cortes de empalme para asfalto se realiza verificación de niveles en el civil 8003179
personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra Arc
Res Interv

27/11/2025 Actividad: se realiza, jornada de orden, aseo y limpieza de todo el sesmento vial, se realiza imprimacion de lavia en el civil 8003179
personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra Arc
Res Interv

28/11/2025 Actividad: Se realiza inicio de remates de obra, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza de todo el sesmento vial en el civil 8003179
personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra Arc
Res Interv

Scanned with CamScanner

MARCO FIDEL SUAREZ

18003049

Scanned with CamScanner

Foto60 - foto75.

Personal: 1Boal — Clima: soleado
3Ayudante
2oficiales

31-10-25 se realiza limpieza de via excavacion entre la foto100 - Fot130 X 6,20, limpieza y cargue de excavacion max. 40cm.

Personal: 1Boal — Clima: soleado
3 Ayudantes
2oficial
1inspectortec
1inspectorsst

1-11-25 Se realiza limpieza de via compactacion y cerco de subrasante entre la Fot000 - Fot130.

Personal: 1Boal — clima: Soleado
2oficial
3 Ayudantes
2operadores
maquinaria: 1minicargador
1 vibrocompactador

Res Interv

2-11-25 Domingo Se realiza Perforacion para Barrenos de 1 metro de profundidad y lleno con cal entre la Fot000 - Fot060 en el total de la via.

Personal: 6 Ayudantes clima: soleado
1 Boal
1 inspector tec
1 operador
maquinaria: 1 minicargador

Res interv

3-11-25 Se continua con la perforacion para barrenos entre la koto60 - koto30 perforacion a 1 metro de profundidad y lleno con cal.

Personal: 1 Boal clima: soleado
6 Ayudantes
1 inspector tec
1 operador
Maquinaria: 1 minicargador

Res interv

4-11-25 Se continua con la demolicion de cajas y construccion de las mismas costado derecho entre la koto00 - koto30.

personal: 1 Boal clima: soleado
2 Ayudantes
2 oficial
maquinaria: 1 minicargador

Res interv

5-11-25 se realiza limpieza de via.

Personal: 1 Boal clima: soleado
2 oficial
3 Ayudantes

Res interv

18

6-11-25 Se continua con la construccion de cajas de inspeccion, construccion poco Km 1130.

Personal: 1 oficial clima: soleado
2 Ayudantes
1 Boal

Res Interv

7-11-25 Se continua con la construccion de cajas de inspeccion y construccion de poco

Personal: 1 oficial clima: soleado
2 ayudantes
1 Boal

Res interv

8-11-25 Se continua con la construccion de cajas de inspección limpieza, orden y aseo

Personal: 1 Boal clima: soleado
2 Ayudante
1 oficial

Res interv

9-11-25 Domingo

10-11-25 Se continua con la construccion de cajas de inspeccion y demolición de cajas, limpieza orden y aseo.

Personal: 1 Boal clima: soleado
1 oficial

Scanned with CamScanner

2 Ayudantes
1 operador
maquinaria: 1 minicargador

Res Interv

11-11-25 se da inicio a la instalacion de Geotextil, instalacion de Geocelda, instalacion de PeA, compactacion con vibrocompactador. entre la Km150 - Km160

Personal: 1 Boal clima: Soleado
1 insfectortec
1 oficial
3 Ayudantes
2 operador
maquinaria: 1 minicargador
1 vibrocompactador

Res interv

12-11-25 se continua con la instalación de Geotextil e instalacion de Geocelda e instalacion de PeA, compactacion y cereo de material. Km160 - Km000

Personal: 1 Boal clima: Soleado
1 oficial
1 insfectortec
3 Ayudantes
2 operador
maquinaria: 1 minicargador
1 vibro compactador

Res Interv

20

13-11-25 Se continua con la compactacion y el cereo de material sobre Geoceldа, limpieza orden y aseo, Ko+000 - Ko+130.

Personal: 1 Oficial
3 Ayudantes
1 Boal

Clima: Soleado

Res interv

14-11-25 Se continua con la compactacion y cereo de material sobre Geoceldа, limpieza orden y aseo entre la Ko+000 - Ko+130.

Personal: 1 Boal
1 Oficial
3 Ayudantes

Clima: soleado

Res interv

15-11-25 Se realiza limpieza, orden y aseo. (fundida de concreto MR45 via costado Derecho entre la Ko+000 - Ko+039, Amarre de ~~Pantillas~~ para refuerzo Pozos entre la Ko+000 - Ko+070.)

Personal: 3 Oficial
4 Ayudantes
1 Boal
1 inspectortec
1 inspectorsst

Clima: soleado mañana tarde 1:00pm en adelante lluvias

Res interv

16-11-25 Domingo

17-11-25 lunes festivo: Se realica instalacion de

estabilizado entre la Km000 - Km030, mezcla de materias con cemento y rostland, compactación.

Personal: 1Boal — Clima: soleado
2oficial
3Ayudantes
Maquinaria: 1minicargador
1vibrocompactador.
~~Ftt~~ Res Interv

8-11-25 Se continua con la compactacion de material estabilizado humectacion de material.

Personal: 1Boal — Clima: soleado
1oficial
3Ayudantes
2operadores
Maquinaria: 1minicargador
1vibrocompactador
~~Ftt~~ Res Interv

9-11-25 Se da inicio ala excavacion manual y a la instalacion de sardinel costado Derecho entre la Km0130 - Km0160.

Personal: 2oficial — Clima: soleado
1Boal
3Ayudantes
2operadores
Maquinaria: 1minicargador
1vibrocompactador
~~Ftt~~ Interv

20-11-25 Se continua con la excavacion manual y la instalacion de sardinel A10 entre la Km060-

Scanned with CamScanner

y la koto 30 costado Derecho

Personal: 1Boal clima: soleado
2oficial
3Ayudantes
1tratico
1inspectortec
2operadores
Maquinaria: 1minicargador
1vibrocompactador

Res Inter

21-11-25 Se continua con la excavacion manual para sardinel e instalacion del mismo costado derecho entre la kot030-kot000.

Personal: 2oficial clima: soleado
1Boal
3Ayudantes
1inspetortec

Res Inter

22-11-25 se continua con la instalacion de sardinel costado Derecho e instalacion Bajo Rampa A85 entre la kot000-kot030.

Personal: 1Boal clima: soleado
2oficial
1inspector
3Ayudantes
1inspectortec
1inspectorsst

Res Inter

Scanned with CamScanner

23-11-25 Domingo

24-11-25 Se continua con la instalacion de sardinel costado izquierdo entre la Koto00 - Koto30, excavacion manual para instalacion del mismo.

Personal: 2oficial — clima: soleado
3Ayudantes
1Boal
1inspector tec
Res Interv

25-11-25 Se continua con la excavacion para instalacion sardinel e instalacion de sardinel entre la Koto30 - Koto45.

Personal: 2oficial — Clima: soleado
3Ayudantes
1Boal
1inspector tec
Res Interv

26-11-25 Se continua con la excavacion para instalacion sardinel e instalacion sardinel entre la Koto45 - Koto65.

Personal: 1Boal — clima: soleado
2oficial
3Ayudantes
1inspector tec
Res Interv

27-11-25 se continua con la excavacion e instalacion

de sardinel costado izquierdo entre la foto 6 y foto 75.

Personal: 1Boal clima: soleado
1oficial
3Ayudantes
1inspectorsst
1inspectortec

Res interv

28-11-25 Se continua con la excavacion de sardinel e instalacion de sardinel costado izquierdo.

Personal: 1Boal clima: soleado
1oficial
3Ayudantes
1inspectortec
1inspectorsst

Res interv

29-11-25 Se continua con la excavacion para instalacion de sardinel costado izquierdo e instalacion de sardinel.

Personal: 1Boal clima: soleado
1oficial
3Ayudantes
1inspectortec
1inspectorsst

Res interv

30-11-25 Domingo.

Scanned with CamScanner
