CONSORCIO CONDE PG

901.601.347-8

Correspondencia Despachada	
Consecutivo:	D-29
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO CONDE PG
Fecha de Radicación:	12/11/2025-08:58 AM
Asunto:	ENTREGA DE DOCUMENTACION ACTA DE RECIBO PARCIAL N.10
Anexos:	DIGITAL
Documento:	SOCIAL
Destinatarios Externos:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER-(SAN GIL)

D-29-2025-40

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL
Atn.: Edgar Orlando Pinzón Rojas
Alcalde Municipal

REFERENCIA: COP-004-2022 *"CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"*

Asunto: Entrega de documentación de acta de recibo parcial No 10.

Respetados señores,

Por medio del presente comunicado se entrega la siguiente información para el trámite correspondiente para el acta de recibo parcial No 10, una vez revisado por parte de la interventoría.

- Formato F12 ORGANIZACIÓN CUENTA DE COBRO CONTRATO DE OBRAS
- CERTIFICACION CUENTA BANCARIA Del CONSORCIO CONDE PG
- FACTURA ORIGINAL
- Formato F29 ACTA PAGO PARCIAL O FINAL #10
- Formato F56 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #10
- Formato F59 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #10
- MEMORIAS FIRMADAS POR INTERVENTORIA Y CONTRATISTA CON SUS DEBIDOS SOPORTES
- RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA (ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO)
- INFORME PARCIAL DEL INTERVENTOR
- Formato F53 INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR
- CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR – (APORTES DE SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES Y RECIBIDO A SATISFACION)
- SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO
- COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES
- PAGOS AL FIC

Cordialmente,

Luis Orlando Pulido García
Representante
CONSORCIO CONDE PG

DAIMCO
NIT: 900021482 - 1

20 AÑOS ANIVERSARIO

PSG-FINDETER-2022-165

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL
Atn, Dr. Edgar Orlando Pinzón Rojas
Alcalde municipal
San Gil (Santander)

Referencia. Contrato de Obra No. COP 004-2022 cuyo objeto es: "Construcción de patinódromo el Conde de Cuchicute en el municipio de San Gil".

Asunto. Remisión Acta de Recibo Parcial No. 10 – Contrato de Obra COP 004-2022.

Respetados señores,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y una vez revisada la documentación remitida por el Contratista de Obra, nos permitimos remitir el Acta Parcial de Obra No. 10 del contrato de la referencia, debidamente suscrita por esta interventoría.

Es pertinente señalar que el valor avalado corresponde a $ 666.342.845,00

Los documentos deben ser descargados del siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1vPkoCVs3TfbOMN1DcgdyM09fDA9wcYdP?usp=sharing

Lo anterior, para su información y trámites pertinentes.

Cordialmente,

José Vicente Bocanegra García
Gerente Técnico
DAIMCO S.A.S.
Tel: 3145427944
jbocanegra@daimco.com.co

Anexos	Lo enunciado	
Elaboró	Ing. Julissa Orozco - Coordinadora de proyectos de interventoría	
Copia 1.	Archivo del contrato	
Copia 2.	Luis Carlos Buitrago Núñez – Secretario de Control Urbano e Infraestructura – Municipio de San Gil	
Copia 3.	Luis Orlando Pulido – Representante Legal Consorcio Conde PG – Contratista de Obra – Av. Cra 19 No. 95-12/20, oficina 605, Bogotá D.C.	

CONSORCIO CONDE PG

901.601.347-8

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2025

Correspondencia Despachada	
Consecutivo:	D-28
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO CONDE PG
Fecha de Radicación:	02/10/2025-11:56 AM
Asunto:	ENTREGA DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.10
Anexos:	DIGITAL
Documento:	TECNICO
Destinatarios Externos:	DAIMCO-(BARRANQUILLA)

D-28-2025-40

Señores
DAIMCO S.A.S.
Atn.: Sheiry Charin Dahjer Herrera
Representante Legal
Carrera 44B No. 57ª-52
Bogotá D.C.

REFERENCIA: COP-004-2022 *"CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"*

Asunto: Entrega de documentación de acta de recibo parcial No 10.

Respetados señores,

Por medio del presente comunicado se entrega la siguiente información para el trámite correspondiente para el acta de recibo parcial No 10, en donde se adjunta los siguientes documentos para revisión, aprobación.

- Formato F29 ACTA PAGO PARCIAL O FINAL #10
- Formato F56 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #10
- Formato F59 ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA #10
- Memorias del acta parcial #10 firmada
- Certificación Parafiscales y Seguridad Social

Cordialmente,

Luis Orlando Pulido García
Representante Legal
CONSORCIO CONDE PG

Bancolombia

Bogotá, 25 de junio de 2024

Señores:
A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO CONDE PG** identificado con Nit. **901601347** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha apertura
CUENTA AHORROS	69000004477	2022/08/30

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4886000 extensión 14241 de Bogotá, Av. Cra 11 N. 91 42 EDIFICIO FIC 9211.

Marily Castillo Jimenez
Asesor comercial

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14940240251

(415)7707212489984(8020) 000001494024025 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 1 3 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONDE PG

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 19 95 12 20 OF 605

42. Correo electrónico facturacion@promotorapuga.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 3 2 7 9 0 3	6 0 1 4 3 2 7 8 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 0 4					

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	5	2	5	5																		

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-02-2025 12:00:14PM

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764095019259

(415)7707212489984(8020) 001876409501925 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 0 1 3 4 7	8				

11. Razón social
CONSORCIO CONDE PG

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AK 19 95 12 20 OF 605

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-07-01 / 08:40:00 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79554518 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONDE PG

997. Fecha formalización 2025-07-01 08:40:00

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764095019259

(415)7707212489984(8020) 001876409501925 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9016013478					

11. Razón social: CONSORCIO CONDE PG

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONDE PG AK 19 95 12 20 OF 605	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	17	20	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO CONDE PG

NIT 901.601.347-8

Av Cra 19 95 20 of 605
(601) 4327903
Bogotá - Colombia
contabilidad@promciviles.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: FVE 19

Cliente: MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 800.099.824-1
Teléfono: (607) 7242179 - Ext. 000
Dirección: CLL 12 9 51
Ciudad: San Gil - Colombia
Correo: ventanillaunica@sangil.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	07/11/2025, 11:44
Expedición	07/11/2025, 11:44
Vencimiento	06/12/2025
Vendedor	CONSORCIO CONDE PG
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 10 CONTRATO DE OBRA N° 004-2022 PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANT	1.00	512,571,419.00
2	COSTO INDIRECTO (A.I.U. 30%)	1.00	153,771,426.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 666,342,845.00

Total Bruto	**666,342,845.00**
Total a Pagar	**666,342,845.00**

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 004-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER"

CONSORCIO CONDE PG
Conformado por:
PROMCIVILES SAS NIT 901.001.320-5 70%
PROMOTORA PUGA LTDA NIT 830.024.796-9 30%

Consignación en BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS
690-000044-77

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095019259 aprobado en 20250701 prefijo FVE desde el número 17 al 20 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
e4ba65306d4829d3338f15b9adaff3403df472eedce719d7f05ea6109c5feab16802732fd408cc50a7edc4f2e40d8b65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE PAGO 10 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº COP-004 DE 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: CONSORCIO CONDE PG

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER".

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$8.489.904.592,00	
VALOR ADICIONAL 1	$1.131.214.940,00	
VALOR ADICIONAL 2	$1.680.708.541,28	
VALOR ADICIONAL 3	$1.680.708.541,28	
VALOR ADICIONAL 4	$ 686.623.436,35	
VALOR TOTAL	$13.669.160.050,91	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO		CINCO (05) DE JUNIO 2023
PLAZO DE PRORROGA #01		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #02		DOCE (12) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #03		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO DE PRORROGA #04		CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #05		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO DE PRORROGA #06		TRENITA Y CINCO (35) DÍAS
PLAZO DE PRORROGA #07		CIENTO CINCO (105) DÍAS
PLAZO DE SUSPENSION #01		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #01		QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #01		TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #01		TREINTA Y DOS (32) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #01		TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #01		NUEVE (09) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #06 DE SUSPENSION #01		DIECIOCHO (18) DIAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #01		TRECE (13) DE DICIEMBRE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO		(21) VEINTIUN MESES Y (1) UN DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #02		TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #02		VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #02		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #02		CATORCE (14) DIAS

FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #02		CINCO (05) DE MAYO 2025
PLAZO DE SUSPENSION #03		VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #03		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #03		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #03		DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #03		QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #03		DOCE (12) DIAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #03		VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		CUATRO (4) DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA		DIESEIS (16) DE DICIEMBRE 2025

En San Gil – Santander a los 21 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, el Ing. **JUAN GABRIEL GONZALEZ BARRAGÁN** , secretario de control urbano e Infraestructura en calidad de **supervisor** del contrato, la empresa interventora **DAIMCO S.A.S**, Gerente Técnico por **JOSE VICENTE BOCANEGRA y** el **CONSORCIO CONDE PG**, representante por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA,** en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO N. 10** del Contrato de obra pública No. COP-004 de 2022, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades de los periodos correspondiente del veintiséis (26) de agosto al treinta (30) de septiembre de 2025, existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL No. 10 es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 8,489,904,592.00	- - -
VALOR ADICIONAL #01	$ 1,131,214,940.00	- - -
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #03	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #04	$ 686,623,436.35	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 11,428,034,685.00
VALOR ACTA N.10	- - -	$ 666,342,845.00

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 1,574,782,520.91
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 13,669,160,050.91	$ 13,669,160,050.91

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4301.4301004 – ADN	$ 666,342,845.00

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

1. **PRIMERO:** Cancelar al contratista **CONSORCIO CONDE PG,** identificado con NIT No. 901.601.347-8, la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 666.342.845).** Que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

CONSORCIO CONDE PG
Representante
Luis Orlando Pulido García
Contratista

DAIMCO S.A.S
Gerente Técnico
José Vicente Bocanegra
Interventoría

Ing. Juan Gabriel González Barragán
Supervisor Municipio de San Gil.

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 10	F:56.AP.GC VERSIÓN: 0.3 FECHA: 19.12.24

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
CONTRATISTA	CONSORCIO CONDE PG
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER
VALOR	OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE **($8.489.904.592)**
VALOR ADICIONAL 1	MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($1.131.214.940)**
VALOR ADICIONAL 2	MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($1.680.708.541,28)**
VALOR ADICIONAL 3	MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE **($1.680.708.541,28)**
VALOR ADICIONAL 4	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($686.623.436,35)**
VALOR TOTAL	TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CINCUENTA CON NOVENTA Y UNCENTAVOS M/CTE **($13.669.160.050,91)**
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
INTERVENTOR	DAIMCO S.A.S
SUPERVISOR	JUAN GABRIEL GONZALEZ BARRAGÁN
PLAZO INICIAL	(7) SIETE MESES
PLAZO DE PRORROGA #01	(2) DOS MESES Y (15) QUINCE DIAS
PLAZO DE PRORROGA #02	(12) DOCE DIAS
PLAZO DE PRORROGA #03	(75) SETENTA Y CINCO DIAS
PLAZO DE PRORROGA #04	(44) CUARENTA Y CUATRO DIAS
PLAZO DE PRORROGA #05	(75) SETENTA Y CINCO DIAS
PLAZO DE PRORROGA #06	(35) TREINTA Y CINCO DÍAS
PLAZO DE PRORROGA #07	(105) CIENTO CINCO DÍAS
PLAZO DE SUSPENSION #01	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #01	(15) QUINCE DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #01	(30) TREINTA DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #01	(32) TREINTA Y DOS DIAS

PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #01	(30) TREINTA DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #01	(09) NUEVE DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #06 DE SUSPENSION #01	(18) DIECIOCHO DIAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #01	13 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO DE SUSPENSION #02	(30) TREINTA DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #02	VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #02	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #03	CATORCE (14) DIAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #02	CINCO (05) DE MAYO 2025
PLAZO DE SUSPENSION #03	VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #01 DE SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #02 DE SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #03 DE SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #04 DE SUSPENSION #03	QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION #05 DE SUSPENSION #03	DOCE (12) DIAS
FECHA DE REINICIO DE LA SUSPENSION #03	VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO 2025
PLAZO ACTUALIZADO	(21) VEINTIUNO MESES Y (01) UN DIAS
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	DIECISÉIS(16) DE DICIEMBRE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430201 2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430203 2.3.2.01.01.001.03.13.01.21.2102.210202

En San Gil – Santander a los 21 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, la empresa interventora **DAIMCO S.A.S** con Nit **900021482-1**, Gerente Técnico por **JOSE VICENTE BOCANEGRA**, el **Ing. JUAN GABRIEL GONZALEZ BARRAGÁN** Secretario de control urbano e Infraestructura municipal de San Gil, supervisor

del contrato y el **CONSORCIO CONDE PG** con NIT **901.601.347-8**, representante por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA**, con el fin de suscribir la presente Acta de pago y recibo 10 del contrato de obra pública N° COP-004-2022, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Se ha verificado por el Supervisor el cumplimiento del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.
2. Que el contratista ha presentado informe de actividades y del mismo es certificado por el supervisor y/o interventor para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del objeto.

CONSIDERANDO

1. Que el **MUNICIPIO DE SAN GIL** y **LUIS ORLANDO PULIDO,** representante legal de **CONSORCIO CONDE PG** celebraron un contrato de obra cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER**".
2. Que a la fecha el contratista presenta un avance del **88.48%**, donde se hace constar que el presente contrato ha sido ejecutado a satisfacción del Municipio de San Gil -Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo cuadro de cantidades (F:59. AP.GC *ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL CONTRATO DE OBRA N° 10)* el cual hace parte integral de la presente acta.
3. Que el balance financiero se describe a continuación

RELACION Y BALANCE

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 8,489,904,592.00	- - -
VALOR ADICIONAL #01	$ 1,131,214,940.00	- - -
VALOR ADICIONAL #02	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #03	$ 1,680,708,541.28	
VALOR ADICIONAL #04	$ 686,623,436.35	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 11,428,034,685.00
VALOR ACTA N.10	- - -	$ 666,342,845.00
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 1,574,782,520.91
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 13,669,160,050.91	$ 13,669,160,050.91

ACORDAMOS

1. Autorizar el pago del acta de Recibo 10 de obra, por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 666.342.845).**

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

CONSORCIO CONDE PG
Representante
Ing Luis Orlando Pulido García
Contratista

TAIMCO S.A.S
Gerente Técnico
Ing José Vicente Bocanegra
Interventoría

Ing. Juan Gabriel González Barragán
Supervisor Municipio de San Gil.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59,AP,GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,669,160,050.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.46%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
100		PRELIMINARES													
101		Descapote manual en terreno comun, hasta exp .30 mt	M2	17,267.51	$ 3,636.00	$ 62,784,666.00	16,134.74	$ 3,636.00	58,665,914.64	0.00	$ -	16,134.74	$ 58,665,914.64	0.00	$ -
102		Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografia)	M2	17,267.51	$ 2,190.00	$ 37,815,847.00	17,267.51	$ 2,190.00	37,815,846.90	0.00	$ -	17,267.51	$ 37,815,846.90	0.00	$ -
103		Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO)	M3	218.71	$ 40,413.00	$ 8,838,727.00	264.10	$ 40,413.00	10,673,073.30	31.25	$ 1,262,906.25	263.12	$ 10,633,468.56	0.98	$ 39,604.74
200		ADECUACIÓN DEL PREDIO													
201		Excavación a máquina sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	17,701.20	$ 10,596.00	$ 187,561,915.00	30,245.34	$ 10,596.00	320,479,622.64	0.00	$ -	30,245.34	$ 320,479,622.64	0.00	$ -
202		Relleno compactado con material común	M3	13,487.30	$ 31,126.00	$ 419,805,700.00	28,815.14	$ 31,126.00	896,900,047.64	0.00	$ -	28,815.14	$ 896,900,047.64	0.00	$ -
203		Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	247.98	$ 66,503.00	$ 16,491,414.00	0.00	$ 66,503.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
204		excavacion en roca sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	1,966.80	$ 92,367.00	$ 181,667,416.00	9,574.37	$ 92,367.00	884,355,633.79	0.00	$ -	9,574.37	$ 884,355,633.79	0.00	$ -
205		Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	6,399.41	$ 33,220.00	$ 212,588,400.00	17,164.96	$ 33,220.00	570,219,971.20	0.00	$ -	17,164.96	$ 570,219,971.20	0.00	$ -
400		CIMENTACIONES													
401		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	26.93	$ 643,882.00	$ 17,339,742.00	29.85	$ 643,882.00	19,219,877.70	9.10	$ 5,859,326.20	29.85	$ 19,219,877.70	0.00	$ -
402		Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	46.36	$ 477,668.00	$ 22,145,616.00	63.25	$ 477,668.00	30,213,766.00	16.90	$ 8,072,927.20	63.25	$ 30,213,766.00	0.00	$ -
403		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	53.80	$ 707,136.00	$ 38,043,917.00	53.15	$ 707,136.00	37,584,278.40	12.43	$ 8,789,700.48	54.52	$ 38,553,054.72	-1.37	-$ 968,776.32
404		Suministro y Colocación de Base Granular	M3	32.06	$ 142,365.00	$ 4,564,222.00	26.46	$ 142,365.00	3,766,977.90	0.00	$ -	0.00	$ -	26.46	$ 3,766,977.90
405		Perfilacion y nivelacion de subrasante para la pista de patinaje de ruta, pista de escuelas, zona de egilizacion, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y nivelacion de la subrasante a maquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.	M2	6,485.12	$ 12,116.00	$ 78,573,714.00	6,405.48	$ 12,116.00	77,608,795.68	0.00	$ -	6,405.48	$ 77,608,795.68	0.00	$ -
406		Geotextil no tejido suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia nt 1600 o equivalente para conformación de filtros, incluye traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	M2	402.00	$ 12,685.00	$ 5,099,370.00	7322.11	$ 12,685.00	92,860,965.35	0.00	$ -	7,322.11	$ 92,860,965.35	0.00	$ -
500		INSTALACIONES SANITARIAS													
501		Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de f'c=3,000psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	20.00	$ 303,744.00	$ 6,074,880.00	55.00	$ 303,744.00	16,705,920.00	0.00	$ -	45.00	$ 13,668,480.00	10.00	$ 3,037,440.00
502		Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	37.00	$ 44,050.00	$ 1,629,850.00	30.00	$ 44,050.00	1,321,500.00	0.00	$ -	19.00	$ 836,950.00	11.00	$ 484,550.00
503		Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	40.00	$ 20,404.00	$ 816,160.00	50.00	$ 20,404.00	1,020,200.00	0.00	$ -	24.00	$ 489,696.00	26.00	$ 530,504.00
504		Red sanitaria pvc 6- incl. excavacion y tape	ML	289.10	$ 91,316.00	$ 26,399,456.00	362.52	$ 91,316.00	33,103,876.32	0.00	$ -	362.52	$ 33,103,876.32	0.00	$ -
505		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 200 mm	ML	120.00	$ 110,124.00	$ 13,214,880.00	0.00	$ 110,124.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
506		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 250 mm	ML	60.00	$ 123,817.00	$ 7,429,020.00	257.06	$ 123,817.00	31,828,398.02	0.00	$ -	257.06	$ 31,828,398.02	0.00	$ -
507		Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	100.00	$ 44,050.00	$ 4,405,000.00	174.51	$ 44,050.00	7,687,165.50	0.00	$ -	102.51	$ 4,515,565.50	72.00	$ 3,171,600.00
508		Bajante aguas lluvias pvc	ML	13.00	$ 49,857.00	$ 648,141.00	37.00	$ 49,857.00	1,844,709.00	0.00	$ -	13.00	$ 648,141.00	24.00	$ 1,196,568.00
509		Suministro y colocación Lavamanos (Inc Griferia)	UND	2.00	$ 27,202.00	$ 54,404.00	0.00	$ 27,202.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
510		Suministro y colocación Sanitario (Inc Griferia)	UND	35.00	$ 380,037.00	$ 13,301,295.00	33.00	$ 380,037.00	12,541,221.00	0.00	$ -	21.00	$ 7,980,777.00	12.00	$ 4,560,444.00
511		Orinal corrido en Mamposteria	ML	8.00	$ 38,399.00	$ 307,192.00	0.00	$ 38,399.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
512		Barras de seguridad, para minusvalidos long. .45ml, acabado cromado en acero inoxidable	UND	4.00	$ 298,362.00	$ 1,193,448.00	6.00	$ 298,362.00	1,790,172.00	0.00	$ -	4.00	$ 1,193,448.00	2.00	$ 596,724.00
513		Sanitario blanco o similar	UND	2.00	$ 493,326.00	$ 986,652.00	3.00	$ 493,326.00	1,479,978.00	0.00	$ -	2.00	$ 986,652.00	1.00	$ 493,326.00
514		Llave control de 1/2"-red white o similar	UND	2.00	$ 72,876.00	$ 145,752.00	0.00	$ 72,876.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
515		Griferia llave automatica para lavamanos	UND	22.00	$ 269,282.00	$ 5,924,204.00	16.00	$ 269,282.00	4,308,512.00	0.00	$ -	8.00	$ 2,154,256.00	8.00	$ 2,154,256.00
516		Rejillas sosco 3x 2	UND	23.00	$ 12,177.00	$ 280,071.00	30.00	$ 12,177.00	365,310.00	0.00	$ -	14.00	$ 170,478.00	16.00	$ 194,832.00
517		Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, gancho	UND	4.00	$ 82,705.00	$ 330,820.00	0.00	$ 82,705.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
518		Ducha sencilla	UND	4.00	$ 65,316.00	$ 261,264.00	0.00	$ 65,316.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
519		Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.)incluye salpicadero y acabado frontal	ML	14.00	$ 197,992.00	$ 2,771,888.00	14.00	$ 197,992.00	2,771,888.00	0.00	$ -	7.00	$ 1,385,944.00	7.00	$ 1,385,944.00
520		Lavamanos de pedestal blanco	UND	2.00	$ 348,941.00	$ 697,882.00	6.00	$ 348,941.00	2,093,646.00	0.00	$ -	2.00	$ 697,882.00	4.00	$ 1,395,764.00
521		Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela	ML	35.00	$ 16,950.00	$ 593,250.00	94.83	$ 16,950.00	1,607,368.50	0.00	$ -	34.83	$ 590,368.50	60.00	$ 1,017,000.00
522		Rejilla cucula	UND	10.00	$ 66,605.00	$ 666,050.00	8.00	$ 66,605.00	532,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 532,840.00
523		Punto reventilacion de 2 plg	UND	2.00	$ 38,914.00	$ 77,828.00	4.00	$ 38,914.00	155,656.00	0.00	$ -	2.00	$ 77,828.00	2.00	$ 77,828.00
524		Punto Hidráulico en tubería PVC 1 = 1/2"	UND	28.00	$ 43,232.00	$ 1,210,496.00	22.00	$ 43,232.00	951,104.00	0.00	$ -	10.00	$ 432,320.00	12.00	$ 518,784.00
525		Bases en concreto reforzado para mastiles de iluminacion (no incluye refuerzo)	UND	5.00	$ 8,598,601.00	$ 42,993,005.00	18.00	$ 8,598,601.00	154,774,818.00	0.00	$ -	18.00	$ 154,774,818.00	0.00	$ -
526		Llave control de 1 1/2 plg	UND	6.00	$ 229,523.00	$ 1,377,138.00	3.00	$ 229,523.00	688,569.00	0.00	$ -	2.00	$ 459,046.00	1.00	$ 229,523.00
527		Tuberia pvc presion 1" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 17,048.00	$ 1,704,800.00	52.47	$ 17,048.00	894,508.56	0.00	$ -	22.47	$ 383,068.56	30.00	$ 511,440.00
528		Punto hidraulico de 1 1/2"	PTO	51.00	$ 62,352.00	$ 3,179,952.00	0.00	$ 62,352.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
529		Tuberia pvc presion 1 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	100.00	$ 31,022.00	$ 3,102,200.00	16.27	$ 31,022.00	504,727.94	0.00	$ -	16.27	$ 504,727.94	0.00	$ -
530		Tuberia pvc presion 2 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	235.00	$ 64,174.00	$ 15,080,890.00	0.00	$ 64,174.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
531		Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	20.00	$ 13,769.00	$ 275,380.00	28.40	$ 13,769.00	391,039.60	0.00	$ -	7.40	$ 101,890.60	21.00	$ 289,149.00
532		Suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable	UND	1.00	$ 21,510,946.00	$ 21,510,946.00	0.00	$ 21,510,946.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,655,169,050.51	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.48%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
533		Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal 16, incluye acabado	ML	61.00	$ 305,559.00	$ 18,639,099.00	71.60	$ 305,559.00	21,939,136.20	0.00	$ -	71.60	$ 21,939,136.20	0.00	$ -
534		Pozo septico 40 m3	UND	1.00	$ 56,996,608.00	$ 56,996,608.00	1.00	$ 56,996,608.00	56,996,608.00	0.00	$ -	1.00	$ 56,996,608.00	0.00	$ -
600		MUROS Y PAÑETES													
601		Sobrecimiente espesor 0.25 ladrillo comun .07x.11x.22 mortero de pega 1:4, pañetado por 3 caras mortero imp. 1:4 - altura promedio .45	ML	250.00	$ 89,315.00	$ 22,328,750.00	0.00	$ 89,315.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
602		Muro sencillo con ladrillo h-10	M2	298.68	$ 47,399.00	$ 14,157,133.00	297.50	$ 47,399.00	14,101,202.50	0.00	$ -	0.00	$ -	297.50	$ 14,101,202.50
603		Muro sencillo con ladrillo h-15	M2	818.67	$ 49,341.00	$ 40,393,996.00	334.94	$ 49,341.00	16,526,274.54	0.00	$ -	334.94	$ 16,526,274.54	0.00	$ -
604		Pañete de muros	ML	252.65	$ 14,455.00	$ 3,652,056.00	36.00	$ 14,455.00	520,380.00	0.00	$ -	13.20	$ 190,806.00	22.80	$ 329,574.00
605		Friso liso sobre muro (inc dilataciones)	M2	1,283.27	$ 21,184.00	$ 26,761,112.00	616.77	$ 21,184.00	13,065,655.68	0.00	$ -	363.93	$ 7,709,493.12	252.84	$ 5,356,162.56
606		Cielero en mortero 1:4	ML	59.00	$ 11,840.00	$ 698,560.00	77.06	$ 11,840.00	912,390.40	0.00	$ -	0.00	$ -	77.06	$ 912,390.40
607		Vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	ML	1,260.00	$ 15,825.00	$ 19,939,500.00	36.00	$ 15,825.00	569,700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	36.00	$ 569,700.00
700		ESTRUCTURAS													
701		columnas en concreto 3.000 psi.	M3	23.70	$ 732,242.00	$ 17,354,135.00	18.52	$ 732,242.00	13,561,121.84	6.91	$ 5,059,792.22	18.52	$ 13,561,121.84	0.00	$ -
702		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms	M2	265.00	$ 210,556.00	$ 55,797,340.00	164.50	$ 210,556.00	34,636,462.00	164.50	$ 34,636,462.00	164.50	$ 34,636,462.00	0.00	$ -
703		Bancas en concreto h:07 x .50 de ancho	ML	30.00	$ 121,158.00	$ 3,634,740.00	33.00	$ 121,158.00	3,998,214.00	0.00	$ -	20.45	$ 2,477,681.10	12.55	$ 1,520,532.90
704		Acero de refuerzo PDR - 60	KG	25,000.00	$ 7,399.00	$ 184,975,000.00	74,842.20	$ 7,399.00	553,757,437.80	5,826.51	$ 43,110,347.49	74,157.71	$ 548,692,896.29	684.49	$ 5,064,541.51
705		Acero tipo electromalla suministro e instalación de acero tipo electromalla 70.000 psi (483 mpa). incluye: corte, figurada y armada.	KG	1,300.00	$ 12,843.00	$ 16,695,900.00	0.00	$ 12,843.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
706		Placa maciza para gradas .13 x .80 concreto 3.000 psi-incluye hierro de1/2" cad .15 ambos senitidos	M3	81.12	$ 699,625.00	$ 56,753,580.00	81.12	$ 699,625.00	56,753,580.00	0.00	$ -	81.12	$ 56,753,580.00	0.00	$ -
707		Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm + cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia.	ML	332.10	$ 30,742.00	$ 10,209,418.00	455.52	$ 30,742.00	14,003,595.84	0.00	$ -	455.52	$ 14,003,595.84	0.00	$ -
800		MANEJO DE AGUAS													
801		Carcamo en concreto de seccion 0.40mt. x hpro. 0.50 incluye tramos rectos y curvos	ML	351.00	$ 432,118.00	$ 151,673,418.00	553.08	$ 432,118.00	238,995,823.44	0.00	$ -	553.08	$ 238,995,823.44	0.00	$ -
900		CIELOS RASOS Y CUBIERTAS													
901		estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC	KG	14500.00	$ 10,881.00	$ 157,774,500.00	14,500.79	$ 10,881.00	157,783,095.99	0.00	$ -	14,500.79	$ 157,783,095.99	0.00	$ -
902		mortero 1:3 impermeabilizado dsnetrelas de cubierta exp. 0.05mt	M2	265.00	$ 39,365.00	$ 10,431,725.00	164.50	$ 39,365.00	6,475,542.50	0.00	$ -	0.00	$ -	164.50	$ 6,475,542.50
903		impermeabilizacion de placa en manto edil 3 mm standar incl. imprimante y pintura bituminosa	M2	265.00	$ 45,935.00	$ 12,172,775.00	164.50	$ 45,935.00	7,556,307.50	0.00	$ -	0.00	$ -	164.50	$ 7,556,307.50
904		suministro e instalacion de cubierta con teja	M2	770.00	$ 116,783.00	$ 89,922,910.00	805.20	$ 116,783.00	94,033,671.60	0.00	$ -	805.20	$ 94,033,671.60	0.00	$ -
1000		PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES													
1001		concreto ciclopeo	M3	150.00	$ 491,598.00	$ 73,739,700.00	121.00	$ 491,598.00	59,483,358.00	0.00	$ -	121.00	$ 59,483,358.00	0.00	$ -
1002		plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0,10 mt.	M2	1,230.00	$ 74,558.00	$ 91,706,340.00	2,696.26	$ 74,558.00	201,027,753.08	0.00	$ -	2,550.93	$ 190,192,238.94	145.33	$ 10,835,514.14
1003		concreto 4000 psi para tanque	M3	10.57	$ 818,534.00	$ 8,651,904.00	0.00	$ 818,534.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1004		mezcla asfaltica, suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc-3 actualmente mdc 10 de e = 1"	M3	98.99	$ 879,273.00	$ 87,039,234.00	0.00	$ 879,273.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1005		muro en concreto 3000 psi, para muro circular	M3	104.67	$ 722,489.00	$ 75,622,924.00	259.34	$ 722,489.00	187,370,297.26	0.00	$ -	259.34	$ 187,370,297.26	0.00	$ -
1006		bordillos prefabricado en sardinel achaflanado a10 .20 x .60 x .50h tipo Idu o similar incl. excavacion de .20x.20	ML	493.98	$ 152,929.00	$ 75,543,667.00	236.65	$ 152,929.00	36,190,647.85	0.00	$ -	236.65	$ 36,190,647.85	0.00	$ -
1007		bordillos de .10x.30. concreto 3.000 psi-para adoquines interiores y exteriores	ML	655.71	$ 48,192.00	$ 41,238,376.00	1386.30	$ 48,192.00	66,808,569.60	0.00	$ -	1,294.30	$ 62,374,905.60	92.00	$ 4,433,664.00
1008		bordillo de 20x30 concreto 3000 psi	ML	334.00	$ 54,915.00	$ 18,341,610.00	48.90	$ 54,915.00	2,685,343.50	0.00	$ -	48.90	$ 2,685,343.50	0.00	$ -
1009		concreto de 3000 psi estriado para rampas vehicular e: 0,30	M2	200.00	$ 163,850.00	$ 32,770,000.00	0.00	$ 163,850.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1010		concreto de 3000 psi estriado para rampas -ciclovias + minusvalidos-	M2	46.78	$ 69,528.00	$ 3,252,520.00	63.52	$ 69,528.00	4,416,418.56	0.00	$ -	63.52	$ 4,416,418.56	0.00	$ -
1011		viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20	ML	625.00	$ 50,648.00	$ 31,655,000.00	152.76	$ 50,648.00	7,736,988.48	0.00	$ -	121.30	$ 6,143,602.40	31.46	$ 1,593,386.08
1012		viga aerea para contahuella en concreto e = 0,10	M3	7.88	$ 902,629.00	$ 6,932,191.00	0.90	$ 902,629.00	812,366.10	0.00	$ -	0.90	$ 812,366.10	0.00	$ -
1013		Andenes en concreto de 2500 psi, ancho = 1,2 mts, e=0,10 mts	ML	125.30	$ 63,233.00	$ 7,923,095.00	0.00	$ 63,233.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1014		Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	383.86	$ 722,489.00	$ 277,334,628.00	453.20	$ 722,489.00	327,432,014.80	0.00	$ -	453.20	$ 327,432,014.80	0.00	$ -
1015		compactacion de la subrasante patinaje de ruta hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	2,397.56	$ 4,011.00	$ 9,616,613.00	9,006.72	$ 4,011.00	36,125,953.92	0.00	$ -	9,006.72	$ 36,125,953.92	0.00	$ -
1016		riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	3,299.05	$ 5,628.00	$ 18,567,053.00	0.00	$ 5,628.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1017		mezcla asfaltica suministro, compactación de mezcla asfáltica mdc 2 actualmente mdc 19 de e = 2"	M3	164.95	$ 722,354.00	$ 119,152,292.00	0.00	$ 722,354.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1018		compactacion de la subrasante hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	3,352.76	$ 4,011.00	$ 13,447,920.00	0.00	$ 4,011.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1019		riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	1,939.32	$ 5,628.00	$ 10,914,493.00	6,220.77	$ 5,628.00	35,010,493.56	0.00	$ -	6,220.77	$ 35,010,493.56	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59,AP,GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,565,160,656.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	89,48%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1020		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19, para ovalo central e. 7 cm	M2	1,939.32	$ 51,417.00	$ 99,714,016.00	6,220.77	$ 51,417.00	319,853,331.09	0.00	$ -	6,220.77	$ 319,853,331.09	0.00	$ -
1021		mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 19 para ovalo central	M2	1,939.32	$ 53,659.00	$ 104,061,972.00	6,220.77	$ 53,659.00	333,800,297.43	0.00	$ -	6,220.77	$ 333,800,297.43	0.00	$ -
1022		riego de liga con asfalto liquido	M2	5,239.81	$ 5,784.00	$ 30,307,081.00	6,220.77	$ 5,784.00	35,980,933.68	0.00	$ -	6,220.77	$ 35,980,933.68	0.00	$ -
1023		concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 ml zonas de parqueaderos (referencia gob cesar)	M2	1,720.00	$ 115,171.00	$ 198,094,120.00	0.00	$ 115,171.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1100		ACABADOS Y PINTURAS													
1101		vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	1,269.00	$ 8,734.00	$ 11,084,646.00	515.35	$ 8,734.00	4,501,066.90	0.00	$ -	0.00	$ -	515.35	$ 4,501,066.90
1102		demarcacion de logotipos para prir 1 x 1 ml.	UND	7.00	$ 51,692.00	$ 361,844.00	0.00	$ 51,692.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1103		suministro y aplicación de pintura trafico	M2	17.00	$ 39,469.00	$ 670,973.00	0.00	$ 39,469.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1104		suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 ml.	ML	175.00	$ 7,693.00	$ 1,346,275.00	0.00	$ 7,693.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1200		PISTA DE VELOCIDAD													
1201		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	3,302.73	$ 11,225.00	$ 37,073,144.00	4,251.80	$ 11,225.00	47,717,475.00	1,521.00	$ 17,073,225.00	4,251.00	$ 47,717,475.00	0.00	$ -
1202		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	3,302.73	$ 12,505.00	$ 41,300,639.00	4,251.80	$ 12,505.00	53,158,755.00	1,521.00	$ 19,020,105.00	4,251.00	$ 53,158,755.00	0.00	$ -
1203		Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas, productos avalados por fedepatin.	M2	1,416.12	$ 37,517.00	$ 53,128,574.00	1,417.00	$ 37,517.00	53,161,589.00	507.00	$ 19,021,119.00	1,417.00	$ 53,161,589.00	0.00	$ -
1204		Reductores de velocidad	UND	819.00	$ 35,567.00	$ 29,129,373.00	819.00	$ 35,567.00	29,129,373.00	0.00	$ -	0.00	$ -	819.00	$ 29,129,373.00
1300		PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA													
1301		Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	1,626.13	$ 134,664.00	$ 219,250,498.00	1,334.30	$ 134,664.00	179,682,175.20	0.00	$ -	1,317.50	$ 177,419,820.00	16.80	$ 2,262,355.20
1302		Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	1,940.76	$ 14,031.00	$ 27,230,804.00	1,940.70	$ 14,031.00	27,229,961.70	526.21	$ 7,411,314.51	1,886.70	$ 26,472,287.70	54.00	$ 757,674.00
1303		Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	1,940.76	$ 15,632.00	$ 30,337,960.00	1,940.70	$ 15,632.00	30,337,022.40	582.21	$ 9,101,106.72	1,940.70	$ 30,337,022.40	0.00	$ -
1304		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas, incluye lineas para demarcación.	M2	1,594.00	$ 31,264.00	$ 49,834,816.00	1,940.70	$ 31,264.00	60,674,044.80	582.21	$ 18,202,213.44	1,940.70	$ 60,674,044.80	0.00	$ -
1305		Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas, productos avalados por fedepatin.	M2	1940.76	$ 46,897.00	$ 91,015,822.00	1940.70	$ 46,897.00	91,013,007.90	582.21	$ 27,303,992.37	1,940.70	$ 91,013,007.90	0.00	$ -
1400		VARIOS EXTERIORES Y PARQUES													
1401		anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	1,100.00	$ 25,269.00	$ 27,795,900.00	0.00	$ 25,269.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1402		cerramiento de muro en concreto	ML	1,100.00	$ 2,047.00	$ 2,251,700.00	0.00	$ 2,047.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1403		malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	1,562.75	$ 17,011.00	$ 26,583,940.00	3,246.43	$ 17,011.00	55,225,020.73	329.00	$ 5,596,619.00	3,033.43	$ 51,601,677.73	213.00	$ 3,623,343.00
1404		Empradización Zonas Verdes	M2	2,000.00	$ 33,727.00	$ 67,454,000.00	5,200.00	$ 33,727.00	175,380,400.00	2,404.80	$ 81,106,689.60	4,995.41	$ 168,480,193.07	204.59	$ 6,900,206.93
1405		suministro e instalacion de canecas acero inoxpara basura m-120 tipo idu esimilar	UND	8	$ 1,587,577.00	$ 12,700,616.00	0	$ 1,587,577.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1406		suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	6.00	$ 3,350,720.00	$ 20,104,320.00	0.00	$ 3,350,720.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1407		suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 4incl, empotramiento	UND	6.00	$ 2,720,989.00	$ 16,325,934.00	0.00	$ 2,720,989.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1500		INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES													
1510		RED AEREA DE MEDIA TENSION													
1511		Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	1.00	$ 3,035,350.00	$ 3,035,350.00	2.00	$ 3,035,350.00	6,070,700.00	1.00	$ 3,035,350.00	1.00	$ 3,035,350.00	1.00	$ 3,035,350.00
1512		Suministro e instalacion de bajante en tubo 4"x3m inc. (incluye capecete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion).	UND	1.00	$ 1,380,557.00	$ 1,380,557.00	1.00	$ 2,380,557.00	2,380,557.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,380,557.00
1513		Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	1.00	$ 459,465.00	$ 459,465.00	1.00	$ 1,563,200.00	1,563,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,563,200.00
1514		Suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	52	$ 1,032,008.00	$ 53,664,416.00	5.00	$ 1,933,115.00	9,665,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 9,665,575.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59,AP,GC
VERSIÓN: 0,1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,669,169,050.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.48%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1520		EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS													
1521		Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13.2/0.208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba).	UND	1.00	$ 10,316,656.00	$ 10,316,656.00	1.00	$ 22,523,612.00	22,523,612.00	1.00	$ 22,523,612.00	1.00	$ 22,523,612.00	0.00	$ -
1522		Suministro e instalacion planta eléctrica 75kw , trifasica con referencia del motor cummins y referencia del generador stanford (incluye cargador automático de baterías de 12v, transporte al sitio de instalación, con descargue en primer piso acceso con montacargas,mano de obra y conexiones eléctricas y mecánicas con recibo de acometida a cero metros)	UND	1.00	$ 74,479,535.00	$ 74,479,535.00	1.00	$ 74,479,535.00	74,479,535.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 74,479,535.00
1523		Suministro e instalacion de transferencia automatica para entrada de planta de emergencia (t-tfa)	UND	1.00	$ 10,298,481.00	$ 10,298,481.00	1.00	$ 10,298,481.00	10,298,481.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 10,298,481.00
1524		Suministro e instalación de tablero general de acometidas (tga) (según diagrama unifilar)	UND	1.00	$ 14,692,123.00	$ 14,692,123.00	1.00	$ 14,692,123.00	14,692,123.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,692,123.00
1525		Suministro e instalacion tablero general para control de alumbrado general t-coag (incluye tolerruptores, contactores, botonera, pancl ied)	UND	1.00	$ 11,013,306.00	$ 11,013,306.00	1.00	$ 11,013,306.00	11,013,306.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 11,013,306.00
1526		Suministro e instalacion de tablero bifasico de distribucion de 8 cto c/t t- loc1/t-loc-2/t-caf	UND	3.00	$ 396,981.00	$ 1,190,943.00	0.00	$ 1,396,981.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1527		Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 12 cto c/t t- cy/m1-edmon	UND	2.00	$ 1,302,660.00	$ 2,605,320.00	2.00	$ 1,302,660.00	2,605,320.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,605,320.00
1528		Suministroe instalacion de tapa registro 20 x 20 contiene plantica	UND	10.00	$ 34,073.00	$ 340,730.00	0.00	$ 34,073.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1529		Suministro e instalacion de ecosto para planta	ML	10	$ 73,227.00	$ 732,270.00	10.00	$ 73,227.00	732,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 732,270.00
1530		ACOMETIDAS RED BAJA TENSION													
1531		suministro e instalación de acometida desde tga hasta transferencia 250a en 3n*4/0+1n*4/0+2t cu en ducto 1ø3" pvc	ML	6.00	$ 299,769.00	$ 1,798,614.00	6.00	$ 299,769.00	1,798,614.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 1,798,614.00
1532		suministro e instalación de acometida desde transferencia hasta planta de emergencia 75kw3n*4/0+1n*4/0+2t cu en ducto 1ø3"	ML	9.00	$ 299,651.00	$ 2,696,859.00	20.00	$ 386,240.00	7,724,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 7,724,800.00
1533		suministro e instalacion acometida tablero de control de alumbrado general t cu-coag 3x1/0+1x1/0+2t cu en tubo 2"	ML	6.00	$ 171,197.00	$ 1,027,182.00	25.00	$ 171,197.00	4,279,925.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 4,279,925.00
1534		suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion local 1 y local 2 2x6+1x6+10t cu en tubo 1" pvc	ML	226.80	$ 50,167.00	$ 11,377,876.00	0.00	$ 50,167.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1535		suministro e instalacion de acometidas tablero de t-gym y t-admon 3x6+1x6+10t cu awg-lhhn	ML	98.10	$ 59,967.00	$ 5,882,763.00	345.00	$ 99,967.00	34,488,615.00	0.00	$ -	0.00	$ -	345.00	$ 34,488,615.00
1536		suministro e instalación de acometida trafo 112,5kva 2(3n*4/0+1n*4/0)+2t cu en ducto 3ø3" pvc	ML	30.00	$ 696,344.00	$ 20,890,320.00	290.00	$ 696,344.00	201,939,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	290.00	$ 201,939,760.00
1537		suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion cafeteria 2x8+1x8+12t cu en tubo 1" pvc	ML	69.30	$ 41,064.00	$ 2,845,735.00	0.00	$ 41,064.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1538		suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 2x10 + 1x12t cu en tubo pvc 3/4"	ML	464.00	$ 33,175.00	$ 15,393,200.00	319.51	$ 59,615.00	19,047,588.65	0.00	$ -	0.00	$ -	319.51	$ 19,047,588.65
1539		suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 3x4 + 1x4+6t Al en tubo pvc 3/4" graderias.	ML	0.00	$ -	$ -	220.00	$ 49,653.00	10,923,660.00	0.00	$ -	0.00	$ -	220.00	$ 10,923,660.00
1540		suministro e instalacion de acometidas iluminacion linea de meta 2x6 + 1x10t cu en tubo pvc 1"	ML	94.1	$ 39,803.00	$ 3,745,462.00	121.0	$ 139,803.00	16,916,163.00	0.00	$ -	0.00	$ -	121.00	$ 16,916,163.00
		Lámparas de emergencia led (autonomia min 1 hora)	UND	18.00	$ 48,874.00	$ 879,732.00	22.00	$ 128,874.00	2,835,228.00	0.00	$ -	0.00	$ -	22.00	$ 2,835,228.00
1540		ALUMBRADO EXTERIOR													
1541		suministro e instalación de acometida luminaria desde caja de registro hasta lampara en 3x14 awg encauchetado	ML	253.00	$ 11,976.00	$ 3,029,928.00	3242.50	$ 11,976.00	38,832,180.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3,242.50	$ 38,832,180.00
1542		suministro e instalación de malla a tierra de iluminación exterior conformada por 1- varilla cooper de 2,4 m, 1- soldadura exotérmica, 1 empalme bimetalico, 1m de cabla de cobre 8 awg	UND	5.00	$ 317,884.00	$ 1,589,420.00	46.00	$ 487,885.00	22,442,710.00	0.00	$ -	0.00	$ -	46.00	$ 22,442,710.00
1543		suministro e instalación de empalme empalme gel 6-2/14-8 ghfc1 para alumbrado	UND	124.00	$ 57,812.00	$ 7,168,688.00	54.00	$ 57,812.00	3,121,848.00	0.00	$ -	0.00	$ -	54.00	$ 3,121,848.00
1544		suministro e instalación de caja de paso tipo ap-250	UND	33.00	$ 578,612.00	$ 19,094,196.00	28.00	$ 778,612.00	21,801,136.00	0.00	$ -	20.00	$ 15,572,240.00	8.00	$ 6,228,896.00
1545		suministro e instalación de postes de 8 metros (ver detalle en plano adjunto)	UND	8.00	$ 1,012,735.00	$ 8,101,880.00	0.00	$ 1,012,735.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1546		suministro de poste metálico tronco cónico circular de 18mts de altura, totalmente galvanizado en caliente, fabricado en tres secciones unidas mediante bridas, diámetro de base 380mm diámetro de cima 190mm, flenge de 60cm de diámetro en 1", sistema de anclaje de 8 pernos de 1" x 2,00mts de longitud, incluye peldaños a partir de los 4mts, argollas para linea de vida y canasta de mantenimiento rectangular para soportar hasta 9 reflectores.(no incluye cimentacion para anclaje)	UND	1.00	$ 22,983,511.00	$ 22,983,511.00	18.00	$ 22,983,511.00	413,703,198.00	0.00	$ -	18.00	$ 413,703,198.00	0.00	$ -
1547		suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049124 SYLVEO LED 30000LM NAR 4K, fotometria 5184	UND	224.00	$ 642,451.00	$ 143,909,024.00	0.00	$ 1,642,451.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,565,150,056.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.48%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1548		suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calla led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	4.00	$ 1,036,607.00	$ 4,146,428.00	18.00	$ 1,036,607.00	18,658,926.00	15.00	$ 15,549,105.00	15.00	$ 15,549,105.00	3.00	$ 3,109,821.00
1549		suministro e instalación de poste sencillo de 8,5 m metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto) (B M)	UND	23	$ 1,613,516.00	$ 37,110,868.00	18.00	$ 1,613,516.00	29,043,288.00	0.00	$ -	15.00	$ 24,202,740.00	3.00	$ 4,840,548.00
1550		suministro e instalacion de mastil cilindrico seccionado de 15.0 m c/canasta p/20 proy c/ canastilla de anclaje, galvanizado y pintura electrostat	UND	4.00	$ 9,532,158.00	$ 38,128,632.00	0.00	$ 9,532,158.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1551		suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049119 SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K (incluye,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico) (PHILIPS)	UND	32.00	$ 2,215,433.00	$ 70,893,856.00	0.00	$ 2,215,433.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1552		suministro e instalacion reflectores led graderia (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	12.00	$ 851,341.00	$ 10,216,092.00	28.00	$ 851,341.00	23,837,548.00	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 23,837,548.00
1553		suministro e instalacion luminarias lineas de meta (incluye estructura, 6 reflectores 144led , y cableado interno)	UND	1.00	$ 56,119,335.00	$ 56,119,335.00	1.00	$ 56,119,335.00	56,119,335.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 56,119,335.00
1554		suministro e instalación de poste sencillo de 3 m - metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto)	UND	4.00	$ 1,226,021.00	$ 4,904,084.00	0.00	$ 1,226,021.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1555		salida para sensor de movimiento	UND	3.00	$ 204,320.00	$ 612,960.00	45.00	$ 204,320.00	9,194,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	45.00	$ 9,194,400.00
1556		suministro e instalacion estructura de mt de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva)	UND	1.00	$ 1,401,224.00	$ 1,401,224.00	5.00	$ 2,401,224.00	12,006,120.00	4.00	$ 9,604,896.00	4.00	$ 9,604,896.00	1.00	$ 2,401,224.00
1557		retenida estructura baja tension	UND	1.00	$ 415,508.00	$ 415,508.00	5.00	$ 415,508.00	2,077,540.00	3.00	$ 1,246,524.00	3.00	$ 1,246,524.00	2.00	$ 831,016.00
1558		acometidas mastiles (1-2-3-4) con canastilla para 20 reflectores en 2(2x6)+1x8t cu en tubo 2x1"	ML	449.50	$ 61,897.00	$ 27,822,702.00	0.00	$ 61,897.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1559		acometidas mastiles (22-25,27-28) con canastilla para reflectores en 3(3x4/0)+6T AL tubo 2x1"	ML		$ -	1236.00	$ 72,189.00	89,225,604.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1,236.00	$ 89,225,604.00	
1560		acometida mastil 5 con canastilla para 8 reflectores en 2x6+1x8t cu en tubo 1"	ML	166.00	$ 52,812.00	$ 8,766,792.00	0.00	$ 52,812.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1561		tablero de control de iluminacion general	UND		$ -	4.00	$ 8,236,011.00	32,944,044.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 32,944,044.00	
1562		tablero de control de iluminacion graderias	UND		$ -	5.00	$ 2,562,350.00	12,811,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 12,811,750.00	
1563		salida iluminacion areas comunes	UND		$ -	0.00	$ 187,630.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1564		lamparas herneticas 2*18w	UND		$ -	0.00	$ 86,320.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1565		salida para luminaria con chasi de policarbonato con cofre 16 y bombillo de alta potencia led 40w en tuberia en emt ½"	UND	4.00	$ 546,533.00	$ 2,186,132.00	0.00	$ 546,533.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1566		proyector H-BAY Stil led IP65 chip Samsung 265320w programable, luz 4000k o 5000 k	UND		$ -	95.00	$ 3,366,745.00	319,840,775.00	0.00	$ -	95.00	$ 319,840,775.00	0.00	$ -	
1567		proyector H-BAY Stil led IP65 chip Samsung 390480w programable, luz	UND		$ -	46.00	$ 4,834,375.00	222,381,250.00	0.00	$ -	46.00	$ 222,381,250.00	0.00	$ -	
1570		ACOMETIDAS RED BAJA TENSION													
1571		salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios	UND	43.00	$ 95,582.00	$ 4,110,026.00	26.00	$ 135,582.00	3,525,132.00	0.00	$ -	0.00	$ -	26.00	$ 3,525,132.00
1572		salida para tomacorriente con proteccion de falla a tierra gfci.	UND	1.00	$ 147,690.00	$ 147,690.00	4.00	$ 147,690.00	590,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 590,760.00
1573		salida para interruptor sencillo	UND	15.00	$ 80,948.00	$ 1,214,220.00	11.00	$ 85,948.00	945,428.00	0.00	$ -	0.00	$ -	11.00	$ 945,428.00
1574		salida para interruptor doble	UND	2.00	$ 102,409.00	$ 204,818.00	0.00	$ 102,409.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1575		salida para aire acondicionado mini split 220v	UND	7.00	$ 170,250.00	$ 1,191,750.00	0.00	$ 170,250.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1576		salida para panel led redonda 26w en emt	UND	30.00	$ 216,110.00	$ 6,483,300.00	37.00	$ 216,110.00	7,996,070.00	0.00	$ -	0.00	$ -	37.00	$ 7,996,070.00
1577		salida para panel led 60x60cm 40w en emt	UND	20.00	$ 405,450.00	$ 8,109,000.00	25.00	$ 181,311.00	4,532,775.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 4,532,775.00
1578		salida para iluminacion zona administrativa	UND		$ -	0.00	$ 195,120.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1579		salida para panel led 60*60 40w en emt	UND		$ -	0.00	$ 405,450.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1580		CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL													
1581		caja de paso rs 3-002	UND	24.00	$ 1,172,950.00	$ 28,150,800.00	0.00	$ 1,172,950.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1582		caja de paso rs 3-003			$ -	40.00	$ 1,933,810.00	77,352,400.00	0.00	$ -	39.00	$ 75,418,590.00	1.00	$ 1,933,810.00	
1583		elaboración de estructura de anclaje para postes metálicos 6.6m de 0.45mx0.45mx0.80	UND	29.00	$ 340,833.00	$ 9,884,157.00	18.00	$ 340,833.00	6,134,994.00	0.00	$ -	15.00	$ 5,112,495.00	3.00	$ 1,022,499.00
1590		SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA													
1591		suministro e instalacion de puntas captora (al) de 0,60m	UND	5.00	$ 201,936.00	$ 1,009,680.00	42.00	$ 201,936.00	8,481,312.00	0.00	$ -	0.00	$ -	42.00	$ 8,481,312.00
1592		sistema de puesta a tierra triangular para mastil (malla de tierra de tres varillas - cable no. 2/0)	UND	5.00	$ 2,144,542.00	$ 10,722,710.00	18.00	$ 2,144,542.00	38,601,756.00	0.00	$ -	18.00	$ 38,601,756.00	0.00	$ -
1593		puesta a tierra tablero de distribucion local 1 y 2	UND	2.00	$ 373,837.00	$ 747,674.00	0.00	$ 373,837.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1600		LUCES DEPOSITOS GRADERIAS													
1601		salida para interruptor sencillo tuberia emt 1/2"	UND	19.00	$ 80,556.00	$ 1,530,564.00	0.00	$ 80,556.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1602		salida para aplique tuberia emt 1/2" (incluye bombilla)	UND	20.00	$ 166,790.00	$ 3,335,800.00	0.00	$ 166,790.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1603		salida para tomacorriente doble graderia en tuberia emt	UND	4.00	$ 101,237.00	$ 404,948.00	0.00	$ 101,237.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1700		SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA													
1701		suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra	ML	310.00	$ 28,627.00	$ 8,874,370.00	1594.62	$ 54,627.00	87,109,306.74	1,232.18	$ 67,310,296.86	1,232.18	$ 67,310,296.86	362.44	$ 19,799,009.88
1702		excavacion para tuberia 4" 2 1/2" +1*3" +2 *1 1/2"			$ -	18.00	$ 75,321.00	1,355,778.00	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 1,355,778.00	
1703		excavacion para tuberia 2*2"			$ -	126.71	$ 83,650.00	10,599,291.50	0.00	$ -	0.00	$ -	126.71	$ 10,599,291.50	
1704		excavacion para tuberia 3*2"			$ -	25.00	$ 75,321.00	1,883,025.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.00	$ 1,883,025.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,659,150,050.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.48%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1705		excavacion para tuberia 2" 2 1/2" + 1"3"				$ -	50.00	$ 75,321.00	3,766,050.00	0.00	$ -	0.00	$ -	50.00	$ 3,766,050.00
1706		excavacion para tuberia 1"2 1/2"				$ -	75.00	$ 75,321.00	5,649,075.00	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,649,075.00
1707		excavacion para tuberia 1"3"				$ -	75.00	$ 75,321.00	5,649,075.00	0.00	$ -	0.00	$ -	75.00	$ 5,649,075.00
1708		excavacion para tuberia 2"2 1/2"				$ -	60.00	$ 75,321.00	4,519,260.00	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 4,519,260.00
1709		excavacion para tuberia 4"2 1/2" +1"3"				$ -	15.00	$ 75,321.00	1,129,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 1,129,815.00
1710		sistema de puesta a tierra subestacion (malla de tierra de 8 varillas - cable n° 2/0		1.00	$ 7,618,004.00	$ 7,618,004.00	1.00	$ 7,618,004.00	7,618,004.00	0.00	$ -	1.00	$ 7,618,004.00	0.00	$ -
1800		CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO													
1801		puertas - divisiones baños lamina cal. 18, enlamborada, incl. anticorrosivo y acabado en esmalte, instalada.	M2	45.00	$ 1,131,461.00	$ 50,915,745.00	42.63	$ 1,131,461.00	48,234,182.43	0.00	$ -	20.79	$ 23,523,074.19	21.84	$ 24,711,108.24
1802		porton 1,5mt. de ancho y 2,50mt. de alto - una hoja	UND	2.00	$ 4,060,732.00	$ 8,121,464.00	0.00	$ 4,060,732.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1803		porton 6 mt. de ancho y 2.8mt. de alto - dos hojas	UND	1.00	$ 15,127,303.00	$ 15,127,303.00	0.00	$ 15,127,303.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1804		suministro, transporte e instalación de divisiones en paneles de acero inoxidable tipo soceda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con una altura de 1.80m, incluye puertas, parales, chapas, bisagras, empaques, pasadores barras de 1,5" de a	M2	218.00	$ 1,130,052.00	$ 246,351,336.00	86.87	$ 1,130,052.00	98,167,617.24	0.00	$ -	62.78	$ 70,944,664.56	24.09	$ 27,222,952.68
1805		ventana aluminio corrediza 5020 , incluye vidrio 5mm	M2	25.00	$ 646,660.00	$ 16,166,500.00	22.360	$ 646,660.00	14,459,317.60	0.00	$ -	13.65	$ 8,953,007.70	8.52	$ 5,506,309.90
1806		suministro e instalacion de vidrio 3+3 laminado	M2	25.00	$ 455,636.00	$ 11,390,900.00	0.00	$ 455,636.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1807		suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio para acceso a cabinas vip graderias	UND	2.00	$ 650,909.00	$ 1,301,818.00	0.00	$ 650,909.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1808		suministro, transporte e instalación de división para orinales en lámina de acero inoxidable tipo soceda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con dimensiones 0,66x0.46m, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 651,987.00	$ 1,303,974.00	5.00	$ 651,987.00	3,259,935.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 3,259,935.00
1809		pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño, incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxipolamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0,10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a partes verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ML	485.82	$ 567,114.00	$ 275,515,323.00	729.04	$ 567,114.00	413,448,790.56	145.78	$ 82,673,878.92	656.02	$ 372,038,126.28	73.02	$ 41,410,664.28
1810		banda de neopreno	ML	485.82	$ 45,317.00	$ 22,015,905.90	729.04	$ 45,317.00	33,037,905.68	0.00	$ -	0.00	$ -	729.04	$ 33,037,905.68
1811		aseo y limpieza	UND	1.00	$ 4,270,283.00	$ 4,270,283.00	2.00	$ 4,270,283.00	8,540,566.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 8,540,566.00
1812		suministro e instalacion de puertas rejillas	M2	97.66	$ 592,303.00	$ 58,022,002.00	0.00	$ 592,303.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1813		barandas metalicas apoyadas cada 1,5mt. incluye instalacion y transporte	ML	171.47	$ 390,545.00	$ 66,966,751.00	259.33	$ 390,545.00	101,278,568.62	0.00	$ -	120.00	$ 46,865,400.00	139.33	$ 54,413,168.62
1814		suministro e instalacion de vidrio templado 10 mm incluye accesorios para su instalacion	M2	33.98	$ 720,518.00	$ 24,483,202.00	0.00	$ 720,518.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1815		suministroe instalacion de vin aluminio	ML	73.06	$ 6,267.00	$ 459,328.00	86.53	$ 6,267.00	544,014.11	0.00	$ -	40.55	$ 254,937.85	45.98	$ 289,076.26
1816		suministro e instalacion de vidrio 3+3 incoloro	UND	12.00	$ 103,055.00	$ 1,236,660.00	0.00	$ 103,055.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1817		elemento metalico sobre porton acceso principal	UND	1.00	$ 6,726,975.00	$ 6,726,975.00	0.00	$ 6,726,975.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1818		suministro e instalacion de espejos flotantes	M2	18.00	$ 53,700.00	$ 966,600.00	18.00	$ 269,350.00	4,848,300.00	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 4,848,300.00
1819		suministro e instalacion de marcos en perfil de aluminio	UND			$ -	0.00	$ 53,700.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1900		ENCHAPES Y PISOS													
1901		Plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.07 mt. para adoquines exteriores - interiores	M2	1,150.00	$ 62,015.00	$ 71,317,250.00	285.31	$ 62,015.00	17,693,499.65	0.00	$ -	153.50	$ 9,519,302.50	131.81	$ 8,174,197.15
1902		Enchape en Porcelanato Piso (dimen. 0.40x0.40; 0.60x0.60) o similar	M2	530.00	$ 58,386.00	$ 30,944,580.00	267.99	$ 58,386.00	15,646,864.14	0.00	$ -	136.18	$ 7,951,005.48	131.81	$ 7,695,858.66
1903		zocalo en porcelanato ,50x.50 de primera calidad	ML	200.00	$ 27,904.00	$ 5,580,800.00	141.37	$ 27,904.00	3,944,788.48	0.00	$ -	74.40	$ 2,076,057.60	66.97	$ 1,868,730.88
1904		media caña en mortero 1:4	ML	130.00	$ 17,877.00	$ 2,324,010.00	0.00	$ 17,877.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1905		mortero de nivelacion 1:4 -exp. 0.05 mt. para la cancha hockey, zona administrativa, mm	M2	600.00	$ 33,524.00	$ 20,114,400.00	267.99	$ 33,524.00	8,984,096.76	0.00	$ -	136.18	$ 4,565,298.32	131.81	$ 4,418,798.44
1906		adoquin ceramico peatonal esp. 3.5 cm junta perdida, con mortero de base 1.4 esp. 0.04	M2	1,150.00	$ 74,300.00	$ 85,445,000.00	0.00	$ 74,300.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1907		ceramica .25 x.35 blanca de primera calidad.	M2	180.00	$ 55,466.00	$ 9,983,880.00	200.60	$ 55,466.00	11,126,479.60	0.00	$ -	90.25	$ 5,006,806.50	110.35	$ 6,120,673.10
1908		ceramica .25 x .35 blanca de primera calidad.	ML	40.00	$ 42,945.00	$ 1,717,800.00	0.00	$ 42,945.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1909		NO PREVISTO													
NP-01		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 315 mm (12")	ML	0.00		$ -	83.33	$ 158,446.64	13,203,358.51	0.00	$ -	83.33	$ 13,203,358.51	0.00	$ -
NP-02		Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 400 mm (16")	ML	0.00		$ -	57.54	$ 269,380.14	15,500,133.26	0.00	$ -	57.54	$ 15,500,133.26	0.00	$ -
NP-03		Suministro e instalación de tubería perforada para filtro d= 100 mm (4")	ML	0.00		$ -	215.14	$ 23,429.00	5,040,515.06	0.00	$ -	215.14	$ 5,040,515.06	0.00	$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-004-2022

F:59.AP.GC
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 08.02.22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	COP-004-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER		
VALOR:	$ 13,569,160,050.91	PORCENTAJE EJECUTADO:	88.46%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-04		Suministro e instalacion de triturado (1" a 3") para filtro	M3	0.00		$ -	197.95	$ 97,848.55	19,329,134.57	0.00	$ -	197.95	$ 19,329,134.57	0.00	$ -
NP-05		Concreto 1500 psi grava comun hecho en obra para solados (incluye suministro y colocacion)	M2	0.00		$ -	1,237.20	$ 33,710.55	41,706,692.46	0.00	$ -	1,237.20	$ 41,706,692.46	0.00	$ -
NP-06		Subbase granular tipo C (suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% del próctor modificado)	M3	0.00		$ -	1,723.48	$ 156,151.68	269,124,297.45	0.00	$ -	1,723.48	$ 269,124,297.45	0.00	$ -
NP-07		Transporte y acarreo interno en obras > 50 mts para material de relleno seleccionado	M3	0.00		$ -	27,931.92	$ 5,375.00	150,134,070.00	0.00	$ -	27,931.92	$ 150,134,070.00	0.00	$ -
NP-08		Relleno en zanja con arena para encamado de tuberia	M3	0.00		$ -	176.51	$ 113,957.52	20,114,641.86	0.00	$ -	176.51	$ 20,114,641.86	0.00	$ -
NP-09		Construcción de pozos de inspeccion D:1.20 m h<1.8m incluye corona, cañuela, pasos	UND	0.00		$ -	3.00	$ 3,431,847.90	10,295,543.70	0.00	$ -	3.00	$ 10,295,543.70	0.00	$ -
NP-10		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 2" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	234.89	$ 28,242.31	7,199,682.40	0.00	$ -	234.89	$ 6,633,836.20	20.00	$ 564,846.20
NP-11		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 3/4" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	87.12	$ 10,006.95	871,805.48	0.00	$ -	42.12	$ 421,492.73	45.00	$ 450,312.75
NP-12		Suministro e instalacion Tuberia PVC presion 1-1/4" (incluye accesorio, limpiador y soldadura)	ML	0.00		$ -	50.20	$ 17,261.47	866,525.79	0.00	$ -	20.20	$ 348,681.69	30.00	$ 517,844.10
NP-13		Suministro e Instalacion de Punto hidraulico en tuberia PVC de 3/4" (incluye accesorios, limpiador, soldaduras y 2m de tuberia)	UND	0.00		$ -	36.00	$ 46,971.23	1,690,964.28	0.00	$ -	23.00	$ 1,080,338.29	13.00	$ 610,625.99
NP-14		Llave control de 3/4" Valvula de bola o similar	UND	0.00		$ -	7.00	$ 33,123.49	231,864.43	0.00	$ -	4.00	$ 132,493.96	3.00	$ 99,370.47
NP-15		Llave control de 1" Válvula de bola o similar	UND	0.00		$ -	7.00	$ 36,123.49	252,864.43	0.00	$ -	4.00	$ 144,493.96	3.00	$ 108,370.47
					SUB-TOTAL	$6,495,213,644.00			$10,488,114,568.59	SUB-TOTAL	$512,571,419.26	SUB-TOTAL	$9,303,367,334.05	SUB-TOTAL	$1,184,747,634.34
300		CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR													
301		barrera con bombonas plasticas y cinta de seguridad	ML	450.00	$ 1,954.00	$ 879,300.00	0.00	$ 1,954.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
302		suministro e instalacion de señalizacion para accesibilidad de personal con baja vision	ML	70.00	$ 124,128.00	$ 8,688,960.00	0.00	$ 124,128.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1580		LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO													
1581		Revision refle distribucion, transformacion y uso final y retilap	UND	1.00	$ 17,313,204.00	$ 17,313,204.00	1.00	$ 17,313,204.00	17,313,204.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17,313,204.00
1582		Estudio, conexion, revision de instalaciones por la Empresa de Energia Municipal	UND	1.00	$ 6,595,110.00	$ 6,595,110.00	1.00	$ 6,595,110.00	6,595,110.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,595,110.00
1583		Diseños, legalizacion y tramites	UND	1.00	$ 5,176,217.00	$ 5,176,217.00	1.00	$ 5,176,217.00	5,176,217.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,176,217.00
					SUB-TOTAL	$38,652,791.00		SUB-TOTAL	$29,084,531.00	SUB-TOTAL	$0.00	SUB-TOTAL	$0.00	SUB-TOTAL	$29,084,531.00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 6,495,313,644.00			$ 10,488,114,968.39		$ 512,571,419.26		$ 9,303,367,334.05		$ 1,184,747,634.34
ADMINISTRACIÓN (A)(24 %)						$ 1,558,875,274.00			$ 2,517,147,592.41		$ 123,017,140.62		$ 2,232,808,160.17		$ 284,339,432.24
IMPREVISTOS (I)(1 %)						$ 64,953,136.00			$ 104,881,149.68		$ 5,125,714.19		$ 93,033,673.24		$ 11,847,476.34
UTILIDADES (U)(5 %)						$ 324,765,682.00			$ 524,405,748.42		$ 25,628,570.96		$ 465,169,365.79		$ 59,237,381.72
AIU (30 %)						$ 1,948,594,092.00			$ 3,146,434,490.51		$ 153,771,426.27		$ 2,791,010,200.21		$ 355,424,290.30
COSTO DIRECTO CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO						$ 38,652,791.00			$ 29,084,531.00		$ -		$ -		$ 29,084,531.00
IVA (19%)						$ 7,344,030.00			$ 5,526,061.00		$ -		$ -		$ 5,526,061.00
AJUSTE AL PESO											$ (0.03)		$ (4.26)		
COSTO TOTAL						$ 8,469,804,557.00			$ 13,569,160,050.91		$ 668,342,845.60		$ 12,094,377,530.00		$ 1,574,782,520.91

LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
CONSORCIO CONDE PG
CONTRATISTA

JOSE VICENTE DURAN DURA
DAIMCO SAS
INTERVENTOR

ING. JUAN GABRIEL GONZALEZ BARRAGAN
SECRETARIO DE CONTROL URANO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 103 DESCRIPCION DEL ITEM: Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO) UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
Zapatas EJES A1,A2,D1,D2,E1,E2,H1,H2	1.50	1.50	1.00	8.00	18.00	m3	18.00
Zapatas EJES B1,B2,C1,C2,F1,F2,G1,G2	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	m3	26.00
Vigas 01-1, 02-01	11.99	0.30	0.30	2.00	2.16	m3	28.16
Vigas 0A-1, 0B-1, 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1	4.29	0.30	0.30	8.00	3.09	m3	31.25
TOTAL EJECUTADO						M3	31.25

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria


CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 103 DESCRIPCION DEL ITEM: Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO) UND M3

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

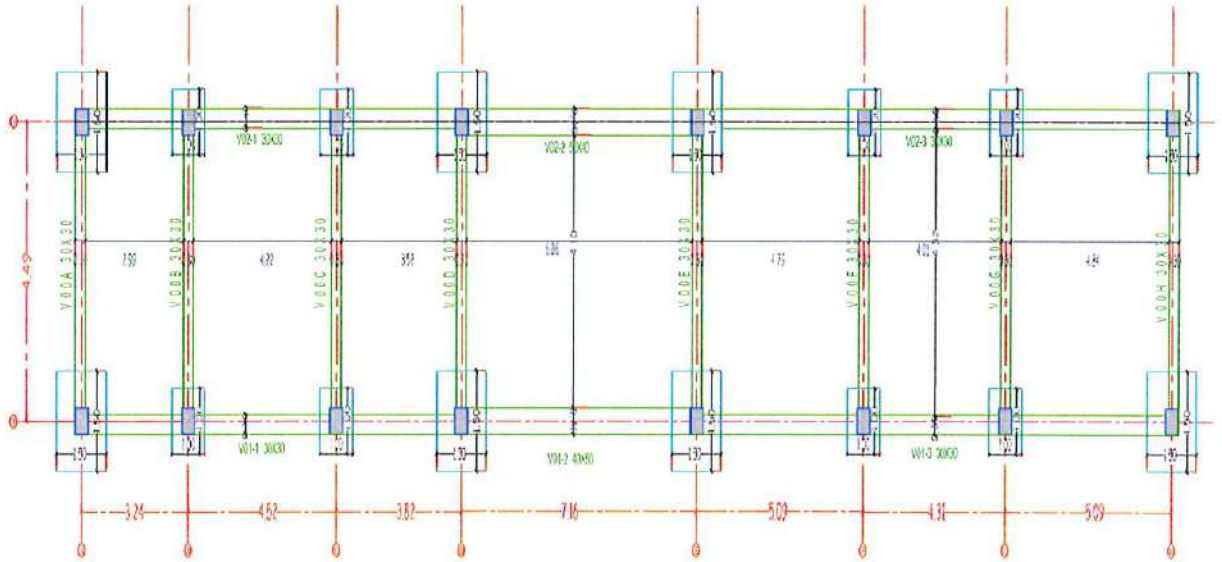

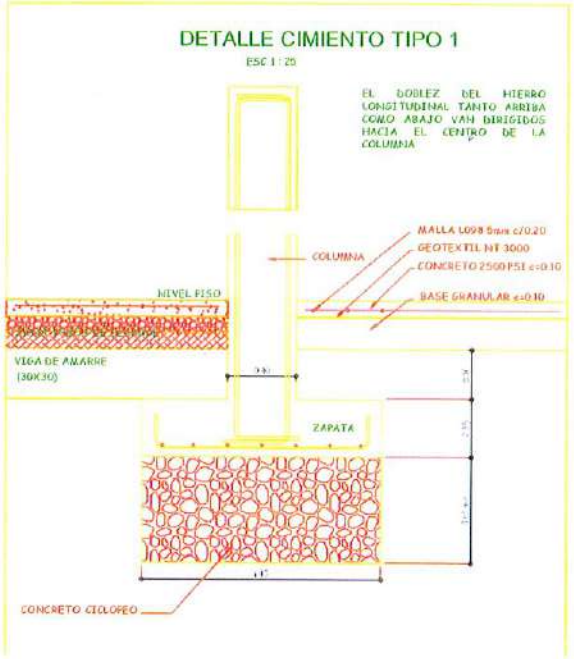

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 401 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
Zapatas EJES A1,A2,D1,D2,E1,E2,H1,H2	1.50	1.50	0.35	8.00	6.30	M3	6.30
Zapatas EJES B1,B2,C1,C2,F1,F2,G1,G2	1.00	1.00	0.35	8.00	2.80	M3	9.10
TOTAL EJECUTADO						M3	9.10

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria


CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 401 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas UND M3

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

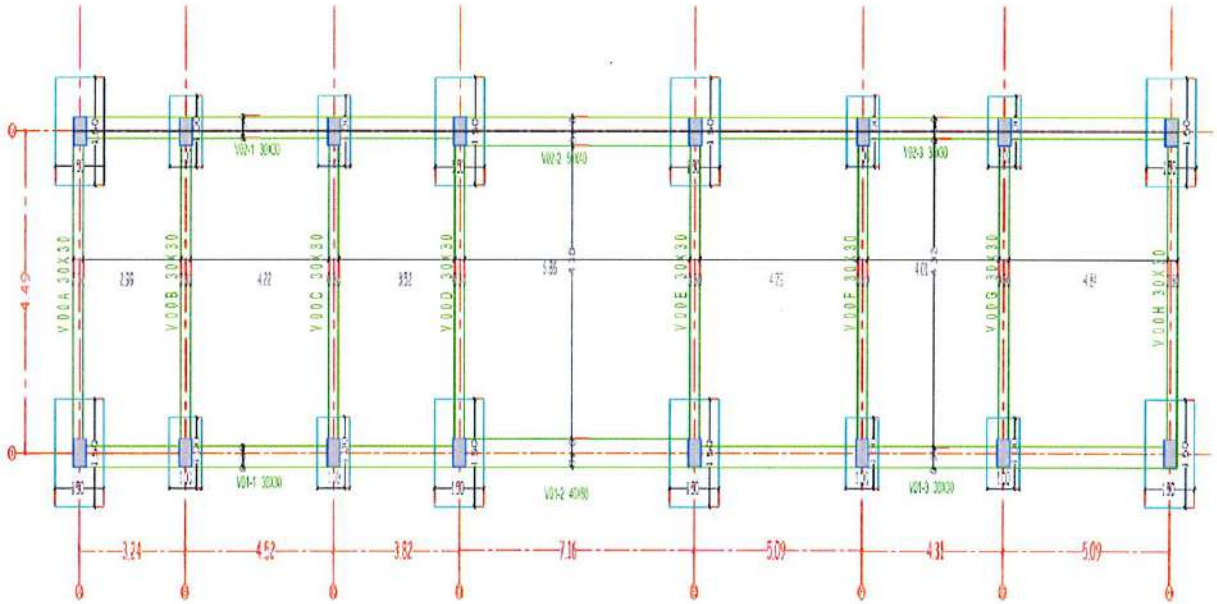

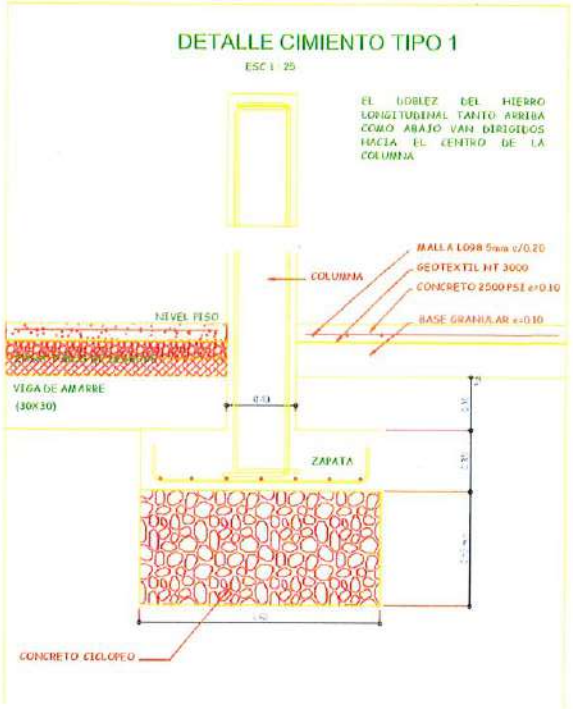

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 402 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2) UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
Ciclopeo de Zapatas EJES A1,A2,D1,D2,E1,E2,H1,H2	1.50	1.50	0.65	8.00	11.70	M3	11.70
Ciclopeo de Zapatas EJES B1,B2,C1,C2,F1,F2,G1,G2	1.00	1.00	0.65	8.00	5.20	M3	16.90
TOTAL EJECUTADO						M3	16.90

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria


CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 402 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2) UND M3

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

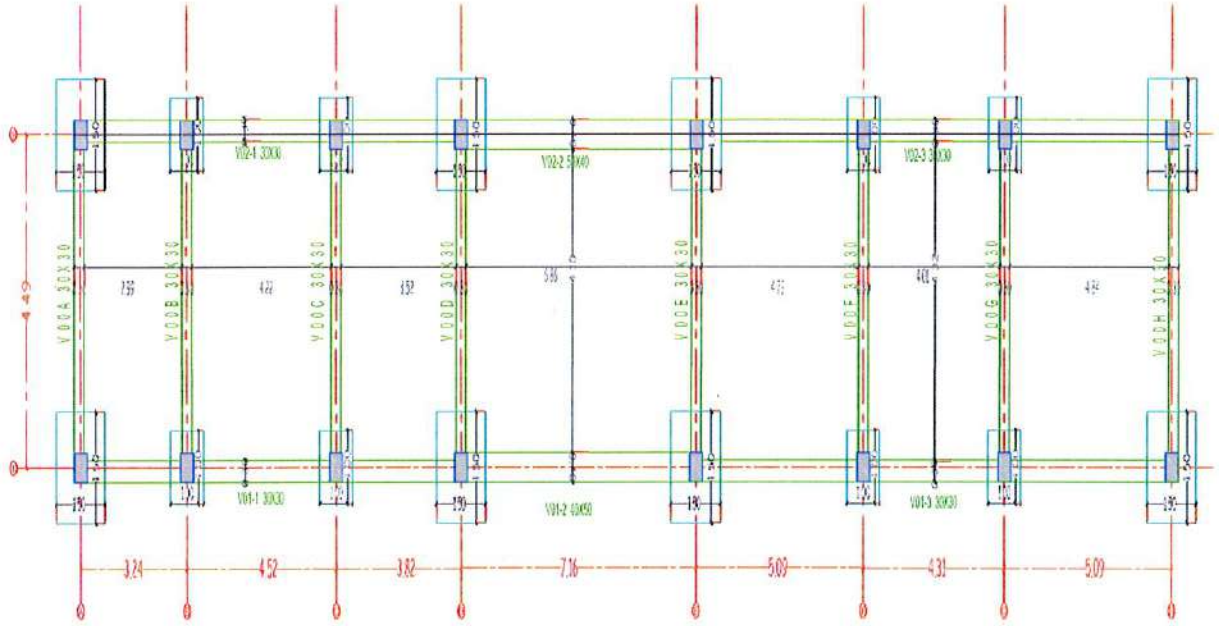

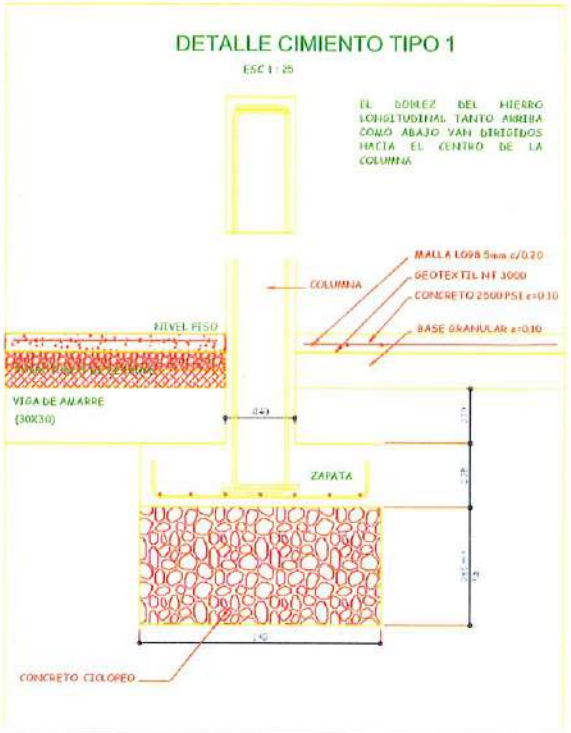

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 403 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
Vigas 01-1, 02-01	11.99	0.30	0.30	2.00	2.16	M3	2.16
Vigas 0A-1, 0B-1, 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1	4.29	0.30	0.30	8.00	3.09	M3	5.25
Vigas 01-2, 02-02	14.89	0.40	0.50	2.00	5.96	M3	11.21
Vigas 01-3, 02-03	6.76	0.30	0.30	2.00	1.22	M3	12.43
TOTAL EJECUTADO						M3	12.43

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO











Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria


CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 403 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre UND M3

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

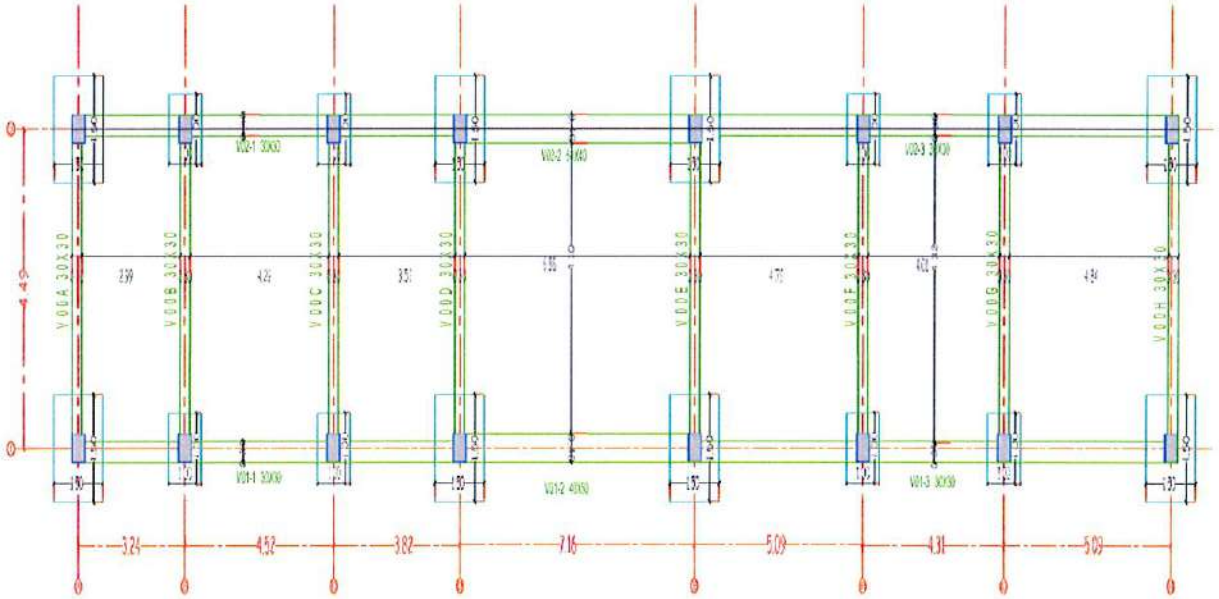

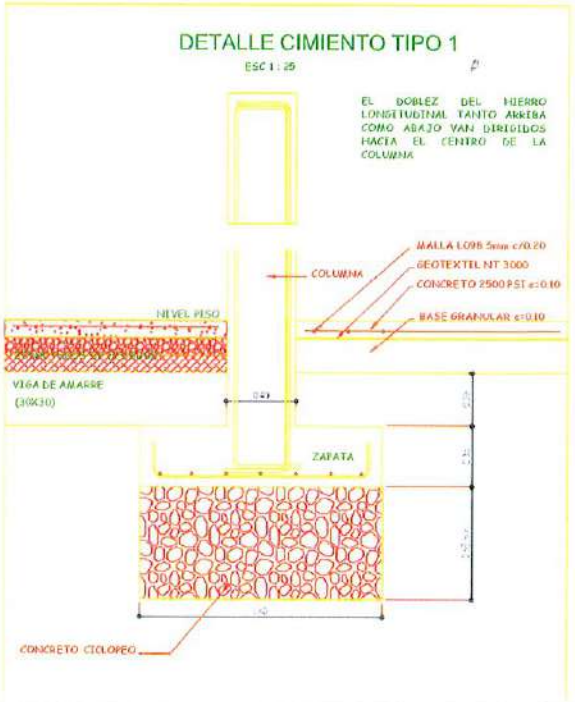

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 701 DESCRIPCION DEL ITEM: columnas en concreto 3.000 psi. UND M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
COLUMNAS A1,A2,D1,D2,E1,E2,H1,H2, B1,B2,C1,C2,F1,F2,G1,G2	2.70	0.40	0.40	16.00	6.91	M3	6.91	
TOTAL EJECUTADO						M3	6.91	









Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA


FECHA: 3/10/2025


CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 701 DESCRIPCION DEL ITEM: columnas en concreto 3.000 psi. UND M3

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

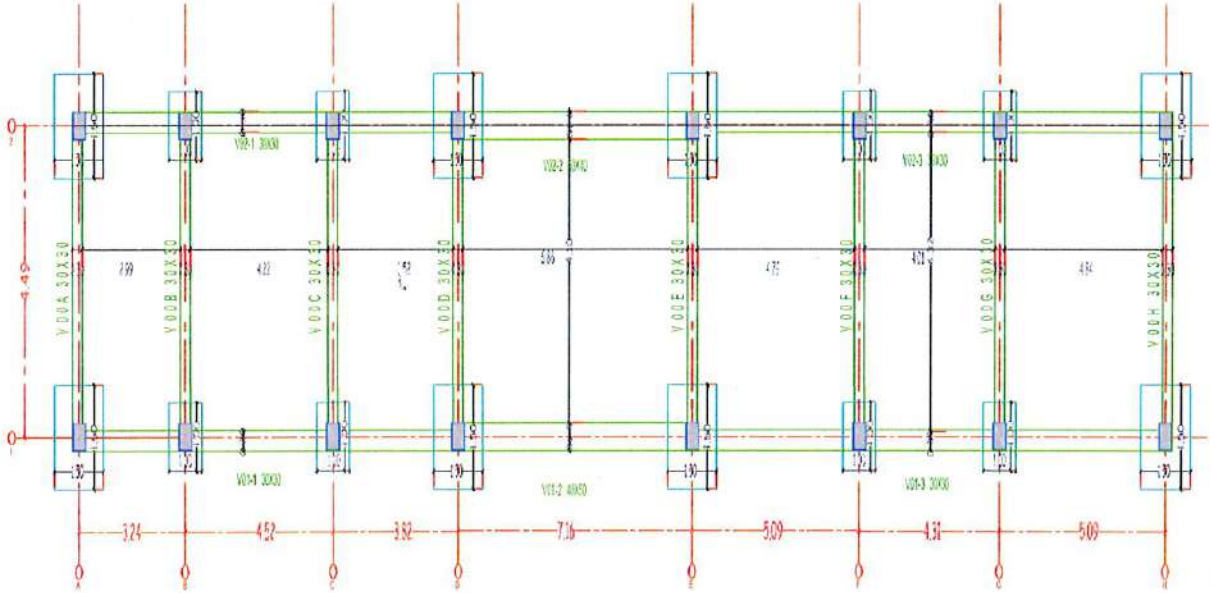

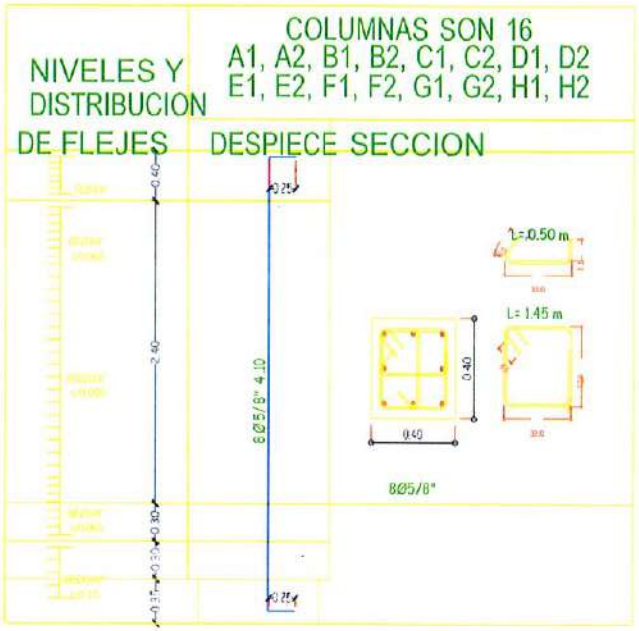

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 702 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
PLACA ALIGEREADA ADMINISTRACION	33.64	4.89		1.00	164.50	M2	164.50
TOTAL EJECUTADO						M2	164.50

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025


CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 702 DESCRIPCION DEL ITEM: Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms UND M2

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

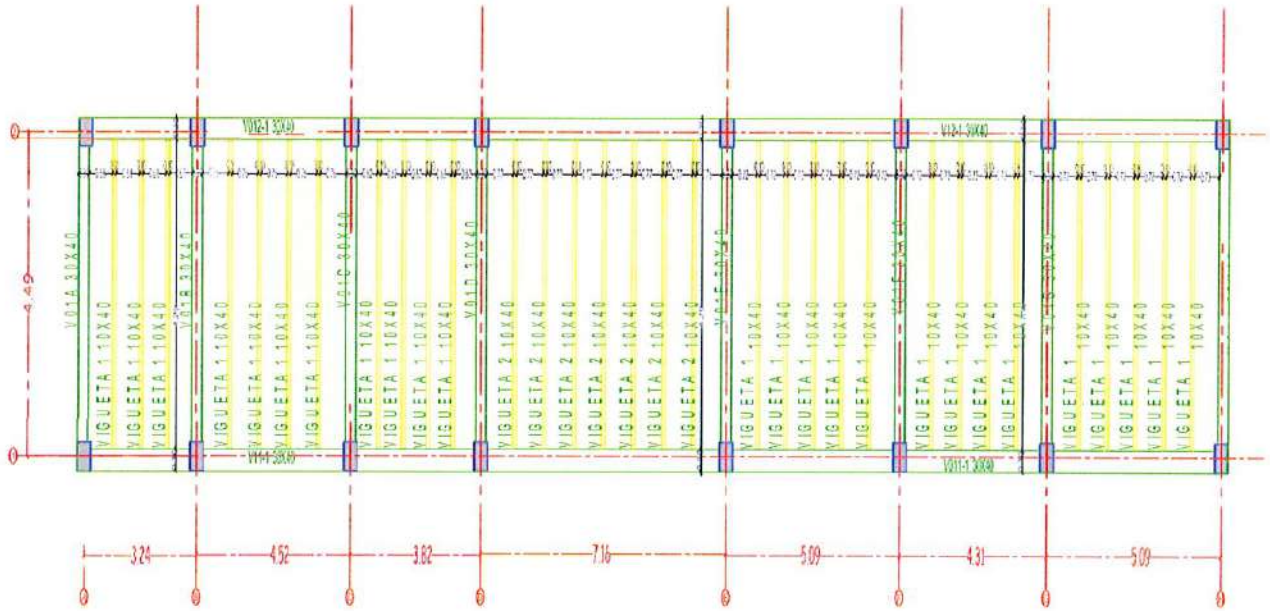

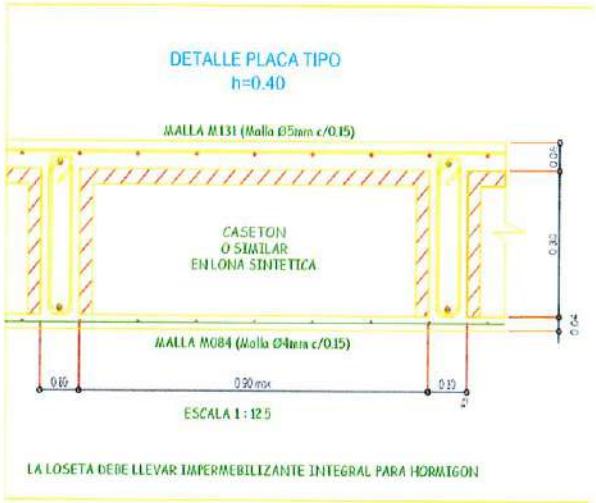

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 704 DESCRIPCION DEL ITEM: Acero de refuerzo PDR - 60 UND KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
ACERO DE REFUEZO ZAPATAS	ANEXO PLANILLA DE ACERO			1.00	284,68	KG	284,68
ACERO DE REFUERZO VIGA DE AMARRE	ANEXO PLANILLA DE ACERO			1.00	1503.26	KG	1787.94
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS	ANEXO PLANILLA DE ACERO			1.00	1798.30	KG	3586.23
ACERO DE REFUERZO VIGA SUPERIOR Y VIGUETAS	ANEXO PLANILLA DE ACERO			1.00	2240.28	KG	5826.51
TOTAL EJECUTADO						KG	5826.51

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025

CANTIDAD TOTAL ACERO DE REFUERZO
ADMINISTRACION

LOCALIZACION	CANTIDAD (kg) D=3/8 (#3)	CANTIDAD (kg) D=1/2 (#4)	CANTIDAD (kg) D=5/8 (#5)	CANTIDAD (kg) D=3/4 (#6)	TOTAL
ACERO ZAPATAS	0	284.6816	0	0	284.68
ACERO VIGAS CIMENTACION	428.96	422.97	330.20	321.12	1503.26
ACERO COLUMNAS	983.81	0.00	814.49	0.00	1798.30
ACERO CUBIERTA	918.40	412.47	909.41	0.00	2240.28
			TOTAL CIMENTACION KG		5826.51


ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025

ACERO ZAPATAS

DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#ZAPATAS	CANTIDAD POR ZAPATA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#4	D=1/2	Z1 (A1, E1, A3, E3) SECCION 1,50*1,50 H=0,35	0.175 — 1,35 — 0.175 7#4 L=1,70	1.7	0.35	1.35	8	7	56	0.994		94.63		
#4	D=1/2	Z1 (A1, E1, A3, E3) SECCION 1,50*1,50 H=0,35	0.175 — 1,35 — 0,175 7#4 L=1,70	1.7	0.35	1.35	8	7	56	0.994		94.63		
#4	D=1/2	Z3 (B1, C1, D1, B3,C3,D3) SECCION 1,00*1,00 H=0,35	0.175 — 0,85 — 0.175 5#4 L=1,20	1.2	0.35	0.85	8	5	40	0.994		47.71		
#4	D=1/2	Z3 (B1, C1, D1, B3,C3,D3) SECCION 1,00*1,00 H=0,35	0.175 — 0,85 — 0.175 5#4 L=1,20	1.2	0.35	0.85	8	5	40	0.994		47.71		

CUADRO DE CIMIENTOS





TIPO	NOMBRE	CANTIDAD	SECCION BXH	ALTURA		HIERROS	
Z1	A1, A2, D1, D2 E1, E2, H1, H2	8	1.50X1.50	0.35	7Ø1/2" 7Ø1/2"	L = 1.70 L = 1.70	
Z2	B1, B2, C1, C2 F1, F2, G1, G2	8	1.00X1.00	0.35	5Ø1/2" 5Ø1/2"	L = 1.20 L = 1.20	

								TOTAL ACERO EN KGS	0	284.68	0.00	0.00

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025



ACERO COLUMNAS

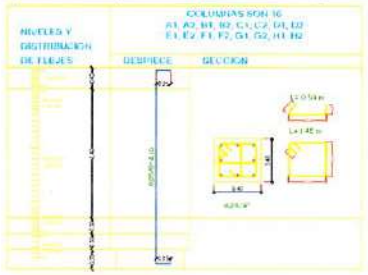DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#COLUMNAS	CANTIDAD POR COLUMNA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#5	D=5/8	COLUMNA A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2,G1,G2,H1,H2		4.1	0.5	3.6	16	8	128	1.552			814.49	
#3	D=3/8	COLUMNA A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2,G1,G2,H1,H2 FLEJES		1.45			16	45	720	0.56	584.64			
#3	D=3/8	COLUMNA A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2,G1,G2,H1,H2 GANCHOS		0.50			16	90	1440	0.56	399.17			
														
								TOTAL ACERO EN KGS			983.81	0.00	814.49	0.00

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025


ACERO VIGAS CIMENTACION ADMINISTRACION
VIGA 01-1 Y VIGA 02-1

DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0,25 — 2#4 L=6,00 — 5,75	6	0.25	5.75	2	2	4	0.994		23.86		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0,25 — 1#5 L=6,00 — 5,75	6	0.25	5.75	2	1	2	1.552			18.624	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=4.97	4.97		4.97	2	2	4	0.994		19.76		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=4.97	4.97		4.97	2	1	2	1.552			15.42688	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=3.25 — 3.00 — 0,25	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=3.25 — 3.00 — 0,25	3,25	0,25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0.25 — 5.75 — 2#4 L=6,00	6	0.25	5.75	2	2	4	0.994		23.86		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0.25 — 5.75 — 1#5 L=6,00	6	0.25	5.75	2	1	2	1.552			18.624	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=4.97	4.97		4.97	2	2	4	0.994		19.76		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=4.97	4.97		4.97	2	1	2	1.552			15.42688	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y E) (30*30)	3.00 — 2#4 L=3.25 — 0.25	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	3.00 — 1#5 L=3.25 — 0.25	3.25	0.25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#3	D=3/8	V01-1 Y V02-1 (FLEJES) (30*30)		1			2	85	170	0.56	95.2			
														
								TOTAL ACERO EN KGS			95.2	113.08	88.27776	0

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025


ACERO VIGAS CIMENTACION ADMINISTRACION
VIGA 01-2 Y VIGA 02-2

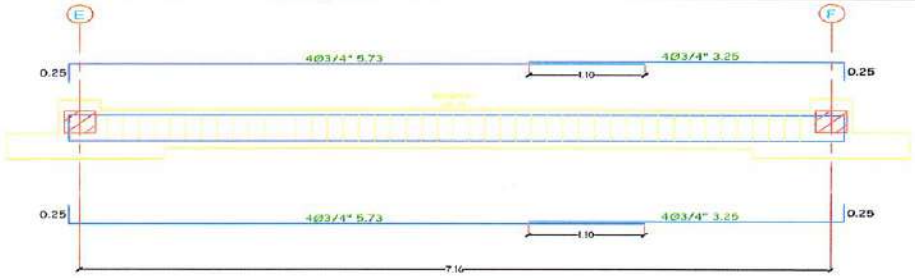
DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#6	D=3/4	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE D Y E) (50*40)	0,25 — 4#6 L=5.73 — 5.48	5.73	0.25	5.48	2	4	8	2.235				102.4524
#6	D=3/4	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE D Y E) (50*40)	4#6 L=3,00 — 3.00 — 0,25	3.25	0.25	3	2	4	8	2.235				58.11
#6	D=3/4	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE D Y E) (50*40)	0.25 — 5.48 — 4#6 L=5.73	5.73	0.25	5.48	2	4	8	2.235				102.4524
#6	D=3/4	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE D Y E) (50*40)	3.00 — 0.25 — 4#6 L=3.25	3.25	0.25	3	2	4	8	2.235				58.11
#3	D=3/8	V01-1 Y V02-1 (FLEJES) (50*40)	L= 1.60 m 	1.6			2	45	90	0.56	80.64			
														
								TOTAL ACERO EN KGS			80.64	0.00	0	321.1248

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

AGOSTO DE 2025

ACERO VIGAS CIMENTACION ADMINISTRACION
VIGA 01-3 Y VIGA 02-3

DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0,25 2#4 L=3.25 / 3.00	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0,25 1#5 L=3.25 / 3.00	3.25	0.25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=5.59	5.59		5.59	2	2	4	0.994		22.23		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=5.59	5.59		5.59	2	1	2	1.552			17.35136	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=6.00	6		6	2	2	4	0.994		23.86		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=6.00	6		6	2	1	2	1.552			18.624	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=3.25 / 3.00 0,25	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=3.25 / 3.00 0,25	3.25	0.25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0.25 3.00 / 2#4 L=3.25	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	0.25 3.00 / 1#5 L=3.25	3.25	0.25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=5.59	5.59		5.59	2	2	4	0.994		22.23		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=5.59	5.59		5.59	2	1	2	1.552			17.35136	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	2#4 L=6.00	6		6	2	2	4	0.994		23.86		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (SUPERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	1#5 L=6.00	6		6	2	1	2	1.552			18.624	
#4	D=1/2	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y E) (30*30)	3.00 / 2#4 L=3.25 0.25	3.25	0.25	3	2	2	4	0.994		12.92		
#5	D=5/8	V01-1 Y V02-1 (INFERIOR ENTRE A Y D) (30*30)	3.00 / 1#5 L=3.25 0.25	3.25	0.25	3	2	1	2	1.552			10.088	
#3	D=3/8	V01-1 Y V02-1 (FLEJES) (30*30)		1			2	102	204	0.56	114.24			





								TOTAL ACERO EN KGS	114.24	143.85168	112.30272	0

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

ACERO VIGAS CIMENTACION ADMINISTRACION

AGOSTO DE 2025

VIGA 0A-1, VIGA 0B-1, VIGA 0C-1 , VIGA 0D-1, VIGA 0E-1, VIGA 0F-1, VIGA 0G-1, VIGA 0H-1

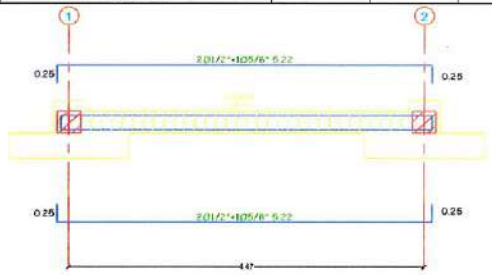DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#4	D=1/2	V0A-1 , 0B-1 , 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1 (SUPERIOR ENTRE F Y H) (30*30)	0,25 — 2#4 L=5.22 — 4.72 — 0,25	5.22	0.5	4.72	8	2	16	0.994		83.02		
#5	D=5/8	V0A-1 , 0B-1 , 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1 (SUPERIOR ENTRE F Y H) (30*30)	0,25 — 1#5 L=5.22 — 4.72 — 0,25	5.22	0.5	4.72	8	1	8	1.552			64.81152	
#4	D=1/2	V0A-1 , 0B-1 , 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1 (INFERIOR ENTRE F Y H) (30*30)	0,25 — 4.72 — 2#4 L=5.22 — 0.25	5.22	0.5	4.72	8	2	16	0.994		83.02		
#5	D=5/8	V0A-1 , 0B-1 , 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1 (INFERIOR ENTRE F Y H) (30*30)	0,25 — 4.72 — 1#5 L=5.22 — 0.25	5.22	0.5	4.72	8	1	8	1.552			64.81152	
#3	D=3/8	V0A-1 , 0B-1 , 0C-1, 0D-1, 0E-1, 0F-1, 0G-1, 0H-1 (FLEJES) (30*30)		1			8	31	248	0.56	138.88			
														
								TOTAL ACERO EN KGS			138.88	166.03776	129.62304	0.00


								TOTAL ACERO EN KGS			428.96	422.97	330.20	321.12

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

FEBRERO DE 2023

ACERO VIGAS CUBIERTA ADMINISTRACION
VIGA 11-1 Y VIGA 13-1

DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 ENTRE A Y H) (SUPERIOR (30*40)	0,25 2#5 L=6.00 5.75	6	0.25	5.75	2	2	4	1.552			37.248	
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 ENTRE A Y H) (SUPERIOR (30*40)	2#5 L=6.00	6	0	6	2	10	20	1.552			186.24	
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 ENTRE A Y H) (SUPERIOR (30*40)	1#4 L=3.00	3	0	3	2	6	12	0.994		35.78		
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 ENTRE A Y H) (SUPERIOR (30*40)	2#5 L=3.73 3.48 0,25	3.73	0.25	3.48	2	2	4	1.552			23.16	
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	0.25 5.75 2#5 L=6.00	6	0.25	5.75	2	2	4	1.552			37.25	
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	2#5 L=6.00	6	0	6	2	10	20	1.552			186.24	
#5	D=5/8	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	11,75 0.25 2#5 L=12,00	12	0.25	11.75	2	2	4	1.552			74.50	
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=2.30	2.3	0	2.3	2	1	2	0.994		4.57		
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=3.20	3.2	0	3.2	2	1	2	0.994		6.36		
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=2.70	2.7	0	2.7	2	1	2	0.994		5.37		
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=5.00	5	0	5	2	1	2	0.994		9.94		
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=3.60	3.6	0	3.6	2	2	4	0.994		14.31		
#4	D=1/2	V11-1 Y V12-1 (INFERIOR ENTRE A YH) (30*40)	1#4 L=3.00	3	0	3	2	1	2	0.994		5.96		
#3	D=3/8	V11-1 Y V13-1 (FLEJES) (30*40)		1.25			2	292	584	0.56	408.8			




								TOTAL ACERO EN KGS	408.8	82.30	544.63	0

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

FEBRERO DE 2023

ACERO VIGAS CUBIERTA ADMINISTRACION
VIGA 1A-1, 1B-1, 1C-1, 1D-1, 1E-1

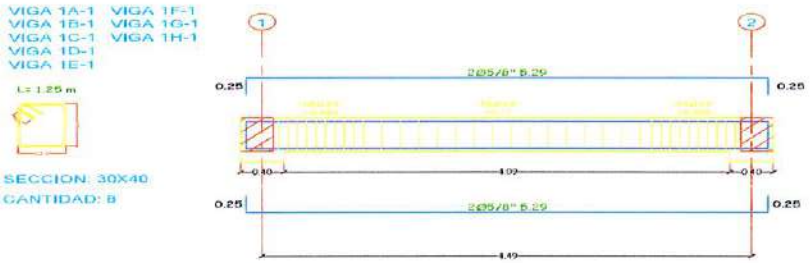
DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGAS	CANTIDAD POR VIGA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#5	D=5/8	V1A-1, V1B-1, V1C-1, V1D-1, V1D-1, V1E-1, V1F-1, V1G-1 , V1H-1 (SUPERIOR ENTRE 1 Y 2) (30*40)	0,25 — 2#5 L=5.29 — 4.79 — 0,25	5.29	0.5	4.79	8	2	16	1.552			131.36	
#5	D=5/8	V1A-1, V1B-1, V1C-1, V1D-1, V1D-1, V1E-1, V1F-1, V1G-1 , V1H-1 (INFERIOR ENTRE 1 Y 2) (30*40)	0.25 — 4.79 — 2#5 L=5.29 — 0.25	9.4	0.5	8.9	8	2	16	1.552			233.42	
#3	D=3/8	V1A-1, V1B-1, V1C-1, V1D-1, V1D-1, V1E-1, V1F-1, V1G-1 , V1H-1 FLEJES (30*40)		1.25			8	35	280	0.56	196.00			
														
								TOTAL ACERO EN KGS			196.0	0.00	364.78	0

ACERO DE REFUERZO SAN GIL

FEBRERO DE 2023

ACERO VIGAS CUBIERTA ADMINISTRACION
VIGUETA 1

DESIGNACION NOMINAL	DIAMETRO Ø	UBICACIÓN	ESQUEMA	LONGITUD	GANCHO	DESARROLLO	#VIGUETAS	CANTIDAD POR VIGUETA	CANTIDAD TOTAL	PESO NOMINAL (kg/m)	PESO (kg) #3	PESO (kg) #4	PESO (kg) #5	PESO (kg) #6
#4	D=1/2	VIGUETA 1(10*40)	0.20 — 1#4 L=5.19 — 4.69 — 0.20	5.19	0.5	4.69	32	1	32	0.994		165.08		
#4	D=1/2	VIGUETA 1(10*40)	0.20 — 4.69 — 1#4 L=5.19 — 0.20	5.19	0.5	4.69	32	1	32	0.994		165.08		
#3	D=3/8	VIGUETA 1(10*40)		0.5			32	35	1120	0.56	313.60			

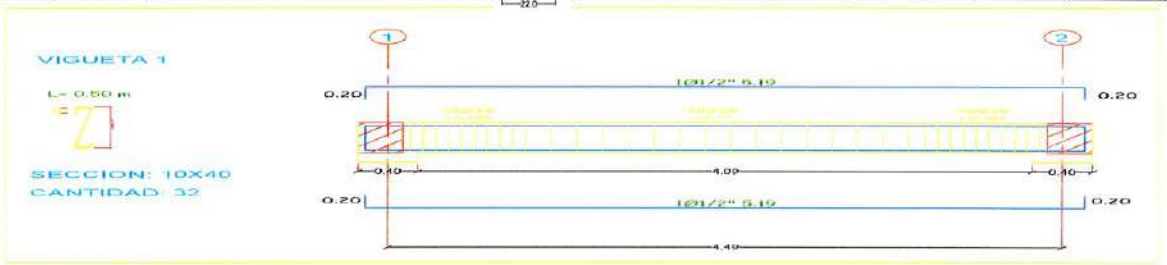

								TOTAL ACERO EN KGS			313.60	330.17	0.00	0.00
								TOTAL ACERO EN KGS			918.40	412.47	909.41	0.00

vesmaco.com synthetic resins for sport and civil surfaces

Vesmaco di Cacciani Claudia
Via Cassolo 15, 60030 Monsano (AN) Italy - Tel. +39 0731 60070
P.Iva 02622300420 - vesmaco@vesmaco.com - www.vesmaco.com

Ciclo/sistema durflex® 101 sp roller professional – homologado CLASS 1 WORLD SKATE / aprobado Fedepatín:

- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 1 / Resurface (para rellenar las cavedades del asfalto)*
- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 2 (fase intermedia)*
- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 3 finish (acabado)*

Pavimentación específica para la práctica calificada del patinaje sobre ruedas, para todas las instalaciones que requieren el sistema skating homologado CLASS 1 WORLD SKATE / Aprobado Fedepatín

Base de apoyo	*Conglomerado bituminoso open grade, realizado con específicas técnicas constructivas sugeridas por Vesmaco.*
Composición	*Ciclo/sistema a base de resinas acrílicas con adición de agregados de diferente medidas y tipologías diferenciados por cada fase del ciclo/sistema;*
Aplicación	*Manual con espatulas por técnicos calificados Vesmaco;*
Colores	*Combinaciones cromáticas a petición;*
Empleo	*Específico para la práctica del patinaje sobre ruedas de alto nivel Agonístico y/o mundial;*
Características	*Pavimentación sintético/resinosa colada en obra directamente sobre soporte en conglomerado bituminoso, con características innovadoras que revoluciona el antiguo concepto de pista de patinaje sobre concreto.* *Ausencia de cortes transversales, elevado confort de empleo, baja traumaticidad de impacto en caso de caída, elevado grado de fluidez, y también de adherencia efectiva y percibida.* *Sistema caracterizado por una alta y óptima calidad que permite un desgaste mínimo de las ruedas manteniendo las características iniciales de agarre, suavidad y color durante mucho tiempo*

HOMOLOGATED BY

WORLD SKATE

APROBADO

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

WORLD SKATE
FACILITIES

CERTIFICATION OF FINISHING SYSTEMS FOR SPEED SKATING SPORTS FLOORING

World Skate | International Federation
Maison du Sport International | Av. De Rhodanie, 54 | 1007 | Lausanne | Switzerland
Phone +41 216011877 | info@worldskate.org | secretariat@worldskate.org | www.worldskate.org

WORLD SKATE
FACILITIES

CERTIFICATE

This certificate is issued for the finishing systems (the product cycle) of sports flooring that can be used for activities and competitions for skating specialties. The certification refers to the materials applied according to a cycle defined by the manufacturer (the product cycle) on the basis of a specific type of support or underlayment material that is provided.

Specialty: speed skating
Certification level: class 1 – international competition

Duration: temporary
Date of initiation: February 17, 2023
Expiration date: February 17, 2024
Company name: COURTSOL

SYSTEM (CYCLE PRODUCT)

System (cycle product): top layer flooring for speed skating rinks

Support of the foreseen product cycle: ASPHALT
Identification or name of the product cycle: COURTSOL WORLDCHAMP ROLLER SYSTEM
Test laboratory: Labosport (Italy) test certificate N°23-0117IT-B dated FEBRUARY 28TH 2023

Tests carried out by the laboratory:

- Hardness Isa 7619-1 (shore AM)
- EN 1969 thickness (mm)
- Air mass EN ISO 23997 (g/m2)
- Traction EN 12230 (kPa)
- Pendulum EN 16837: 0° dry, 90° dry, 0° wet, 90° wet
- Rotation resistance: 50/200mm (Met. Int.) (N)

The laboratory results have been acknowledged by the World Skate Facilities Department.

The technical data sheet of the product cycle includes:

- Nature and technical specifications of the support beneath the target layer (asphalt, concrete, metal, wood, etc.);
- Recommended thickness and substrate characteristics;
- Granulometric curves are suggested for aggregates used to construct the substrate.

Applicator: Exclusively personnel of the company holding this certificate or, in any event, personnel referenced and authorized, adequately instructed and trained, by the company itself.

WORLD SKATE
FACILITIES

Warranty: In order for this certification to be valid, the product cycle must have a minimum five-year warranty that has been certified by the company.

For the purposes of the validity and use of this World Skate certification, the manufacturer declares that the sports flooring's resin cycle has:

- no toxicity is released during processing or over time.
- a suitable degree of adherence;
- a suitable degree of smoothness;
- a suitable degree of elasticity capable of absorbing micro-cracks in the support;
- a suitable degree of permeability or impermeability based on the substrate;
- a suitable durability over time;
- a technical sheet for the user that defines the cycle and materials and certifies their characteristics, application methods, and durability;
- a time guarantee certified by the company of at least five years;

This certificate must always be accompanied by the company's specific product cycle technical sheets, which provide additional information about the product's characteristics and installation procedures.

Sabatino Aracu
President

World Skate | International Federation
Maison du Sport International | Av. De Rhodanie, 54 |1007 | Lausanne | Switzerland
Phone +41 216011877 | info@worldskate.org | secretariat@worldskate.org | www.worldskate.org

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1201 DESCRIPCION DEL ITEM: Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-2730.00	M2	-2730.00
PISTA OVALO 200M PRIMERA LAVADA PARA IMPRIMASION	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	-1313.00
PISTA OVALO 200M SEGUNDA LAVADA PARA BASE	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	104.00
PISTA OVALO 200M TERCERA LAVADA PARA CAPA FINAL	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	1521.00
TOTAL EJECUTADO						M2	1521.00

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1202 DESCRIPCION DEL ITEM: Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-2730.00	M2	-2730.00	
PISTA OVALO 200M PRIMERA LAVADA PARA IMPRIMASION	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	-1313.00	
PISTA OVALO 200M SEGUNDA LAVADA PARA BASE	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	104.00	
PISTA OVALO 200M TERCERA LAVADA PARA CAPA FINAL	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	1521.00	
TOTAL EJECUTADO						M2	1521.00	









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1203 DESCRIPCION DEL ITEM: Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas,incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-910.00	M2	-910.00	
PISTA OVALO 200M CAPA FINAL ACABADO	218.00	6.50		1.00	1417.00	M2	507.00	
TOTAL EJECUTADO						M2	507.00	

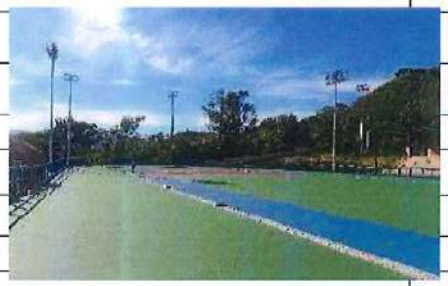







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

vesmaco.com synthetic resins for sport and civil surfaces

Vesmaco di Cacciani Claudia
Via Cassolo 15, 60030 Monsano (AN) Italy - Tel. +39 0731 60070
P.iva 02622300420 - vesmaco@vesmaco.com - www.vesmaco.com

Ciclo/sistema durflex® 101 sp roller professional – homologado CLASS 1 WORLD SKATE / aprobado Fedepatín:

- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 1 / Resurface (para rellenar las cavedades del asfalto)*
- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 2 (fase intermedia)*
- *durflex® 101 sp roller professional – Phase 3 finish (acabado)*

Pavimentación específica para la práctica calificada del patinaje sobre ruedas, para todas las instalaciones que requieren el sistema skating homologado CLASS 1 WORLD SKATE / Aprobado Fedepatín

Base de apoyo	*Conglomerado bituminoso open grade, realizado con específicas técnicas constructivas sugeridas por Vesmaco.*
Composición	*Ciclo/sistema a base de resinas acrílicas con adición de agregados de diferente medidas y tipologías diferenciados por cada fase del ciclo/sistema;*
Aplicación	*Manual con espatulas por técnicos calificados Vesmaco;*
Colores	*Combinaciones cromáticas a petición;*
Empleo	*Específico para la práctica del patinaje sobre ruedas de alto nivel Agonístico y/o mundial;*
Características	*Pavimentación sintético/resinosa colada en obra directamente sobre soporte en conglomerado bituminoso, con características innovadoras que revoluciona el antiguo concepto de pista de patinaje sobre concreto.* *Ausencia de cortes transversales, elevado confort de empleo, baja traumaticidad de impacto en caso de caída, elevado grado de fluidez, y también de adherencia efectiva y percibida.* *Sistema caracterizado por una alta y óptima calidad que permite un desgaste mínimo de las ruedas manteniendo las características iniciales de agarre, suavidad y color durante mucho tiempo*

HOMOLOGATED BY

WORLD SKATE

APROBADO

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE

WORLD SKATE
FACILITIES

CERTIFICATION OF FINISHING SYSTEMS FOR SPEED SKATING SPORTS FLOORING

World Skate | International Federation
Maison du Sport International | Av. De Rhodanie, 54 | 1007 | Lausanne | Switzerland
Phone +41 216011877 | info@worldskate.org | secretariat@worldskate.org | www.worldskate.org

WORLD SKATE
FACILITIES

CERTIFICATE

This certificate is issued for the finishing systems (the product cycle) of sports flooring that can be used for activities and competitions for skating specialties. The certification refers to the materials applied according to a cycle defined by the manufacturer (the product cycle) on the basis of a specific type of support or underlayment material that is provided.

Specialty: speed skating
Certification level: class 1 – international competition

Duration: temporary
Date of initiation: February 17, 2023
Expiration date: February 17, 2024
Company name: COURTSOL

SYSTEM (CYCLE PRODUCT)

System (cycle product): top layer flooring for speed skating rinks

Support of the foreseen product cycle: ASPHALT
Identification or name of the product cycle: COURTSOL WORLDCHAMP ROLLER SYSTEM
Test laboratory: Labosport (Italy) test certificate N°23-0117IT-B dated FEBRUARY 28TH 2023

Tests carried out by the laboratory:

- Hardness Isa 7619-1 (shore AM)
- EN 1969 thickness (mm)
- Air mass EN ISO 23997 (g/m2)
- Traction EN 12230 (kPa)
- Pendulum EN 16837: 0° dry, 90° dry, 0° wet, 90° wet
- Rotation resistance: 50/200mm (Met. Int.) (N)

The laboratory results have been acknowledged by the World Skate Facilities Department.

The technical data sheet of the product cycle includes:

- Nature and technical specifications of the support beneath the target layer (asphalt, concrete, metal, wood, etc.);
- Recommended thickness and substrate characteristics;
- Granulometric curves are suggested for aggregates used to construct the substrate.

Applicator: Exclusively personnel of the company holding this certificate or, in any event, personnel referenced and authorized, adequately instructed and trained, by the company itself.

World Skate | International Federation
Maison du Sport International | Av. De Rhodanie, 54 | 1007 | Lausanne | Switzerland
Phone +41 216011877 | info@worldskate.org | secretariat@worldskate.org | www.worldskate.org

WORLD SKATE
FACILITIES

Warranty: In order for this certification to be valid, the product cycle must have a minimum five-year warranty that has been certified by the company.

For the purposes of the validity and use of this World Skate certification, the manufacturer declares that the sports flooring's resin cycle has:

- no toxicity is released during processing or over time.
- a suitable degree of adherence;
- a suitable degree of smoothness;
- a suitable degree of elasticity capable of absorbing micro-cracks in the support;
- a suitable degree of permeability or impermeability based on the substrate;
- a suitable durability over time;
- a technical sheet for the user that defines the cycle and materials and certifies their characteristics, application methods, and durability;
- a time guarantee certified by the company of at least five years;

This certificate must always be accompanied by the company's specific product cycle technical sheets, which provide additional information about the product's characteristics and installation procedures.

Sabatino Aracu
President

World Skate | International Federation
Maison du Sport International | Av. De Rhodanie, 54 |1007 | Lausanne | Switzerland
Phone +41 216011877 | info@worldskate.org | secretariat@worldskate.org | www.worldskate.org

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1302 DESCRIPCION DEL ITEM: Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-1358.49	M2	-1358.49
PISTA DE 200M LAVADO INTERNA	64.69	30.00		1.00	1940.70	M2	582.21
TOTAL EJECUTADO						M2	582.21

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1303 DESCRIPCION DEL ITEM: Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-1358.49	M2	-1358.49	
PISTA DE 200M OVALO 1 CAPA	64.69	30.00		1.00	1940.70	M2	582.21	
TOTAL EJECUTADO						M2	582.21	









Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1304 DESCRIPCION DEL ITEM: Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con dos capas cruzadas, incluye lineas para demarcación. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-1358.49	M2	-1358.49	
PISTA DE 200M OVALO 2 CAPA	64.69	30.00		1.00	1940.70	M2	582.21	

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

v

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1305 DESCRIPCION DEL ITEM: Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas,incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin. UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-1358.49	M2	-1358.49	
PISTA DE 20CM OVALO 3 CAPA	64.69	30.00		1.00	1940.70	M2	582.21	
TOTAL EJECUTADO						M2	582.21	









Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025


No. ITEM PRESUPUESTO: 1403 DESCRIPCION DEL ITEM: malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha. UND m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
MALLA DE REFUERZO TORTA INFERIOR	33.64	4.89		1.00	164.50	M2	164.50
MALLA DE REFUERZO TORTA SUPERIOR	33.64	4.89		1.00	164.50	M2	329.00
TOTAL EJECUTADO						M2	329.00





ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

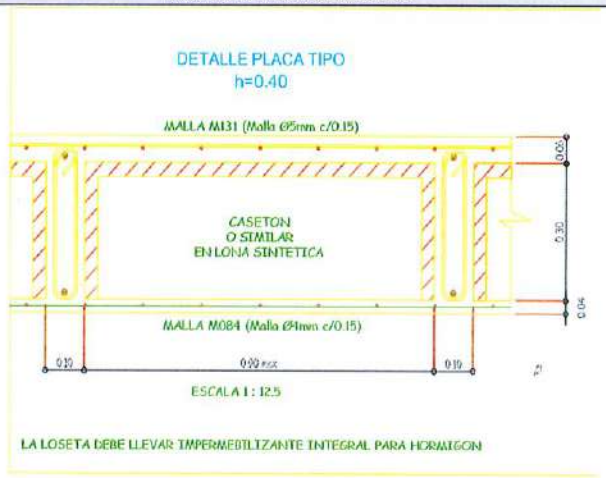

LA LOSETA DEBE LLEVAR IMPERMEBILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGON

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1404 DESCRIPCION DEL ITEM: Empradización Zonas Verdes) UND M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
DESCUENTO DEL ACTA ANTERIOR					-2590.61	M2	-2590.61
AREA 1 ZONA SUPERIOR DERECHA DE GRADERIA	303.87				303.87	M2	-2286.74
AREA 2 ZONA ENTRE ANDEN DE PISTA DE 400M Y CONEXIÓN DE GRADERIA SUPERIOR	184.60				184.60	M2	-2102.14
AREA 3 ZONA DE PISTA DE 400M ADYACENTE DE CAMINO REAL	164.43				164.43	M2	-1937.71
AREA 4 ZONA DE PISTA DE 400M ADYACENTE DE ADMINISTRACION	146.30				146.30	M2	-1791.41
AREA 5 ZONA DE PISTA DE 400M ADYACECENTE DE PARQUEADERO	94.93				94.93	M2	-1696.48
AREA 6 ZONA DE PISTA DE 400M ADYACENTE DE PARQUEADERO Y RECTA	27.95				27.95	M2	-1668.53
AREA 7 ZONA DE PARQUEADERO	55.87				55.87	M2	-1612.66
AREA 8 ZONA FRENTE A CASONA A PISTA 400M	163.04				163.04	M2	-1449.62
AREA 9 ZONA DE PARQUEADERO A CASONA	70.40				70.40	M2	-1379.22
AREA 10 ZONA DE PARQUEADERO A CASONA	70.60				70.60	M2	-1308.62
AREA 11 ZONA DE RAMPA DE PMR Y RECTA DE PISTA 400M	127.95				127.95	M2	-1180.67
AREA 12 ZONA ENTRE PISTA DE 400M Y 200M COSTADO IZQUIERDO	639.27				639.27	M2	-541.40
AREA 13 ZONA ENTRE PISTA DE 400M Y 200M COSTADO DERECHA	1566.42				1566.42	M2	1025.02
AREA 14 ZONA PISTA DE 400	1379.78				1379.78	M2	2404.80
TOTAL EJECUTADO						M2	2404.80

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1404 DESCRIPCION DEL ITEM: Empradización Zonas Verdes) UND M2

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

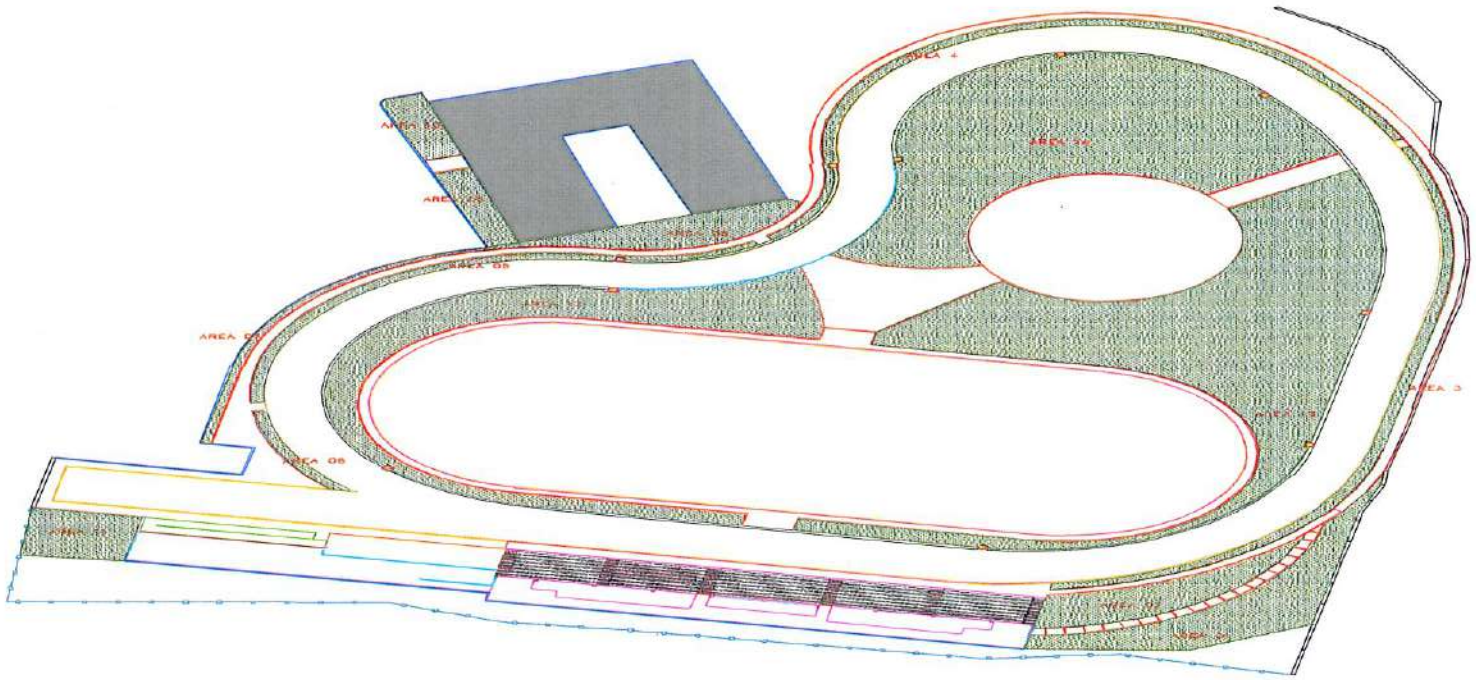

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1511 DESCRIPCION DEL ITEM: Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada) UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
POSTE DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR				1.00	1.00	UND	1.00	
TOTAL EJECUTADO						UND	1.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1511 DESCRIPCION DEL ITEM: Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada) UND UND

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

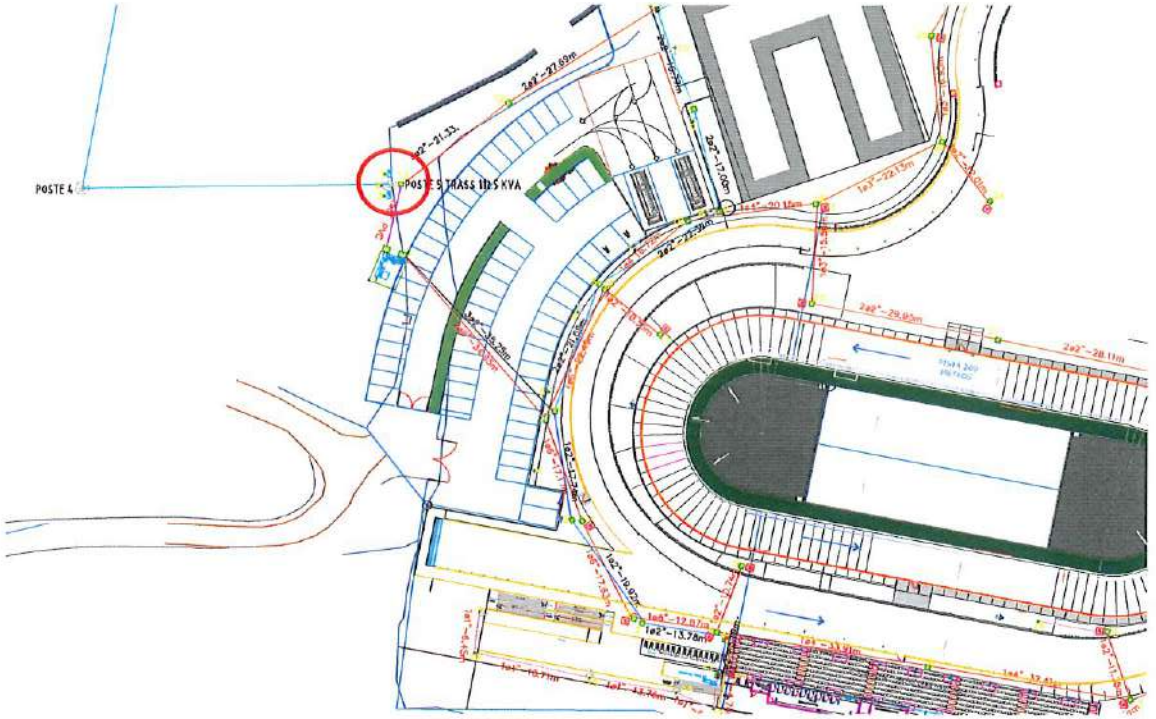

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1521 DESCRIPCION DEL ITEM: Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13,2/0,208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba). UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
TRANSFORMADOR POSTE 5				1.00	1.00	UND	1.00	
TOTAL EJECUTADO						UND	1.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO:	1521	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13,2/0,208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba).	UND	UND

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

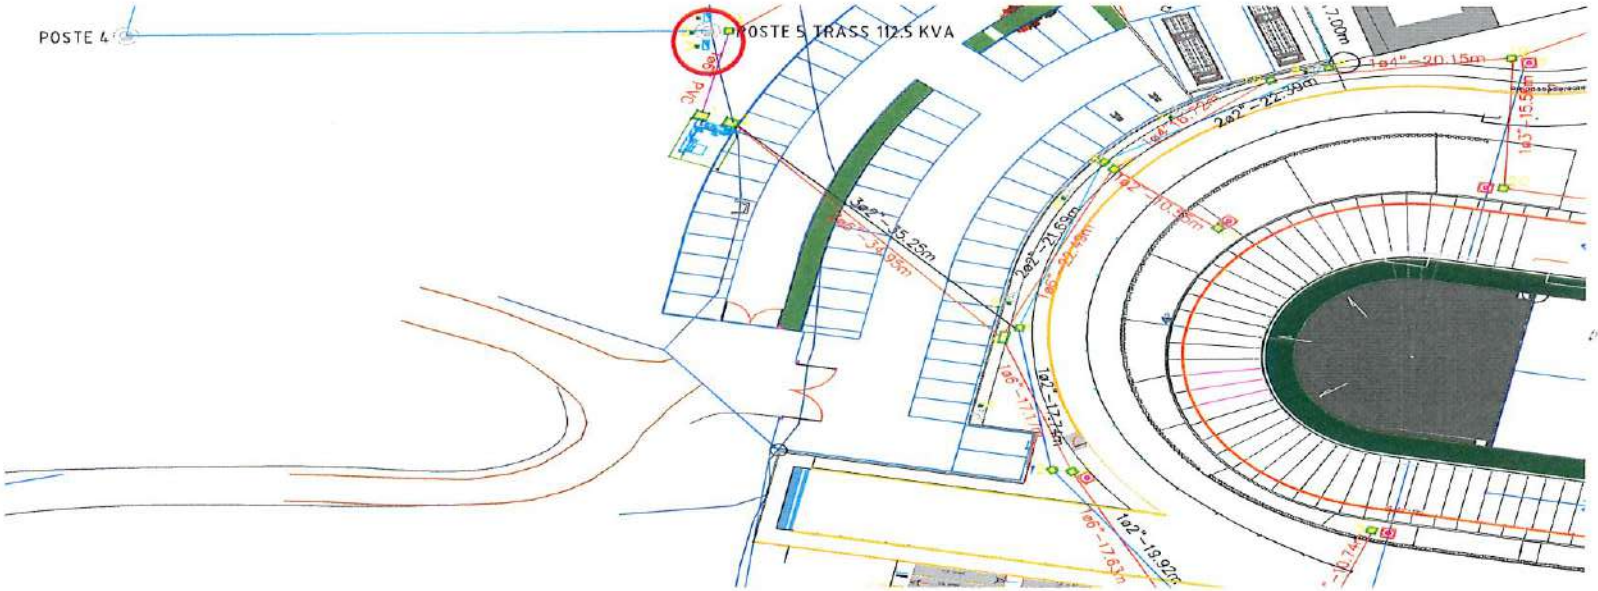

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1548 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calla led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico) UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
LUMINARIAS PARA LA ZONA DE LA PARTE DE ATRÁS GRADERIAS				6.00	6.00	UND	6.00
LUMINARIAS PARA LA ZONA DE ANDEN DE LA PISTA DE 400M Y CASONA				9.00	9.00	UND	15.00
TOTAL EJECUTADO						UND	15.00






ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO






Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO:	1548	DESCRIPCION DEL ITEM:	suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calla led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	UND

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

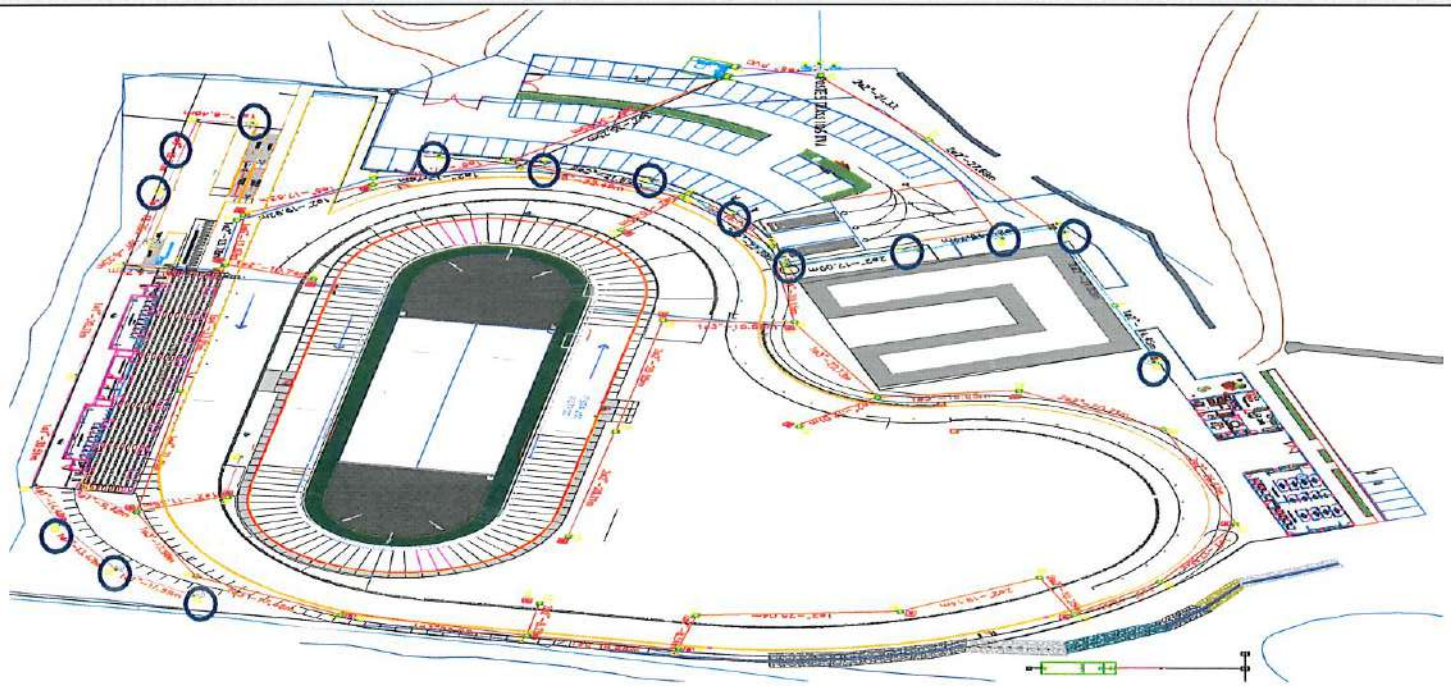

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1556 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion estructura de m.t. de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva) UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
POSTE 1				1.00	1.00	UND	1.00	
POSTE 2				1.00	1.00	UND	2.00	
POSTE 3				1.00	1.00	UND	3.00	
POSTE 4				1.00	1.00	UND	4.00	
TOTAL EJECUTADO						und	4.00	









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO:	1556	DESCRIPCION DEL ITEM:	suministro e instalacion estructura de m.t. de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva)	UND	UND

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

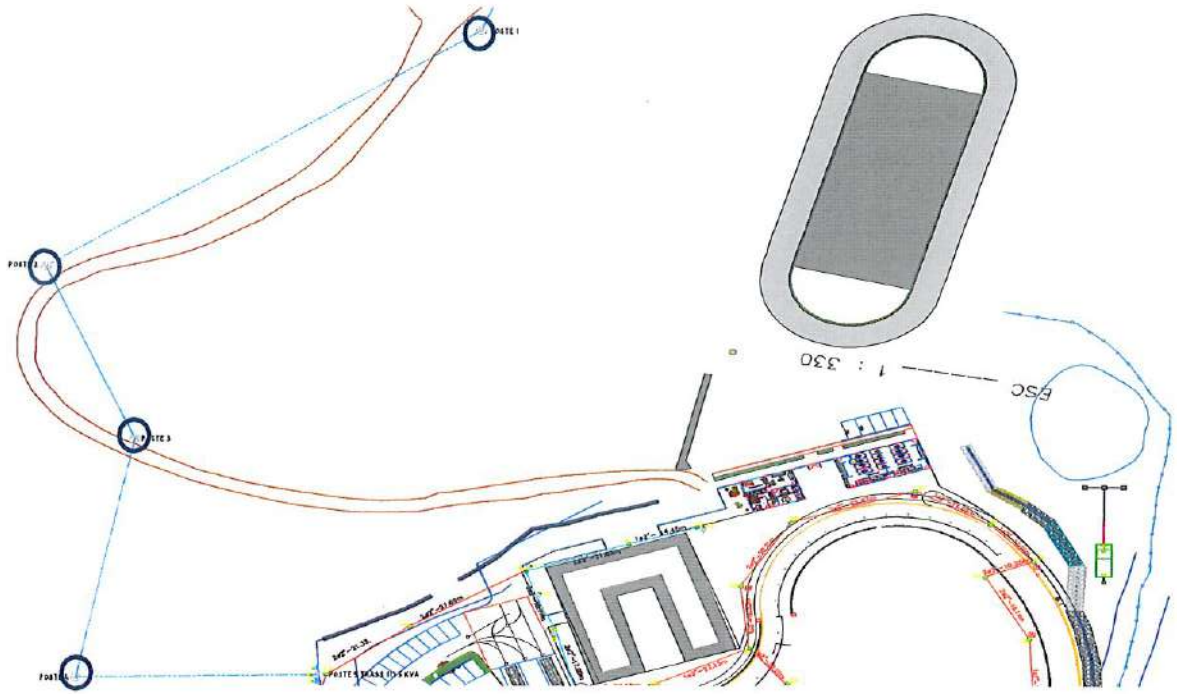

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1557 DESCRIPCION DEL ITEM: retenida estructura baja tension UND UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
POSTE 3				1.00	1.00	UND	1.00	
POSTE 4				1.00	1.00	UND	2.00	
POSTE 5				1.00	1.00	UND	3.00	
TOTAL EJECUTADO						M2	3.00	







Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1557 DESCRIPCION DEL ITEM: retenida estructura baja tension UND UND

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

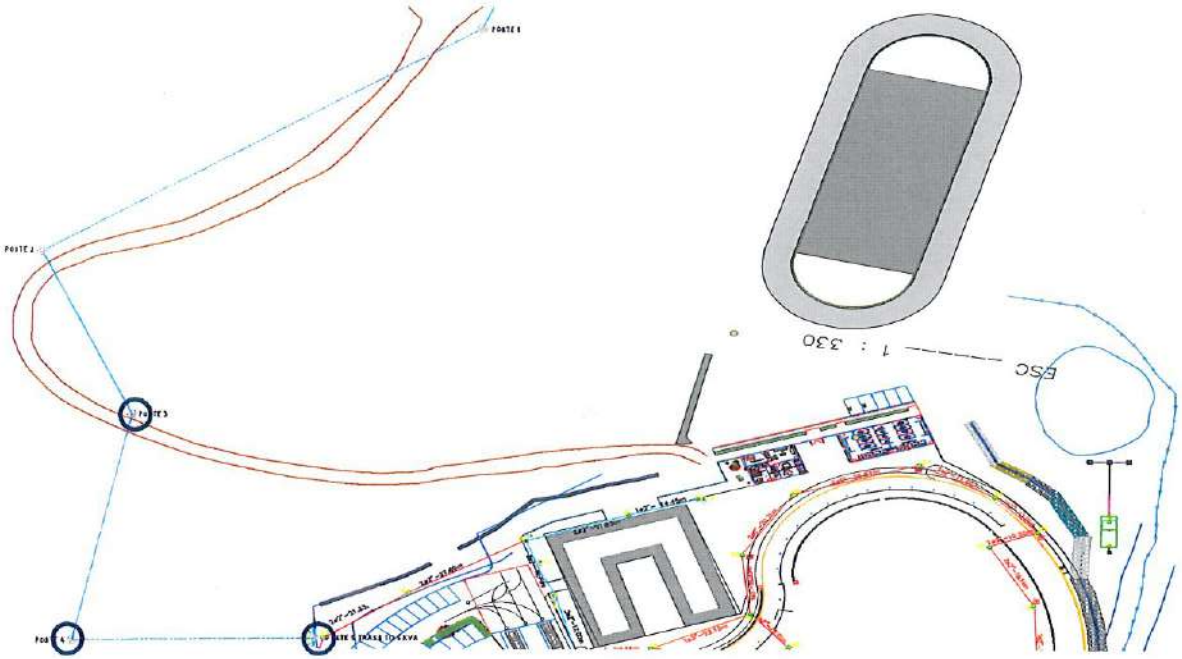

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoría

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025 CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1701 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra UND ML

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES Largo			Cantidad	TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
CJ-SUB	1	CA	1	36.22			1.00	36.22	ML	36.22
CA	1	CA	5	23.00			1.00	23.00	ML	59.22
CA	5	CA	6	23.39			1.00	23.39	ML	82.61
CA	6	CA	7	18.00			1.00	18.00	ML	100.61
CA	7	CA	8	18.40			1.00	18.40	ML	119.01
CA	8	CA	10	38.50			1.00	38.50	ML	157.51
CA	1	CA	2	19.07			1.00	19.07	ML	176.58
CA	2	CA	3	21.40			1.00	21.40	ML	197.98
CA	3	CA	4	15.20			1.00	15.20	ML	213.18
CA	4	CA	11	7.70			1.00	7.70	ML	220.88
CABLE DE PUNTA CAPTADORA A BASE DEL MASTIL				20.00			18.00	360.00	ML	580.88
CJ-SUB	1	AP	1	35.95			1.00	35.95	ML	616.83
AP	1	AP	2	18.80			1.00	18.80	ML	635.63
AP	2	AP	3	19.10			1.00	19.10	ML	654.73
AP	3	AP	4	14.35			1.00	14.35	ML	669.08
AP	4	AP	5	12.45			1.00	12.45	ML	681.53
AP	4	AP	6	35.20			1.00	35.20	ML	716.73
AP	6	AP	7	34.20			1.00	34.20	ML	750.93
AP	7	AB	23	11.00			1.00	11.00	ML	761.93
AP	7	AP	8	13.00			1.00	13.00	ML	774.93
AP	7	AP	9	19.80			1.00	19.80	ML	794.73
TOTAL EJECUTADO									SUBTOTAL	794.73

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10


CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1701 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra UND ML

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
				Largo		Alto	Cantidad			
AP	9	AP	10	21.65			1.00	21.65	ML	21.65
AP	10	AP	11	24.80			1.00	24.80	ML	46.45
AP	11	AP	12	9.80			1.00	9.80	ML	56.25
AP	11	AP	13	20.10			1.00	20.10	ML	76.35
AP	13	AP	14	10.00			1.00	10.00	ML	86.35
AP	14	AP	15	26.50			1.00	26.50	ML	112.85
AP	15	AP	30	20.50			1.00	20.50	ML	133.35
AP	30	AP	29	11.60			1.00	11.60	ML	144.95
AP	29	AP	28	14.40			1.00	14.40	ML	159.35
AP	28	AP	27	19.00			1.00	19.00	ML	178.35
AP	27	AP	26	28.00			1.00	28.00	ML	206.35
AP	26	AP	25	21.40			1.00	21.40	ML	227.75
AP	25	AP	23	18.45			1.00	18.45	ML	246.20
AP	23	AP	24	13.40			1.00	13.40	ML	259.60
AP	23	AP	19	23.60			1.00	23.60	ML	283.20
AP	19	AP	20	17.40			1.00	17.40	ML	300.60
AP	20	AP	22	60.70			1.00	60.70	ML	361.30
AP	19	AP	18	21.60			1.00	21.60	ML	382.90
AP	18	AP	16	18.20			1.00	18.20	ML	401.10
TOTAL EJECUTADO									SUBTOTAL	401.10

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO



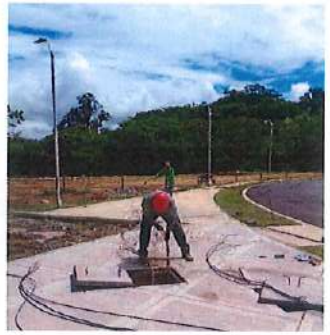

Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG

AREA TECNICA

MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1701 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra UND ML

LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
				Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
AP	16	AP	17	12.40			1.00	12.40	ML	12.40
AP	17	AP	1	23.95			1.00	23.95	ML	36.35
									SUBTOTAL	36.35
TOTAL EJECUTADO									TOTAL	1232.18

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO





Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	


FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1701 DESCRIPCION DEL ITEM: suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra UND ML

ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO

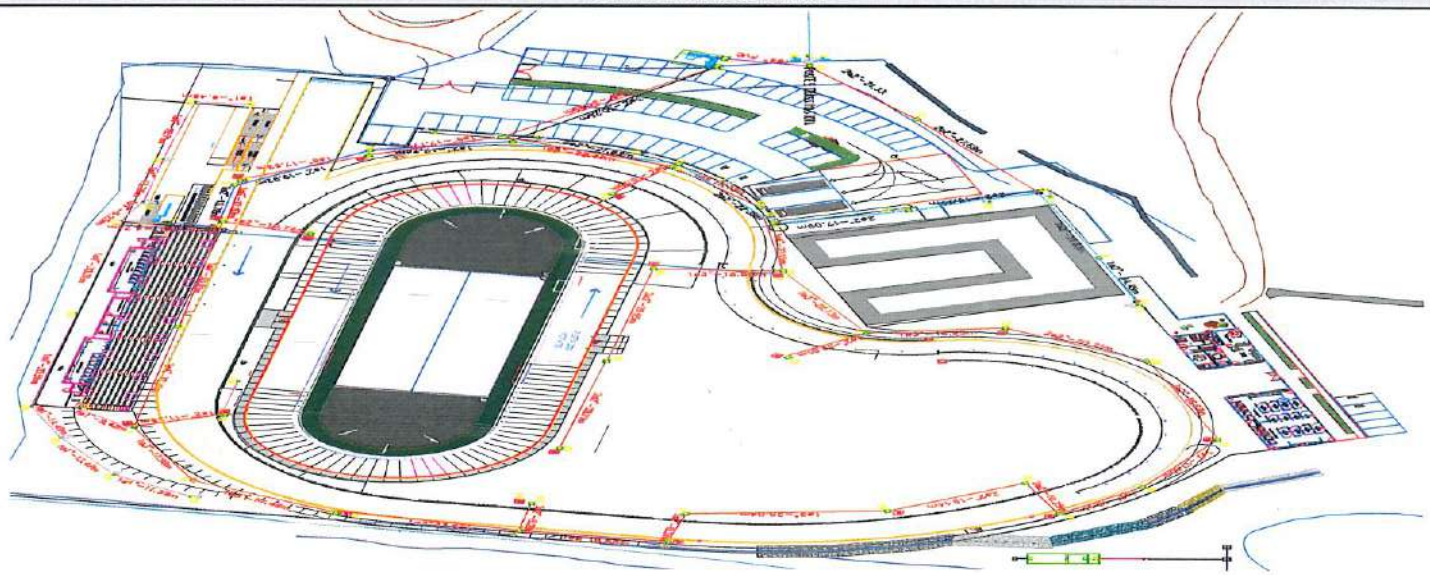

Elaboró

Firma: Camilo Portela

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

CONSORCIO CONDE PG	AREA TECNICA	
	MEMORIA DE CALCULO OBRA EJECUTADA	

FECHA: 3/10/2025

CONTRATO: COP-004-2022 ACTA: 10

CORTE DEL: 26/08/2025 AL 30/09/2025

No. ITEM PRESUPUESTO: 1809

DESCRIPCION DEL ITEM: pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm (suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño. incluye: soldadura de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxipoliamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a parales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.)

UND: ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL	UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad				
BARANDA PARA PISTA DE 200M	238.33			0.20	47.67	ML	47.67	
BARANDA PARA PISTA DE 400M	490.59			0.20	98.12	ML	145.78	
TOTAL EJECUTADO						M2	145.78	









Elaboró

Firma:

Nombre: Ing. Camilo Andres Portela Cardenas

Residente de Obra

Aprobó
INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Ing.Edinson Marquez Canaval

Residente de Interventoria

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER

Contrato obra Publica No. COP-004-2022

INFORME TECNICO N° 10
DEL 26 DE AGOSTO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Contratista:
CONSORCIO CONDE PG

Interventoría:
DAIMCO S.A.S.

SAN GIL, D.C, 14 de octubre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
CONTENIDO DE LAS TABLAS 3
CONTENIDO DE LAS ILUSTRACIONES 3
1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVO 7
2.1 OBJETIVOS GENERALES 7
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
3. ALCANCE 7
5. INFORME GENERAL DEL CONTRATO 12
5.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 15
5.2. PÓLIZAS Y SUS MODIFICACIONES 26
5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA 32
5.4. PROGRAMACIÓN 33
5.5. CORTES DE OBRA 33
5.6. PRESUPUESTO Y CANTIDADES 33
6. RECURSOS UTILIZADOS 93
6.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 93
6.2. PERSONAL NO CALIFICADO 94
6.3. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 94
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO. 94
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 94
7.2. REGISTRO ACTIVIDADES 95
7.3. ACTIVIDADES TOPOGRÁFICO 96
7.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 96
8. CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Y SOPORTE DE ENSAYO DE LABORATORIOS 108
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 123

CONTENIDO DE LAS TABLAS

Tabla 1 Contrato y modificaciones 12
Tabla 2 Información del contrato 13
Tabla 3 Correspondencia Recibida 16
Tabla 4 Correspondencia Enviada 19
Tabla 5 Cuadro de Pólizas 26
Tabla 6 Estado de programación y financiero del Contrato 32
Tabla 7 Presupuesto Inicial 33
Tabla 8 Presupuesto con Adición #01 45
Tabla 9 Presupuesto con Adición #02 58
Tabla 10 Presupuesto con Adición #03 70
Tabla 11 Presupuesto con Adición #04 81
Tabla 12 Mano de obra calificada 93
Tabla 13 Personal No calificado 94
Tabla 14 Equipos utilizados 94
Tabla 15 Ítems de actividades realizadas 95
Tabla 16. Resumen Toma de densidad des realizados durante el contrato. 108
Tabla 17. Asentamiento mínimo y máximo permitido para diferente tipo de estructuras para concreto sin aditivos 112
Tabla 18. Resumen resultados cilindros a compresión 113

CONTENIDO DE LAS ILUSTRACIONES

Ilustración 1. excavación manual de cimentación 96
Ilustración 2. Aplicación de recubrimiento en la pista 96
Ilustración 3. Vista de la pista de 200m 97
Ilustración 4. Vista de la pista de 200m 97
Ilustración 5. Aplicación de las líneas demarcación 97
Ilustración 6. Excavación de vigas de cimentacion 97
Ilustración 7. Aplicación de las líneas demarcación 97
Ilustración 8. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 97
Ilustración 9. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 98
Ilustración 10. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 98
Ilustración 11. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 98
Ilustración 12. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 98
Ilustración 13. Fundida de concreto de 3000 psi para ciclopeo 98
Ilustración 14. Excavacion de vigas de amarre 98
Ilustración 15. Figurado de acero para cimentacion 99
Ilustración 16. Figurado de acero para cimentacion 99

Ilustración 17. Figurado de acero para columnas 99
Ilustración 18. Figurado de acero para columnas 99
Ilustración 19. Figurado de acero para cimentacion 99
Ilustración 20. Figurado de acero para cimentacion y columnas 99
Ilustración 21. Fundida de concreto de 3000 psi para zapatas 100
Ilustración 22. Fundida de concreto de 3000 psi para zapatas 100
Ilustración 23. Fundida de concreto de 3000 psi para zapatas 100
Ilustración 24. Fundida de concreto de 3000 psi para zapatas 100
Ilustración 25. Armado y figurado de acero para viga de amarre 100
Ilustración 26. Armado y figurado de acero para viga de amarre 100
Ilustración 27. Armado y figurado de acero para viga de amarre 101
Ilustración 28. Armado y figurado de acero para viga de amarre 101
Ilustración 29. Armado y figurado de acero para viga de amarre 101
Ilustración 30. Armado y figurado de acero para viga de amarre 101
Ilustración 31. Armado y figurado de acero para viga de amarre y columna ..101
Ilustración 32. Armado y figurado de acero para viga de amarre 101
Ilustración 33. Vista de la zona administrativa 102
Ilustración 34. Fundida de la viga de amarre en concreto de 3000 psi 102
Ilustración 35. Fundida de la viga de amarre en concreto de 3000 psi 102
Ilustración 36. Fundida de la viga de amarre en concreto de 3000 psi 102
Ilustración 37. Fundida de la viga de amarre en concreto de 3000 psi 102
Ilustración 38. Fundida de la viga de amarre en concreto de 3000 psi 102
Ilustración 39. Armado y figurado de acero para columna 103
Ilustración 40. Armado y figurado de acero para columna 103
Ilustración 41. Armado y figurado de acero para columna 103
Ilustración 42. excavación manual de las zonas de administración 103
Ilustración 43. excavación manual de las zonas de administración 103
Ilustración 44. Excavación manual de cajas de inspección de aguas negras ..103
Ilustración 45. Excavación manual de tuberías de aguas negras 104
Ilustración 46. Encofrado de columna 104
Ilustración 47. Excavación manual de tuberías de aguas negras 104
Ilustración 48. Fundida de placa de caja de inspeccion 104
Ilustración 49. Excavación de la zona administrativa 104
Ilustración 50. Instalación de empradización en la zona de la pista de 400m ...104
Ilustración 51. Instalación de empradización en la zona de la pista de 400m ...105
Ilustración 52. Instalación de empradización en la zona de la pista de 400m ...105
Ilustración 53. Encofrado de columnas 105
Ilustración 54. Encofrado de columnas 105

Ilustración 55. Encofrado de columnas 105
Ilustración 56. Fundida de 3500 psi para columnas 105
Ilustración 57. Fundida de 3500 psi para columnas 106
Ilustración 58. Fundida de 3500 psi para columnas 106
Ilustración 59. Columnas fundidas 106
Ilustración 60. Columnas fundidas 106
Ilustración 61. Encofrado de columnas 106
Ilustración 62. Encofrado de columnas 106
Ilustración 63. Encofrado de columnas 107
Ilustración 64. Fundida de 3500 psi para columnas 107
Ilustración 65. Fundida de 3500 psi para columnas 107
Ilustración 66. Fundida de 3500 psi para columnas 107
Ilustración 67. Columnas fundidas 107
Ilustración 68. Figurado y armado de acero para vigas aereas 107

1. INTRODUCCIÓN

El interés de la Alcaldía Municipal de San Gil – Santander como entidad contratante para este contrato adjudicado al CONSORCIO CONDE PG. es atender de manera oportuna las labores de "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER" en la cual determinan los siguientes espacios: Zona Administrativa, Zona Publico, Zona Deportiva, Zona Paramédicos y Zona Parqueadero.

Zona administrativa: Esta zona comprende los espacios necesarios para el buen funcionamiento y organización de los diferentes eventos. En esta zona se desarrollarán y tomaran las decisiones que tienen que ver con la dirección de la actividad. Comprende los siguientes espacios que funcionaran completamente ligados entre sí con sus respectivas áreas de servicio para hacerla independiente de las actividades del escenario.

- Oficina administración con unidad sanitaria
- secretaria, taquilla e inscripciones
- Sala de espera donde ocasionalmente puede funcionar para reuniones
- Área de jueces, sala, camerinos y unidad sanitaria

Zona pública: Esta zona comprende los espacios necesarios para el público en general con sus respectivos servicios.

- Gradería para el público.
- Batería baños damas
- Baterías baños caballeros
- Terrazas para personas con movilidad reducida
- Baños para personas con movilidad reducida.
- Área VIP, autoridades del evento.
- Cabinas de prensa
- Circulaciones podo táctiles
- Circulación publico

Zona deportiva: Esta zona es la más importante para los deportistas encontramos los siguientes espacios.

- Pista de velocidad 200 metros
- Pista de ruta 400 metros
- Zona de agilización
- Recta de 100 metros incluida en la pista de ruta
- Zona de precalentamiento
- Batería baños para damas deportistas
- Batería baños para caballeros deportistas
- Pista plana

Zona servicios paramédicos:

- Espacio para dos ambulancias
- Área de enfermería con baño
- Área pruebas antidopaje con baño

Zona parqueaderos: En esta zona encontramos:

- Parqueaderos publico
- Parqueadero para personas con movilidad reducida
- Parqueadero para buses
- Parqueadero para dos ambulancias.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVOS GENERALES

El Objetivo del presente contrato es la *"CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER."*.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente informe resume las actividades desarrolladas en el período comprendido Del 26 de agosto al 30 de septiembre del 2025, correspondientes al Contrato de obra No. COP-004 de 2022, suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER.

3. ALCANCE

El alcance del presente informe es demostrar de manera clara sobre el seguimiento de las labores asignadas contractuales en lo relacionado a calidad y estado de ejecución del contrato, para satisfacer las expectativas del contrato cuyo objeto es: *"CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER."*, contrato suscrito y legalizado con el LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN GIL - SANTANDER. Las actividades realizadas en el proyecto es realizar la construcción de la Zona administrativa, Zona pública, Zona deportiva, Zona servicios paramédicos y Zona parqueaderos:

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La eficiencia y la eficacia en los servicios que demanda la ley, como vocación fundada en la satisfacción de las necesidades básicas de la población Sangileña y el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios, que la constitución y la ley establecen son la principal meta de la administración municipal de San Gil.

Es por ello por lo que la administración municipal para el cumplimiento de los fines del estado que le han sido encomendados, como entidad territorial desarrollar una serie de procesos y procedimientos administrativos y contractuales, entre otros, los cuales permiten el buen desarrollo de los proyectos plasmados en el plan de desarrollo para el beneficio de la comunidad.

Que motivado en la necesidad evidenciada por el Municipio de San Gil en donde es pertinente propender por la CONSTRUCCION DE SITIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, donde esta actividad permita el normal desarrollo de habilidades deportivas, sano esparcimiento, aprovechamiento del aire libre y el buen uso del tiempo libre, motivo por el cual se debe brindar buen estado físico de la infraestructura deportiva y espacial de las instalaciones de los centros recreativos y deportivos, así como la construcción de nuevos sitios que permitan el desarrollo de habilidades de nuestros deportistas.

En la actualidad San Gil ha evidenciado un gran número de escuelas Deportivas en el área del Patinaje aproximadamente con 750 estudiantes los cuales no cuenta con un escenario que cumpla con las necesidades para su buen desarrollo y practica del mismo, viéndose obligados a desarrollar estos deportes en canchas, vías públicas y un escenario que se encuentra totalmente deteriorados, ocasionando gran número de accidentes es por esto que nace la necesidad urgente de la "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER", el cual se ha venido solicitando desde vigencias anteriores, motivando un proyecto constructivo que requiere ser terminado para optimizar su uso total, a favor de la comunidad educativa y deportiva.

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de San Gil presentó ante el Gobierno Nacional "MINISTERIO DE DEPORTES", el proyecto de la "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER" radicado en el banco de programas y proyectos del municipio de San Gil, debido al alto número de practicantes del deporte, donde el Municipio de San Gil debe propender por el mejoramiento y construcción de la infraestructura Deportiva y Recreativa, que permita el normal desarrollo de todas las actividades de Recreación y Deporte en lo relativo a calidad y cobertura. Logrando la firma del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO No. 1219 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, el cual tiene por objeto "LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, PARA DEFINIR LA RUTA DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LAS

COMPETENCIAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA LA EVENTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER".

Que el Municipio de San Gil, cumplió con cada una de las etapas del mencionado convenio llevando a feliz término su objeto y nace el NÚMERO CONVENIO: COID-1277-2021, el cual tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN GIL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".

En este sentido tenemos que en el plan de desarrollo SAN GIL CON VISIÓN CIUDADANA se encuentra priorizado el sector DEPORTES Y RECREACION, de donde resulta el programa SAN GIL CON VISIÓN CIUDADANA POR LA GESTIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, teniendo en cuenta el deterioro y ausencia de la infraestructura Deportiva y Recreativa el cual impide el normal desarrollo de acciones y buenas prácticas deportivas y Recreativas. Es así, que nace la necesidad de construir un escenario deportivo apto para la realización de entrenamiento y preparación para campeonatos de patinaje de velocidad de alto rendimiento dentro de la programación en el calendario anual de eventos departamentales, nacionales y panamericanos avalados por la liga santandereana de patinaje (LISAPATIN), Federación colombiana de patinaje (FEDEPATIN), la World Skate América, (WSA), y la World Skate (WS). Donde para el presente proyecto se denominará "CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER", en la cual determinan los siguientes espacios: Zona Administrativa, Zona Publico, Zona Deportiva, Zona Paramédicos y Zona Parqueadero.

Zona administrativa: Esta zona comprende los espacios necesarios para el buen funcionamiento y organización de los diferentes eventos. En esta zona se desarrollarán y tomaran las decisiones que tienen que ver con la dirección de la actividad. Comprende los siguientes espacios que funcionaran completamente ligados entre sí con sus respectivas áreas de servicio para hacerla independiente de las actividades del escenario.

- Oficina administración con unidad sanitaria
- secretaria, taquilla e inscripciones
- Sala de espera donde ocasionalmente puede funcionar para reuniones

• Área de jueces, sala, camerinos y unidad sanitaria

Zona pública: Esta zona comprende los espacios necesarios para el público en general con sus respectivos servicios.

- Gradería para el público.
- Batería baños damas
- Baterías baños caballeros •
- Terrazas para personas con movilidad reducida
- Baños para personas con movilidad reducida.
- Área VIP, autoridades del evento.
- Cabinas de prensa
- Circulaciones podo táctiles
- Circulación publico

Zona deportiva: Esta zona es la más importante para los deportistas encontramos los siguientes espacios.

- Pista de velocidad 200 metros
- Pista de ruta 400 metros
- Zona de agilización
- Recta de 100 metros incluida en la pista de ruta
- Zona de precalentamiento
- Batería baños para damas deportistas
- Batería baños para caballeros deportistas
- Pista plana

Zona servicios paramédicos: • Espacio para dos ambulancias

- Área de enfermería con baño
- Área pruebas antidopaje con baño

Zona parqueaderos: En esta zona encontramos:

- Parqueaderos publico
- Parqueadero para personas con movilidad reducida
- Parqueadero para buses
- Parqueadero para dos ambulancias.

Las actividades para ejecutarse derivadas del proyecto en mención se requieren debido a que San Gil se caracteriza a nivel nacional como un destino para la práctica

de deportes extremos relacionados con los elementos, agua, tierra y aire. Adicionalmente, la práctica de futbol (soccer), patinaje de velocidad, ciclismo, baloncesto, voleibol, karate y atletismo es muy común. Destacando el patinaje de velocidad como uno de los más populares, con cuatro clubes de formación en este deporte los cuales participan en competencias a nivel departamental y algunos a nivel nacional e internacional.

Esta necesidad se deriva debido a que la infraestructura actual no cumple con la normativa vigente para la práctica de este deporte y mala calidad espacial para tomar clases perjudicando especialmente a los practicantes de este deporte. La Construcción de estos escenarios, es una necesidad latente con la cual se puede garantizar, entre otras cosas, lo siguiente:

- Promover y fortalecer una generación deportiva capaz de competir con la más alta elite en este deporte insignia del país.
- Generar y liderar procesos deportivos con disciplina que sean modelo para la juventud y estimulo en la recuperación de una sociedad más sana y justa.
- Orientar a la juventud y niñez en la ocupación del tiempo libre con metas exitosas.
- Convertir el deporte como un proyecto de vida para nuestra sociedad.
- Fomentar el deporte en la sociedad y la INCLUSION de toda la comunidad en esta actividad.
- Crear una sociedad con equidad, transparencia, universalidad, pertenencia, eficiencia y coherencia, a través de la práctica deportiva.

Que la ordenación de gasto debe ser acorde a la necesidad, y contando que a la fecha dentro del presupuesto aprobado para la vigencia 2022, existen los recursos que respaldan suplir con lo requerido en la presente contratación. Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, en garantía del interés general, y dado que la Entidad requiere contratar quien realice y este en capacidad de ejecutar el mismo.

De conformidad con lo expuesto, se requiere llevar a cabo un proceso contractual para la: CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL, SANTANDER; toda vez que el proyecto es viable y cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo y Plan Anual de Adquisiciones PAA.

5. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Durante el proceso del contrato se suscribe los siguientes documentos.

Tabla 1 Contrato y modificaciones

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DETALLE
CONTRATO DE OBRA	28 DE JUNIO DE 2022	Firma del contrato de obra No. COP-004 de 2022
ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2023	Firma de acta de inicio de obra
ADICION DEL CONTRATO 01	14 DE JUNIO DE 2023	Firma de acta de adición 01
ADICION DEL CONTRATO 02	29 DE DICIEMBRE DE 2023	Firma de acta de adición 02
PRORROGA DEL CONTRATO 02	19 DE MARZO DE 2024	Firma de acta de prorroga 02
PRORROGA DEL CONTRATO 03	27 DE MARZO DE 2024	Firma de acta de prorroga 03
PRORROGA DEL CONTRATO 04	07 DE JUNIO DE 2024	Firma de acta de prorroga 04
SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	19 DE JULIO DE 2024	Firma de acta de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 01 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	02 DE AGOSTO DE 2024	Firma de acta de ampliación 01 de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 02 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	16 DE AGOSTO DE 2024	Firma de acta de ampliación 02 de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 03 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 03 de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 04 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	11 DE OCTUBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 04 de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 05 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 05 de suspensión 01
AMPLIACION DEL CONTRATO 06 SUSPENSIO DEL CONTRATO 01	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	Firma de acta de ampliación 06 de suspensión 01
REINICIO DEL CONTRATO 01	13 DE DICIEMBRE DE 2024	Firma de acta de Reinicio
PRORROGA DEL CONTRATO 05	16 DE DICIEMBRE DE 2024	Firma de acta de prorroga 05
ADICION DEL CONTRATO 03	27 DE DICIEMBRE 2024	Firma de acta de adición 03
SUSPENSIO DEL CONTRATO 02	21 DE FEBRERO 2025	Firma de acta de suspensión 02

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DETALLE
AMPLIACION DEL CONTRATO 01 SUSPENSIO DEL CONTRATO 02	20 DE MARZO 2025	Firma de acta de ampliación 01 de suspensión 02
AMPLIACION DEL CONTRATO 02 SUSPENSIO DEL CONTRATO 02	04 DE ABRIL 2025	Firma de acta de ampliación 02 de suspensión 02
AMPLIACION DEL CONTRATO 03 SUSPENSIO DEL CONTRATO 02	22 DE ABRIL 2025	Firma de acta de ampliación 03 de suspensión 02
REINICIO DEL CONTRATO 02	05 DE MAYO 2025	Firma de acta de Reinicio
PRORROGA DEL CONTRATO 06	05 DE MAYO 2025	Firma de acta de prorroga 06
SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	10 DE JUNIO 2025	Firma de acta de suspensión 03
AMPLIACION DEL CONTRATO 01 SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	20 DE JUNIO 2025	Firma de acta de ampliación 01 de suspensión 03
AMPLIACION DEL CONTRATO 02 SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	7 DE JULIO 2025	Firma de acta de ampliación 02 de suspensión 03
AMPLIACION DEL CONTRATO 03 SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	14 DE JULIO 2025	Firma de acta de ampliación 03 de suspensión 03
AMPLIACION DEL CONTRATO 04 SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	28 DE JULIO 2025	Firma de acta de ampliación 04 de suspensión 03
AMPLIACION DEL CONTRATO 05 SUSPENSIO DEL CONTRATO 03	12 DE AGOSTO 2025	Firma de acta de ampliación 05 de suspensión 03
REINICIO DEL CONTRATO 03	26 DE AGOSTO 2025	Firma de acta de Reinicio
ADICION DEL CONTRATO 04	26 DE AGOSTO 2025	Firma de acta de adición 04

Se relaciona la información general del contrato a que se hace referencia el presente informe

Tabla 2 Información del contrato

1, INFORMACIÓN DEL PROYECTO		
INFORME No.	**10**	Periodo comprendido entre el 26 de agosto del 2025 al 30 de septiembre del 2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PATINODROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL - SANTANDER
LOCALIZACIÓN	SAN GIL - SANTANDER
CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	COP-004 de 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO CONDE PG
INTERVENTORÍA	DAIMCO SAS
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PLAZO DE PRORROGA #01	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #02	DOCE (12) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #03	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #04	CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #05	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #06	TREINTA Y CINCO (35) DIAS
PLAZO DE PRORROGA #07	CIENTO CINCO (105) DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #01	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #01 DE LA SUSPENSION #01	QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #02 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #03 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA Y DOS (32) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #04 DE LA SUSPENSION #01	TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #05 DE LA SUSPENSION #01	NUEVE (09) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #06 DE LA SUSPENSION #01	DIECIOCHO (18) DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #02	TREINTA (30) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #01 DE LA SUSPENSION #02	VEINTE (20) DIAS

PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #02 DE LA SUSPENSION #02	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #03 DE LA SUSPENSION #02	CATORCE (14) DIAS
PLAZO DE SUSPENSION #03	VEINTE (20) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #01 DE LA SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #02 DE LA SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #03 DE LA SUSPENSION #03	DIEZ (10) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #04 DE LA SUSPENSION #03	QUINCE (15) DIAS
PLAZO DE AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION #05 DE LA SUSPENSION #03	DOCE (12) DIAS
PLAZO ACTUALIZADO	(21) VEINTIÚN MESES Y (1) UN DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	16 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$8.489.904.592,00
VALOR ADICIÓN (1)	$1.131.214.940,00
VALOR ADICIÓN (2)	$ 1.680.708.541,28
VALOR ADICIÓN (3)	$ 1.680.708.541,28
VALOR ADICIÓN (4)	$ 686.623.436,35
VALOR ACTUALIZADO	$13.669.160.050,91

5.1. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Durante este periodo se realizó el recibo y él envió de correspondencia hacia las entidades públicas, la interventoría y la entidad.

Tabla 3 Correspondencia Recibida

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-1	CORREO	12/07/2023	SOLICITUD ACLARACION PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA NO. COP 004-2022 PATINODROMO SAN GIL
R-2	SIN NUMERO	14/09/2023	ENVIO No. 0922/CARTA No. No. 279197
R-1	PGS-FINDETER-2022-015	18/01/2023	SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUEIRDOS PARA FIRMA DEL ACTA DE INICIO - CONTRATO DE OBRA No. cop -004-2022
R-2	SIN NUMERO	2/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE
R-3	SIN NUMERO	5/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-4	PGS-FINDETER-2022-022	5/06/2023	REITERACION -ACLARACION SOBRE EL ALCANCE DEL COMPONBENTE SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA-ETAPA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
R-5	SIN NUMERO	14/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-6	SIN RADICADO	14/06/2023	MODIFICACION DE CONTRATO
R-7	SIN RADICADO	21/06/2023	APROBACION INSCRIPCION DE TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-8	PGS-FINDETER-2022-023	23/06/2023	SOLICITUD DE SOPORTES PARA APU-NP"S ROCERIA DEMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2,10m
R-9	PGS-FINDETER-2022-024	23/06/2023	TRASLADO SOLICITID DE INFORMACION -COMUNICADO D-6-2023-40 CONTRATISTA
R-10	SIN RADICADO	23/06/2023	SUBSANAR INSCRIPCION TRABAJADOR DEPENDIENTE
R-11	PGS-FINDETER-2022-023	23/06/2023	TRASLADO SOLICITID DE INFORMACION -COMUNICADO D-6-2023-40 CONTRATISTA
R-12	PGS-FINDETER-2022-027	4/07/2023	REITERACION SOLICITUD DE SOPORTES PARA APU -NP"S ROCERIA, DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA DE OBRA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LONA H=2.10m
R-13	PGS-FINDETER-2022-028	4/07/2023	SOLICITUD CRONOGRAMA ACTUALIZADO SEFUN ACTA DE

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
			INICIO -CONTRATO DE OBRA 004-2022
R-14	PGS-FINDETER-2022-029	5/07/2023	SOLICITUD INFORMES MENSUALE DE OBRA- CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-15			
R-16	CORREO	11/07/2023	SOLICITUD ENTREGA DESGLOSE DE AIU -COP 004-2022-PATINODROMO SAN GIL
R-17	PGS-FINDETER-2022-031	13/07/2023	SOLICITUD PLAN DE COMPRAS - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-18	18932023	17/07/2023	RESPUESTA RAD 230007506-2310007077
R-19	PGS-FINDETER-2022-033	25/07/2023	SU COMUNICADO 1893.2023-RESPUESTA RAD 2310007506-2310007077- CONTRATO DE OBRA No. COP 004-2022
R-20	CORREO	28/07/2023	ACEPTACION FLUJO DE INVERSION Y PROGRAMACION DE OBRA -COP 004
R-21	CORREO	28/07/2023	RESPUESTA RADICADOS MINDEPORTE 2023EE001548-2023E0017780-2023EE0018666-2023EE0020009
R-22	PGS-FINDETER-2022-033	4/08/2023	SOLICITUD INFORMES MENSUALE DE OBRA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-23	CORREO	5/08/2023	LICENCIA DE CONSTRUCCION - OTROS
R-24	PGS-FINDETER-2022-034	8/08/2023	SOLICITUD ACTA PARCIAL DE COBRO-CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-25	PGS-FINDETER-2022-037	9/08/2023	TRASLADO SOLICITUD DE OBSERVACIONES -COMUNICADO D-11 CONTRATISTA
R-1	CORREO	17/01/2024	BAJO RENDIMIENTO
R-2	CORREO	24/01/2024	OBSERVACONES Y ACLARACION PARA LA MATERIALIZACION DEL PROYECTO DEL PATINODROMO CONDE CUCHICUTE
R-3	PGS-FINDETER-2022-069	18/05/2024	REQUERIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-4	PGS-FINDETER-2022-077	19/07/2024	COMUNICADO D-17-2024-40- Estado de tramite de la adicion solicitada en el comunicado D-17-2023-40 del 21.11.2023 y D-20-2023-40 del 15.12.2023 CONTRATO DE OBRA No. COP -004-2024
R-5	686794089001-2024-00258-00	22/07/2024	ACCION DE TUTELA
R-6	686794089001-2024-00258-00	2/08/2024	ACCION DE TUTELA
R-7	PGS-FINDETER-2022-093	10/10/2024	SOLICITUD REMISION DE CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO
R-8	PGS-FINDETER-2022-095	11/10/2024	COMUNICADO PSG-FINDETER-2022-094-SOLICITUD DE AMPLIACION No. 4 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022- SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA
R-9	PGS-FINDETER-2022-100	23/11/2024	COMUNICADO D-24-2024-40 - SOLICITUD DE PRORROGA #5, POR 75 DIAS CALENDARIO HASTA EL 30.04.2025 - CONTRATO DE OBRA COP 004-2022
R-10	PGS-FINDETER-2022-101	21/11/2024	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION - ETAPA DE CONSTRUCCION
R-11	PGS-FINDETER-2022-102	27/11/2024	COMUNICADO D-29-2024- SOLICITUD DE AMPLIACION No. 6 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO COP 004-2022
R-12	PGS-FINDETER-2022-103	27/11/2024	COMUNICADO PSG-FINDETER-2022-102- SOLICITUD DE AMPLIACION No. 6 DE LA SUSPENSION No. 1 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA COP 004-2022 - SOLICITUD DE AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA REFENCIA
R-1	54548	17/01/2025	RESPUESTA PETICION No. 1-2024-016266 del 29/11/2024
R-2	n2642266	31/01/2025	NOTIFICACION DE PAGO POR TRASFERENCIA ELECTONICA DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA - CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**RADICADO**	**FECHA DE RECIBIDO**	**ASUNTO**
R-3	PGS-FINDETER-2022-113	18/02/2025	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA- LLAMADO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
R-4	706	21/04/2025	ACCION DE TUTELA 686794071002-2025-0040-00
R-5	2025-00040-01	28/05/2025	TUTELA
R-6	PGS-FINDETER-2022-132	6/06/2025	SU COMUNICADO D-13-2025-50 "PRESUPUESTO PARA LA ADICION DE LA ZONA ADMINISTRITIVA"
R-7	PGS-FINDETER-2022-142	4/07/2025	COMUNICADO D-19-2025-40 - SOLICITUD DE AMPLIACION No. 2 DE LA SUSPENSION No. 3 DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
R-8	1160-2025	4/07/2025	APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION No. 2 DE LA SUSPENSION No, 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2022
R-9	1197-2025	14/07/2025	APROBACION DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION No. 3 DE LA SUSPENSION No, 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 004-2022
R-10	CORREO	23/07/2025	AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No. 3 por 15 dias calendario
R-11	PGS-FINDETER-2022-149	11/08/2025	COMUNICADO D-25-2025-40 SOLICITUD DE AMPLIACION No. 5 A LA SUSPENSION No. 3 DE EJECUCION DEL CONTRATO

Tabla 4 Correspondencia Enviada

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-1	1/07/2022	POLIZAS SEGÚN CONTRATO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-2	30/08/2022	Apertura cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA
D-3	22/12/2022	REMISION ACTA DE VERIFICACION DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TECNICOS FIRMADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-1	24/01/2023	RESPUESTA AL COMUNICADO No. PSG-FINDETER-2022-015 DE FECHA 18.01.2023 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FIRMA DEL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
		ACTA DE INICIO - CONTRATO DE OBRA No. COP - 004-2022	
D-2	30/05/2023	SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO AL REFERENCIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-3	7/06/2023	ENTREGA DEL ACTA DE INICIO FIRMADA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-4	14/06/2023	REMISION DE ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO 01 SUSCRITO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-5	15/06/2023	SOLICITUD DE MATERIALIZACION Y ENTREGA DE AMARRE DEL PROYECTO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-6	22/06/2023	SOLICITUD Y APROBACION DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA MATERIALIZACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-7	23/06/2023	POLIZAS ACTA DE INICIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-8	23/06/2023	POLIZAS DE ACUERDO AL ADICONAL No. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-9	10/07/2023	ENVIO DEL PLAN DE CALIDAD V02	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-10	13/07/2023	ENTREGA DE PROGRAMCION Y FLUJO DE INVERSION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-11	3/08/2023	SOLICITUD DE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA MATERIALIZACION DEL PROYECTO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL DAIMCO SAS
D-12	16/08/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1	DAIMCO
D-13	28/08/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-14	3/10/2023	CAMBIO PROFESIONAL HSEQ	DAIMCO

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA- CONSORCIO CONDE PG			
# DE CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIADO**	**ASUNTO**	**ENVIADO A**
D-15	14/11/2023	ENTREGA DE APU PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS #01	DAIMCO
D-16	20/11/2023	ENTREGA DE DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 2	DAIMCO
D-17	21/11/2023	SOLICITUD ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-004-2022	DAIMCO
D-18	13/12/2023	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-19	13/12/2023	SOLICITUD ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-004-2022	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-20	15/12/2023	Alcance al comunicado D-17-2023-40 de fecha 21.11.2023 de la solicitud adicion No. 2 y prorroga No. 1 del contrato de pbra No. COP-004-2022	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-1	15/02/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 4	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-2	19/02/2024	Entrega programacion y balance de los recursos solicitados por el municipio de san gil a ministerio de deporte	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-3	28/02/2024	Solicitud de devolucion de saldo a favor	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO MUNICIPAL
D-4	12/03/2024	Solicitud de prorroga No. 2 por 12 dias calendario	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-5	22/03/2024	Solicitud de suspension del contrato	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-6	27/03/2024	Solicitud de prorroga No. 3 por 75 dias calendario	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-7	2/04/2024	Polizas de acuero a la prorroga No. 2	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
D-8	3/04/2024	Entrega de documentacion de acta de recibo parcial No. 5	DAIMCO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
