FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c24d3d0d9ead85f471b6d3ba3dce0b8c0f7faf60c35c8fefb91caf0b0e253e8d512ea0854efe08be00237a4fe16ac21d

Número de Factura: 2
Fecha de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Vencimiento: 31/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025
Nit del Emisor: 901911031
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 101 A # 47 A - 43
Teléfono / Móvil: 3105295497
Correo: fecdr2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Cra. 21 entre Calles 22 y 23
Teléfono / Móvil: 606 8982444
Correo: financierapda@caldas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	PRODUCTO 1 PLAN DE TRABAJO	NIU	1,00	$ 110.240.577,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.945.709,69	19.00			$ 110.240.577,31
2	003	PRODUCTO 2 INFORME DE RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE	NIU	1,00	$ 55.120.288,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.472.854,76	19.00			$ 55.120.288,24

Notas Finales

CONTRATO DE CONSULTORIA
OBJETO: EABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED
INTERVENTOR - INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS
SUPERVISOR - ING OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/08/2025 08:18:00
Documento validado por la DIAN:
01/08/2025 08:18:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		165360865.55
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		165360865.55
IVA		31418564.45
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		31418564.45
Total neto factura (=)		196779430
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 196779430

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		165.360.865,55
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		165.360.865,55
IVA		31.418.564,45
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		31.418.564,45
Total neto factura (=)		196.779.430,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$196.779.430,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094652519 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-06-20

Gobierno de CALDAS	ACTA PARCIAL DE PAGO No 1	Plan Departamental de Agua de Caldas	Codigo: CDR25-1	V0
			Fecha del Acta:	05 de julio de 2025

CONTRATO No.:	21022025-0425	**VALOR CONTRATO:**	$ 1'311'862'869	
NUMERO DE PROCESO	CM-SV-011-2024	**FECHA DE INICIO:**	26 DE MAYO DE 2025	
ID SECOP	CO1.PCCNTR.7359620	**PLAZO**	SIETE 07 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
OBJETO:	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	25 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA :	CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025	**SUPERVISOR:**	ING. OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR	
No. DE IDENTIFICACION	901911031-6	**ORDENADOR DEL GASTO:**	FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNANDO LEAL CORONADO	**PERIODO A PAGAR:**	PERIODO DEL 26 DE MAYO 2025 AL 05 DE JULIO DE 2025	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 1	PLAN DE TRABAJO	UNIDAD	10%	$ 131'186'286.90			10.0%	$ 131'186'287	10.0%	$ 131'186'287	0.0%	$ 0
Producto No 2	INFORME DE SOCIALIZACION	UNIDAD	2%	$ 26'237'257.38			0.0%		0.0%	$ 0	2.0%	$ 26'237'257
Producto No 3	INFORME DE RECOPILACION DE LA INFORMACION EXISTENTE	UNIDAD	5%	$ 65'593'143.45			5.0%	$ 65'593'143	5.0%	$ 65'593'143	0.0%	$ 0
Producto No 4	INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD	10%	$ 131'186'286.90					0.0%	$ 0	10.0%	$ 131'186'287
Producto No 5	ESTUDIOS BASICOS	UNIDAD	15%	$ 196'779'430.35					0.0%	$ 0	15.0%	$ 196'779'430
Producto No 6	INFORME DIAGNOSTICO	UNIDAD	10%	$ 131'186'286.90					0.0%	$ 0	10.0%	$ 131'186'287
Producto No 7	INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION	UNIDAD	5%	$ 65'593'143.45					0.0%	$ 0	5.0%	$ 65'593'143
Producto No 8	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DE SUELOS	UNIDAD	6%	$ 78'711'772.14					0.0%	$ 0	6.0%	$ 78'711'772
Producto No 9	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE TOPOGRAFIA	UNIDAD	6%	$ 78'711'772.14					0.0%	$ 0	6.0%	$ 78'711'772
Producto No 10	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDROLOGIA	UNIDAD	3%	$ 39'355'886.07					0.0%	$ 0	3.0%	$ 39'355'886

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDOS	
			% DEL VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	% ACUMUL. ANT.	VALOR ACUMUL. ANT.	% ACTA	VALOR ACTA	% ACUMUL.	VALOR ACUMUL.	% DE SALDOS	VALOR SALDOS
Producto No 11	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDRAULICA	UNIDAD	6%	$ 78'711'772.14					0.0%	$ 0	6.0%	$ 78'711'772
Producto No 12	ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DISEÑO DETALLADO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	3%	$ 39'355'886.07					0.0%	$ 0	3.0%	$ 39'355'886
Producto No 13	PLANOS GENERALS DEL PROYECTO	UNIDAD	6%	$ 78'711'772.14					0.0%	$ 0	6.0%	$ 78'711'772
Producto No 14	PRESUPUESTO GENERAL, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICAIONES TECNICAS, APUS, CRONOGGRAMA Y CALCULO DE AIU	UNIDAD	5%	$ 65'593'143.45					0.0%	$ 0	5.0%	$ 65'593'143
Producto No 15	INFORME PREDIAL	UNIDAD	4%	$ 52'474'514.76					0.0%	$ 0	4.0%	$ 52'474'515
Producto No 16	ENTREGA FINAL DE INFORMACION Y PRESENTACION AL MINISTERIO	UNIDAD	4%	$ 52'474'514.76					0.0%	$ 0	4.0%	$ 52'474'515
TOTAL			**100%**	**$ 1'311'862'869**	**0.0%**	**$ 0**	**15.0%**	**$ 196'779'430**	**15.0%**	**$ 196'779'430**	**85.0%**	**$ 1'115'083'439**

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1'311'862'869**
VALOR ACTA No.1	**$ 196'779'430**	
VALOR ACTA No.2		
VALOR ACTA No.3		
VALOR ACTA No.4		
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 196'779'430**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 1'115'083'439**	
SUMAS IGUALES	**$ 1'311'862'869**	**$ 1'311'862'869**

VALOR PRESENTE ACTA	$ 196'779'430	**CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0	
VALOR A PAGAR	**$ 196'779'430**	

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

LUIS HERNANDO LEAL CORONADO
Representante Legal
CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO
Representante Legal
INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

Bogotá D.C., 03 de Julio de 2025

Señores
Gobernación de Caldas
Ciudad

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Revisor Fiscal, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que la Compañía CHAFIK INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.218.431-3 se encuentra a paz y salvo con los pagos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

Atentamente,

Nancy Aragón Rodríguez
Revisor Fiscal
TP. 76730-T
CHAFIK INGENIERÍA SAS

Hernando Leal Coronado
Representante Legal CHAFIK
INGENIERÍA SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	TRABAJO DE CAM / CAMPO BOG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	86963296	$4.845.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172.600	0		0		0	0	0	0	172.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	143.800	0		0		0	0	0	0	143.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	198.200	0		0		0	0	0	0	198.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	314.000	0	0	0	0	0	0		314.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.199.600	0	0	0	0	0	0		2.199.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.078.200				1.078.200	0	0	1.078.200			10.782	1.078.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	624.600	0	0	624.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	628.600	628.600
Pensión	2	2.513.600	2.513.600
Riesgos Laborales	1	1.078.200	1.078.200
CCF	1	624.600	624.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.845.000	4.845.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	TRABAJO DE CAM	CAMPO BOG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	86963296	$4.845.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033679508	BRIÑEZ CABIATIVA DIKSON YOANY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1049794747	MONTAÑEZ BULLA DILSON ALIRIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	12280163	GOMEZ FAJARDO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	3.474.007	555.900	0	0	0	0	EPS008	3.474.007	139.000	14-7	3.474.007	5	241.800	CCF24	3.474.007	139.000	0	0	0	0	0
4	CC	12280163	GOMEZ FAJARDO MIGUEL ANGEL	1	0			S													X				230301	119.794	19.200	0	0	0	0	EPS008	119.794	4.800	14-7	119.794	5	0	CCF24	119.794	4.800	0	0	0	0	0
5	CC	80215494	ROJAS GARCIA WILMAR ROLANDO	1	0			S																	230301	2.891.784	462.700	0	0	0	0	EPS017	2.891.784	115.700	14-7	2.891.784	5	201.300	CCF24	2.891.784	115.700	0	0	0	0	0
6	CC	80215494	ROJAS GARCIA WILMAR ROLANDO	1	0			S											X						230301	99.717	16.000	0	0	0	0	EPS017	99.717	4.000	14-7	99.717	5	0	CCF24	99.717	0	0	0	0	0	0
7	CC	80215844	CELY ROJAS DIEGO ARMANDO	1	0			S																	230301	4.313.500	690.200	0	0	0	0	EPS005	4.313.500	172.600	14-7	4.313.500	5	300.300	CCF24	4.313.500	172.600	0	0	0	0	0
8	PT	918142	CAPUANO ESTEVEZ VICTOR JAVIER	1	0			S																	230201	1.962.200	314.000	0	0	0	0	EPS017	1.962.200	78.500	14-7	1.962.200	5	136.600	CCF24	1.962.200	78.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	86924471	$28.446.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	349.000	0		0		0	0	0	0	349.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.525.100	0		0		0	0	0	0	2.525.100	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.011.900	0		0		0	0	0	0	1.011.900	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	139.100	0		0		0	0	0	0	139.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	279.700	0		0		0	0	0	0	279.700	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	64.100	0		0		0	0	0	0	64.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	295.700	0	0	0	0	0	0		295.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	7.596.000	0	0	34.500	34.500	0	0		7.665.000	15
231001	Colfondos	800227940-6	3.497.400	0	0	82.600	82.600	0	0		3.662.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	6.081.500	0	0	97.400	97.400	0	0		6.276.300	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.894.300				1.894.300	0	0	1.894.300			18.943	1.894.300	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.283.800	0	0	4.283.800	26

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	86924471	$28.446.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	4.368.900	4.368.900
Pensión	4	17.899.600	17.899.600
Riesgos Laborales	1	1.894.300	1.894.300
CCF	1	4.283.800	4.283.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	28.446.600	28.446.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900218431-3	CHAFIK INGENIERIA S.A.S		Calle 101A No 47A-43 - Pasadena	6028838	dbonilla@chafiking.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	86924471	$28.446.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000134921	CELY ARIAS TANIA BRIGUITH	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000134921	CELY ARIAS TANIA BRIGUITH	1	0			S												X					230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS002	500.000	20.000	14-7	500.000	1	0	CCF24	500.000	20.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000616764	MESA VARGAS JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.968.810	315.100	0	0	0	0	EPS008	1.968.810	78.800	14-7	1.968.810	1	10.300	CCF24	1.968.810	78.800	0	0	0	0	0
4	CC	1000616764	MESA VARGAS JUAN DAVID	1	0			S												X					230301	67.890	10.900	0	0	0	0	EPS008	67.890	2.800	14-7	67.890	1	0	CCF24	67.890	2.800	0	0	0	0	0
5	CC	1002580940	ATENCIA PEREZ JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.765.140	282.500	0	0	0	0	EPS005	1.765.140	70.700	14-7	1.765.140	1	9.300	CCF24	1.765.140	70.700	0	0	0	0	0
6	CC	1002580940	ATENCIA PEREZ JUAN DAVID	1	0			S												X					230301	271.560	43.500	0	0	0	0	EPS005	271.560	10.900	14-7	271.560	1	0	CCF24	271.560	10.900	0	0	0	0	0
7	CC	1002647432	MONROY MURCIA JHONATAN NARBEY	1	0			S																	230301	2.036.700	325.900	0	0	0	0	EPS002	2.036.700	81.500	14-7	2.036.700	1	10.700	CCF24	2.036.700	81.500	0	0	0	0	0
8	CC	1010011490	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARD FELIPE	1	0			S																	230301	2.151.510	344.300	0	0	0	0	EPS005	2.151.510	86.100	14-7	2.151.510	1	11.300	CCF24	2.151.510	86.100	0	0	0	0	0
9	CC	1010011490	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARD FELIPE	1	0			S												X					230301	74.190	11.900	0	0	0	0	EPS005	74.190	3.000	14-7	74.190	1	0	CCF24	74.190	3.000	0	0	0	0	0
10	CC	1014228099	GONZALEZ FLOREZ JULLY TATIANA	1	0			S																	230301	5.082.000	813.200	0	0	0	0	EPS008	5.082.000	203.300	14-7	5.082.000	1	26.600	CCF24	5.082.000	203.300	0	0	0	0	0
11	CC	1014228099	GONZALEZ FLOREZ JULLY TATIANA	1	0			S											X						230301	363.000	58.100	0	0	0	0	EPS008	363.000	14.600	14-7	363.000	1	0	CCF24	363.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1015418769	SANCHEZ CUENCA ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	3.593.800	575.100	0	0	0	0	EPS005	3.593.800	143.800	14-7	3.593.800	1	18.800	CCF24	3.593.800	143.800	0	0	0	0	0
13	CC	1018402220	BONILLA MARTINEZ DINA LUZ	1	0			S																	230301	6.882.500	1.101.200	0	0	34.500	34.500	EPS005	6.882.500	275.300	14-7	6.882.500	1	36.000	CCF24	6.882.500	275.300	0	0	0	0	0
14	CC	1020791531	CASTILLO FORERO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	3.646.934	583.600	0	0	0	0	EPS008	3.646.934	145.900	14-7	3.646.934	1	19.100	CCF24	3.646.934	145.900	0	0	0	0	0
15	CC	1020791531	CASTILLO FORERO MIGUEL ANGEL	1	0			S												X					230301	561.067	89.800	0	0	0	0	EPS008	561.067	22.500	14-7	561.067	1	0	CCF24	561.067	22.500	0	0	0	0	0
16	CC	1020800341	VALLEJO POVEDA JULIETH KATHERINE	1	0			S																	230301	1.695.250	271.300	0	0	0	0	EPS005	1.695.250	67.900	14-7	1.695.250	1	8.900	CCF24	1.695.250	67.900	0	0	0	0	0
17	CC	1020800341	VALLEJO POVEDA JULIETH KATHERINE	1	0			S												X					230301	339.050	54.300	0	0	0	0	EPS005	339.050	13.600	14-7	339.050	1	0	CCF24	339.050	13.600	0	0	0	0	0
18	CC	1023917362	BELTRAN QUINTERO EDGAR ANDRES	1	0			S																	230301	3.191.067	510.600	0	0	0	0	EPS002	3.191.067	127.700	14-7	3.191.067	1	16.700	CCF24	3.191.067	127.700	0	0	0	0	0
19	CC	1023917362	BELTRAN QUINTERO EDGAR ANDRES	1	0			S											X						230301	245.467	39.300	0	0	0	0	EPS002	245.467	9.900	14-7	245.467	1	0	CCF24	245.467	0	0	0	0	0	0
20	CC	1023917362	BELTRAN QUINTERO EDGAR ANDRES	1	0			S											X						230301	245.467	39.300	0	0	0	0	EPS002	245.467	9.900	14-7	245.467	1	0	CCF24	245.467	0	0	0	0	0	0
21	CC	1030639775	RODRIGUEZ ESCOBAR TERESA	1	0			S							X										231001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
22	CC	1031141498	MONTENEGRO DUARTE ANGIE KATHERINE	1	0			S							X										25-14	2.406.667	385.100	0	0	0	0	EPS005	2.406.667	96.300	14-7	2.406.667	1	12.600	CCF24	2.406.667	96.300	0	0	0	0	0
23	CC	1031141498	MONTENEGRO DUARTE ANGIE KATHERINE	1	0			S											X						25-14	1.266.667	202.700	0	0	0	0	EPS005	1.266.667	50.700	14-7	1.266.667	1	0	CCF24	1.266.667	0	0	0	0	0	0
24	CC	1031141498	MONTENEGRO DUARTE ANGIE KATHERINE	1	0			S												X					25-14	126.667	20.300	0	0	0	0	EPS005	126.667	5.100	14-7	126.667	1	0	CCF24	126.667	5.100	0	0	0	0	0
25	CC	1032469792	MONTOYA BUITRAGO DIANA BETULIA	1	0			S																	230301	3.787.200	606.000	0	0	0	0	EPS005	3.787.200	151.500	14-7	3.787.200	1	19.800	CCF24	3.787.200	151.500	0	0	0	0	0
26	CC	1033750337	RIVERA LINARES WILMER	1	0			S																	230301	3.475.600	556.100	0	0	0	0	EPS017	3.475.600	139.100	14-7	3.475.600	1	18.200	CCF24	3.475.600	139.100	0	0	0	0	0
27	CC	1074158818	SEGURA HORTUA JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	7.366.500	1.178.700	0	0	36.900	36.900	EPS005	7.366.500	294.700	14-7	7.366.500	1	38.500	CCF24	7.366.500	294.700	0	0	0	0	0
28	CC	1075679825	VARGAS MATEUS IVAN GUILLERMO	1	0			S																	25-14	3.934.500	629.600	0	0	0	0	EPS005	3.934.500	157.400	14-7	3.934.500	1	20.600	CCF24	3.934.500	157.400	0	0	0	0	0
29	CC	1075679825	VARGAS MATEUS IVAN GUILLERMO	1	0			S												X					25-14	786.900	126.000	0	0	0	0	EPS005	786.900	31.500	14-7	786.900	1	0	CCF24	786.900	31.500	0	0	0	0	0
30	CE	323736	OCHOA CHEHAB BETTY ISABEL	1	0			S																	231001	8.259.000	1.321.500	0	0	41.300	41.300	EPS005	8.259.000	330.400	14-7	8.259.000	1	43.200	CCF24	8.259.000	330.400	0	0	0	0	0
31	CC	37196300	ESCALANTE RODRIGUEZ YADIRA	1	0			S																	230301	1.600.900	256.200	0	0	0	0	ESSC24	1.600.900	64.100	14-7	1.600.900	1	8.400	CCF24	1.600.900	64.100	0	0	0	0	0
32	CC	52118723	AGUILAR VARELA ROSA ELENA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-7	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	52819470	CHACON CORONADO LUISA FERNANDA	1	0			S																	231001	8.259.000	1.321.500	0	0	41.300	41.300	EPS008	8.259.000	330.400	14-7	8.259.000	1	43.200	CCF24	8.259.000	330.400	0	0	0	0	0
34	CC	52883229	VERGARA VILLALOBOS JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	4.458.400	713.400	0	0	0	0	EPS005	4.458.400	178.400	14-7	4.458.400	5	310.400	CCF24	4.458.400	178.400	0	0	0	0	0
35	CC	79247991	LEAL CORONADO LUIS HERNANDO	1	0			S							X										25-14	12.094.000	1.935.100	0	0	60.500	60.500	EPS005	12.094.000	483.800	14-7	12.094.000	5	841.800	CCF24	12.094.000	483.800	0	0	0	0	0
36	CC	79784934	SUAREZ SANTANA WILSON	1	0			S																	231001	2.539.500	406.400	0	0	0	0	EPS008	2.539.500	101.600	14-7	2.539.500	5	176.800	CCF24	2.539.500	101.600	0	0	0	0	0
37	CC	80219866	BELDUQUE BUSTOS DIEGO EDISON	1	0			S																	25-14	5.566.000	890.600	0	0	0	0	EPS037	5.566.000	222.700	14-7	5.566.000	1	29.100	CCF24	5.566.000	222.700	0	0	0	0	0
38	CC	93472765	CESPEDES GIL LIBARDO	1	0			S																	230201	1.847.800	295.700	0	0	0	0	EPS005	1.847.800	74.000	14-7	1.847.800	5	128.700	CCF24	1.847.800	74.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 1150 del 2007

Yo RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIRREZ En mi condición de Representante Legal hace saber que la empresa FELD INGENIERIA SAS, identificada con Nit 900.262.799-4, me permito certificar que de acuerdo con los estados financieros se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), aportes del CREE Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los tres (3) día del mes de julio de 2025.

Firma: _____
RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
CC 80.850.300 de Bogotá D.C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900262799	4	FELD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FELD	CR 49 A 94 76 OF 305	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7036765	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497146321	9486327504	E	2025/05/23	2025/05/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,355,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FELD (4 Afiliados)							$8,758,278	$1,401,500			$8,758,278	$350,500			$8,758,278	$350,500			$8,758,278		$252,800		$0	$0		$2,355,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)							$5,546,064	$887,500			$5,546,064	$222,000			$5,546,064	$222,000			$5,546,064		$29,200		$0	$0		$1,360,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$5,546,064	$887,500			$5,546,064	$222,000			$5,546,064	$222,000			$5,546,064		$29,200		$0	$0		$1,360,700
1	CC	53048032	FORERO HEIDY		230201	30	$2,166,482	$346,700	EPS005	30	$2,166,482	$86,700	CCF21	30	$2,166,482	$86,700	14-11	30	$2,166,482	0.522%	$11,400	30	$0	$0	Si	$531,500
2	CC	52547877	GARZON JAKELINE		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	23810435	MARTINEZ LIZBETH		25-14	30	$1,956,082	$313,000	EPS005	30	$1,956,082	$78,300	CCF21	30	$1,956,082	$78,300	14-11	30	$1,956,082	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$479,900
Centro de Trabajo: FELD (1 Afiliados)							$3,212,214	$514,000			$3,212,214	$128,500			$3,212,214	$128,500			$3,212,214		$223,600		$0	$0		$994,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$3,212,214	$514,000			$3,212,214	$128,500			$3,212,214	$128,500			$3,212,214		$223,600		$0	$0		$994,600
4	CC	1032395050	URUEÑA JONATHAN		25-14	30	$3,212,214	$514,000	EPS005	30	$3,212,214	$128,500	CCF21	30	$3,212,214	$128,500	14-11	30	$3,212,214	6.960%	$223,600	30	$0	$0	Si	$994,600
Total			**Afiliados(4)**				$8,758,278	$1,401,500			$8,758,278	$350,500			$8,758,278	$350,500			$8,758,278		$252,800		$0	$0		$2,355,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900262799	4	FELD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FELD	CR 49 A 94 76 OF 305	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7036765	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1497146321	9486327504	E	2025/05/23	2025/05/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,355,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,401,500	$0	$0	$1,401,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$827,000	$0	$0	$827,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$346,700	$0	$0	$346,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$252,800	$0	$0	$252,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$252,800	$0	$0	$252,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$350,500	$0	$0	$350,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$350,500	$0	$0	$350,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$350,500	$0	$0	$350,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$293,500	$0	$0	$293,500
TOTAL				4	$2,355,300	$0	$0	$2,355,300

Barranquilla, D.E.I.P., julio 2 de 2025

CERTIFICACION

El suscrito **ELIÉCER ENRIQUE MELO JEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.144.577 expedida en Cartagena, actuando en mi calidad de representante legal de la sociedad MRC INGENIEROS S.A.S., identificada con NIT No. 901.688.528-8, declara bajo la gravedad del juramento que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato.

Atentamente,



ELIÉCER ENRIQUE MELO JEREZ
C.C. No. 73.144.577 de Cartagena
Representante Legal MCR INGENIEROS S.A.S.

CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED

INFOME DE GESTION No 1

CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025

Junio 2025

Gobierno de CALDAS

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.

CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025
INFOME DE GESTION No 1

Julio de 2025

Versión:00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	Ing. Luisa Fernanda Chacón Coordinadora del Proyecto	*Ing. Hernando Leal* Representante Legal
Fecha: 02/07/2025	Fecha: 02/07/2025	Fecha: 02/07/2025

CONTRATO N. 21022025-0425

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.

Versión: 00

CONTRATISTA: **CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025**

ELABORO: Firma:	REVISO: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre:	Nombre: Luisa Chacón	Nombre: Luis Hernando Leal
Cargo:	Cargo: Ingeniera Civil	Cargo: Representante Legal
Fecha: 02/07/2025	Fecha: 02/07/2025	Fecha: 02/07/2025

INTERVENTOR: **INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS**

REVISO: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Johana Consuelo López	Nombre: Johana Consuelo López
Cargo: Representante Legal	Cargo: Representante Legal
Fecha:	Fecha:

APROBÓ: Firma:
Nombre: Oscar Eduardo Toro Betancur
Cargo: ING. Supervisor de La Gobernación De Caldas
Fecha:

Plan de Calidad:	**CHAFIK INGENIERÍA S.A.S**

Contrato de Interventoría Nº	29042025-0853
Ubicación	Calle 101A 47A 43 Bogotá
Nombre del Cliente	Gobernación de Caldas
Duración	Siete (07) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de Inicio	26 de mayo de 2025
Fecha de Terminación	25 de diciembre de 2025

Tabla Control de Cambios

Versión	Fecha	Naturaleza del cambio	Responsable	Firma
0	02/07/2025	Versión Inicial		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 8

2.1. LOCALIZACIÓN 8
2.2. DESCRIPCIÓN 11
2.3. ALCANCE 11
ALCANCE ESPECÍFICO 11
2.4. OBJETIVOS 14
2.4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 14
2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO DE LA CONSULTORÍA 14
2.4.3. NORMATIVIDAD VIGENTE 14

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 16

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 16
3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES 16
3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS 17
3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS 18
3.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO 20
3.2.1. ALCANCE 20
3.2.2. PERSONAL APROBADO DE LA CONSULTORÍA 21
3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO APROBADO CONTRACTUAL 22
3.2.4. GESTIÓN COMITÉS DE SEGUIMIENTO 22
2.2.4.1. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS EN EL PERIODO 23
3.2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES 23
3.2.6. ESTADOS DE AVANCE 33
3.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION DE CALIDAD 34
3.3.1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 35
3.3.2. PLANES DE MEJORA 35

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Reunión previa a visitas de campo Alcaldía de Aránzazu..... 24
Ilustración 2. recorridos de campo realizados 25
Ilustración 3. Identificación de las veredas objeto de diseño..... 25
Ilustración 4. Zona de ingreso Ramal los Naranjos 26
Ilustración 5. Zona alta, zona de proyección PTAP 26
Ilustración 6. Rio Chamberí 27
Ilustración 7. Identificación de áreas alejadas del proyecto 28

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la zona rural del Departamento de Caldas cuenta con deficiente calidad en el agua que se suministra a través de acueductos rurales y abastos; es así como la población rural de Caldas consume agua no tratada en más del 70%. La acentuada deforestación de las áreas de las microcuencas abastecedoras de los acueductos rurales del área de cobertura del sistema de acueducto proyectado y creciente efecto adverso del cambio climático hace que en las épocas de verano y más aún en las épocas del fenómeno del niño se presente desabastecimiento de agua para estos acueductos, situación que se busca solucionar con este proyecto.

Para tal fin la Gobernacion de Caldas, realizó la INVITACIÓN PÚBLICA No. No. CM-SV- 011-2024, con el fin de desarrollar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED. ", por el cual se suscribió el contrato de Consultoría No. 21022025-0425 firmado con el CONSORCIO DISEÑOS REGIONAL 2025.

El presente informe es una relación de las actividades desarrolladas durante el Primer periodo de gestión para el cumplimiento contractual del consultor.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1. LOCALIZACIÓN

Ubicación de la ejecución del proyecto:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona norte del departamento de Caldas que beneficiara a comunidades rurales de los municipios de Aranzazu, Filadelfia, Salamina y la Merced, con el fin de garantizar una infraestructura de acueducto adecuada que proporcione salubridad pública, calidad eficiente y oportuna del servicio a los habitantes de las siguientes veredas:

MUNICIPIO	CONSECUTIVO	NUCLEO POBLACIONAL
ARANZAZU	1	San José
	2	Barro Blanco
	3	La Pradera
	4	El Manzanillo
	5	San Ignacio
	6	El Roblal
	8	La Esperanza

	9	Chupaderos Santa Teresita
	10	B.V Las Marraneras
	11	B.V Santa Cruz
	12	B.V Naranjal
	13	B.V Naranjalito
	14	San Rafael
	15	B.V. Chupaderos
	16	La Meseta
	17	El Roció
	18	Alto El Roció
	19	Alegrías Bajo
	20 -26	Alegrías (El alto de los Ocampos, camino viejo, el Edén, el Crucero, Alegrías y la Pradera)
	27	La Guaira
	28	La floresta
	29	cuatro esquinas
TOTAL VEREDAS (29)		

LA MERCED	1	El Limón
	2	El Yarumo
TOTAL VEREDAS (2)		
FILADELFIA	1	La Marina
	2	Fil. Maiba
	3	La Quinta
	4	La Paila
	5	Llanitos
	6	Churimales
	7	Santa Rita
	8	Madroñales
	9	Corregimiento el Verso
	10 – 11	Piedras Blancas y Tambo
TOTAL VEREDAS (11)		
SALAMINA	1	Amoladora Pequeña
	2	Amoladora Pequeña Alta
	3	Amoladora Grande
	4	Amoladora El Hoyo
	5	San Diego
	6	El Perro
	7	Los Limones
	8	Los Naranjos
TOTAL VEREDAS (8)		
TOTAL VEREDAS PROYECTO	**50**	

2.2. DESCRIPCIÓN

En la actualidad la zona rural del Departamento de Caldas cuenta con deficiente calidad en el agua que se suministra a través de acueductos rurales y abastos; es así como la población rural de Caldas consume agua no tratada en más del 70%. La acentuada deforestación de las áreas de las microcuencas abastecedoras de los acueductos rurales del área de cobertura del sistema de acueducto proyectado y creciente efecto adverso del cambio climático hace que en las épocas de verano y más aún en las épocas del fenómeno del niño se presente desabastecimiento de agua para estos acueductos, situación que se busca solucionar con este proyecto.

Igualmente el índice de Riesgo por Calidad del Agua (IRCA) para la zona rural de los municipios involucrados en el proyecto, presenta valores altos lo que se convierte en un factor indicativo de mala gestión de la Administración municipal, el cual solo es posible mejorarlo siempre y cuando se dote a las comunidades del área rural del servicio de acueducto suministrando agua potable; desde el año 2014 las Entidades como Gobernación de Caldas en articulación con la Administración municipal de entonces evidenciaron la necesidad de construir un acueducto regional para la zona norte del departamento que beneficiara a comunidades rurales de los municipios de Aranzazu, Filadelfia, Salamina y la Merced, con el fin de garantizar una infraestructura de acueducto adecuada que proporcione salubridad pública, calidad eficiente y oportuna del servicio a los habitantes de las veredas antes mencionadas.

2.3. ALCANCE

ALCANCE ESPECÍFICO

En virtud del contrato a suscribir, la consultoría seleccionada deberá elaborar todos los Estudios y diseños correspondientes al componente técnico (estudios y diseños detallados), documentos necesarios para garantizar el aval de dicho componente de acuerdo a la Resolución 0661 de 2019 y a la normativa técnica del sector Resolución 330 de 2017 y todas las normas que la modifiquen, de forma que el proyecto pueda ser presentado ante el mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La consultoría también debe apoyar la estructuración de todos los componentes del proyecto ya sea documental, legal, institucional, ambiental, social y predial de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 y organizar la información de estos componentes para Caldas. El Alcance de este proyecto debe garantizar la funcionalidad del mismo, es decir, se debe captar, tratar y entregar agua a la comunidad.

PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO
Metodología de diseño
Metodología trabajos de campo
Cronograma
PRODUCTO 2: INFORME DE SOCIALIZACION
Recopilación de información de líderes sociales
Socialización inicial
Informe de socialización
PRODUCTO 3: INFORME DE RECOPILACION DE LA INFORMACION EXISTENTE
Solicitud de información y estudios disponibles la entidad contratante
Solicitud de información en las entidades municipales correspondientes
Análisis de la información jurídica
Análisis de la información recopilada
PRODUCTO 4: INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES
Diagnostico detallado de la situación de los municipios
Proyección de la población
Características sociocultural de la población beneficiada
Cuantificación de la demanda y/o necesidades
PRODUCTO 5: ESTUDIOS BASICOS
Informe de estudios básicos generales
Informe de estudios básicos de topografía y SIG
Informe de estudios básicos de suelos y geotecnia
Informe de estudios básicos de Hidrología
Informe sobre catastro de usuarios
Informe de estudios básicos Prediales

Informe de estudios básicos sociales
PRODUCTO 6: INFORME DIAGNOSTICO
Diagnostico hidráulico
Diagnostico Geotécnico
Diagnostico estructural
Diagnostico legal y administrativo del prestador
PRODUCTO 7: INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION
Planteamiento Alternativas líneas de aducción y conducción
Planteamiento Alternativas líneas de distribución
Planteamiento Alternativas planta de tratamiento
Planteamiento Alternativas tanques
Elaboración matriz multicriterio
Selección de alternativa optima
Socialización alternativa
Plan de estudios detallados de campo
PRODUCTO 8: ESTUDIOS DE DETALLE
Diseño detallado Topografía
Diseño detallado hidráulico y geométrico
Diseño detallado suelos
Estudios detallados hidrología
Diseño detallado estructuras
Estudio Predial
Elaboración de análisis de cantidades, especificaciones técnicas, cronograma y Presupuesto
PRODUCTO 9: ENTREGA FINAL DE INFORMACION Y PRESENTACION AL MINISTERIO

Documentación para viabilizaciòn

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general de la consultoría es contar con los diseños a nivel de detalle constructivo del sistema de acueducto, incluyendo sus obras anexas que cumplan la normatividad aplicable en el sector de agua potable y saneamiento básico y que siga los requerimientos de la resolución 0661 de 2019, para su presentación al mecanismo de viabilizaciòn ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) para la solicitud de recursos de Inversión.

2.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO DE LA CONSULTORÍA

Elaborar todos los Estudios y diseños correspondientes al componente técnico (estudios y diseños detallados), documentos necesarios para garantizar el aval de dicho componente de acuerdo a la Resolución 0661 de 2019 y a la normativa técnica del sector Resolución 330 de 2017 y todas las normas que la modifiquen, de forma que el proyecto pueda ser presentado ante el mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La consultoría también debe apoyar la estructuración de todos los componentes del proyecto ya sea documental, legal, institucional, ambiental, social y predial de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0661 de 2019 y organizar la información de estos componentes para presentación ante el Ministerio de manera coordinada con el PDA de Caldas. El Alcance de este proyecto debe garantizar la funcionalidad del mismo, es decir, se debe captar, tratar y entregar agua a la comunidad.

2.4.3. NORMATIVIDAD VIGENTE

- Resolución 0661 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Resolución 330 de 2017 Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
- Manual de contratación Gobernación de Caldas.

- Manual de interventoría Gobernación de Caldas
- NTC- Norma Técnica Colombiana ICONTEC
- INVIAS- Instituto Nacional de Vías
- NSR - Norma Sismo Resistente
- SCG- Sociedad Colombiana de Geotecnia
- ISO 9001 versión 2008
- ASTM International- Standards Worldwide
- AWWA- America Water Works Association
- AASHTO- American Association of State Highway and Transportation Officials.
- NTC ISO 9000:2005 Sistema de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario.
- NTC ISO 14001:2015 Sistema de gestión Ambiental Requisitos
- OHSAS 18001:2007 Sistema en Gestión en seguridad y salud ocupacional.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
CONTRATO No.	21022025-0425
OBJETO	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.
PLAZO	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR	**1.311.862.869 COP**
VALOR DE ANTICIPO	No aplica
FECHA DE INICIO	26 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de diciembre de 2025
CONTRATISTA O CONSULTOR	CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS
SUPERVISOR	ING. OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR

3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS

Tabla 1 Vigencia de Pólizas Consultoría legalización contrato

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros
Cumplimiento	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 11/02/2025 Hasta: 11/01/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Salarios y Prestaciones Sociales	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 11/02/2025 Hasta: 11/09/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad del Servicio	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 11/02/2025 Hasta: 11/09/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Compañía de seguros
Cumplimiento	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 26/05/2025 Hasta: 25/04/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Salarios y Prestaciones Sociales	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 26/05/2025 Hasta: 24/12/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Calidad del Servicio	11-44-101249618	$ 262,372,573.80	Desde: 26/05/2025 Hasta: 24/12/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 2 Vigencia de Pólizas Consultoría acta de inicio

Estado: La actualización se realizó según acta de inicio, se encuentran en revisión por parte de la entidad.

3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS

Para cada uno de los productos descritos a continuación la EAAB-ESP realizará los pagos de la siguiente manera:

PORCENTAJE	ACTIVIDAD O PRODUCTO
10% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
2% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DEL INFORME DE SOCIALIZACION INCIAL Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
5% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE INFORME DE RECOPILACION DE INFORMACION EXITENTE Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
10% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
15% DEL VA|LOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS BÁSICOS Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
10% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
5% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE LA SOCIALIZACION DE LA MISMA Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
6% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE DETALLE – INFORME DETALLADO DE SUELOS Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
6% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE DETALLE – INFORME DETALLADO DE TOPOGRAFIA Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
3% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE DETALLE – INFORME DETALLADO DE HIDROLOGÍA Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA

6% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE DETALLE – INFORME DETALLADO DE HIDRÁULICA Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
3% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE DETALLE – INFORME DE DISEÑO DETALLADO DE ESTRUCTURAS Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
6% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE LOS PLANOS GENERALES DEL PROYECTO Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
5% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO GENERAL, CANTIDADES DE O BRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, APUS, CRONOGRAMA, CALCULO DEL AIU Y EN GENERAL TODO LO QUE INCLUYE LA RES 0661 DE 2019 QUE DEBE CONTENER EL PRESUPUESTO Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
4% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE INFORME PREDIAL, FORMATO RESUMEN, MANUALES DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA
4% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON LA ENTREGA DE TODA LA INFORMACION Y PRESENTACION DEL PROYECTO AL MINISTERIO Y SU APROBACION POR INTERVENTORÍA

De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato el valor por producto es el siguiente:

PRODUCTO	VALOR	%
PLAN DE TRABAJO	$ 131.186.286,90	10%
INFORME DE SOCIALIZACION	$ 26.237.257,38	2%
INFORME DE RECOPILACION DE LA INFORMACION EXISTENTE	$ 65.593.143,45	5%
INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 131.186.286,90	10%
ESTUDIOS BASICOS	$ 196.779.430,35	15%
INFORME DIAGNOSTICO	$ 131.186.286,90	10%
INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION	$ 65.593.143,45	5%
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DE SUELOS	$ 78.711.772,14	6%

PRODUCTO	VALOR	%
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE TOPOGRAFIA	$ 78.711.772,14	6%
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDROLOGIA	$ 39.355.886,07	3%
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDRAULICA	$ 78.711.772,14	6%
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DISEÑO DETALLADO DE ESTRUCTURAS	$ 39.355.886,07	3%
PLANOS GENERALS DEL PROYECTO	$ 78.711.772,14	6%
PRESUPUESTO GENERAL, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICAIONES TECNICAS, APUS, CRONOGGRAMA Y CALCULO DE AIU	$ 65.593.143,45	5%
INFORME PREDIAL	$ 52.474.514,76	4%
ENTREGA FINAL DE INFORMACION Y PRESENTACION AL MINISTERIO	$ 52.474.514,76	4%

3.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO

3.2.1. ALCANCE

El presente informe da a conocer el avance de los Aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros y de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, desarrollados durante el período comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio de 2025, en concordancia con las actividades contratadas, específicamente en aquellas en las cuales hubo ejecución como se resaltan en el siguiente cuadro:

Tabla 3. Productos de la Consultoría

PRODUCTO
PLAN DE TRABAJO
INFORME DE SOCIALIZACION
INFORME DE RECOPILACION DE LA INFORMACION EXISTENTE
INFORME DE ACTIVIDADES PRELIMINARES
ESTUDIOS BASICOS
INFORME DIAGNOSTICO

PRODUCTO
INFORME DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DE SUELOS
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDROLOGIA
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DETALLADO DE HIDRAULICA
ESTUDIO DE DETALLE - INFORME DISEÑO DETALLADO DE ESTRUCTURAS
PLANOS GENERALS DEL PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICAIONES TECNICAS, APUS, CRONOGGRAMA Y CALCULO DE AIU
INFORME PREDIAL
ENTREGA FINAL DE INFORMACION Y PRESENTACION AL MINISTERIO

Fuente: CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025.

3.2.2. PERSONAL APROBADO DE LA CONSULTORÍA

El personal aprobado por la interventoría es el siguiente:

Tabla 4 Personal en estudio para aprobación consultoría

NOMBRE	CARGO
ROBERTO ENRIQUE VARGAS CASALINS	Director de consultoría
CÉSAR AUGUSTO LEAL CORONADO	Especialista Hidráulico
FRANKLEN CARLOS SUTA PICO	Especialista Suelos
CAMILO ANDRÉS CONTRERAS ROJAS	Especialista estructural
CAMILO TOVAR BONILLA	Geólogo
DIEGO CAMILO MATEUS PINEDA	Ingeniero Eléctrico

LEIDY TATIANA DIAZ RAMOS	Especialista Costos y presupuestos
CLAUDIA YAMILET RENDON VALENCIA	Especialista Ambiental
DIEGO ALFONSO GOMEZ CORTES	Especialista en Hidrología
GLORIA PATRICIA PEDROZA BALLESTEROS	Profesional Predial
LUISA FERNANDA CHACON CORONADO	Ingeniero Civil
JUAN JOSE CAJIGAS SANTAELLA	Arquitecto
JENNY PAOLA VERGARA	Profesional social
CARLOS ANDRES OCAMPO	Profeional SIG
TANIA BRIGUITH CELY ARIAS	Dibujante

3.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPO APROBADO CONTRACTUAL

Los equipos utilizados por la consultoría, durante este periodo fueron los siguientes:

- Camioneta Pick up (tarjeta de propiedad – camioneta Nissan MJX 144).
- Equipos de topografía con certificado de calibración vigente y GPS
- Software procesamiento de documentos, hoja de cálculo, cronograma, modelación de acueducto y alcantarillado y SIG.
- Equipo de comunicación móvil.
- Equipos para exploraciones de suelos (incluyendo perforaciones), laboratorio y cualquier otro que sea indispensable en las etapas de investigación y diseño.

3.2.4. GESTIÓN COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Para este periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento:

FECHA	ASISTENTES	OBJETIVO
30/05/2025	INTERVENTORIA CONSULTOR	Reunión de inicio para socialización de alcance
10/06/2025	INTERVENTORIA CONSULTOR PDA	Definición de los lineamientos para la socialización inicial requerida en términos.
12/06/2025	INTERVENTORIA CONSULTOR	Mesa de trabajo
13/06/2025	INTERVENTORIA CONSULTOR PDA	Mesa de trabajo para el desarrollo de actividades topográficas
25/06/2025	INTERVENTORIA CONSULTOR PDA	Presentación del apoyo a la supervisión y comité de seguimiento.

2.2.4.1. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS EN EL PERIODO

Se firmó acta de inicio el día 26 de mayo de 2025 una vez aprobada la documentación inicial requerida para tal fin.

3.2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES

3.2.5.1. PLAN DE TRABAJO

El día 5 de Junio se realizó la entrega del Plan de trabajo del Proyecto. El documento de manera general contiene:

- ✓ Alcance del proyecto.
- ✓ Enfoque técnico y metodología.
  - Etapa I: Recopilación de la Información, diagnóstico y planteamiento de alternativas.
  - Etapa II: Diseños De Ingeniería De Detalle
- ✓ Responsables.
- ✓ Cronograma de Trabajo.

El día 12 de Junio se envió respuesta a las observaciones iniciales al plan de trabajo emitidas por parte de la interventoría mediante el oficio HIDRO 2025-028. Entre la respuesta está la atención de observaciones a la socialización inicial, producto de recopilación y análisis de información existente, actividades preliminares, estudios

básicos, diagnóstico y análisis y selección de alternativas. De acuerdo con lo anterior quedó consolidada la versión 01 del plan de trabajo.


El día 13 de Junio se envió respuesta a las observaciones iniciales al plan de trabajo emitidas por parte de la interventoría mediante el oficio HIDRO 2025-030. Entre la respuesta está la atención de observaciones al producto de gestión social y predial, otras relacionadas a gestiones a desarrollar por parte de la consultoría para permisos, licencias y autorizaciones, personal y dedicación mínima y otras relacionadas a observaciones y recomendaciones del documento. De acuerdo con lo anterior quedó consolidada la versión 02 del plan de trabajo.

3.2.5.2. VISITA INICIAL A LA ZONA DEL PROYECTO

Durante los días 04 y 05 de junio de 2025 se realizaron recorridos de campo en los cuales se contó con la presencia del personal de la supervisión Interventoría y consultoría, entre las actividades desarrolladas se enlistan:

- Se realizó presentación del equipo de trabajo y una socialización inicial del alcance del proyecto al alcalde de Aránzazu y al gerente de aguas de Aránzazu

Ilustración 1. Reunión previa a visitas de campo Alcaldía de Aránzazu.

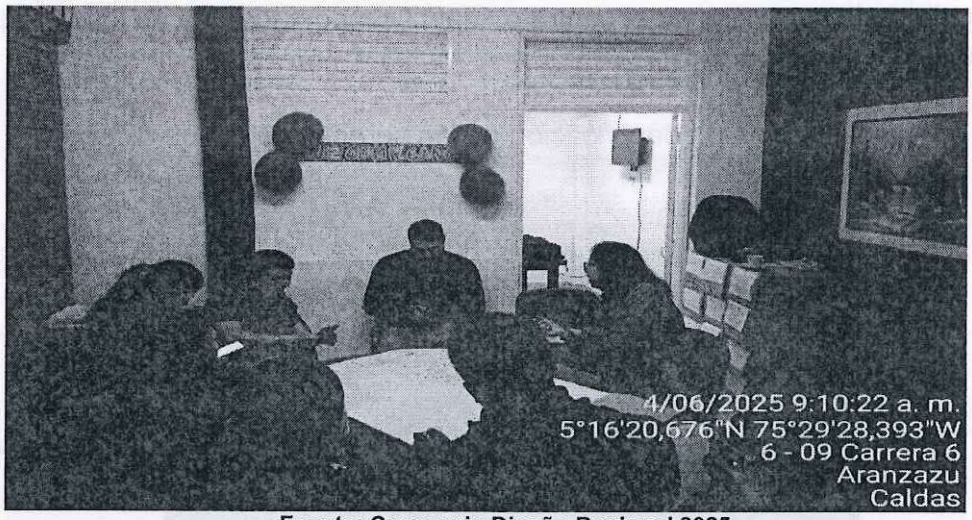


Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

En dicha reunión se definió a Aránzazu como centro para el desarrollo de las actividades

- Se realizaron recorridos por los corredores propuestos en la consultoría anterior

Ilustración 2. recorridos de campo realizados

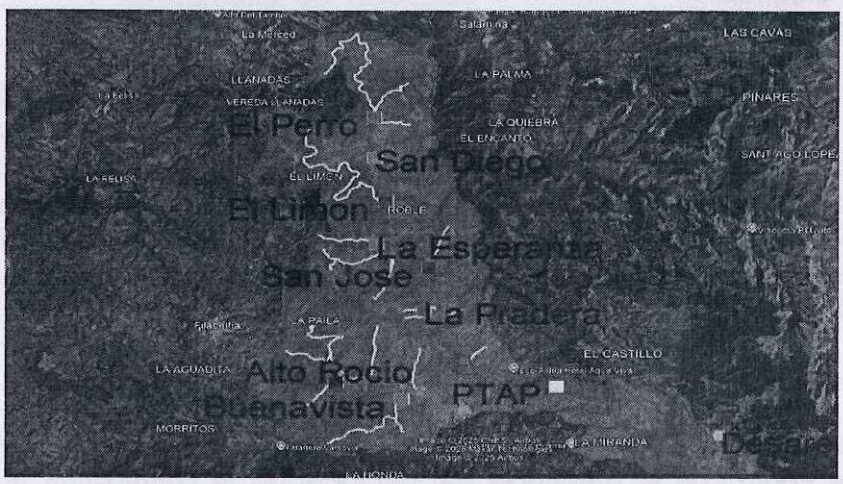


Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

Se realizó visita de reconocimiento del terreno, así como la visita los sitios de implantación de los posibles tanques de almacenamiento y distribución

- Se realizó una explicación de la zona de influencia directa de proyecto por parte de la supervisión del contrato, identificando cada una de las veredas a abastecer
-

Ilustración 3. Identificación de las veredas objeto de diseño.

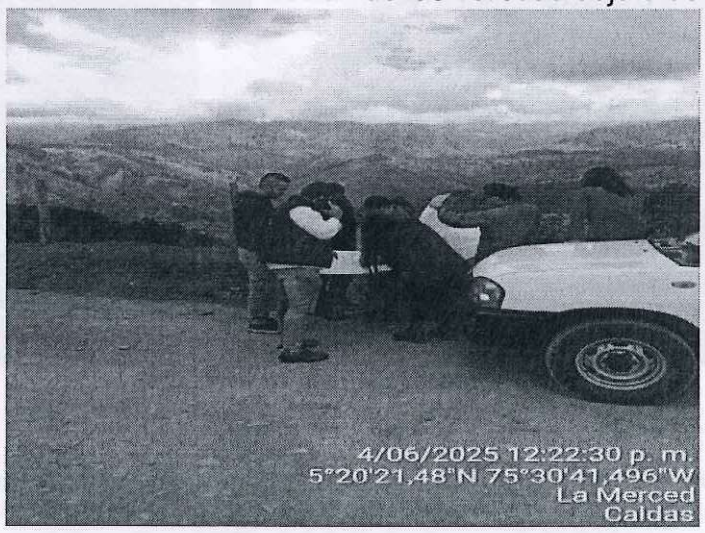

Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

- Durante el recorrido de campo se realizó reconocimiento de los ramales de distribución por medio de los cuales se lograría el cubrimiento de todas las veredas objeto de estudio

Ilustración 4. Zona de ingreso Ramal los Naranjos



Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

- El día 05 de junio se realizó reconocimiento de la zona donde se proyecta la planta de tratamiento de agua potable para el proyecto.

Ilustración 5. Zona alta, zona de proyección PTAP



Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

- Se realizó recorrido en la zona alta de cuenca del rio Chamberí, reconocimiento de quebrada la Sirena posible fuente de abastecimiento


Ilustración 6. Rio Chamberí



Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

- Durante la visita se logró identificar que las veredas Piedras blancas, el Tambo y corregimiento El Verso, que hacen parte del municipio de Filadelfia esta alejadas del área de influencia directa del proyecto y su interconexión o integración en el proyecto se dificulta.

Ilustración 7. Identificación de áreas alejadas del proyecto

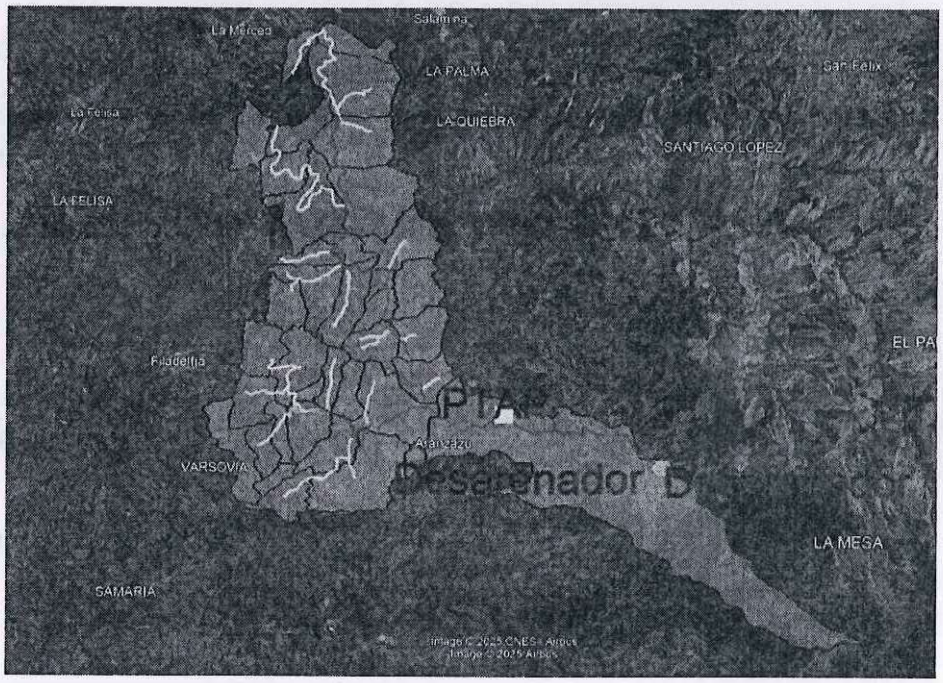

Fuente: Consorcio Diseño Regional 2025.

3.2.5.3. *PRODUCTO 3 – RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN*

El día 16 de Junio se hizo la respectiva entrega del producto 3 del proyecto "Recopilación y Análisis de la Información" el cual de manera resumida abarcó las actividades descritas a continuación.

- ✓ Recopilación de la normatividad aplicable al proyecto.
- ✓ Descripción, Información General y Localización del Proyecto.
- ✓ Descripción y Caracterización Física de los municipios involucrados en el proyecto.
- ✓ Solicitud, Recopilación y Análisis de la Información Disponible dentro de la cual se realizó:
  - ➢ Recopilación de la información recibida por el PDA de Caldas.
  - ➢ Solicitud de información a las siguientes instituciones públicas y privadas involucradas de manera directa o indirecta sobre el proyecto desde el 05 de Junio:

- Empresa prestadora del servicio de acueducto de Aranzazu S.A.S
- Alcaldías de Aranzazu, Salamina, Filadelfia y La Merced.
- Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC- S.A E.S.P.
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
- Corporación Autónoma Regional – Corpocaldas.
- Agencia Nacional de Tierras ANT.
- Migración Colombia.
- CENIT.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

✓ Revisión General de PBOT/EOT de los municipios involucrados en el proyecto.

✓ Revisión del proyecto elaborado en los estudios previos realizados para el año 2014 para los diferentes componentes.

✓ Recopilación de información Censal para el Proyecto.

✓ Conclusiones y recomendaciones.

El día 20 de Junio del 2025 se recibe el oficio de observaciones HIDRO 2025-038 realizadas al producto 3 del proyecto las cuales son atendidas resaltando los siguientes puntos importantes.

✓ Se atienden observaciones correspondientes al producto.

✓ Las observaciones hechas sobre actividades de diagnóstico serán atendidas en su momento para los productos correspondientes a diagnóstico del sistema de abastecimiento de acueducto en la zona del proyecto.

✓ Las observaciones realizadas hechas sobre actividades de alternativas serán atendidas en su momento para los productos correspondientes al planteamiento, análisis y selección de las mismas en la zona del proyecto.

✓ Se presentan los soportes correspondientes al seguimiento y la trazabilidad de la información solicitada a las diferentes entidades públicas y privadas involucradas de manera directa e indirecta en el proyecto.

- ✓ Se hace claridad que la información recibida desde el PDA de Caldas es la mostrada en el informe el cual detalla la misma en la revisión realizada, en la misma no se encuentra a detalle la información de algunos componentes de acuerdo a las conclusiones del producto.
- ✓ La información de PBOT/EOT de los municipios fue obtenida en las páginas oficiales de las alcaldías que representan fuentes confiables de la documentación descargada.
- ✓ La consultoría realizó principalmente la revisión del proyecto previo al contrato pues representa la primera información que debe ser tenida en cuenta para el desarrollo del contrato. Así mismo se realiza una solicitud de información a entidades como la ANLA, CENIT, Las Alcaldías, Corpocaldas y otras de carácter público y privado que tienen de primera mano la información de valor para el proyecto y su desarrollo, es por ello que, en medida que se va recibiendo información de estas entidades se va recopilando y haciendo un análisis que discrimine entre la información relevante y no relevante para el proyecto. Sin embargo, como se puede evidenciar en el informe del producto entregado a la fecha de entrega del mismo aún no se ha empezado a recibir este tipo de información y como quedó estipulado en el capítulo de solicitud, análisis y recopilación de la información del informe se seguirá realizando la trazabilidad de la misma y se continuará recopilando la información para su respectivo uso en productos posteriores de acuerdo con la solicitud de la interventoría del proyecto.

1. Para el informe de este producto se concluyó:

- ✓ La revisión realizada muestra que el alcance del proyecto actual es más amplio que el de la consultoría anterior y contempla un mayor número de veredas razón por la cual debe realizarse una ampliación de la cobertura del proyecto y aunque se seguirá la estructura del diseño previo el actual debe rediseñarse para dar cumplimiento a los nuevos objetivos del proyecto.
- ✓ Para la presente consultoría el estudio de población debe ser actualizado considerando netamente la población rural de las veredas incluidas en el alcance de este contrato y que se encuentran distribuidas entre los municipios de Aranzazu, Filadelfia, La Merced y Salamina. Adicionalmente, es de tener en cuenta que los datos censales reportados por el DANE han tenido actualizaciones post Covid y que en el lapso de tiempo entre los estudios previos desarrollados en el año 2014 y los estudios a desarrollar en el presente contrato, la normativa en la que se enmarca el proyecto ha tenido actualizaciones por lo que se deberá garantizar que se cumpla con los

nuevos requerimientos que puedan tener estas actualizaciones.

- ✓ La proyección de la demanda debe ser ajustada considerando la actualización del estudio de población y las actualizaciones de la normativa en la que se enmarca el proyecto en el lapso de tiempo entre los estudios previos desarrollados en el año 2014 y los estudios a desarrollar en el presente contrato.

- ✓ Dentro de la información recibida la presente consultoría no encuentra planos ni otros archivos en formato editable (Archivos dwg, archivos tipo shape, Raster, Tin, entre otros) que sirvan de ayuda en etapas posteriores del presente proyecto.

- ✓ De acuerdo a lo indicado en los términos de referencia en cuanto a información de entrada proveniente de los diseños realizados previamente se determina la inexistencia de información topográfica, estructural, caracterización de la fuente, entre otros de importancia, pues se encuentran algunos apartes en los informes pero carece de memorias de cálculo, modelos o cualquier tipo de soporte de la información (Como soporte de esto se tiene la lista de chequeo emitida por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio). Si la entidad no cuenta con información adicional a la entregada, podría conllevar a unos mayores tiempos de ejecución ya que algunas labores tendrían que iniciar desde cero. Es importante recalcar que en la etapa precontractual era imposible determinar la completitud de la información del estudio anterior.

- ✓ No se encuentran entre la información revisada modelaciones hidráulicas del proyecto ni memorias de cálculo que respalden los diseños realizados.

- ✓ Para esta consultoría, el trazado planteado en los estudios previos del proyecto, aunque no cuenta con un planteamiento de alternativas, se evidencia en la revisión realizada tuvo un trabajo estructurado que contempló en su momento varios criterios que hacen del mismo una buena opción de trazado por lo que se considera sirve como base preliminar para el diseño a desarrollar de manera que se complementará y/o modificará en casos en los que se vea necesario hacerlo por falta de redes en veredas adicionales en el alcance del contrato o en otros casos como cruce de interferencias, vías, cuerpos de hídricos entre otros. Estos cambios mencionados bajo una evaluación multicriterio que permita las mejores decisiones en pro de lograr los objetivos del proyecto.

- ✓ Una de las grandes conclusiones de la visita realizada es que el corregimiento El Verso y la vereda Piedras blancas y El Tambo se encuentran muy alejadas del área aferente de la estructura integral del acueducto

regional planteado en los estudios previos del presente contrato y su cobertura dispuesta y según lo observado en campo no sería posible la interconexión técnica del sistema diseñado con estas zonas que se encuentran dentro del alcance del presente contrato de consultoría y que son zonas nuevas tenidas en cuenta entre el proyecto ejecutado en el año 2014 y el diseño detallado a llevar a cabo en el presente contrato. A continuación, se muestra una salida gráfica de lo mencionado anteriormente que evidencia la imposibilidad de incluir estas zonas en la cobertura del proyecto (La salida gráfica muestra el sector El Tambo que corresponde a la Vereda/Núcleo Poblacional Piedras Blancas y El tambo mencionadas en el alcance del contrato).

- ✓ La información recepcionada para el componente social, del proyecto anterior, no es suficiente para la generación base del documento de diagnóstico y, por ende, se está a la espera de la información solicitada a los entes municipales y territoriales.

- ✓ De acuerdo con la respuesta por parte del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la lista de chequeo, el proyecto cuenta únicamente con un cd conteniendo medios magnéticos en pdf, establece el MCVT, se requiere contar con los medios físicos de texto y planos impresos a escalas convenientes debidamente firmados por los responsables. así mismo, contar con los medios magnéticos originales, es decir, modelación hidráulica en epanet o similar, planos en cad, texto en procesador de palabra o de texto, presupuesto formulado en excel, enlazando los valores desde los listados de precios para materiales, equipos, mano de obra y transporte, formulación de los análisis de precios unitarios – apu, y enlace de los apu con el formulario de cantidades y precios que dan origen al presupuesto final. igualmente contar con los estudios completos para cada una de las especialidades que contribuyen al diseño. Lo anterior respalda algunas de las conclusiones realizadas por la consultoría en el presente informe. ***Se entrega esta lista de chequeo como en el Anexo No. 6 al presente informe.***

- ✓ Una vez revisada la información existente y consultada la información del Componente Predial, desde los aspectos Técnico Catastral y Jurídico, se puede establecer lo siguiente:

  - El documento denominado Anexo B Análisis Predial, no cuenta con las características Técnicas requeridas para un Análisis Predial, solo se trata de un informe de campo elaborado para dar claridad acerca de las zonas desde el Componente Social.

  - El documento revisado no cita información de aspectos jurídicos o Catastrales, solo menciona algunos de los propietarios que se

encontraron en el momento de realizar los recorridos.

- La estructuración que tiene el documento no se categoriza como un informe, sino más bien como un reporte de campo, relacionado con lo que se logra encontrar en terreno, luego de realizar las visitas a los predios.
- Es posible que la información que se capturó en esa fecha, deba actualizarse, sin embargo, el documento no relaciona folios de matrículas inmobiliarias, para realizar análisis jurídicos.
- El documento no viene acompañado de una cartografía general, a fin de dar a conocer un corredor de trabajo o un alineamiento completo de las zonas objeto de intervención.
- Tampoco se realizó la recolección de información catastral de soporte, como es el tema de la codificación de los predios a nivel catastral, se tomó un código incompleto, que no puede asociarse con las bases del IGAC.

✓ Luego de realizar las consultas en la cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, se logra determinar geográficamente la zona, identificando los códigos catastrales, nombres de veredas y coordenadas para elaborar cartografía temática.

✓ Se elaboran oficios a IGAC a fin de obtener información Catastral y Jurídica de los predios identificados.

✓ Se establece contacto con las Secretarías de Planeación de los Municipios, a fin de solicitar la información de los POTS y de las normas de Uso del Suelo para estas zonas.

3.2.6. Estados de Avance

AVANCES	PROGRAMADO	EJECUTADO
Financiero	12%	0%
Físico	17%	16,80%
Tiempo	14,29%	14,29%

LINEA DEL TIEMPO:

TIEMPO	DIAS	PORCENTAJE
Tiempo del contrato	210	100%
Tiempo Ejecutado al 04 de octubre de 2024	30	14.29%
Tiempo por ejecutar del contrato	180	85.71%

3.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION DE CALIDAD

El área de Diseños de CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025 para garantizar que el desarrollo de los procedimientos y el servicio prestado cumpla con los requisitos y expectativas de sus clientes, detallo dentro del Plan de calidad cada uno de los parámetros, programas y procedimientos a seguir durante la ejecución del contrato.

Cabe resaltar que el plan de calidad nos proporciona la metodología y responsabilidades que se tienen frente a cada una de las actividades que se desarrollaran durante la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales impuestos por la Gobernacion de Caldas.

Dentro de los parámetros anteriormente mencionados, se ha diligenciado los formatos correspondientes a la etapa de ejecución que se relacionan a continuación:

- Registro de Correspondencia Enviada
- Registro de Correspondencia Recibida
- Cronograma de ejecución de trabajos
- Relación de información recopilada

✓ AUDITORÍAS INTERNAS

No hay auditorias para el periodo

✓ INDICADORES DE GESTIÓN

El único indicador de gestión del proyecto que ha sido medido es el de avance del proyecto establecido en el cronograma.

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** SIG **CONTRATO No.** 21022025-0425	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Vivienda y Territorio
UNIDAD O GRUPO:	Agua potable y saneamiento básico
FECHA INFORME:	Julio 11 de 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
N.º CONTRATO	21022025-0425				
CONTRATISTA	CONSORCIO DISEÑO REGIONAL 2025				
OBJETO DE CONTRATO	*ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DE CALDAS, MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED..*				
POBLACIÓN BENEFICIADA	*MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.*				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	*MUNICIPIOS DE ARANZAZU, SALAMINA, FILADELFIA Y LA MERCED.*				
VALOR:	$1.311.862.869 COP				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	7 meses	**FECHA INICIACIÓN**	26-5-2025	**FECHA. TERMINACIÓN**	25-12-2025

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADAS	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
1. Cumplir el objeto del presente contrato en los términos, obligaciones y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios previos, Anexos, en la Propuesta, y en el contrato.	A la fecha, se ha dado cumplimiento total a las obligaciones establecidas en las cláusulas 9 (Obligaciones generales del consultor) y 10 (Obligaciones específicas del consultor) del contrato.	100%
2. Elevar las consultas respectivas ante los municipios de Aranzazu, Salamina, Filadelfia. La Merced, entidades prestadoras de servicios públicos, etc., de documentos y estudios, diseños realizados que se	Dentro del periodo del reporte se generaron las consultas requeridas a los municipios y a las diferentes entidades de orden nacional, departamental y municipal	100%

encuentren dentro de la zona de influencia del área bajo estudio.		
3. Realizar a su nombre, las afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral (EPS, AFP, CCF, ARL) de la totalidad del personal vinculado al proyecto, independientemente del porcentaje de dedicación.	Se cumple con los aportes y afiliaciones correspondientes y se recibe por parte del consultor los certificados.	100%
4. Poner a disposición del contrato el personal mínimo ofertado	Se cumplió con el personal mínimo ofertado de acuerdo a los requerimientos de los productos.	100%
5. Presentar al Interventor o al Supervisor los informes semanales o los que se requiera sobre los avances de la Consultoría.	Se presento el informe de gestión No 1 y este fue avalado por la interventoría.	100%
6. Desarrollar las actividades establecidas en el presente estudio previo alcance del objeto. Estudios y diseños.	Para el corte de este informe esta actividad aun no aplica	100%
7. Entregar informe de cada estudio realizado (hidráulico, geotecnia y suelos, topografía, estructural, eléctrico, etc.) con sus respectivos anexos, de acuerdo a la Resolución 0661 de 2021, las recomendaciones de cada evaluador y cumplimiento de normativa del sector.	Para este corte, se entregó satisfactoriamente el Producto 1: Plan de Trabajo y Producto 3: Informe de recopilación de la información existente, y se ha avanzado de manera significativa en los siguientes productos: Producto 2: Informe de socialización Producto 4: Actividades preliminares	15%
8. Realizar acompañamiento a los municipios y al PDA en la presentación del proyecto ante el MVCT y en todas las mesas técnicas que se requieran hasta que se obtenga el aval del componente técnico.	No aplica para este periodo	N/A
9. Los estudios, memorias de cálculos, presupuesto, planos, que		100%

se alleguen deberán contar con la firma original del profesional que corresponda según el componente del proyecto y competencias legales (deberá entregarse copia de la cédula, tarjeta profesional, memorial de responsabilidad y certificado de vigencia de la tarjeta profesional de quien diseñe cada uno de los componentes donde se evidencie la fecha de emisión de los mismos).	Se dio cumplimiento en los productos No 1 y No 3 entregados en este periodo	
10. El contratista debe realizar los ajustes y modificaciones que se requieran por parte de la interventoría y los respectivos evaluadores del MVCT	Se realizaron los ajustes solicitados por la interventoría a los productosa entregados	100%
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento.	100%
12. Avisar oportunamente a la Entidad contratante, las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento.	100%
13. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión del contrato.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
14. Cumplir con todas las obligaciones derivadas y lineamientos técnicos del presente estudio previo.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
15. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
16. El CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante las planillas de pago y certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de	Para el corte de este informe esta actividad aun no aplica	

acuerdo a los requerimientos de Ley,o por el representante legal, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.		
17. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato de interventoría.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
18. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
19. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%
20. Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato.	Se ha dado cumplimiento a las citaciones realizadas tanto por la interventoría como por la supervisión del contrato.	100%
21. Las demás que, de conformidad con las especificaciones técnicas de obra, el manual de contratación del departamento y las disposiciones del artículo 1603, del Código Civil, corresponden a la naturaleza del contrato o que por ley, le parezcan	Se ha dado cumplimiento a este requerimiento de manrera rigurosa por parte del consultor.	100%

OBSERVACIONES:

- Se cumplió satisfactoriamente con la entrega del Plan de Trabajo (Producto 1) y del Producto 3 (Recopilación y Análisis de Información), incluyendo versiones corregidas tras observaciones por parte de la interventoría. Esto evidencia una planificación sólida y una respuesta ágil y adecuada a los requerimientos contractuales.

- Las visitas de reconocimiento y recorridos realizados con supervisión, interventoría y consultoría consolidaron una comprensión técnica y territorial profunda. Además, fortalecieron la base de datos geográfica, facilitando la identificación de zonas críticas, veredas prioritarias y potenciales áreas técnicas.

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

verificó rigurosamente el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral del personal del contratista

2. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		**$ 1'311'862'869**
Pago No.1	$ 196.779.430	
Saldo del contrato	$ 1'115'083'439	
SUMAS IGUALES	**$ 1'311'862'869**	**$ 1'311'862'869**

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La supervisión del contrató revisó la documentación presentada por la contratista durante el último periodo correspondientes al mes de ejecución (mayo-junio) y a los informes de la cuenta presentada, considerando que las mismas se realizaron con la oportunidad e idoneidad requerida.

EL SUSCRITO SUPERVISOR

HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el Pago Nro. 1 Lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO TORO B
FIRMA	

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.
