**MEMORANDO**

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
COMUNICACIONES - INTERNAS
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:
Radicado: 10-817-2025-003858
Fecha: 01/12/2025 - 08:32 AM
Remitente: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
Destinatario: LUISA FERNANDA SANDOVAL BARRAGAN
No.Folios: 1 Anexos: 30

110401

Bogotá D.C.,

PARA: **LUISA FERNANDA SANDOVAL BARRAGÁN**
Subdirectora Jurídica y de Contratación

DE: **ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO**
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

**ASUNTO:** Alcance Memorando N.º 10-817-2025-003848
Prórroga Contrato de Interventoría N.º SECOP II 5333353 – IPES 400 de 2023

Respetada Subdirectora.

Cordial saludo:

De manera atenta doy alcance al Memorando N.º 10-817-2025-003848 mediante el cual se solicitó adelantar el trámite de prórroga del Contrato de Interventoría N.º SECOP II 5333353 – IPES 400 de 2023, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL". adjuntando de manera completa los soportes de la justificación de la modificación.

Agradezco su atención.

**ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO**
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Anexos: Soportes justificación en 30 folios.

| | NOMBRE, CARGO O CONTRATO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Humberto C. Noya – Contratista SDAE | | 28/11/2025 |
| Revisó | Javier H. López Medina – Contratista SDAE | | 28/11/2025 |
| Aprobó | Adriana Villamizar Navarro – Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico | | 28/11/2025 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico del Instituto para la Economía Social IPES | | | |



**Carrera 9 N.º 10 – 59**
**PBX. 6014841930**
**Línea Gratuita**
**018000517621**
**www.ipes.gov.co**

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2025

CO-193-TCI-IPES-QUIRIGUA

**Señores:**
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL**
Dra. Adriana Villamizar Navarro
Supervisora del contrato
Ing. Humberto Carlos Noya Romero
Apoyo a la Supervisión
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
Instituto para la Economía Social (IPES)
.

**Referencia**: **CONTRATO INTERVENTORIA No. C01.PCCNTR.5333353**
**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"
**CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.5291236**
**OBJETO** "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

**Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C01.PCCNTR.5333353**

Cordial saludo:

En atención a la necesidad de una **prórroga de tiempo** al contrato OBRA CO1.PCCNTR**.5291236**, es necesario que la entidad estudie la posibilidad de prorrogar de tiempo al contrato de interventoría para continuar con las labores de control y vigilancia al contrato de obra durante el plazo solicitado por el contratista de obra. La solicitud se fundamente a causas no imputables, específicamente las condiciones climáticas adversas que han afectado directamente la ejecución de las actividades críticas del contrato, consistentes en el desmontaje y cambio de la cubierta y estructura de techo, labores que requieren condiciones secas para garantizar:

- Estabilidad estructural.
- Seguridad del personal.
- Correcta instalación de sistemas de impermeabilización.

## CAUSALES DE PRORROGA DE TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA

1) **Evidencia de Afectación Climática:**

El contratista adjunta un registro detallado de 337 días de seguimiento meteorológico en la Plaza de Quirigua, del cual se desprende que:

- 166 días registraron lluvia (49,70% del periodo).
- Meses con mayor afectación: Mayo (73,5 horas), Octubre (59 horas), Junio (54 horas).
- La frecuencia e intensidad de las precipitaciones superan las condiciones normales previstas para la ejecución de obras en cubierta.

2) **Fundamentos para la Aprobación**

La interventoría repaso las siguientes evidencias en que se fundamente la solicitud:

a) **Cumplimiento de Requisitos Contractuales y Legales**

- La solicitud se ajusta a lo previsto en la Ley 80 de 1993, que establece que:
  - Las entidades deben garantizar la ejecución idónea del objeto contractual.
  - Ninguna de las partes responde por hechos no imputables o causas fortuitas.
- La solicitud se ajusta a lo previsto en la Ley 80 de 1993, que establece que:

b) **Principio de Equilibrio Contractual**

- La jurisprudencia ha reconocido que, ante circunstancias sobrevinientes no imputables, se deben realizar ajustes razonables al plazo para preservar el equilibrio económico y técnico del contrato

c) **Transparencia y Seguimiento**

- La afectación climática fue documentada y socializada en:
  - Comités semanales de obra.
  - Informes semanales y mensuales.
  - Registros de interventoría y supervisión del IPES.

d) **Proporcionalidad de la Solicitud:**

- Aunque la afectación equivaldría a 164 días de lluvia, el contratista solicita solo 14 días de prórroga, demostrando buena fe, razonabilidad y eficiencia.

3) **Recomendación de la interventoría:** La interventoría recomienda APROBAR la prórroga solicitada por las siguientes razones:

- ✓ Causa justificada y no imputable al contratista.
- ✓ Sustento técnico y documental robusto y verificable.
- ✓ Alineación con el marco legal y contractual vigente.
- ✓ Protección de la calidad y seguridad de la obra.
- ✓ Mantenimiento del equilibrio contractual.

4) **Condiciones de la Aprobación:**

- La prórroga se otorga sin costos adicionales para la entidad.
- El contratista debe mantener la coordinación permanente con la interventoría y el IPES.
- Deberá presentar un cronograma ajustado con las actividades pendientes.

**JUSTIFICACION PRORROGA AL CONTRATO INTERVENTORIA**

Teniendo en cuenta la prórroga solicitada por el contratista de obra por (14) días, se hace necesario hacer un seguimiento y labores de control y vigilancia al contrato de obra NO **CO1.PCCNTR.5291236,** según lo descrito en la ley 80 de 1993:

ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación.

1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.


   En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

Cordialmente,



**ING. MIGUEL EFRAÍN ROSERO POLO**
ESP. EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN ESTRUCTURAS
MSC INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMICA.
Proyecto: ing. carlos acosta/residente de interventoría


| Id | Modo de tarea | No Item | Nombre de tarea | % completado | Comienzo | Fin | %Ejecutado 16/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **OBJETO: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPA 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO QUIRIGUA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL** | **100%** | **mar 5/11/24** | **lun 15/12/25** | **91%** |
| 2 | | | **ACTA DE INICIO PROYECTO** | **100%** | **mar 5/11/24** | **mar 5/11/24** | **100%** |
| 3 | | | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | **100%** | **mar 5/11/24** | **jue 16/01/25** | **100%** |
| 4 | | | DOCUMENTACION Y TRAMITE DE LA SUSPENSION CONTRATO OBRA No1 | 100% | mar 5/11/24 | mié 4/12/24 | 100% |
| 5 | | | TIEMPO SUSPENDIDO CONTRATO | 100% | mié 4/12/24 | jue 16/01/25 | 100% |
| 6 | | | **FASE 1 (pasillo 1 y 2)** | **100%** | **jue 16/01/25** | **lun 15/12/25** | **97%** |
| 7 | | | **CAPITULO 1** | **100%** | **jue 16/01/25** | **lun 15/12/25** | **100%** |
| 8 | | | ACTAS DE VECINDAD FASE 1 | 100% | jue 16/01/25 | dom 19/01/25 | 100% |
| 9 | | 1.6 | TRANSPORTE Y LOGISTICA | 100% | jue 16/01/25 | lun 10/02/25 | 100% |
| 10 | | | CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES | 100% | vie 7/02/25 | dom 9/02/25 | 100% |
| 11 | | NP17 | TORRE PLATAFORMA ALTURA DE TRABAJO 4 MT CON BARANDA DE SEGURIDAD | 100% | mar 11/02/25 | mar 24/06/25 | 100% |
| 12 | | 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL HASTA H=2,00m EN REPISA Y LONA VERDE | 100% | mié 12/02/25 | jue 29/05/25 | 100% |
| 13 | | 1.02 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS | 100% | mar 18/02/25 | vie 23/05/25 | 100% |
| 14 | | 1.04 | DESMONTE CARPINTERIA METALICA - REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD | 100% | jue 27/03/25 | jue 22/05/25 | 100% |
| 15 | | 1.05 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD NO INCLUYE ADECUACIONES O PINTURA | 100% | jue 27/11/25 | lun 15/12/25 | 100% |
| 16 | | 1.08 | DESMONTE DE LAMPARAS | 100% | lun 7/04/25 | jue 29/05/25 | 100% |
| 17 | | | **CAPITULO 2** | **100%** | **vie 7/02/25** | **sáb 20/09/25** | **100%** |
| 18 | | 1.09 | DESMONTE DE PARCIALES ELÉCTRICAS MONOFASICAS, BIFASICAS O TRIFASICAS MAYORES A 12 AWG. INCLUYE TUBERIAS PVC O EMT. | 100% | mié 26/02/25 | mar 10/06/25 | 100% |
| 19 | | 1.10 | INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS | 100% | vie 14/02/25 | jue 12/06/25 | 100% |
| 20 | | NP2 | (DEMOLICION)ESCARIFICACIÓN DE LA VIGA CANAL | 100% | lun 3/03/25 | jue 12/06/25 | 100% |
| 21 | | NP3 | ANCLAJE EN COLUMNA CON VARILLA #5 L=1,30 | 100% | mar 4/03/25 | vie 13/06/25 | 100% |
| 22 | | NP4 | VIGA CANAL EN CONCRETO 4.000 PSI (28 Mpa) CON ACELERANTE INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI Y APLICACIÓN SIKADUR EN CONCRETO ANTIGUO | 100% | vie 13/06/25 | sáb 20/09/25 | 100% |
| 23 | | NP7 | MAMPOSTERIA PARA ANTEPECHOS VENTANA Y COMPLETAR ALETAS DE VIGA CANAL INCLUYE REPELLO | 100% | mié 12/03/25 | vie 13/06/25 | 100% |
| 24 | | 2.02 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | 100% | lun 28/04/25 | mar 17/06/25 | 100% |
| 25 | | **2.01** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILES IPE 270** | 100% | **vie 7/02/25** | **mié 18/06/25** | 100% |
| 26 | | | SUMINISTRO MATERIAL IPE 270 PEDIDO 1 | 100% | vie 7/02/25 | vie 7/02/25 | 100% |
| 27 | | | SUMINISTRO MATERIAL IPE 270 PEDIDO 2 | 100% | lun 14/04/25 | mar 15/04/25 | 100% |
| 28 | | | TRABAJO EN TALLER IPE 270 | 100% | lun 10/02/25 | dom 8/06/25 | 100% |
| 29 | | | INSTALACION DE IPE 270 | 100% | vie 4/04/25 | mié 18/06/25 | 100% |
| 30 | | NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION CARPINTERIA METALICA - VENTANAS EN ALUMINIO(PERFILERIA EN ALUMINIO1101 PARA MARCO, VERTICALES EN 1103, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO DE 5MM, SELLADA CON SILICONA ESTRUCTURAL TRANSPARENTE, INCLUYE ALFAJIA) | 100% | mar 29/04/25 | sáb 21/06/25 | 100% |
| 31 | | **NP1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS ( PHR 220X80 (2.5mm)** | 100% | **sáb 8/02/25** | **mié 18/06/25** | 100% |
| 32 | | | SUMINISTRO MATERIAL PHR 220X80 (2.5 mm) PEDIDO 1 | 100% | sáb 8/02/25 | sáb 8/02/25 | 100% |
| 33 | | | SUMINISTRO MATERIAL PHR 220X80 (2.5 mm) PEDIDO 2 | 100% | mié 16/04/25 | mié 16/04/25 | 100% |
| 34 | | | TRABAJO EN TALLER PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | dom 9/02/25 | dom 8/06/25 | 100% |
| 35 | | | INSTALACION DE PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | sáb 5/04/25 | mié 18/06/25 | 100% |
| 36 | | NP18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA SKYDECK SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES 50 CM 0,45 mm | 100% | lun 28/04/25 | sáb 21/06/25 | 100% |
| 37 | | | **CAPITULO 3** | **100%** | **lun 24/03/25** | **vie 20/06/25** | **87%** |
| 38 | | NP5 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" INCLUYE ACCESORIOS | 100% | mar 8/04/25 | mié 18/06/25 | 100% |
| 39 | | NP11 | CUPULA CONCENTRICA DE ALUMINIO 6X4 (DE ACUERDO A PLANO HLL-03 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) | 100% | lun 19/05/25 | sáb 14/06/25 | 0% |
| 40 | | NP12 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL | 100% | jue 22/05/25 | mié 18/06/25 | 100% |
| 41 | | NP13 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION Y PENDIENTADO CON LOS NUEVOS TRAMOS DE CANAL | 100% | vie 18/04/25 | jue 19/06/25 | 100% |
| 42 | | NP14 | REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES O LA QUE LA ENTIDAD PROVEA | 100% | sáb 24/05/25 | vie 20/06/25 | 0% |

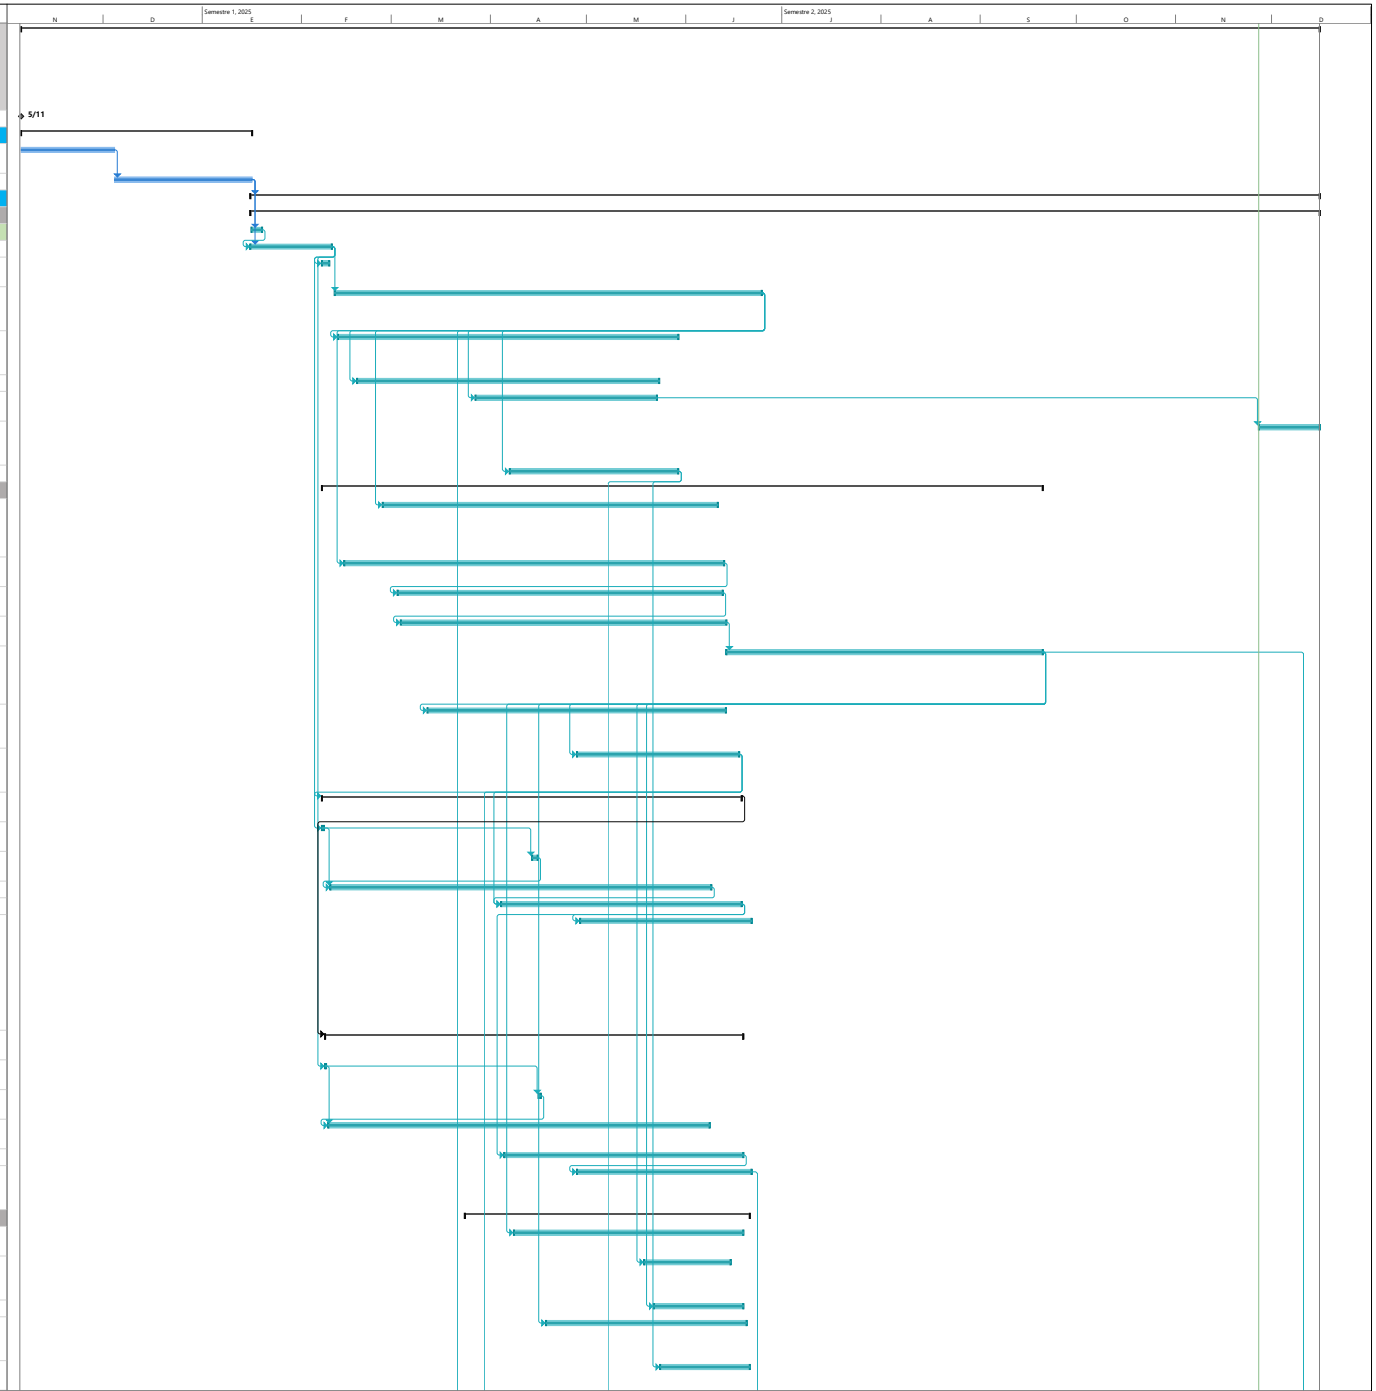


Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 27/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


| Id | Modo de tarea | No Item | Nombre de tarea | % completado | Comienzo | Fin | %Ejecutado 16/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | NP15 | ORGANIZACIÓN CABLEADO EN CUBIERTA (SEGUIMIENTO A CABLEADO EN USO Y SUSPENSION DESISTALACION DE LOS CABLES EN DESUSO) | 100% | lun 24/03/25 | vie 20/06/25 | 100% |
| 44 | | NP16 | MODULO EN PLASTICO Y PERFIL METALICO 1 1/2" X 1 1/2" | 100% | mar 1/04/25 | vie 20/06/25 | 100% |
| 45 | | NP19 | PINTURA KORAZA FACHADA 2 MANOS | 100% | sáb 10/05/25 | jue 19/06/25 | 100% |
| 46 | | | FIN FASE 1 | 100% | sáb 21/06/25 | sáb 21/06/25 | 0% |
| 47 | | | ACTAS DE VECINDAD FASE 2 | 100% | lun 16/06/25 | vie 20/06/25 | 100% |
| 48 | | | **FASE 2 (pasillo 3 y 4)** | **100%** | **dom 22/06/25** | **lun 15/12/25** | **93%** |
| 49 | | | **CAPITULO 1** | **100%** | **dom 22/06/25** | **lun 15/12/25** | **88%** |
| 50 | | 1.6 | TRANSPORTE Y LOGISTICA | 100% | dom 22/06/25 | mar 24/06/25 | 0% |
| 51 | | NP17 | TORRE PLATAFORMA ALTURA DE TRABAJO 4 MT CON BARANDA DE SEGURIDAD | 100% | lun 23/06/25 | dom 17/08/25 | 100% |
| 52 | | 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL HASTA H=2,00m EN REPISA Y LONA VERDE | 100% | mié 25/06/25 | sáb 16/08/25 | 100% |
| 53 | | 1.02 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS | 100% | mié 25/06/25 | lun 11/08/25 | 100% |
| 54 | | 1.04 | DESMONTE CARPINTERIA METALICA - REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD | 100% | sáb 28/06/25 | lun 11/08/25 | 100% |
| 55 | | 1.05 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD NO INCLUYE ADECUACIONES O PINTURA | 100% | jue 27/11/25 | lun 15/12/25 | 65% |
| 56 | | 1.08 | DESMONTE DE LAMPARAS | 100% | mié 2/07/25 | mar 12/08/25 | 57% |
| 57 | | | **CAPITULO 2** | **100%** | **lun 23/06/25** | **sáb 30/08/25** | **100%** |
| 58 | | 1.09 | DESMONTE DE PARCIALES ELÉCTRICAS MONOFASICAS, BIFASICAS O TRIFASICAS MAYORES A 12 AWG. INCLUYE TUBERIAS PVC O EMT. | 100% | mié 25/06/25 | vie 8/08/25 | 100% |
| 59 | | 1.10 | INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS | 100% | mié 25/06/25 | jue 14/08/25 | 100% |
| 60 | | NP2 | (DEMOLICION)ESCARIFICACIÓN DE LA VIGA CANAL | 100% | vie 27/06/25 | jue 14/08/25 | 100% |
| 61 | | NP3 | ANCLAJE EN COLUMNA CON VARILLA #5 L=1,30 | 100% | vie 27/06/25 | jue 14/08/25 | 100% |
| 62 | | NP4 | VIGA CANAL EN CONCRETO 4.000 PSI (28 Mpa) CON ACELERANTE INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI Y APLICACIÓN SIKADUR EN CONCRETO ANTIGUO | 100% | sáb 28/06/25 | vie 15/08/25 | 100% |
| 63 | | NP7 | MAMPOSTERIA PARA ANTEPECHOS VENTANA Y COMPLETAR ALETAS DE VIGA CANAL INCLUYE REPELLO | 100% | mar 15/07/25 | sáb 16/08/25 | 100% |
| 64 | | 2.02 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | 100% | sáb 12/07/25 | vie 15/08/25 | 100% |
| 65 | | **2.01** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILES IPE 270** | **100%** | **lun 23/06/25** | **vie 29/08/25** | **100%** |
| 66 | | | SUMINISTRO MATERIAL IPE 270 | 100% | lun 23/06/25 | lun 23/06/25 | 100% |
| 67 | | | TRABAJO EN TALLER IPE 270 | 100% | mar 24/06/25 | vie 29/08/25 | 100% |
| 68 | | | INSTALACION DE IPE 270 | 100% | sáb 28/06/25 | jue 21/08/25 | 100% |
| 69 | | NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION CARPINTERIA METALICA - VENTANAS EN ALUMINIO(PERFILERIA EN ALUMINIO1101 PARA MARCO, VERTICALES EN 1103, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO DE 5MM, SELLADA CON SILICONA ESTRUCTURAL TRANSPARENTE, INCLUYE ALFAJIA) | 100% | lun 14/07/25 | mar 12/08/25 | 100% |
| 70 | | **NP1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS ( PHR 220X80 (2.5mm)** | **100%** | **mar 24/06/25** | **sáb 30/08/25** | **100%** |
| 71 | | | SUMINISTRO MATERIAL PHR 220X80 (2.5 m | 100% | mar 24/06/25 | mar 24/06/25 | 100% |
| 72 | | | TRABAJO EN TALLER PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | mié 25/06/25 | sáb 30/08/25 | 100% |
| 73 | | | INSTALACION DE PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | sáb 28/06/25 | vie 29/08/25 | 100% |
| 74 | | NP18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA SKYDECK SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES 50 CM 0,45 mm | 100% | mar 15/07/25 | dom 17/08/25 | 100% |
| 75 | | | **CAPITULO 3** | **100%** | **dom 6/07/25** | **dom 17/08/25** | **80%** |
| 76 | | NP5 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" INCLUYE ACCESORIOS | 100% | dom 6/07/25 | mié 13/08/25 | 100% |
| 77 | | NP11 | CUPULA CONCENTRICA DE ALUMINIO 6X4 (DE ACUERDO A PLANO HLL-03 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) | 100% | mié 9/07/25 | dom 13/07/25 | 0% |
| 78 | | NP12 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL | 100% | dom 20/07/25 | sáb 16/08/25 | 100% |
| 79 | | NP13 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION Y PENDIENTADO CON LOS NUEVOS TRAMOS DE CANAL | 100% | dom 13/07/25 | sáb 16/08/25 | 100% |
| 80 | | NP14 | REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES O LA QUE LA ENTIDAD PROVEA | 100% | dom 10/08/25 | vie 15/08/25 | 35% |
| 81 | | NP15 | ORGANIZACIÓN CABLEADO EN CUBIERTA (SEGUIMIENTO A CABLEADO EN USO Y SUSPENSION DESISTALACION DE LOS CABLES EN DESUSO) | 100% | dom 6/07/25 | vie 15/08/25 | 100% |
| 82 | | NP16 | MODULO EN PLASTICO Y PERFIL METALICO 1 1/2" X 1 1/2" | 100% | dom 6/07/25 | mié 13/08/25 | 0% |
| 83 | | NP19 | PINTURA KORAZA FACHADA 2 MANOS | 100% | lun 7/07/25 | dom 17/08/25 | 100% |
| 84 | | | FIN FASE 2 | 100% | dom 17/08/25 | dom 17/08/25 | 0% |
| 85 | | | ACTAS DE VECINDAD FASE 3 | 100% | mié 13/08/25 | sáb 16/08/25 | 0% |
| 86 | | | **FASE 3 (pasillo 5 - 6 y 7)** | **100%** | **lun 18/08/25** | **sáb 11/10/25** | **88%** |
| 87 | | | **CAPITULO 1** | **100%** | **lun 18/08/25** | **lun 15/12/25** | **100%** |

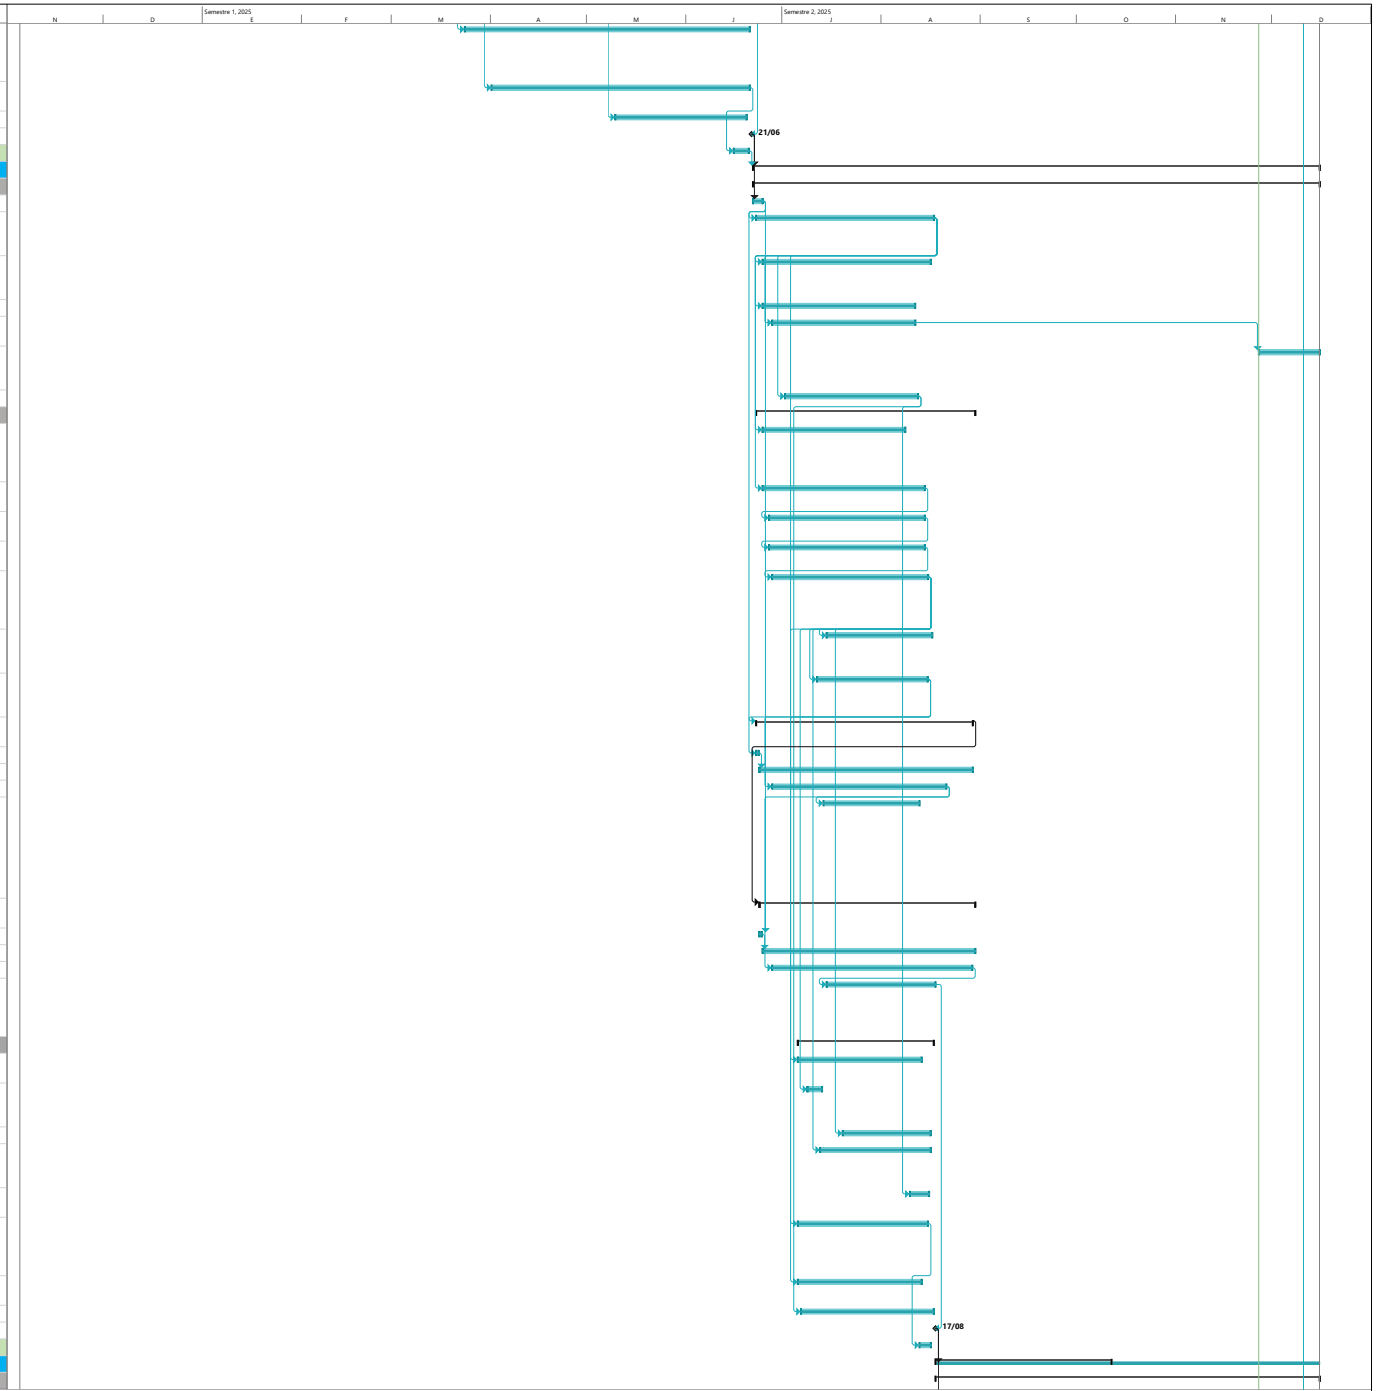


Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 27/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


| Id | Modo de tarea | No Item | Nombre de tarea | % completado | Comienzo | Fin | %Ejecutado 16/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | 1.6 | TRANSPORTE Y LOGISTICA | 100% | lun 18/08/25 | mié 20/08/25 | 100% |
| 89 | | NP17 | TORRE PLATAFORMA ALTURA DE TRABAJO 4 MT CON BARANDA DE SEGURIDAD | 100% | lun 18/08/25 | vie 10/10/25 | 100% |
| 90 | | 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL HASTA H=2,00m EN REPISA Y LONA VERDE | 100% | mar 19/08/25 | vie 10/10/25 | 100% |
| 91 | | 1.02 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS | 100% | sáb 23/08/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 92 | | 1.04 | DESMONTE CARPINTERIA METALICA - REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD | 100% | mié 27/08/25 | dom 30/11/25 | 100% |
| 93 | | 1.05 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD NO INCLUYE ADECUACIONES O PINTURA | 100% | jue 27/11/25 | lun 15/12/25 | 100% |
| 94 | | 1.08 | DESMONTE DE LAMPARAS | 100% | mié 27/08/25 | lun 6/10/25 | 100% |
| 95 | | | **CAPITULO 2** | **100%** | **lun 18/08/25** | **lun 15/12/25** | **94%** |
| 96 | | 1.09 | DESMONTE DE PARCIALES ELÉCTRICAS MONOFASICAS, BIFASICAS O TRIFASICAS MAYORES A 12 AWG. INCLUYE TUBERIAS PVC O EMT. | 100% | vie 22/08/25 | dom 5/10/25 | 100% |
| 97 | | 1.10 | INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS | 100% | vie 22/08/25 | sáb 11/10/25 | 100% |
| 98 | | NP6 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | 100% | lun 25/08/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 99 | | NP2 | (DEMOLICION)ESCARIFICACIÓN DE LA VIGA CANAL | 100% | lun 25/08/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 100 | | NP3 | ANCLAJE EN COLUMNA CON VARILLA #5 L=1,30 | 100% | mar 26/08/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 101 | | NP4 | VIGA CANAL EN CONCRETO 4.000 PSI (28 Mpa) CON ACELERANTE INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI Y APLICACIÓN SIKADUR EN CONCRETO ANTIGUO | 100% | mié 27/08/25 | jue 9/10/25 | 100% |
| 102 | | NP7 | MAMPOSTERIA PARA ANTEPECHOS VENTANA Y COMPLETAR ALETAS DE VIGA CANAL INCLUYE REPELLO | 100% | lun 1/09/25 | lun 6/10/25 | 100% |
| 103 | | 2.02 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | 100% | lun 1/09/25 | vie 10/10/25 | 100% |
| 104 | | **2.01** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILES IPE 270** | **100%** | **lun 18/08/25** | **mié 8/10/25** | **100%** |
| 105 | | | SUMINISTRO MATERIAL IPE 270 | 100% | lun 18/08/25 | lun 18/08/25 | 100% |
| 106 | | | TRABAJO EN TALLER IPE 270 | 100% | mar 19/08/25 | mar 7/10/25 | 100% |
| 107 | | | INSTALACION DE IPE 270 | 100% | lun 1/09/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 108 | | NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION CARPINTERIA METALICA - VENTANAS EN ALUMINIO(PERFILERIA EN ALUMINIO1101 PARA MARCO, VERTICALES EN 1103, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO DE 5MM, SELLADA CON SILICONA ESTRUCTURAL TRANSPARENTE, INCLUYE ALFAJIA) | 100% | lun 1/09/25 | lun 15/12/25 | 35% |
| 109 | | **NP1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS ( PHR 220X80 (2.5mm)** | **100%** | **mar 19/08/25** | **mié 8/10/25** | **100%** |
| 110 | | | SUMINISTRO MATERIAL PHR 220X80 (2.5 m | 100% | mar 19/08/25 | mar 19/08/25 | 100% |
| 111 | | | TRABAJO EN TALLER PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | mié 20/08/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 112 | | | INSTALACION DE PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | mar 2/09/25 | mié 8/10/25 | 100% |
| 113 | | NP18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA SKYDECK SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES 50 CM 0,45 mm | 100% | mar 9/09/25 | sáb 11/10/25 | 66% |
| 114 | | | **CAPITULO 3** | **100%** | **jue 28/08/25** | **mié 15/10/25** | **51%** |
| 115 | | NP5 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" INCLUYE ACCESORIOS | 100% | jue 28/08/25 | mié 8/10/25 | 7% |
| 116 | | NP11 | CUPULA CONCENTRICA DE ALUMINIO 6X4 (DE ACUERDO A PLANO HLL-03 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) | 100% | mié 1/10/25 | dom 5/10/25 | 0% |
| 117 | | NP12 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL | 100% | mar 9/09/25 | vie 10/10/25 | 60% |
| 118 | | NP13 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION Y PENDIENTADO CON LOS NUEVOS TRAMOS DE CANAL | 100% | mar 2/09/25 | mié 8/10/25 | 60% |
| 119 | | NP14 | REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES O LA QUE LA ENTIDAD PROVEA | 100% | vie 3/10/25 | jue 9/10/25 | 50% |
| 120 | | NP15 | ORGANIZACIÓN CABLEADO EN CUBIERTA (SEGUIMIENTO A CABLEADO EN USO Y SUSPENSION DESISTALACION DE LOS CABLES EN DESUSO) | 100% | vie 5/09/25 | jue 9/10/25 | 100% |
| 121 | | NP19 | PINTURA KORAZA FACHADA 2 MANOS | 100% | jue 25/09/25 | mié 15/10/25 | 44% |
| 122 | | | FIN FASE 3 | 100% | sáb 11/10/25 | sáb 11/10/25 | 0% |
| 123 | | | ACTAS DE VECINDAD FASE 4 | 100% | lun 6/10/25 | vie 10/10/25 | 0% |
| 124 | | | **FASE 4 (pasillo 8 - 9 , zona restaurantes) y administración)** | **100%** | **dom 12/10/25** | **lun 15/12/25** | **77%** |
| 125 | | | **CAPITULO 1** | **100%** | **dom 12/10/25** | **lun 15/12/25** | **70%** |
| 126 | | 1.6 | TRANSPORTE Y LOGISTICA | 100% | dom 12/10/25 | mar 14/10/25 | 70% |
| 127 | | NP17 | TORRE PLATAFORMA ALTURA DE TRABAJO 4 MT CON BARANDA DE SEGURIDAD | 100% | lun 13/10/25 | lun 15/12/25 | 66% |
| 128 | | 1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL HASTA H=2,00m EN REPISA Y LONA VERDE | 100% | mar 14/10/25 | vie 28/11/25 | 70% |
| 129 | | 1.02 | DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS | 100% | jue 16/10/25 | mar 25/11/25 | 72% |
| 130 | | 1.03 | ADECUACIÓN OBRAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (DESMONTES, TRASLADOS, ACOMETIDAS) | 100% | dom 19/10/25 | vie 28/11/25 | 75% |

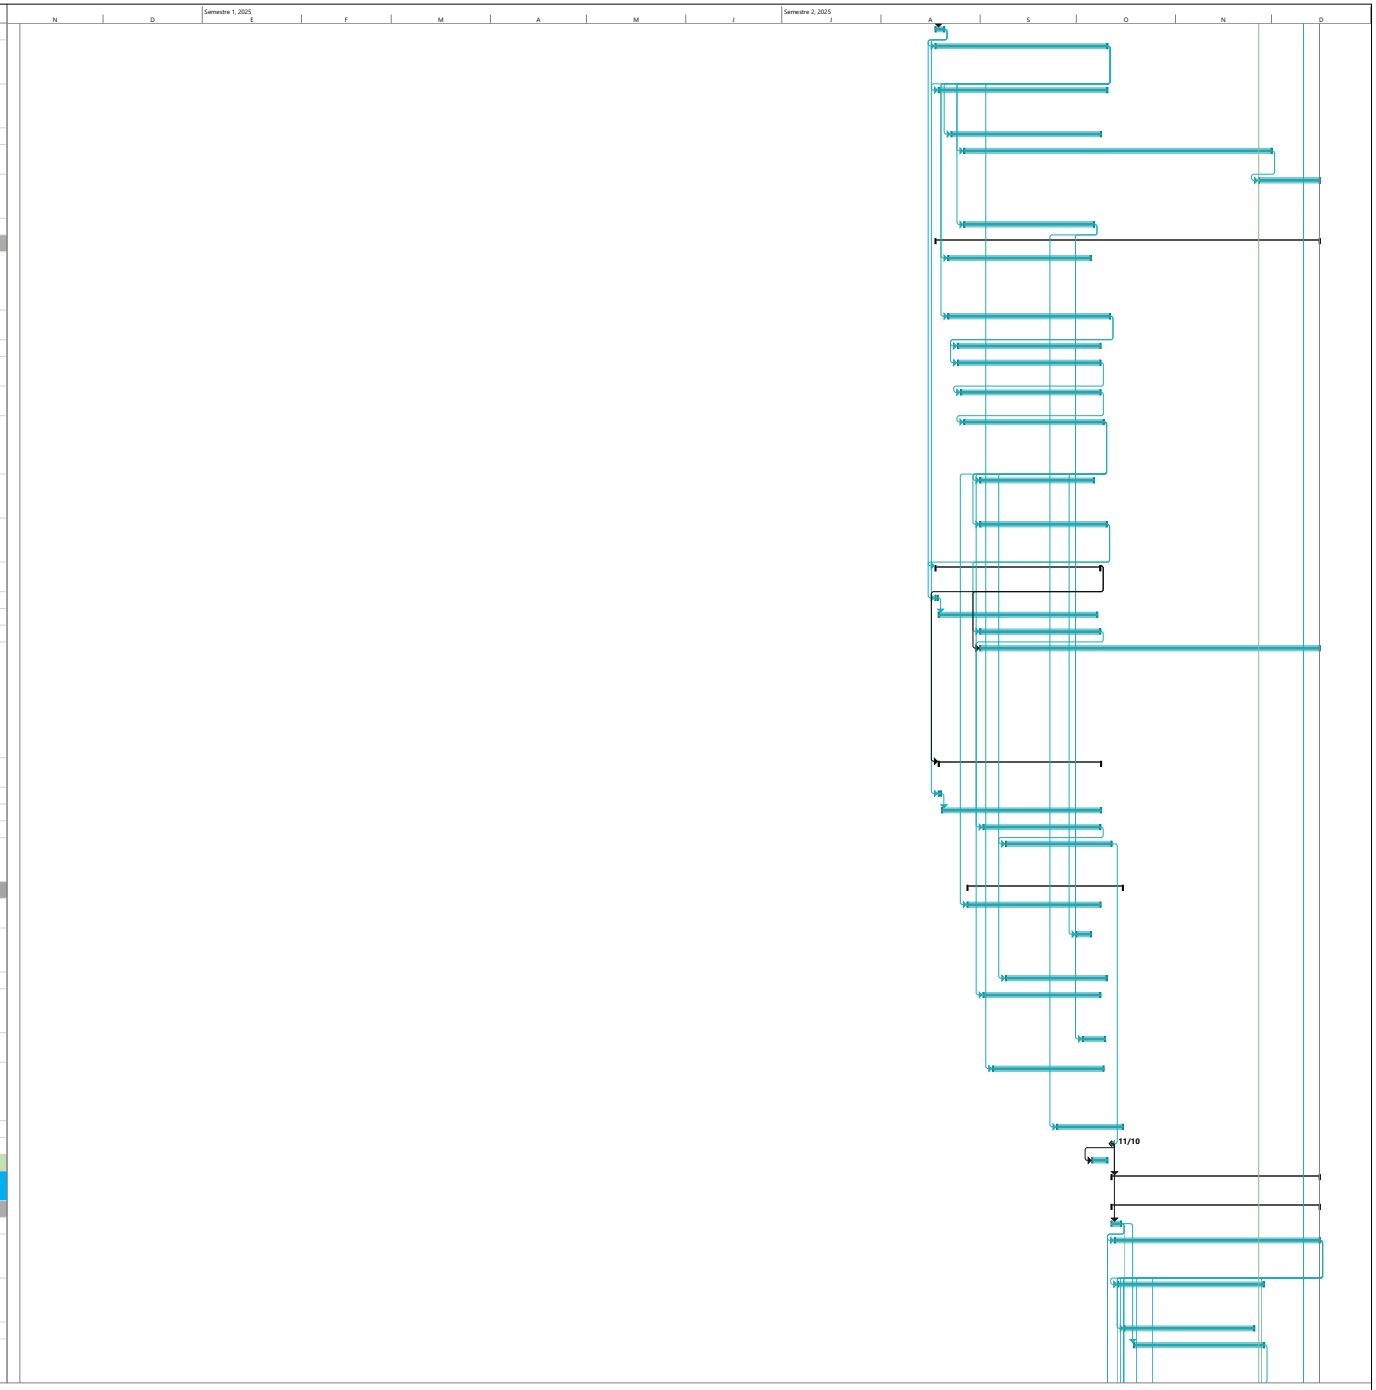


Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 27/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

| Id | Modo de tarea | No Item | Nombre de tarea | % completado | Comienzo | Fin | %Ejecutado 16/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | 1.04 | DESMONTE CARPINTERIA METALICA - REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD | 100% | dom 30/11/25 | lun 15/12/25 | 68% |
| 132 | | 1.05 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA REJAS VENTANAS SIN PROFUNDIDAD NO INCLUYE ADECUACIONES O PINTURA | 100% | dom 30/11/25 | lun 15/12/25 | 0% |
| 133 | | 1.07 | DESMONTE ESTANTERIAS | 100% | sáb 18/10/25 | sáb 22/11/25 | 100% |
| 134 | | 1.08 | DESMONTE DE LAMPARAS | 100% | mié 22/10/25 | sáb 22/11/25 | 100% |
| 135 | | | **CAPITULO 2** | **100%** | **lun 13/10/25** | **lun 15/12/25** | **87%** |
| 136 | | 1.09 | DESMONTE DE PARCIALES ELÉCTRICAS MONOFASICAS, BIFASICAS O TRIFASICAS MAYORES A 12 AWG. INCLUYE TUBERIAS PVC O EMT. | 100% | jue 16/10/25 | dom 23/11/25 | 75% |
| 137 | | 1.10 | INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURAS | 100% | vie 17/10/25 | dom 23/11/25 | 100% |
| 138 | | NP6 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA | 100% | sáb 18/10/25 | lun 24/11/25 | 100% |
| 139 | | NP2 | (DEMOLICION)ESCARIFICACIÓN DE LA VIGA CANAL | 100% | sáb 18/10/25 | dom 23/11/25 | 100% |
| 140 | | NP3 | ANCLAJE EN COLUMNA CON VARILLA #5 L=1.30 | 100% | dom 19/10/25 | lun 24/11/25 | 100% |
| 141 | | NP4 | VIGA CANAL EN CONCRETO 4.000 PSI (28 Mpa) CON ACELERANTE INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI Y APLICACIÓN SIKADUR EN CONCRETO ANTIGUO | 100% | lun 20/10/25 | mar 25/11/25 | 100% |
| 142 | | NP7 | MAMPOSTERIA PARA ANTEPECHOS VENTANA Y COMPLETAR ALETAS DE VIGA CANAL INCLUYE REPELLO | 100% | sáb 15/11/25 | mar 25/11/25 | 0% |
| 143 | | 2.02 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | 100% | vie 28/11/25 | lun 8/12/25 | 72% |
| 144 | | **2.01** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILES IPE 270** | **100%** | **lun 13/10/25** | **dom 14/12/25** | **85%** |
| 145 | | | SUMINISTRO MATERIAL IPE 270 | 100% | lun 13/10/25 | lun 13/10/25 | 100% |
| 146 | | | TRABAJO EN TALLER IPE 270 | 100% | mar 14/10/25 | dom 30/11/25 | 85% |
| 147 | | | INSTALACION DE IPE 270 | 100% | mié 10/12/25 | dom 14/12/25 | 85% |
| 148 | | **NP1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS ( PHR 220X80 (2.5mm)** | **100%** | **mar 14/10/25** | **dom 14/12/25** | **85%** |
| 149 | | | SUMINISTRO MATERIAL PHR 220X80 (2.5 m | 100% | mar 14/10/25 | mar 14/10/25 | 100% |
| 150 | | | TRABAJO EN TALLER PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | mié 15/10/25 | dom 14/12/25 | 85% |
| 151 | | | INSTALACION DE PHR 220X80 (2.5 mm) | 100% | mié 10/12/25 | dom 14/12/25 | 85% |
| 152 | | NP18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA SKYDECK SIN TRASLAPOS LONGITUDINALES 50 CM 0,45 mm | 100% | dom 26/10/25 | lun 15/12/25 | 80% |
| 153 | | | **CAPITULO 3** | **100%** | **mar 21/10/25** | **lun 15/12/25** | **66%** |
| 154 | | NP5 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" INCLUYE ACCESORIOS | 100% | vie 24/10/25 | vie 28/11/25 | 35% |
| 155 | | NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION CARPINTERIA METALICA - VENTANAS EN ALUMINIO(PERFILERIA EN ALUMINIO1101 PARA MARCO, VERTICALES EN 1103, PISAVIDRIO PLANO, VIDRIO CRUDO DE 5MM, SELLADA CON SILICONA ESTRUCTURAL TRANSPARENTE, INCLUYE ALFAJIA) | 100% | jue 11/12/25 | lun 15/12/25 | 0% |
| 156 | | NP9 | DESMONTE DE CIELO RASO (OFICINA DE ADMINISTRACION) | 100% | sáb 15/11/25 | mié 19/11/25 | 100% |
| 157 | | NP10 | INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA (OFICINA DE ADMINISTRACION) | 100% | lun 24/11/25 | jue 27/11/25 | 100% |
| 158 | | NP11 | CUPULA CONCENTRICA DE ALUMINIO 6X4 (DE ACUERDO A PLANO HLL-03 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) | 100% | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 0% |
| 159 | | NP12 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL | 100% | vie 28/11/25 | lun 15/12/25 | 100% |
| 160 | | NP13 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION Y PENDIENTADO CON LOS NUEVOS TRAMOS DE CANAL | 100% | mar 21/10/25 | vie 28/11/25 | 100% |
| 161 | | NP14 | REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES O LA QUE LA ENTIDAD PROVEA | 100% | jue 20/11/25 | lun 15/12/25 | 100% |
| 162 | | NP15 | ORGANIZACIÓN CABLEADO EN CUBIERTA (SEGUIMIENTO A CABLEADO EN USO Y SUSPENSION DESISTALACIÓN DE LOS CABLES EN DESUSO) | 100% | lun 27/10/25 | vie 28/11/25 | 80% |
| 163 | | NP19 | PINTURA KORAZA FACHADA 2 MANOS | 100% | sáb 1/11/25 | vie 28/11/25 | 72% |
| 164 | | | FIN FASE 4 | 100% | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 0% |
| 165 | | | FIN PROYECTO | 100% | lun 15/12/25 | lun 15/12/25 | 0% |

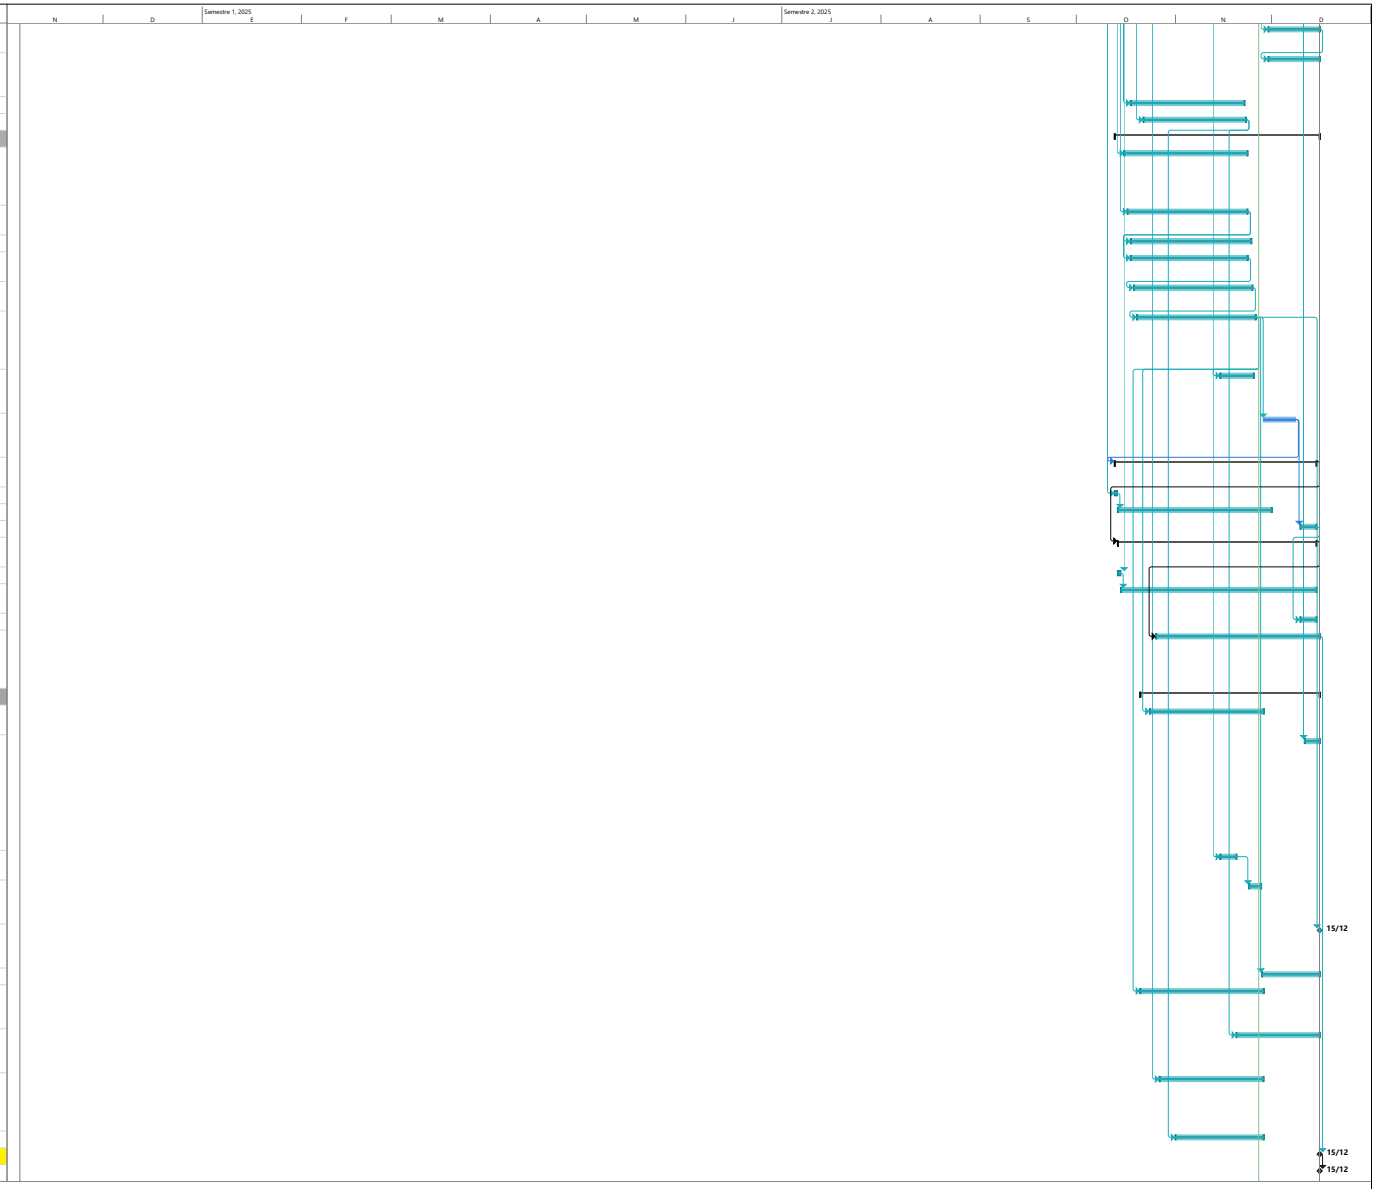


Proyecto: CRONOGRAMA DE A
Fecha: jue 27/11/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A S
Nit: 900027116 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 01486538 |
| Fecha de matrícula: | 8 de junio de 2005 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Fecha de renovación: | 4 de abril de 2025 |
| Grupo NIIF: | Grupo II. |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Cr 26A 62-21 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | contabilidad@tciingenieria.com |
| Teléfono comercial 1: | 2484503 |
| Teléfono comercial 2: | 2487192 |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Cl 53A 28-67 Of 101 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | contabilidad@tciingenieria.com |
| Teléfono para notificación 1: | 2484503 |
| Teléfono para notificación 2: | 2487192 |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 3 de junio de 2005 , inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2005, con el No. 00994867 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO Y/O TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA E U.

## REFORMAS ESPECIALES

Por Documento Privado del empresario, del 16 de diciembre de 2009, inscrito el 24 de diciembre de 2009 bajo el Número 1350279 del Libro IX, la empresa de la referencia se convirtió de Empresa Unipersonal a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIAS S.A.S.

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2009 de Empresario, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2009, con el No. 01350279 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO Y/O TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA E U a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A S.

## ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Oficio No. 2007 del 12 de octubre de 2023, el Juzgado 66 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., inscrito el 3 de Noviembre de 2023 con el No. 00212644 del Libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso ejecutivo singular No. 11001400308420230119700 de ATS INGENIERIA GEOMATICA S.A.S NIT. 900.401.223-1, Contra: TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A S NIT. 900.027.116-8.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## OBJETO SOCIAL

La Sociedad comercial por Acciones Simplificada podrá ejecutar y desarrollar cualquier acto lícito de comercio. Sin perjuicio de la regla anterior establecida por la Ley 1258 de 2008, también realizará las siguientes actividades: A) Prestación de todos los servicios relacionados con la ingeniería, tales como: Topografía, geodesia, cartografía, catastro, fotointerpretación de sensores remotos, suelos, estructuras, hidrográficos, geológicos, hidrogeológicos, geofísicos, ensayos de laboratorio, climatológicos, sismológicos, oceanográficos y estudios de hidrología e hidráulica. B) Prestación de toda clase de servicios relacionados con la geología, tales como exploración y explotación de minas de toda clase de minerales. C) Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información y de los siguientes estudios: Socioeconómicos de proyectos y gestión de proyectos, ambientales (planeación, legislación y protección) y de saneamiento ambiental, forestales, aprovechamiento y uso de la tierra y de los recursos hídricos, geología minera (exploración y evaluación de reservas), infraestructura física y social, estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos naturales tráfico y transportes. D) Diseño, gestión, desarrollo y ejecución de toda clase de proyectos relacionados con las actividades previstas dentro de su objeto social. E) Prestación de servicios de montajes electromecánicas y obras complementarias. F) Diseño, montaje, instalación y mantenimiento de toda clase de sistemas de comunicación y obras complementarias. G) Diseño, construcción, adecuación y mantenimiento de toda clase de edificaciones y obras urbanísticas. H) Prestación de servicios urbanos y de diseños arquitectónicos. I) Prestación de servicios de consultoría y construcción de obras civiles. J) Prestación de servicios de consultoría y construcción de obras de transporte y complementarias, de vías y carreteras, acueductos y alcantarillados, redes eléctricas, obras hidráulicas, sanitarias de minería y protección ambiental. K) Prestación de servicios de asesoría, consultoría e interventoría para todos los servicios contemplados dentro de su objeto social. L) Prestación de servicios de gestión, capacitación y ayudas educativas en todos los servicios comprendidos dentro de su objeto social. M) Fabricación, comercialización, distribución, compra, venta, exportación e importación de toda clase de bienes muebles relacionados con las actividades previstas dentro de su objeto social. N) exportación e importación de todos los servicios previstos dentro de su objeto

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

social. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá además: 1. Formar parte de otras sociedades o empresas, celebrar contratos de asociación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante la adquisición o suscripción de acciones, partes o cuotas de interés social o haciendo aportes de cualquier especie, incorporar otras sociedades o fusionarse con ellas propendiendo por facilitar o complementar la ejecución del objeto social. 2. Celebrar y ejecutar todos los actos mercantiles o contratos que sean necesarios o útiles para el logro de sus fines sociales. 3. Realizar y suscribir convenios y alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas, con y sin ánimo de lucro para propender por beneficios económicos siempre y cuando no pongan en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. 4. Adquisición, posesión y explotación de patentes; nombres comerciales, marcas, secretos industriales, licencias y otros derechos constitutivos de propiedad industrial, la concesión de su explotación a terceros, así como la adquisición de concesiones para su explotación. 5. El arrendamiento e inversión en bienes muebles e inmuebles, su venta, permuta, gravámenes, arrendamientos y en general la negociación de los mismos. 6. Invertir en fondos o disponibilidades, en activos financieros o valores mobiliarios tales como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cédulas hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o gravamen. 7. Aceptar y tomar a su cargo consignaciones, representaciones, contratos de comisión, o de firmas nacionales o extranjeras, así como aceptar y ejercer comisiones, agencias, entrenamiento de personal, evaluación, y estudios de factibilidad de proyectos que se relacionen con su objeto social. 8. En general, realizar cualquier actividad mercantil. Parágrafo: Todas las actividades comprendidas en el objeto social de la compañía podrán ser prestadas a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas dentro y fuera del territorio colombiano.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $800.000.000,00
No. de acciones : 800.000,00
Valor nominal : $1.000,00

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad estará a cargo de un Gerente, quien tendrá dos (2) suplentes que los remplazarán en sus faltas.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es el Representante Legal de la sociedad para todos los efectos, el ordenador del gasto y ejecutor de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Presentar a consideración de la Asamblea los balances de fin de ejercicio para su aprobación 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Abrir y manejar cuentas con entidades financieras. 5. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas o de acuerdo a sus facultades de contratación. 6. Suscribir los contratos que se requieran para el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 7. Presentar a la Asamblea en sus reuniones un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 8. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Asamblea de

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Accionistas. 9. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 10. Convocar la asamblea a las reuniones de máximo órgano social. 11. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea de Accionistas y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben ser aprobadas previamente según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 12. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 13. El Gerente estará facultado para comprar, vender, arrendar, construir, remodelar los bienes requeridos para el desarrollo del objeto social, de conformidad con las limitaciones establecidas en el presente estatuto, previa autorización de la Asamblea de Accionistas. 14. Delegar, en casos especiales, por medio de poder legalmente constituido, para que se asuma la representación legal de la sociedad en asuntos judiciales, administrativos y en los que se requiera, dentro de los límites establecidos en los presentes estatutos sociales. 15. En general, realizar todos los actos necesarios conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 16. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial, incluso después de su desvinculación laboral con la empresa. 17. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, incluso después de su desvinculación laboral con la empresa. Parágrafo primero: en ningún momento podrá constituir gravámenes, ni ser garante de los accionistas o de terceros en contra del patrimonio de la sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea de Accionistas. Parágrafo segundo: El Gerente podrá suscribir actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía sin límite de cuantía. El suplente del gerente requiere de autorización de la Asamblea de Accionistas para suscribir actos y contratos relacionados con el objeto social de la compañía que excedan de 200 SMLMV.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2009, de Empresario, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2009 con el No. 01350279 del Libro IX, se designó a:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Miguel Efrain Rosero Polo | C.C. No. 79400909 |

Por Acta No. 005 del 5 de julio de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de julio de 2017 con el No. 02239457 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Segundo Suplente Del Gerente | Juan Manuel Garzon Alarcon | C.C. No. 19109197 |

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2009, de Empresario, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2009 con el No. 01350279 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente Del Gerente | Harold Rosero Polo | C.C. No. 79563445 |

## REVISORES FISCALES

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2009, de Empresario, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2009 con el No. 01350279 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Principal | Nelly Paola Torres Cassiano | C.C. No. 52877983 T.P. No. 133718-T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Doc. Priv. del 16 de diciembre de 2009 de la Empresario | 01350279 del 24 de diciembre de 2009 del Libro IX |
| Acta No. 07 del 27 de diciembre de 2010 de la Asamblea de Accionistas | 01442244 del 30 de diciembre de 2010 del Libro IX |
| Acta No. 005 del 5 de julio de 2017 de la Asamblea de Accionistas | 02239456 del 5 de julio de 2017 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7490
Otras actividades Código CIIU: 7010, 4390

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.747.842.375

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de junio de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

**********

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 12 de noviembre de 2025 Hora: 17:42:26**
Recibo No. AB25710119
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257101199CA74**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA**

(Use la opción que corresponda, según certifique el representante legal o el revisor fiscal)

Yo, NELLY PAOLA TORRES CASSIANO, identificado con C.C. 52.877.983, y con Tarjeta Profesional No. 133718-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS identificado con NIT 900.027.116-8 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Técnicas Colombianas de Ingeniería S.A.S.** es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, por lo tanto está exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se encuentra al día con el pago de impuesto de auto-retención renta de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Dada en Bogotá, a los (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Firma _____

Nombre de quien declara: NELLY PAOLA TORRES CASSIANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 A 7 9 0 8 9 E 6 D 2 2 E F A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY PAOLA TORRES CASSIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52877983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 133718-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio [illegible] Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**133718-T**



**NELLY PAOLA**
**TORRES CARDIANO**
**C.C. 52877983**
**RESOLUCION INSCRIPCION 82** **FECHA 10/04/2008**
**UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ** **143791**

FIRMA DEL TITULAR 56378

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52877983

TORRES CASSIANO
APELLIDOS

NELLY PAOLA
NOMBRES

Nelly P. Torres C.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1983
UBAQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.53 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

24-JUL-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500119-42096424-F-0052877983-20011227 03497 01360D 01 114157901

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 18:23:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9000271168 |
| Código de Verificación | 900027116825111218233 2 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 18:23:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 79400909 |
| Código de Verificación | 79400909251112182304 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 284324906

PIB
18:20:35


Bogotá DC, 12 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 9000271168:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 284323722

PIB
18:03:47


Bogotá DC, 12 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79400909:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

**LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

**CERTIFICA**

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **79400909** de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS NUEVE)

**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

**ADVERTENCIAS:**

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).


* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.



**VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 06:30:21 PM horas del 12/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79400909**
Apellidos y Nombres: **ROSERO POLO MIGUEL EFRAIN**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/11/2025 06:29:40 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79400909** y Nombre: **MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **126515164** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 17:23:49 horas del 28/11/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79400909,** Apellidos y Nombres **ROSERO POLO MIGUEL EFRAIN**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL**, con NIT **899999446-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79400909 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 06/09/2025 02:13 PM

Código Verificación: **1SVRBD3X69**

Válida hasta: **05/12/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**
