MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	18	MM	11	AA	2025	ACTA N°	1	ELABORÓ	ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ

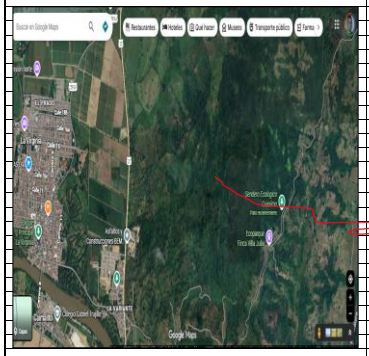
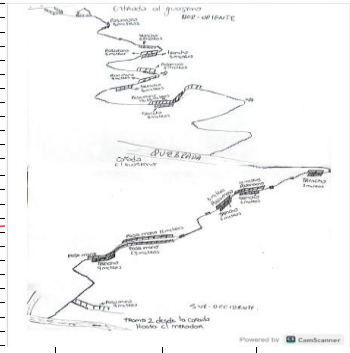
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PRODUCCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL DEL D.M.I GUASIMO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA				
CONTRATISTA	INNSOLUTIONS S&M SAS	NIT O C.C.	901.112.928-9	CONTRATO N°	CD-055-2025-COP
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA	NIT O C.C.	901.442.761-1		
CAPÍTULO	ITEM	DESCRIPCION			
B	E.1.7	Lleno compactado con material transportado manual	UND	M3	UBICACIÓN: ZONA RURAL-LA VIRGINIA









Descripción	DIMENSIONES			No Elem.	Medida Total
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA		
SENDERO GUASIMO E1.2					
Recuperacion de caminos tramo No 1.	25,00	0,80	0,14	1	2,80
Recuperacion de caminos tramo No 2.	10,00	0,80	0,17	1	1,36
Recuperacion de caminos tramo No 3.	10,00	0,80	0,93	1	7,44
Recuperacion de caminos tramo No 4.	80,00	0,80	0,16	1	10,24
Recuperacion de caminos tramo No 5.	15,00	0,80	0,18	1	2,16
Recuperacion de caminos tramo No 6.	7,00	0,80	0,19	1	1,06
SENDERO GUASIMO E1.5					
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 1	6,00	0,38	0,66	1	1,50
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 2	3,00	0,40	0,69	1	0,83
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 3	6,00	0,61	0,65	1	2,38
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 4	6,00	0,43	0,61	1	1,57
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 5	9,00	0,36	0,87	1	2,82
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 6	6,00	0,75	0,71	1	3,20
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 7	6,00	0,48	0,57	1	1,64
Suministro de materiales y construccion de trinchos TRAMO 8	3,00	0,40	0,42	1	0,50

OBSERVACIONES:		ACUMULADO EN ITEM	39,51	TOTAL: 39,51





Colaboró /Inspector de obra: JHONY ALEJANDRO GALINDO GUTIERREZ	Elaboró /Residente de obra: ELINCER DE JESUS HERRERA FLOREZ	Revisó Residente de interventoría: JORGE ROBINSON RODRIGUEZ LOPEZ
