La Jagua de Ibirico, 11 de noviembre de 2025.

Doctor
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 312-2025
PERIODO No 01
Del 28 de agosto de 2025 al 05 de noviembre de 2025.

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del convenio objeto de este informe, presentar evidencias sobre su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO No		312 DE 28 DE AGOSTO DE 2025		
TIPO DE CONVENIO:		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATISTA:		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A E.S.P.		
OBJETO:		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A. E.S.P. PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA OBTENCIÓN DE LAS METAS DE MICROMEDICIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C ($ 199.519.316,00).		
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:		CUATRO (4) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		28 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE INICIO:		28 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION:		28 DE DICIEMBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:				
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECHA:	N.A.
PRORROGAS		N.A.	FECHA:	N.A.

2. DESARROLLO DEL CONVENIO:

Mediante CLAUSULA 13 – SUPERVISION fui designado como Supervisor del convenio objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 01 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUERON LAS SIGUIENTES:

EL CONTRATISTA EN EL PERIODO NO. 01 COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 28 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Y EJECUTÓ LAS CANTIDADES RELACIONADAS MÁS ADELANTE.

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DE ACUERDO CON EL INFORME DE ACTIVIDADES REMITIDO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A. E.S.P. Y POR LA SUPERVISIÓN EJERCIDA DE MANERA PRESENCIAL EJERCIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 312 DE 2025, A LA FECHA DE CINCO (05) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL CONTRATISTA (LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A. E.S.P.), HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE 500 MICROMEDIDORES DE LOS 1.642 PREVISTOS EN EL CONVENIO, LO QUE CORRESPONDE A UN AVANCE FÍSICO DE 30.45%.

POR CADA MICROMEDIDOR EL CONTRATISTA (LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A. E.S.P.) HA EJECUTADO LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTES A SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 312 DE 2025, DENTRO DE LAS CUALES SE INCLUYEN: CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANDENES, EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, VÁLVULAS DE PASO Y ANTIFRAUDE, INSTALACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD, REPOSICIÓN DE ANDENES, INSTALACIÓN DE TAPAS BASE Y CAJILLAS DE VÁLVULAS DE USUARIO. ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA (LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A. E.S.P.) CONFORME A LAS CANTIDADES Y COSTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LAS SIGUIENTES FECHAS, DESDE EL 28 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEFINIDAS DENTRO DEL CONVENIO Y LISTADAS A CONTINUACIÓN:

- **CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL CONVENIO 312 – 2025.**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN MICROMEDIDORES				
1.1	CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO, INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS	M2	125.00	$17,274.00	$ 2,159,250.00
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL DE 0,5 M X 0,5 M CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0,25 M. INCLUYE LA EVACUACIÓN DE SOBRANTES.	M3	31.30	$45,969.00	$ 1,438,829.70

1.3	INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE TIPO VELOCIDAD, CUERPO DE POLÍMERO SINTÉTICO COMPOSITE", TRANSMISIÓN MAGNETICA, ESFERA SECA, (Q3/Q1) R=160, LONGITUD 115 MM, DN15MM (1/2"), T. 0°-50°, VÁLVULA ANTI RETORNO, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, BLINDAJE ANTIMAGNÉTICO, PREEQUIPADO CON RECEPTÁCULO PARA EMISIÓN. ADEMAS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS (CODOS, NIPLES ENTRE OTROS) NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LA DOMICILIARIA.	UND	500.00	$51,016.00	$ 25,508,000.00
1.4	INSTALACION VÁLVULA DE PASO DE BOLA H-H NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, 1/2". CARACTERÍSTICAS: LLAVE DE PASO DE BOLA, DIAMETRO 1/2". PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO: 25 BAR MÁX.	UND	500.00	$5,894.00	$ 2,947,000.00
1.5	INSTALACION VÁLVULA ANTIFRAUDE, H-H NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, 1/2" CARACTERÍSTICAS: LLAVE DE SEGURIDAD ANTIFRAUDE 1/2" DE BOLA. PRESIÓN NORMAL DE TRABAJO: 25 BAR MÁX.	UND	500.00	$5,473.00	$ 2,736,500.00
1.6	INSTALACION DE CAJA DE SEGURIDAD PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA CON DIMENSIONES PARA MEDIDORES DE DN15: L.80 A L.165, DN20: L.130, DIMENSIONES DE LA CAJILLA PARTE SUPERIOR: 32.5 CM DE LARGO, 15 CM DE ANCHO DIMENSIONES DE LA CAJILLA PARTE INFERIOR: 37,5 CM DE LARGO, 20 CM DE ANCHO, 16.5 CM DE ALTO.	UND	500.00	$21,050.00	$ 10,525,000.00
1.7	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (REPOSICIÓN DE ANDEN INTERVENIDO) EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0,07 M	M2	125.00	$51,058.00	$ 6,382,250.00
1.8	INTALACIÓN DE TAPA BASE DE PISO PARA CAJA DE SEGURIDAD DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CON DIMENSIONES DE LA CAJILLA PARTE INFERIOR: 37,5 CM DE LARGO, 20 CM DE ANCHO, 16.5 CM DE ALTO.	UND	500	$5,506.57	$ 2,753,285.00
1.9	INSTALACIÓN DE CAJILLA VALVULA DE USUARIO (TRAMPILLON) DIMENSIONES: 10.20 CM DE DIAMETRO, 12.5 CM DE ALTO EN TEMPERATURAS DE	UND	500	$12,615.00	$ 6,307,500.00

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

	0°- 40°C, FABRICADO NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA CAPACIDAD, RESISTENTE A LA FRICCIÓN, A LOS RAYOS UV.				
VALOR COSTOS DIRECTOS					**$ 60,757,615**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTALACIÓN					**$ 60,757,615**

A LA FECHA DE CINCO (05) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EL CONTRATISTA (LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AAA S.A. E.S.P.), LLEVA UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 30.45% DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES PLANTEADAS EN EL PRESUPUESTO DEL CONVENIO 312 – 2025. EL CONTRATISTA HA REALIZADO LOS PAGOS POR LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS IMPUESTOS REQUERIDOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO Y TAMBIÉN HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo agosto ejecutado por el contratista:

AGOSTO (EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL) DE 2025

IBC	$ 17.217.600
SALUD	$ 2.707.100
PENSIÓN	$ 10.592.400
RIESGOS	$ 1.211.000
PARAFISCALES	$ 2.707.100
NUMERO DE PLANILLA	**9491407360**

SEPTIEMBRE (EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL) DE 2025


IBC	$ 18.141.000
SALUD	$ 2.843.900
PENSIÓN	$ 11.139.600
RIESGOS	$ 1.246.700
PARAFISCALES	$ 2.843.900
NUMERO DE PLANILLA	**9493654689**

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 56.66%

GRAFICA AVANCE TIEMPO



GRAFICA AVANCE FINANCIERO 30.45%

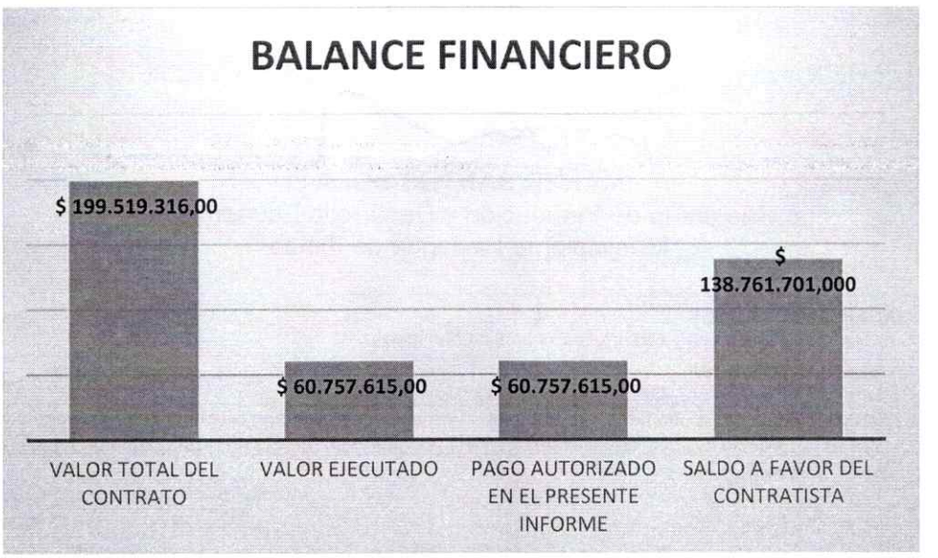

4 AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 199.519.316	N/A	100 %
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO	$ 60.757.615	N/A	30.45%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME (No. 01)	$ 60.757.615	N/A	30.45%
SALDO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 60.757.615	N/A	30.45%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por ejecutar)	$ 138.761.701	N/A	69.54%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente relacionada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO No. 01** comprendido entre el **28 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025,** el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades y el suministro inmerso en el objeto del convenio además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M.C. ($ 60.757.615).**

Nota aclaratoria: la baja ejecución (etapa contractual) del avance financiero por parte del contratista (la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo AAA S.A. E.S.P.) se debe a factores externos (caso fortuito) a la relación contractual entre el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo AAA S.A. E.S.P., debido a que los usuarios de la empresa prestadora del servicio público domiciliario han tratado de impedir en su mayoría el suministro e instalación de las cantidades contratadas en el presente convenio 312 – 2025 por medio de vías de hecho, lo cual ha impedido un avance financiero acorde o en relación al plazo del convenio.

MAHER SANTOS SOSA
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Municipio de La Jagua de Ibirico

Proyectó:	**MAHER SANTOS SOSA** Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Revisó:	**MAHER SANTOS SOSA** Secretario de Planeación y Desarrollo Económico Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		
