MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **COMANDO DE INGENIEROS**	**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-571 **Versión:** 2 **Fecha de emisión:** 2018-12-10

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019					
INFORME SEMANAL	**No.**	2	**DEL:**	**16/08/2019**	**AL:**	22/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

ALCANCE	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL UBICADO EN EL CANTON MILITAR PICHINCHA DE LA CIUDAD DE CALI							
INTERVENTOR	VAG INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.S							
EJECUTOR	ALEJANDRO AVILA RESTREPO							
PRESUPUESTO TOTAL	$	867.448.102	**PAGADO A LA FECHA**	$	-		**% SOBRE EL TOTAL**	0%
DEMERITO Y DESGASTE	$	-	**POR PAGAR**	$	867.448.102		**% SOBRE EL TOTAL**	100%

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

N°	OBJETO DEL CONTRATO	RAZON SOCIAL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO

2. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

2.1. AVANCE DE OBRA

Programado semana (%)	Ejecutado semana (%)	Programado Acumulado (%)	Ejecutado Acumulado (%)	Atraso (-) o adelanto (%)
3%	1,00%	4,00%	2,00%	-2,00%

2.2. ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS EN EL SEMANA

2.2.1. Preliminares de obra

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		75%	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).
		100%	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO
		12%	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).

FOTOS 1. Demarcacion para Demolicion de muros





2.2.2. Preliminares de obra

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		12%	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).

FOTOS 2. Excavacion para conexión Hidraulica, Tableros electricos provisionales



BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019					
INFORME SEMANAL	**No.**	2	**DEL:**	**16/08/2019**	**AL:**	22/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019


FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Comité Tecnico de obra


FOTO 3. Cerramiento



FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		100%	Liberacion de actividades mediante Bitacora

FOTOS 4. Línea de excavación Red Hidráulica

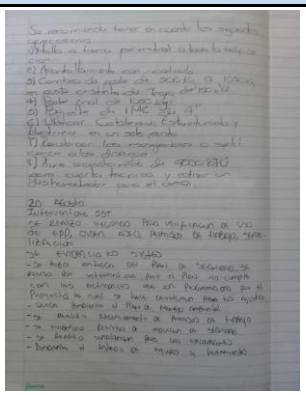

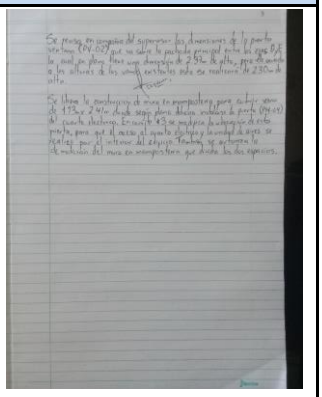

FRENTE DE OBRA	ABSCISA	% AVANCE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA
		30%	Replanteo de mampostería
		50%	Conexión Preliminar de Energía

FOTOS 5. Replanteo mampostería y tableros eléctricos de obra






BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX						
PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019					
INFORME SEMANAL	**No.**	2	**DEL:**	**16/08/2019**	**AL:**	22/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

2.3. ESTADO DEL TIEMPO EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN		HORAS DIARIAS DE LLUVIA EN OBRA	
Breve descripción de las actividades interrumpidas por las lluvias y de las acciones de mitigación adelantadas por la unidad para evitar trastornos; en las horas de lluvia se indican las de toda la semana.	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**	***FECHA***	***HORAS***
		16/08/2019	0,00
		17/08/2019	0,00
	NO		
		20/08/2019	0,90
	TOTAL HORAS DE LLUVIA EN LA SEMANA, HORAS LABORALES	21/08/2019	0,00
		22/08/2019	0,00
	0,00		
			0,90



2.4. CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL BASADO EN EL PRESUPUESTO, NO EN EL PLAN DE COMPRAS

OBRA	UNIDAD	A EJECUTAR	EJECUTADO SEMANAL	ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO	PRESUPUESTO	VR. A EJECUTAR	VR. EJECUTADO SEMANAL	VR. TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIÓN
PRELIMINARES	CAP	5.864.487	178.185	178.185	27,04%		5.864.487	$ 1.407.510	$ 1.585.695	27,04% del Capitulo
CIMIENTOS	CAP	663.382	0	0	0,00%		663.382	$ 0	$ 0	
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	CAP	8.817.763	0	0	0,00%		8.817.763	$ 0	$ 0	
PISOS-BASES-RELLENOS	CAP	2.936.394	0	0	0,00%		2.936.394	$ 0	$ 0	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	CAP	11.450.486	0	0	0,00%		11.450.486	$ 0	$ 0	
MAMPOSTERIA	CAP	28.722.976	0	0	0,00%		28.722.976	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES HIDRAULICAS	CAP	17.832.791	0	0	6,65%		17.832.791	$ 1.185.158	$ 1.185.158	6,65% del Capitulo
RED CONTRA INCENDIOS	CAP	585.680	0	0	0,00%		585.680	$ 0	$ 0	
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	CAP	103.849.566	0	0	0,00%		103.849.566	$ 0	$ 0	
PAÑETES-RESANES	CAP	28.160.231	0	0	0,00%		28.160.231	$ 0	$ 0	
CUBIERTAS	CAP	58.682.660	0	0	0,00%		58.682.660	$ 0	$ 0	
CIELO RASOS	CAP	28.766.578	0	0	0,00%		28.766.578	$ 0	$ 0	
PISOS - ACABADOS	CAP	98.785.384	0	0	0,00%		98.785.384	$ 0	$ 0	
ENCHAPES Y ACCESORIOS	CAP	28.326.358	0	0	0,00%		28.326.358	$ 0	$ 0	
VIDRIOS Y ESPEJOS	CAP	1.509.332	0	0	0,00%		1.509.332	$ 0	$ 0	
APARATOS SANITARIOS	CAP	17.371.990	0	0	0,00%		17.371.990	$ 0	$ 0	
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	CAP	86.950.121	0	0	0,00%		86.950.121	$ 0	$ 0	
CERRADURAS	CAP	4.605.161	0	0	0,00%		4.605.161	$ 0	$ 0	
PINTURA	CAP	68.764.534	0	0	0,00%		68.764.534	$ 0	$ 0	
EQUIPOS ESPECIALES	CAP	37.716.281	0	0	0,00%		37.716.281	$ 0	$ 0	
OBRAS EXTERIORES	CAP	13.946.409	0	0	0,00%		13.946.409	$ 0	$ 0	
ASEO GENERAL	CAP	163.475	0	0	0,00%		163.475	$ 0	$ 0	
VIAS Y PAVIMENTOS	CAP	707.942	0	0	0,00%		707.942	$ 0	$ 0	
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	CAP	35.628.216	0	0	0,00%		35.628.216	$ 0	$ 0	
							$ 690.808.197	$ 2.592.668	$ 2.770.853	
	% EJECUCIÓN TOTAL PRESUPUESTO						**0,40%**	**% EJECUCIÓN SEMANAL PRESUPUESTO**		**0,37%**

BATALLÓN DE INGENIEROS N° XX

PROYECTO:	Mantenimiento y Adecuación a todo costo del Centro de Rehabilitación Funcional" ubicado en el Canton Militar Pichincha de la ciudad de Cali para la vigencia 2019					
INFORME SEMANAL	**No.**	2	**DEL:**	**16/08/2019**	**AL:**	22/08/2019
DURACION PROYECTO	123	DIAS	**FECHA DE INICIO:**	**9/08/2019**	**FECHA DE TERMINO:**	9/12/2019

2.5. ACTIVIDADES Y/O INQUIETUDES QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DE COING.

2.6. EQUIPO DE INGENIEROS

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA						TRABAJOS DIARIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	
MAQUINARIA PESADA	**CANTIDAD**	**EN L.S**	**EQUIPO**	**CANTIDAD**	**EN L.S**	EQUIPO	VALOR
Trituradora y Clasificadora	0	0	Equipo de soldadura	0	0		
Camioneta 4x4	0	0	Vibrador de concreto	0	0		
Cargador	0	0	Compactador de pistón	0	0		
Carro taller	0	0	Mezcladora para concreto	0	0		
Carro tanque de agua	1	0	Equipo de soldadura aceti	0	0		
Carro tanque de combustible	0	0	Equipo monta llantas	0	0		
Tractor o Bulldozer	0	0	Regla vibratoria	0	0		
Vibro compactador 10 Tn.	0	0					
Excavadora de orugas	0	0					
Volqueta doble troque 14 m3	0	0					
Volqueta sencilla 7 m3	0	0					
TOTALES	1	0	TOTALES	0	VERDADERO	TOTAL	$ 0
ESTADO DE LA MAQUINARÍA EN LINEA DE SERVICIO (%)				**100%**			

2.7. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAQUINA O EQUIPO	HORAS DE TRABAJO	COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	ACTIVIDAD REALIZADA POR LA MAQUINA O EQUIPO EN EL FRENTE DE TRABAJO
TOTALES	0	0	

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

PERSONAL EN OBRA	DEDICACION	CANTIDAD	TROPA EN EL PROYECTO	CANTIDAD	DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL	OFICIAL	S/OFICIAL	SLP.	SLR.
Ingenieros Residentes	100%	2	OFICIALES	0	PERSONAL PROYECTO (COING)	0	0	0	0
Topógrafos		0	SUB-OFICIALES	0	PERSONAL EQUIPO (BATING)	0	0	0	0
Ingeniero Director	50%	1	SOLDADOS PROFESIONALES	0	PERSONAL CONSTRUCCIONES (BATING)	0	0	0	0
Profesional Administrativo	50%	1	SOLDADOS REGULARES	0	PERSONAL SEGURIDAD (BATING)	0	0	0	0
Ing Electrico	50%	1			**TOTAL**	0	0	0	0
Profesional SISO	50%	1							
Maestro de Obra									
Oficiales de construcción									
Ayudantes									

4. INFORMACIÓN GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL O CIVICO MILITAR REALIZADA	PERSONAS BENEFICIADAS - PARTICIPANTES	LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA	FECHA	OBSERVACIONES

5. POBLACIÓN BENEFICIADA - DATOS DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DEL DANE

CIUDAD, POBLACIÓN, CORREGIMIENTO O VEREDA BENEFICIADA	CANTIDAD DE HABITANTES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	OBSERVACIONES
TOTAL	0		

VIVIANA ANDREA GIL.
R.L. VAG INTERVENTORIA
CONTRATISTA

C. PALENCIA BRAVO JHON A.
CAPITAN EJERCITO MILITAR
SUPERVISOR
