CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 02

MENSUAL [X] FINAL [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

MUNICIPIO: LA ARGENTINA Y SAN AGUSTIN **DEPARTAMENTO: HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMCIH374 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO INDERHUILA 2023

INFORME (MENSUAL) N°2

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Natalia Bustos Botero	ENTIDAD	INDERHUILA
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CMCIH374	DE	2023
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".	PERIODO DEL INFORME	Entre 07 de mayo al 06 De junio de 2024
CONTRATISTA	Consorcio Inderhuila 2023	NIT	901.768.748-5
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Manuel Medina Barreto	C.C	12.132.626 de Neiva
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO	29 de noviembre de 2023		
PLAZO SUSPENSION 1	28 de diciembre de 2023		
FECHA DE REINICION 1	07 de mayo de 2024		
OTRO SI 1	07 de mayo de 2024		
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.		
VALOR TOTAL	$ 13.191.312,00		
1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CSAMCIH430 DE 2023		
OBJETO	Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.		
CONTRATISTA	Consorcio escenario deportivos JC		
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos García Rodríguez		
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO	29 de noviembre de 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.		
OTRO SI 1	14 de diciembre de 2023		
FECHA SUSPENSION 1	28 de diciembre de 2023		
FECHA REINICIO 1	07 de mayo de 2024		
OTRO SI 2	07 de mayo de 2024		
VALOR TOTAL	$ 215.045.630,00		

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto "Construcción placa para polideportivos en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz" se encuentra ubicado en el Departamento del Huila en los siguientes municipios:

No.	MUNICIPIO	SITIO	DIRECCIÓN
1	La Argentina	Resguardo Indígena	Nam Misak

2	San Agustín	Resguardo Indígena	Fil Vits


1. **Municipio La Argentina cabildo indígena Nam Misak)**

El proyecto **"Construcción de una placa para polideportivos del resguardo indígena Guambiana de Nam Misak"** está ubicado en el municipio de La Argentina, en el Departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se parte del Parque Principal y se toma la vía hacia el centro poblado gallego del municipio de La Plata. Desde allí, se toma la intersección hacia el centro poblado Belén y, a continuación, la vía registrada como La Plata-Popayán, km 15, hasta llegar al cruce o intersección hacia el resguardo Nan Misak.

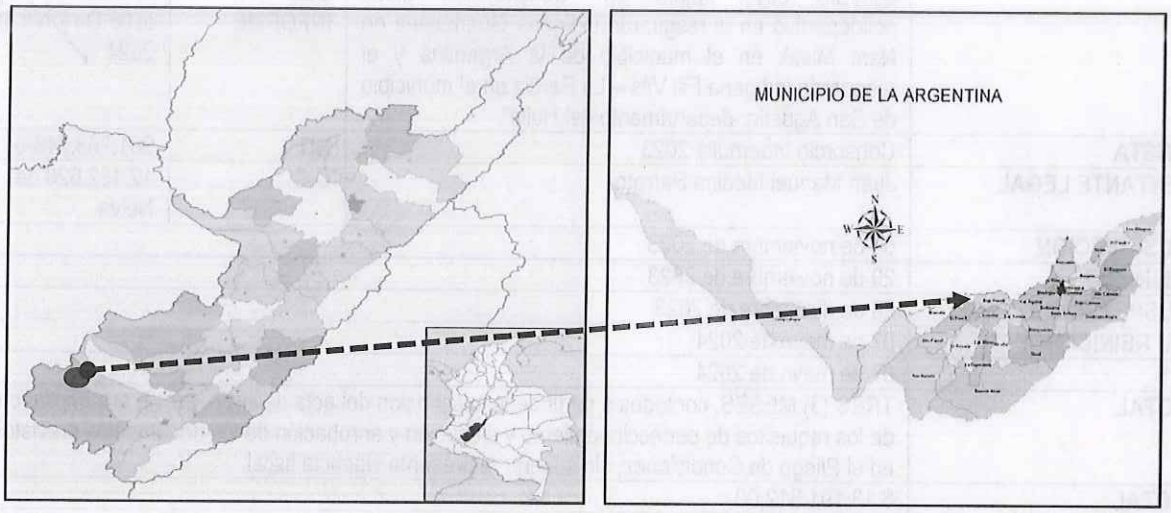

2. **Municipio San Agustín cabildo indígena Fil Vits**

El proyecto **"Construcción de una placa para polideportivos del resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz"** está ubicado en el municipio de San Agustín, en el Departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se parte del Parque Principal y se toma la vía hacia el parque arqueológico. Luego, se sigue por la intersección hacia la vereda La Perdiz, hasta llegar al sitio de ejecución de la obra.

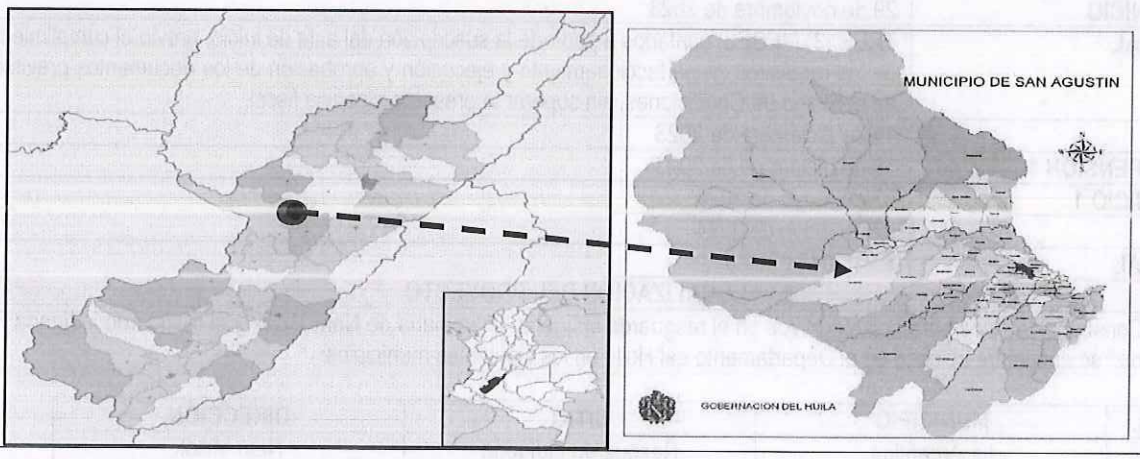

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Consorcio Escenarios Deportivos JC llevará a cabo la construcción, conforme al contrato titulado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Este contrato abarca la ejecución de obras en los municipios de La Argentina y San Agustín, ubicados en el departamento del Huila. El alcance del proyecto incluye la construcción de placas de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm, con la instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro. Malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura, Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto. para polideportivos en los mencionados resguardos indígenas, con el objetivo de mejorar las infraestructuras deportivas y recreativas en las zonas designadas. La ejecución de las obras se llevará a cabo en conformidad con los términos y especificaciones contractuales, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad establecidos para el proyecto.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante este periodo, el contratista de obra inició la logística para la ejecución del proyecto, reactivó la afiliación del personal de obra al sistema de seguridad social, efectuó los pagos de las contribuciones correspondientes y actualizó la bitácora del proyecto.
Las actividades se han desarrollado de la siguiente manera.

Resguardo Indígena Fill Vits- La Perdiz de San Agustín, Departamento del Huila:

Durante el periodo de ejecución contado a partir del acta de reinicio, se han registrado precipitaciones en la zona durante aproximadamente 15 días, lo que corresponde al 50% del tiempo hábil de trabajo. Cabe destacar que únicamente en dos ocasiones se han presentado al menos tres días consecutivos sin lluvia, los cuales fueron aprovechados por el contratista para trasladar material pétreo hasta el sitio de intervención. Sin embargo, el contratista se encuentra a la espera de condiciones meteorológicas más favorables que permitan culminar el traslado del material restante, el cual aún permanece sobre la vía.

Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak en el Municipio de la Argentina, Departamento del Huila.

En la zona de influencia se han registrado lluvias durante más de 15 días, Además, en el contratista ha tenido que utilizar mulares, motocicletas y realizar transporte adicional de material, dado que el sitio de trabajo está a más de 1.25 Km de la vía terciaria principal, el punto hasta donde llegan los vehículos. Esta circunstancia ha ralentizado el suministro de materiales y ha afectado negativamente el cronograma de obra.

Dada la situación actual en el área de influencia del proyecto, donde se han presentado precipitaciones y se ha dificultado el acceso al sitio de trabajo, se ha observado un impacto significativo en el cronograma inicial de obra. La necesidad de utilizar mulares, motocicletas y realizar transporte adicional de materiales debido a la distancia desde la vía terciaria principal ha contribuido a la ralentizado el suministro de materiales.

5. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	**Inspección en Campo y Verificación del Avance de Obra** La interventoría llevó a cabo inspecciones periódicas en el sitio de ejecución con el fin de evaluar el progreso físico de las actividades contratadas. **Registro de avance:** Se realizó documentación detallada del estado de avance de obra, incluyendo observaciones sobre posibles desviaciones, atrasos o ajustes requeridos respecto a lo programado. **Control de Calidad y Supervisión de Materiales** Se efectuó la verificación de la calidad de los materiales destinados a la construcción de las placas en los polideportivos. **Inspección técnica de materiales:** Se constató que los insumos cumplieran con los estándares de calidad establecidos, garantizando la durabilidad, resistencia y funcionalidad de la infraestructura proyectada.

	Verificación y Aprobación de la Localización de los Trabajos La interventoría validó que las áreas seleccionadas para la ejecución de obra se ajustaran a las especificaciones contractuales. **Confirmación de localización:** Se aprobó la ubicación de los frentes de trabajo tras revisión en campo. **Inspección de sitio:** Se verificó que las zonas de intervención correspondieran con los planos y lineamientos técnicos del proyecto. **Control de Actividades Programadas y Recomendaciones Técnicas** Se realizó seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución. **Recomendaciones de ajuste:** Se emitieron observaciones técnicas para la optimización de tiempos y recursos, con el objetivo de mantener la ejecución dentro de los parámetros establecidos en el plan de trabajo.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	Durante el periodo evaluado no se realizaron ensayos de laboratorio, en tanto no se ejecutaron actividades que lo requirieran. No obstante, se solicitó al contratista de obra iniciar el proceso de diseño de mezcla para concreto con resistencia característica de 3.000 psi, con el fin de contar con todos los insumos técnicos previamente definidos y aprobados antes del inicio de la actividad correspondiente a la construcción de las placas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	En relación con el control y seguimiento al anticipo, la interventoría ha verificado que el contratista presentó en el mes de diciembre un plan de inversión debidamente justificado y aprobado conforme a lo estipulado en el contrato. Desde su presentación, se ha realizado seguimiento permanente a dicho plan, mediante la revisión de facturas, comprobantes de compra y demás soportes que evidencian que los recursos han sido utilizados conforme a las actividades previstas. Así mismo, en las visitas técnicas realizadas en campo se ha confirmado la presencia y disponibilidad de los materiales adquiridos con cargo al anticipo, los cuales corresponden a las especificaciones técnicas aprobadas. En consecuencia, se concluye que el contratista ha venido cumpliendo de manera adecuada con lo establecido en el plan de inversión presentado, aplicando los recursos conforme a los fines contractuales hasta la fecha.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	En cuanto al control y seguimiento del personal, la interventoría ha verificado de manera continua que el contratista disponga del recurso humano requerido para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en los pliegos y su propuesta técnica. Durante el periodo evaluado, se ha realizado revisión de las afiliaciones al sistema de seguridad social, el cumplimiento de los perfiles exigidos, así como el registro de ingreso del personal en el sitio de obra. Así mismo, se ha hecho seguimiento a la permanencia y rotación del equipo de trabajo, confirmando que se mantiene la disponibilidad del personal técnico y operativo necesario para el desarrollo de las actividades programadas. Esta verificación se ha soportado en la revisión documental y visitas en campo, con el fin de asegurar la adecuada ejecución del proyecto en términos de capacidad operativa.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo control y seguimiento de los equipos en obra esto para garantizar la productividad, seguridad y cumplimiento de los cronogramas del proyecto. Desde el rol de esta interventoría, se implementar herramientas y protocolos de supervisión que aseguren el estado óptimo de los equipos y su correcta utilización. La integración de tecnología en este proceso mejora la trazabilidad y el desempeño, contribuyendo a la eficiencia general del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se llevó a cabo el control y seguimiento de los materiales, actividad esencial para garantizar la calidad, la optimización de recursos y el cumplimiento de los plazos en el desarrollo de la obra. En este sentido, la interventoría ha implementado procedimientos de inspección, control y trazabilidad, verificando que los materiales gestionados por el contratista cumplan con los estándares establecidos en el proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Se realizó control y seguimiento a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral relacionados con el personal vinculado al proyecto de obra, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Este seguimiento ha consistido en la verificación documental de las afiliaciones activas a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, así como en la revisión de los soportes de pago correspondientes.
	Se realizó el seguimiento a las pólizas de garantía con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, proteger los intereses del proyecto y respaldar la correcta ejecución de

SEGUIMIENTO A POLIZAS DE GARANTIAS	las obras. Este control implicó la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en cada póliza, garantizando su validez, cobertura y vigencia durante todo el periodo contractual. La interventoría se aseguró de que las pólizas presentadas cumplieran con los requisitos legales, contractuales y técnicos exigidos, fortaleciendo así la gestión del riesgo y la seguridad jurídica del proyecto, y asegurando la protección integral de las partes involucradas.
ACTIVIDADES LOGISTICAS	**Suministros:** se han presentado retrasos, debido a las lluvias no ha sido posible el suministro de materiales y en el resguardo indígena de Nam Misak solo se puede realizar suministro por medio de sobreacarreo en bestia. **Bitácora o Libro de Obra:** Se realizó seguimiento permanente a la bitácora en cada frente de trabajo, en la cual se registraron diariamente los acontecimientos, avances, novedades y decisiones relevantes adoptadas durante la ejecución del proyecto. Este instrumento ha sido clave para garantizar la trazabilidad técnica y administrativa del contrato.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL	Durante el periodo evaluado, y considerando que actualmente el proyecto se encuentra en fase preliminar de distribución de materiales, la interventoría ha verificado que el contratista adopte prácticas básicas de manejo ambiental acordes con esta etapa.
ACTIVIDADES FINANCIERAS	Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento al componente financiero del contrato, verificando la ejecución del anticipo conforme al plan de inversión presentado por el contratista en el mes de diciembre. Como resultado de las actividades desarrolladas, se suscribió el Acta Parcial No. 01, correspondiente al mismo mes, por un valor de $51.735.900,00, la cual refleja la aplicación de recursos asociados principalmente a la adquisición y transporte de materiales, así como al inicio de las actividades preliminares en sitio, particularmente la excavación y la ejecución de rellenos compactados para la adecuación de las zonas destinadas a la construcción de las placas polideportivas. Estas labores incluyeron el retiro de capa vegetal, nivelación de terrenos y disposición controlada de material granular, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la conformación de la subrasante. La interventoría verificó en campo el desarrollo de estas actividades, así como los documentos soporte presentados, concluyendo que los recursos han sido utilizados conforme a lo establecido en el plan de inversión y en cumplimiento de los fines contractuales.
ACTIVIDADES JURÍDICOS	Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones jurídicas establecidas en el contrato, velando por la correcta ejecución conforme al marco legal aplicable. Se verificó la legalidad de los actos contractuales suscritos, tales como el acta de reinicio, el acta parcial de obra y los soportes relacionados con el anticipo. Así mismo, se hizo revisión del cumplimiento de los requisitos contractuales por parte del contratista, incluyendo la vigencia de las pólizas, la actualización de los documentos legales y la observancia de las condiciones establecidas en el clausulado. Cualquier actuación que implique modificación contractual, ajuste de plazos o requerimientos adicionales fue analizada bajo los principios de legalidad, transparencia y cumplimiento del objeto contractual, dejando constancia en las respectivas comunicaciones y actas de seguimiento.

RELACION DE ACTAS REALIZADAS estas actas son las de justificación/adición/suspensión o parciales o las de comités

CMCIH 374 DE 2023

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

ACTAS		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
ACTA DE INICIO	1	29/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACION 1	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSION 1	1	28/12/2023
ACTA DE REINICIO 1	1	07/05/2024

ACTA DE JUSTIFICACION	1	07/05/2024
OTRO SI N° 1	1	07/05/2024

CSAMCIH 430 DE 2023

Objeto: "Construcción Placa para polideportivos en el resguardo indígena guambiana de Nam Misak en el Municipio de la Argentina y el Resguardo Indígena Fil Vits la perdiz en el Municipio de San Agustín Departamento del Huila"

ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	*01*	*29/11/2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK – MUNICIPIO LA ARGENTINA - HUILA	*01*	*30/11/2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ -MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	*01*	*1/12/2023*
ACTA DE MODIFICACION ANTICIPO	*01*	*12/12/2023*
OTRO SI – Modificación Clausula 6	*01*	*14/12/2023*
ACTA PARCIAL	*01*	*19/12/2023*
ACTA JUSTIFICACION	*01*	*28/12/2023*
ACTA DE SUSPENSIÓN	*01*	*28/12/2023*
ACTA JUSTIFICACION	*02*	*07/05/2024*
ACTA DE REINICIO	*01*	*07/05/2024*
OTRO SI	02	07/05/2024

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo comprendido desde el 07 de mayo del 2024 al 06 de junio del 2024 se evidencio el siguiente estado del clima:

- **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTÍN																																
MES	MAYO																									JUNIO						
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
DIAS	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	
LLUVIAS		X	X			X		X						X	X	X			X			X	X	X				X	X	X	X	

- **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA LA ARGENTINA																																
MES	MAYO																									JUNIO						
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
DIAS	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	
LLUVIAS		X	X	X				X			X	X		X			X	X	X	X	X				X				X	X	X	

7. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA										
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,5083%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,5498%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%

	las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.									
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,0000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,0000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00			0,0000%
		Costo Directo - Nam Misak			$ 86.018.252,00		$ 0,00			24,0581%

CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO			ACUMULADO	
						CANTIDADES			CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,508%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%

2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,550%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00			$ 0,00
		Costo Directo - Fil Vits			$ 86.018.252,00		$ 0,00			24,058%
		Costo Directo - Proyecto			$ 172.036.504,00		$ 0,00			24,058%

8. CONTROL DE ANTICIPO - INTERVENTORIA				
N/A				
8.1. CONTROL DE ANTICIPO - OBRA				
RELACIÓN DE PAGO (ANTICIPO Y/O ACTA DE OBRA EJECUTADA)	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR ANTICIPO (25%)	09/05/2023	$ 53.761.407,50	$ 0	$ 53.761.407,50
ACTA PARCIAL NO. 1	09/05/2023	$ 51.735.900,00	$ 12.933.975,00	$ 38.801.925,00
VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 215.045.630,00	$0,00	$215.045.630,00	$ 51.735.900,00	$ 163.309.730,00

9. RELACION DE PERSONAL - INTERVENTORIA	
PROFESIONAL	CARGO
Juan Manuel Medina Barreto	Director de Interventoría
RELACION DE PERSONAL - OBRA	
PROFESIONAL	CARGO
Hernán Darío Rivera Flórez	Director De Obra
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Nam Misak.
María Ximena Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Fil Vits.
María Katalina Silva Manrique	Especialista en gerencia de proyectos.
Mario Andres Ortiz	Maestro de Obra
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	Ayudante de Obra
Nelson Vargas Almario	Ayudante de Obra
William Iván Delgado Rodríguez	Ayudante de Obra

10. RELACIÓN DE PAGOS OBRA		
TIPO DE PAGO (Acta No. /Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000387	09/05/2024
ACTA PARCIAL NO. 1	2024000388	09/05/2024

11. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - INTERVENTORIA						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Juan Manuel Medina Barreto	$ 238.500	$ 186.400	$ 36.400	$0,00	$ 0.0	8633159242
Carlos Andres Gorrón Avendaño	$288,000	$225,000	$9,400	$0,00	$0,00	9469157040

11.1. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - OBRA						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFIS CALES	N° PLANILLA
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162,500	$6,800	$0	$0	9467882234
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162,500	$8,100	$0	$0	9467134442 9482011903
María Ximena Vargas Gutiérrez	$117.900	$29.500	$3.900	$29.500	$0	9484925709
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	29611285
Mario Andres Ortiz	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9468170208
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30080174
Nelson Vargas Almario	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30080174
William Iván Delgado Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30080174
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9468170208
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30080174

12. POLIZAS DE GARANTIA - INTERVENTORIA

Póliza actualizada: ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Seguros mundial	CHU-100009625	ANEXO 3	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	12/01/2025
				Prestaciones sociales	29/11/2023	15/07//2027
				Calidad del servicio	29/11/2023	12/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Seguros mundial	CHU-100001938	ANEXO 3	07/05/2024	29/11/2023	12/07/2024

12.1. POLIZAS DE GARANTIA - OBRA

Póliza actualizada: ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Aseguradora Solidaria	560-47-994000171378	ANEXO 2	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	21/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGÚN REINICIO 1					
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031449	ANEXO 2	07/05/2024	01/03/2024	10/07/2024


13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

13.1. RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK:



Sobreacarreo de material en bestia.

13.2. RESGUARDO INDIGENA FIL VITS:

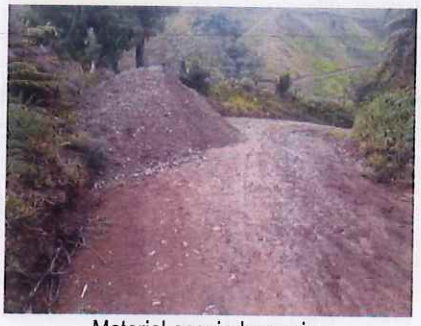

Material acopiado en via.

CONCLUSIONES

- Aunque ya se realizaron actividades de excavaciones y rellenos compactados, no se evidencia aún la ejecución de ítems principales de la obra (placa en concreto, acabados, instalación de elementos deportivos). Esto se debe principalmente a las condiciones climáticas adversas y dificultades de acceso.
- La alta frecuencia de lluvias (entre 15 y 19 días con precipitación en el periodo evaluado) y las dificultades de acceso (distancia desde vías principales y necesidad de transporte con mulas y motocicletas) han generado retrasos considerables frente a la programación inicial.
- El contratista ha cumplido con la legalidad contractual, el manejo del anticipo, la presentación de soportes de inversión y la actualización de la seguridad social del personal. La interventoría confirmó la trazabilidad en el uso de recursos y el aseguramiento de garantías y pólizas vigentes.
- Se realizaron inspecciones de campo, verificación de materiales, control documental, seguimiento a la bitácora, pólizas, aportes sociales y equipos, garantizando el control integral de los aspectos técnicos, legales, financieros y administrativos.

RECOMENDACIONES

- Es necesario reprogramar las actividades críticas considerando la estacionalidad climática de la zona, implementando planes de contingencia para minimizar los tiempos improductivos.
- Evaluar la contratación de medios de transporte alternativos o estrategias de acopio intermedio de materiales para mitigar las dificultades de acceso y asegurar continuidad en la ejecución.
- Agilizar la validación de diseños de mezcla de concreto y programar con anticipación los ensayos de laboratorio requeridos, evitando que se conviertan en un factor de retraso cuando inicie la construcción de las placas.
- Mantener comunicación constante con las comunidades indígenas beneficiarias para informar sobre el avance, dificultades y reprogramación, fortaleciendo la transparencia y confianza en la ejecución del proyecto.
- De persistir los retrasos por condiciones externas, evaluar la posibilidad de solicitar prórroga justificada del plazo contractual, soportada en los registros de lluvias y accesibilidad documentados por la interventoría.

14. ANEXOS

- COMITÉS Y/O REUNIONES.
- APROBACION DISEÑO DE MEZCLAS.
- APROBACION SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.
- SEGURIDAD SOCIAL.
- BITACORA

Ing. Juan Manuel Medina Barreto	29 – octubre – 2024	Ing. Natalia Bustos Botero
FIRMA INTERVENTOR	FECHA DE ENTREGA	Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISION

COMITÉS Y/O REUNIONES.

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Conocer Avance de Obra	No. ACTA:	1
FECHA:	04/06/2024	HORA INICIO	4:00 p.m.
RESPONSABLE:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	HORA FINAL	4:30 p.m.

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de obra.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Juan Manuel Medina Barreto (Director y Representante legal)	Consorcio Inderhuila 2023	
Carlos andres Gorron Avendaño (Representante suplente)	Consorcio Inderhuila 2023	
Andres Paredes (Representante legal)	consorcio escenarios deportivos JC	
Natalia Bustos Botero (Apoyo a la supervisión)	Entidad Contratante	

DESARROLLO:

Se reunió mediante una sesión virtual por la plataforma MEET a las 4:00 am el ingeniero Andres Paredes, El representante Legal del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC, el ingeniero Juan Manuel Medina Barreto, representante legal y Director de Interventoría del CONSORCIO INDERHUILA 2023, el Ingeniero Carlos Andres Gorron Avendaño como delegado y representante suplente del CONSORCIC INDERHUILA 2023, la Ingeniera Natalia Bustos Botero, quien ejerce como apoyo a la Supervisión del Contrato y el Abogado de Gestión de Infraestructura Deportiva Jaime Enrique Jiménez López.

El apoyo a la supervisión expreso ante los presentes la preocupación por el avance de obra de los dos lugares a ejecutar el contrato y no se ha culminado al 100 % de ejecución ya faltando pocos días de terminarse el contrato y pregunta cuál es el inconveniente que se está presentando el atraso de ejecución.

El representante legal del contratista de obra manifiesta que ha sido imposible llevar el material necesario para culminar la ejecución de la obra ya que en los dos lugares se está presentando lluvias constantes y las v as no han permitido dar el paso a los camiones, comenta que han intentado llegar hasta el punto deseado pero los camiones se han quedado atascados por el barro de las vias y que hasta le han tocado deja el material en fincas aledañas al lugar. De igual manera afirma que esta problemática lo han puesto en conocimiento a la interventoría enviéndoles evidencia del problema.

El delgado de la interventoría afirma que si han recibido la información expresada por el contratista de obra y manifiesta que también le ha compartido esa información a la supervisora de apoyo.

El representante legal del contratista de obra solicita a la entidad contratante y a la interventoría una prórroga de tiempo, solicitan 60 días adicionales para poder culminar y entregar a satisfacción el contrato de obra. Manifiesta que esta solicitud la realiza ya que espera que el tiempo climático mejore y pueda ingresar los materiales al punto de destino.

El abogado de Gestión de Infraestructura Deportiva responde a la solicitud que sería lo mejor hacer una espera para volver a evaluar como sigue el tiempo climático, porque ese mal climático puede pasar en algunos dias o se puede empeorar y no poder culminar la ejecución. Asi que le propone al contratista de obra e interventoría volverse a reunir el día 24 de junio del año 2024 para ya evaluar y dar respuesta a la solicitud del contratista según como sigue el tiempo climático.

El contratista de obra, el delegado de interventoría y el apoyo a la supervisión responden a esta propuesta que si seria una mejor manera de aceptar dicha prorroga.

El apoyo a la supervisión solicita al contratista de obra que hasta que llegue esa fecha debe de enviar reportes a la interventoria del estado y con evidencia como sigue el estado climático en los dos lugares. Igualmente le solicita que debe ir realizando el informe mensual con su respectiva bitácora con firma de los responsables.

No siendo más se cierra la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Enviar reporte del estado climático a la interventoria.	CONTRATISTA DE OBRA	22	06	24
Realizar reunión el día 24 de junio del 2024	INTERVENTORIA	26	06	24

Siendo las 4:30 p.m. se dio por finalizada la sesión de esta reunión

APROBACION DISEÑO DE MEZCLAS.

CONSORCIO
INDERHUILA 2023
NIT. 901.768.748-5

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLAS

Contrato de Obra No. CSAMCIH430 de 2023
Objeto: *Construcción de placa para polideportivos en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y el resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.*
Contratista: Consorcio Escenarios Deportivos JC
Interventoría: Consorcio INDERHUILA 2023
Entidad Contratante: INDERHUILA

CERTIFICA

Que el **Consorcio INDERHUILA 2023**, en calidad de **Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental** del contrato de obra mencionado, revisó y evaluó los **diseños de mezcla de concreto** presentados por el **Contratista Consorcio Escenarios Deportivos JC**, destinados a la ejecución de las placas polideportivas contempladas en el proyecto.

Luego del análisis técnico de los documentos y resultados de laboratorio entregados por el contratista, se verificó que los mismos cumplen con los parámetros y especificaciones establecidas en el **pliego de condiciones**, así como con los requisitos de diseño y resistencia exigidos para el concreto estructural de **3.000 PSI (210 kg/cm²)**.

En consecuencia, la **Interventoría APRUEBA** los **diseños de mezclas de concreto** propuestos por el contratista para su aplicación en las obras de construcción de las placas polideportivas en los resguardos indígenas **Guambiana de Nam Misak** (municipio de La Argentina) y **Fil Vits – La Perdiz** (municipio de San Agustín), Departamento del Huila.

Atentamente;

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

APROBACION SEGURIDAD SOCIAL DELCONTRATISTA DE OBRA.

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH430 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de acuerdo con la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada, verificada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico los pagos de las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido entre el 07 de mayo del 2024 al 06 de junio del 2024.*

Para constancia se firma a los (16) días del mes de agosto de 2024.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

SEGURIDAD SOCIAL.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	8633159242	I	2024-10-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.300	43.600	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-06-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	1.350.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	168.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.350.000	43.600	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	417.700	N	1702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	8633159242	I	2024-10-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.300	43.600	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-06-11	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	22.500	0	238.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	22.500	0	238.500
EPS(Administradoras: 1)				1	168.800	0	17.600	0	186.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	168.800	0	17.600	0	186.400
ARP(Administradoras: 1)				1	32.900	0	3.500	0	36.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	32.900	0	3.500	0	36.400
Gran Total					417.700	0	43.600	0	461.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-11
FECHA DE PAGO:	2024-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	8633159242
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657553974
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 17.600	$ 158.300	$ [illegible]
25-14	800338304	COLPENSIONES	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 22.500	$ 216.300	$ 258.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 32.300	$ 36.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 43.600	$ 407.700	$ 451.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/07/2024

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	731874750	94691570 40	I	2024/06/18	2024/06/26	BANCOLOMBIA	8	$525,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,900	$0	$289,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,900	$0	$289,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$1,500	$0	$226,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$1,500	$0	$226,500
TOTAL				1	$522,400	$3,500	$0	$525,900

ok

2025/08/26 02:29 PM

BITACORA

07 de Mayo del 2024

Se da reinicio al Contrato de obra el interventoria luego de superar los motivos que generaron la suspension de los Contratos como se reporta en el Acta de Reinicio Se procede a Realizar actividades Administrativas, como afiliacion del personal y compra de material petreo.

[redacted] Herrán Rivera

08 de Mayo del 2024

Actividades por iniciar, transporte de material petreo, no se puede ejecutar por las Fuertes lluvias presentadas y el acceso se colmata de humedad.

[redacted] Herrán Rivera

09 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias, lo cual imposibilito el acceso de las volquetas Con el material petreo.

[redacted] Herrán Rivera

10 de Mayo del 2024

Se continuan presentando fuertes lluvias por lo cual la vía de acceso no se encuentra en optimas condiciones para el transporte del material petreo.

[redacted] Herrán Rivera

11 de Mayo del 2024

Se realiza en conjunto con la interventoria, inspección visual de la vía desde el provedor del material petreo hasta el cruce en la vía, se pudo corroborar q' debido a la humedad de las lluvias de los días anteriores no es posible el transporte del material

[redacted] Herrán Rivera

12 de Mayo del 2024

No se logro transportar material en horas de la mañana, en la tarde sobre un viaje de material petreo hasta el cruce de la vía, se dispone a empacar este material en lonas para luego ser trasnsportado al sitio de intervencion.

[redacted] Herrán Rivera

13 de Mayo del 2024

Se logra transportar un viaje de material petreo en el cruce de la vía puesto q' el terreno se encuentra muy humedo y las llantas de las Vdguetas resbalan y no es posible transportar mas, se espera que mañana mejore el clima

14 de Mayo del 2024

Se presentaron lluvias constantes durante la mañana y la tarde, lo cual no permitio el acarreo ni sobreacarreo del material petreo.




15 de Mayo del 2024

Por las lluvias de ayer el terreno de acceso desde el proveedor hasta el puente es de dificil acceso por la constante humedad se continua empacando el material q' esta acopiado en el borde de la via hasta el puente esperando q' el clima mejore



16 de Mayo del 2024

en horas de la mañana se termina de empacar el material petreo en lonas y se inicia el transporte de este hasta el resguardo indigena en mulas, en la tarde llega un viaje de material petreo el cual se acopia en el Cruce de la vía



17 de Mayo del 2024

Se presentaron fuertes lluvias durante el dia, condicion climatica que no permite actividades de obra ni de transporte de materiales

18 de Mayo del 2024

Continuan las fuertes lluvias, se mantuvieron en la mañana y en la tarde perjudicando las actividades del proyecto

19 de Mayo del 2024

Por la humedad presente en la vía de acceso no se puede realizar transporte de material petreo, pero se continua empacando el material acopiado a borde de carretera y sobre acarreado hasta el puente

20 de Mayo del 2024

Persisten lluvias en la mañana y en la tarde, no se logra realizar actividades




21 de Mayo del 2024

debido a la humedad presente no se logra realizar transporte de material petreo desde el proveedor hasta el puente, se continua empacando el material petreo existente en el Cauce de la vía hasta el puente y del puente hasta el resguardo indigena



22 de Mayo del 2024

En horas de la tarde llega un viaje de material petreo hasta el puente, se continua empacando el material acopiado en el cauce de la via y sobre acarreandolo en bestia hasta el puente y del puente hasta el resguardo indigena.



23 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias durante el día, por tal no se realizaron actividades de obra



24 de Mayo del 2024


Continuan las lluvias se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde imposibilitando actividades del progecto.

25 de Mayo del 2024

Se persisten las fuertes lluvias desde la mañana hasta la noche, imposibilitando actividades de transporte y sobreacarreo


26 de Mayo del 2024

Continuan las fuertes lluvias, tanto en la mañana como en la tarde noche, no se pudo realizar algun tipo de trabajos en campo



27 de Mayo del 2024

Se presentan lluvias tanto en horas de la mañana, como en la tarde, estas lluvias no permiten realizar el respectivo transporte y sobreacarreo.



28 de Mayo del 2024

debido a la humedad presente en la via de acceso no se logro realizar transporte de material petreo, se continua empacando el material acopiado en cruce de la carretera hasta el puente y del puente hasta el resguardo indigena, esta actividad se realiza en bestia




29 de Mayo del 2024

debido a la humedad aún presente en la vía de acceso, no es posible el transporte de material petreo desde el provedor hasta el puente. Se continua realizando el empaque del material petreo acopiado en el cruce y en el puente y se esta sobreacarreando desde estos puntos hasta el resguardo indigena.



30 de Mayo del 2024


Se logra llevar dos viajes de material, los wales fueron acopiados en el cruce de la via, por otro lado, se continua empacando este material en estacas para luego ser sobreacarreado desde el cruce de la via hasta el puente y del puente al resguardo indigena, esta actividad se realizo con mulas.



31 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias durante el día, no se realizan labores

[redacted]



01 de Junio del 2024

Debido a las lluvias del día de ayer el terreno de acceso desde el proveedor hasta el puente se encuentra colmatado de humedad, no fue posible de realizar transporte, pero se continuo con el empogue en lonas del material petreo acopiado en el cruce de vía y sobreacarreado en mula hata el puente y de ahí hasta el resguardo indigena

[redacted]

02 de Junio del 2021

Se logra transportar un viaje hasta el puente de material petreo, se continua con la actividad de sobreacarreo del material acopiado desde el cruce de la via hasta el puente y el resguardo indigena, esta se realizo en mulas

[redacted]

03 de Junio del 2024

Se logro realizar 3 viajes de material desde el proveedor hasta el borde de vía en el cruce, se continua con el sobre acarreo del material petreo desde el cruce hasta el puente y de ahí al resguardo indigena en bestias.

[redacted]

04 de Junio del 2024

Se presentan lluvias en el día al Inicio de la mañana 7:05 a.m y se prolongaron hasta las 9:33 P.m imposibilitando las respectivas actividades


[redacted]



05 de Junio del 2024


Se presentan fuertes lluvias durante el día lo cual no permito las actividades de acarreo y sobre-acarreo del material petreo

[redacted]



06 de Junio del 2024

Continuan las fuertes lluvias, en el municipio de la argentina y la plata, no se logra realizar algun tipo de actividad.



07 de Mayo del 2024

Se dió Reinicio del Proyecto de obra y de interventoria luego de superar las Condiciones que generaron la respectiva suspension, como esta en la respectivo acta de Reinicio.

Hernán Dra V

maria X Vargas

08 de Mayo del 2024

Se presentan lluvias fuertes durante el dia lo que imposibilito el inicio de las actividades operativas del proyecto en este resguardo indigena

maria Ximena V.

09 de Mayo del 2024

Se continua presentando lluvias tanto en la mañana como en la tarde noche, no permitio el inicio de las actividades

maria Ximena V.

10 de Mayo del 2024

debido a las fuertes de los días anteriores la vía de acceso se encuentra colmatada y en mal estado de conservación, el provedor de transporte no realiza por lo anterior transporte de material petreo

maria ximena V.

11 de Mayo del 2024

dia nublado, Se hace revision con interventoria de la vía de acceso, condyendo que debido a la humedad presente en la vía, no se realiza transporte de materiales

maria ximena V.

12 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias no se realizan labores en obra.

maria Ximena V.

13 de Mayo del 2024

Se chequea el area de acceso y no es posible transporte de materiales, se chequean niveles de la estructura de soporte de placa y se precisa la necesidad de material de relleno, dobido a la erosion del terreno.

Maria Ximena V.

14 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias durante el dia lo cual no permitio el ingreso de materiales.

maria Ximena V.

15 de Mayo del 2024

Se realiza verificacion de la via de acceso. se preasa que hay humedad en esta se toma la deasion de no hacer transporte de materiales

maria ximena V.

16 de Mayo del 2024

dia nublado, en horas de la mañana se presenta lluvina muy leve pero esta no permite que la vía de acceso se horee y se seque

maria ximena V.

17 de Mayo del 2024

dia nubado, se realiza recorrido con la interventoria para verificar el estado de la via, se toma la deasion de no ingresar volquetas aun el suelo esta humedo y liso en alguna lomas.

maria Ximena V.

18 de Mayo del 2024

hoy clima soleado, pero el suelo en la vía de acceso se encuentra humedo, se intenta el transporte de un viaje de material, no se logra ingresar hasta el resguardo indigena, se deja acopiado a borde de vía y se tapa con plastico negro

Maria Ximena V.

19 de Mayo del 2024

Se inicia el día nublado, sin presencia de lluvia, suelo humedo, se intenta realizar un viaje de material petreo no se logra el objetivo y toca descargar a borde de Carretera, este material se tapa con plastico negro

Hernán Ruiz V

maria ximena V.

20 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias durante el día lo cual no permitio labores de transporte de material.

maria ximena V. Hernán Ruiz V

21 de Mayo del 2024

Se continua presentando lluvias, durante todo el día, no permitio el transporte de materiales petreos.

Hernán Ruiz V

Maria Ximena V.

22 de Mayo del 2024

hoy continuaron las precipitaciones, lo cual no permitio el acceso de material petreo.

maria ximena V. Hernán Ruiz V

23 de Mayo del 2024

Se presasa que la via de acceso al resguardo indigena desde san agustin se encuentra humeno lo wal no permite el acceso de volquetas debido al mal estado

Hernán Ruiz V

maria ximena V.

24 de Mayo del 2024

dia nublado, sin presencia de lluvia, Se intenta transportar un viaje de material petreo, no se logra el acceso de la volqueta, toca acopiar el material petreo a borde de via, este material se tapa con plastico negro.

Hernán Ruiz V

25 de Mayo del 2024

Se presentan fuertes lluvias, no se realizan labores operativas

maria ximena V.

Hernán Rivera V

26 de Mayo del 2024

Se presento un derrumbe en la via, la comunidad del resguardo indigena, realiza remocion manual del mismo, pero es insuficiente el paso, se continua esta actividad mañana

Hernán Rivera V

27 de Mayo del 2024

Amane un día nublado, suelo de la via de acceso colmatado de humedad, no se intenta llevar material, el transportador no se arriesga

Hernán Rivera V

28 de Mayo del 2024

Se presentan llovizna continua durante todo el día, no permitio el ingreso de materiales petreos.

maria ximena V. Hernán Rivera V

29 de Mayo del 2024

durante todo el día se presentaron lluvias fuertes, impidiendo el acceso de volquetas con materiales petreos

maria ximena V. Hernán Rivera V

30 de Mayo del 2024

Nuevamente se presentan lluvias fuertes y constantes durante el día, No se realizan labores operativas

Hernán Rivera V

31 de Mayo del 2024

Hasta el día de hoy no se presentan lluvias, la comunidad del resguardo indígena continuan removiendo material del derrumbe, no se permite el paso de volquetas

Hernán Ruiz V

01 de Junio del 2024

La comunidad hoy termino de remover material del derrumbe de manera manual, esperando el día de mañana para continuar con el transporte de material petreo.

Hernán Ruiz V

02 de Junio del 2024

Se transporta un viaje de material petreo, pero debido a la humedad del suelo y al mal estado de este, toco acopiar este material a borde de via, el cual fue tapado con plastico negro.

Hernán Ruiz V

03 de Junio del 2024

Se presentan lluvias constantes durante todo el día, no se realizan trabajos operativos

Hernán Ruiz V

04 de Junio del 2024

Hoy, se presentaron lluvias fuertes en la mañana y llovizna constantes en Horas de la tarde, No permitio labores en dora

Hernán Ruiz V

05 de Junio del 2024

Se continuan presentando fuertes lluvias, lo que impide el acceso de materiales petreos.

Hernán Ruiz V

24

06 de Junio del 2024

Se presentaron fuertes lluvias, no se realizaron labores en sitio de intervención.

Hernán Ortiz V.
