CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 03

MENSUAL [X] FINAL [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

MUNICIPIO: LA ARGENTINA Y SAN AGUSTIN **DEPARTAMENTO: HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMCIH374 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO INDERHUILA 2023

INFORME (MENSUAL) N° 3

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Natalia Bustos Botero	ENTIDAD	INDERHUILA
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CMCIH374	DE	2023
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".	PERIODO DEL INFORME	Entre 07 de junio al 06 De julio de 2024
CONTRATISTA	Consorcio Inderhuila 2023	NIT	901.768.748-5
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Manuel Medina Barreto	C.C	12.132.626 de Neiva

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	01 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A)	29 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
FECHA DE SUSPENSION 1 (D/M/A)	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1 (D/M/A)	07 de mayo de 2024
OTRO SI 1	07 de mayo de 2024
PLAZO ADICIONAL (No.1) (05/07/24):	Dos (2) meses
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.
VALOR TOTAL	$ 13.191.312,00
1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	CSAMCIH430 DE 2023
OBJETO	Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.
CONTRATISTA	Consorcio escenario deportivos JC
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos García Rodríguez
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	21 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A)	29 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

	y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal.
OTRO SI 1 Modificación clausula 6	14 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSION 1 (D/M/A)	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1 (D/M/A)	07 de mayo de 2024
OTRO SI 2 Modificación clausula 4 ajuste vigencia fiscal	07 de mayo de 2024
OTRO SI 3 Modificación clausula 4 Prorroga de dos (2) meses	05 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL (No.1) (05/07/24): (Si aplica)	Dos (2) meses
PLAZO TOTAL	cinco (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
VALOR TOTAL	$ 215.045.630,00


2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Construcción placa para polideportivos en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz" se encuentra ubicado en el Departamento del Huila en los siguientes municipios:

No.	MUNICIPIO	SITIO	DIRECCIÓN
1	La Argentina	Resguardo Indígena	Nam Misak
2	San Agustín	Resguardo Indígena	Fil Vits


1. Municipio La Argentina cabildo indígena Nam Misak.

El proyecto **"Construcción de una placa para polideportivos del resguardo indígena Guambiana de Nam Misak"** está ubicado en el municipio de La Argentina, en el Departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se parte del Parque Principal y se toma la vía hacia el centro poblado gallego del municipio de La Plata. Desde allí, se toma la intersección hacia el centro poblado Belén y, a continuación, la vía registrada como La Plata-Popayán, km 15, hasta llegar al cruce o intersección hacia el resguardo Nan Misak.

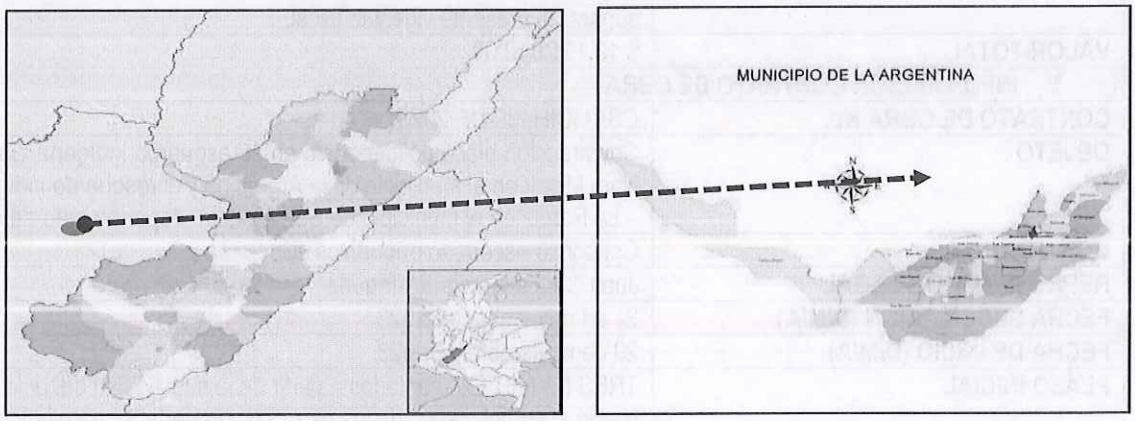

2. Municipio San Agustín - cabildo indígena Fil Vits.

El proyecto **"Construcción de una placa para polideportivos del resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz"** está ubicado en el municipio de San Agustín, en el Departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se parte del Parque Principal y se toma la vía hacia el parque arqueológico. Luego, se sigue por la intersección hacia la vereda La Perdiz, hasta llegar al sitio de ejecución de la obra.

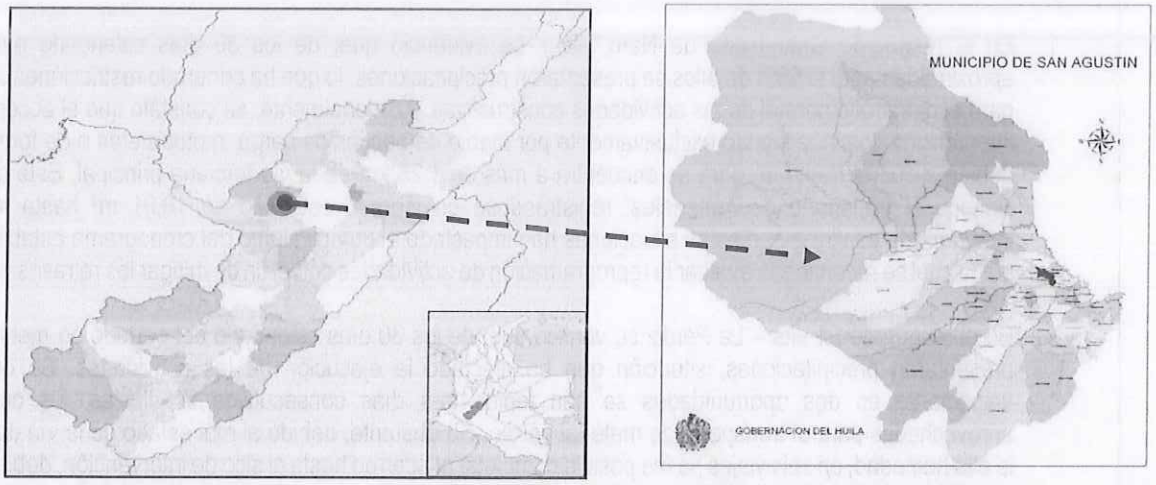

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Consorcio Escenarios Deportivos JC llevará a cabo la construcción, conforme al contrato titulado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Este contrato comprende la ejecución de intervenciones en los municipios de La Argentina y San Agustín, ubicados en el departamento del Huila, y tiene como objeto el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en los resguardos indígenas mencionados.

El alcance del proyecto contempla la construcción de placas en concreto con resistencia característica de 3.000 PSI y espesor de 0,10 metros, incluyendo el corte y sellado de juntas, así como la instalación de malla electrosoldada de dimensiones 2,35 m x 6,00 m, con separaciones de 15 x 15 cm y varilla de 4 mm.

Adicionalmente, se instalarán canchas multifuncionales con estructura en tubo de acero galvanizado tipo AN, de 3" y 2" (calibre 16), para la práctica de fútbol de salón, baloncesto y voleibol. El equipamiento incluye tableros en fibra de vidrio de 20 mm (dimensiones 1,80 m x 1,50 m), aros, mallas, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura. Se realizará la demarcación de las canchas con pintura para tráfico pesado, incluyendo el marcado de logos institucionales y las líneas reglamentarias para las tres disciplinas deportivas.

La ejecución se desarrollará conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y condiciones contractuales, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y funcionalidad establecidos para el proyecto.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante la visita de interventoría correspondiente al período reportado, se verificó el avance de las actividades ejecutadas en los frentes de trabajo localizados en los resguardos indígenas Guambiana de Nam Misak (municipio de La Argentina) y Fil Vits – La Perdiz (municipio de San Agustín), ambos en el departamento del Huila.

Las intervenciones se han visto afectadas significativamente por condiciones climáticas adversas, las cuales han limitado el acceso, el transporte de materiales y el desarrollo de las actividades programadas en los sitios de intervención.

1. En el resguardo Guambiana de Nam Misak se evidenció que, de los 30 días calendario evaluados, en aproximadamente el 58% de ellos se presentaron precipitaciones, lo que ha generado restricciones significativas para el desarrollo normal de las actividades constructivas. Adicionalmente, se constató que el acceso al sitio de intervención continúa siendo exclusivamente por medio de bestias de carga, motocicletas o de forma peatonal, debido a que el frente de obra se encuentra a más de 1.25 km de la vía terciaria principal. Esta condición ha limitado el transporte de materiales, registrándose un ingreso estimado de 10,91 m³ hasta la fecha. La interventoría confirma que estas situaciones han impactado el cumplimiento del cronograma establecido, razón por la cual se recomienda evaluar la reprogramación de actividades con el fin de mitigar los retrasos ocasionados.

2. En el resguardo Fil Vits – La Perdiz se verificó que, de los 30 días calendario del período en mención, el 46% presentaron precipitaciones, situación que ha afectado la ejecución de las actividades. Se constató que únicamente en dos oportunidades se han tenido tres días consecutivos sin lluvias, los cuales fueron aprovechados para el transporte de material pétreo. No obstante, debido al mal estado de la vía de acceso y a la alta humedad, en seis viajes no fue posible completar el acarreo hasta el sitio de intervención, debiendo acopiar el material a borde de carretera. Actualmente se encuentran acumulados seis viajes de volqueta sencilla en la vía de acceso, a la espera de condiciones climáticas favorables que permitan ejecutar el sobreacarreo y continuar con la programación de actividades.

5. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL	**1. Desarrollar el objeto del contrato** • Aunque no se inició la fase constructiva en sitio, se **avanzó en la ejecución de actividades logísticas**, en particular el **transporte de materiales pétreos**. **2. Garantizar la calidad de los bienes suministrados** • Aunque no se han incorporado materiales directamente a la estructura de la obra, el acopio controlado y el transporte bajo ventanas climáticas adecuadas refleja **una planificación coherente para preservar las condiciones de calidad de los materiales pétreos**. **3. Identificar oportunidades para promover el empleo local** • El transporte de materiales mediante **métodos no mecanizados (uso de bestias)**, especialmente en el Resguardo Nam Misak, indica la contratación de mano de obra local. **4. Abstenerse de utilizar elementos o productos no permitidos** • No se evidenció el uso de materiales en la obra durante este periodo que estén por fuera de lo autorizado o sin especificación técnica. **5. Informar a la Entidad sobre condiciones que puedan afectar el contrato** • La interventoría reportó de manera oportuna las afectaciones climáticas y logísticas (dificultades de acceso por lluvias persistentes), lo cual permite asumir que el contratista

	ha **reportado la situación conforme a lo estipulado en el contrato**, permitiendo evaluar medidas de contingencia 6. **Implementar medidas de prevención y seguridad** • Aunque no se detalló explícitamente en el resumen de avance, el uso de ventanas climáticas y la suspensión de transporte durante lluvias fuertes sugiere que se han aplicado **medidas preventivas para proteger al personal, los materiales y las vías**, conforme a la obligación de preservar condiciones seguras.
CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	Se llevó a cabo el control y seguimiento permanente de las actividades operativas en los dos frentes de obra establecidos en los resguardos indígenas Guambiana de Nam Misak (municipio de La Argentina) y Fil Vits – La Perdiz (municipio de San Agustín). Dicho seguimiento se desarrolló conforme a los lineamientos técnicos del contrato y bajo supervisión directa de la interventoría, con énfasis en los siguientes aspectos: **1. Verificación de condiciones climáticas y su impacto en obra** • Se realizó seguimiento diario a las condiciones meteorológicas en ambos sitios de intervención. • Las precipitaciones registradas en más del 50% del periodo limitaron las actividades de transporte de materiales y acceso al sitio de obra, situación registrada y reportada mediante actas de visita y comunicaciones periódicas con la supervisión del contrato. • La interventoría validó las ventanas climáticas aprovechadas para el desarrollo puntual del transporte de material pétreo, confirmando el uso eficiente de dichos espacios temporales. **2. Monitoreo de accesibilidad y logística de transporte** • Se hizo seguimiento al acarreo de materiales en condiciones no mecanizadas (uso de bestias de carga y transporte peatonal), conforme a las limitaciones topográficas del resguardo Guambiana de Nam Misak. • En el caso del resguardo Fil Vits – La Perdiz, se constató la imposibilidad de culminar algunos acarreos hasta el sitio de intervención, dejando registro del **acopio provisional de materiales a borde de carretera** como medida temporal de manejo logístico. **3. Seguimiento al cumplimiento del cronograma** • Se evidenció un desfase parcial en el cumplimiento del cronograma contractual debido a las restricciones de acceso y condiciones meteorológicas adversas. • No obstante, se constató que el contratista mantuvo la operatividad en campo con el objetivo de no paralizar completamente las actividades, priorizando el transporte parcial de materiales y la organización logística para futuras jornadas de obra. • La interventoría recomendó ajustar el cronograma y contemplar estrategias de contingencia para maximizar el avance físico durante ventanas climáticas disponibles. **4. Supervisión del manejo de materiales** • Se verificó el adecuado almacenamiento provisional de materiales en sitios definidos por la interventoría, minimizando el riesgo de pérdida por escorrentía o contaminación. • Se instruyó al contratista sobre la necesidad de implementar elementos de contención para los acopios temporales, así como señalización preventiva en bordes de vía.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A	No se ejecutaron actividades de instalación o colocación de materiales en sitio que requirieran la aplicación inmediata de ensayos de laboratorio sobre elementos estructurales, dado que las labores

ENSAYO DE LABORATORIOS	desarrolladas se centraron en el transporte y acopio de materiales pétreos hacia los frentes de intervención. No obstante, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el control de calidad, la interventoría adelantó el siguiente control preventivo: - Verificación y aprobación de los diseños de mezclas establecidos para cada frente de obra.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	La interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero al manejo del anticipo contractual, verificando que su ejecución se desarrolla conforme al plan de inversión aprobado. Los recursos han sido destinados principalmente a la logística de transporte de materiales pétreos hacia los sitios de intervención en los resguardos indígenas, incluyendo acarreos, contratación de mano de obra local y aprovisionamiento inicial de insumos. En ese sentido, se concluye que el anticipo está siendo ejecutado de manera adecuada, alineado con los objetivos del contrato y las obligaciones establecidas en la cláusula sexta.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	La interventoría realizó el seguimiento al personal vinculado por el Consorcio Escenarios Deportivos JC, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la conformación del equipo operativo.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	La interventoría realizó seguimiento al uso y disponibilidad de los equipos y medios auxiliares vinculados por el contratista para la ejecución de las actividades logísticas de transporte y acarreo de materiales pétreos. Se constató que, debido a las condiciones topográficas y climáticas de los sitios de intervención, se hizo uso limitado de equipos mecanizados, priorizando el empleo de medios tradicionales como bestias de carga, conforme a las restricciones de acceso propias del terreno. No obstante, el contratista mantuvo disponibles los equipos básicos requeridos para la operación de cargue y transporte desde las canteras hasta los puntos de acopio intermedios, garantizando su funcionamiento y estado operativo. La interventoría verificó que los equipos utilizados cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en el contrato.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	La interventoría realizó seguimiento al suministro, transporte y acopio de materiales pétreos destinados a la ejecución de la obra, verificando su procedencia, volumen, y estado de conservación. Se constató que el contratista no ha avanzado en el transporte de materiales desde las fuentes autorizadas hasta los frentes de obra, por las condiciones climáticas adversas y las limitaciones de acceso. Los materiales fueron acopiados en puntos estratégicos, tanto en sitio como a borde de vía en el resguardo Fil Vits – La Perdiz, en espera de condiciones favorables para su sobreacarreo. La interventoría validó que los materiales cumplen con las especificaciones técnicas preliminares y ha solicitado al contratista garantizar su adecuada protección hasta el momento de su utilización, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el objetivo de preservar su calidad y trazabilidad dentro del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	La interventoría efectuó el control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado por el contratista. Se verificó que el Consorcio Escenarios Deportivos JC mantiene actualizados los registros de afiliación a salud, pensión, riesgos laborales del personal operativo que participó en las actividades de transporte y logística durante el periodo, así como del personal propuesto por el contratista.
	La interventoría realizó seguimiento a la vigencia, cobertura y suficiencia de las pólizas de garantía exigidas en el Contrato CSAMCIH430 de 2023, verificando su correspondencia con lo establecido en el pliego de condiciones y las normas que rigen la contratación estatal. Se confirmó que el

SEGUIMIENTO A POLIZAS DE GARANTIAS	contratista mantiene en firme las garantías exigidas, entre ellas: cumplimiento del contrato, calidad de la obra, estabilidad de la misma, pago de salarios, prestaciones sociales y buen manejo del anticipo, todas ellas amparadas mediante póliza global debidamente constituida y expedida por entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, se verificó que las pólizas fueron entregadas y aprobadas en los términos contractuales y no se presentaron novedades, modificaciones ni vencimientos que comprometieran la cobertura de los riesgos asegurados durante el periodo evaluado.
ACTIVIDADES LOGISTICAS	El contratista adelantó diversas actividades logísticas orientadas a garantizar la continuidad operativa del proyecto, pese a las condiciones climáticas adversas y las restricciones de acceso a los frentes de obra. Dentro de estas actividades se destacan la coordinación y programación del transporte de materiales pétreos desde las fuentes de suministro autorizadas, la organización de los puntos de acopio temporales, y la gestión del personal de apoyo para labores de cargue, descargue y acarreo manual mediante bestias de carga, especialmente en el resguardo Guambiana de Nam Misak. Así mismo, se realizó la identificación y adecuación de rutas de ingreso, la disposición de recursos básicos para almacenamiento de materiales, y la planificación de actividades en función de las ventanas climáticas disponibles, todo ello bajo seguimiento de la interventoría y en cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales del proyecto.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL.	La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental establecidas en el Contrato CSAMCIH430 de 2023, verificando que el contratista ha adoptado medidas preventivas y de manejo ambiental en concordancia con lo estipulado en la normativa vigente y en las obligaciones contractuales. Se constató que las actividades de transporte y acopio de materiales se desarrollaron sin generar afectaciones al entorno natural, manteniéndose el control sobre la disposición temporal de materiales, evitando vertimientos, contaminación por residuos sólidos o afectación a cuerpos de agua cercanos. Asimismo, se verificó que el contratista ha dispuesto señalización básica en las zonas de intervención y ha evitado la remoción de vegetación sin autorización, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009. La interventoría continuará verificando las actividades de prevencion.
ACTIVIDADES FINANCIERAS.	Se ha continuado con el control financiero del **Contrato CSAMCIH430 de 2023**, evidenciándose las siguientes acciones y movimientos: • El valor del **anticipo correspondiente al 25% del valor total del contrato**, equivalente a **$53.761.407,50**, fue registrado con fecha **04/12/2023** y pagos el 09/05/2024. • La **Acta Parcial No. 1**, aprobada el **19/12/2023**, presentó un valor ejecutado por **$51.735.900,00**, de los cuales **$12.933.975,00** fueron aplicados como amortización del anticipo, y **$38.801.925,00** correspondieron a pago efectivo al contratista, los cuales se cancelaron el 09/05/2024. • El **valor total del contrato** se mantiene en **$215.045.630,00**, sin presentar adiciones ni modificaciones presupuestales. • A la fecha de corte del informe, se reporta un acumulado total pagado al contratista de **$163.309.730,00**. Estas cifras reflejan que el contratista ha iniciado la amortización del anticipo conforme a lo estipulado contractualmente y mediante los pagos parciales todo esto bajo verificación y aprobación de la interventoría, en concordancia con el avance físico de obra. La ejecución financiera continúa bajo seguimiento permanente por parte de la interventoría, con el fin de garantizar el uso eficiente y legal de los recursos públicos.
ACTIVIDADES JURÍDICOS.	Las actividades jurídicas se centraron en la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato CSAMCIH430 de 2023, en especial en lo relativo a la

	legalidad de la ejecución del anticipo, que fue otorgado sin constitución de fiducia, conforme a las excepciones previstas y autorizadas en el marco del proceso contractual. La interventoría revisó y validó los documentos soporte asociados a los pagos realizados, asegurando que se ajustan a las condiciones establecidas en el contrato y a las normas del Estatuto General de Contratación. Igualmente, se confirmó la vigencia y suficiencia de las pólizas de garantía, y no se presentaron novedades jurídicas, conflictos contractuales ni requerimientos formales por parte de órganos de control o terceros durante el periodo evaluado. Se mantiene actualizada la trazabilidad jurídica del contrato, conforme al seguimiento regular por parte de la interventoría técnica y administrativa.
RELACION DE ACTAS REALIZADAS estas actas son las de justificación/adición/suspensión o parciales o las de comités	**CMCIH 374 DE 2023** **Objeto:** "Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION	2	07 de mayo 2024
ACTA DE REINICIO	1	07 de mayo 2024
OTROSI	1	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	05 de julio de 2024
OTROSI	2	05 de julio de 2024

CSAMCIH 430 DE 2023

Objeto: "Construcción Placa para polideportivos en el resguardo indígena guambiana de Nam Misak en el Municipio de la Argentina y el Resguardo Indígena Fil Vits la perdiz en el Municipio de San Agustín Departamento del Huila"

ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta De Inicio	*01*	*29/11/2023*
Acta De Veeduría Resguardo Indígena Guambiana De Nam Misak – Municipio La Argentina - Huila	*01*	*30/11/2023*
Acta De Veeduría Resguardo Indígena Fil Vits- La Perdiz -Municipio De San Agustín - Huila	*01*	*1/12/2023*
Acta De Modificación Anticipo	*01*	*12/12/2023*
Otro Si – Modificación Clausula 6	*01*	*14/12/2023*
Acta Parcial	*01*	*19/12/2023*
Acta Justificación	*01*	*28/12/2023*
Acta De Suspensión	*01*	*28/12/2023*
Acta Justificación	*02*	*07/05/2024*
Acta De Reinicio	*01*	*07/05/2024*
Acta de justificación 2	*02*	*07/05/2024*
Otro Si	02	07/05/2024
Justificación 3 para prorroga 1	3	05/07/2024
otro si 3 prorroga 1 adición 2 meses	3	05/07/2024

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo comprendido entre el 07 de junio y el 06 de julio de 2024, el comportamiento climático en los dos frentes de obra del proyecto estuvo caracterizado por una alta frecuencia de precipitaciones, las cuales impactaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas. En el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak, ubicado en el municipio de La Argentina, se presentaron lluvias en 16 de los 30 días calendario, representando el 53% del periodo de ejecución, lo que generó restricciones logísticas para el transporte de materiales y limitó el acceso mediante vehículos hasta la zona de intervención. Por su parte, en el resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz, en el municipio de San Agustín, se registraron precipitaciones en 14 de los 30 días calendario, equivalentes al 46% del periodo, afectando también la transitabilidad de las vías terciarias y obligando al contratista a realizar acopios parciales a borde de carretera, en espera de condiciones climáticas más favorables. Estas condiciones meteorológicas adversas fueron monitoreadas y registradas por la interventoría, y han sido consideradas como factores determinantes que han condicionado el ritmo de ejecución física del contrato durante el mes evaluado.

Durante el periodo comprendido desde el 07 de junio del 2024 al 06 de Julio del 2024 se evidencio el siguiente estado del clima:

- **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN LA ARGENTINA																														
MES	JUNIO																							JULIO						
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
DIAS	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
LLUVIAS		X		X			X		X	X		X		X	X			X	X		X		X		X	X		X		X

Con relación a la tabla anterior se puede observar que de los 30 días se han presentado precipitaciones 16 días, siendo esto el 53% de los días de ejecución.

- **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTÍN																														
MES	JUNIO																								JULIO					
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
DIAS	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
LLUVIAS	X		X			X				X		X			X	X				X	X		X	X	X	X				X	

Con relación a la tabla anterior se puede observar que de los 30 días de ejecución se han presentado precipitaciones en la zona 14 días, siendo esto el 46% de los días de ejecución.

7. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
	CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA									
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,5083%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,5498%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,0000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,0000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	153,83	$ 171.059,00	0,1989%	153,83	0,1989%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 171.059,00			0,1989%
		Costo Directo - Nam Misak			$ 86.018.252,00		$ 171.059,00			24,2570%

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
	CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA									
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%

1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
	SUB-TOTAL				$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,508%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA						MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
	SUB-TOTAL				$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,550%
3	ACABADOS						ACABADOS			
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades basica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
	SUB-TOTAL				$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,000%
4	PLACA DE CONTRAPISO						PLACA DE CONTRAPISO			
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
	SUB-TOTAL				$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,000%
6	TRANSPORTE						TRANSPORTE			
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
	SUB-TOTAL				$ 940.752,00		$ 0,00			$ 0,00
	Costo Directo - Fil Vits				$ 86.018.252,00		$ 0,00			24,058%
	Costo Directo - Proyecto				$ 172.036.504,00		$ 171.059,00			24,158%

8. CONTROL DE ANTICIPO - INTERVENTORIA				
N/A				
8.1. CONTROL DE ANTICIPO - OBRA				
RELACIÓN DE PAGO (ANTICIPO Y/O ACTA DE OBRA EJECUTADA)	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR ANTICIPO (25%)	09/05/2023	$ 53.761.407,50	$ 0	$ 53.761.407,50
ACTA PARCIAL NO. 1	09/05/2023	$ 51.735.900,00	$12.933.975,00	$ 38.801.925,00
VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 215.045.630,00	$0,00	$215.045.630,00	$51.735.900,00	$163.309.730,00

9. RELACION DE PERSONAL - INTERVENTORIA	
PROFESIONAL	CARGO
Juan Manuel Medina Barreto	Director de Interventoría

9.1. RELACION DE PERSONAL - OBRA	
PROFESIONAL	CARGO
Hernán Darío Rivera Flórez	Director De Obra
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Nam Misak.
María Ximena Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Fil Vits.
María Katalina Silva Manrique	Especialista en gerencia de proyectos.
Mario Andres Ortiz Villareal	Maestro de Obra
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	Ayudante de Obra
Nelson Vargas Almario	Ayudante de Obra
William Iván Delgado Rodríguez	Ayudante de Obra

10. RELACIÓN DE PAGOS OBRA		
TIPO DE PAGO (Acta No. /Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000387	09/05/2024
ACTA PARCIAL NO. 1	2024000388	09/05/2024

11. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - INTERVENTORIA						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLLA
Juan Manuel Medina Barreto	$ 234.000	$ 182.900	$ 35.700	$ 0.0	$ 0.0	8633159248
Carlos Andres Gorrón Avendaño	$288,000	$225,000	$9,400	$0,00	$0,00	9470497542
11.1. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - OBRA						
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	9469288607
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162.500	$8.000	$0	$0	9467274781 9482012132
María Ximena Vargas Gutiérrez	$145.600	$36.400	$36.400	$4.800	$0	9484927064
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	29861798
Mario Andres Ortiz	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9469779542
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131
Nelson Vargas Almario	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131
William Iván Delgado Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9469779542
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131

12. POLIZAS DE GARANTIA - INTERVENTORIA

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1- OTROSI No.2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN:	AMPARO	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009625	ANEXO 4	**22/07/2024**	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	15/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	15/09/2027
				Calidad del servicio	29/02/2024	12/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001938	ANEXO 4	22/07/2024	29/11/2023	12/09/2024

12.1. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA CONTRATO DE OBRA

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1- OTROSI No.3:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
ANEXO 3	05/07/2024	Cumplimiento del contrato		17/11/2023	20/03/2025
		Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		17/11/2023	20/03/2025
		Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		17/11/2023	18/09/2027
		Estabilidad y Calidad de Obras	Vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante		

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGÚN PRORROGA No. 1- OTROSI No.1:					
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031449	ANEXO 3.	05/07/2024	10/07/2024	10/09/2024

13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

13.1. RESGUARDO INDIGENA FIL VITS:



Mal estado de las vías.



Material Acopiado en vias por **dificil acceso al proyecto.**

13.2. RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK:



Sobreacarreo de material en bestia.

CONCLUSIONES

- Impacto climático en la ejecución: Las altas precipitaciones, que se presentaron en más del 50% de los días del período reportado, han sido el principal factor que ha limitado el desarrollo normal de las actividades de obra, afectando el cronograma y obligando a reprogramar el transporte y el acopio de materiales.
- Aunque el avance físico en actividades de construcción es bajo, se ha priorizado la logística de transporte, acopio y organización de materiales, aprovechando las ventanas climáticas disponibles.
- El contratista ha mantenido la ejecución de los recursos de anticipo de forma adecuada y en línea con el plan de inversión aprobado. Además, las pólizas, la seguridad social del personal y la documentación legal del contrato están en regla y actualizadas.
- Se verificó la adopción de medidas preventivas de seguridad para proteger al personal y los materiales, así como acciones para mitigar el impacto ambiental, evitando afectaciones al entorno natural.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda actualizar el cronograma de obra incorporando tiempos de espera por factores climáticos, de modo que se optimicen las actividades constructivas en las ventanas climáticas disponibles.
- Fortalecer la planificación del transporte de materiales para minimizar los retrasos, evaluando el uso de medios de acarreo adicionales o alternativos que reduzcan la dependencia de condiciones climáticas favorables.
- Implementar coberturas temporales y elementos de contención en los sitios de acopio para evitar pérdidas por escorrentía, contaminación o deterioro de los materiales.
- Mantener el seguimiento diario del estado del tiempo y elaborar reportes que permitan a la entidad contratante anticipar ajustes en la programación de obra.
- Establecer un plan de contingencia que contemple escenarios de alta pluviosidad, con estrategias para asegurar el avance mínimo en obra y mitigar el riesgo de incumplimientos contractuales.

14. ANEXOS

- MEMORIAS DE CANTIDADES.
- COMITÉS Y/O REUNIONES.
- APROBACION SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.
- SEGURIDAD SOCIAL.
- BITACORA

Ing. Juan Manuel Medina Barreto	29 – octubre – 2024	Ing. Natalia Bustos Botero
FIRMA INTERVENTOR	**FECHA DE ENTREGA**	**Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISION**

MEMORIAS DE CANTIDADES.

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	F. Aplica:	DIRECCIÓN TOS
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	7/06/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	6/07/2024
CAPÍTULO:	5 TRANSPORTE		
ITEM:	5,1 Transporte de materiales petreos	UNIDAD:	KG

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	VOL MATERIALES	CANTIDAD EN M3		DISTANCIA	Medida Total
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0,57M3 ARENA - 0,84M3 GRAVA)	1,41	10,91		10,00	153,83
TOTAL					153,83

ESQUEMAS:




Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

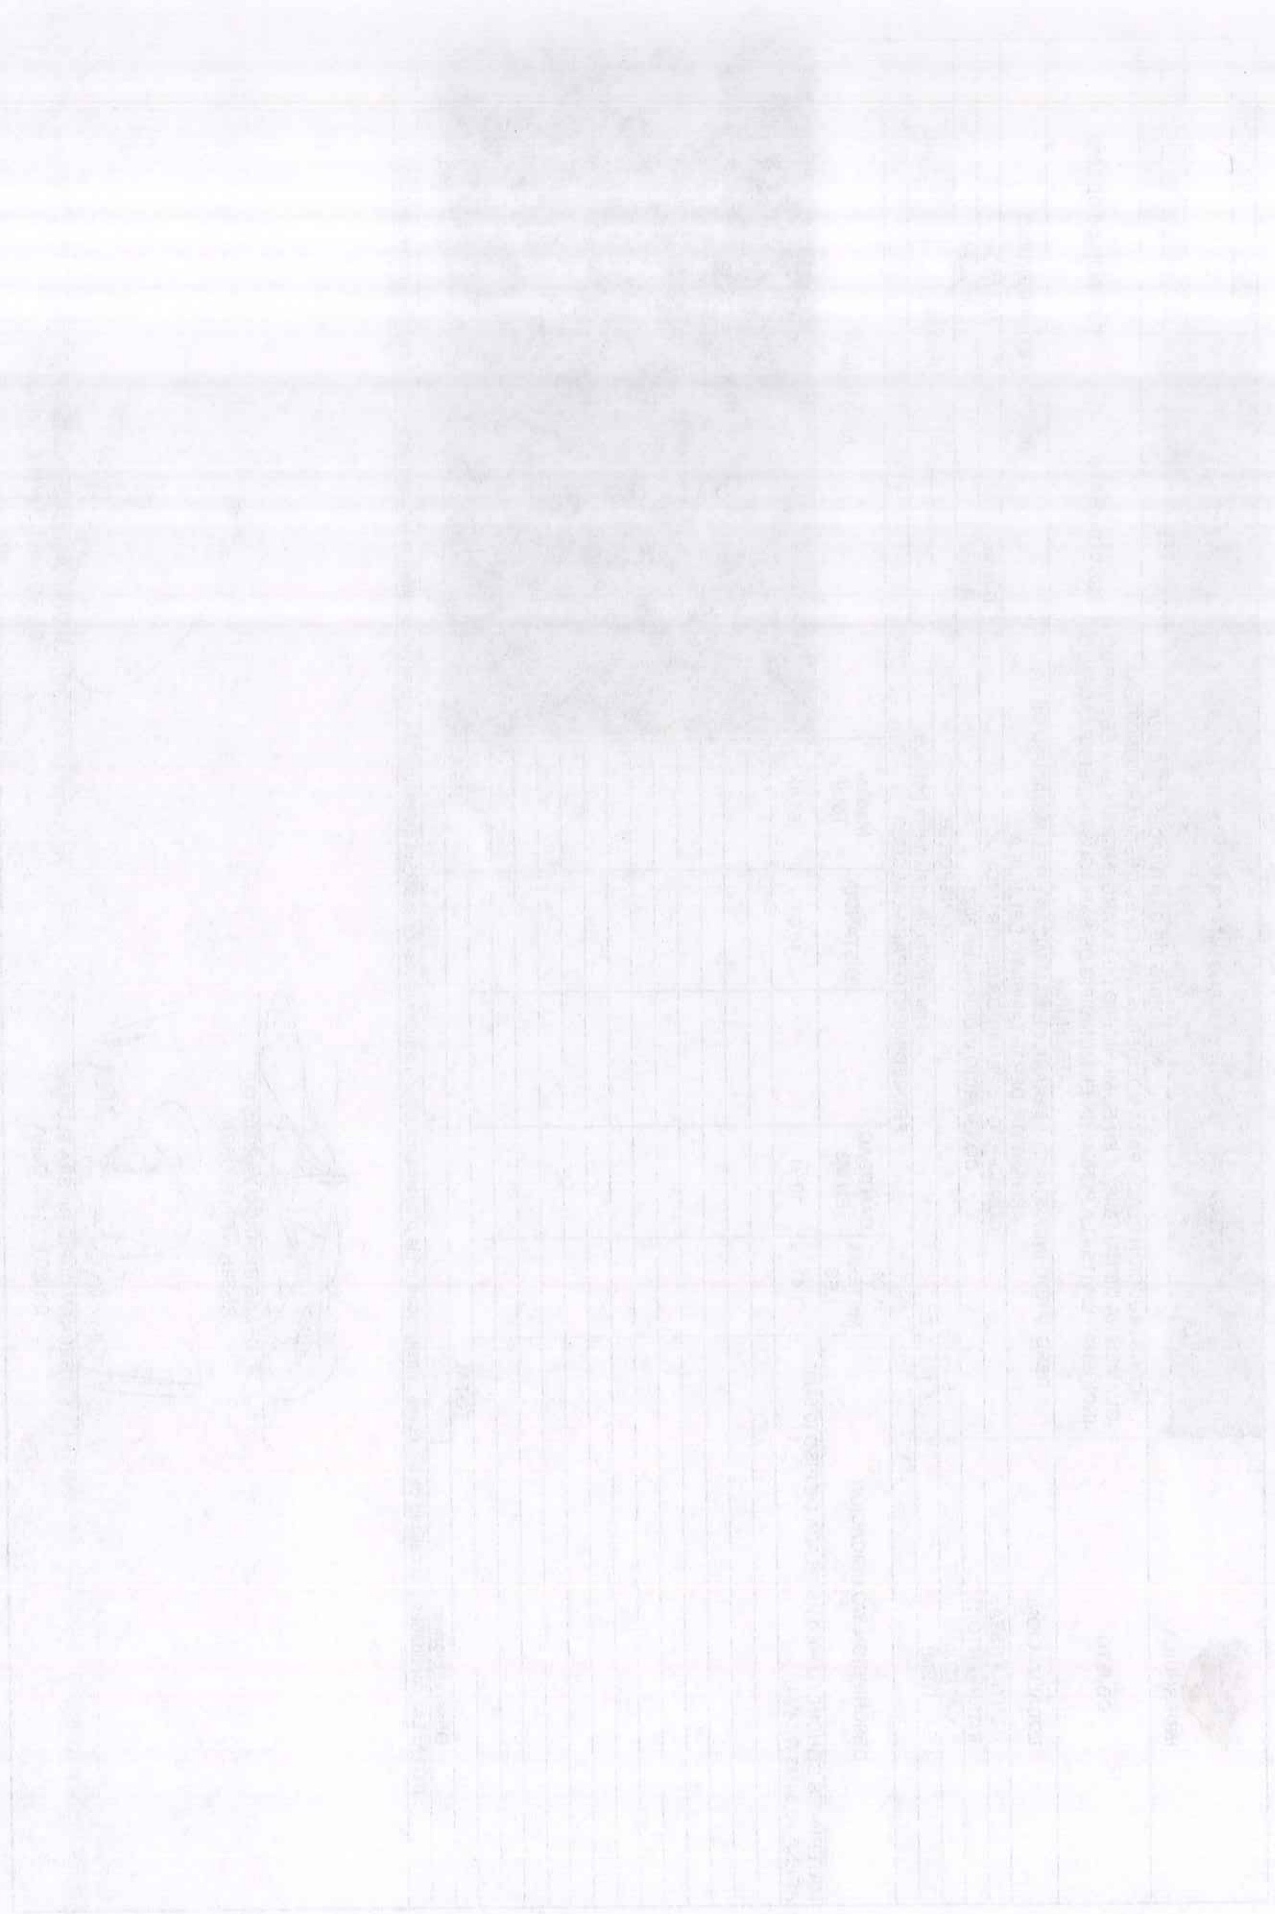

COMITÉS Y/O REUNIONES.

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Conocer Avance de Obra	**No. ACTA:**	2
FECHA:	26/06/2024	**HORA INICIO**	9:00 a.m.
RESPONSABLE:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	**HORA FINAL**	10:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de obra.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Juan Manuel Medina Barreto (Director y Representante legal)	Consorcio Inderhuila 2023	
Carlos andres Gorron Avendaño (Representante suplente)	Consorcio Inderhuila 2023	
Andres Paredes (Representante legal)	Consorcio Escenarios Deportivos JC	
Natalia Bustos Botero (Apoyo a la supervisión)	Entidad Contratante	

DESARROLLO:

Se reunió mediante una sesión virtual por la plataforma MEET a las 9:00 am el ingeniero Andres Paredes, representante Legal del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC, el ingeniero Juan Manuel Medina Barreto, representante legal y director de Interventoría del CONSORCIO INDERHUILA 2023, el Ingeniero Carlos Andres Gorron Avendaño como delegado y representante suplente del CONSORCIO INDERHUILA 2023, la Ingeniera Natalia Bustos Botero, quien ejerce como apoyo a la Supervisión del Contrato.

El representante legal del contratista de obra manifiesta que ha sido imposible llevar el material necesario para culminar la ejecución de la obra en los dos lugares, pero ha sido imposible llevar el 100% del material necesario para culminar las obras por el motivo del mal estado de la lluvia. Que por eso vuelve a solicitar una adición de prórroga de tiempo.

El apoyo de la supervisión le solicita que sea más explícito en el avance de obra y transporte de los materiales en los dos lugares al contratista.

El contratista responde que el NAM MISAK-LA ARGENTINA para acceder al sitio a intervenir se debe realizar por medio de bestias, moto o a pie, ya que este sitio se encuentra a más de 1.25 km de distancia de la vía terciaria principal (Sitio hasta donde llegan los vehículos) esta situación hace que el suministro los materiales sea de una manera lenta afectando el cronograma de obra propuesto, ya que el material se acopia a borde de carretera y este debe ser empacado en tulas y transportado por los únicos medios descritos anteriormente hasta el sitio de intervención y como es conocimiento por las partes, el sobre acarreo de este material es realizado con la colaboración de la comunidad de este resguardo, al día de hoy ya se encuentra el material pétreo necesario en el sitio de intervención, pero no se ha podido realizar hacer llegar el cemento necesario del proyecto, ya que la comunidad se debe poner de acuerdo para que en conjunto se pueda realizar una minga para el sobre acarreo de este, también este suministro se realizará en cuatro (04) días no seguidos como lo solicito la comunidad por la cantidad de cemento a llevar al sitio, y no se disponen de las bestias suficientes para poder cargar la totalidad de este en un solo día, adicionalmente la gente de la comunidad tienen sus labores y manifestaron que se podrán ponerse de acuerdo para subir el material una vez por semana, siendo así, solo el suministro de el material faltante podrá durar 1 mes, también quiero dejar claro que este sobre acarreo no ha sido contemplado por la entidad contratante y no está siendo pago por esta, y que este costo que la comunidad exige para esta labor es cancelada por el contratista de obra. Y FIL VITS – SAN AGUSTIN La vía de acceso al resguardo indígena desde el municipio de san Agustín se encuentra en muy mal estado de conservación, la cual se ha empeorado por las lluvias constantes ocurridas durante el presente mes, estas constantes lluvias no han permitido el tránsito de las volquetas por

esta vía terciaria imposibilitando el suministro del material necesario hasta el desarrollo del proyecto, también como es conocimiento de la interventoría, se encuentra a copiado 6 viajes de material acopiado en la carretera porque la volqueta no pudo subir al sitio de intervención, se espera que el clima mejore para poder realizar el sobre acarreo de este material al sitio de intervención. Adicionalmente, el consorcio contratista realizó la compra de 6 viajes de balastro para que con apoyo de la comunidad éste sea extendido en la vía, para mejorar los pasos más críticos de la vía, material que no está siendo reconocido por la entidad contratante, pero con el fin de solucionar y poder avanzar en el proyecto lo realizamos, con la infortuna de que el clima no nos ha permitido continuar con el acarreo del material que se encuentra acopiado en la vía.

Adicionalmente, como es de conocimiento de ámbito nacional, el país se encuentra en épocas de fuertes lluvias y el municipio de la Argentina y San Agustín no es la excepción, estas fuertes precipitación ha incrementado aún más la lentitud del transporte del material, ya que la zona de acceso se pone lisa, como se puede evidenciar en los reportes del Ideam.

Igualmente, el contratista afirma que ya tiene elaborado las canchas de en el municipio de Neiva solo faltaría transportarla hasta su lugar de destino.

El contratista manifiesta que han realizado todo lo posible para que el material necesario sea llevado a los sitios de intervención, pero que por factores externos como el clima no se ha podido realizar el suministro de materiales en su totalidad y por eso solicitan una ampliación al plazo inicial de 2 meses, los cuales corresponden el plazo que hasta hoy se ha perdido por las razones anteriormente mencionadas

El apoyo a la supervisión le da la palabra al representante de la interventoría el cual manifiesta que "Se tienen conocimiento de los hechos ocurridos por las lluvias ya que el contratista ha presenciado junto con el residente de obra los hechos ocurridos y los avances realizados por ellos, así mismo manifiesta que es viable dar una adición de plazo al tiempo contractual por todos los hechos ocurridos por las lluvia dejando una atraso en el avance de las obras y que han visto que el contratista ah hecho todo lo posible para poder llevar el material a su destino pero el contratiempo de acciones o climáticas han incurrido el cumplimiento del tiempo contractual".

La ing. Natalia Bustos pregunta que si con el tiempo solicitado, es definitivo para ejecutar las actividades faltantes y dar por terminado el contrato.

El contratista responde que si ya que ellos llevan la cuenta de que el primer mes solicitado es para poder culminar el transporte del material a su destino con las dependencias solicitadas por la comunidad del resguardo y que después de tener el material

en el destino necesitaran 20 días para poder culminar la ejecución de las obras y el tiempo restante es para perfeccionar o arreglar observaciones suministrada por la interventoría o entidad contratante.

El apoyo a la supervisión y la interventoría expresan total acuerdo con lo solicitado por el contratista de obra, para lo cual el apoyo a la supervisión solicita al contratista de obra y a la interventoría presentar su respectiva documentación a la entidad para solicitar la adición de tiempo (prorroga). Igual mente les solicita a los dos que esta documentación sea suministrada el día viernes 28 de junio por medio de correo para que ellos pueda realizar la respectiva revisión y aprobación de los documentos y que el día martes 02 de julio se radique mediante físico esta documentación en la oficina de la entidad contratante.

No siendo más se cierra la sesión con los siguientes compromisos.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Enviar acta de jsutificacion proyectada a la entidad	CONTRATISTA DE OBRA Y INTERVENTORIA	28	06	24
Efectuar otro si modificatorio	**ENTIDAD**	**02**	**07**	**24**

Siendo las 10:00 a.m. se dio por finalizada la sesión de esta reunión

APROBACION SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH430 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de acuerdo con la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada, verificada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico los pagos de las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido entre el 07 de junio del 2024 al 06 de julio del 2024.*

Para constancia se firma a los (16) días del mes de agosto de 2024.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

SEGURIDAD SOCIAL.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	8633159248	I	2024-10-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	452.600	34.900	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-07-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	1.350.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	168.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.350.000	32.900	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	417.700	N	1702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	8633159248	I	2024-10-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	452.600	34.900	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-07-08	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	18.000	0	234.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	18.000	0	234.000
EPS(Administradoras: 1)				1	168.800	0	14.100	0	182.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	168.800	0	14.100	0	182.900
ARP(Administradoras: 1)				1	32.900	0	2.800	0	35.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	32.900	0	2.800	0	35.700
Gran Total					417.700	0	34.900	0	452.600

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACIÓN	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO	2024-07-08
FECHA DE PAGO	2024-10-29
ENTIDAD DE PAGO	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN	2024-06
PERÍODO SALUD	2024-06
NUMERO PLANILLA:	8633159248
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657553974
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 198.800	$ 198.900
2974	[illegible]	COLPENSIONES	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 18.000	$ 214.500	$ 204.500
1423	[illegible]	POSITIVA	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 22.900	$ 22.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 34.900	$ 417.700	$ 432.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2024

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	801116365	9470497542	I	2024/07/15	2024/07/26	BANCOLOMBIA	11	$526,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,400	$0	$290,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$2,400	$0	$290,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$1,900	$0	$226,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$1,900	$0	$226,900
TOTAL				1	$522,400	$4,400	$0	$526,800


ok

2024/07/26 09:41 AM

BITACORA


06 de Junio del 2024

Continuan las fuertes lluvias, en el municipio de la argentina y la plata, no se logra realizar algun tipo de actividad.




07 de Junio del 2024

Hoy se realiza actividades de sobre acarreo de material petreo desde el borde de via hasta el puente y de ahí al resguardo indigena.




08 de Junio del 2024
Se presentan fuertes lluvias en la mañana y en la tarde, no se realizan actividades




09 de Junio del 2024

Se hace actividad de Sobreacarreo de material petreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.




10 de Junio del 2024
Se presentan fuertes lluvias, durante el dia, no se realizan actividades operativas



11 de Junio del 2024

Se empaca material petreo en lonas y se hace sobreacarreo de este material desde el cruce de la via y el puente hasta el resguardo indigena.



12 de Junio del 2021

Se continua realizando el sobre acarreo de material petreo hasta el resguardo indigena en bestias

13 de Junio del 2024
Se presentan lluvias constantes durante el día no se logra Continuar actividades operativas

14 de Junio del 2024

Se continua realizando el Sobreacarreo de material petreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.

15 de Junio del 2024
Se presentan lluvias durante todo el día no se logra continuar con actividades operativas


16 de Junio del 2024
Persisten las lluvias Constantes durante el día no se logra realizar actividades operativas

17 de Junio del 2024

Se empaca material en lonas y este es Sobreacarreado desde el acopio hasta el resguardo indigena en mulas.

18 de Junio del 2024

Se presentan lloviznas constantes durante todo el dia, lo cual entorpecio las actividades operativas




19 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo del material petreo hasta el resguardo indigena en bestias.



20 de Junio del 2024

Hoy se presentaron lluvias Constante durante el dia lo cual imposibilito las actividades operativas



21 de Junio del 2024

Hoy Continuaron las lluvias, se presentaron durante el dia, no se pudo realizar actividades operativas



22 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo del material petreo hasta el resguardo indigena hasta el sitio de intervencion en bestias.



23 de Junio del 2024

Se empara material petreo y se Sobreacarrea desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias




24 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias en el día de hoy, no se realizaron labores



25 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se lograron realizar actividades



26 de Junio del 2024

Se realizo Sobreacarreo de material en bestias hasta el sitio de intervencion



27 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias el dia de hoy NO se realizaron actividades de obra.

28 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo de material en bestias hasta el resguardo indigena

29 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias constantes el día de hoy, no se puede realizar actividades de obra

30 de Junio del 2024

Se continua empacando material ~~desde~~ petreo y se realiza sobre acarreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena

[illegible]

01 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se pudo realizar trabajos


[illegible]



02 de Julio del 2024

Continua el día de hoy las lluvias, esto no permite las actividades operativas


[illegible]



03 de Julio del 2024

Se continua empacando material petreo en lonas y este se sobreacarrea en bestias hasta el resguardo indigena

[illegible]



04 de Julio del 2024

Se presentan lluvias el día de hoy no se puede realizar actividades de obra

[illegible]

05 de Julio del 2024

Se continua realizando sobre acarreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.

[illegible]

06 de Julio

Se presentan lluvias el día de hoy por lo cual no se pudo realizar actividades operativas.

06 de Junio del 2024

Se presentaron Fuertes lluvias, no se realizaron labores en stio de intervención.

Hernán Rivera V.

maria ximena V.

07 de Junio del 2024

Se presentan lluvias el día de hoy, No se pueden realizar actividades

maria ximena V. Hernán Rivera V

08 de Junio del 2024
Hoy se intento subir 3 vigas de material petreo, por culpa de la humedad del terreno no se logro llegar hasta el resguardo indigena, toco acopiarlo a borde de via

maria ximena V.

09 de Junio del 2024

Se presentan lluvias constantes durante el dia, no se hacen actividades operativas

maria ximena V. Hernán Rivera V

10 de Junio del 2024
La veeduria del Resguardo Indigena de Fil Vits, manifiesta que la junta de Accion comunal de pradera y villa fatima iniciaron la construcción de 2 placas huellas, esto perjudica totalmente la ejecución de actividades de la construccion de la placa huella.

Hernán Rivera V
maria ximena V.


11 de Junio del 2024

debido a la Construccion de las placas huellas en pradera y villa fatima no se podra ~~podra~~ hacer actividades operativas de transporte de material petreo

maria ximena V.

12 de Junio del 2024


Se presentan lluvias el día de hoy no se puede continuar con el Sobreacarreo.



maria ximena V.

13 de Junio del 2024

Se contrato una camioneta para realizar el sobreacarre del material petreo desde el acopio de la via hasta el reseguardo indigena, no se pudo realizar esta actividad debido a la humedad del suelo la camioneta resbala los llantas



maria ximena V.

14 de Junio del 2024


hoy se hacen actividades de sobreacarreo de material petreo con camioneta hasta el reseguardo indigena.



maria ximena V.

15 de Junio del 2024

Se continuan actividades de sobreacarreo del material acopiado en vía, hasta el reseguardo indigena en camioneta.



maria ximena V.

16 de Junio del 2024


Se presentan lluvias el dia de hoy, no Se pueden hacer actividades de Sobreacarreo.



maria ximena V.

17 de Junio del 2024

Por la humedad q' presenta la vía no se pueden realizar actividades de sobre-acarreo



maria ximena V.

18 de Junio del 2024

Se presentan lluvias, lo wal no permite realizar actividades de sobreacarreo

maria ximena V.

Hernán

19 de Junio del 2024

Por la humedad del terreno de la vía no se pueden hacer actividades de Sobreacarreo

maria ximena V. Hernán

20 de Junio del 2024

Hoy se logró realizar actividades de Sobreacarreo de material petreo hasta el resguardo indigena.

maria ximena V. Hernán

21 de Junio del 2024

Se presentan lluvias Constantes el día de hoy, no se puede hacer actividades de Sobreacarreo

maria ximena V. Hernán

22 de Junio del 2024

Continuan presentando lluvias el día de hoy, no se pueden hacer actividades de Sobreacarreo.

Hernán

23 de Junio del 2024

en conjunto con la interventoria, nos comunicamos con el presidente de la junta de Acción comunal de pradera y villa fatima el señor olman Anaizar Sanchez. quien manifiesta que tiene fecha prevista de terminación es el 23/08/2024 y q se debe esperar los 28 días

Hernán

24 de Junio del 2024

Hoy se realizan actividades de sobre acarreo del material petreo desde el acopio en via hasta el resguardo indigena en camioneta

Hernán Riva V

25 de Junio del 2024

Se continua realizando actividades de Sobreacarreo en camioneta del material acopiado en via

Hernán Riva V

26 de Junio del 2024

Se presentan lluvias el dia de hoy, no se realizan actividades de Sobre acarreo

Hernán Riva V

27 de Junio del 2024

El dia de hoy se presentaron lluvias durante todo el dia, no se logra hacer actividades de sobre acarreo

Hernán Riva V

28 de Junio del 2024

Por la humedad del terreno, no se pueden hacer actividades de sobreacarreo

Hernán Riva V

29 de Junio del 2024

Se presentan lluvias, no se pueden hacer actividades de sobreacarreo

Hernán Riva V

30 de Junio del 2024

el día de hoy, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde, no se pueden hacer actividades de sobreacarreo.

Hernán Riva V

01 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias durante el día no se pueden hacer actividades de obra

Hernán Riva V

02 de Julio del 2024

Continuan las lluvias, fueron persistentes en horas de la mañana y en la tarde, no se hace sobreacarreo.

Hernán Riva V

03 de Julio de 2024

Por la humedad que presenta el terreno no se puede hacer actividades de sobreacarreo del material acopiado en vía.

Hernán Riva V

04 de Julio de 2024

Se realizan actividades de sobreacarreo con camioneta del material acopiado en vía hasta el resguardo indigena

Hernán Riva V

05 de Julio de 2024

Se realizan actividades de Sobreacarreo del material petreo acopiado en via hasta el resguardo indigena en camioneta.

Hernán Riva V

06 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se hacen actividades de sobreacarreo

Hernández V

07 de Julio del 2024
