CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 05

MENSUAL [X] FINAL [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

MUNICIPIO: LA ARGENTINA Y SAN AGUSTIN **DEPARTAMENTO: HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH374 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO INDERHUILA 2023

INFORME No. 05.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	CMCIH374 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 07 de agosto al 26 de agosto 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INDERHUILA 2023	**NIT:**	901.768.748-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	**C.C:**	12.132.626
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024.		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1	07 DE MAYO DE 2024		
OTRO SI 1	07 DE MAYO DE 2024		
PLAZO ADICIONAL (NO.1)	05 DE JULIO DE 2024 PRORROGA 01 – 60 DIAS		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 (D/M/A)	26 DE AGOSTO DEL 2024		
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024.		
VALOR TOTAL:	$ 13.191.312,00		
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA NO.	CSAMCIH430 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVOS JC	**NIT:**	901.771.793-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES FELIPE PAREDES SANABRIA	**C.C:**	1.075.260.938
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	10/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	29/11/2023		
OTROSI No. 01 - Modificación Clausula 6	14/12/ 2023		

SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
REINICIO 1	07/05/2024
OTROSI No. 02 - Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal	07/05/2024
OTROSI No. 03 - Modificación Cláusula 4 Prorroga de dos (02) meses.	05/07/2024
SUSPENSIÓN 2	26/08/2024
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No. 01	DOS (02) MESES.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	$215.045.630
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$0
VALOR TOTAL:	$215.045.630

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El Consorcio Escenarios Deportivos JC construirá, de acuerdo con el contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA", obras localizadas en los municipios de:

NO.	MUNICIPIO	SITIO	DIRECCIÓN
1	LA ARGENTINA	RESGUARDO INDÍGENA	NAM MISAK
2	SAN AGUSTÍN	RESGUARDO INDÍGENA	FIL VITS

1. MUNICIPIO LA ARGENTINA CABILDO INDÍGENA NAM MISAK:


El proyecto "Construcción de placa para polideportivos del Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak" se encuentra ubicado en el municipio de La Argentina, departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se debe partir desde el parque principal y tomar la vía hacia el centro poblado gallego del municipio de La Plata. Desde allí, se toma la intersección hacia el centro poblado Belén y se continúa por la vía registrada como La Plata-Popayán, hasta el kilómetro 15. Finalmente, se toma la vía de cruce o

intersección hacia el resguardo de Nam Misak.

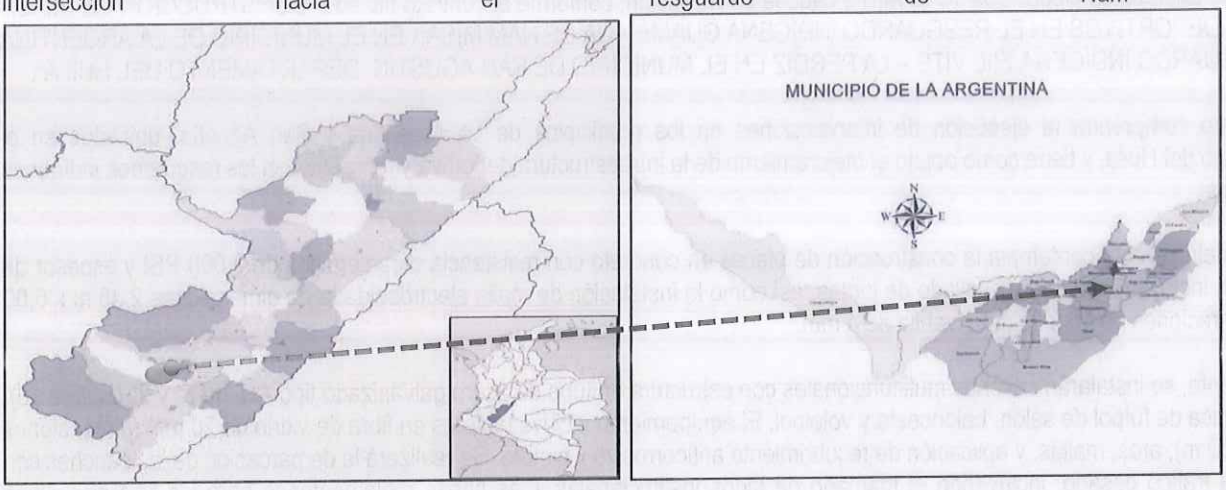

1. MUNICIPIO SAN AGUSTÍN RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS:

El proyecto "Construcción de placa para polideportivos del Resguardo Indígena Fiil Vits – La Perdiz" se encuentra ubicado en el municipio de San Agustín, departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se debe partir desde el parque principal y tomar la vía hacia el parque arqueológico. Luego, se toma la intersección hacia la vereda La Perdiz, llegando al sitio de ejecución de la obra.

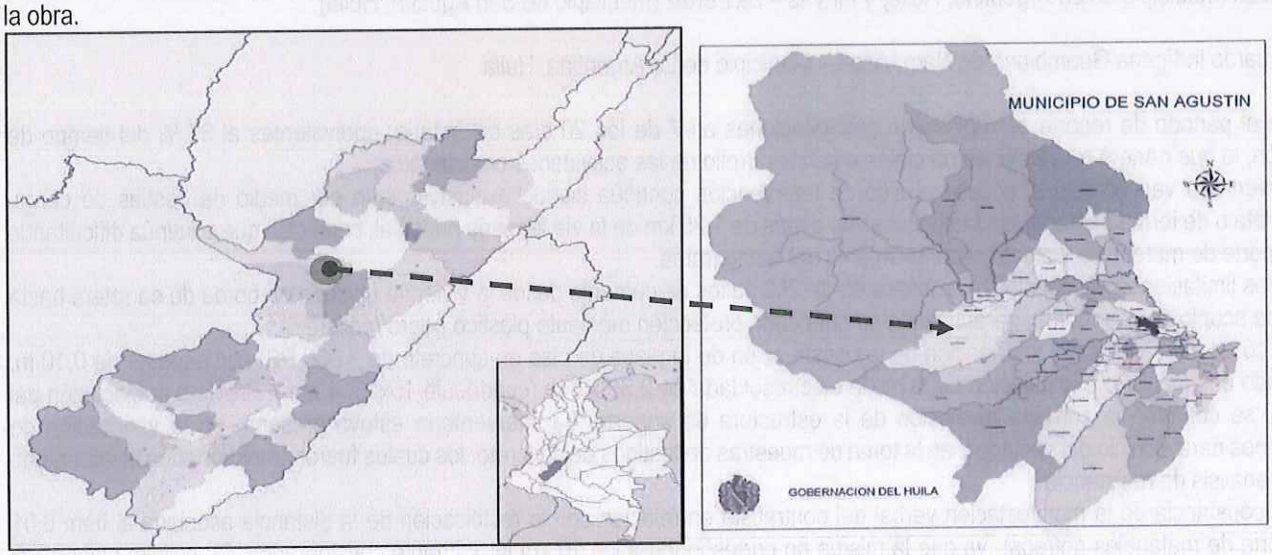

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Consorcio Escenarios Deportivos JC llevará a cabo la construcción, conforme al contrato titulado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Este contrato comprende la ejecución de intervenciones en los municipios de La Argentina y San Agustín, ubicados en el departamento del Huila, y tiene como objeto el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en los resguardos indígenas mencionados.

El alcance del proyecto contempla la construcción de placas en concreto con resistencia característica de 3.000 PSI y espesor de 0,10 metros, incluyendo el corte y sellado de juntas, así como la instalación de malla electrosoldada de dimensiones 2,35 m x 6,00 m, con separaciones de 15 x 15 cm y varilla de 4 mm.

Adicionalmente, se instalarán canchas multifuncionales con estructura en tubo de acero galvanizado tipo AN, de 3" y 2" (calibre 16), para la práctica de fútbol de salón, baloncesto y voleibol. El equipamiento incluye tableros en fibra de vidrio de 20 mm (dimensiones 1,80 m x 1,50 m), aros, mallas, y aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura. Se realizará la demarcación de las canchas con pintura para tráfico pesado, incluyendo el marcado de logos institucionales y las líneas reglamentarias para las tres disciplinas deportivas.

La ejecución se desarrollará conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y condiciones contractuales, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y funcionalidad establecidos para el proyecto.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En cumplimiento de las funciones de interventoría, se realizó el seguimiento y control a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 07 y el 26 de agosto de 2024, en los frentes de trabajo ubicados en los resguardos indígenas Guambiano de Nam Misak (municipio de La Argentina, Huila) y Fil Vits – La Perdiz (municipio de San Agustín, Huila).

1. Resguardo indígena Guambiano de Nam Misak – Municipio de La Argentina, Huila

Durante el periodo de reporte se registraron precipitaciones en 7 de los 20 días calendario, equivalentes al 35 % del tiempo de ejecución, lo que generó restricciones parciales en el desarrollo de las actividades programadas.
La interventoría verificó que el acceso al sitio de intervención continúa siendo exclusivamente por medio de bestias de carga, motocicleta o de forma peatonal, dada su ubicación a más de 1,25 km de la vía terciaria principal, condición que continúa dificultando el transporte de materiales y afecta el cumplimiento del cronograma.
Pese a las limitaciones, se constató el sobrecareo de 250 bultos de cemento desde la vivienda ubicada en borde de carretera hasta el sitio de acopio del resguardo, garantizando su adecuada protección mediante plástico negro (calibre 6).
Se verificó además el inicio y terminación de la construcción de la placa de piso en concreto de 3.000 PSI con espesor de 0,10 m, incluyendo el suministro e instalación de la malla electrosoldada de 2,35 x 6 m (cuadrícula 15x15, 4 mm). Previo a la ejecución del vaciado, se confirmó la correcta nivelación de la estructura de soporte. La interventoría estuvo presente en la verificación de condiciones para el inicio del vaciado y en la toma de muestras de testigos de concreto, los cuales fueron transportados al laboratorio para su análisis de resistencia.
Se deja constancia de la manifestación verbal del contratista en relación con la rectificación de la distancia asociada al ítem 6.01 (transporte de materiales pétreos), ya que la misma no corresponde a los 10 km inicialmente considerados. Se solicita elaborar el balance de mayores y menores cantidades para su revisión y ajuste en el acta correspondiente.

2. Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz – Municipio de San Agustín, Huila:

En este frente de trabajo se presentaron precipitaciones en 6 de los 20 días calendario, lo que representa el 30 % del periodo de ejecución.

Sin embargo, no se registró avance en la ejecución de actividades, dado que el acceso permanece restringido por la construcción de la placa huella que comunica a las veredas La Pradera y Villa Fátima, único medio de ingreso al resguardo. Debido a esta situación, la interventoría avala la suspensión temporal de las actividades en este frente de obra hasta tanto se habiliten las condiciones de acceso.

De igual manera, se deja constancia de la manifestación verbal de rectificación de la distancia del ítem 6.01 (transporte de materiales pétreos), solicitando el respectivo balance de mayores y menores cantidades para su análisis.

5. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**Cumplimiento Contractual** Verificación de Cláusulas y Condiciones: La interventoría se aseguró de que el contratista cumpliera con todas las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato. Esto incluyó: Control de Calidad de Materiales: Verificación de que los materiales utilizados cumplieran con los estándares y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Normativas de Seguridad: Aseguramiento de que el contratista cumpliera con todas las normativas de seguridad aplicables. **Suscripción de Documentos Contractuales** Actas y Documentos Relevantes: Se suscribieron y gestionaron diversos documentos importantes relacionados con el contrato, incluyendo: **Solicitud de suspensión** **Firma del acta de suspensión**
CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	**Inspección en Campo** Verificación del Avance de la Obra: La interventoría ha llevado a cabo inspecciones regulares en el campo para evaluar el progreso de la obra. Se ha constatado que las actividades en el resguardo indígena de La Argentina iniciaron el 2 de agosto del presente año, conforme a los planos y especificaciones técnicas. Sin embargo, en el resguardo indígena del municipio de San Agustín no ha sido posible iniciar las actividades debido a la construcción de la placa huella que la comunidad está realizando en la vía de acceso al resguardo. Las condiciones climáticas adversas han impedido el avance esperado en la construcción de la placa huella, generando retrasos en la ejecución y afectando la implementación de los trabajos según lo planificado. Registro de Avances: Documentación detallada del avance de las obras, incluyendo observaciones sobre cualquier desviación o ajuste necesario. **Control de Calidad** Supervisión de Mano de Obra y Materiales: La interventoría supervisó la calidad de los materiales utilizados en la construcción de las placas de los polideportivos. Se aseguraron los siguientes aspectos: Inspección de Materiales: Verificación de que los materiales utilizados cumplieran con los estándares de calidad establecidos para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las placas. **Verificación y Aprobación de la Localización de los Trabajos** Confirmación de Localización: Se verificó y aprobó la localización de los trabajos para garantizar que se ajustara a las especificaciones del contrato. Esto incluyó: Inspección de Sitio: Revisión del sitio de trabajo para asegurar que la ubicación de las actividades de construcción fuera correcta y adecuada según los planos. **Verificación de Cantidades de Obra**

	Revisión de Documentos: Se ha realizado una verificación exhaustiva de las cantidades de obra especificadas en el contrato en comparación con las cantidades realmente ejecutadas. Esta revisión garantiza que las cantidades de trabajo realizadas se alineen con las estipuladas en el contrato y en las especificaciones técnicas, facilitando una evaluación precisa del progreso del proyecto y la conformidad con los términos acordados. Es importante destacar que, a la fecha, únicamente se han completado las actividades preliminares en el resguardo indígena del municipio de San Agustín, mientras que en el resguardo indígena del municipio de La Argentina se ha continuado con la ejecución de las demás actividades contractuales. **Control de Actividades Programadas y Recomendaciones** Monitoreo de Actividades: Seguimiento de las actividades programadas para identificar cualquier desviación o retraso. Recomendaciones de Ajustes: Recomendación de ajustes necesarios para mantener el proyecto en línea con el cronograma y los objetivos establecidos. Que por los motivos de la construcción de la placa huella que comunica a la vereda la Pradera y Villa Fátima, único acceso al Resguardo Indígena Fil Vits, no ha sido posible realizar el transporte del material del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	La interventoría realizó el control y seguimiento a los ensayos de laboratorio derivados de la construcción de la placa en concreto de 3.000 PSI, con espesor de 0,10 m, en el resguardo indígena Guambiano de Nam Misak. Se verificó la correcta toma de muestras de concreto fresco en sitio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la norma NTC 550 y las especificaciones técnicas del proyecto. Los cilindros fueron elaborados, curados en obra y transportados oportunamente al laboratorio para la ejecución de los ensayos de resistencia a la compresión a las edades establecidas (3,7, 14 y 28 días). **La interventoría realizó:** Inspección visual durante el proceso de toma de muestras, garantizando la adecuada compactación y etiquetado de los cilindros. Registro en bitácora de la fecha y hora de vaciado, ubicación de la placa, número de muestras tomadas y responsable de la actividad. Verificación del transporte de los cilindros al laboratorio, asegurando condiciones adecuadas para evitar alteraciones en los especímenes. Seguimiento al cronograma de roturas, solicitando al laboratorio la entrega oportuna de resultados para su análisis. Los resultados de resistencia obtenidos serán comparados con la resistencia de diseño (3.000 PSI), para verificar el cumplimiento de las especificaciones. La interventoría se asegurará de que cualquier desviación o no conformidad sea reportada de inmediato y se tomen las acciones correctivas pertinentes.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	La interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero al manejo del anticipo contractual, verificando que su ejecución se desarrolla conforme al plan de inversión aprobado. Los recursos han sido destinados principalmente a la logística de transporte de materiales pétreos hacia los sitios de intervención en los resguardos indígenas, incluyendo acarreos, contratación de mano de obra local y aprovisionamiento inicial de insumos. En ese sentido, se concluye que el anticipo está siendo ejecutado de manera adecuada, alineado con los objetivos del contrato y las obligaciones establecidas en la cláusula sexta.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	La interventoría realizó el seguimiento al personal vinculado por el Consorcio Escenarios Deportivos JC, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la conformación del equipo operativo.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo control y seguimiento de los equipos en obra esto para garantizar la productividad, seguridad y cumplimiento de los cronogramas del proyecto. Desde el rol de esta interventoría, se implementar herramientas y protocolos de supervisión que aseguren el estado óptimo de los equipos y su correcta utilización. La integración de tecnología en este proceso mejora la trazabilidad y el desempeño, contribuyendo a la eficiencia general del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se llevo a cabo control y seguimiento de los materiales es una actividad esencial para garantiza la calidad, optimización de recursos y cumplimiento de plazos en el desarrollo de una obra. Esta interventoría implemento procedimientos de control, inspección y trazabilidad que aseguren que los materiales se gestionen de manera eficiente y cumplan con los estándares del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Se realizo control y seguimiento de los aportes a la Seguridad Social Integral del proyecto de obra garantizando el cumplimiento de las normativas legales y proteger los derechos de los trabajadores. Este proceso tiene como objetivo verificar que los aportes correspondientes se realicen de manera oportuna, completa y conforme a la legislación vigente.
SEGUIMIENTO A POLIZAS DE GARANTIAS	Se realizo el seguimiento a las pólizas de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, proteger los intereses del proyecto y garantizar la correcta ejecución de las obras, este control implico la supervisión del cumplimiento de las condiciones estipuladas en las pólizas, asegurando su validez y cobertura en todo momento. Esta interventoría se aseguró que las pólizas cumplan con los requisitos contractuales, legales y técnicos, y que estén siempre vigentes. Esto no solo fortalece la gestión del proyecto, sino que también garantiza la seguridad de las partes involucradas.
ACTIVIDADES LOGÍSTICOS.	Se ha establecido y mantenido una bitácora de obra junto con el contratista. En este documento se registran diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas durante la ejecución de los trabajos. La bitácora proporciona un registro detallado y continuo de la evolución del proyecto y facilita la supervisión y el control de la obra. mediciones de obra. Se han efectuado mediciones precisas de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista, conforme a las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo los planos de referencia. Estas mediciones aseguran que los trabajos se puedan realicen de acuerdo con los requisitos contractuales y técnicos, y permiten una evaluación precisa del progreso y la calidad de la ejecución.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL.	Gestión de residuos: La interventoría ha supervisado la correcta gestión de los residuos generados durante la construcción de la placa para polideportivo en Nam Misak. Hasta la fecha, no se han generado residuos significativos, ya que el contratista aún se encuentra en la fase de distribución de materiales en el municipio de la argentina, se terminó la actividad de la construcción de la placa en el resguardo del municipio de La Argentina.

ACTIVIDADES FINANCIERAS.	El interventor ha llevado a cabo un control exhaustivo sobre el aspecto administrativo y financiero del contrato. Este control incluye la supervisión y verificación de la correcta aplicación y gestión de los recursos financieros destinados al proyecto. Se ha asegurado que todos los procesos administrativos relacionados con la gestión financiera, como la aprobación de pagos, la justificación de gastos y la adecuación de los fondos, se realicen conforme a los términos contractuales y las normativas vigentes. Se ha efectuado un control detallado de la inversión realizada en el marco del contrato. Este control ha implicado la revisión de los informes financieros y de inversión para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y conforme a lo estipulado en el contrato. Se ha evaluado la correcta asignación y utilización de los fondos, asegurando que las inversiones realizadas cumplan con los objetivos del proyecto y los requisitos contractuales establecidos.
ACTIVIDADES JURÍDICOS.	El interventor ha llevado a cabo una revisión exhaustiva para asegurar que todas las partes involucradas en el contrato cumplan con las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el acuerdo. Esta verificación incluyó la evaluación del cumplimiento de los términos legales y contractuales, con el objetivo de prevenir posibles conflictos o incumplimientos. Se ha comprobado que los requisitos contractuales están siendo atendidos de manera adecuada y que se están siguiendo los procedimientos establecidos. Se ha confirmado que las pólizas asociadas al contrato se encuentran vigentes y en plena vigencia. Esta revisión asegura que las garantías y seguros requeridos por el contrato están en efecto, protegiendo a las partes involucradas contra riesgos y contingencias previstas en el acuerdo. Se ha verificado que las pólizas cumplen con los términos contractuales y que no existen lapsos en la cobertura que puedan afectar la ejecución del proyecto. Se verifico la documentación y justificación para la respectiva suspensión del contrato de obra como el de interventoría.
RELACION DE ACTAS REALIZADAS	**CMCIH 374 DE 2023** **Objeto:** "Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO 1	1	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	2	07 de mayo 2024
OTRO SI N° 1	1	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	05 de julio de 2024
OTROSI 2 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	2	05 de julio de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION 4	4	26 de agosto del 2024
ACTA DE SUSPENSION 2	2	26 de agosto del 2024

CSAMCIH 430 DE 2023

Objeto: "Construcción Placa para polideportivos en el resguardo indígena guambiana de Nam Misak en el Municipio de la Argentina y el Resguardo Indígena Fil Vits la perdiz en el Municipio de San Agustín Departamento del Huila"

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	*29 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK – MUNICIPIO LA ARGENTINA - HUILA	1	*30 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ -MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	1	*1 de diciembre de 2023*
ACTA DE MODIFICACION ANTICIPO No 1	1	*12 de diciembre de 2023*
OTRO SI – Modificación Clausula 6	1	*14 de diciembre de 2023*
ACTA PARCIAL	1	*19 de diciembre 2023*
ACTA JUSTIFICACION	1	*28 de diciembre 2023*
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	*28 de diciembre 2023*
ACTA JUSTIFICACION	2	*07 de mayo 2024*
ACTA DE REINICIO	1	*07 de mayo 2024*
OTROSI 2 – Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal	2	*07 de mayo 2024*
ACTA DE JUSTIFICACION	3	*05 de julio de 2024*
OTROSI 3 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	3	*05 de julio de 2024*
ACTA DE JUSTIFICACION	4	*26 de agosto del 2024*
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02	2	*26 de agosto del 2024*

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

La situación actual del proyecto se ve afectada significativamente por las condiciones climáticas adversas. Las intensas lluvias y el mal estado de las vías de acceso han impactado negativamente en el avance de la construcción de las placas para los polideportivos en los municipios de San Agustín y la argentina.

La situación climática actual sigue siendo un factor crítico, con lluvias constantes que continúan afectando la ejecución y el transporte de materiales, lo que ha llevado a la solicitud de suspensión del proyecto. La interventoría sigue supervisando de cerca el progreso y la gestión del proyecto para asegurar que se cumplan los términos acordados y se minimicen los impactos negativos del clima.

Durante el periodo comprendido desde el 07 al 26 de agosto del 2024 se evidencio el siguiente estado del clima:

- **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTÍN																				
MES	AGOSTO																			
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DIAS	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU
LLUVIAS		X	X	X						X	X	X							X	

Con relación a la tabla anterior se puede observar que, de los 20 días de ejecución, se han presentado precipitaciones en la zona 7 días, siendo esto el 35% de los días de ejecución.

- **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTÍN																				
MES	AGOSTO																			
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DIAS	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU
LLUVIAS			X	X					X	X	X					X				

Con relación a la tabla anterior se puede observar que, de los 20 días de ejecución, se han presentado precipitaciones en la zona 6 días, siendo esto el 30% de los días de ejecución.

7. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA										
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,5083%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,5498%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,0000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	600,00	$ 51.379.800,00	59,7313%	600,00	59,7313%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 51.379.800,00			59,7313%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	291,00	$ 323.592,00	0,3762%	734,73	0,9498%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 323.592,00			0,9498%
		Costo Directo - Nam Misak			$ 86.018.252,00		$ 51.703.392,00			84,7392%

CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA										
CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE

1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,508%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,550%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00			$ 0,00
		Costo Directo - Fil Vits			$ 86.018.252,00		$ 0,00			24,058%
		Costo Directo - Proyecto			$ 172.036.504,00		$ 51.703.392,00			54,399%

8. CONTROL DE ANTICIPO				
RELACIÓN DE PAGO (ANTICIPO Y/O ACTA DE OBRA EJECUTADA)	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR ANTICIPO (25%)	09/05/2023	$ 53.761.407,50	$ 0	$ 53.761.407,50
ACTA PARCIAL NO. 1	09/05/2023	$ 51.735.900,00	$12.933.975,00	$ 38.801.925,00
VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 215.045.630,00	$0,00	$215.045.630,00	$51.735.900,00	$163.309.730,00

9. RELACION DE PERSONAL (PROFESIONAL INTERVENTORÍA)	
PROFESIONAL	CARGO
Juan Manuel Medina Barreto	Director de Interventoría

9.1. RELACION DE PERSONAL (PROFESIONAL OBRA)	
PROFESIONAL	CARGO
Hernán Darío Rivera Flores	Director De Obra
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	Residente De Obra
María Ximena Vargas Gutiérrez	Residente De Obra
María Katalina Silva Manrique	Especialista En Gerencia De Proyectos.
Mario Andrés Ortiz	Maestro De Obra
Jonathan Mora Sánchez	Ayudante de Obra
Juan De Jesús Perdomo Moreno	Ayudante de Obra
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	Ayudante de Obra

10. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA		
TIPO DE PAGO (Acta No. /Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000387	09/05/2024
ACTA PARCIAL NO. 1	2024000388	09/05/2024

11. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

INTERVENTORIA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Juan Manuel Medina Barreto	$ 230.000	$ 179.700	$ 35.100	$ 0	$0	8633749829
Carlos Andres Gorrón Avendaño	$232.700	$181.800	$7.700	$0,00	$0,00	9473548609 9493510410

OBRA

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	9472113734
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162.500	$7.700	$0	$0	9471133920 9482012666
María Ximena Vargas Gutiérrez	$97.100	$24.300	$3.200	$24.300	$0	9484927747
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	30481284
Mario Andres Ortiz	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9473113207
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31676331
Jonathan Mora Sánchez	$34,700	$8,700	$1,200	$8,700	$0	9473113207


Juan De Jesús Perdomo Moreno	$34,700	$8,700	$1,200	$8,700	$0	9473113207
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31676331
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9473113207
12. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA						
En el rango de fechas del presente informe no se realizó ajuste a las garantías de los contratos.						


13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

13.1. RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK:

ESQUEMA



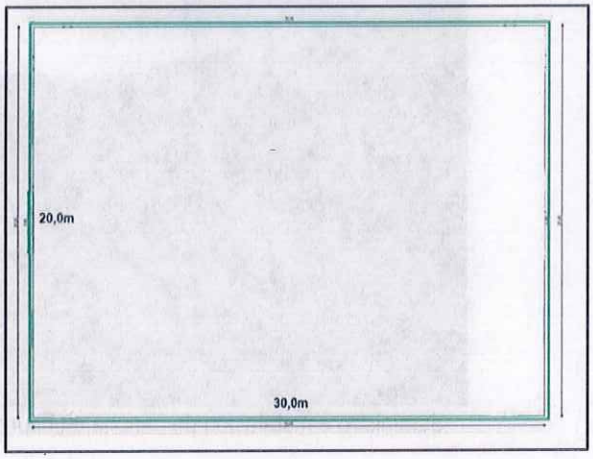

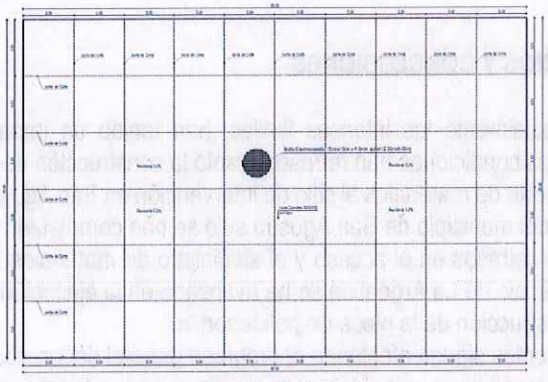

PLANTA JUNTAS DE CORTE PLACA

FOTOGRAFIA




Construcción Placa de concreto.



Chequeo espesor de placa.




Construcción Placa de concreto.

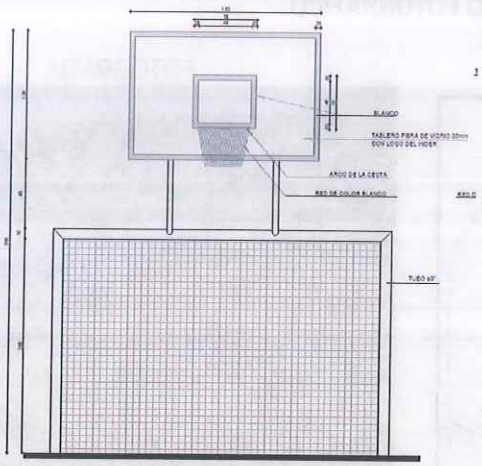



Construcción Placa de concreto.

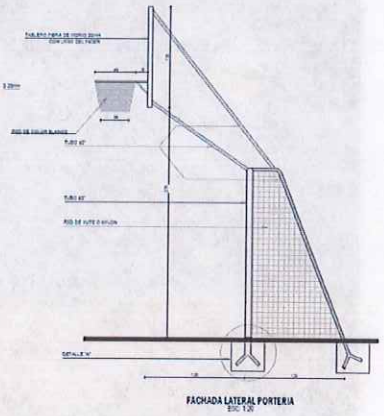



Suministro e instalacion de cancha multifuncional.

14. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Las condiciones climáticas adversas, especialmente las intensas lluvias, han tenido un impacto significativo en el progreso del proyecto. Estas condiciones han retrasado tanto la construcción de las placas para los polideportivos como el transporte de materiales al sitio de intervención en San Agustín.
- En consecuencia, en el resguardo indígena del municipio de San Agustín solo se han completado las actividades preliminares. Esto se debe a los retrasos en el acceso y el suministro de materiales. En contraste, en el resguardo indígena del municipio de La Argentina se ha avanzado en la ejecución de otras actividades contractuales, como la construcción de la placa de polideportivo.
- Sin embargo, las condiciones climáticas adversas siguen afectando el progreso general del proyecto, especialmente en San Agustín. Estos problemas han contribuido a retrasos en el inicio y la ejecución de las actividades contractuales en dicho municipio.

- En términos de suministro de materiales, el contratista ha realizado entregas parciales en el municipio de San Agustín y completas en el municipio de La Argentina. Este hecho indica un avance parcial en el suministro de materiales necesarios para el proyecto.
- No obstante, a pesar del avance en La Argentina, los retrasos continúan en el municipio de San Agustín. Las actividades preliminares aún no se han completado debido a problemas en la distribución de materiales y condiciones logísticas desfavorables.
- Se suspende las actividades en el frente de trabajo del resguardo indígena Fil Vits, debido a la construcción de la placa huella que se esta construyendo en la via de acceso al resguardo en la vereda villa Fátima y pradera, razón por la cual se suspende las actividades en este frente.

15. ANEXOS

- MEMORIAS DE CALCULO.
- CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- APROBACION ENSAYOS DE LABORATORIO.
- BITACORA DE OBRA.
- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Ing. Juan Manuel Medina Barreto	24 – Diciembre – 2024	Ing. Natalia Bustos Botero
FIRMA INTERVENTOR	**FECHA DE ENTREGA**	**Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISION**

MEMORIAS DE CALCULO.

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-GGID-F95
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	7/08/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	26/08/2024
CAPÍTULO:	4 PLACA DE CONTRAPISO		
ITEM:	4,01 Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	UNIDAD:	KG

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DE PISO	30,00	20,0000		1,00	600,00
TOTAL					600,00

ESQUEMAS:




Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA


JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

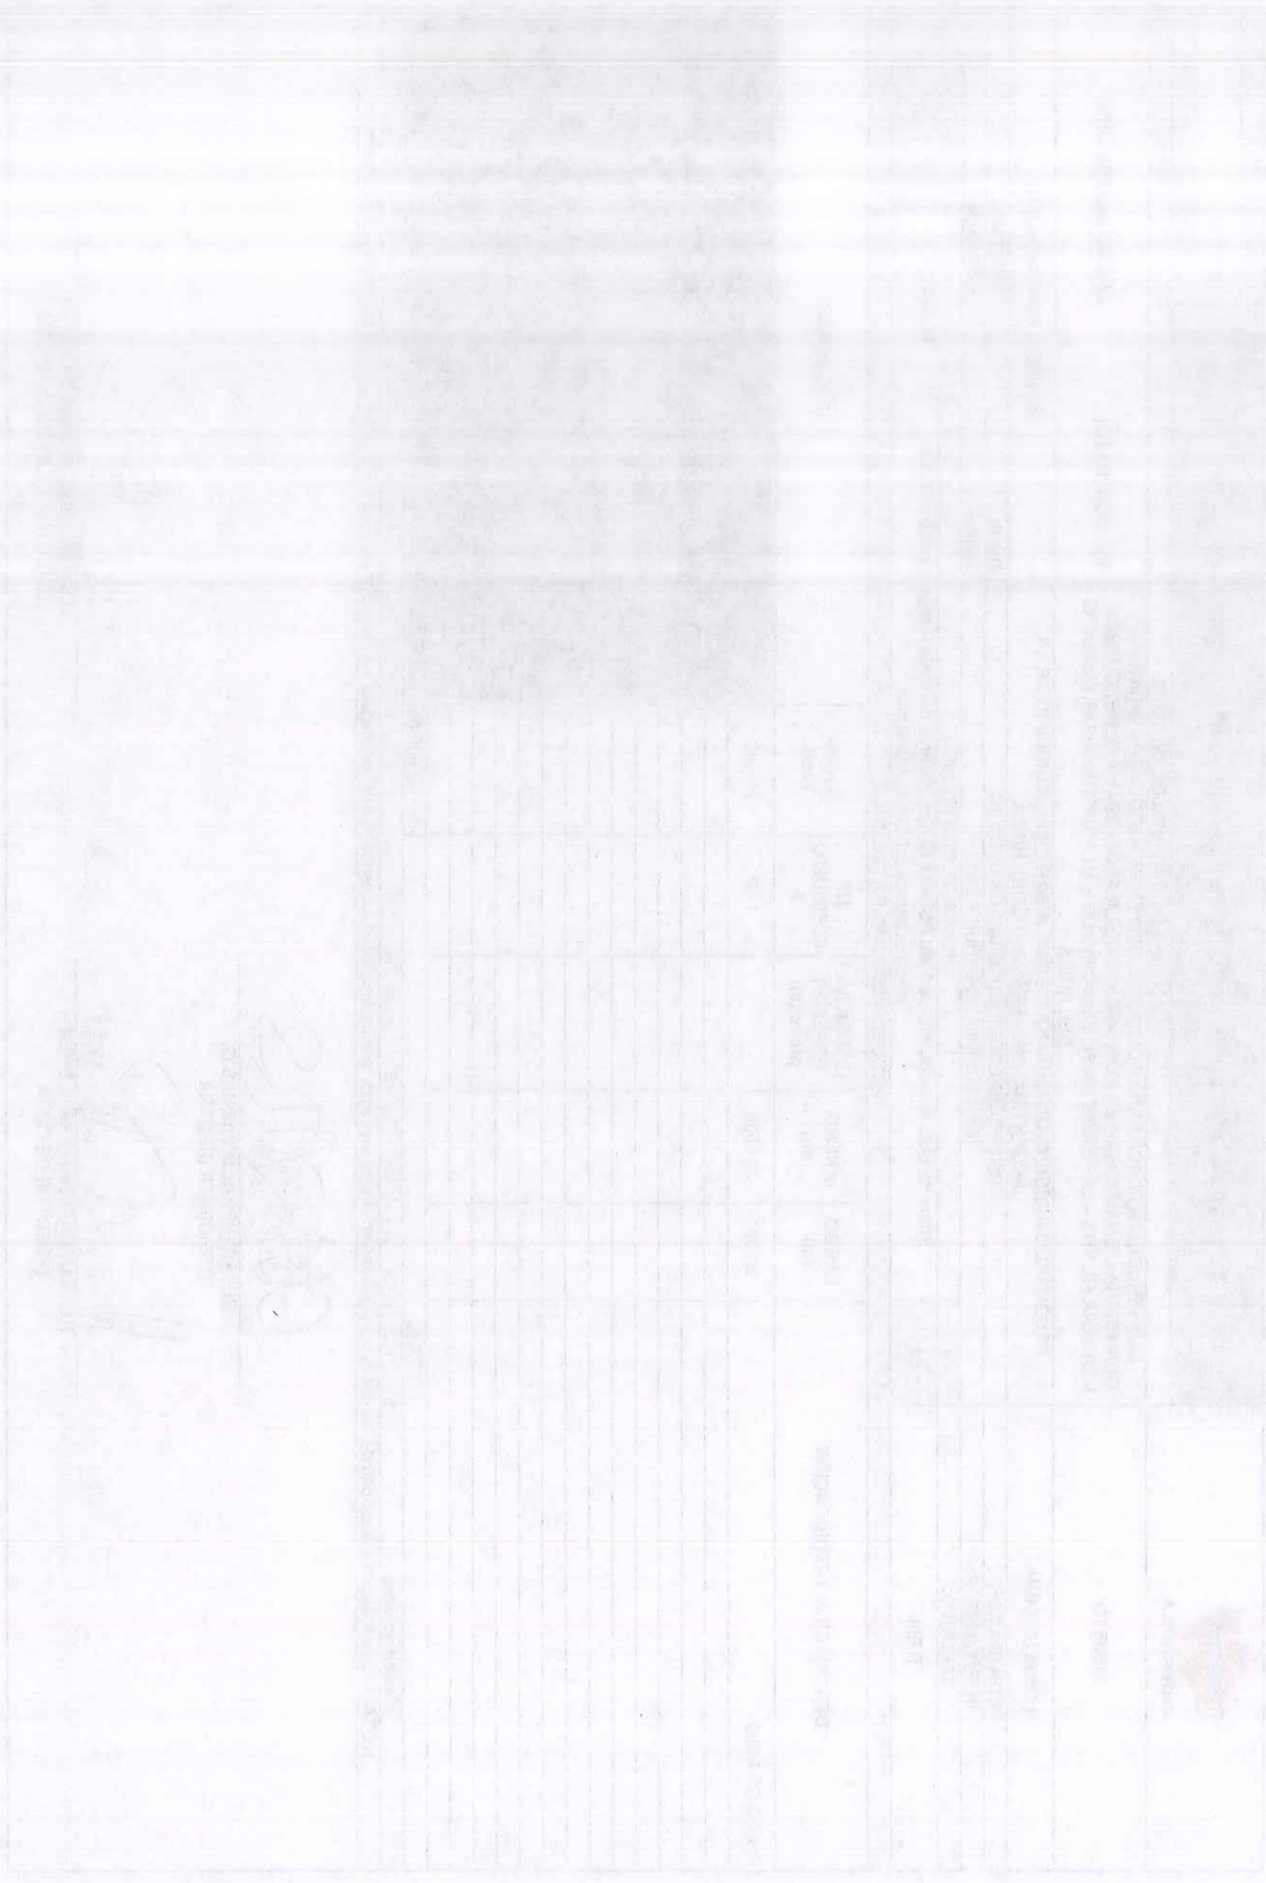

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
		Fecha de Aprobación:	12/09/2023
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	7/08/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	26/08/2024
CAPÍTULO: 5	TRANSPORTE	UNIDAD:	M3-KM
ITEM: 5,1	Transporte de materiales petreos		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

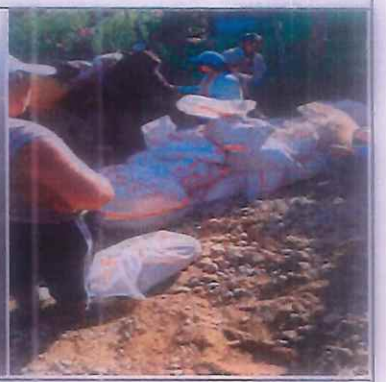DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	VOL MATERIALES	CANTIDAD EN M3		DISTANCIA	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0,57M3 ARENA - 0,84M3 GRAVA)	1,41	20,64		10,00	291,00	 
TOTAL					291,00	


Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

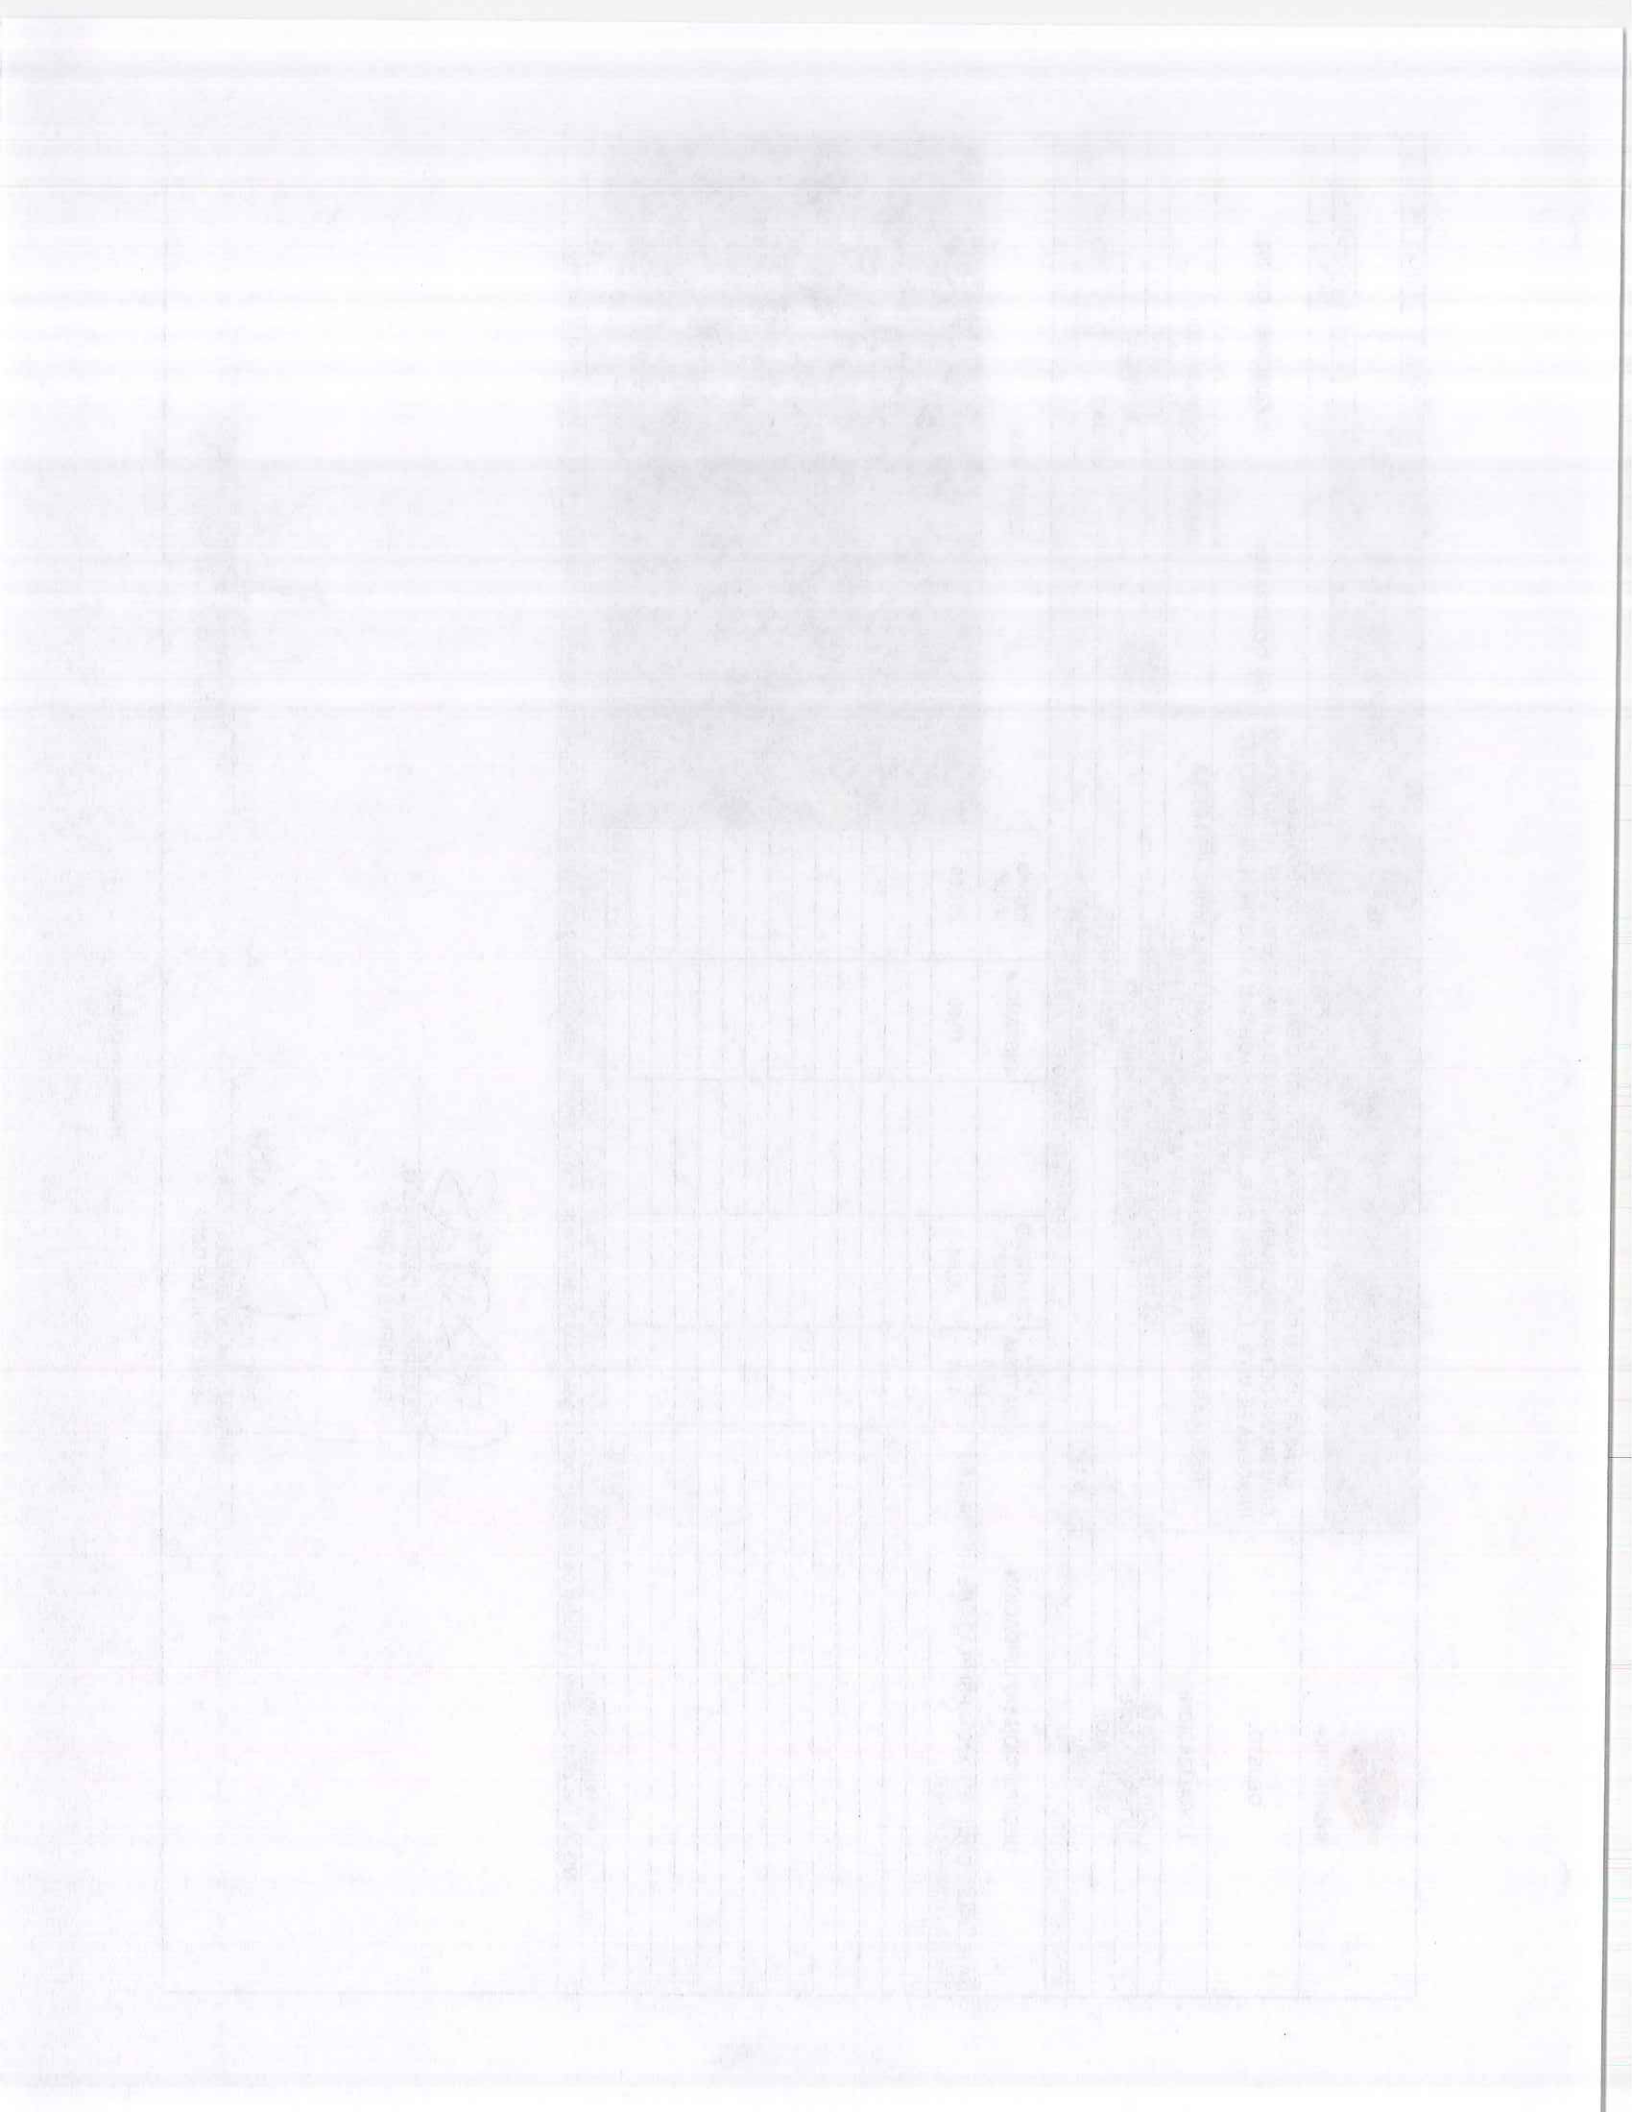

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA.

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH430 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de acuerdo con la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada, verificada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico los pagos de las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido entre el 07 de agosto del 2024 al 26 de agosto del 2024.*

Para constancia se firma a los (24) días del mes de diciembre de 2024.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	8633749829	I	2024-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	444.800	27.100	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633749829	2024-09-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	CC 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	1.350.000																0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	168.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.350.000	32.900	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	417.700	N	1702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	8633749829	I	2024-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	444.800	27.100	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633749829	2024-09-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	14.000	0	230.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	14.000	0	230.000
EPS(Administradoras: 1)				1	168.800	0	10.900	0	179.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	168.800	0	10.900	0	179.700
ARP(Administradoras: 1)				1	32.900	0	2.200	0	35.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	32.900	0	2.200	0	35.100
Gran Total					417.700	0	27.100	0	444.800

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL:	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-06
FECHA DE PAGO:	2024-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8633749829
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633749829
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 10.900	$ 168.800	$ 179.700
[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 14.000	$ 216.000	$ 230.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 32.900	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 27.100	$ 417.700	$ 444.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2024

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	927995551	94735489 09	I	2024/09/13	2024/09/23	BANCOLOMBIA	10	$215,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$92,100		0	$0	$0	14-23	17	$736,667	$3,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$736,667	$117,900			$736,667	$92,100			$0	$0			$736,667	$3,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,900	$900	$0	$118,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$117,900	$900	$0	$118,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,900	$100	$0	$4,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,900	$100	$0	$4,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,100	$700	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,100	$700	$0	$92,800
TOTAL				1	$213,900	$1,700	$0	$215,600

2024/10/01 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1868200555	9493510410	N	2024/09/13	2025/10/21	NEQUI	403	$206,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	17	($736,667)	($117,900)	EPS005	17	($736,667)	($92,100)		0	$0	$0	14-23	17	($736,667)	($3,900)	0	$0	$0
2	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$563,333	$90,100			$563,333	$70,400			$0	$0			$563,333	$2,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,100	$23,800	$0	$113,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$90,100	$23,800	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,900	$800	$0	$3,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$2,900	$800	$0	$3,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,400	$18,600	$0	$89,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,400	$18,600	$0	$89,000
TOTAL				1	$163,400	$43,200	$0	$206,600

2025/10/21 12:53 PM

APROBACION ENSAYOS DE LABORATORIO.

CONSORCIO
INDERHUILA 2023
NIT. 901.768.748-5

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Contrato de Obra No. CSAMCIH430 de 2023
Objeto: *Construcción de placa para polideportivos en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y el resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.*
Contratista: Consorcio Escenarios Deportivos JC
Interventoría: Consorcio INDERHUILA 2023
Entidad Contratante: INDERHUILA

CERTIFICA

Que el **Consorcio INDERHUILA 2023**, en su calidad de **Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental** del contrato de obra mencionado, realizó el **seguimiento, control y aprobación de los ensayos de laboratorio** correspondientes a las **muestras cilíndricas de concreto** tomadas durante la fundición de la placa polideportiva ejecutada en el **Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak**, municipio de La Argentina, departamento del Huila.

Metodología y procedimiento

Durante la jornada de vaciado, se tomaron **muestras cilíndricas de concreto fresco** conforme a los procedimientos establecidos por la **Norma Técnica Colombiana**, que regulan la elaboración, curado y ensayo de cilindros de concreto para determinar su resistencia a la compresión.

La toma de muestras fue supervisada directamente por la interventoría, garantizando:

- Homogeneidad del concreto procedente del mezclado en sitio.
- Correcta elaboración de los cilindros (dimensiones, compactación y etiquetado).
- Curado húmedo controlado durante el periodo previo al ensayo.
- Transporte adecuado al laboratorio certificado para el desarrollo de los ensayos.

Resultados de los ensayos

Los resultados obtenidos en el laboratorio acreditado para los cilindros correspondientes a la muestra del concreto vaciado fueron los siguientes:

Edad del ensayo (días)	Resistencia promedio obtenida (PSI)	Observaciones
3 días	1.509 PSI	Dentro del rango esperado para el 40% de la resistencia de diseño.
7 días	2.168 PSI	Dentro del rango esperado para el 70% de la resistencia de diseño.
14 días	*En espera de resultados*	—
28 días	*En espera de resultados*	—

Conclusión técnica

Con base en la metodología aplicada y los resultados preliminares obtenidos a los **3 y 7 días**, la interventoría concluye que el **comportamiento del concreto es adecuado y conforme a las especificaciones técnicas del diseño de mezcla aprobado (3.000 PSI a 28 días)**. Los resultados parciales demuestran una correcta dosificación, mezcla y colocación del concreto, evidenciando un proceso de curado apropiado y un control de calidad eficiente durante la ejecución.

La **Interventoría APRUEBA** los resultados parciales de los ensayos de laboratorio realizados, y quedará a la espera de los resultados a **14 y 28 días** para emitir el cierre definitivo del control de calidad de la resistencia del concreto correspondiente al resguardo mencionado.

Atentamente;

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA



Neiva, Agosto 27 del 2024

Señores:
CONSORCIO INDERHUILA 2023.
R.L. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Ciudad

Referencia: Remisión resultados de laboratorio.

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANADE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
ISABEL MORENO CHARRY
Nit 900456835-5


LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO — I.N.V. 410-13

ORDEN DE TRABAJO: 052-24
CONTRATISTA: CONSORCIO INDERHUILA 2023
PROYECTO: CONSTRUCCION PLACA DE POLIDEPORTIVO NAM MISAK
UBICACIÓN: LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA EMISION INFORME: CONSOLIADO DE ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO MES DE AGOSTO


FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Slump (Pulg)	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN								
14/08/2024	13/08/2024	1	15,00	30,00	186,00	4 1/4"	3	16/08/2024	1527	51%	1	3000	TIRA INTERMEDIA DE LA PLACA
	13/08/2024		15,00	30,00	263,00	4 1/4"	7	20/08/2024	2159	72%	1	3000	
	13/08/2024		15,00	30,00	341,00	4 1/4"	14	27/08/2024	2799	93%	4	3000	
	13/08/2024		15,30	30,50	0,00	4 1/4"	28	10/09/2024	0	0%	2	3000	

EQUEMA DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%


LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
JEFE DE LABORATORIO
Nit: 900456835-5

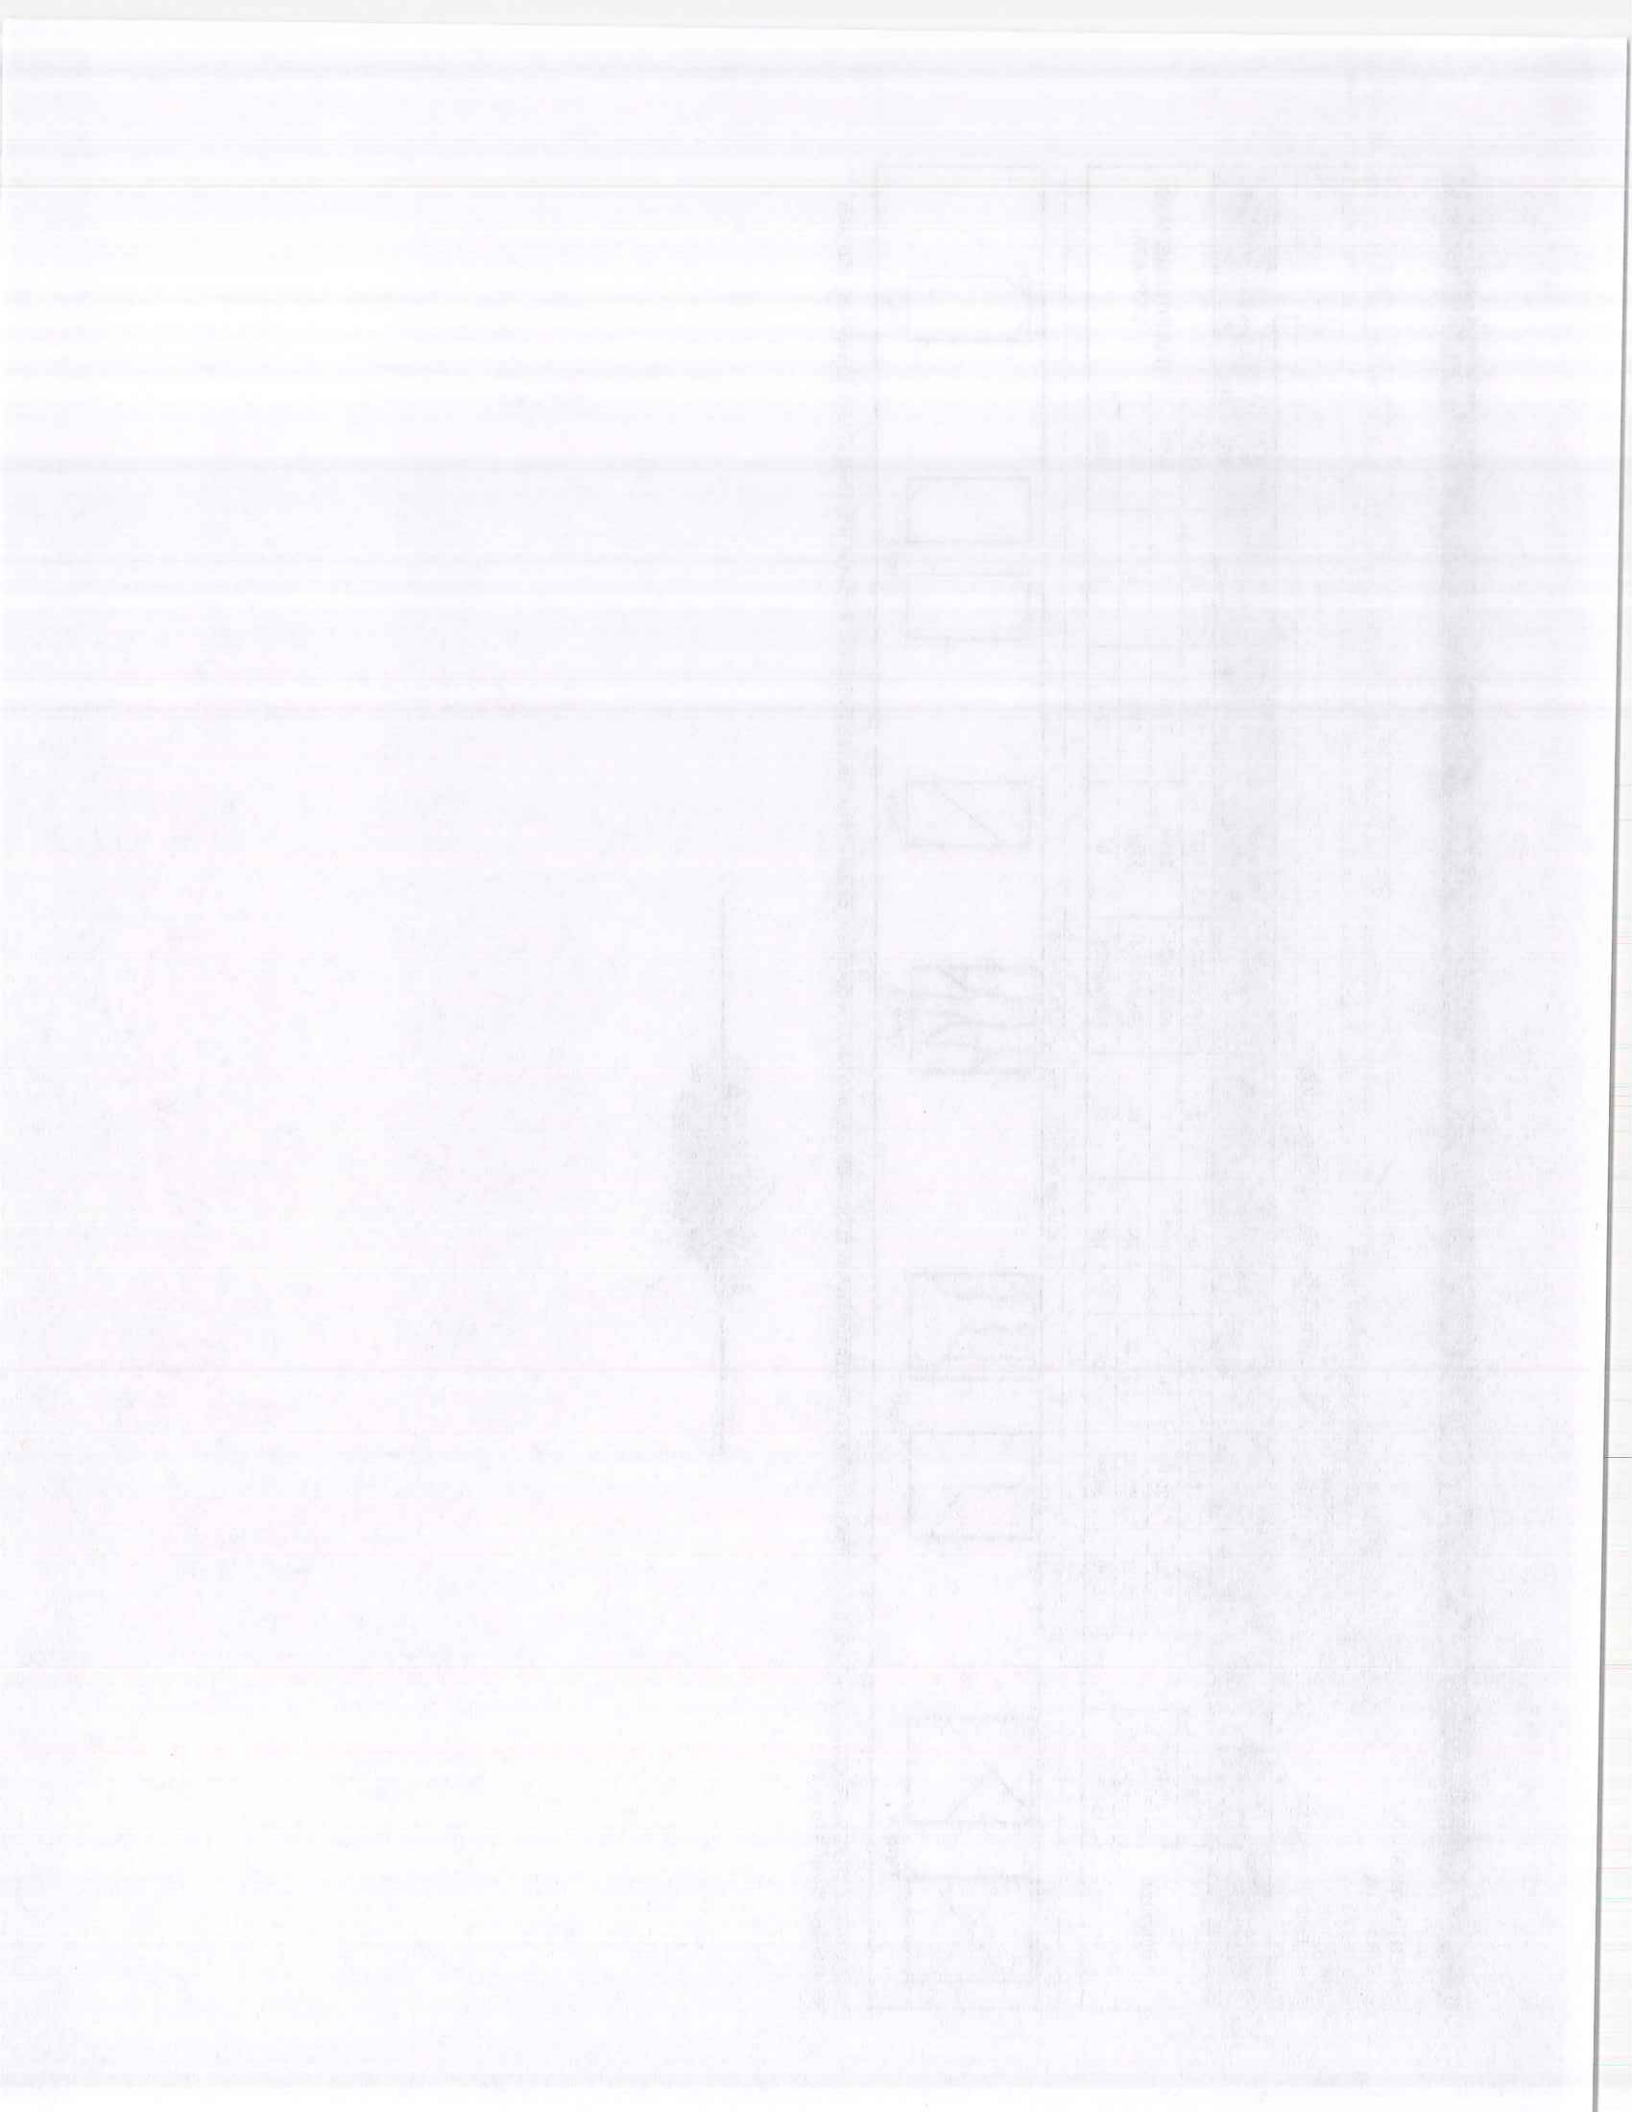

BITACORA DE OBRA.

07 Agosto del 2024

Llega al puente 250 bultos de cemento, se acopian y se tapan con plastico negro, se continua con el sobre-acarreo del material al resguardo indigena, se inicia en el sitio la verificacion de nuveles y se inicia la instalacion de Formaleta metalica en una dimension completa a lo largo de la longitud de 30m y un ancho de 3,33m, se intala la malla electrosoldada en esta area



[redacted]

Hernán

08 Agosto del 2024

Se presentaron Precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto.

[redacted]

Hernán

09 Agosto del 2024

Se presentaron Precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecución del Actividades de obra del proyecto.

[redacted]


Hernán

10 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.


11 Agosto del 2024

Se continua con el sobreacarreo del material desde el puente al resguardo indigena, se realiza instalacion de formaleta metalica longitudinal a los 30 metros de longitud quedando formaletiado dos lineas para fundir mañana llego al sitio de Obra la totalidad del Cemento.




12 Agosto del 2024

Se continua sobreacarreo de material petreo, y se termina de llevar a pie la malla electrosoldada, se inicia el día con la fundición de una tira de la placa de 30 x 3,33 m la cual se termina, llega la empresa de laboratorios y saco los 4 especimenes de Concreto para fallarlos en el laboratorio. la interventoria verifico q' la mezcla se realizara de acuerdo a lo estipulado en el diseño de mezclas




13 Agosto del 2024

Se continua realizando el sobre acarreo de material petreo en lonas y usando bestias, Se inicia fundicion de segunda tira de concreto de 3.000 psi 30x3,33x0,10 pero solo se logró fundir un 50% de esta pq' inicio llovizna en horas de la tarde



14 Agosto del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo de material petreo hasta el resguardo indigena.
Se realiza fundición del 50% faltante de la Segunda tira de 3.000 PSI con medidas de 15 x 3,33 x 0,10 m a hoy tenemos fundido $2 \times 30 \times 3,33 = 200 m^2$




15 Agosto del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo de material petreo hasta el resguardo indigena, se inicia el desformaleteo de las tiras de la placa ya fundida.




16 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecucion de Actividades de obra del proyecto




17 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecución del Actividades de obra del proyecto




18 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecución del Actividades de obra del proyecto.




19 Agosto del 2024

debido a las fuertes lluvias presentada los ultimos dias, hoy se inicia instalacion de formaleta metalica, se continua acarreando material petreo hasta el resguardo indigena, se espera mañana fundir una tira Completa de 30x3,33x0,10 de acuerdo al clima, la interventoria chequea la instalacion de la malla electrosoldada verificando q cumpla con el recubrimiento dentro de la placa.



20 Agosto del 2024

día soleado, se funde tira proyectada de 30x3,33x0,10 de 3,000 PSI, interventoria verifica q la mezcla se realice de acuerdo al diseño de mezclas, hoy no se sobreacarrea material, Se dispuso del Personal para fundir la placa.




a hoy tenemos $3 \times 30 \times 3,33 = 300\ m^2$




21 Agosto del 2024

hoy se dedica todo el dia al equipo para la Fundición de otra tira en concreto de 3.000 PSI de 30x333x0,10 la interventoria verifica la instalacion de la malla electrosoldada asi como q la mezcla se realice deacuerdo al diseño de mezcla.

a hoy se tiene fundido $4 \times 30 \times 3,33 = 400\ m^2$





22 Agosto del 2024


Se realiza el desformaleteo de la tira fundida anteriormente, se dispone de todo el personal y se termina de realizar el sobreacarreo del material petreo, previsto para la terminacion de la placa de polideportivo

[redacted]

23 Agosto del 2024

Hoy se realiza fundicion de una tira de Concreto de 3.000 PSI de 30x3,33x0,10 el interventor Verifica la instalacion de malla electrosoldada, así como la dosificacion del Concreto, ha hoy tenemos


5x30x3,33 = 500 m²



[redacted]

24 Agosto del 2024

Hoy se termina de realizar la fundicion de la ultima placa en concreto de 3000 PSI de 30x3,33x0,10, interventoria chequea la malla electrosoldada y la relacion con el diseño de mezcla hoy se concluye 6x30x3,33 = 600 m²



[redacted]

25 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de Actividades de obra del proyecto.

[redacted]

26 Agosto del 2024

Se realiza la suspension del Contrato de obra y de interventoria de acuerdo a las condiciones plasmadas en el acta de Justificacion y Suspension No. 02.

[redacted]

Z

Hernan Ruiz

07 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido

maria ximena V.

08 Agosto del 2024

Frente de Obra Suspendido.

maria ximena V.

09 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto.

maria ximena V.

10 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto

maria ximena V

11 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido

maria ximena V.

12 Agosto del 2024

Frente de Obra Suspendido

maria ximena V.

13 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido

maria ximena V.

14 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido.

maria ximena V.

15 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto

Hernán Ochoa V

10 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto

maria ximena V

11 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido

maria ximena V.

12 Agosto del 2024

Frente de Obra Suspendido

maria ximena V.

13 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido

maria ximena V.

14 Agosto del 2024

Frente de Obra suspendido.

maria ximena V.

15 Agosto del 2024

Se Presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto

Hernán Ochoa V

22 Agosto del 2024

Se presentaron precipitaciones fuerte lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

Hernán Ruiz

23 Agosto del 2024

Frente Suspendido temporalmente

Hernán Ruiz

24 Agosto del 2024

Frente de Obra Suspendido temporalmente

Hernán Ruiz

25 Agosto del 2024

Frente de obra suspendido temporalmente
Se realiza verificacion de la distancia de transporte de material petreo desde el proveedor hasta el resguardo con la interventoria

Hernán Ruiz

26 de agosto del 2024

Se realiza la suspensión del Contrato de Obra deacuerdo a las condiciones plasmadas en el acta de suspension No. 02.

Hernán Ruiz

CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO TIPOS UG Y ART

Fabricado por **CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.,** en la

Calle 52A No. 11 - 101, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Manufactured by **CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.,** in the

Calle 52A No. 11 - 101, Sogamoso, Boyacá, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2021)

Especificación de desempeño para cemento hidráulico

Performance specification for hydraulic cement

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0167-1
Certificate

Fecha de Aprobación: 2005-04-27
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2023-07-28
Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2029-07-28
Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2023-11-10
Restoration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento" Bogotá D.C., Colombia

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 28.06.2024
HORA: 20:29:04
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6097996 - ALAMBRON 5,5MM 1008 NTC 330 **REPORTE:** *89252
CLIENTE: MALLAS Y SUMINISTROS-BODEGA NEIVA **PLACA:** SRM254 **ORDEN DE ENTREGA:** 8091189058

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS				DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	%B	% V %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	Al (%) %	Es (%) %				
Mínimo:	0,00	0,30	0,000	0,000																
Máximo:	0,10	0,50	0,040	0,050																

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	%B	% V %	Rs(MPa) MPa	Fl (MPa) MPa	Al (%) %	Es (%) %				
E29254-24	14.365,00	0,06	0,38	0,014	0,028	0,11	0,299	0,114	0,111	0,024	0,000	0,0008	0,000	445,18	321,95	22,28	73,93				

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA Al (%) - ELONGACION (%) Es (%) - ESTRICCION (%)

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022
