CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No. 06

MENSUAL [X] FINAL [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

MUNICIPIO: LA ARGENTINA Y SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH374 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO INDERHUILA 2023

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	ENTIDAD	INDERHUILA
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	CMCIH374 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre 25 de octubre al 24 de noviembre 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INDERHUILA 2023	NIT:	901.768.748-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	C.C:	12.132.626

FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1	07 DE MAYO DE 2024
OTRO SI 1	07 DE MAYO DE 2024 – Modificación Vigencia Fiscal.
OTRO SI 2	05 DE JULIO DE 2024 PRORROGA 01 – 60 DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN 2	26 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE REINICIO 2	25 DE OCTUBRE DE 2024
OTRO SI 3	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRORROGA 02 – 20 DIAS
OTRO SI 4	22 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRORROGA 03 – 20 DIAS
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024.
VALOR TOTAL:	$ 13.191.312,00

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	CSAMCIH430 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVOS JC	NIT:	901.771.793-8

REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES FELIPE PAREDES SANABRIA	C.C:	1.075.260.938
FECHA SUSCRIPCIÓN:	10/11/2023		
FECHA DE INICIO:	29/11/2023		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
OTROSI No. 01 - Modificación Clausula 6	14/12/ 2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO 1	07/05/2024		
SUSPENSIÓN 2	26/08/2024		
REINICIO 2	25/10/2024		
OTROSI No. 02	07/05/2024 - Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal		
OTROSI No. 03	05/07/2024 - Modificación Cláusula 4 Prorroga de dos (02) meses.		
OTROSI No. 04	01/11/2024 - Modificación Cláusula 4 Prorroga de veinte (20) días.		
OTROSI No. 05	22/11/2024 - Modificación Cláusula 4 Prorroga de veinte (20) días.		
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL 2024.		
VALOR INICIAL:	$215.045.630		
VALOR TOTAL:	$215.045.630		

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El Consorcio Escenarios Deportivos JC construirá, de acuerdo con el contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA", obras localizadas en los municipios de:

NO.	MUNICIPIO	SITIO	DIRECCIÓN
1	LA ARGENTINA	RESGUARDO INDÍGENA	NAM MISAK
2	SAN AGUSTÍN	RESGUARDO INDÍGENA	FIL VITS

1. MUNICIPIO LA ARGENTINA CABILDO INDÍGENA NAM MISAK.


El proyecto "Construcción de placa para polideportivos del Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak" se encuentra ubicado en el municipio de La Argentina, departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se debe partir desde el parque principal y tomar la vía hacia el centro poblado gallego del municipio de La Plata. Desde allí, se toma la intersección hacia el centro poblado Belén y se continúa por la vía registrada como La Plata-Popayán, hasta el kilómetro

15. Finalmente, se toma la vía de cruce o intersección hacia el resguardo de Nam Misak.

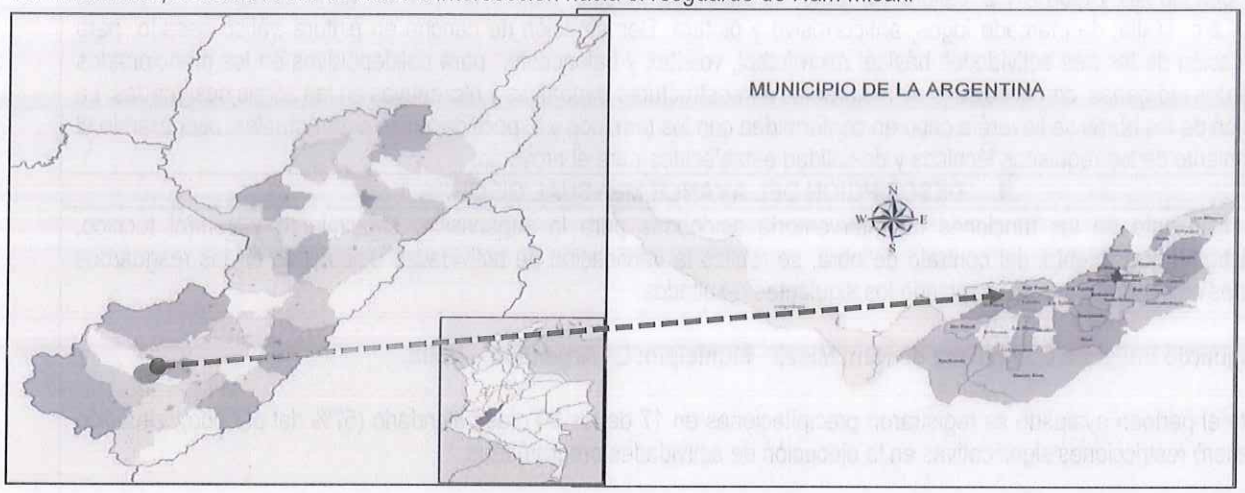

1. MUNICIPIO SAN AGUSTÍN RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS.

El proyecto "Construcción de placa para polideportivos del Resguardo Indígena Fiil Vits – La Perdiz" se encuentra ubicado en el municipio de San Agustín, departamento del Huila. Para acceder al área del proyecto, se debe partir desde el parque principal y tomar la vía hacia el parque arqueológico. Luego, se toma la intersección hacia la vereda La Perdiz, llegando al sitio de ejecución de la obra.

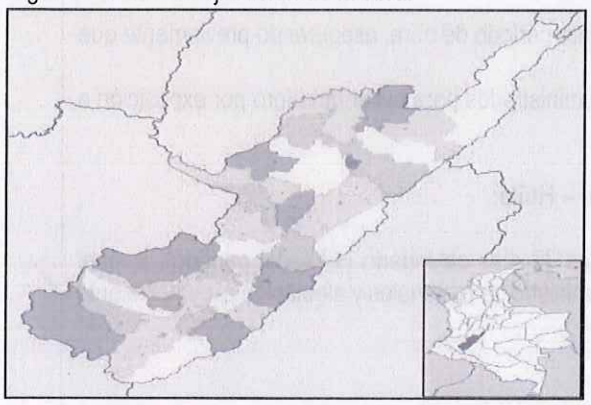



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Consorcio Escenarios Deportivos JC llevará a cabo la construcción, conforme al contrato titulado "CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA POLIDEPORTIVOS EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Este contrato abarca la ejecución de obras en los municipios de La Argentina y San Agustín, ubicados en el departamento del Huila. El alcance del proyecto incluye la construcción de placas de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm, con la instalación de cancha multifuncional en tubo de

3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro. Malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura, Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto. para polideportivos en los mencionados resguardos indígenas, con el objetivo de mejorar las infraestructuras deportivas y recreativas en las zonas designadas. La ejecución de las obras se llevará a cabo en conformidad con los términos y especificaciones contractuales, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad establecidos para el proyecto.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En cumplimiento de las funciones de interventoría asignadas para la supervisión, seguimiento y control técnico, administrativo y ambiental del contrato de obra, se realizó la verificación de actividades ejecutadas en los resguardos indígenas objeto del proyecto, arrojando los siguientes resultados:

1. Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak - Municipio: La Argentina – Huila:

Durante el período evaluado se registraron precipitaciones en 17 de los 30 días calendario (57% del período), situación que generó restricciones significativas en la ejecución de actividades programadas.

Actividades verificadas:

Se constató el suministro de los elementos para el par de canchas multifuncionales, incluyendo tableros, aros y mallas en nylon.
No fue posible la demarcación de la cancha debido a que las condiciones de humedad del terreno no cumplen con los parámetros adecuados para garantizar la correcta adherencia y durabilidad de la pintura.

Observaciones de interventoría:
Se recomienda reprogramar la actividad de demarcación para el siguiente período de obra, asegurando previamente que el sustrato presente la humedad superficial adecuada.
Se solicita mantener el control de almacenamiento de los elementos suministrados para evitar deterioro por exposición a la intemperie.

2. Resguardo Indígena Fil Vits – La Perdiz - Municipio: San Agustín – Huila:

Durante el mismo período se presentaron precipitaciones en 14 de los 30 días calendario (47% del período), lo que, sumado a la limitada accesibilidad a la zona, ocasionó retrasos en el suministro de materiales y afectación al cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

Actividades verificadas:
Se constató la nivelación del terreno con el fin de dejar los niveles a cero y permitir la fundición de la placa de concreto.
Se verificó la ejecución de la fundición de la placa de polideportivo en concreto de resistencia 3.000 PSI, con dimensiones de 30x20x0,10 m, incluyendo la instalación de malla electrosoldada 2,35 x 6 m (15x15x4 mm).

Observaciones de interventoría:

La actividad fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.
Se recomienda realizar seguimiento especial al curado del concreto debido a la alta pluviosidad del sector.
Se sugiere reforzar la logística de transporte de materiales para mitigar el impacto de las condiciones climáticas en el cronograma de obra.

5. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO.	
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	**Cumplimiento Contractual** Verificación de Cláusulas y Condiciones: La interventoría se aseguró de que el contratista cumpliera con todas las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato. Esto incluyó: Control de Calidad de Materiales: Verificación de que los materiales utilizados cumplieran con los estándares y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Normativas de Seguridad: Aseguramiento de que el contratista cumpliera con todas las normativas de seguridad aplicables. **Suscripción de Documentos Contractuales** Actas y Documentos Relevantes: Se suscribieron y gestionaron diversos documentos importantes relacionados con el contrato, incluyendo: **Acta de justificación N° 5** para reinicio de obra. **Acta de reinicio N° 2.** Cambio de residente de obra, resguardo indígena fill vits municipio de la argentina, la modificación se realiza por la Arquitecta María Ximena Vargas Gutiérrez por el Ingeniero Fabian Camilo Falla Naranjo **Acta de justificaciones** para la ampliación del plazo del contrato de obra e interventoría. **Otrosis:** se suscriben Otrosis para prorroga al contrato de obra y de interventoría.
CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	La interventoría ha llevado a cabo inspecciones regulares en el campo para evaluar el progreso de la obra, resguardo indígena de La Argentina y resguardo indígena de san Agustín. conforme a los planos y especificaciones técnicas. Registro de Avances: Documentación detallada del avance de las obras, incluyendo observaciones sobre cualquier desviación o ajuste necesario. **Control de Calidad** Supervisión de Mano de Obra y Materiales: La interventoría supervisó la calidad de los materiales utilizados en la construcción de las placas de los polideportivos. Se aseguraron los siguientes aspectos: Inspección de Materiales: Verificación de que los materiales utilizados cumplieran con los estándares de calidad establecidos para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las placas. **Verificación y Aprobación de la Localización de los Trabajos** Confirmación de Localización: Se verificó y aprobó la localización de los trabajos para garantizar que se ajustara a las especificaciones del contrato. Esto incluyó: Inspección de Sitio: Revisión del sitio de trabajo para asegurar que la ubicación de las actividades de construcción fuera correcta y adecuada según los planos. **Verificación de Cantidades de Obra** Revisión de Documentos: Se ha realizado una verificación exhaustiva de las cantidades de obra especificadas en el contrato en comparación con las cantidades realmente ejecutadas. Esta revisión garantiza que las cantidades de trabajo realizadas se alineen con las estipuladas en el contrato y en las especificaciones técnicas, facilitando una evaluación precisa del progreso del proyecto y la conformidad con los términos acordados. Es importante destacar que, a la fecha, únicamente se han completado las actividades preliminares en el resguardo indígena del municipio de San Agustín, mientras que en el resguardo indígena del municipio de La Argentina se ha continuado con la ejecución de las demás actividades contractuales.

	Control de Actividades Programadas y Recomendaciones Monitoreo de Actividades: Seguimiento de las actividades programadas para identificar cualquier desviación o retraso. Recomendaciones de Ajustes: Recomendación de ajustes necesarios para mantener el proyecto en línea con el cronograma y los objetivos establecidos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	La interventoría realizó el control y seguimiento a los ensayos de laboratorio derivados de la construcción de la placa en concreto de 3.000 PSI, con espesor de 0,10 m, en el resguardo indígena de Fil Vits. Se verificó la correcta toma de muestras de concreto fresco en sitio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la norma NTC 550 y las especificaciones técnicas del proyecto. Los cilindros fueron elaborados, curados en obra y transportados oportunamente al laboratorio para la ejecución de los ensayos de resistencia a la compresión a las edades establecidas (3,7, 14 y 28 días). **La interventoría realizó:** Inspección visual durante el proceso de toma de muestras, garantizando la adecuada compactación y etiquetado de los cilindros. Registro en bitácora de la fecha y hora de vaciado, ubicación de la placa, número de muestras tomadas y responsable de la actividad. Verificación del transporte de los cilindros al laboratorio, asegurando condiciones adecuadas para evitar alteraciones en los especímenes. Seguimiento al cronograma de roturas, solicitando al laboratorio la entrega oportuna de resultados para su análisis. Los resultados de resistencia obtenidos serán comparados con la resistencia de diseño (3.000 PSI), para verificar el cumplimiento de las especificaciones. La interventoría se asegurará de que cualquier desviación o no conformidad sea reportada de inmediato y se tomen las acciones correctivas pertinentes.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	La interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero al manejo del anticipo contractual, verificando que su ejecución se desarrolla conforme al plan de inversión aprobado. Los recursos han sido destinados principalmente a la logística de transporte de materiales pétreos hacia los sitios de intervención en los resguardos indígenas, incluyendo acarreos, contratación de mano de obra local y aprovisionamiento inicial de insumos. En ese sentido, se concluye que el anticipo está siendo ejecutado de manera adecuada, alineado con los objetivos del contrato y las obligaciones establecidas en la cláusula sexta.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	La interventoría realizó el seguimiento al personal vinculado por el Consorcio Escenarios Deportivos JC, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la conformación del equipo operativo. Se constató la participación activa de mano de obra no calificada proveniente de la región, en concordancia con lo exigido en el contrato respecto al uso de personal local. Así mismo, se evidenció que las actividades desarrolladas durante este periodo contaron con el personal requerido para ejecutar el transporte y manejo logístico de materiales, como la construcción de la placa de concreto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se realizo control y seguimiento de los equipos en obra esto para garantizar la productividad, seguridad y cumplimiento de los cronogramas del proyecto. Desde el rol de esta interventoría, se implementar herramientas y protocolos de supervisión que aseguren el estado óptimo de los

	equipos y su correcta utilización. La integración de tecnología en este proceso mejora la trazabilidad y el desempeño, contribuyendo a la eficiencia general del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se llevo a cabo control y seguimiento de los materiales es una actividad esencial para garantiza la calidad, optimización de recursos y cumplimiento de plazos en el desarrollo de una obra. Esta interventoría implemento procedimientos de control, inspección y trazabilidad que aseguren que los materiales se gestionen de manera eficiente y cumplan con los estándares del proyecto.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Se realizo control y seguimiento de los aportes a la Seguridad Social Integral del proyecto de obra garantizando el cumplimiento de las normativas legales y proteger los derechos de los trabajadores. Este proceso tiene como objetivo verificar que los aportes correspondientes se realicen de manera oportuna, completa y conforme a la legislación vigente.
SEGUIMIENTO A POLIZAS DE GARANTIAS	Se realizo el seguimiento a las pólizas de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, proteger los intereses del proyecto y garantizar la correcta ejecución de las obras, este control implico la supervisión del cumplimiento de las condiciones estipuladas en las pólizas, asegurando su validez y cobertura en todo momento. Esta interventoría se aseguró que las pólizas cumplan con los requisitos contractuales, legales y técnicos, y que estén siempre vigentes. Esto no solo fortalece la gestión del proyecto, sino que también garantiza la seguridad de las partes involucradas.
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS.	Se ha establecido y mantenido una bitácora de obra junto con el contratista. En este documento se registran diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas durante la ejecución de los trabajos. La bitácora proporciona un registro detallado y continuo de la evolución del proyecto y facilita la supervisión y el control de la obra. mediciones de obra. Se han efectuado mediciones precisas de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista, conforme a las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo los planos de referencia. Estas mediciones aseguran que los trabajos se puedan realicen de acuerdo con los requisitos contractuales y técnicos, y permiten una evaluación precisa del progreso y la calidad de la ejecución.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL.	Gestión de residuos: La interventoría ha supervisado la correcta gestión de los residuos generados durante la construcción de las placas para los polideportivos. Hasta la fecha.
ACTIVIDADES FINANCIERAS.	El interventor ha llevado a cabo un control exhaustivo sobre el aspecto administrativo y financiero del contrato. Este control incluye la supervisión y verificación de la correcta aplicación y gestión de los recursos financieros destinados al proyecto. Se ha asegurado que todos los procesos administrativos relacionados con la gestión financiera, como la aprobación de pagos, la justificación de gastos y la adecuación de los fondos, se realicen conforme a los términos contractuales y las normativas vigentes. Se ha efectuado un control detallado de la inversión realizada en el marco del contrato. Este control ha implicado la revisión de los informes financieros y de inversión para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y conforme a lo estipulado en el contrato. Se ha evaluado la correcta asignación y utilización de los fondos, asegurando que las inversiones realizadas cumplan con los objetivos del proyecto y los requisitos contractuales establecidos. Adicional se realizo respectivo balance del proyecto, determinando y conociendo el alcance final del proyecto.
ACTIVIDADES JURÍDICOS.	El interventor ha llevado a cabo una revisión exhaustiva para asegurar que todas las partes involucradas en el contrato cumplan con las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el acuerdo. Esta verificación incluyó la evaluación del cumplimiento de los términos legales y

	contractuales, con el objetivo de prevenir posibles conflictos o incumplimientos. Se ha comprobado que los requisitos contractuales están siendo atendidos de manera adecuada y que se están siguiendo los procedimientos establecidos. Se ha confirmado que las pólizas asociadas al contrato se encuentran vigentes y en plena vigencia. Esta revisión asegura que las garantías y seguros requeridos por el contrato están en efecto, protegiendo a las partes involucradas contra riesgos y contingencias previstas en el acuerdo. Se ha verificado que las pólizas cumplen con los términos contractuales y que no existen lapsos en la cobertura que puedan afectar la ejecución del proyecto.
RELACION DE ACTAS REALIZADAS	**CMCIH 374 DE 2023** **Objeto:** "Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato cuyo objeto es "Construcción placa polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de la Argentina y el resguardo indígena Fiil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila".

ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION 1	1	28 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO 1	1	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	2	07 de mayo 2024
OTRO SI N° 1	1	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	05 de julio de 2024
OTROSI 2 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	2	05 de julio de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION 4	4	26 de agosto del 2024
ACTA DE SUSPENSION 2	2	26 de agosto del 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN 5	5	25 de octubre de 2024
ACTA DE REINICIO 2	2	25 de octubre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN 6	6	01 de noviembre de 2024
OTRO SI MODIFICATORIO 3	3	01 de noviembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN 07	7	22 de noviembre de 2024
OTRO SI MODIFICATORIO 4	4	22 de noviembre de 2024

CSAMCIH 430 DE 2023

Objeto: "Construcción Placa para polideportivos en el resguardo indígena guambiana de Nam Misak en el Municipio de la Argentina y el Resguardo Indígena Fil Vits la perdiz en el Municipio de San Agustín Departamento del Huila"

ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK – MUNICIPIO LA ARGENTINA - HUILA	1	30 de noviembre de 2023

ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ -MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	1	1 de diciembre de 2023
ACTA DE MODIFICACION ANTICIPO No 1	1	12 de diciembre de 2023
OTRO SI – Modificación Clausula 6	1	14 de diciembre de 2023
ACTA PARCIAL	1	19 de diciembre 2023
ACTA JUSTIFICACION	1	28 de diciembre 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	28 de diciembre 2023
ACTA JUSTIFICACION	2	07 de mayo 2024
ACTA DE REINICIO	1	07 de mayo 2024
OTROSI 2 – Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal	2	07 de mayo 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	3	05 de julio de 2024
OTROSI 3 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	3	05 de julio de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	4	26 de agosto del 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02	2	26 de agosto del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	5	25 de octubre del 2024
ACTA DE REINICIO No.02	2	25 de octubre del 2024
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	1	29 de octubre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	6	01 de noviembre del 2024
OTROSI 4 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	4	01 de noviembre del 2024
ACTA DE JUSTIFICACION	7	22 de noviembre del 2024
OTROSI 5 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	5	22 de noviembre del 2024

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

La situación actual del proyecto se ve afectada significativamente por las condiciones climáticas adversas. Las intensas lluvias y el mal estado de las vías de acceso han impactado negativamente en el avance de la obra.

La situación climática actual sigue siendo un factor crítico, con lluvias constantes que continúan afectando la ejecución y el transporte de materiales, lo que ha llevado a la solicitud de una prórroga para ajustar los plazos del proyecto. La interventoría sigue supervisando de cerca el progreso y la gestión del proyecto para asegurar que se cumplan los términos acordados y se minimicen los impactos negativos del clima.

Durante el periodo comprendido desde el 25 de octubre al 24 de noviembre del 2024 se evidencio el siguiente estado del clima:

- **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN LA ARGENTINA																														
MES	OCTUBRE							NOVIEMBRE																						
FECHA	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DIAS	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D

LLUVIAS		X		X	X				X	X	X					X	X		X			X	X	X	X	X	X		X		X

Con relación a la tabla anterior se puede observar que, de los 30 días de ejecución, se han presentado precipitaciones en la zona 17 días, siendo esto el 47% de los días de ejecución.

- **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTIN																														
MES	OCTUBRE							NOVIEMBRE																						
FECHA	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DIAS	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
LLUVIAS	X	X	X					X	X			X	X	X				X	X	X		X			X			X			

Con relación a la tabla anterior se puede observar que, de los 30 días de ejecución, se han presentado precipitaciones en la zona 14 días, siendo esto el 47% de los días de ejecución.

7. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	MODIFICACION No. 01 CANT	MODIFICACION No. 01 VR/UNIT	MODIFICACION No. 01 VR/TOTAL	EJECUTADO CANTIDADES CANTIDAD	EJECUTADO CANTIDADES VALOR	EJECUTADO CANTIDADES PORCENTAJE	ACUMULADO CANTIDADES CANTIDAD	ACUMULADO CANTIDADES PORCENTAJE
CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA													
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES			PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5084%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 26.558,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00			$ 2.157.600,00		$ 0,00			2,5084%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA			MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7287%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8218%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,5505%
3	ACABADOS					ACABADOS			ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 3.793.495,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%

	demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.												
NP 3,3	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo de 2", segun diseño Incluye tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,2mts demarcado con logos de la administracion, Aro de baloncesto en hierro, mallas, angulo para soporte de tablero, dados en concreto, anticorrosivo y pintura.	UND	0,00	$ 2.835.215,00	$ 0,00	2,00	$ 2.835.215,00	$ 5.670.430,00	2,00	$ 5.670.430,00	6,5921%	2,00	6,5923%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00			$ 10.422.830,00		$ 5.670.430,00			6,5923%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO			PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	59,7333%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00			$ 51.379.800,00		$ 0,00			59,7333%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE			TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	3.164,00	$ 1.112,00	$ 3.518.368,00	2429,27	$ 2.701.348,00	3,1404%	3164,00	4,0904%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00			$ 3.518.368,00		$ 2.701.348,00			4,0904%
		Costo Directo - Nam Misak			$ 86.018.252,00			$ 86.015.358,00		$ 8.371.778,00	9,733%		94,4749%

CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACION No. 01			EJECUTADO			ACUMULADO	
									CANTIDADES			CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE

1	PRELIMINARES					PRELIMINARES			PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5159%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 26.558,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00			$ 2.157.600,00		$ 0,00			2,516%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA			MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7578%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8571%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,615%
3	ACABADOS								ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 3.793.495,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
NP 3,3	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo de 2", segun diseño Incluye tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,2mts demarcado con logos de la administracion, Aro de	UND	0,00	$ 2.835.215,00	$ 0,00	2,00	$ 2.835.215,00	$ 5.670.430,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%

	baloncesto en hierro, mallas, angulo para soporte de tablero, dados en concreto, anticorrosivo y pintura.												
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00			$ 10.422.830,00		$ 0,00			0,0000%
4	PLACA DE CONTRAPISO									PLACA DE CONTRAPISO			
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	600,00	$ 51.379.800,00	59,9115%	600,00	59,9115%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00			$ 51.379.800,00		$ 51.379.800,00			59,912%
6	TRANSPORTE									TRANSPORTE			
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	2.933,93	$ 1.112,00	$ 3.262.530,00	2.933,93	$3.262.530,00	3,8043%	2933,93	3,8043%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00			$ 3.262.530,00		$ 3.262.530,00			$ 0,00
		Costo Directo - Fil Vits			$ 86.018.252,00			$ 85.759.520,00		$ 54.642.330,00	63,716%		87,847%
		Costo Directo - Proyecto			$ 172.036.504,00			$ 171.774.878,00		$ 63.014.108,00			91,161%

8. CONTROL DE ANTICIPO - INTERVENTORIA				
N/A				
8.1. CONTROL DE ANTICIPO - OBRA				
RELACIÓN DE PAGO (ANTICIPO Y/O ACTA DE OBRA EJECUTADA)	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
VALOR ANTICIPO (25%)	09/05/2023	$ 53.761.407,50	$ 0	$ 53.761.407,50
ACTA PARCIAL NO. 1	09/05/2023	$ 51.735.900,00	$12.933.975,00	$ 38.801.925,00
VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 215.045.630,00	$0,00	$215.045.630,00	$51.735.900,00	$163.309.730,00

9. RELACION DE PERSONAL - INTERVENTORÍA	
NOMBRE YAPELLIDOS	CARGO
Juan Manuel Medina Barreto	Director de Interventoría

9.1. RELACION DE PERSONAL - OBRA	
PROFESIONAL	CARGO
Hernán Darío Rivera Flores	Director De Obra
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Nam Misak.
Fabian Camilo Falla Naranjo	Residente de obra – Fil Vits.
María Ximena Vargas Gutiérrez	Residente de obra – Fil Vits.
María Katalina Silva Manrique	Especialista en gerencia de proyectos.
Mario Andrés Ortiz	Maestro de Obra
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	Ayudante de Obra
Daniela Constanza Guiza Ottavo	Ayudante de Obra
Daniel Eduardo Hernández Pita	Ayudante de Obra

10. RELACIÓN DE PAGOS		
TIPO DE PAGO (ANTICIPO / ACTA NO.)	NO. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000387	09/05/2024
ACTA PARCIAL 1	2024000388	09/05/2024

. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

INTERVENTORIA						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
OCTUBRE						
Juan Manuel Medina Barreto	$263.600	$206.000	$40.200	$	$	8638469733
Carlos Andres Gorrón Avendaño	$288,000	$225,000	$9,400	$0,00	$0,00	9474228923
NOVIEMBRE						
Juan Manuel Medina Barreto	$208.000	$162.500	$13.600	$	$	8633609380
Carlos Andres Gorrón Avendaño	$288,000	$225,000	$9,400	$0,00	$0,00	9477394893

OBRA						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
OCTUBRE						
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	9476749220
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162.500	$90.500	$0	$0	9475831654

María Ximena Vargas Gutiérrez	$20,800	$5,200	$700	$5,200	$0	9484928385
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	31037689
Mario Andres Ortiz Villareal	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	$0	9477079687
Daniela Constanza Guiza Ottavo	$34.700	$8.700	$1.200	$8.700	$0	9478533193
Daniel Eduardo Hernández Pita	$34.700	$8.700	$1.200	$8.700	$0	9478533193
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31676354
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31676354
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	$0	9477079687
NOVIEMBRE						
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	9478020989
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162.500	$90.500	$0	$0	9477310123
Fabian Camilo Falla Naranjo	$224.000	$175.000	$7.400	$0	$0	31611133
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	31375108
Mario Andres Ortiz Villareal	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	$0	9478297189
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31841694
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	31841694
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208.000	$52.000	$6.800	$52.000	$0	9478297189

12. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA SEGÚN REINICIO NO. 2:

ASEGUADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE	DESDE
Aseguradora Solidaria	560-47-994000171378	ANEXO 4	30/10/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	20/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	20/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACTUALIZADA SEGÚN REINICIO No. 02:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031449	ANEXO 4	30/10/2024	10/09/2024	10/11/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA SEGÚN OTROSI No. 04:

ASEGUADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE	DESDE
Aseguradora Solidaria	560-47-9940001713 78	ANEXO 5	07/11/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	09/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	09/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACTUALIZADA SEGÚN OTROSI No. 04:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031449	ANEXO 5	07/11/2024	10/11/2024	30/11/2024

INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO SEGÚN REINICIO 2:

ASEGUADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009625	ANEXO 5	08/11/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	15/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	15/11/2027
				Calidad del servicio	29/02/2024	12/07/2029

RC SEGÚN SEGÚN REINICIO 2:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001938	ANEXO 5	08/11/2024	30/11/2024	22/12/2024

CUMPLIMIENTO SEGÚN OTROSI No. 03:

	No	ENDOZO	FECHA	AMPARO	VIGENCIA

ASEGUADORA			DE EMISIÓN		DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009625	ANEXO 6	08/11/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	05/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	05/12/2027
				Calidad del servicio	29/02/2024	12/07/2029

RC SEGÚN OTROSI No. 03:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001938	ANEXO 6	13/11/2024	29/11/2023	12/09/2024

CORRECCION SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO N° 3

ASEGUADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009625	ANEXO 7	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	25/12/2027
				Calidad del servicio	29/02/2024	12/07/2029

CORRECCION RC SEGÚN OTROSI No. 03:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001938	ANEXO 7	15/11/2024	29/11/2023	12/11/2024


CORRECCION RC SEGÚN OTROSI No. 03:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	
				DESDE	DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001938	ANEXO 8	19/11/2024	29/11/2023	03/12/2024

13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

13.1. RESGUARDO INDIGENA FIL VITS:


ESQUEMA

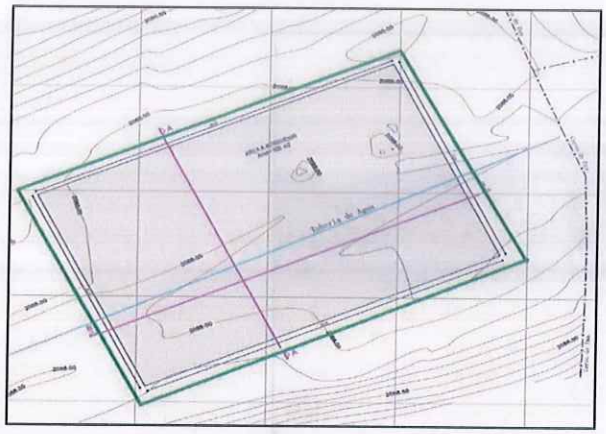

FOTOGRAFIA



Construcción Placa de concreto.

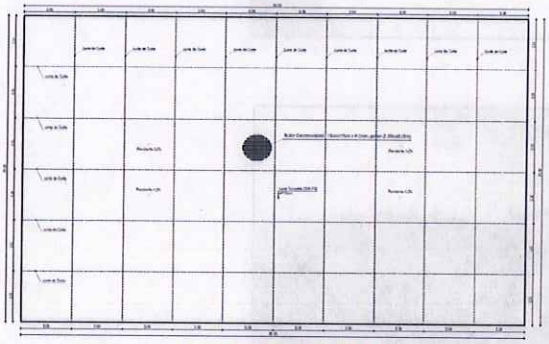

PLANTA JUNTAS DE CORTE PLACA



Construcción Placa de concreto.



Construcción Placa de concreto.

13.2. RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK:





14. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

- Las condiciones climáticas adversas, especialmente las intensas lluvias, han tenido un impacto significativo en el progreso del proyecto. Estas condiciones han retrasado la señalización de la placa para la argentina y la construcción de la placa en San Agustín.


- Sin embargo, las condiciones climáticas adversas siguen afectando el progreso general del proyecto, especialmente en San Agustín. Estos problemas han contribuido a retrasos en el inicio y la ejecución de las actividades contractuales en dicho municipio, pero pese a la situación se a avanzado en las actividades contractuales.

- En términos de suministro de materiales, el contratista ha realizado entregas totales en el municipio de San Agustín y La Argentina. Este hecho indica un avance significativo en el suministro de materiales y ejecución de obra necesarios para el proyecto.

15. ANEXOS

- MEMORIAS DE CALCULO.
- CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- BITACORA DE OBRA.
- APROBACION DEL PERSONAL – F12.
- APROBACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

Ing. Juan Manuel Medina Barreto	26 – Diciembre – 2024	Ing. Natalia Bustos Botero
FIRMA INTERVENTOR	**FECHA DE ENTREGA**	**Vo.Bo. APOYO A LA SUPERVISION**

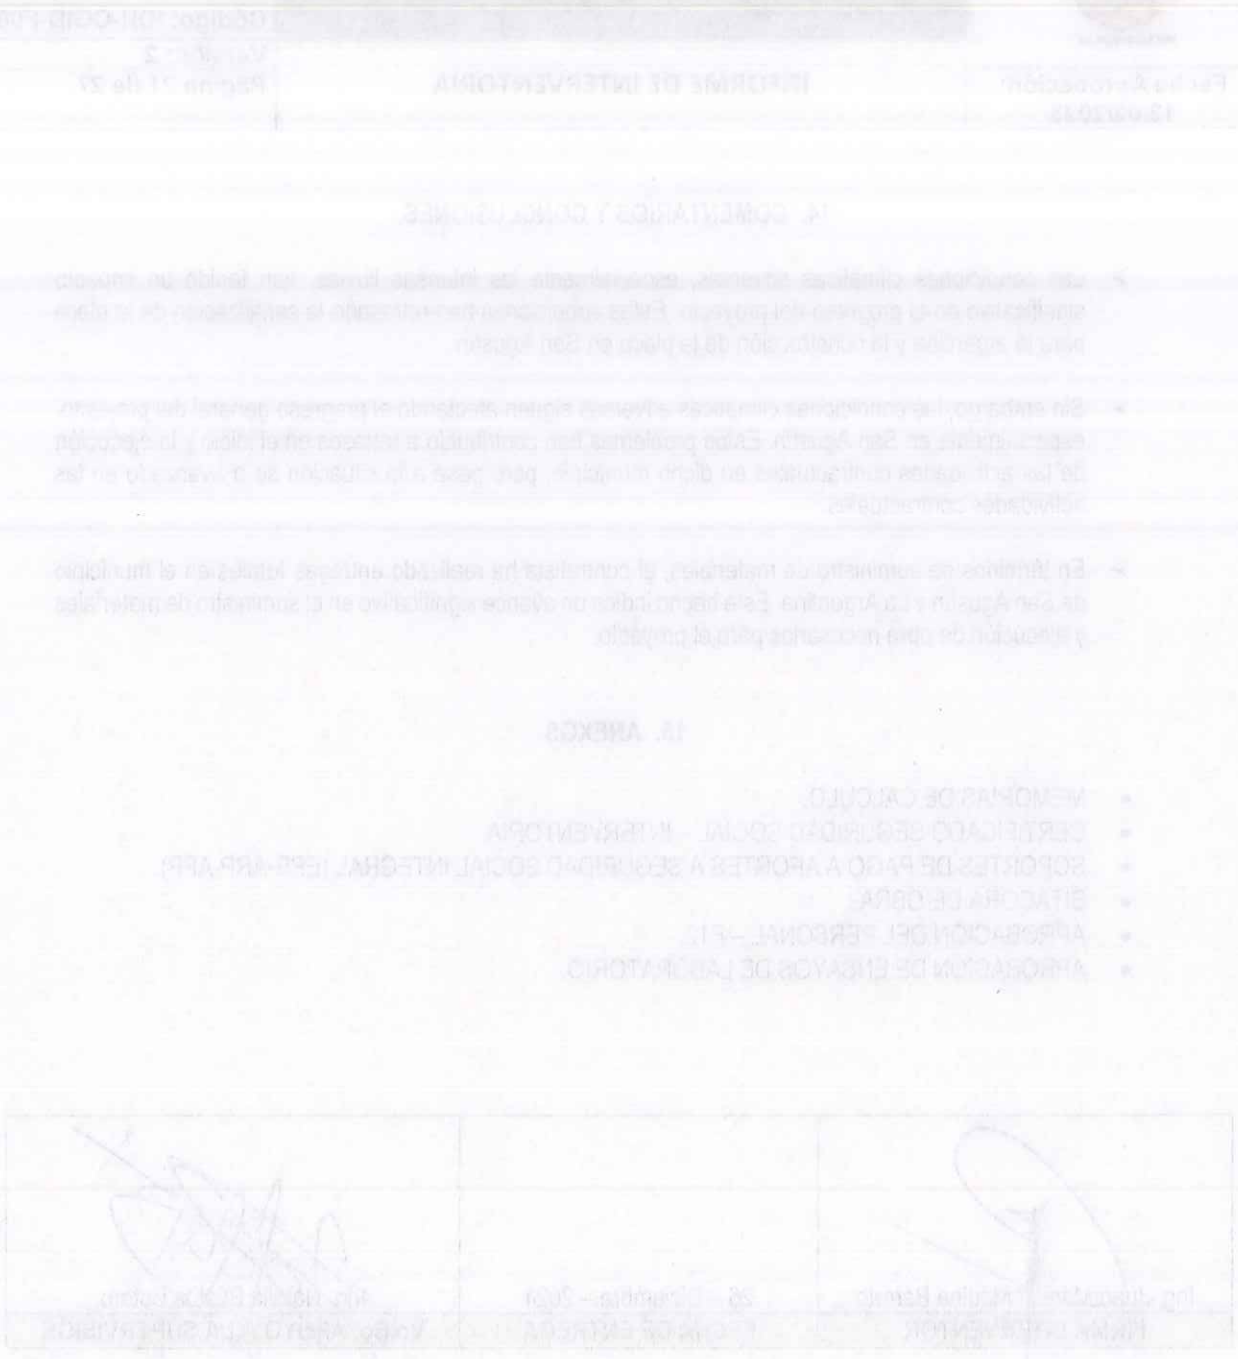

MEMORIAS DE CALCULO.

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Código	DIH-CGID-F95
				Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			Fecha de Aprobación:	12/09/2023
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023	
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA		PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		Desde:	25/10/2024	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023		Hasta:	24/11/2024	
CAPÍTULO:	3	ACABADOS			
ITEM:	NP 3,3	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo de 2", segun diseño Incluye tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,2mts demarcado con logos de la administracion, Aro de baloncesto en hierro, mallas, angulo para soporte de tablero, dados en concreto, anticorrosivo y pintura.	UNIDAD:	UND	

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Cancha Multifuncional				2,00	2,00
TOTAL					2,00

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F05
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	25/10/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	24/11/2024
CAPÍTULO:	5 TRANSPORTE	UNIDAD:	M3-KM
ITEM:	5,1 Transporte de materiales petreos		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	VOL MATERIALES	CANTIDAD EN M3		DISTANCIA	Medida Total
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0,57M3 ARENA - 0,84M3 GRAVA)	1,41	46,07		37,40	2.429,27
TOTAL					2.429,27

ESQUEMAS:




Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

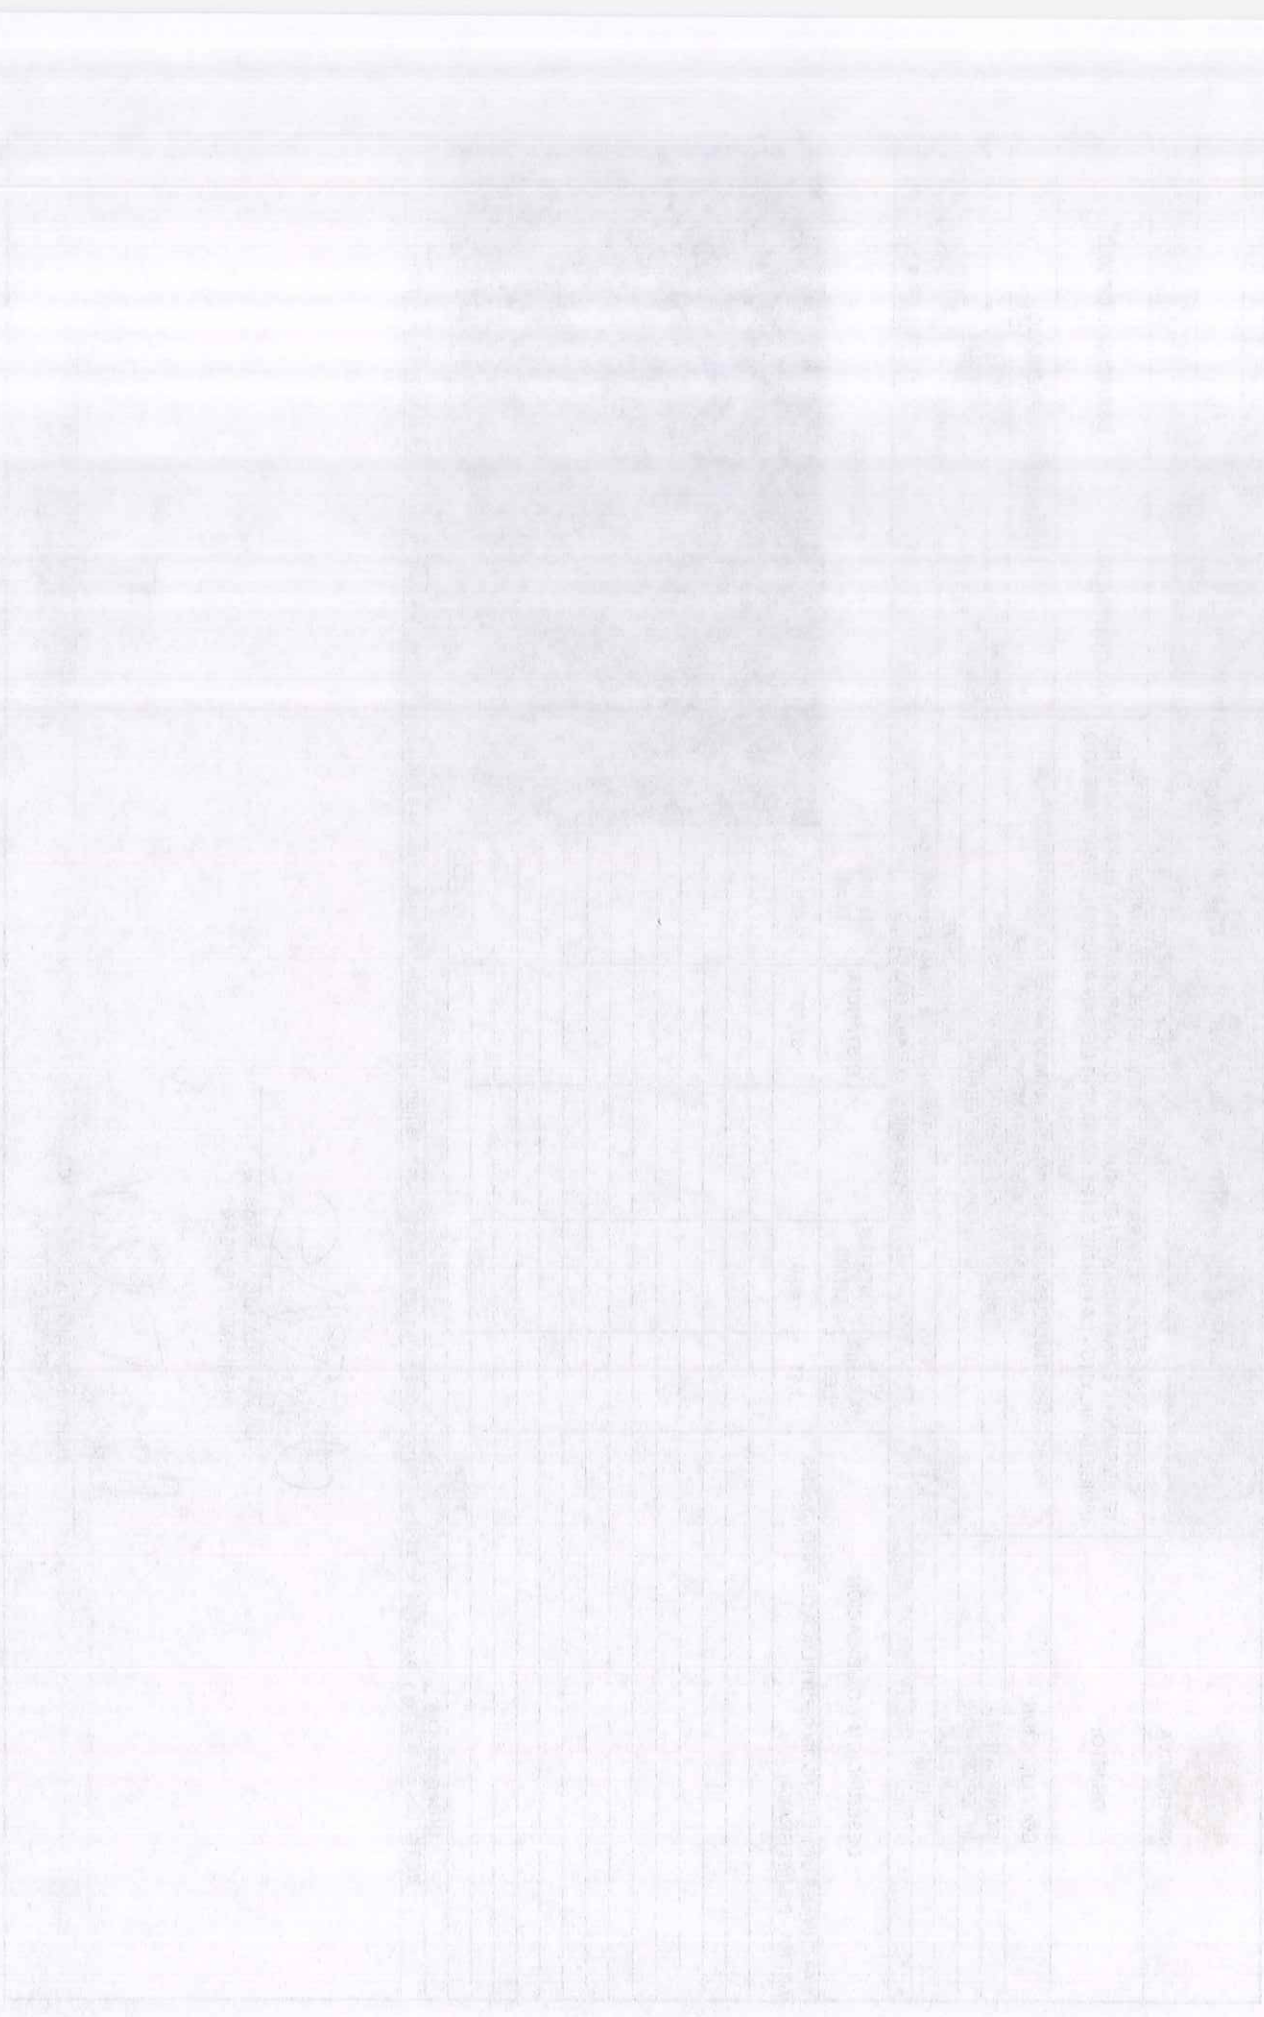

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Codigo	DIH-CGID-F95
				Ve sión:	1
				Fecha de Aprobación:	
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			12/09/2023	
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA		No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023	
LOCALIZACION:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA		PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC		Desde:	25/10/2024	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023		Hasta:	24/11/2024	
CAPÍTULO:	4	PLACA DE CONTRAPISO	UNIDAD:	m2	
ITEM:	4,01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm			

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DE PISO	30,00	20,00		1,00	600,00
TOTAL					600,00

ESQUEMAS:



FABIAN CAMILO FALLA NARANJO
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023
LOCALIZACION:	CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	25/10/2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	24/11/2024
CAPÍTULO:	5	TRANSPORTE	
ITEM:	5,1	Transporte de materiales petreos	UNIDAD: M3-KM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	VOL MATERIALES	CANTIDAD EN M3	ALTURA (Y/O) ESPESOR prom. (m)	DISTANCIA	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0,57M3 ARENA - 0,84M3 GRAVA)	1,41	60,00		34,68	2.933,93	 
TOTAL					2.933,93	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

FABIAN CAMILO FALLA NARANJO
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL – INTERVENTORIA.

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH430 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de acuerdo con la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada, verificada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico los pagos de las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido entre el 25 de octubre del 2024 al 24 de noviembre del 2024.*

Para constancia se firma a los (26) días del mes de diciembre de 2024.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	8638469733	I	2025-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	509.800	92.100	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-11-08	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	1.350.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.350.000	216.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.350.000	168.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.350.000	32.900	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	417.700	N	1702001

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	2	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA NO 11 02		8716734			JUANMANUELMEDINABARRETO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	8638469733	I	2025-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	509.800	92.100	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8657553974	2024-11-08	Sin pagar							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	216.000	0	47.600	0	263.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	216.000	0	47.600	0	263.600
EPS(Administradoras: 1)				1	168.800	0	37.200	0	206.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	168.800	0	37.200	0	206.000
ARP(Administradoras: 1)				1	32.900	0	7.300	0	40.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	32.900	0	7.300	0	40.200
Gran Total					417.700	0	92.100	0	509.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12132626
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-06
FECHA DE PAGO:	2024-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NUMERO PLANILLA:	8633609380
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633609380
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	830602790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2025

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA N11 02		8716734			MEDINABARRETOJUANMANUEL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	8633609380	I	2024-11-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	384.100	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633609380	2024-12-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	1.300.000		X															0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	384.100	N	2813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12132626	0	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	AV LA TOMA N11 02		8716734			MEDINABARRETOJUANMANUEL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	8633609380	I	2024-11-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	384.100	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633609380	2024-12-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	13.600	0	0	0	13.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	13.600	0	0	0	13.600
Gran Total					384.100	0	0	0	384.100

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12132026
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-01-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8634510937
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8671937202
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 162.500	$ 163.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 208.300	$ 209.300
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 384.100	$ 386.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/02/2025

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	1072935628	9474226923	I	2024/11/18	2024/11/25	BANCOLOMBIA	7	$525,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1075276063	GORRON CARLOS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2024/11/24 07:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1072935628	9474228923	I	2024/11/18	2024/11/25	BANCOLOMBIA	7	$525,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$1,500	$0	$289,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$1,500	$0	$289,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$1,200	$0	$226,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$1,200	$0	$226,200
TOTAL				1	$522,400	$2,800	$0	$525,200

2024/11/24 07:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1092587668	947739893	I	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0		$522,400

2024/12/02 09:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18a No 35 - 95 APTO 202	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1092587668	9477394893	I	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

2024/12/02 09:20 AM

BITACORA DE OBRA.

25 de octubre del 2024

Se firma el acta de Reinicio del proyecto de obra como el de inventoria luego de superado los inconvenientes que generaron el acta de Suspension #2, se hacen labores administrativas de seguridad y logistica de materiales

[redacted] Hernán Rivas

26 de octubre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

[redacted] Hernán Rivas

27 de octubre del 2024

debido a la humedad que presenta el terreno no se logra acceder el material faltante para terminar

[redacted] Hernán Rivas

28 de octubre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

[redacted] Hernán Rivas

29 de octubre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto

[redacted] Hernán Rivas

30 de octubre del 2024

La vía se presenta colmatada y no es posible acceder carro con material de las canchas y el material de la demarcacion.

[redacted] Hernán Rivas

31 de octubre del 2024

la vía aun presenta humedad, no es posible acceder material.

[redacted]

01 de Noviembre del 2024

Se logra llevar la volqueta con las dos conchas multifuncionales, partidas en 2 secciones, debido a que este se debe ingresar a pie, se acopian y se ingresa el material para la demarcacion.

[redacted]

02 de Noviembre del 2024

Se Presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto

[redacted]

03 de Noviembre del 2024

Se Presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de Actividades de obra del proyecto.

[redacted]



04 de Noviembre del 2024

Se Presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto.


[redacted]



05 de Noviembre del 2024

Hoy se realiza instalacion del arco de mini futbol el cual quedo anclado en dado de Concreto y aplomado de ambos lados

[redacted]



06 de noviembre del 2024

Se presentan lluviznas suaves no permitio realizar actividades de Soldadura.

[illegible] Hernán [illegible]

07 de noviembre del 2024

dia humedo, nublado, no se pueden realizar actividades de Soldadura y demarcacion

[illegible] Hernán [illegible]

08 de noviembre del 2024

Se presentan lluvinas leves, no se puede realizar actividades de Soldadura y demarcacion

[illegible] Hernán [illegible]

09 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra de Proyecto.

[illegible] Hernán [illegible]

10 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra de proyecto.

[illegible] Hernán [illegible]


11 de noviembre del 2024

dia humedo y nublado, no se puede realizar actividades de soldadura y demarcacion

[illegible]


12 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.




13 de noviembre del 2024

dia humedo, no se pudo hacer actividades de ornamentación




14 de noviembre del 2024

Hoy se logro instalar y soldar la parte de baloncesto en una de las porterias



15 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto



16 de noviembre de 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.



17 de noviembre de 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto



18 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

[redacted]

19 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

[redacted]

20 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

[redacted]

21 de noviembre del 2024

dia humedo, presento llovisna leves lo cual no permitio trabajos de ornamentación

[redacted]

22 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

[redacted]

23 de noviembre del 2024

dia humedo, se presentaron llovisnas leves lo cual no permitio realizar actividades de ornamentación.

[redacted]

62

24 de noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

25 de octubre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto, Se firma acta de Reinicio del Contrato de Obra e interventoria como consta en la respectiva Acta



Maria ximena V.

26 de octubre del 2024


Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.



maria ximena V.

27 de octubre del 2024


Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.



maria ximena V.


28 de octubre del 2024

Se dan Reinicio a las actividades, llegan al sitio de obra 2 viajes de material de relleno para reinstalar en las areas que se daño por las lluvias constantes del sitio, se compactomecanicamente




29 de octubre del 2024

llega al sitio de intervencion 2 viajes de recebo para reconfigurar la estructura de soporte de la futura placa, este material se viene extendiendo y Compactando mecanicamente.



30 de octubre del 2024

llega al sitio de obra 3 viajes de recebo, el cual se extendio y compacto en el area afectada por las lluvias, tambien llego 1 viaje de material petreo el contratista en conjunto con la comunidad del Resguardo realizaron la extendida de balastro en la via en zonas criticas para mejorar el acceso de las valquetas aún quedan más areas criticas pero se intervinieron unos puntos



31 de octubre del 2024

Se termina de Cerio el pellono para la estructura de la placa, llega al sitio 250 bultos de cemento los wales se acopiaron en estibas y taparon con plastico negro llego un viaje de material petreo.

Hernán Rua

01 de Noviembre del 2024

Se presentaran precipitaciones fuerte lo cual no pemitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

Hernán Rua

02 de Noviembre del 2024

Se presentaran precipitaciones fuerte lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

Hernán Rua

03 Noviembre del 2024

Se realizo transporte de 2 viajes de material petreo, los wales se acopian en el sitio a intervenir, se continua realizando compactacion mecanica de la estructura de recebo.

Hernán Rua

04 de noviembre del 2024

llega al resguardo indigena 120 bultos de Cemento, los wales se acopiaron en estiba doble y se taparon con plastico negro, se continua realizando compactacion del recebo

Hernán Rua


05 de Noviembre del 2024

Se presentaran Precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de actividades de obra del proyecto.

Hernán Rua


06 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto.




07 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecución de Actividades de obra del proyecto.




08 de Noviembre del 2024

llega al sitio de intervencion 2 viajes de material petreo, los cuales se acopiaron




09 de Noviembre del 2024

llegan 2 viajes de materiales petreos al Resguardo indigena




10 de Noviembre del 2024

llega al sitio de intervencion 2 viajes de material petreo, los cuales se acopiaron en sitio



11 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de Actividades de obra del proyecto.



12 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

13 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

14 de Noviembre del 2024


debido a las lluvias llego 1 viaje de material petreo, así como la malla electrosoldad necesaria para todo la placa de polideportivo, así como las canchas multiples sin tableros.


15 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permito la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

16 de Noviembre del 2024

Se realiza formaleteo de una tira de 30x3,33, y se realiza instalacion de la malla electrosoldada en esa tira, se compacta mecanicamente esta area.






17 de Noviembre del 2024

el interventor chequeo la instalacion de la malla electrosoldada y se inicio la fundicion en concreto de 3.000psi para la tira de 30x3,33 x0,10m. el interventor Verifico que la mezcla se realizará con lo estipulado en el diseño de mezcla, Se termina el dia con el avance de $30 \times 3,33 = 100\ m^2$





18 de Noviembre del 2024


Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no permitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto.

Hernán

19 de Noviembre del 2024

Se realiza instalacion de concha multiple aplomada y se dejo formaleteada la tira fundida, se procede a formaletiar la placa en el area de las conchas para dejar embebida estas con el dado y la placa se procede a fundir y se ejecuta a hoy

$(30 \times 3,33) + (12 \times 3,33) = 140\ m^2$



Hernán

20 de Noviembre del 2024

Hoy se procedio a fundir el resto de la tira del medio, la interventoria chequeo la docificacion de la mezcla, así como el recubrimiento de la malla electrosoldad.

Se realiza formaleteo de una tira para fundir mañana

Se tiene ejecutado a hoy

$2 \times 30 \times 3,33 = 200\ m^2$



Hernán


21 de Noviembre del 2024

Se presentaron precipitaciones fuertes lo cual no pamitio la ejecucion de actividades de obra del proyecto

Hernán

22 de Noviembre del 2024


Se aprovecha el dia y se realiza la fundicion de la tira completa q se dejo formaleteado ayuer la interventoria reviso el recubrimiento de la malla electro soldada así como la mezcla q concuerde con el diseño de mezclas $3 \times 3,33 \times 30 = 300\ m^2$



Hernán

23 de Noviembre del 2024


Se realiza fundicion de tiras de concreto de 3.000 PSI de $30 \times 3,33 \times 0,10$, la interventoria verifica la instalacion de la malla electrosoldada, tambien verifica la mezcla en concreto que se realice de acuerdo al diseño de mezclas. $5 \times 30 \times 3,33 = 500\ m^2$



Hernán

24 de noviembre del 2024

Se realiza fundicion de tira completa de Concreto de 3.000 Psi, Se tomaron muestras de especimenes de Concreto, la ~~I~~nterventoria chequeo la toma, así como la docificacion de acuerdo al diseño de mezcla $6 \times 30 \times 3,33 = 600\ m^2$

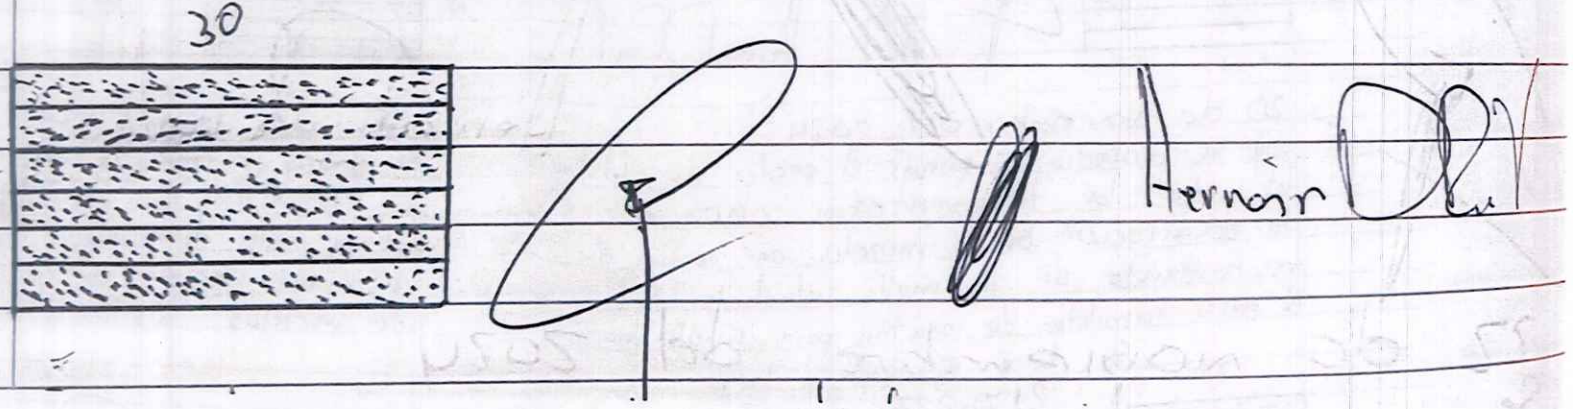

APROBACION DEL PERSONAL – F12.

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CFLD-F12
		Versión: 1
Fecha Aprobación: 13/02/2023	VERIFICACIÓN DE PERSONAL TECNICO	Página 1 de 1

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

EQUIPO DE (OBRA/CONSULTORIA/INTERVENTORIA)

ÍTEM	TIPO DE PERSONAL RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO	UNIDAD/TIEMPO	CANT	DEDICACION (%)	CUMPLE		DESCRIPCIÓN
					SI	NO	
1,0	RESIDENTE FIL VITS	MES	1	100	X		La interventoria acepta al Ing. Fabian Camilo Falla Naranjo como Residente del Resguardo Indigena Fil Vits para el municipio de San Agustin, el cual cumple con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones los cuales son: General: minimo 4 años en el ejercicio de su profesion contados a partir de la expedicion de la matricula profesional. para lo cual se suministra Matricula Profesional con fecha de expedicion de 23/03/2016 con lo cual acredita 8 años. Especifica: Minimo 2 años como residente de obras relacionadas a Proyectos de Construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Mantenimiento y/o Adecuacion y/o Reforzamiento y/o intervencion de polideportivos o Edificaciones. Para lo cual se suministra 2 certificados de obra en donde se ejecutaron construccion de cancha de polideportivo y construccion de cubiertas para polideportivos que sumados cuentan con 49 meses de ejecucion.

Revisó:

CONSORCIO INDERHUILA 2023
RPL. JUAN MANUEL MEDINA B.
INTERVENTORIA

APROBACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

CONSORCIO
INDERHUILA 2023
NIT. 901.768.748-5

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Contrato de Obra No. CSAMCIH430 de 2023
Objeto: *Construcción de placa para polideportivos en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y el resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.*
Contratista: Consorcio Escenarios Deportivos JC 2023
Interventoría: Consorcio INDERHUILA
Entidad Contratante: INDERHUILA

CERTIFICA

Que el **Consorcio INDERHUILA 2023**, en su calidad de **Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental** del contrato de obra citado, realizó el **seguimiento, verificación y aprobación de los ensayos de laboratorio** correspondientes a las **muestras cilíndricas de concreto** tomadas durante la fundición de la placa polideportiva ejecutada en el **Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak**, municipio de La Argentina, departamento del Huila.

Metodología

Durante la jornada de fundición, se tomaron las **muestras cilíndricas de concreto fresco** de acuerdo con los procedimientos definidos en las normas **NTC 550 (Concreto. Elaboración y curado de especímenes)** y **NTC 673 (Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión del concreto)**.

La interventoría supervisó de manera directa el proceso, verificando:

- Correcta toma de muestras del concreto en sitio, garantizando homogeneidad del material.
- Elaboración de cilindros con dimensiones y compactación adecuadas.
- Etiquetado, curado húmedo y almacenamiento inicial bajo condiciones controladas.
- Transporte oportuno al laboratorio acreditado para la ejecución de los ensayos de resistencia a la compresión.

El laboratorio realizó los ensayos conforme a los protocolos de calidad y con equipos calibrados, asegurando la trazabilidad y confiabilidad de los resultados.

Resultados de los ensayos

Los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto para la muestra correspondiente al vaciado de la placa en el **Resguardo Indígena Nam Misak** fueron los siguientes:

Edad del ensayo (días)	Resistencia promedio (PSI)	Porcentaje estimado de resistencia de diseño (3.000 PSI)	Observación técnica
3 días	1.509 PSI	50 %	Dentro del rango esperado.
7 días	2.168 PSI	72 %	Cumple resistencia intermedia esperada.
14 días	2.785 PSI	93 %	Cumple tendencia normal de ganancia de resistencia.
28 días	3.054 PSI	102 %	Cumple y supera la resistencia de diseño.

Conclusión Técnica

Con base en la metodología aplicada y los resultados obtenidos, la interventoría concluye que el **proceso de muestreo, elaboración y ensayo de los cilindros fue realizado conforme a las normas técnicas vigentes**, asegurando representatividad del material y confiabilidad en los resultados.

Los valores alcanzados evidencian un **comportamiento óptimo del concreto**, superando la resistencia de diseño especificada de **3.000 PSI a los 28 días**, lo cual confirma la **idoneidad del diseño de mezcla aprobado** y la **correcta ejecución del proceso constructivo** durante la fundición de la placa polideportiva en el resguardo mencionado.

En consecuencia, la **Interventoría APRUEBA** los resultados finales de los ensayos de laboratorio correspondientes al **Resguardo Indígena Guambiana de Nam Misak**, por cumplir satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos en el contrato de obra.

Atentamente;

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA



Neiva, noviembre 24 del 2024

Señores:
CONSORCIO INDERHUILA 2023.
R.L. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
Ciudad

Referencia: Remisión resultados de laboratorio.

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANADE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIIL VITS LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Atentamente,

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE
Nit. 900456835-5

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. 410-13

ORDEN DE TRABAJO: 052-24
CONTRATISTA: CONSORCIO INDERHUILA 2023
PROYECTO: CONSTRUCCION PLACA DE POLIDEPORTIVO NAM MISAK
UBICACIÓN: LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA EMISION INFORME: CONSOLIADO DE ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO MES DE NOVIMEBRE

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Slump (Pulg)	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN								
14/08/2024	13/08/2024	1	15,00	30,00	186	4 1/4"	3	16/08/2024	1527	51%	1	3000	TIRA INTERMEDIA DE LA PLACA
	13/08/2024		15,00	30,00	263	4 1/4"	7	20/08/2024	2159	72%	1	3000	
	13/08/2024		15,00	30,00	341	4 1/4"	14	27/08/2024	2799	93%	4	3000	
	13/08/2024		15,00	30,00	375	4 1/4"	28	10/09/2024	3078	103%	2	3000	

EQUEMA DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

LABINCON S.A.S.
Nit. 900456835-5


REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. 410-13

ORDEN DE TRABAJO: 075-24
CONTRATISTA: CONSORCIO INDERHUILA 2023
PROYECTO: CONSTRUCCION PLACA DE POLIDEPORTIVO FILVITS
UBICACIÓN: SAN AGUSTIN - DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA EMISION INFORME: CONSOLIADO DE ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO MES DE NOVIEMBRE

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Slump (Pulg)	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN								
18/11/2024	17/11/2024	2	15,00	30,00	188,00	4 1/4"	3	20/11/2024	1543	51%	1	3000	TIRA INTERMEDIA DE LA PLACA
	17/11/2024		15,00	30,00	265,00	4 1/4"	7	24/11/2024	2175	72%	1	3000	
	17/11/2024		15,00	30,00	0,00	4 1/4"	14	01/12/2024	0	0%	4	3000	
	17/11/2024		15,00	30,00	0,00	4 1/4"	28	15/12/2024	0	0%	2	3000	

EQUEMA DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

LABINCON S.A.S.
Carlos Alfonso Bautista Ramos
JEFE DE LABORATORIO
NIT. 900456835-5

