INFORME DE AVANCE DE OCTUBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	ERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DI							
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00		Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00							
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00							
Plazo de Ejecución:	14 MESES Y 24 DIAS		Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1	31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024		Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2	31/12/2025
Vencimiento:	31/12/2025						Plazo Actualizado	14 MESES Y 24 DIAS
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SE	Desde	16/10/2024	Hasta	30/06/2026	$ 2.791.730.311,00			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	12	Período comprendido entre el	10 DE OCTUBRE DEL 2025	y el	9 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025	Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025
Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025	Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025
Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES	Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES
Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025	Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025
Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES	Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES
Valor Inicial:	$ 518,496,955	Valor Inicial:	$ 13,358,523,629,68
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518,496,955	Valor Actualizado:	$ 13,358,523,629,68
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518,496,955	Valor por pagar:	$ 13,358,523,629,68
Nombre Supervisor:	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/08/2026	51.849.695,50
IOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIOI	31/03/2025	10/02/2029	51.849.696,50
CALIDAD DEL SERVICIO	8/09/2025	8/09/2030	51.849.697,50
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-1014-68251

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	N° POLIZAS	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2026	667.926.181,48
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	4.007.557.088,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	2.671.704.725,94
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095284	10/03/2025	7/02/2026	771.750.000,00
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	CONTRATO DE OBRA Nº

a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	38,24%	33,83%	72,07%
% Ejecutado	27,25%	42,65%	69,90%
Diferencia	10,99%	-8,82%	2,17%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. El contratista continua con las actividades de replanteo con equipos topograficos.

2. Excavacion mecanica y manual en zona de parques

3. instalacion de relleno seleccionado en cancha y en zona de parques.

4. Solado de viga de cimiento de cerramiento.

5. Armado de acero de esfuerzo de cerramiento perimetral, graderia y tanques.

6. Fundida de contenedores de raiz.

7. Fundida de viga de cerramiento.

8. Fundida de columnas de graderias.

9. Fundida de graderias

10. Fundida de tanques.


11. Instalacion de piso en loseta de cemento y fundida de bordillo de confinamiento.

12. Instalacion de niples en muros de los tanques.

13. Construccion de registros electricos.

14. PGIO.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

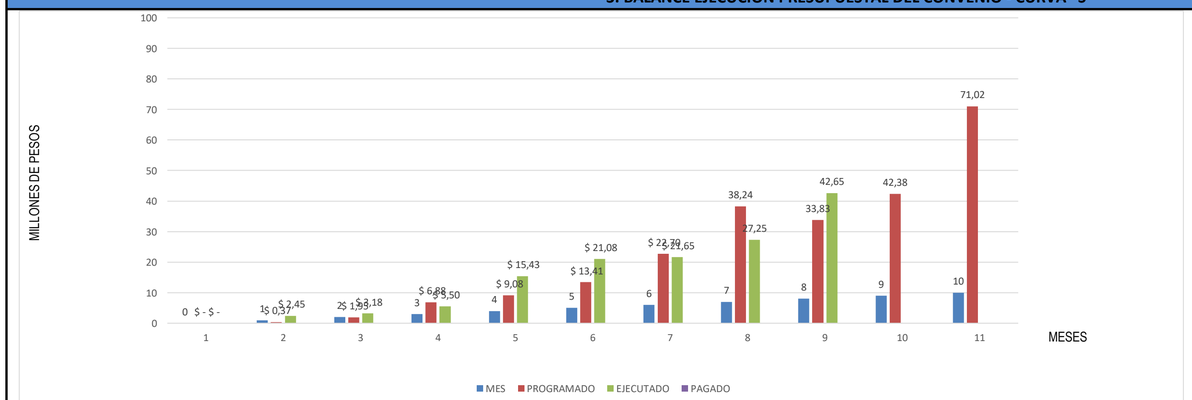

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoría evidencia en el registro de avance del proyecto un adelanto del 8,82%, evidenciando que el Contratista avanza en cumplimiento con la reprogramación entregada con el Acta Modificatoria No. 1. Se recomienda al Contratista continuar disponiendo en obra los recursos necesarios para avanzar conforme a lo programado. También, se recomienda al Contratista cumplir con la entrega de los informes de PGIO y los informes Técnicos de Obra, dentro de las fechas establecidas. Así mismo se recomienda al Contratista presentar los resultados de laboratorio con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia de los concretos y entregar los certificados de calidad de las losetas.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA **FORMATO** INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 3

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		49
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica			11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría		6	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra		0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		137
7.	Copia libro de obra/bitácora		20	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura.	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Secretario de planeacion e infraestructura	Elaborado: 2/12/2025 Total de Páginas: 3



Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	2/12/2025		

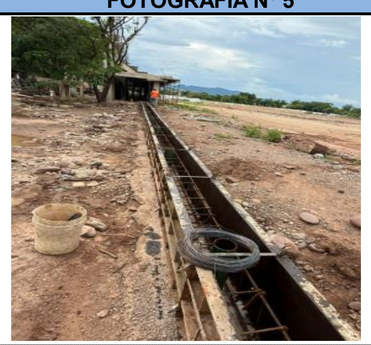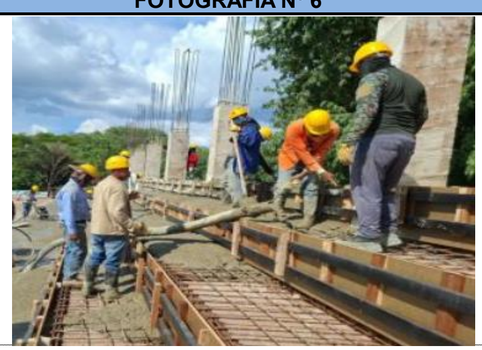FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Fundida de muros de tanques de rehuso.	instalacion de losetas y vigas de confinamiento del espacio de la plazoleta.	instalacion de losetas y vigas de confinamiento del espacio de la plazoleta.
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
El armado de acero para vigas implica la colocación estratégica de barras de refuerzo dentro de la viga de concreto para resistir las fuerzas de tensión y compresión	El armado de acero para vigas y enconfrado implica la colocación estratégica de barras de refuerzo dentro de la viga de concreto para resistir las fuerzas de tensión y compresión	Proceso de fundida de huella y contrahuella de graderias.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:	**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	domingo, 9 de noviembre de 2025	**MES No.**	8	INFORME DEL	10/10/2025	AL	9/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**			
CONTRATO No.:	004 DE 2024			CONTRATO No.:	033 DE 2025		
PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00			PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		
FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2025			FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A			SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		
PRÓRROGA No. 1 :	30 abril de 2025			PRÓRROGA No. 1:	30 abril de 2025		
REINICIO No. Y FECHA:	N/A			REINICIO No. Y FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS):	336,00			PLAZO ACTUALIZADO:	336,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	244	EQUIVALE AL:	73%	PLAZO TRANSCURRIDO:	244	EQUIVALE AL:	73%
VALOR INICIAL :	$ 518.496.955,00			VALOR INICIAL :	$ 13.358.523.629,68		
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A			VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -			VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -			VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 518.496.955,00			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 518.496.955,0			VALOR POR PAGAR:	$ 13.358.523.629,68		
INTERVENTOR O CONSULTOR:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25			CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	27/12/2024	27/12/2025	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	28/01/2025	28/01/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	27/12/2024	27/06/2028	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	28/01/2025	28/07/2028	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	27/06/2025	27/06/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2030	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2027	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	28/01/2025	28/07/2025	$ 771.750.000,00

2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025		**SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025**	
SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:	SUSPENSIÓN NO.:	DE FECHA:
PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025	PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025
MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 11/03/2025	MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 13-03-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					**CONTRATO DE OBRA**				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	31/03/2025	10/08/2026	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	31/03/2025	10/02/2029	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2029	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	8/09/2025	8/09/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	10/03/2025	7/02/2026	$ 771.750.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**%**	**FECHA DE PAGO**
TOTAL PAGADO				**TOTAL PAGADO**			

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. El contratista continúa con las actividades de replanteo con equipos topográficos
2. Excavación mecánica y manual en zona de parques
3. Instalación de relleno seleccionado en cancha y en zona de parques
4. Solado de viga de cimiento de cerramiento
5. Armado de acero de refuerzo de cerramiento perimetral, gradería y tanques.
6. Fundida de contenedores de raiz
7. Fundida de viga de cerramiento
8. Fundida de columnas de graderías
9. Fundida de graderías
10. Fundida de tanques
11. Instalación de piso en loseta de cemento y fundida de bordillos de confinamiento
12. Instalación de niples en muros de los tanques
13. Construcción de registros eléctricos
14. PGIO

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	**ACUMULADO**		**% DE AVANCE OBRA EJECUTADO**			**ACUMULADO**		**% DE ADELANTO ACUMLADO**	
	33,83%					**42,65%**		**-8,82%**	
CAPITULOS	**INICIO**	**FIN**	**DURACIÓN (DIAS)**	**% TOTAL**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**% ATRASO**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**DÍAS DE ATRASO**
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 10 de marzo de 2025	miércoles, 19 de noviembre de 2025	254	0,78%	**0,74%**	0,70%	0,04%	EN EJECUCIÓN	0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	domingo, 30 de marzo de 2025	domingo, 18 de enero de 2026	294	15,04%	**12,89%**	13,72%	-0,83%	EN EJECUCIÓN	0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	miércoles, 9 de abril de 2025	domingo, 25 de enero de 2026	291	17,92%	**8,73%**	9,95%	-1,22%	EN EJECUCIÓN	0
MAMPOSTERIA	jueves, 21 de agosto de 2025	domingo, 18 de enero de 2026	150	0,54%	**0,23%**	0,23%	0,00%	EN EJECUCIÓN	0
CARPINTERIA METALICA	martes, 8 de julio de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	208	20,03%	**6,54%**	12,98%	-6,44%	EN EJECUCIÓN	0
OBRAS DE URBANISMO	martes, 29 de julio de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	187	10,20%	**1,29%**	1,56%	-0,27%	EN EJECUCIÓN	0
ACABADOS	miércoles, 19 de noviembre de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	74	2,38%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	viernes, 9 de mayo de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	268	19,68%	**0,36%**	0,63%	-0,28%	EN EJECUCIÓN	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	miércoles, 30 de abril de 2025	domingo, 25 de enero de 2026	270	10,80%	**1,40%**	1,25%	0,14%	EN EJECUCIÓN	0
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS	miércoles, 26 de noviembre de 2025	domingo, 1 de febrero de 2026	67	0,31%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	lunes, 10 de marzo de 2025	domingo, 8 de febrero de 2026	335	2,31%	**1,66%**	1,63%	0,03%	EN EJECUCIÓN	0
TOTAL				**100,00%**	**33,83%**	**42,65%**	**-8,82%**		0

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN		**ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO**
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	No se presentan atrasos en el presente Informe Mensual, teniendo en cuenta la reprogramación de obra, según el Acta Modificatoría del pasado 04 de noviembre.
ADELANTO (DIAS):	-30	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	


OBSERVACIONES:

En el presente informe se evalua el avance de obra de acuerdo a la reprogramación presentada por el Contratista mediante oficio OF_CEDUSD_N.019 del 04 de noviembre del presente año, teniendo en cuenta el Acta Modificatoría No. 1 que propone el Contratista según los ajustes que surgieron en los diseños hidrosanitarios y eléctrico y la revisión de los diseños iniciales del proyecto. Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el octavo mes de ejecución, se lleva un adelanto del 8,82%, que se muestra en mayor proporción en el capítulo 3, 5 y 9.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO: **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**	**Fecha: 19/11/2021**

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	domingo, 9 de noviembre de 2025	**MES No.**	8	INFORME DEL	10/10/2025	AL	9/11/2025

CURVA DE AVANCE

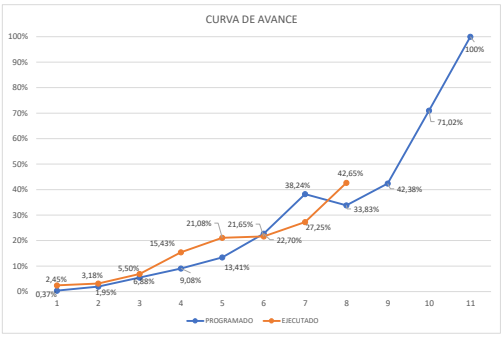

5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha del presente informe, el Contratista presenta un adelanto en el cronograma de obra del 8,82%.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ha ejecutado las actividades con personal capacitado y tecnicamente bien ejecutados. El Contratista no ha realizado la entrega de los resultados de laboratorio del concreto y el certificado de calidad de las losetas, solicitados reiteradamente en obra

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En lo correspondiente a la parte administrativa del contrato, el contratista realizó la entrega de la seguridad social de los empleados administrativos y mano de obra no calificada.

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

El contratista cuenta con la disponibilidad del recurso humano neceario para la ejecucion del contrato, cuenta con relleno seleccionado, acero, cemento, arena, losetas, materiales para acometidas eléctricas, estructura metálica de cubierta, cerramiento y rampa. Sin embargo se sugiere al Contratista adelantar el proceso de suministro de materiales del sistema de riego e hidrosanitarios necesarios para el correcto desarrollo del contrato dentro de las actividades según la programación.

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

A la fecha no se registra avance financiero del contrato

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Persiste la evidencia que los trabajadores no cuentan con dotación completa, no realizan el uso correcto de los EPPs y realizan labores que generan riesgos sin la debida precausión, sin portar los elementos para prevenir accidentes, como barbuquejos, cascos, guantes, arnes de seguridad, línea de vida, botas de seguridad y protectores auditivos. Por lo anterior la Interventoría mediante oficio CISD028 del 16 de octubre del 2025, envió evidencia fotográfica de los incumplimientos en temas de seguridad y salud en el trabajo y solicitó al Contratista el cumplimiento de las normas de SST obra, nesesario para garantizar las condiciones de Seguridad Integral y el cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de obra.

No. DE INCIDENTES:	0	**No. ACCIDENTES:**	0	

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS

En el periodo del presente informe no se registraron eventos

g. ASPECTO AMBIENTAL:

El Contratista viene entregando los informes del PGIO acumulados y posfechados. Teniendo en cuenta que los últimos informes recibidos son de los meses de Julio y Agosto de 2025, recibido el día 17-09-2025. Y, a la fecha del presente informe, no hemos recibido los Informes de septiembre y octubre de 2025.

h. ASPECTO SOCIAL:

El Contratista realizó la entrega de las actas de vecindad el día 18 de junio de 2025 vía correo eléctronico. No se han efectuado más reuniones con la comunidad.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Municipio de las pólizas de obra e interventoría, de acuerdo al Adicional No. 01

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Entregar el Informe mensual del PGIO del mes de Septiembre y Octubre 2025	Contratista	

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

El Contratista presentó el Acta Modificatoria No. 1, aprobado el día 04 de noviembre de 2025, donde se encuentran las actividades no previstas y un balance de mayores y menores cantidades, conservando el valor inicial del Contrato de Obra.

8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD
		JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
		HILLARY CARRILLO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	1
		LUIS FELIPE VEGA PEDROZO	PROFESIONAL SST	1
		JOSE JAIRO BRITO BRITO	TOPOGRAFO	1
		MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	1
		MICHELLE MURGAS	APOYO SST	1

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

La Interventoría evidencia en el registro de avance del proyecto un adelanto del 8,82%, evidenciando que el Contratista avanza en cumplimiento con la reprogramación entregada con el Acta Modificatoria No. 1. Se recomienda al Contratista continuar disponiendo en obra los recursos necesarios para avanzar conforme a lo programado. También, se recomienda al Contratista cumplir con la entrega de los informes de PGIO y los informes Técnicos de Obra, dentro de las fechas establecidas. Así mismo se recomienda al Contratista presentar los resultados de laboratorio con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia de los concretos y entregar los certificados de calidad de las losetas.

10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de Noviembre de 2025

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR ALCALDIA : LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO

CARGO SUPERVISOR ALCALDIA : SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Deporte	PROCESO:	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Código: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 8	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
ARMADO DE FORMALETA PARA MEDIA CAÑA DEL FONDO DEL TANQUE DE REÚSO	EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA Y LODO DEL TANQUE DE REÚSO	INSTALACIÓN DE LOSETA EN PARQUE BIOSALUDABLE
		
EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA Y LODO DEL TANQUE DE REÚSO	LOSETA INSTALADA EN PARQUE BIOSALUDABLE	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE GRADERIA
		
INSTALACIÓN DE ESTRIBOS EN COLUMNAS DE GRADERIAS	INSTALACIÓN DE LOSETA EN PARQUE BIOSALUDABLE	COLOCACIÓN DE ESTRIBOS EN COLUMNAS DE GRADERIAS
		
INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA COMO FORMALETA DEL FONDO DEL TANQUE DE REÚSO	INSTALACIÓN DE LOSETA EN PARQUE BIOSALUDABLE	EXCAVACIÓN DE CONTENEDOR DE RAIZ

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 8	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGA DE CERRAMIENTO DE CANCHA</td><td>INSTALACIÓN DE FORMALETA EN VIGA DE CERRAMIENTO DE CANCHA</td><td>VIGA DE CERRAMIENTO FUNDIDA</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSTALACIÓN DE FORMALETA EN MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO</td><td>RECORRIDO EN OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO</td><td>FUNDIDA DE COLUMNAS EN GRADERIAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>CONTROL DE VERTICALIDAD DE LA COLUMNA POSTERIOR AL VACIADO</td><td>COMPACTACIÓN DE ACCESO AL PROYECTO</td><td>ARMADO ACERO DE REFUERZO EN GRADERIAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSTALACIÓN DE ALINEADORES EN MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO</td><td>FUNDIDA DE GRADERIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI</td><td>GRADERIAS FUNDIDAS</td></tr>
</table>

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 8	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>FALLO ENCONTRADO EN ZONA DE PARQUE</td><td>RETIRO DE FALLO EN ZONA DE PARQUE</td><td>DESINSTALACIÓN DE CASETA EXISTENTE EN EL PROYECTO</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CASETA EXISTENTE</td><td>INSTALACIÓN DE NIPLES EN MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO</td><td>EXTESIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CANCHA</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>EXTENSIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN PARQUE</td><td>FUNDIDA DE FONDO DEL TANQUE DE REÚSO</td><td>INSTALACIÓN DE LOSETA EN ZONA DE PARQUES</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>LIMPIEZA DE CÁRCAMO DE AGUAS LLUVIAS</td><td>FUNDIDA DE MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO</td><td>DESENCOFRADO DE MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO</td></tr>
</table>

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 8	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

		
FONDO DEL TANQUE DE REÚSO	INSTALACIÓN DE NIPLES EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	INSTALACIÓN DE FORMALETA EN MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS
		
VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE GRADERIA	LIMPIEZA DE CÁRCAMO EN PARQUE	EXCAVACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE LUMINARIAS DEL PARQUE
		
FUNDIDA DE MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	FUNDIDA DE MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	EXTESIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CANCHA
		
INSTALACIÓN DE LOSETAS	INSTALACIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CANCHA	EXTENSIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CANCHA

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

CUENTA N°:	900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
BANCO:	OCCIDENTE

MES DE OCTUBRE DE 2025

Fecha	Comp	item	tipo	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30/09/2025				Saldo que viene a 30 de Sept 2025	0	0	13.983.309.359,09
15/10/2025				Devolucion de Rendimientos Financieros		24.657.535,00	24.657.535,00
31/10/2025			NT	intereses	25.479.452,11		25.479.452,11
SALDO A FIN DE MES					**25.479.452,11**	**24.657.535,00**	**13.984.131.276,20**

Luis Felipe S

Contador
Tp : 340495-T

CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

NIT. 800086623

CONCILIACIÓN BANCARIA OCTUBRE -2025

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: -

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	13.983.309.359,09	SALDO ANTERIOR LIBROS:	13.983.309.359,09
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	13.984.131.276,20	SALDO ACTUAL LIBROS:	13.984.131.276,20
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	13.984.131.276,20	SALDO CONCILIADO LIBROS:	13.984.953.193,31

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
31-oct	ABONO INTERES	25.479.452,11
TOTAL: (1)		**25.479.452,11**

Cargos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
15-oct	PAGO DE INTERESES DE SEPTIEMBRE	24.657.535,00
	Iva en Transaciones	
	Comis Recaudos Caja Nacional	
	Cuota de manejo	
	Retenciones	
	Gravamen Movimiento Financier	
	Debito por rechazo	
	TOTAL: (2)	**24.657.535,00**

Abonos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (3)		**0,00**

Cargos no registrados por el banco

Fecha	Detalle	Valor
TOTAL: (4)		**0,00**

DE LIBROS A BANCOS	
Saldo en Libros	13.984.131.276,20
+ Total (1)	25.479.452,11
- Total (2)	(24.657.535,00)
- Total (3)	-
+ Total (4)	-
Saldo según Extracto	**13.984.953.193,31**

DE BANCOS A LIBROS	
Saldo según Extracto	13.984.131.276,20
- Total (1)	(25.479.452,11)
+ Total (2)	24.657.535,00
+ Total (3)	-
- Total (4)	-
Saldo en Libros	**13.983.309.359,09**

LUIS FELIPE SOCARRAS BARROS
CONTADOR

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800096623
Generado por: ELVIA ELENA SOTO ISEDA

A continuación el detalle de: **Transacciones Autorizadas - Autorizar**

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
No. Producto	*****4677
Valor a Pagar	$25,479,453.00
Factura	118299
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
Fecha Transacción	2025/11/12

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Octubre 09 de 2025 - jueves.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux Siso, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) Maestro, (6) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of. losera, (2) Ay. losera.
- Personal Intervenroria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (2) volqueras, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (2) canguros, (1) cortadora, (5) mezcladoras.
- Actividades: * Continua instalación de losera en parque biosaludable.
* Armado de plataforma de graderias.
* Limpieza de barro en parque de refuso.
* Instalación de formaleta en parque de almacenamiento
* Armado de carpinteria para parque de refuso.
* Figurado e instalación de acero de refuso en graderias.
* Ingresa rieles de 10cmx15 para bordillos

Alan V°B°
Interventoria.

Octubre 10 de 2025 - viernes.
- Estado del tiempo: Mañana Soleado, tarde nublada
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00 Pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) AUX SISO, (1) Director. (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) Maestro, (6) oficiales, (6) Ayudantes, (2) of. losera, (2) ay. losera,
- Personal Intervenroria: (1) Ing Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero
- Equipos): Equipos de topografia, (1) motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) Rana, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (2) volqueras, (1) vibrador de concreto, (2) canguros, (1) cortadora, (5) mezcladoras, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible

Powered by CamScanner

Actividades: Ingresa relleno seleccionado a concha.
* Continua instalación de loseras en parque biosaludable
* Fundida de bordillos entre loseras.
* Se realiza encofrado de muro de tanque en cuarto de máquinas
* Continua limpieza de lodo en tanque de rehuso, con bomba sumergible e hidrolavadora.
* Continua instalación de formaleta en gradería e instalación de acero de refuerzo
* Armado de carpintería para media caña en tanque de rehuso.

V°B° Interventoría

Octubre 11 de 2025 - (Sábado)
- Estado del tiempo: Soleado. Lluvia fuerte de 5:30 pm a 6:00 pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Maestro, (2) operadores, (6) oficiales (9) Ayudantes, (2) of. losera, (2) Ay. losera.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topografo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía; (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) Rana, (5) mezcladoras, (1) cortadora, (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (2) volquetas, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible.
- Actividades: * Continua limpieza de tanque de rehuso.
* Acopio de relleno seleccionado en concha
* Armado de plataforma de gradas e instalación de acero.
* Continua instalación de loseras y fundida de bordillos
* Armado de carpintería para media caña de tanque de rehuso.
* Instalación de formaleta en muro del tanque cuarto de máquinas

Octubre 12 de 2025 - (Domingo)
- Estado del tiempo: Nublado

No se realizan labores

Octubre 13 de 2025 - (Lunes Festivo).
- Estado del tiempo: Nublado, lluvia leve 4:00Pm a 5:00Pm.

No se realizan labores

Octubre 14 de 2025 - Martes
- Estado del tiempo: soleado
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) Director, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Aux SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) fracero, (6) oficiales, (9) Ayudantes, (2) of. losero, (2) Ay. losero.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topografo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (5) mezcladoras, (1) cortadora, (2) conguas, (1) vibrador de concreto, (2) volquetas, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible, (1) Rana.
- Actividades:
  - Continua limpieza de zanjas de relleno
  - Instalación de losetas y fundida de bordillos entre losetas.
  - Ingreso de relleno seleccionado a punto de acopio.
  - Armado de formaleta y acero de refuerzo de gradenas.
  - Fundida de paneletas de 5cm de alto.

Octubre 15 de 2025 - Miercoles

- Estado del tiempo: Nublado. Lluvia fuerte 5:20pm. Lluvia leve 6:00pm
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Maestro, (1) Topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (6) oficiales, (8) ayudantes, (1) Almacenista, (2) of laseros, (2) ay laseros.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) Rana, (1) Vibrador de concreto, (5) mezcladoras, (2) Canguros, (1) comadora, (1) Planta eléctrica, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible, (2) volquetas.
- Actividades: * Continua limpieza del tanque de rebajo.
  * Instalación de laseros y fundida de bordillos entre los laseros.
  * Continua armado de acero de refuerzo en gradenes.
  * Acopio, extensión, nivelación y compactación de relleno seleccionado sobre la concha.

El dia de hoy se presenta lluvia intensa después de finalizar la jornada, cuando los tanques de rebajo encontraban limpios de lodo. Por lo cual se genera atraso en la fundida de la losa del fondo del tanque de rebajo. Este retroceso lleva más de 2 semanas y no ha sido posible programar la fundida.

Octubre 16 de 2025 - Jueves

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Maestro, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (5) oficiales, (10) Ayudantes, (2) of laseros,

(2) Ay. losera.

•Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) Coordinador.

•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) Miniretroexcavadora, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (1) Rana, (2) conguros, (1) planta eléctrica, (1) Bomba sumergible, (1) hidrolavadora, (5) mezcladoras, (2) volquetas.

•Actividades: * Se realiza nuevamente limpieza del cangue de relleno.
* Continua armado de formaleta y acero de graderías.
* Instalación de losera. y fundida de bordillos entre loseras.
* Debido a la cantidad de agua sobre algunas partes de la cancha, no se ingresa relleno seleccionado para acopio.

Octubre 4 de 2025 - viernes

•Estado del tiempo: Soleado.

•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 Pm

•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Director, (1) Aux SISO, (1) Director, (2) operadores, (1) Maestro, (1) Topografo, (1) Cadenero, (5) oficiales, (7) Ayudantes, (2) of. losera, (3) Ay. losera.

•Personal Interventoría: (1) Ing. residente, (1) SISO, (1) Coordinador, (1) Topógrafo, (1) Cadenero.

•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) Miniretroexcavadora, (1) cortadora, (2) conguros, (5) mezcladoras, (1) planta eléctrica, (1) Bomba sumergible, (1) hidrolavadora, (1) Rana, (2) volquetas.

•Actividades: * Se realiza acopio de relleno seleccionado sobre la cancha
* Continua instalación de acero de refuerzo en graderías
* Instalación de losera en parque biosaludable
* Instalación de formaleta en viga de cerramiento permanente de cancha frente a parque biosaludable.

Powered by CamScanner

- Continua limpieza del tanque de rehuso con hidrolavadora y bomba sumergible.

Octubre 18 de 2025 - Sábado.

- Estado del tiempo: Nublado, lluvia intensa de 4:00 pm a 6:00 pm.
- Hora inicio: 7:00 am. - Hora final: 12:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) maestro, (2) operadores, (1) maestro, (6) oficiales, (5) Ayudantes, (2) of. losero, (2) Ay. losero.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retro-excavadora, (1) compactador, (1) hidrolavadora, (1) planta eléctrica, (1) bomba sumergible, (5) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (2) volquetas, (1) Rana, (2) conos.
- Actividades: * Se realiza fundida de viga de cerramiento perimetral de la concha frente a parque Bosa Ludible.
  * Continua armado de acero de refuerzo en las gradas.
  * Continua limpieza del tanque de rehúso, sacando lodo y haciendo lavado del solado.
  * Acopio de relleno seleccionado sobre la concha.

Octubre 19 de 2025 - Domingo.

- Estado del tiempo: soleado.
- No se realizan labores.

Octubre 20 de 2025 - Lunes.

- Estado del tiempo: Nublado, lluvia intensa 5:30 Pm
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing residente, (1) Ing. Ambiental, (1) Director, (1) SISO, (1) Director, (1) Almacenista, (1) Topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (5) oficiales, (8) Ayudantes, (1) Aux. SISO,
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniretroexcavadora, (1) vibrador de concreto, (5) mezcladoras, (2) canguros, (1) Reina, (1) cortadora, (1) hidrolavadora, (1) planta eléctrica, (1) bomba sumergible, (2) volqueras.
- Actividades: - Instalacion de formaleta en columnas de graderia
  - Fundida de bordillo permanente de loseta.
  - Continua limpieza del rondine de rehúso.
  - Descopado de viga del cerramiento permanente de la cancha, frente a parque biosaludable.

Octubre 21 de 2025 - Martes.

- Estado del tiempo: Nublado
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topográfo, (1) cadenero, (1) cord. Volq., (1) Maestro, (8) Ayudantes, (6) oficiales, (2) operadores.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (5) mezcladora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) mini retroexcavadora, (1) vibrador de concreto, (1) planta electrica, (1) hidrolavadora, (1) Bomba sumergible, (1) cortadora, (2) canguros, (1) Reina, (2) volqueras.

Powered by CamScanner

- Actividades:
  - Se realiza fundida de 7 columnas en graderas del B3 al B9. Se toman muestras de concreto y se realiza vibrado durante la fundida.
  - Se realiza acopio de relleno seleccionado en la cancha.
  - Continua limpieza en el tanque de rehóso, el cual volvió a verse afectado con la lluvia en la tarde de ayer.

Octubre 22 de 2025 - Miercoles.

- Estado del tiempo: Nublado
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Ing. ambiental, (1)SISO, (1)Aux. SISO, (1)Director, (1) Almacenista, (1)Topógrafo, (2)cadenero, (1)Maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes, (2) Operadores, (1)cond. volquetas
- Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1) SISO, (1)coordinador, (1) Topógrafo (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Rana, (1) vibrador de concreto, (1) planta eléctrica, (1) hidrolavadora, (1) Bomba sumergible, (1) cortadora, (2) canguro, (5) mezcladoras, (2) volqueras
- Actividades:
  - Se realiza desencofrado de columnas de gradería
  - Fundida de bordillos entre taseras
  - Continua limpieza del tanque de rehóso
  - limpieza de viga de cerramiento perimetral de la cancha
  - Instalación de formaleta en muros del cuarto de máquinas, e instalación de acero en muros.
  - Se realiza limpieza y aseo en obra

Octubre 23 de 2025 - Jueves.

- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 7:00 am. Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) almacenista, (2) operadores, (1) cond. volquero, (1) Maestro, (6) oficiales, (10) Ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo (1) cadenero.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografía, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) cortadora, (5) mezcladoras, (1) plano, (2) conos, (1) vibrador de concreto, (2) volquetas, (1) planta eléctrica, (1) hidrolavadora, (1) bomba sumergible.
- Actividades:
  - Se realiza adecuación de terreno en la cancha, retirando el material de sobrante sanitario.
  - Limpieza y fundida de bordillos en zonas duras del parque biosaludable. Se toman muestras de concreto.
  - Instalación de relleno seleccionado, extensión con motoniveladora y compactación con vibrocompactador
  - Continua armado de formaleta e instalación de acero de refuerzo en gradería.
  - Continua limpieza en tanque de reúso, instalación de formaleta en madera, para la losa del fondo.
  - Instalación de alineadores en muros del tanque de almacenamiento.
  - Limpieza de terreno al lado de construcción de zonas duras del parque biosaludable con minirretroexcavadora, en zona cerca al cerramiento provisional.

Octubre 24 de 2025 - Viernes

- Estado del tiempo: parcialmente nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Director, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) cond. volqueta, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) maestro, (6) oficiales, (7) ayudantes.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) miniretroexcavadora, (1) Rana (2) canguros, (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (5) Mezcladoras, (1) Plana eléctrica, (1) hidrolavadora, (2) volquetas
- Actividades:
  - * Continua limpieza en tanque de rebose
  - * Se realiza instalación de niples en muros del tanque de almacenamiento.
  - * Armado de acero de refuerzo de muros internos en tanque de reuso.
  - * Continua armado de graderías.
  - * Se realiza limpieza en cárcamo, en el ramal ubicado en parque biosaludable.
  - * Adecuación de terreno en zonas duras, se retira material saturado y corte en subrasante en zona de fallo.
  - * Se realiza desmonte de casa existente y demolición
  - * Ingresa losetas
  - * Nivelación y aplomado de muros en tanque de almacenamiento.
  - * Ingreso de material de relleno seleccionado en concha. Se realiza extensión y nivelación con motoniveladora y compactación con vibrocompactador

Octubre 25 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing - ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) conductor volquera, (1) Maestro, (6) oficiales, (6) Ayudantes.
- Personal Interventoria: (1) Ing - Residente, (1) coordinador, (1) topografo, (1) SISO, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Pala, (2) canguros, ((1) vibrocompactador) (1) vibrador de concreto, (1) cortadora, (1) mezcladoras, (1) planta eléctrica, (2) volqueras.
- Actividades: * Continua armado de acero de refuerzo y colocación de formaleta en muros internos del tanque de reuso.
  * Continua armado de gaviones.
  * Ingreso de relleno seleccionado en cancha, se realiza extensión, nivelación y compactación.
  * Colocación, nivelación y compactación de relleno seleccionado en zona de parques.
  * Nivelación de muros del tanque de almacenamiento.

Octubre 26 de 2025 - Domingo.

- Estado del tiempo: soleado. cielo nublado desde 5:00 pm.

No se realizan labores.

Octubre 27 de 2025 - Lunes.

- Estado del tiempo: soleado.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) topografo, (1) Director, (1) Auxiliar, (1) cadenero, (1) Almacenista, (2) operadores, (1) cond. volquera, (1) Maestro, (5) oficiales, (8) Ayudantes, (2) of. lasera.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) topografo

(1) cadenero, (1) SISO.

- Equipo: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) Planta eléctrica, (1) Minicargador, (1) Mini retroexcavadora, (2) conos, (2) vibrador de concreto, (4) Mezcladoras, (2) volquetes, (1) Rana, (1) Cortadora
- Actividades:
  - * Se realiza instalación de relleno seleccionado, extensión y nivelación y compactación en cancha.
  - * Instalación de relleno, nivelación y compactación en zona de parques.
  - * Instalación de losera en parque biosaludable.
  - * Fundida de losa de fondo del tanque de reuso
  - * Encofrado de muros de cuarto de máquinas
  - * Durante la fundida de la losa de fondo del tanque de reuso se realiza aplicación del retardante al concreto impermeabilizado, con el fin de evitar que el proceso de fraguado ocurra antes de terminar el proceso de acabado del fondo y muros del tanque. Se toman 2 cilindros de muestra. Se realizó la fundida con 2 mixer y una autobomba.
  - * Continua armado de graderas.

Octubre 28 de 2025 - Martes

- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) Director, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) Aux SISO, (2) operadores (1) cond. volquetas, (5) oficiales, (9) Ayudantes, (1) Maestro, (2) of. loseras, (1) Ay. loseras.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) Topografo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Motoniveladora, (1) Retroexcavadora, (1) vibrocompactador, (1) Minicargador, (1) Mini retroexcavadora, (1) Planta eléctrica, (2) vibrador de concreto, (1) Cortadora,

Powered by CamScanner

(2) cangure, (1) Rana, (2) volqueta, (4) mezcladoras.

- Actividades: * Se realiza instalación, nivelación y compactación de relleno seleccionado en cancha.
  * Instalación de loseras en zona de parques.
  * Continua armado de gradenes, instalación de alineadores.
  * Instalación, nivelación y compactación de relleno seleccionado en parque biosaludable.
  * Se realiza fundida de muros del parque de almacenamiento se toman 2 cilindros de muestra, se realiza vibrado del concreto.
  * Se realiza limpieza y fundida de muro del cárcamo en zona de parque biosaludable.

Octubre 29 de 2025 - Miercoles.

- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublado, lluvia intensa de 5:30 pm a 6:00 pm., lluvia leve de 6:30 pm a 7:30 pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Aux. SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) cond. volquetas, (2) operadores, (1) Maestro, (6) oficiales, (9) Ayudantes, (2) of. losera.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) topografo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografía, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniretroexcavadora, (1) Plana eléctrica., (2) vibrador de concreto, (1) cortadora, (2) cangure, (1) Rana, (2) volqueta, (4) mezcladoras.
- Actividades: * Continua extensión de relleno sobre cancha.
  * Continua armado de gradenes, instalación Alineadores
  * Instalación de loseras en parque
  * Instalación y compactación de relleno en parque
  * Se realiza retiro de mediacaña del fondo del

tanque de reuso.
* Instalación de formaleta en muros del cuarto de máquinas.
* Limpieza en caicamo de parque biosaludable.
* Se realiza extensión de relleno duros de parque biosaludable
* Desencofrado de muros del tanque de almacenamiento.

Octubre 30 de 2015 - Jueves.
- Estado del tiempo: Nublado. lluvia moderada 7:00 pm a 8:00 pm, lluvia leve 8:00 pm a 9:00 pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) cond. volqueta, (6) oficiales, (9) Ayudantes, (2) of. losera.
- personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (1) SISO.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) miniretroexcavadora, (1) planta eléctrica, (1) luna, (2) canguros, (4) mezcladoras, (2) volquetas, (2) vibrador de concreto, (1) cortadora.
- Actividades:
  * Ingresa losera
  * Se realiza fundida de muro de caicamo en parque biosaludable.
  * Colocación, extensión y compactación de Relleno seleccionado en cancha
  * Continua instalación de formaleta en gradenes.
  * Continua desencofrado de tanques de reuso y desencofrado de muros de tanque de almacenamiento.
  * Instalación de losera en parque

Octubre 31 de 2025 - viernes
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) Ax SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Maestro (1) cond. volquetas, (2) operadores, (6) oficiales, (4) Ayudantes, (2) of. losera.
- Personal Intervención: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) Motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirexcavadora, (1) Rana, (2) conguas, (1) planta eléctrica, (1) compresor, (4) mezcladoras, (2) vibrador de concreto, (2) volquetas.
- Actividades: * Colocación, nivelación y compactación de relleno seleccionado sobre la concha
  * Continua instalación de losera en parque.
  * Continua armado de graderías, instalación de alineadores.
  * Instalación de formaleta en muros del cuarto de máquinas
  * Desencofrado de muros de tanque de almacenamiento

Noviembre 01 de 2025 - sábado.
- Estado del tiempo: Mañana soleado. tarde nublada.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) cond volquetas, (2) operadores, (1) maestro, (6) oficiales, (9) Ayudantes, (2) of losera
- Personal Intervención: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero,
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (1) Rana, (2) conguas, (2) volquetas, (1) compresor, (4) mezcladoras, (1) planta eléctrica, (2) vibrador de concreto.

Powered by CamScanner

•Actividades: * Armado de gradería, se realiza instalación de alineadores, anclajes de acero de refuerzo de grados en columnas, con epóxico.
* Extensión, nivelación y compactación de relleno seleccionado en parques.
* Instalación de loseras en parque biosaludable.
* Instalación de formaleta en muro de tanque de cuarto de máquinas.
* Instalación de relleno seleccionado en cancha.

Noviembre 02 de 2025 - Domingo.
•Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublado.
No se realizaron labores.

Noviembre 03 de 2025 - Lunes festivo
•Estado del tiempo: Soleado.
No se realizan labores.

Noviembre 04 de 2025 - Martes.
•Estado del tiempo: soleado
•Hora inicio: 7:00 Am. •Hora final: 5:00 pm.
• Personal obra: (1) Ing Residente, (1) Director, (1) Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) maestro, (2) of. losera, (6) oficiales, (8) Ayudantes.
•Personal eléctrico: (2) oficiales, (1) Ing. eléctrico.
• Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) planta eléctrica, (1) minicargador, (1) cortadora,

Powered by CamScanner

(1) Rana, (2) canguros, (1) minirretroexcavadora, (4) Mezcladoras, (2) vibrador de concreto., (2) volquetes,

- Actividades: * Se realiza extensión de relleno seleccionado en cancha.
  * Continua armado de graderías, instalación de alineadores y formaleta.
  * Continua instalación de loseras en zona parque.
  * Ubicación de puntos eléctricos en zona de parque biosaludable para puntos de luminarias.
  * Se realiza detallado de acabado de columnas y vigas de graderías.
  * Se realiza instalación de puntos eléctricos provisionales en oficina ubicada en cuarto de eléctrico.
  * Descorfrado de muros internos del parque de almacenamiento.

Noviembre 05 de 2025: Miercoles.

- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora Inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) maestro, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (2) operadores, (7) oficiales, (8) Ayudantes, (2) of. losera.
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) motoniveladora, (2) canguros, (2) volquetes, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) minirretroexcavadora, (4) Mezcladoras, (1) planta eléctrica, (1) cortadora, (2) vibrador de concreto, (1) Rana.
- Actividades: * Se realiza instalación de loseras en zona de parques.
  * Extensión de relleno seleccionado en cancha.
  * Excavación para puntos eléctricos existentes en zona de loseras. Se realiza descubrimiento de la tubería para construcción de registros.
  * Excavación manual de contenedor de raíz en zonas duras.

* Colocación de arena sobre losetas para sello.
* Instalación de ñples en muros del cuarto de máquinas, se realiza instalación de formaleta y nivelación de muros.

Noviembre 06 de 2025. (Jueves).
Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Director, (1)Ing. ambiental, (1)SISO, (1)Aux SISO, (1)Almacenista, (2)Operadores, (1)topógrafo, (1)cadenero, (1)Maestro, (7)oficiales, (6) Ayudantes,
- Personal eléctrico: (2)oficiales eléctricos
- Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1)coordinador, (1) SISO, (1) topógrafo, (1)cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1)Retroexcavadora, (1)Motoniveladora, (1)vibrocompactador, (1)planta eléctrica, (1)minicargador, (1)compactadora, (1)Miniretroexcavadora, (4)Mezcladoras, Esvibrador de concreto, (1)Rana, (2)canguros, (2)volqueta
- Actividades: * Se realiza adecuación de terreno en entrada de la obra, descapote y nivelación de terreno con relleno seleccionado.
  * Excavación de contenedores de raíz en parque biosaludable.
  * Limpieza de confinamiento entre losetas para fundida de bordillos.
  * Colocación de arena de sello sobre las losetas.
  * Continua excavación para descubrir tubería eléctrica en registros de zona de parque biosaludable.
  * Se realiza fundida de muros del cuarto de máquinas, se toman 3 cilindros de muestra, se realiza vibrado del concreto durante el proceso de fundida. Se realiza el vaciado con apoyo de auto bomba.

Powered by CamScanner

* Ingreso de personal para la fundida de gradas. se adelanta proceso de afiliaciones de 7 trabajadores.
* Ingreso de relleno seleccionado en cancha.
* Se realiza detallado de columnas y vigas en graderia.

Noviembre 07 de 2025 - (viernes)

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ambiental, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) maestro, (6) oficiales, (6) Ayudantes, (6) acabados gradas.
- Personal eléctrico: (2) oficiales, (1) Ing. Eléctrico.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) cadenero.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) retroexcavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retro excavadora, (1) planta eléctrica, (1) compresor, (4) mezcladoras, (3) vibrador de concreto, (1) rana, (2) canguros, (2) volqueteo
- Actividades: * Se realiza limpieza de zona de bordillo de confinamiento entre loseras en parque biosaludable.
  * Continua excavación de contenedor de raices en parque.
  * Ingreso de relleno seleccionado a cancha. Se realiza extensión con motoniveladora.
  * Se realiza fundida de graderias con concreto premezclado de 3000 PSI con auto bomba, se realiza vibrado del concreto, nivelado y acabado con Escobar de roxement. Se toman 4 cilindros de muestra.
  * Armado de acero y fundida de 2 contenedores de raiz en parque biosaludable.
  * Toma de detalles en pare inferior de placa de graderias.

Noviembre 08 de 2025 - (sabado).
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 12:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Ing. ambiental, (1) SISO, (1) maestro, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) Almacenista, (6) oficiales, (8) ayudantes, (2) operadores, (1) cond. volquero.
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoria: (1) Ing. Residente, (1) coordinador, (1) Topografo, (1) SISO, (1) cadenero.
- Equipos: Equipo de topografia, (1) Retro excavadora, (1) motoniveladora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) mini retro excavadora, (1) Cortadora, (1) planta eléctrica, (4) mezcladoras, (2) vibradores de concreto, (1) Rana, (2) conguros, (2) volqueros,
- Actividades: * Se realiza drenado de parte interior de placa de gradenas y en columnas y vigas a la vista
  * Armado de formaleta en madera para fundida de registros de 40 x 40 en parque.
  * Descapotado de muros en parque de centro de máquinas y parque de almacenamiento
  * Armado de acero de refuerzo en muros del parque de (almacenamiento) reúso.
  * Instalación de relleno seleccionado en cancha.

Noviembre 09 de 2025 - Domingo.
- Estado del tiempo: Soleado.
No se realizan labores.

Noviembre 10 de 2025 - Lunes
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) Ing. Ambiental, (1) SISO, (1) MAESTRO,

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743002676	9491255748	E	2025/09/10	2025/09/01	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																			$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

2025/09/19 03:02 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1789410323	9492005988	E	2025/09/10	2025/09/19	BANCOLOMBIA		$809,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total		**Afiliados(1)**																				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$104,000
TOTAL				**1**	**$805,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1816499707	9492719517	E	2025/09/10	2025/10/01	BANCOLOMBIA		$6,869,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(8)**																						$21,897,000	$3,503,600			$21,897,000	$876,000			$21,897,000	$876,000			$21,897,000		$1,524,100		$0	$0		$6,779,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,503,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,707,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,524,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,524,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$876,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$756,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$876,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$522,000
TOTAL				**8**	**$6,779,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (3 Afiliados)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
1	CC	77189995	ASCANIO EDWIN	X																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Centro de Trabajo: PROFESIONAL SST (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
3	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total Afiliados(3)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,376,000	$0	$0	$1,376,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$598,600	$0	$0	$598,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$598,600	$0	$0	$598,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$344,000	$0	$0	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$244,000	$0	$0	$244,000
TOTAL				**3**	**$2,662,600**	**$0**	**$0**	**$2,662,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835158055	9493032535	E	2025/10/10	2025/10/07	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1889293803	9494169691	E	2025/10/10	2025/10/30	BANCOLOMBIA		$5,766,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(7)**																				$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,943,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,147,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,280,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,280,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$736,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$736,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$736,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$270,000
TOTAL				**7**	**$5,696,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1789410323	9492005988	E	2025/09/10	2025/09/19	BANCOLOMBIA		$809,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total		**Afiliados(1)**																				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$104,000
TOTAL				**1**	**$805,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1816499707	9492719517	E	2025/09/10	2025/10/01	BANCOLOMBIA		$6,869,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(8)**																						$21,897,000	$3,503,600			$21,897,000	$876,000			$21,897,000	$876,000			$21,897,000		$1,524,100		$0	$0		$6,779,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,503,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,707,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,524,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,524,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$876,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$756,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$876,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$522,000
TOTAL				**8**	**$6,779,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (3 Afiliados)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
1	CC	77189995	ASCANIO EDWIN	X																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Centro de Trabajo: PROFESIONAL SST (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
3	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total Afiliados(3)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,376,000	$0	$0	$1,376,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$598,600	$0	$0	$598,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$598,600	$0	$0	$598,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$344,000	$0	$0	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$244,000	$0	$0	$244,000
TOTAL				**3**	**$2,662,600**	**$0**	**$0**	**$2,662,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835158055	9493032535	E	2025/10/10	2025/10/07	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1889293803	9494169691	E	2025/10/10	2025/10/30	BANCOLOMBIA		$5,766,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(7)**																				$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,943,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,147,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,280,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,280,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$736,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$736,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$736,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$270,000
TOTAL				**7**	**$5,696,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743002676	9491255748	E	2025/09/10	2025/09/01	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																			$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

2025/09/19 03:02 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1816499707	9492719517	E	2025/09/10	2025/10/01	BANCOLOMBIA		$6,869,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(8)**																						$21,897,000	$3,503,600			$21,897,000	$876,000			$21,897,000	$876,000			$21,897,000		$1,524,100		$0	$0		$6,779,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,503,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,707,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,524,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,524,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$876,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$756,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$876,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$522,000
TOTAL				**8**	**$6,779,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (3 Afiliados)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000		$355,000		$0	$0		$1,579,000
1	CC	77189995	ASCANIO EDWIN	X																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Centro de Trabajo: PROFESIONAL SST (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000		$243,600		$0	$0		$1,083,600
3	CC	1109383879	TERRAZA MALKY																		23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF15	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total Afiliados(3)																							$8,600,000	$1,376,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000	$344,000			$8,600,000		$598,600		$0	$0		$2,662,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1843741159	9493163076	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$2,662,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,376,000	$0	$0	$1,376,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$598,600	$0	$0	$598,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$598,600	$0	$0	$598,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$344,000	$0	$0	$344,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$344,000	$0	$0	$344,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$244,000	$0	$0	$244,000
TOTAL				**3**	**$2,662,600**	**$0**	**$0**	**$2,662,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835158055	9493032535	E	2025/10/10	2025/10/07	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1889293803	9494169691	E	2025/10/10	2025/10/30	BANCOLOMBIA		$5,766,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO R 5 (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																							$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100
1	CC	1010148149	BRITO JOSE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	CCFC55	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1082961179	CARRILLO HILLARY																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
3	CC	77146893	CARRILLO JORGE																		230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF15	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	6.960%	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
4	CC	19691435	CERVANTES JESUS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF15	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1118854724	SALAS NICOLAS																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF15	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	9149244	TORRES ARNOLD																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1119838992	VENCE MARIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(7)**																				$18,397,000	$2,943,600			$18,397,000	$736,000			$18,397,000	$736,000			$18,397,000		$1,280,500		$0	$0		$5,696,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,943,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,347,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,147,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,280,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,280,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$736,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$736,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$736,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$120,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$232,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$270,000
TOTAL				**7**	**$5,696,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743002676	9491255748	E	2025/09/10	2025/09/01	NEQUI		$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																					**$1,500,000**	**$240,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,500,000**		**$7,900**		**$0**	**$0**		**$367,900**
1	CC	1065575056	CAMPO GLEIMYS																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Total		**Afiliados(1)**																			$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**1**	**$367,900**

2025/09/19 03:02 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901347645	9	H&Q INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CL 18 E BIS 34 A BIS 1 61 CON DON JOSE	VALLEDUPAR-CESAR	5871186	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1789410323	9492005988	E	2025/09/10	2025/09/19	BANCOLOMBIA		$809,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO VALLEDUPAR 5 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1065611177	HERNANDEZ EDUARDO																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total		**Afiliados(1)**																				$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$104,000
TOTAL				**1**	**$805,000**

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO URBANOS 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	MES 8	MES 9					MES 10					MES 11				
					Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55
				10 de marzo al 3 de noviembre	Seamana del 3 al 5 de noviembre	Semana del 5 al 12 de noviembre	Semana del 12 al 19 de noviembre	Semana del 19 al 26 de noviembre	Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre	Semana del 3 al 5 de diciembre	Semana del 5 al 12 de diciembre	Semana del 12 al 19 de diciembre	Semana del 19 al 26 de diciembre	Semana del 26 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 25 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero
1	**OBRAS PRELIMINARES**		**$ 104.427.640,61**																	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	$ 104.427.640,61	$ 96.076.235,00	$ 2.783.801,87	$ 2.783.801,87	$ 2.783.801,87													
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		**$ 2.009.108.440,27**																	
2.1	EXCAVACION A MAQUINA PARA NIVELACION DE TERRENO. INCL RETIRO	M3	$ 90.279.889,92	$ 10.699.130,88	$ 18.700.000,00	$ 14.600.000,00	$ 12.200.000,00	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90	$ 3.408.075,90			
2.2	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES. INCL RETIRO	M3	$ 36.412.530,75	$ 36.412.530,75																
2,3	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	$ 1.858.259.470,00	$ 1.616.468.910,56	$ 40.298.426,57	$ 40.298.426,57	$ 40.298.426,57	$ 40.298.426,57	$ 40.298.426,57	$ 40.298.426,57										
2,4	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	$ 24.156.549,60						$ 8.052.183,20	$ 8.052.183,20	$ 8.052.183,20									
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		**$ 2.394.443.201,49**																	
3,1	SOLADO EN CONTRETO DE 2500 PSI	M3	$ 28.247.742,70	$ 12.570.578,35	$ 15.677.164,35															
3,2	ACERO f'C 60000 PSI	KG	$ 628.932.398,00	$ 508.512.278,27	$ 60.210.059,87	$ 30.105.029,93	$ 7.526.257,48	$ 7.526.257,48	$ 7.526.257,48	$ 7.526.257,48										
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	$ 55.527.043,95	$ 39.716.959,73	$ 15.810.084,22															
3,4	VIGAS DE CIMENTACION DE 3500 PSI	M3	$ -																	
3,5	COLUMNAS EN CONCRETO DE DE 3500 PSI	M3	$ -																	
3,6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI E:10CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm	M2	$ 30.806.592,67	$ 4.499.684,41					$ 8.768.969,42	$ 8.768.969,42	$ 8.768.969,42									
3,7	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	$ -																	
3,8	GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ 88.494.267,40		$ 88.494.267,40															
3,9	ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	$ -																	
3.10	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:15CM	M2	$ -																	
3.11	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 15 CM SIN ACERO DE REFUERZO	M2	$ -																	
3.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 3000 PSI 25x20CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	$ 42.117.101,07									$ 10.529.275,27	$ 10.529.275,27				$ 10.529.275,27	$ 10.529.275,27		
3.13	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 15 CM x 20 CM	ML	$ 85.919.387,82	$ 40.618.127,73	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01	$ 4.530.126,01						
3.14	CONTENEDORES DE RAIZ EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO (PROFUNDIDAD DE 1.3 Y E:20 CM)	ML	$ 160.004.756,80			$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68	$ 16.000.475,68					
3.15	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E:10 CM PINTADA, INCLUYE MALLA DE ACERO	M2	$ 111.205.331,11									$ 27.801.332,78	$ 27.801.332,78				$ 27.801.332,78	$ 27.801.332,78		
3.16	RAMPA EN CONCRETO	M2	$ 61.942.178,55									$ 20.647.392,85	$ 20.647.392,85				$ 20.647.392,85			
3.17	LOSA PARQUEADERO EN CONCRETO DE 3000 PSI H=12 CM, INCLUYE REFUERZO Y TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE	M2	$ -																	
3.18	PLACA MACIZA PARA MESONES Y VESTIERES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.07X0.60m, REFORZADA	ML	$ 4.336.296,60										$ 2.168.148,30	$ 2.168.148,30						
3.19	PLACA DE FONDO MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO E IMPERMEABILIZADO H/.30	M2	$ -																	
3.20	MURO EN CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO-ESPESOR .30CM-IMPERMEABILIZADO	M2	$ -																	
3.21	PLACA SUPERIOR MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO H/.30	M2	$ -																	
NP. 3.22	VIGAS DE CIMENTACION DE 4000 PSI	M3	$ 131.018.072,80	$ 131.018.072,80																
NP. 3.23	COLUMNAS EN CONCRETO DE DE 4000 PSI	M3	$ 70.364.520,99	$ 53.879.098,99						$ 16.485.422,00										
NP. 3.24	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 50.146.319,16	$ 31.051.198,81				$ 9.547.560,17	$ 9.547.560,17											
NP. 3.25	ESCALERAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	$ 7.757.424,48	$ 2.334.298,97								$ 5.423.125,51								
NP. 3.26	PLACA MACIZA DE ENTREPISO E:15CM EN CONCRETO DE 4000 PSI	M2	$ 30.677.128,05	$ 30.677.128,05																
NP. 3.27	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CERRAMIENTO	M3	$ 158.620.023,60						$ 79.310.011,80	$ 79.310.011,80										
NP. 3.28	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUES SUBTERRANEOS. NO INCLUYE ACERO	M3	$ 321.089.399,04	$ 77.980.346,10	$ 48.621.810,59	$ 48.621.810,59	$ 48.621.810,59	$ 48.621.810,59			$ 48.621.810,59									
NP. 3.29	LOSA PARQUEADERO EN CONCRETO DE 3500 PSI H=17 CM, INCLUYE REFUERZO Y TEXTURIZADO DE LA SUPERFICIE	M2	$ 327.237.216,70								$ 65.447.443,34	$ 65.447.443,34	$ 65.447.443,34	$ 65.447.443,34		$ 65.447.443,34				
4	**MAMPOSTERIA**		**$ 72.034.668,40**																	
4.1	MURO EN BLOQUE ABUJARDADO	M2	$ 39.252.024,62	$ 28.909.786,12							$ 5.171.119,25	$ 5.171.119,25								
4.2	MURO EN LADRILLO H-10	M2	$ 11.624.312,28								$ 5.812.156,14	$ 5.812.156,14								
4.3	PAÑETE EN MORTERO 1:4	M2	$ 12.551.832,50	$ 1.702.726,25							$ 5.424.553,13	$ 5.424.553,13								
4.4	ESTUCO ACRILICO	M2	$ 4.949.788,55													$ 2.474.894,28	$ 2.474.894,28			
4.5	PINTURA TIPO I PARA INTERIOR 3 MANOS	M2	$ 3.656.710,45													$ 1.828.355,23	$ 1.828.355,23			
5	**CARPINTERIA METALICA**		**$ 2.675.100.178,73**																	
5.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON ALTURA DE 5.0MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2.5mm Y MARCO DE FIJACIÓN EN ANGULO DE 1.1/2"x3/16", SEGÚN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2.1/2" E=2.5mm	ML	$ 487.040.563,20	$ 275.164.160,00							$ 30.268.057,60	$ 30.268.057,60	$ 30.268.057,60	$ 30.268.057,60		$ 30.268.057,60	$ 30.268.057,60	$ 30.268.057,60		
5,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON ALTURA DE 2.5MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2.5mm Y MARCO DE FIJACIÓN EN ANGULO DE 1.1/2"x3/16", SEGÚN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2.1/2" E=2.5mm	ML	$ 921.111.930,36	$ 314.621.185,54							$ 86.641.534,97	$ 86.641.534,97	$ 86.641.534,97	$ 86.641.534,97		86641534,97	86641534,97	86641534,97		
5.3	BARANDA METALICA PARA GRADERIAS CON TURERIA Y TRAVESAÑO	ML	$ 122.504.604,72														$ 40.834.868,24	$ 40.834.868,24	$ 40.834.868,24	
5.4	ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS, CERCHAS Y CORREAS, INCLUYE MANOFACTURA, FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO	KG	$ 659.854.742,27	$ 122.824.080,00								$ 89.505.110,38	$ 89.505.110,38	$ 89.505.110,38			$ 89.505.110,38	$ 89.505.110,38	$ 89.505.110,38	
5,5	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	M2	$ 59.441.455,38																$ 59.441.455,38	
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA EN TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 4" PARA CANCHA, INCLUYE MALLA	UND	$ 15.842.034,00															$ 15.842.034,00		
5,7	ESTRCUTURA METALICA EN PERFILERIA IPE, COLUMNAS EN TUBERIA METALICA REDONDA, INCLUYE MANOFACTURA, FIGURACIÓN E IZAJE, SOLDADURA, PLATINAS DE	KG	$ 409.304.848,80																	

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO URBANOS 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	MES 8	MES 9					MES 10					MES 11				
					Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55
				10 de marzo al 3 de noviembre	Seamana del 3 al 5 de noviembre	Semana del 5 al 12 de noviembre	Semana del 12 al 19 de noviembre	Semana del 19 al 26 de noviembre	Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre	Semana del 3 al 5 de diciembre	Semana del 5 al 12 de diciembre	Semana del 12 al 19 de diciembre	Semana del 19 al 26 de diciembre	Semana del 26 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 25 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero
	ANCLAJE, ELEMENTOS DE FIJACION Y CONEXIONES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE - SEGÚN DISEÑO			$ 160.472.448,00								$ 49.766.480,16	$ 49.766.480,16	$ 49.766.480,16			$ 49.766.480,16	$ 49.766.480,16		
6	**OBRAS DE URBANISMO**		**$ 1.362.367.426,83**																	
6.1	PISO LOSETA CEMENTO DE 40x40	M2	$ 415.503.520,63	$ 118.640.219,89	$ 53.061.837,56	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90	$ 30.475.182,90							
6.2	GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA O SIMILAR	M2	$ 774.537.600,00													$ 193.634.400,00	$ 193.634.400,00	$ 193.634.400,00	$ 193.634.400,00	
6.3	CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL	ML	$ 35.620.509,20														$ 17.810.254,60	$ 17.810.254,60		
6.4	CANECAS PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 16.340.776,00															$ 8.170.388,00	$ 8.170.388,00		
6.5	BANCAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 2000 PSI	UND	$ 24.715.356,00															$ 12.357.678,00	$ 12.357.678,00	
6.6	PARQUE INFANTIL REF MPM 369 ME. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI	UND	$ 50.916.969,00														$ 25.458.484,50	$ 25.458.484,50		
6.7	MODULO DE JUEGO BIO SALUDABLE DE 12 MAQUINAS Y VALLA. . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION Y CONCRETO PARA ANCLAJE DE 2000 PSI	UND	$ -																	
6.8	MODULO DE JUEGO EN ESTRUCUTRA POLIEDRICA METALICO	UND	$ -																	
6.9	GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES	M2	$ -																	
6.10	BUTACA O SILLA PARA ESTADIO ESPALDAR ALTO	UND	$ 43.019.648,00														$ 21.509.824,00	$ 21.509.824,00		
6.11	CICLOPARQUEADERO EN TUBERIA METALICA.	M2	$ 1.713.048,00															$ 1.713.048,00		
6.12	EMPRADIZACION, INCLUYE PASTO, TIERRA NEGRA E=0.20M Y MANO DE OBRA	M2	$ -																	
7	**ACABADOS**		**$ 318.290.357,43**																	
7.1	ENCHAPES PARA MURO	M2	$ 25.149.060,72										$ 8.383.020,24			$ 8.383.020,24	$ 8.383.020,24			
7.2	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	$ 14.004.059,40													$ 7.002.029,70	$ 7.002.029,70			
7.3	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 40.046.850,00														$ 20.023.425,00	$ 20.023.425,00		
7.4	LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 15.138.725,00														$ 7.569.362,50	$ 7.569.362,50		
7.5	ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA	UND	$ 12.764.620,00														$ 6.382.310,00	$ 6.382.310,00		
7.6	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 4.195.367,00															$ 4.195.367,00		
7.7	INSTALACION DE ESPEJO CRISTAL 3mm	M2	$ 1.280.877,84																$ 1.280.877,84	
7.8	REJILLAS DE PISO SOSCO 3 X 2 EN ALUMINIO	UND	$ 1.333.975,00														$ 1.333.975,00			
7.9	PUERTAS EN HOJA Y MARCO EN ALUMINIO	M2	$ 9.395.508,00															$ 4.697.754,00	$ 4.697.754,00	
7.10	VENTANAS CON MARCO DE ALUMINO ANODIZADO	M2	$ 2.138.076,00															$ 1.069.038,00	$ 1.069.038,00	
7.11	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 108.738.104,05													$ 36.246.034,68	$ 36.246.034,68	$ 36.246.034,68		
7.12	MESON EN POLICUARZO	ML	$ 14.982.276,48													$ 7.491.138,24	$ 7.491.138,24			
7.13	PUERTA DE MARCO METALICO DE ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIO	M2	$ 15.679.072,00														$ 7.839.536,00	$ 7.839.536,00		
7.14	ESCOTILLA METALICA CALIBRE 14 INCLUYE MARCO Y ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO	M2	$ 16.214.400,86	$ 8.107.200,43							$ 8.107.200,43									
7.15	DUCHAS LINEA ECONO	UND	$ 1.863.288,00															$ 1.863.288,00		
7.16	KIT DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA PMR	UND	$ 3.401.870,00															$ 3.401.870,00		
7.17	KIT TELEDUCHA CON MONOCONTROL PARA PMR	UND	$ 942.915,00															$ 942.915,00		
7.18	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA PMR	UND	$ 1.973.364,00															$ 1.973.364,00		
7.19	CIELO RASO PVC BLANCO LISO, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION	M2	$ 29.047.948,08												$ 9.682.649,36	$ 9.682.649,36	$ 9.682.649,36			
8	**SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		**$ 2.629.562.989,88**																	
8,1	DOS (2) ELECTROBOMBAS PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICOY APOYO EN CONCRETO 3000PSI	UND	$ 96.714.547,00													$ 48.357.273,50	$ 48.357.273,50			
8,2	TUBERIA DE 1/2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 1.166.482,80						$ 583.241,40	$ 583.241,40										
8,3	TUBERIA DE 3/4" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 497.766,66						$ 248.883,33	$ 248.883,33										
8,4	TUBERIA DE 1" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 586.614,60						$ 293.307,30	$ 293.307,30										
8,5	TUBERIA DE 1 1/4" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 1.853.629,44						$ 926.814,72	$ 926.814,72										
8,6	TUBERIA DE 1 1/2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 23.904.524,60						$ 5.976.131,15	$ 5.976.131,15	$ 5.976.131,15	$ 5.976.131,15								
8,7	TUBERIA DE 2" PARA SUMINISTRO DE AGUA	ML	$ 2.896.534,80							$ 965.511,60	$ 965.511,60	$ 965.511,60								
8,8	TUBERIA DE 3" PARA SUMINISTRO DE AGUA	UND	$ 26.676.604,00											$ 26.676.604,00						
8,9	MACROMEDIDOR DE AGUA ø 2"	UND	$ 8.840.571,00																$ 8.840.571,00	
8.10	VALVULA DE CIERRE Y CHEQUE 2"	UND	$ 1.561.070,00									$ 1.561.070,00								
8,11	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1 1/2 CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 2.902.514,00							$ 2.902.514,00										
8,12	CAJAS DE REGISTRO DE 80X80CM	UND	$ 4.347.980,00								$ 2.173.990,00	$ 2.173.990,00								
8,13	CAJAS DE REGISTRO DE 100X100CM	UND	$ 9.080.806,00								$ 4.540.403,00	$ 4.540.403,00								
8,14	PUNTOS SANITARIOS DE 2"	UND	$ 2.974.770,00								$ 2.974.770,00									
8,15	PUNTOS SANITARIOS DE 4"	UND	$ 1.278.870,00								$ 1.278.870,00									
8,16	TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 4.967.353,50							$ 2.483.676,75	$ 2.483.676,75									
8,17	TUBERIA SANITARIA DE 3" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 2.722.076,00							$ 1.361.038,00	$ 1.361.038,00									
8,18	TUBERIA SANITARIA DE 4" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 8.901.316,25	$ 2.613.835,00						$ 3.143.740,63	$ 3.143.740,63									
8,19	ELECTROBOMBAS DE ALTA PRESION PARA CUARTO DE MAQUINAS INCLUYES ACCESORIOS	UND	$ 287.827.758,00															$ 143.913.879,00	$ 143.913.879,00	
8,20	TANQUE HIDROACUMULADOR VERTICAL	UND	$ 8.936.301,00															$ 4.468.150,50	$ 4.468.150,50	

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO URBANOS 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	MES 8	MES 9					MES 10					MES 11				
					Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55
				10 de marzo al 3 de noviembre	Seamana del 3 al 5 de noviembre	Semana del 5 al 12 de noviembre	Semana del 12 al 19 de noviembre	Semana del 19 al 26 de noviembre	Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre	Semana del 3 al 5 de diciembre	Semana del 5 al 12 de diciembre	Semana del 12 al 19 de diciembre	Semana del 19 al 26 de diciembre	Semana del 26 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 25 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero
8,21	TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO INCLUYE PORTA FUSIBLES Y MONITOR DE VOLTAJE	UND	$ 33.226.461,00															$ 16.613.230,50	$ 16.613.230,50	
8,22	TUBERIA 3" RDE 41, INCLUYE ACCESORIOS Y ACOMETIDA	ML	$ -																	
8,23	LLAVE 3" TIPO WAFER CON ACEESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.825.177,00															$ 3.825.177,00		
8,24	VALVULAS DE PURGA DE 3"	UND	$ 1.654.593,00															$ 1.654.593,00		
8,25	ASPERSORES DE 3/4"	UND	$ -																	
8,26	CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	M3	$ -																	
8,27	TAPA METALICA DE 60X60 CON MANIJA EN LAMINA COL ROLLED	UND	$ 481.674,00								$ 481.674,00									
8,28	TUBERIA DE DRENAJE DIAM. 4" PERFORADA	ML	$ 75.624.912,40								$ 37.812.456,20	$ 37.812.456,20								
8,29	TUBERIA DE DRENAJE DIAM. 6" PERFORADA	ML	$ 26.836.544,00								$ 13.418.272,00	$ 13.418.272,00								
8,30	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE CAPA DE GRAVILLA ESPESOR 0.20 MTS	M3	$ 451.065.973,87										$ 225.532.986,94	$ 225.532.986,94						
8,31	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE ARENA GRUESA ESPESOR 0.2 M	M3	$ 281.544.340,00										$ 140.772.170,00	$ 140.772.170,00						
8,32	TUBERIA SANITARIA DE 6" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ -																	
8,33	TUBERIA C900 DE 4" PARA RCI	ML	$ 100.886.230,80									$ 50.443.115,40	$ 50.443.115,40							
8,34	ACCESORIOS C900 ø4"	UND	$ 9.955.890,00									$ 4.977.945,00	$ 4.977.945,00							
8,35	GABINETES TIPO 2	UND	$ 6.327.938,00														$ 6.327.938,00			
8,36	SIAMESA EN BRONCE ø4"	UND	$ 2.078.556,00														$ 2.078.556,00			
8,37	VALVULA DE CHEKE ø4"	UND	$ 2.672.989,00														$ 2.672.989,00			
8,38	TRANSICIONES DE PVC A SH10	UND	$ 3.433.356,00														$ 3.433.356,00			
8,39	TUBERIA AGUA LLUVIA DE 6" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	ML	$ 61.610.196,60								$ 15.402.549,15	$ 15.402.549,15	$ 15.402.549,15	$ 15.402.549,15						
8,40	CANALETA METALICA CALIBRE 14 CON SOPORTE TIPO PALOMERA PARA AGUA LLUVIAS	ML	$ 21.560.892,00																$ 21.560.892,00	
8,41	CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS 0,30 X H VARIABLE MAXIMO 0,45 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON REJILLA METALICA EN PERFIL CALIBRE 14	ML	$ 91.111.021,20	$ 23.608.422,00				$ 11.250.433,20	$ 11.250.433,20		$ 11.250.433,20	$ 11.250.433,20				$ 11.250.433,20	$ 11.250.433,20			
8,42	INSTALACIONE DE CUARTO DE MAQUINAS	M2	$ 50.861.600,00														$ 25.430.800,00	$ 25.430.800,00		
8,43	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100x100x100CM (INTERNA), EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS.	UND	$ 2.046.117,00										$ 2.046.117,00							
8,44	CANAL PERIMETRAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3.000 PSI PARA DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA, Incluye acero de refuerzo y tapa.	ML	$ 202.537.500,00													$ 67.512.500,00	$ 67.512.500,00	$ 67.512.500,00		
8,45	GEOTEXTIL SOBRE TERRENO Y LECHO FILTRANTE	M2	$ 122.290.565,60											$ 61.145.282,80	$ 61.145.282,80					
8,46	GEODREN PLANAR	M2	$ 434.002.800,00										$ 217.001.400,00	$ 217.001.400,00						
8,47	ASPERSOR METALICO DE 3/4"	UND	$ -																	
8,48	RED SUMINISTRO EN MANGUERA DE POLIETILENO 3/4 (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE) PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ML	$ -																	
8,49	RED SUMINISTRO EN MANGUERA DE POLIETILENO 2" (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE) PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	ML	$ -																	
NP. 8,50	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA DE 90MM DE POLIETILENO PN10 RDE 17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 27.061.216,16										$ 13.530.608,08	$ 13.530.608,08						
NP. 8,51	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA 63MM POLIETILENO PN10 RDE17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 12.401.241,60											$ 6.200.620,80	$ 6.200.620,80					
NP. 8,52	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA 32MM POLIETILENO PN10 RDE17 PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA (INCLUYE EXCAVACION Y TAPE)	ML	$ 20.976.480,00													$ 20.976.480,00				
NP. 8,53	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1-1/4"	UND	$ 2.940.015,00									$ 2.940.015,00								
NP. 8,54	PUNTO DE AGUA POTABLE DE 1/2"	UND	$ 4.602.944,00									$ 4.602.944,00								
NP. 8,55	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 2" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 1.155.588,00								$ 577.794,00	$ 577.794,00								
NP. 8,56	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1-1/4" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 740.866,00								$ 370.433,00	$ 370.433,00								
NP. 8,57	VALVULA DE CORTE EN BRONCE 1" CON TAPA DE 20x20 CM	UND	$ 608.672,00								$ 304.336,00	$ 304.336,00								
NP. 8,58	POZO DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO hpm = 1,70 m	UND	$ 18.179.732,00		$ 9.089.866,00	$ 9.089.866,00														
NP. 8,59	TUBERIA DE PVC CON SISTEMA DE UNION MECANICA, CAMPANA ESPIGO CON HIDROSELLO, DE PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, DE DIÁMETRO 6" (160 MM).	ML	$ 24.743.966,00		$ 12.371.983,00	$ 12.371.983,00														
NP. 8,60	NIPLE PASAMURO Ø1" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 1.808.496,00				$ 904.248,00	$ 904.248,00												
NP. 8,61	NIPLE PASAMURO Ø1-1/2" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 742.564,00				$ 371.282,00	$ 371.282,00												
NP. 8,62	NIPLE PASAMURO Ø2" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 5.115.540,00				$ 2.557.770,00	$ 2.557.770,00												
NP. 8,63	NIPLE PASAMURO Ø3" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 4.220.930,00				$ 2.110.465,00	$ 2.110.465,00												
NP. 8,64	NIPLE PASAMURO Ø4" L=50 CM RM X RM EN A/C SCH 40 Z = 25 CM	UND	$ 6.023.274,00				$ 3.011.637,00	$ 3.011.637,00												
NP. 8,65	ASPERSOR METALICO DE 1"	UND	$ 13.968.048,00														$ 13.968.048,00			
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		**$ 1.442.862.322,04**																	
9,1	**ACOMETIDA DE BAJA TENSION**		**$ 337.530.362,00**																	
9.1.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 1X(3F # 4/0 + 1N # 4/0 + 1# 2/0 T CU AWG) Tubo 4" IMC + 2X4" PVC DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA PROTECCIÓN PRINCIPAL DE TABLERO GENERAL. INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 36.325.600,00	$ 8.718.144,00												$ 27.607.456,00				
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PARA ACOMETIDA PRINCIPAL EN TUBERIA IMC 4". INCLUYE CAPACETE	UND	$ 2.420.042,00													$ 2.420.042,00				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SUBTERRANEA PARA ACOMETIDA PRINCIPAL EN TUBO CONDUIT PVC DE 2X4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 7.236.160,00	$ 5.065.312,00												$ 2.170.848,00				
9.1.4	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TI CONTROL ILUMINACION, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 1/0 (F)+ 1No 1/0 (N) + 1No 2(T) EN TUB. PVC DE 3". INCLUYE	ML	$ 3.880.866,00																	

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO URBANOS 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	MES 8	MES 9					MES 10					MES 11				
					Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55
				10 de marzo al 3 de noviembre	Seamana del 3 al 5 de noviembre	Semana del 5 al 12 de noviembre	Semana del 12 al 19 de noviembre	Semana del 19 al 26 de noviembre	Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre	Semana del 3 al 5 de diciembre	Semana del 5 al 12 de diciembre	Semana del 12 al 19 de diciembre	Semana del 19 al 26 de diciembre	Semana del 26 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 25 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero
	EXCAVACION			$ 1.293.622,00					$ 1.293.622,00		$ 1.293.622,00									
9.1.5	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TIEXTERIOR, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 8 (F)+ 1No 8 (N) + 1No 10 (T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 3.770.445,00	$ 502.726,00					$ 1.633.859,50		$ 1.633.859,50									
9.1.6	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TBOMBAS, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 6(F)+ 1No 6(N) + 1No 8(T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 49.663.290,00	$ 5.842.740,00					$ 21.910.275,00		$ 21.910.275,00									
9.1.7	ACOMETIDA SUBTERRANEA SENCILLA DE TG A TCAMERINOS, EN CABLE DE COBRE THHN EN 3No 8(F)+ 1No 8 (N) + 1No 10 (T) EN TUB. PVC DE 1". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 18.140.275,00	$ 5.335.375,00					$ 6.402.450,00		$ 6.402.450,00									
9.1.8	ACOMETIDA SENCILLA PARA TOMAS DOBLES DE 220 VOLTIOS EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1T #12 EN TUB. PVC DE 3/4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 4.037.120,00						$ 2.018.560,00		$ 2.018.560,00									
9.1.9	ACOMETIDA SENCILLA PARA TOMAS GFCI EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. PVC DE 3/4". INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 3.784.920,00						$ 1.892.460,00		$ 1.892.460,00									
9.1.10	ACOMETIDA SENCILLA PARA LAMPARAS HERMETICAS DE 40W EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. EMT 1/2	ML	$ 16.079.470,00										$ 8.039.735,00	$ 8.039.735,00						
9.1.11	ACOMETIDA SENCILLA PARA LAMPARAS WALLPACK 30W EN CABLE DE COBRE THHN EN 1F #12 + 1N #12 + 1T #12 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1/2	ML	$ 3.748.160,00										$ 1.874.080,00	$ 1.874.080,00						
9.1.12	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA LED JETTA 100W EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1T #10 EN TUB. PVC CONDUIT DE 3/4	ML	$ 16.631.520,00										$ 8.315.760,00	$ 8.315.760,00						
9.1.13	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA SYLFLOOD PRO 800W MASTILES 1 Y 2 EN CABLE DE COBRE THHN EN 3F #6 + 1N #6 + 1T #8 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1"	ML	$ 35.971.660,00										$ 17.985.830,00	$ 17.985.830,00						
9.1.14	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA SYLFLOOD PRO 800W MASTILES 3 Y 4 EN CABLE DE COBRE THHN EN 3F #4 + 1N #4 + 1T #6 EN TUB. PVC CONDUIT DE 1 1/2"	ML	$ 87.726.800,00										$ 43.863.400,00	$ 43.863.400,00						
NP. 9.1.15	ACOMETIDA SENCILLA PARA LUMINARIA LED STREET DE 35W EN CABLE DE COBRE THHN EN 2F #10 + 1N #10 + 1T #12 EN TUB. PVC 3/4	ML	$ 48.114.034,00										$ 24.057.017,00	$ 24.057.017,00						
9,2	**PUESTAS A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**		**$ 76.312.283,00**																	
9.2.1	MALLA DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL	UND	$ 7.395.359,00	$ 7.395.359,00																
9.2.2	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACION	ML	$ 43.011.150,00													$ 43.011.150,00				
9.2.3	SUMINISTRO DE SOLDADURA CADWELD DE 90 GRAMOS PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO	UND	$ 1.979.512,00													$ 1.979.512,00				
9.2.4	SUMINISTRO DE HIDROSOLTA DE 15 KG PARA SISTEMA DE INTERCONEXION APANTALLAMIENTO	UND	$ 4.484.844,00													$ 4.484.844,00				
9.2.5	PUESTA A TIERRA PARA MASTILES CON PUNTAS FRANKLIN	UND	$ 9.549.712,00													$ 9.549.712,00				
9.2.6	PUESTA A TIERRA PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 1.896.121,00													$ 1.896.121,00				
9.2.7	SUMINISTRO DE ALAMBRON EN 8MM PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	ML	$ 5.465.400,00													$ 5.465.400,00				
9.2.8	SUMINISTRO DE PUNTAS CAPTADORAS PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 1.565.787,00													$ 1.565.787,00				
9.2.9	REGISTRO DE INSPECCION DE 40x40 PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO PARA LA CUBIERTA DE LAS GRADERIAS	UND	$ 964.398,00													$ 964.398,00				
9,3	**REGISTROS DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO**		**$ 29.913.551,00**																	
9.3.1	REGISTRO DE BAJA TENSION DE 50X50 CMS SB325	UND	$ 21.324.315,00	$ 14.216.210,00	$ 1.777.026,25		$ 1.777.026,25		$ 1.777.026,25		$ 1.777.026,25									
9.3.2	REGISTRO DE BAJA TENSION DE 1X1X1 MTS SB300	UND	$ 8.589.236,00	$ 4.294.618,00	$ 1.073.654,50		$ 1.073.654,50		$ 1.073.654,50		$ 1.073.654,50									
9,4	**TRANSFORMADOR Y RED DE MEDIA TENSION**		**$ 151.463.695,04**																	
9.4.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA; 13200/214/120 VOLTIOS	UND	$ 36.663.071,00	$ 36.663.071,00																
9.4.2	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 735 Dan. Incluye cimentacion	UND	$ 6.450.021,00	$ 6.450.021,00																
9.4.3	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 735 Dan. Incluye cimentacion	UND	$ 4.731.568,00	$ 4.731.568,00																
9.4.4	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 1600 Dan. INCLUYE CIMENTACION	UND	$ 11.197.396,00	$ 11.197.396,00																
9.4.5	POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS X 1600 Dan. INCLUYE CIMENTACION	UND	$ 7.483.436,00	$ 7.483.436,00																
9.4.6	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO ANGULO TRIFASICA 134MT	UND	$ 3.917.233,00	$ 3.917.233,00																
9.4.7	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO ALINEACION TRIFASICA 132MT	UND	$ 2.064.120,00	$ 2.064.120,00																
9.4.8	ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO FIN DE LINEA TRIFASICA 331MT	UND	$ 4.821.212,00	$ 2.410.606,00	$ 2.410.606,00															
9.4.9	RETENIDA DIRECTA A TIERRA PRIMARIA CON AISLADOR TENSOR DE 4 1/4", AMARRES PREFORMADOS PARA RETENIDAS, PLETINA DE SUJECIÓN, GRILLETE, GUARDACABOS Y VARILLA DE ANCLAJE 5/8" X 1,8 MTS Y CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" X 13.000KG	UND	$ 2.998.598,00	$ 2.998.598,00																
9.4.10	PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN	UND	$ 2.906.391,00	$ 968.797,00	$ 484.398,50	$ 484.398,50	$ 484.398,50									$ 484.398,50				
9.4.11	PUENTES EN POSTE DE M.T. TRIFASICOS EN CALIENTE	UND	$ 2.693.033,00															$ 2.693.033,00		
9.4.12	TENDIDO CABLE ACSR 1/0	ML	$ 65.537.616,04	$ 44.199.092,00	$ 5.334.631,01	$ 5.334.631,01	$ 5.334.631,01									$ 5.334.631,01				
9,5	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**		**$ 25.689.578,00**																	
9.5.1	TABLERO DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION EXTERIOR TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON PUERTA	UND	$ -																	
9.5.2	TABLERO DE DISTRIBUCION ILUMINACION TDI DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	$ -																	
9.5.3	TABLERO GENERAL TRIFASICO. INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 8.944.770,00														$ 4.472.385,00	$ 4.472.385,00		
9.5.4	TABLERO DE DISTRIBUCION TD MASTILES	UND	$ 2.541.052,00													$ 2.541.052,00				
9.5.5	TABLERO DE DISTRIBUCION TD CAMERINOS	UND	$ 1.849.447,00																	

REPROGRAMACION DE OBRA No. 4

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO URBANOS 2025**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	MES 8	MES 9					MES 10					MES 11				
					Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55
				10 de marzo al 3 de noviembre	Seamana del 3 al 5 de noviembre	Semana del 5 al 12 de noviembre	Semana del 12 al 19 de noviembre	Semana del 19 al 26 de noviembre	Semana del 26 de noviembre al 3 de diciembre	Semana del 3 al 5 de diciembre	Semana del 5 al 12 de diciembre	Semana del 12 al 19 de diciembre	Semana del 19 al 26 de diciembre	Semana del 26 de diciembre al 2 de enero	Semana del 2 al 4 de enero	Semana del 4 al 11 de enero	Semana del 11 al 18 de enero	Semana del 18 al 25 de enero	Semana del 25 de enero al 1 febrero	Semana del 1 al 8 de febrero
9.5.5	TABLERO DE DISTRIBUCION TD CAMERINOS	UND	$ 1.849.447,00													$ 1.849.447,00				
9.5.6	TABLERO DE DISTRIBUCION TDBOMBAS	UND	$ 743.999,00													$ 743.999,00				
NP. 9.5.7	TABLERO CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR	UND	$ 2.054.125,00													$ 2.054.125,00				
NP. 9.5.8	TABLERO CONTROL DE ILUMINACION CANCHA	UND	$ 9.556.185,00													$ 9.556.185,00				
9,6	**SALIDAS DE LUCES Y TOMAS EN CAMERINOS**		**$ 29.410.760,00**																	
9.6.1	SALIDAS PARA TOMAS DOBLES DE 220 VOLTIOS	UND	$ 365.974,00															$ 365.974,00		
9.6.2	SALIDAS PARA TOMAS GFCI	UND	$ 1.896.512,00															$ 1.896.512,00		
9.6.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UND	$ 486.012,00															$ 486.012,00		
9.6.4	SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	UND	$ 634.820,00															$ 634.820,00		
9.6.5	SALIDAS DE ILUMINACION PARA LAMPARAS HERMETICAS DE 2X18W	UND	$ 26.027.442,00													$ 13.013.721,00	$ 13.013.721,00			
9,7	**ILUMINACION EXTERIOR Y POSTES METALICOS**		**$ 761.534.968,00**																	
9.7.1	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA LED JETTA 100W	UND	$ 9.685.360,00														$ 9.685.360,00			
9.7.2	SUMINISTRO E INSTLACION DE LUMINARIA LED SYLFLOOD PRO 800W	UND	$ 242.378.336,00													$ 80.792.778,67	$ 80.792.778,67	$ 80.792.778,67		
9.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO TIPO AVI SENCILLO DE 10 METROS, ALTURA DE LAMPARA: 10 METROS. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO Y PUESTA A TIERRA	UND	$ 31.585.588,00													$ 15.792.794,00	$ 15.792.794,00			
9.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL GALVANIZADO DE 18 MTS DE ALTURA, CON CANASTILLA RECTANGULAR, CON ESCALERA PARA MONTAJE, DE DIMEL PARA 8 REFLECTORES	UND	$ 142.398.164,00													$ 71.199.082,00	$ 71.199.082,00			
9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE GALVANIZADO TIPO AVI DOBLE DISPOSICION DE 8 METROS, ALTURA DE LAMPARA: 8 METROS ALCANCE 1,0 METRO. INCLUYE PEDESTAL EN CONCRETO Y PUESTA A TIERRA	UND	$ 197.293.824,00									$ 65.764.608,00	$ 65.764.608,00	$ 65.764.608,00						
9.7.6	LUMINARIA LED SOLAR TODO EN 1 DE S40W	UND	$ -																	
NP. 9.7.7	LUMINARIA LED STREET DE 35W	UND	$ 104.840.680,00										$ 34.946.893,33				$ 34.946.893,33	$ 34.946.893,33		
NP. 9.7.8	EMPALMES DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC	UND	$ 2.492.280,00									$ 2.492.280,00								
NP. 9.7.9	REGISTRO DE 40X40 POSTES GALVANIZADOS DE 10 Y 8 METROS	UND	$ 30.860.736,00				$ 7.715.184,00	$ 7.715.184,00	$ 7.715.184,00	$ 7.715.184,00										
9,8	**MEDIDA**		**$ 31.007.125,00**																	
9.8.1	SUMINISTRO DE PUNTO DE MEDIDA DIRECTA 3TC / SIN ACOMETIDA DE CARGA	UND	$ 31.007.125,00														$ 15.503.562,50	$ 15.503.562,50		
TOTAL COSTO DE OBRA			**$13.008.197.225,68**	**$3.916.819.486,20**	**$380.729.743,69**	**$223.651.134,06**	**$187.776.377,36**	**$187.480.732,94**	**$272.913.171,49**	**$241.455.173,84**	**$469.246.874,49**	**$682.425.728,57**	**$1.320.125.871,28**	**$1.223.898.104,11**	**$96.437.104,54**	**$905.081.803,42**	**$1.160.510.291,68**	**$1.133.257.335,18**	**$606.388.292,84**	**$0,00**
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS			**$41.330.000,00**						**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$41.330.000,00**	**$0,00**
11,1	ESTUDIOS PARA CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION Y USO FINAL		$15.055.000,00																$15.055.000,00	
11,2	ESTUDIOS PARA CERTIFICACION RETILAP		$17.900.000,00																$17.900.000,00	
11,3	TRAMITE, PAGOS Y DESCARGO ANTE OPERADOR DE RED		$8.375.000,00																$8.375.000,00	
12	**PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**		**$308.996.404,00**	**$216.452.981,00**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$6.283.963,94**	**$7.783.963,94**	**$7.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$5.783.963,94**	**$1.283.963,94**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (INCLUYE AIU)		**$13.358.523.629,68**	**$4.133.272.467,20**	**$386.513.707,63**	**$229.435.098,00**	**$193.560.341,30**	**$193.264.696,88**	**$278.697.135,43**	**$247.239.137,78**	**$475.030.838,42**	**$688.709.692,51**	**$1.327.909.835,22**	**$1.231.682.068,05**	**$102.221.068,48**	**$910.865.767,36**	**$1.166.294.255,61**	**$1.139.041.299,12**	**$653.502.256,78**	**$1.283.963,94**
	AVANCE INVERSIÓN SEMANAL PROGRAMADO		**$13.358.523.629,68**	**$4.133.272.467,20**	**$386.513.707,63**	**$229.435.098,00**	**$193.560.341,30**	**$193.264.696,88**	**$278.697.135,43**	**$247.239.137,78**	**$475.030.838,42**	**$688.709.692,51**	**$1.327.909.835,22**	**$1.231.682.068,05**	**$102.221.068,48**	**$910.865.767,36**	**$1.166.294.255,61**	**$1.139.041.299,12**	**$653.502.256,78**	**$1.283.963,94**
	AVANCE INVERSIÓN PROGRAMADO ACUMULADO			**$4.133.272.467,20**	**$4.519.786.174,82**	**$4.749.221.272,82**	**$4.942.781.614,12**	**$5.136.046.311,00**	**$5.414.743.446,42**	**$5.661.982.584,20**	**$6.137.013.422,62**	**$6.825.723.115,13**	**$8.153.632.950,35**	**$9.385.315.018,40**	**$9.487.536.086,88**	**$10.398.401.854,23**	**$11.564.696.109,85**	**$12.703.737.408,97**	**$13.357.239.665,74**	**$13.358.523.629,68**
	PORCENTAJE INVERSIÓN SEMANAL			30,94%	2,89%	1,72%	1,45%	1,45%	2,09%	1,85%	3,56%	5,16%	9,94%	9,22%	0,77%	6,82%	8,73%	8,53%	4,89%	0,01%
	PORCENTAJE INVERSIÓN SEMANAL ACUMULADO			30,94%	33,83%	35,55%	37,00%	38,45%	40,53%	42,38%	45,94%	51,10%	61,04%	70,26%	71,02%	77,84%	86,57%	95,10%	99,99%	100,00%

JEISON DANIEL SERNA CASTILLEJO
Rep. Leg. CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
CONTRATISTA
