INFORME DE OBRA No 2

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/03/2025 AL 31/03/2025

FECHA DEL INFORME: 31/03/2025

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VG

MARZO DE 2025

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2. ASPECTO TÉCNICO. 6
2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 7
3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 13
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15
4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15
5. SEGURIDAD SOCIAL 17
6. MEMORIA DIARIA O BITACORA 17
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
8. ASPECTO JURÍDICO 17
8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 18
8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 19
9. ENSAYOS DE LABORATORIO 22
10. ESTUDIOS Y DISEÑOS 24
11. COMITES DE OBRA 25
12. CORRESPONDENCIA 26
13. CALIBRACION DE EQUIPOS 27
14. CARTERAS TOPOGRAFICAS 27
15. CONCLUSIONES 27

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios a intervenir: 5
Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra 5
Tabla 3 Control de programación y avance de obra. 8
Tabla 4 Programación y Flujo de caja del proyecto 9
Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado. 11
Tabla 6. Tabla pluviométrica 13
Tabla 7. Gráfica de precipitación 14
Tabla 8. Maquinaria mínima requerida 15
Tabla 9. Personal Técnico requerido 15
Tabla 10. Condiciones contrato de obra 17

ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Informe SST
Anexo 7 Correspondencia
Anexo 8 Calibración de equipos
Anexo 9 Laboratorios
Anexo 10 Cartera Topográfica

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto a ejecutar se encuentra en el norte del Departamento del Huila partiendo de la ciudad de Neiva por la vía departamental cuyo código es 45 A01, en una longitud de 9.2km aproximadamente desde el inicio del primer tramo hasta el final del último tramo, el cual se encuentra el municipio de Tello, Departamento del Huila.

Esta vía actualmente cuenta con pavimento flexible, el cual presenta deterioro en su estructura, identificando veinticinco (25) tramos críticos para ser intervenidos y cuya rehabilitación es el objeto del presente contrato. Maokiller9008



Via Fortalecillas - Tello

El proyecto a desarrollar corresponde a la vía Fortalecillas- Tello, según la resolución 4611 de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte y comprende la construcción de 5,33 km de pavimento flexible distribuidos en 25 tramos, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

De acuerdo al anexo técnico del contrato de obra 015 de 2024 los tramos están comprendidos en las siguientes coordenadas así:

TRAMO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (mts)	VIA	COORDENADA INICIO	COORDENADA FINAL
1	TELLO	VEREDA CUCHARITO	21,78	VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN COD 45A01 NEIVA SAN ANTONIO	E: 8708117.813	E: 870834.389
					N: 829114.321	N: 829128.151
2		VEREDA CUCHARITO	193		E: 872465.259	E: 872626.413
					N: 830243.272	N: 830349.328
3		VEREDA CUCHARITO	91,52		E: 872911.689	E: 872994.247
					N: 830480.790	N: 830520.292
4		VEREDA CUCHARITO	74,7		E: 873014.910	E: 873080.364
					N: 830529.547	N: 830565.457
5		VEREDA CUCHARITO	78		E: 873288.448	E: 873355.103
					N: 830691.417	N: 830731.927
6		VEREDA CUCHARITO	66		E: 873549.081	E: 873600.478
					N: 830870.461	N: 830911.783
7		VEREDA CUCHARITO	30		E: 873783.309	E: 873809.183
					N: 830988.643	N: 831003.786
8		VEREDA CUCHARITO	130		E: 873874.551	E: 873983.477
					N: 831045.673	N: 831116.631
9		VEREDA CUCHARITO	121,64		E: 873993.756	E: 874095.676
					N: 831123.447	N: 831189.854
10		VEREDA CUCHARITO	24,98		E: 874104.910	E: 874125.811
					N: 831195.799	N: 831209.475
11		VEREDA CUCHARITO	107,12		E: 874180.040	E: 874269.915
					N: 831245.012	N: 831303.300
12		VEREDA CUCHARITO	56,02		E: 874374.500	E: 874421.628
					N: 831370.522	N: 831400.812
13		VEREDA CUCHARITO	48,71		E: 874438.217	E: 874479.108
					N: 831411.498	N: 831437.974
14		VEREDA CUCHARITO	103,65		E: 874486.186	E: 874572.812
					N: 831442.528	N: 831499.437
15		VEREDA CUCHARITO	94,37		E: 874811.921	E: 874904.457
					N: 831595.297	N: 831613.806
16		VEREDA CUCHARITO	88,32		E: 874964.772	E: 876488.492
					N: 831626.175	N: 831727.129
17		VEREDA CUCHARITO	725,07		E: 875879.397	E: 876488.492
					N: 831449.881	N: 831727.129
18		VEREDA CUCHARITO	200,04		E: 876532.198	E: 876731.150
					N: 831728.958	N: 831745.452
19		MESA DEL TRAPICHE	1361,97		E: 876759.269	E: 878067.835
					N: 831741.316	N: 831795.883
20		MESA DEL TRAPICHE	206,36		E: 878254.143	E: 878459.126
					N: 831866.245	N: 831890.036
21		MESA DEL TRAPICHE	66,98		E: 878489.106	E: 878545.532
					N: 831897.396	N: 831932.956
22		VEREDA CUCHARITO	52		E: 879068.291	E: 879120.280
					N: 831700.165	N: 831701.231
23		VEREDA CUCHARITO	126		E: 879212.267	E: 879338.252
					N: 831702.244	N: 831704.152
24		VEREDA CUCHARITO	826,99		E: 879437.818	E: 880235.376
					N: 831710.540	N: 831827.137
25		VEREDA CUCHARITO	446,63		E: 880338.945	E: 880756.615
					N: 831793.934	N: 831640.332
TOTAL			**5341,85**			

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
TELLO	Ruta Código 45 A01 NEIVA- SAN ANTONIO	5,33 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
TELLO	Vía de primer Orden	$ 8.258.002.715,00
VALOR TOTAL		**$ 8.258.002.715,00**

Fuente: Autor

Valor adicional según ajuste No 1 del contrato de obra

TELLO	Vía de primer Orden
VALOR ADICIONAL	$3.370.776.617,36
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 11.628.779.332,36

Plazo Inicial = Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo adicional = Tres y medio (3.5) meses.
Plazo total contrato de obra = 7.5 meses.

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido Dos (2) meses (17 de junio de 2024 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad del proyecto, los inconvenientes y el estado de avance de estos:

El día 17/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-14 a la interventoría remitiendo los resultados de ensayos de laboratorio para la subrasante existente, sub-base granular y base granular.

El día 18/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-15 a la interventoría con respecto a la conformación de veedurías ciudadanas para el contrato de referencia.

El día 18/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-16 a la interventoría con respecto a la solicitud por parte de la alcaldía de Tello de material de fresado para mantenimiento de vías terciarias en el municipio.

El día 26/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-17 a la interventoría con respecto a la entrega del informe No 1 del contrato de obra.

El día 28/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-18 a la interventoría con la respuesta al comunicado INTER-VG-043 “Observaciones del informe No 1 de obra área técnica”.

El día 31/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-19 a la interventoría con la respuesta al comunicado INTER-VG-042, de acuerdo a las observaciones realizadas en la parte SISO, ambiental y social en el informe No 1 de obra.

El día 31/03/2025 se envió comunicado CO-15-24-20 a la interventoría con respecto a la entrega del PMT y PAGA del contrato de obra.

Actividades de obra física.

Vía Fortalecillas- Tello.

Actividades ejecutadas durante el periodo. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- En el ítem de localización y replanteo se ejecutó una cantidad de 4,013 km por un valor de $ 17.992.738,97, correspondiente al tramo No 17 con una longitud de 725,07; tramo No 18 con una longitud de 200m; tramo No 19 con una longitud de 1360 m; tramo No 20 con una longitud de 206,35; tramo No 21 con una longitud de 66,97m; tramo No 22 con una longitud de 52 m; tramo No 23 con una longitud de 120 m; tramo No 24 con una longitud de 825,99m; tramo No 25 con una longitud de 446,63m , obteniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 75,29 %.

- Se ejecutó el fresado de pavimento asfáltico del tramo No 17, con una cantidad de 200,89 m2 completando el 100% en este tramo; en el tramo No 18 una cantidad de 1320 m2 ; en el tramo No 19 una cantidad de 8989,2 m2; en el tramo No 20 una cantidad de 1359,60 m2; en el tramo No 21 una cantidad de 442,2 m2; en el tramo No 22 una cantidad de 343,2 m2; en el tramo No 23 una cantidad de 831,6 m2; en el tramo No 24 una cantidad de 5458,2 m2 y en el tramo No 25 una cantidad de 2950,2 m2 para un total acumulado de 26485,8 m2 que suma un valor de $ 96.328.854,60 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 75,25%.

- Se ejecutó conformación de la calzada en el tramo No 17 con una cantidad de 6388,8 m2; en el tramo No 18 una cantidad de 1760 m2; en el tramo No 19 una cantidad 11985,6 m2 para un total acumulado de 20134,40 m2 que suma un valor de $ 56.174.976, teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 53,94%.

- Se ejecutó instalación de sub-base granular en el tramo No 17 con una cantidad parcial de 888 m3, para un total acumulado de 888 m3 que suma un valor de $ 97.680.000, teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 11,89%.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA EN EL CONTRATO	% PROGRAMADO MES	% EJECUTADO MES	% PROGAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO
1.1	Localización y replanteo	Km	5,33	14,29%	61,00%	28,58%	75,29%	263,43%
1.2	Fresado de Pavimento asfáltco	M2	35.195,49	17,39%	62,21%	30,43%	75,25%	247,28%
3.1	Conformación de calzada	M2	37.328,55	16,67%	53,94%	16,67%	53,94%	323,57%
3.4	Sub-base granular	M3	7.465,71	9,09%	11,89%	9,09%	11,89%	130,80%
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	174.632,53	19,05%	7,43%	19,05%	7,43%	39,00%

Tabla 4 Programación y Flujo de caja del proyecto

CONTRATO DE OBRA No. 015-2024	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO: HUILA	FECHA DE INICIO: 17 de junio de 2024
	FECHA DE SUSPENSION 1: 26 de junio de 2024
	FECHA REINICIO 1: 5 de febrero de 2025
	PRESUPUESTO FORTALECILLAS- TELLO

PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
		PRELIMINARES									
1	1,1	Localización y replanteo	Km	5,330	$ 4.483.613,00	$ 23.897.657,29	0,21	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	m2	35.195,49	$ 3.637,00	$ 128.005.997,13	1,10	$ 16.696.434,41	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54
SUBTOTAL PRELIMINARES						**$ 151.903.654,42**	1,31				
		EXPLANACIONES									
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	22.483,80	$ 23.498,00	$ 528.324.268,96	4,54		$ 45.941.240,78	$ 114.853.101,95	$ 114.853.101,95
SUBTOTAL EXPLANACIONES						**$ 528.324.268,96**	4,54				
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE									
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	37.328,55	$ 2.790,00	$ 104.146.654,50	0,90		$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75
5	3,2	base granular	M3	7.465,71	$ 145.000,00	$ 1.082.527.950,00	9,31		$ 90.210.662,50	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	3.710,24	$ 1.519.219,00	$ 5.636.665.340,27	48,47			$ 341.616.081,23	$ 1.024.848.243,69
7	3,4	Sub-base granular	M3	7.465,71	$ 110.000,00	$ 821.228.100,00	7,06		74.657.100,00	149.314.200,00	149.314.200,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M2	35.195,49	$ 3.416,00	$ 120.227.793,84	1,03			$ 21.859.598,88	$ 21.859.598,88
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						**$ 7.764.795.838,61**	66,77				
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS									
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	1.599,80	$ 955.221,00	$ 1.528.157.779,70	13,14				$ 339.590.617,71
10		**ITEMS NO PREVISTOS**					0,00				
11	N.P 4,2	ITEM : MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	2.739,68	$ 176.951,14	$ 484.790.201,56	4,17				$ 121.197.550,39
12	N.P 4,3	ITEM : GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	16.260,99	$ 22.320,29	$ 362.949.931,18	3,12				$ 90.737.482,80
13	N.P 4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	4.566,14	$ 37.916,13	$ 173.130.335,01					$ 43.282.583,75
14	N.P 4,5	ITEM : GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRIA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	M3	291,00	$ 492.731,11	$ 143.384.752,72	1,23				$ 71.692.376,36
15	N.P 4,6	ITEM: CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	225,00	$ 133.996,45	$ 30.149.200,58	0,26				
16	N.P 4,7	ITEM: BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	27,00	$ 1.022.678,66	$ 27.612.323,74	0,24				$ 27.612.323,74
17	N.P 4,8	ITEM:RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	M3	128,00	$ 122.605,83	$ 15.693.546,75	0,13				
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						**$ 2.765.868.071,23**	23,78				
		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
17	5,1	Línea de demarcación con pintura en frío	ML	15.997,95	$ 2.917,00	$ 46.666.020,15	0,40				
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**$ 46.666.020,15**	0,40				
		TRANSPORTES									
18	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	174.632,53	$ 1.500,00	$ 261.948.792,00	2,25		$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						**$ 261.948.792,00**	2,25				
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 11.519.506.645,36**					
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 11.519.506.645,36					
		PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT)				$ 49.554.000,00	0,43	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)				$ 59.718.687,00	0,51	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60
					VALOR TOTAL	**$ 11.628.779.332,36**					
								$ 34.680.077,05	$ 318.307.342,21	$ 915.562.645,99	$ 2.292.907.743,19
					%			0,30%	2,74%	7,87%	19,72%
					% ACUMULADO			0,30%	3,04%	10,91%	30,63%
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO			**$ 34.680.077,05**	**$ 352.987.419,26**	**$ 1.268.550.065,25**	**$ 3.561.457.808,45**

CONTRATO DE OBRA No. 015-2024	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
DEPARTAMENTO	HUILA
FECHA DE INICIO	17 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION 1	26 de junio de 2024
FECHA REINICIO 1	5 de febrero de 2025
PRESUPUESTO FORTALECILLAS- TELLO	

PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

5 MES	6 MES	7 MES	8 MES
$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	
$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54		
$ 91.882.481,56	$ 91.882.481,56	$ 68.911.861,17	
$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	
$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 90.210.662,50
$ 1.281.060.304,61	$ 1.281.060.304,61	$ 1.281.060.304,61	$ 427.020.101,53
149.314.200,00	149.314.200,00	149.314.200,00	
$ 21.859.598,88	$ 21.859.598,88	$ 21.859.598,88	$ 10.929.799,44
$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 169.795.308,86
$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	
$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	
$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	
$ 71.692.376,36			
$ 30.149.200,58			
	$ 15.693.546,75		
		$ 31.110.680,10	$ 15.555.340,07
$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00	12.473.752,00	
$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 3.303.600,00
$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 3.981.245,80
$ 2.528.686.060,56	$ 2.442.538.030,38	$ 2.375.301.374,79	$ 720.796.058,20
21,75%	21,00%	20,43%	6,20%
52,37%	73,38%	93,80%	100,00%
$ 6.090.143.869,01	**$ 8.532.681.899,39**	**$ 10.907.983.274,18**	**$ 11.628.779.332,36**

Tabla 5. Control de inversión ejecutado y programado.

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 2**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	2,74%	3,04%
valor de la obra programada	$318.307.342,21	$352.987.419,26
obra ejecutada (%)	2,60%	2,72%
valor de la obra ejecutada	$302.251.632,57	$316.821.324,17



De acuerdo a la programación a la fecha de cierre del presente informe se tiene un porcentaje programado acumulado del 3,04% y un porcentaje ejecutado acumulado del 2,72%, presentando un atraso del 0,32 %.

Plan de inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VÍAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO	$8.258.002.715
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$2.477.400.815,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$2.477.400.815,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$123.870.041,00
VALOR NETO GIRADO.	$2.353.530.774,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	25,000%	$588.382.693,50	$588.382.693,50
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	22,000%	$517.776.770,28	$517.776.770,28
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	30,000%	$706.059.232,20	$706.059.232,20
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	14,000%	$329.494.308,36	$329.494.308,36
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	9,000%	$211.817.769,66	$211.817.769,66
			100,000%		$2.353.530.774,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$2.353.530.774,00

SON	$2.353.530.774,00
VALOR EN LETRAS	DOS MIL TRECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
Contratista

INTERVENTORIA:

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
R.L. CONSORCIO VG
Interventoria

El anticipo se encuentra en proceso de aprobación por parte del ente contratante.

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- Durante el periodo de este informe se presentaron fuertes precipitaciones que impidieron un rendimiento más alto en la ejecución de las actividades. A continuación, en las siguientes tablas se grafica el comportamiento meteorológico en el área de influencia del proyecto:


Tabla 6. Tabla pluviométrica

Entidad	**INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES**				
Codigo Estacion	**Nombre Estación**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**categoría**
21110040	HATO MILAGRO [21110040]	30.748.888.890,00	-75,16841667	548	Pluviometria
Municipio	**Fecha Instalación**	**Id Parámetro**	**Etiqueta**		
Tello	15/09/1971	PRECIPITACIÓN	PTPM_CON		
Descripción Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Nivel Aprobación
Dia pluviometro	Diaria	1-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	2-mar-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	3-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	4-mar-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	5-mar-25	15	50	900
Dia pluviometro	Diaria	6-mar-25	20	50	900
Dia pluviometro	Diaria	7-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	8-mar-25	3	50	900
Dia pluviometro	Diaria	9-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	10-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	11-mar-25	40	50	900
Dia pluviometro	Diaria	12-mar-25	4	50	900
Dia pluviometro	Diaria	13-mar-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	14-mar-25	10	50	900
Dia pluviometro	Diaria	15-mar-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	16-mar-25	12	50	900
Dia pluviometro	Diaria	17-mar-25	3	50	900
Dia pluviometro	Diaria	18-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	19-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	20-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	21-mar-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	22-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	23-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	24-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	25-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	26-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	27-mar-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	28-mar-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	29-mar-25	30	50	900
Dia pluviometro	Diaria	30-mar-25	9	50	900
Dia pluviometro	Diaria	31-mar-25	0	50	900
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Esttudios Ambientales (IDEAM) URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/					

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar en las dos primeras semanas precipitaciones constantes e intensas, dificultando la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación actual durante el periodo correspondiente al presente informe.

Table 7. Grafica de precipitación

FRECUENCIA	DIARIA
MESES	MARZO
DIAS	mm/día
1-mar	0
2-mar	10
3-mar	0
4-mar	10
5-mar	15
6-mar	20
7-mar	0
8-mar	3
9-mar	0
10-mar	0
11-mar	40
12-mar	4
13-mar	2
14-mar	10
15-mar	2
16-mar	12
17-mar	3
18-mar	0
19-mar	0
20-mar	0
21-mar	2
22-mar	0
23-mar	0
24-mar	0
25-mar	0
26-mar	0
27-mar	0
28-mar	2
29-mar	30
30-mar	9
31-mar	0

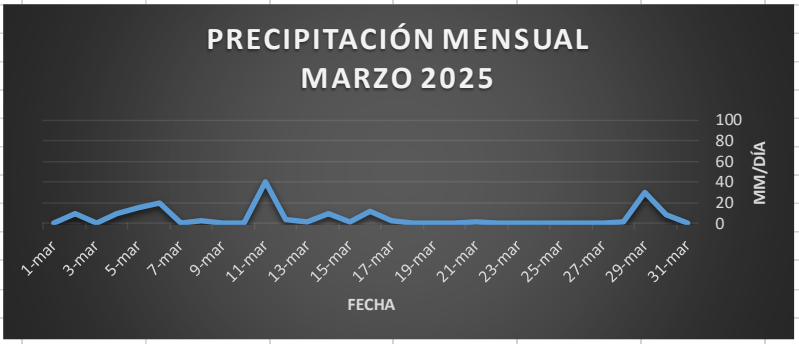

Elaboró: Ingeniero residente de Obra. Consorcio Infraestructura JPN Tello
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM)
URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 8. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Mezcladora de concreto 9P3.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 galones)	2
Cortadora de pavimento	2
Formaleta metálica (Concreto hidráulico)	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

Informe De Personal

En el presente periodo ya se presentaron a la interventoría las hojas de vida del personal mínimo requerido. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Tabla 9. Personal Técnico requerido

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	2	100%
INSPECTOR DE OBRA	2	100%
PROFESIONAL SISO	2	80%
TOPOGRAFO	2	50%
AUX. TRANSITO	4	80%

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a las obligaciones contractuales y según el pliego de condiciones se hacen las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

- El Contratista de obra a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

8. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.015-2024.

8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 10. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	TRES Y MEDIO (3.5) MESES
PLAZO TOTAL	7.5 MESES
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101019508, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101053603.

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	23/02/2024	30/12/2024	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	23/02/2024	30/12/2024	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	23/02/2024	30/06/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	24/04/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	24/04/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	23/10/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	23/10/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de Acta de reinicio No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	04/12/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	04/12/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	04/06/2028	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo del informe No 2 se realizaron los siguientes ensayos de caracterización para la subrasante, Subbase y Base granular (Ver anexo 9):

- Material de subrasante: Limites de consistencia, compactación con equipo modificado.

- Material para subbase granular procedente de la planta “Construcciones Lago S.A.S.

SUBBASE GRANULAR		
ENSAYO	**S/ESPECIFICACIÓN**	**VALOR OBTENIDO**
Desgaste máquina de los Ángeles, máximo (%) - 500 revoluciones - 500 revoluciones	50	20,3
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%)	30	21,0
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Magnesio), máximo (%)	18	10,1
Límite líquido, máximo (%)	25	24,5
Índice de plasticidad, máximo (%)	6	2,9
Equivalente de arena, mínimo (%)	25	29
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	2	0,54
Proctor modificado (kg/m^3)	-----	2.126
Humedad óptima (%)	-----	9,0
CBR (%), después de 4 días de inmersión	≥30	86,4

- Material para Base granular procedente de la planta “Construcciones Lago S.A.S.

BASE GRANULAR		
ENSAYO	**S/ESPECIFICACIÓN**	**VALOR OBTENIDO**
Desgaste máquina de los Ángeles, máximo (%) - 500 revoluciones		
- 500 revoluciones	40	20,9
- 100 revoluciones	8	4,9
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%)	30	20,5
Evaluación de la resistencia mecánica por el método de los 10% de finos		
- Valor seco, mínimo (kN)	70	79,7
- Relación húmedo/seco, mínimo (%)	75	87,4
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos (Magnesio), máximo (%)	18	10,5
Límite líquido, máximo (%)	---	24,7
Índice de plasticidad, máximo (%)	0	2,0
Equivalente de arena, mínimo (%)	30	33
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	2	0,52
Índice de alargamiento y aplanamiento, máximo (%)	35	11,6
Caras fracturasas, mínimo (%)		
- Una cara	70	80,5
- Dos caras	50	69,6
Angularidad de la fracción fina, mínimo (%)	35	40,2
Proctor modificado (kg/m^3)	-----	2.139
Humedad óptima (%)	-----	9,5
CBR (%), después de 4 días de inmersión	≥80	169,0

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo a lo considerado en el comité técnico el día 26 de junio de 2024, el contratista realizó la revisión y ajuste al diseño con los parámetros iniciales con la firma Especializada INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda, cuyo representante legal es el Ingeniero Mario Trujillo Calderón Castro (Esp. En Ingeniería de Vías, T.P. 1920240632CAU) y se presentó a la interventoría el 10 de julio de 2024 a través del oficio CO-15-24-07 para la respectiva revisión. El ajuste del diseño por el método de la AASHTO y con revisión por el método racional se presentó una estructura homogénea para las secciones 1 y 2, teniendo en cuenta la poca diferencia en los CBR y una estructura para la sección 3.

Una vez presentada el ajuste de diseño a la interventoría. El Especialista de la interventoría realiza observaciones técnicas en cuanto a parámetros y factores utilizados para la utilización del método de la AASHTO y Método Racional. Dichas observaciones son contestadas y aclaradas por el Especialista del Contratista y aceptadas por la Interventoría.

Aclaradas las observaciones al ajuste del diseño se presenta el ajuste del diseño a la Secretaría de Vías e Infraestructura para la revisión y aprobación el día 23 de agosto de 2024 a través del oficio CO-15-24-11. Finalmente, la firma INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda realiza el diseño completo con los parámetros iniciales reiterando la estructura de pavimento para las secciones 1, 2 y 3. Se unifica una estructura para las secciones 1 y 2 y otra estructura para la sección 3.

Sección 1.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 1				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3167.68	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1417.13	200
	Subrasante	0.5	823.72	∞

Sección 2.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 2				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3407.74	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1524.53	200
	Subrasante	0.5	923.86	∞

Sección 3.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 3				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	120
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	2777.83	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1242.73	200
	Subrasante	0.5	674.33	∞

Una vez presentada la solicitud del ajuste No 1 el día 21 de noviembre de 2024 a la Secretaría de Vías e Infraestructura y surtidos todos los procesos de revisión, finalmente mediante resolución No 283 de 2024 de fecha 30 de diciembre de 2024 y mediante decreto No 021 de 2025 de fecha 31 de enero de 2025, se aprueba la incorporación al presupuesto departamental del referido ajuste No 1.

11. COMITES DE OBRA

Durante el periodo del presente informe No 2 se realizó un comité el día 14 de marzo de 2025 donde se trataron los siguientes temas: **Anexo 4** Comités de obra.

- Estructura final en tramos puntuales del proyecto en donde se encuentran cultivos de arroz.
- Documentación de vehículos para transporte de material (Volquetas).
- Permisos para depósito final de material de excavación.
- Entrega de acta de conformación de consorcio.

- Profesional SISO adicional al proyecto.
- Resultados de caracterización de material de base y subbase granular para el proyecto.
- Presentación de informes semanales.
- Intervención prioritaria para el tramo No 4.
- Presentación de informes mensuales.

12. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo del presente informe No 2 se tiene la siguiente correspondencia: **Anexo 7** Correspondencia.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 2						
ITEM	PROCENDENCIA			DETALLE		
	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	N° DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-14	17/03/2025	Remisión de resultados de ensayos de laboratorio para la subrasante existente, subbase granular y Base granular	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
2	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-15	18/03/2025	Conformación de Veedurías Ciudadanas para el contrato de referencia	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
3	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-16	18/03/2025	Solicitud de material de fresado para mantenimiento de Vías Terciarias en el municipio de Tello	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
4	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-17	26/03/2025	Entrega de Informe No 1 del contrato de referencia	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
5	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-18	28/03/2025	Respuesta al comunicado INTER-VG043 "Observaciones del informe No 1 de obra área Técnica"	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
6	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-19	31/03/2025	Respuesta al comunicado INTER-VG042	Contrato de Obra No 0015 DE 2024
7	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-20	31/03/2025	Entrega de documento PMT y PAGA del contrato de referencia.	Contrato de Obra No 0015 DE 2024

13. CALIBRACION DE EQUIPOS

Durante el periodo del presente informe No 2 para la localización y replanteo se utilizó el siguiente equipo: **Anexo 8** Calibración de equipos.

- Estación Total de marca HI TARGET modelo HTS 720 con serie No VAWN16431991.

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS

Durante el periodo del presente informe No 2 se instaló subbase del tramo No 17: **Anexo 10** Cartera Topográfica.

15. CONCLUSIONES

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar en las dos primeras semanas precipitaciones constantes e intensas, dificultando la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación actual durante el periodo correspondiente al presente informe.

A la fecha de cierre del informe No 2 no se han presentado actas parciales de obra para revisión de la interventoría y el ente contratante.

De acuerdo a la programación de obra a la fecha de cierre del informe No 2 tiene un porcentaje programado acumulado del 3,04% y un porcentaje ejecutado acumulado del 2,72%, presentando un atraso del 0,32%.

ING. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
Director de Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

ANEXO 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA FORTALECILLAS- TELLO RUTA 45 A01

Localización y replanteo en el tramo No 17,18,19,20









Fresado de pavimento asfáltico Tramo No 17,18,19,20









Instalación de sub-base granular Tramo No 17










Anexo 2
Programación

Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
1	1,1	Localización y replanteo	Km	5,730	$ 1.448.973,09	$ 25.892.667,29	0,21	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04
2	1,2	Fresado de pavimento asfaltico	M2	95.165,40	$ 3.607,00	$ 126.205.067,10	1,19	$ 10.090.404,47	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54
SUBTOTAL ITEM PRELIMINARES						$ 151.997.734,39	1,31				
		EXPLANACIONES									
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	27.473,60	$ 83.468,00	$ 105.204.259,96	4,94		$ 45.941.240,78	$ 114.853.101,95	$ 114.853.101,95
SUBTOTAL EXPLANACIONES						$ 105.204.259,96	4,94				
		CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE									
4	3,1	Conformacion de la calzada	M2	37.329,56	$ 2.795,00	$ 104.346.064,20	0,90		$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75
5	3,2	base granular	M3	7.415,77	$ 140.000,00	$ 1.038.207.950,00	9,01		$ 80.210.650,00	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	5.715,24	$ 2.439.219,00	$ 5.636.895.540,27	48,47			$ 241.576.081,20	$ 1.026.948.243,60
7	3,4	Base granular	M3	7.415,77	$ 140.000,00	$ 621.226.100,00	9,00		$ 74.457.100,00	$ 148.914.200,00	$ 148.914.200,00
8	3,5	Riego de sellamiento con emulsion asfaltica CRL-0	M2	39.195,04	$ 3.915,00	$ 120.227.793,21	1,03			$ 21.059.598,48	$ 21.059.598,48
SUBTOTAL CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE						$ 7.764.795.838,41	66,77				
		CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS									
9	4,1	Cuneta de Concreto Vaciada in SITU, no incluye la compensación en la superficie de apoyo	M3	1.096,60	$ 955.297,00	$ 1.536.167.774,74	13,14				$ 306.590.000,00
10		ITEMS NO PREVISTOS					0,00				
11	N.P.4.2	ITEM MATERIAL GRANULAR FILTRANTE CBR 67%-10 INV.	M3	2.708,63	$ 178.951,14	$ 484.708.291,48	4,17				$ 121.197.500,00
12	N.P.4.3	ITEM GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, 65% (10-19 INV.	M2	15.268,08	$ 22.310,29	$ 382.049.831,16	3,12				$ 90.737.482,00
13	N.P.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	4.286,14	$ 37.915,13	$ 162.156.329,91					$ 45.462.083,71
14	N.P.4.5	ITEM GAVION EN PIEDRA ZONDA Y MUDA ZONDA, MALLA 6*8, CALIBRE 10CM X 10CM, VENA CAFE INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 663 INV.	M3	290,00	$ 462.731,11	$ 143.084.753,73	1,23				$ 71.092.378,36
15	N.P.4.6	ITEM CONCRETO PARA ACONDICIONAMIENTO DE GAVIONES	M3	229,00	$ 153.946,67	$ 39.149.200,00	0,21				
16	N.P.4.7	ITEM BASTARDA MEZCLA DE GAVIONES CON CONCRETO DE 21Mpa (ESPESOR 250MM)	M3	27,00	$ 1.227.679,63	$ 27.612.329,73	0,24				$ 27.612.329,73
17	N.P.4.8	ITEM RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (ESP. 616-13 P.E. INV.	M3	128,00	$ 122.303,63	$ 15.651.544,73	0,13				
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						$ 2.793.568.971,25	23,71				
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
17	5,1	Valla de información con postes metálicos	ML	15.357,05	$ 3.917,00	$ 49.696.620,15	0,40				
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						$ 49.696.620,15	0,40				
		TRANSPORTES									
18	6,1	Transporte (comprende de la sacadera de la explanación, tierras y prestamos para distancias mayores de mil metros	M3KM	174.830,50	$ 1.502,00	$ 261.948.790,00	2,25		$ 49.989.858,00	$ 99.989.858,00	$ 99.989.858,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						$ 261.948.792,00	2,25				
					SUBTOTAL OBRAS	$ 11.626.779.332,36					
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE PAO	$ 11.626.779.332,36					
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (VER ANEXO PMT)	$ 69.154.000,00	0,60	$ 6.907.200,00	$ 6.907.200,00	$ 6.907.200,00	$ 6.907.200,00
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 99.710.497,00	0,51	$ 7.992.491,60	$ 7.992.491,60	$ 7.992.491,60	$ 7.992.491,60
					VALOR TOTAL	$ 11.626.779.332,36					
								$ 34.680.077,05	$ 318.307.342,21	$ 515.562.845,99	$ 2.292.907.743,10
					%			0,29%	2,74%	7,67%	19,72%
					% ACUMULADO			0,30%	3,04%	10,91%	30,63%
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO			$ 34.680.077,05	$ 352.987.419,26	$ 1.268.550.265,25	$ 3.561.457.808,45

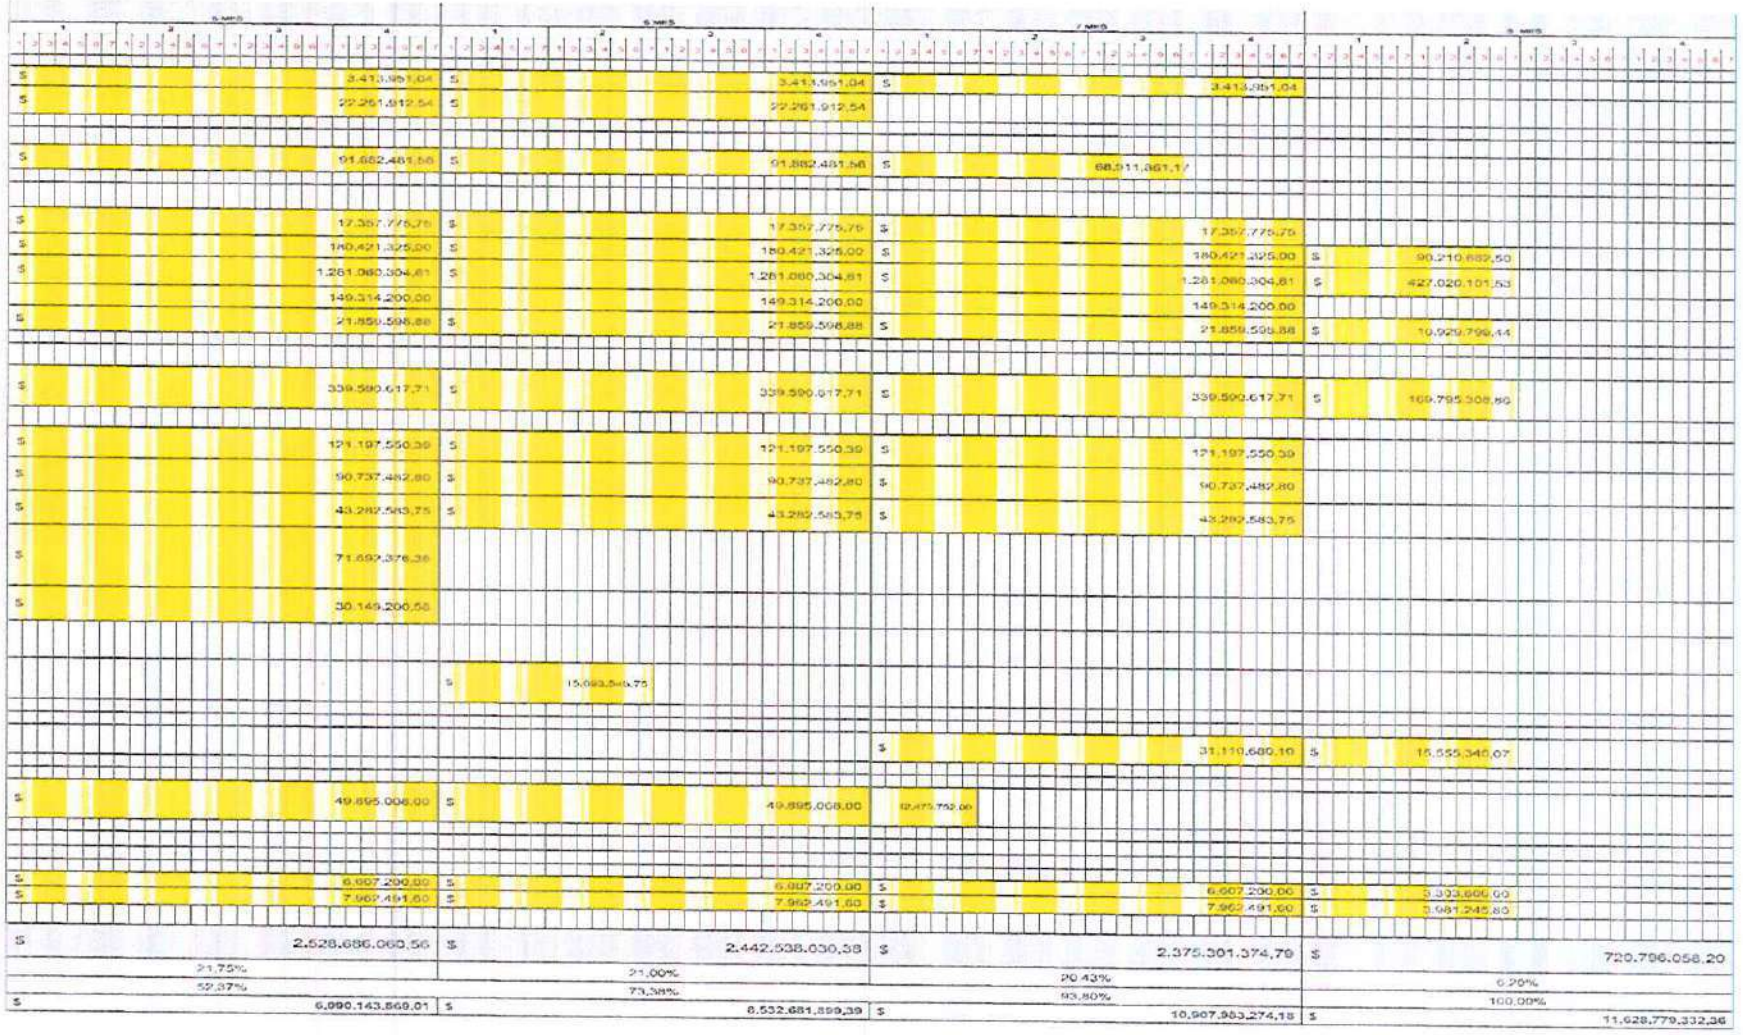

$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	
$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54		
$ 91.882.481,56	$ 91.882.481,56	$ 68.911.861,17	
$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	
$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00	$ 90.210.662,50
$ 1.261.060.304,81	$ 1.261.060.304,81	$ 1.261.060.304,81	$ 427.020.101,53
149.314.200,00	149.314.200,00	149.314.200,00	
$ 21.859.596,88	$ 21.859.596,88	$ 21.859.596,88	$ 10.929.798,44
$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 339.590.617,71	$ 169.795.308,86
$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	$ 121.197.550,39	
$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	$ 90.737.482,80	
$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	$ 43.282.583,75	
$ 71.692.376,36			
$ 30.149.200,56			
	$ 15.093.546,75		
		$ 31.110.680,16	$ 15.555.340,07
$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00	[illegible]	
$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 3.303.600,00
$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 7.962.491,60	$ 3.981.245,80
$ 2.528.686.060,56	$ 2.442.538.030,38	$ 2.375.301.374,79	$ 720.796.058,20
21,75%	21,00%	20,43%	6,20%
52,37%	73,38%	93,80%	100,00%
$ 6.990.143.868,01	$ 8.532.681.899,39	$ 10.907.983.274,18	$ 11.628.779.332,36

Anexo 3

Bitacora de Obra

18

L FRO 28/25 intensas lluvias en horas de la mañana
Charla por parte de las profesionales 9150
Labores de fresado en el sector 17 con retroexcavadora motoniveladora, Vibro compactador y Volquetas, quedando concluido el tramo.

F MAR 1/25 intensas lluvias en horas de la mañana
- Se realizó charla por parte de las profesionales 9150.
Se realizo el fresado en el tramo 18 con retro y tres Volquetas.
Se realizaron actividades mecanicas a la motoniveladora y el Vibro.
SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN EL TRAMO 18 EN EL FRESADO Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE DISEÑO DE SUBRASANTE CON LA COMISION TOPOGRAFICA DEL CONTRATISTA TRAMO 17

MAR 3/25 Charla por parte de las prof. 9150 continuó el fresado en el sector 18 quedando terminado y se inició el sector 19 con apoyo de 3 Volquetas
F SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO CON PROFESIONALES DE INTERVENTORIA EN TRAMO 18 E INICIO EN TRAMO 19 EN FRESADO DE CARPETA ASFALTICA

Scanned with CamScanner

MAR. 4/25 Charla con las profesionales SISO
continuó el pesado en el sector 19
con apoyo de 3 Volquetas.
SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO CON EL RESIDENTE DE
INTERVENTORIA Y SISO EN ACTIVIDADES REALIZADAS
EN TRAMO 19

MAR 5/25 Charla con las profesionales SISO
lluvias en el sector en horas de la mañana
Continua el pesado en el sector 19
con apoyo de Volquetas, motoniveladora
y Vibrocompactador, Labores de Topografia
SE REALIZA VERIFICACION DE MAQUINARIA AMARILLA Y
VOLQUETAS POR PARTE DE LA PROFESIONAL SIG DE
INTERVENTORIA Y SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DE PARCHADO Y RETIRO DE CARPETA
ASFALTICA EN TRAMO 19

MAR 6/25 Charla con las profesionales SISO
Intensas lluvias durante todo el dia,
impidieron realizar labores de pesado.
Se realizaron actividades logisticas.

Scanned with CamScanner

MAR 7/25 charla con las profesionales SISO continua el fresado en el sector 19 con apoyo de motoniveladora, Volquetas y Vibrocompactador
SE VERIFICA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL ESTADO DE LA MAQUINARIA PARA CONTINUAR CON EL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO 19
PR51000K

MARZO 8/25 charla con las profesionales SISO Lluvias en el sector.
Se realizaron labores de conformación de la subrasante del sector 19 con motoniveladora y Vibro.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA EN EL TRAMO 19
PR51000K

MARZO 10/25 charla con las profesionales SISO Lluvias durante las primeras horas continua el fresado en el sector 19 con apoyo de Volquetas.
Labores de Topografia.
SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO CON EL PERSONAL DE INTERVENTORIA DURANTE CHARLA PREOPERATIVA Y ACTIVIDADES DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA Y RETIRO DE MATERIAL EN TRAMO 19
PR51000K

Scanned with CamScanner

MAR 11/25 Charla con las profesionales SISO
Labores de fresado en el sector 19 con
apoyo de Volquetas.
Labores de Topografía.
SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAL
DE INTERVENTORIA EN CHARLAS PREOPERATIVAS,
FRESADO DE CARPETA ASFALTICA Y RETIRO DE
MATERIAL EN TRAMO 19

MAR 12/25. Charla con las profesionales SISO
Lluvias durante las primeras horas
de la mañana.
Labores de fresado en el sector 19 con
apoyo de Volquetas
Se realizó conformación de la sub-
rasante en el sector 17 con motoniveladora y Vibrocompactador
Labores de Topografía.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE
INTERVENTORIA EN LA CONFORMACION DE SUBRASANTE
EN TRAMO 17 Y FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN
TRAMO 19

MAR 13/25 Charla con las profesionales SISO
Continúa el fresado en el sector 19
con apoyo de Volquetas.
Se inició el extendido de sub-base en
el sector 17 con apoyo de Volquetas
motoniveladora, Vibrocompactador
y Topografía.

CONTINUA....

Scanned with CamScanner

LA INTERVENTORIA EXTRAE MUESTRA DE MATERIAL DE SUBBASE IMPRESA EN TRAPO 19 PARA TOMA DE ENSAYOS, DE ACOMPAÑO EN TRAPO 19 PARA PRUEBA

MARZO 14/25 Charla con las profesionales SISO intensas lluvias en el sector, durante todo el dia, no permitieron realizar labores en obra.

MARZO 15/25 Charla con las profesionales SISO lluvias durante las primeras horas de la mañana
Labores de fresado en el sector 19 quedando concluido y conformación de la sub-rasante con motoniveladora y Vibrocompactador.
La Humedad en la sub-rasante en el sector 17, no permitió el extendido de sub-base durante el dia a pesar de la disponibilidad de 6 Volquetas en la planta para el transporte de la misma

MAR 17/25 Charla a cargo de las profesionales SISO
Lluvias durante toda la mañana
Se laboró a partir de la 1PM., iniciando el fresado en el sector 20 con apoyo de Volquetas y simultaneamente con, formando la sub-rasante con moto niveladora y Vibrocompactador.
Se suspendieron labores por lluvias a las 3:30 PM.

MAR. 18/25 Charla a cargo de las profesionales SISO
Continuo el fresado en el sector 20, quedando concluido y se inició el sector 21. Se realizó conformación de la sub-rasante en el sector 19 con motoniveladora y Vibrocompactador.
El material fresado fue Trasladado, por solicitud del alcalde de Tello, al depósito del municipio para el mantenimiento de la red terciaria,
SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE EN TRAMO 19, FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO 20 Y TRAMO 21.

24

MAR. 19/25 Charla a cargo de las profesionales SISO
Se realizo Fresado en el sector 21, quedando concluido y se inicio y termino el sector 22, con dos moto niveladoras, Vibrocompactador y Volquetas (2)
Se realizo mantenimiento (Tapa de huecos) a la via en el sector de CUCHARITO, Reparando un claro de bastante consideración que causaba incomodidad y riesgo a los usuarios de la Via.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA EN REPARACIÓN PROVISIONAL EN PUNTO CRÍTICO DE TRAMO 4, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN FRESADO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO 22

MAR 20/25 Charla a cargo de las profesionales SIS
Se inicio y Termino el fresado en el sector 23 con apoyo de motoniveladora, Vibrocompactador y dos Volquetas.
Se realizaron labores de Topografia.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAL DE INTERVENTORIA EN TRAMO 17 MIENTRAS LA COMISIÓN DE TOPOGRAFIA DEL CONTRATISTA DE OBRA CHEQUEABA NIVELES PARA PROGRAMAR INSTALACIÓN DE SUBBASE PARA EL DÍA DE MAÑANA

MAR. 21/25 Labores a cargo de los profesionales SISO
Se inició fresado en el sector 24 con apoyo de motoniveladora y Volquetas (2)
Se reinició el extendido de sub-base en el sector 17 con motoniveladora Vibrocompactador y Volquetas doble troque y apoyo de la Topografía.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA EN TRAMO 24 VERIFICANDO EL TRAZADO DE CARPETA ASFALTICA, EN TRAMO 17 CON INSTALACIÓN DE SUBBASE TOMANDO MUESTRAS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA TOMA DE DENSIDADES EN SUBRASANTE EN TRAMO 17 PARA INSTALACIÓN DE SUBBASE

MAR 22/25 No se realizaron labores en la vía, con el fin de despejarla para el uso de los visitantes a la feria del municipio de Tello evitandole posibles contratiempos.
Se realizaron labores de Topografía en oficina.

Scanned with CamScanner

MAR 25/25 charla a cargo de las profesionales SISO
Se reiniciaron labores de fresado en el sector 24 con apoyo de motoniveladora y Volquetas (2)

MAR 26/25 charla a cargo de las profesionales SISO
Continuó el Fresado en el sector 24 con apoyo de motoniveladora, Vibro compactador y Volquetas (2)
Labores de Topografía en Terreno
SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE INTERVENTORÍA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA DE HOY

MAR 27/25 charla a cargo de las profesionales SISO
Continuó el Fresado en el sector 24 con apoyo de motoniveladora y Volquetas (2)
Labores de Topografía en Terreno.

MAR 28/25 Bitácora a cargo de los profesionales SLSO
continua el Fresado en el sector 24
con apoyo de Volquetas (2)
Reinicio el extendido de sub-base en
el sector 17 con motoniveladora, Vibro
compactador y Volquetas (3) doble Tro
que y apoyo de la Topografía.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE
INTERVENTORIA EN FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN
TRAMO 24 Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA INSTALACIÓN
DE SEÑALE EN TRAMO 17, VERIFICANDO EL MATERIAL
Y LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD

MAR 29/25 Bitácora a cargo de los profesionales
SLSO
continua el Fresado en el sector 24
con apoyo de Volquetas (2)
continua el extendido de sub-base
en el sector 17 con motoniveladora,
Vibrocompactador y Volquetas (3)
doble Trogue y apoyo permanente
de la Topografía.
SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE
LA INTERVENTORIA DURANTE LA INSTALACIÓN DE
SEÑALE EN TRAMO 17 Y VERIFICACIÓN DEL
ESTADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DURANTE
LA ACTIVIDAD. SE VERIFICO LA ACTIVIDAD DE
FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO 24

28

MAR. 3 | 25 Charla a cargo de las Prof. SISO
Continúa el fresado en el sector 24 con el apoyo de Volquetas (2).
Continúa el extendido de sub-base en el sector 17 con Volquetas (3) doble Tracción motoniveladora y Vibrocompactador con apoyo de la Topografía.
SE NEGARO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN LA ALTURA DE INSTALACIÓN DE SUBBASE, VERIFICANDO JUNTO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA DEL CONTRATISTA LOS CNIVELES DE TERMINADO DE SUBBASE
PARCIAL

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4932-1 Código: SVI-C017-F13
Fecha Aprobación: 11 de Noviembre de 2022	ACTA DE REUNION	Versión: 2
		Página 1 de 3

ACTA No: 4

CONTRATO DE OBRA Nro:	0020 DE 2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:	0015 DE 2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO VG		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
14 DE MARZO DE 2025	4:30PM	6:35PM	DOS HORAS

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Temas varios de obra para fijar compromisos y soluciones.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VG
PABLO ROBERTO CLARK GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO VG
JESIKA KATHERINE ACOSTA	PROFESIONAL SISO INTERVENTORIA CONSORCIO VG
CLAUDIO MEJIA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
AURELIO CUBIDES	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
ANDRES TRUJILLO	PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

III. TEMAS TRATADOS:

1. Estructura final en tramos puntuales del proyecto en donde se encuentran cultivos de arroz.
2. Documentación de vehículos para transporte de material (volquetas).
3. Permisos para deposito final de material de excavación.
4. Entrega de acta de conformación de consorcio.
5. Profesional siso adicional para el proyecto.
6. Resultados de caracterización de material de base y subbase granular para el proyecto.
7. presentación de informes semanales.
8. Intervención prioritaria para el tramo 4.
9. Presentación de informes mensuales.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El día de ayer 14 de marzo se evidencio que la estructura que se planteó para los tramos en donde se encontraban cultivos de arroz subirá aproximadamente 50cm, esto provocará que la parte superior de vehículos grandes afecten las ramas de los árboles en los túneles verdes en el momento en que se vaya a instalar las capas de base y carpeta asfáltica.
2. En revisión de los formatos preoperacionales para volquetas del contratista, se evidencio que los vehículos no cuentan con la documentación completa, por tal razón se deberá ajustar la entrega de la documentación solicitada para dar cumplimiento a requisitos de seguridad. El contratista manifiesta

8. Se han recibido quejas de un sector en específico correspondiente al tramo 4, la comunidad solicita la intervención de dicho tramo ya que se dificulta el paso de todo tipo de vehículos y para el din de semana del 21 al 24 de marzo se estarán realizando unas ferias en el municipio de Tello, por lo cual el tránsito vehicular aumentara drásticamente y la idea es minimizar el riesgo de accidente el contratista de obra se compromete a realizar una intervención provisional para mejorar el trafico por ese punto en específico ya que es el más crítico de todos.

9. La entidad contratante cuenta con una lista de chequeo de información mínima que debe contener un informe mensual, por lo anterior la interventora da a conocer dicha lista de chequeo al contratista de obra con el fin de estandarizar la manera en la que se deben presentar los informes mensuales.

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	ENTREGA DE DOCUMENTACION FALTANTE DE VOLQUETAS Y EQUIPOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	17/03/2025
2	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA DEPOSITOS DE MATERIAL DE EXCAVACION	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	15/03/2025
3	ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONFORMACION DE VEEDURIA CIUDADANA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	15/03/2025
4	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PROFESIONAL SISO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	17/03/2025
5	ENTREGA DE CARACTERIZACION DE MATERIAL DE SUBBASE Y BASE GRANULAR RUCOM y TITULO MINERO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	17/03/2025

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCION	MUNICIPIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Claudio mejía G.	Director obra	Consorcio JPN	Tello	3125233942.	Claudiomg19@gmail.com.	
2	Andres Leonardo Trujillo O.	Administrativo	Consorcio JPN	Tello	3124895338	andres@hotmail.com	
3	Jessica Acosta C.	SST	Consorcio VG	Tello	3174318346	inter.consorciovg@gmail.com	Jessica A.
4	PABLO R. CLARK GONZALEZ	ING RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO VG	TELLO	3106855287	inter.consorciovg@gmail.com	
5	VICTOR O. RODRIGUEZ	INGENIERO	CONSORCIO VG	TELLO	3208736075	victorgvr@hotmail.com	

Anexo 5

Control Personal Obra

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1427250178	9485012464	E	2025/03/20	2025/04/22	BANCOLOMBIA	33	$2,969,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
1	CC	1082804794	ALDANA HOYOS MARIA EDITH	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
2	CC	12101945	CUBIDES RODRIGUEZ AURELIO	X																		0	$0	$0	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF32	12	$1,600,000	$64,000	14-7	12	$1,600,000	6.960%	$111,400	12	$0	$0	Si	$239,400
3	CC	1082807042	ESPINOSA VALDERRAMA SMITH SAMARA	X																	230201	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
4	CC	1082804610	LOPEZ VEGA ANLLY ASTRID	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
5	CC	12127850	LUCUARA PARRACI CARLOS ALBERTO	X																	230201	12	$720,000	$115,200	EPS005	12	$720,000	$28,800	CCF32	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	6.960%	$50,200	12	$0	$0	Si	$223,000
6	CC	12138187	MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR	X																	231001	12	$1,600,000	$256,000	EPS037	12	$1,600,000	$64,000	CCF32	12	$1,600,000	$64,000	14-7	12	$1,600,000	6.960%	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
7	CC	1075296777	MURCIA SOTO KELLYA YARETH	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	6.960%	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
8	CC	26586026	OLIVEROS SOTTO MAGALY	X																	230201	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
9	CC	1078778338	PERDOMO HORTA DANIELA	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	6.960%	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
10	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	X																	25-14	12	$1,200,000	$192,000	EPS037	12	$1,200,000	$48,000	CCF32	12	$1,200,000	$48,000	14-7	12	$1,200,000	6.960%	$83,600	12	$0	$0	Si	$371,600
11	CC	19105846	RUBIO DIAZ HECTOR	X																		0	$0	$0	EPS037	12	$720,000	$28,800	CCF32	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	6.960%	$50,200	12	$0	$0	Si	$107,800
12	CC	4945986	TRUJILLO SALAZAR JAIME	X																		0	$0	$0	EPS005	12	$1,800,000	$72,000	CCF32	12	$1,800,000	$72,000	14-7	12	$1,800,000	6.960%	$125,300	12	$0	$0	Si	$269,300
Total			**Afiliados(12)**																			$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1427250178	9485012464	E	2025/03/20	2025/04/22	BANCOLOMBIA	33	$2,969,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,184,000	$25,100	$0	$1,209,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$5,400	$0	$261,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$4,100	$0	$196,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$438,400	$9,300	$0	$447,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$297,600	$6,300	$0	$303,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$802,300	$17,000	$0	$819,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$802,300	$17,000	$0	$819,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$460,800	$9,800	$0	$470,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$460,800	$9,800	$0	$470,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$460,800	$9,900	$0	$470,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$204,800	$4,400	$0	$209,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$45,600	$1,000	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$210,400	$4,500	$0	$214,900
TOTAL				**12**	**$2,907,900**	**$61,800**	**$0**	**$2,969,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1390066937	9484254872	E	2025/03/05	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	33	$907,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA TELLO (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
1	CC	1081160572	IBARRA ROJAS ANDRES	X																	230201	13	$953,334	$152,600	EPS037	13	$953,334	$38,200	CCF32	13	$953,334	$38,200	14-11	13	$953,334	6.960%	$66,400	13	$0	$0	Si	$295,400
2	CC	11323894	MANJARRES VANEGAS ISIDRO	X																	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1075248646	OBANDO CEDEÑO GERSON ANDRES	X																	230201	6	$440,000	$70,400	EPS005	6	$440,000	$17,600	CCF32	6	$440,000	$17,600	14-11	6	$440,000	6.960%	$30,700	6	$0	$0	Si	$136,300
4	CC	1075287658	POLANIA DELVALLE JOHAN CAMILO	X																	230301	13	$953,334	$152,600	EPS037	13	$953,334	$38,200	CCF32	13	$953,334	$38,200	14-11	13	$953,334	6.960%	$66,400	13	$0	$0	Si	$295,400
5	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO JAVIER	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
Total			**Afiliados(5)**																			$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1390066937	9484254872	E	2025/03/05	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	33	$907,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$459,200	$9,700	$0	$468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$800	$0	$38,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$198,200	$4,200	$0	$202,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$223,000	$4,700	$0	$227,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$200,000	$4,200	$0	$204,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$200,000	$4,200	$0	$204,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$114,900	$2,400	$0	$117,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$114,900	$2,400	$0	$117,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$114,900	$2,500	$0	$117,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,400	$1,600	$0	$78,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,400	$300	$0	$11,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$27,100	$600	$0	$27,700
TOTAL				**5**	**$889,000**	**$18,800**	**$0**	**$907,800**

Anexo 6
Informe SST

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 2

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL INFORME: 31/03/2025

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCO VG

MARZO DE 2025

1. INTRODUCCION 5
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 6
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4. INDUCCION 8
ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción 8
5. EXAMENES MEDICO LABORALES 8
5.1. Exámenes de ingreso 9
5.2. Exámenes de egreso 9
ANEXO 2. Exámenes medico laborales 9
6. RECURSOS 10
6.1. Recursos humanos 10
6.2. Recursos técnicos 10
6.3. Recursos financieros 10
7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 11
Relación personal marzo 11
7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL 12
7.1.1. RELACION DE PERSONAL 12
ANEXO 3. Afiliaciones y planilla seguridad social 12
8. CHARLAS DE SEGURIDAD 13
ANEXO 4. Registros de asistencia 14
8.1. Registro fotográfico 15
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO 16
ANEXO 5. Acta conformación Copasst 17
9.1. Registro fotográfico 17
10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 17
ANEXO 6. Acta de conformación CCL 18
10.1. Registro fotográfico 18
11. BRIGADAS DE EMERGENCIA 18

ANEXO 7. Acta de confirmación brigadas de emergencia 19
12. CONTROL DE VEHICULOS 19
ANEXO 8. Documentación de volquetas 20
13. INSPECCIONES 20
13.1. Inspección de vehículos y maquinaria 20
13.2. Inspecciones de equipos de emergencia 21
13.3. Registro fotográfico 21
ANEXO 9. Inspecciones 22
14. SEÑALIZACION 23
14.1. Plan manejo de tránsito (PMT) 23
ANEXO 10. Facturas 24
14.2. Registro fotográfico 24
15. DOTACION Y EPP 26
ANEXO 11. Registros entrega de epp y dotación 26
16. ACCIDENTES DE TRABAJO 27
17. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS 27
ANEXO 12. Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos 27
18. PLAN DE MANEJO AMBIETAL (PMA) 27
18.1. PMA 28
NOTA: ver anexo 10 facturas 29
18.2. PUNTO ECOLOGICO 29
18.2.1. Registro fotográfico 29
18.3. Orden y Aseo 30
ANEXO 13. Acta conformación de brigada orden y aseo 30
18.3.1. Registro fotográfico 31
18.4. Permiso disposición final de material 31
ANEXO 14. Permiso disposición de material 32
19. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 33
NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1 33
20. GESTIÓN SOCIAL 33

20.1. Localización general del proyecto 33
20.2. Conformación de veedurías 33
NOTA: El anexo de la conformación de las veedurías reposa en el informe No. 1 34
20.3. Directorio del municipio de Tello 35
20.4. Gestión humana y contratación mano de obra de la región 36
20.5. PAC punto de atención al ciudadano 36
20.5.1. Registro fotográfico 37
20.6. Reuniones informativas con la comunidad 37

JPNTELLO

1. INTRODUCCION

El presente documento relaciona las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo que corresponden, al mes de marzo del presente año, realizadas en la ejecución del proyecto **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 15 DE 2024, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un pilar fundamental de la empresa, ya que busca garantizar condiciones laborales seguras, prevenir accidentes y proteger el bienestar físico y mental de los trabajadores. A través de la identificación, evaluación y control de riesgos, se promueve un entorno de trabajo saludable y eficiente.

La ejecución de medidas de SST no solo cumple con normativas legales, sino que también mejora la productividad, reduce costos asociados a incidentes laborales y fortalece la cultura organizacional. Una adecuada gestión de la seguridad laboral es clave para fomentar el compromiso de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

JPN TELLO

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	27 DE MAYO DE 2025

3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un modelo estructurado que permite a las empresas identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Su ejecución es un requisito legal, el cual está diseñado para mejorar continuamente las condiciones de trabajo, promoviendo un ambiente seguro y saludable para los empleados.

un SG-SST bien ejecutado no solo protege la vida y la salud de los trabajadores, sino que también beneficia a la empresa al reducir costos asociados a incidentes laborales, mejorar la moral del equipo y fortalecer la reputación de la organización. Su correcta gestión contribuye a crear un entorno laboral más seguro, cumpliendo con las normativas legales y promoviendo el bienestar de todos los colaboradores.

4. INDUCCION

La **inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** es un proceso fundamental para garantizar que todos los trabajadores de la obra conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas que deben seguir para desarrollar sus actividades de manera segura.

En la inducción al personal se les dio a conocer la siguiente información:

- Explicar las normas y procedimientos de seguridad que deben cumplir.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la ejecución de sus actividades.
- Reglamento y horarios de trabajo
- capacitar sobre en el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Sensibilizar sobre la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

En el mes de marzo se realizó la inducción a 4 personas que ingresaron al proyecto

ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción

5. EXAMENES MEDICO LABORALES

En cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, se han realizado los **exámenes médicos laborales** requeridos para la ejecución de las actividades en obra.

Estos exámenes permiten evaluar la condición física y aptitud médica del personal, asegurando que se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones sin riesgo para su bienestar.

- Todos los trabajadores han sido evaluados de acuerdo con el perfil ocupacional de su cargo.
- Se cuenta con los certificados médicos que respaldan la aptitud del personal.

- Se garantiza la confidencialidad de los resultados y el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional.

La realización de estos exámenes médicos contribuye a la prevención de enfermedades laborales y refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad y el bienestar de su equipo de trabajo

5.1. Exámenes de ingreso

- Verificar que el trabajador se encuentra **apto física y mentalmente** para desempeñar el cargo.
- Identificar condiciones de salud preexistentes.
- Garantizar que las tareas asignadas no representen un riesgo para su salud ni para la de terceros

Personal que realizaron los exámenes de ingreso el mes marzo

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUNIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR
HENRRY VARGAS	83.253.808	CONDUCTOR
DARIO FLORES MOTTA	7.710.473	OPE. RETRO EXCAVADORA
HECTOR ACOSTA	12.097.084	OPE. MOTONIVELADORA

5.2. Exámenes de egreso

- Evaluar el estado de salud del trabajador al momento de su retiro.
- Identificar si se produjo algún deterioro relacionado con la exposición a factores de riesgo durante su permanencia en la empresa.
- Dejar un registro clínico oficial que pueda usarse en caso de reclamaciones o procesos legales.

ANEXO 2. Exámenes medico laborales

6. RECURSOS

6.1. Recursos humanos

Responsable del SG-SST: Profesional en seguridad y salud en el trabajo encargado de la gestión y supervisión del sistema.

Nombre Profesional	Cargo
Brian Alexander Hernández Olaya	Profesional SST
Kellya Murcia Soto	Auxiliar SST
Daniela Perdomo Horta	Profesional SST

6.2. Recursos técnicos

- Equipos de Protección Personal (EPP): Cascos, guantes, gafas de seguridad, botas punta de acero, chalecos reflectivos, entre otros.
- Señalización y demarcación: Avisos de prevención, zonas de riesgo y prohibiciones.
- Herramientas y equipos seguros: Equipos en buen estado, revisados periódicamente para evitar fallos o accidentes.

6.3. Recursos financieros

- Presupuesto para seguridad y salud en el trabajo: Inversión en capacitación, compra de EPP, señalización y equipos de seguridad.

7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con las obligaciones contractuales y en cumplimiento del pliego de condiciones, se han realizado las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato a los sistemas de seguridad social obligatorios. Estas afiliaciones incluyen:

- Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Garantiza la cobertura en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Fondo de Pensiones: Asegura la cotización para la jubilación o protección en casos de invalidez o fallecimiento.
- Sistema de Salud: Proporciona acceso a servicios médicos y prestaciones asistenciales.

Se cuenta con los soportes correspondientes que evidencian la afiliación y pago de aportes del personal vinculado. Además, se han implementado medidas de control para garantizar el cumplimiento continuo de estas obligaciones durante la ejecución del contrato.

Relación personal marzo

PERSONAL INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS		
LUNIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR
HENRRY VARGAS	83.253.808	CONDUCTOR
DARIO FLORES MOTTA	7.710.473	OPE. RETRO EXCAVADORA
HECTOR ACOSTA	12.097.084	OPE. MOTONIVELADORA

7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia y de las obligaciones contractuales establecidas, la empresa realizo el pago de la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes**, como evidencia del cumplimiento de las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el personal vinculado al proyecto.

7.1.1. RELACION DE PERSONAL

PERSONAL CONSORCIO JPN		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
CLAUDIO MEJIA GUTIERREZ	12.138.187	ING. DIRECTOR
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE
JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO
HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2
CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA
SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST
KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	AUXILIAR SST
PERSONAL INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS		
JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA
ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA
LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR
ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA
GERSON ANDRES OBANDO CEDEÑO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA
ISIDRO MANJARRES VANEGAS	11.323.894	CELADOR
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE

ANEXO 3. Afiliaciones y planilla seguridad social

8. CHARLAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, antes de iniciar la jornada laboral se realizan charlas de seguridad con el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención de riesgos.

Estas charlas reflejan el compromiso de la empresa contratista con la seguridad y el bienestar del personal, permitiendo:

- Analizar situaciones que podrían derivar en accidentes.
- Evaluar los riesgos a los cuales están expuestos en la ejecución de las actividades.
- Identificar y aplicar medidas de control adecuadas.

El profesional SST es el encargado de dirigir estas charlas diarias, explicando las tareas programadas, los riesgos asociados y las acciones preventivas a implementar.
La capacitación o charla pre operacional es de carácter obligatorio y debe realizarse todos los días antes del inicio de las actividades con la participación de todo el personal de obra.
Se llevan registros de asistencia y temas tratados como evidencia del cumplimiento de este requisito.


FECHA	TEMA
1/03/2025	Comunicación
3/03/2025	Riesgo biológico
4/03/2025	Epp- orden y aseo
5/03/2025	Riesgo físico
7/03/2025	Orden y aseo
8/03/2025	Uso obligatorio de epp
10/03/2025	Conformación del COPASST Y COCOLA
11/03/2025	Conformación de brigadas
12/03/2025	Epp y carpado obligatorio de volquetas
13/03/2025	Ambiente laboral

14/03/2025	Buena comunicación y respeto en el trabajo
15/03/2025	Recomendaciones generales en sst
17/03/2025	Uso obligatorio de tapabocas- infecciones respiratorias
18/03/2025	Trabajo en equipo
19/03/2025	Autocuidado personal
20/03/2025	Seguridad vial - Epp
21/03/2025	Buen trato y buena comunicación
25/03/2025	Entorno laboral
26/03/2025	Correcto uso de epp
27/03/2025	Uso obligatorio de tapabocas
28/03/2025	Ambiente laboral - epp
29/03/2025	Comunicación
31/03/2025	Respeto y buen trato

ANEXO 4. Registros de asistencia

JPNTELLO

8.1. Registro fotográfico

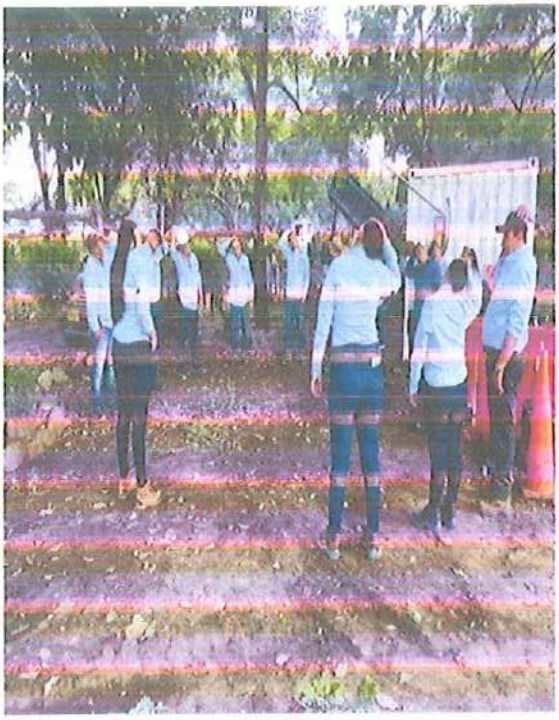












9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO

En cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el mes de marzo se ha realizado la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el cual tiene como función principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de prevención de riesgos laborales dentro de la obra.

ANEXO 5. Acta conformación Copasst

9.1. Registro fotográfico

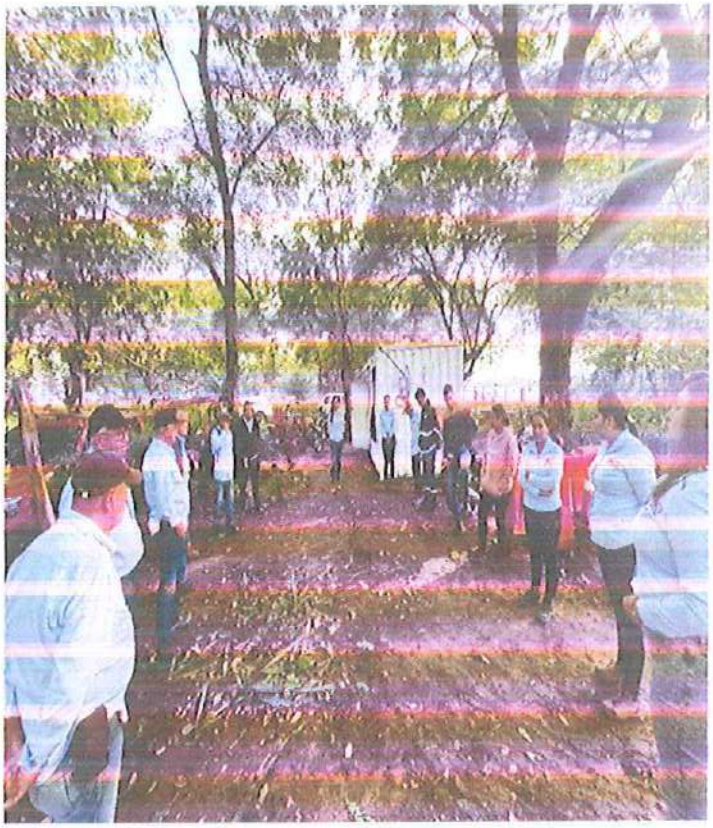

10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, salud en el trabajo y bienestar organizacional, en el mes de marzo se realizó conformación del **Comité de Convivencia Laboral (CCL)**, con el propósito de prevenir y atender situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente de trabajo sano, respetuoso y armonioso.

ANEXO 6. Acta de conformación CCL

10.1. Registro fotográfico



11. BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento del Plan de Emergencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), durante el mes de marzo se realizó la conformación de las Brigadas de Emergencia, con el propósito de garantizar:

- actuar de manera organizada y eficiente ante situaciones de emergencia.
- Proteger la vida e integridad de los trabajadores y visitantes en la obra.
- coordinar acciones de prevención, atención y recuperación en caso de incidentes.

- Reducir el impacto de emergencias mediante respuestas rápidas y efectivas.

ANEXO 7. Acta de confirmación brigadas de emergencia

12. CONTROL DE VEHICULOS

El control adecuado de vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla es clave para la seguridad vial en la obra. Implementar protocolos de inspección, mantenimiento y capacitación ayuda a reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con la normativa vigente

Durante el mes de marzo el consorcio conto con vehículos Livianos, pesados y maquina amarilla para la ejecución de actividades en obra, se relacionan a continuación

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA

No.	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO	TARJETA REGISTRO
1	Motoniveladora	Champión	710 a	1989	157-694-19629
2	Motoniveladora	Champión	715 a	2006	715ª-101-0705-2
3	Retroexcavadora	Caterpilar	320 D	2008	CPPAB06905
4	Retroexcavadora	Caterpilar	320 CL	2006	CAT0320CPPAB06905
5	Vibroconpactador	Dynapac	CA125D	1998	64220324

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS

No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	Camioneta	CHEVROLET	LUV D MAX DSL	2006	CMQ 423
2	Camioneta	FORD	RANGER	2012	TDS 050

LISTADO DE VOLQUETAS

No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1998	OWH 749
2	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1983	OZD 276

ANEXO 8. Documentación de volquetas

Nota: la documentación del resto de maquinaria y vehículos reposa en el informe 1

13. INSPECCIONES

13.1. Inspección de vehículos y maquinaria

Las inspecciones de seguridad y pre operacionales de maquinaria son estrategias preventivas implementadas por la empresa para identificar peligros y controlar riesgos antes de que puedan ocasionar daños a los trabajadores o afectar el entorno donde se desarrollan las actividades.

A través de estas inspecciones se busca:

- Verificar el estado mecánico y operativo de la maquinaria.
- Detectar posibles fallas o condiciones inseguras que puedan generar accidentes.
- Asegurar que los equipos cumplan con las normas de seguridad y mantenimiento establecidas.
- Evaluar el correcto uso de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria.

Estas inspecciones son realizadas antes del inicio de cada jornada laboral o previo a la operación de cualquier equipo, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar riesgos.

Se lleva un registro detallado de cada inspección y documentando.

13.2. Inspecciones de equipos de emergencia

En el mes de marzo se realizan inspecciones a los equipos de emergencia con el objetivo de verificar su estado, funcionamiento y disponibilidad, garantizando una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad en la obra.

En la locación contamos con

- Camilla de emergencia con inmovilizador cervical
- Extintores
- Botiquines
- Kit antiderrame

13.3. Registro fotográfico





JPNTELLO



ANEXO 9. Inspecciones

14. SEÑALIZACION

De acuerdo al plan de manejo de tránsito (PMT) La señalización de la obra es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y conductores que transitan por la zona de intervención. Su correcta implementación permite informar, advertir y regular la circulación, minimizando riesgos y evitando accidentes.

La señalización vial debe cumplir con las normativas vigentes y ser visible en todo momento, asegurando que los usuarios de la vía puedan identificar oportunamente las condiciones del tránsito y las restricciones generadas por la obra.

Diariamente se realiza una verificación de la señalización para garantizar su correcto estado y visibilidad, asegurando que:

- Las señales estén bien ubicadas y en condiciones óptimas.
- Los dispositivos de seguridad cumplan su función.
- Se implementen ajustes según el avance de la obra y las condiciones del tráfico.

La correcta aplicación de la señalización en obra vial contribuye a la prevención de accidentes y al ordenamiento del tránsito, garantizando un entorno seguro para todos los involucrados.

14.1. Plan manejo de tránsito (PMT)

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*
Barricada de listones, con tablero "SEÑAL VÍA CERRADA"	UND	2
Paleta de control PARE-SIGA	UND	0
Señal INICIO DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	3
Señal FIN DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	3
Señal SPO-1 TRABAJOS EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	2

Señal SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	2
Señal SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Delineador compuesto separado cada 11 metros	UND	6
Cinta de demarcación (500m)	UND	4
Radio teléfono Banda VHF (Frecuencia 151-161 MHZ) Banda UHF (Frecuencia 462-469 MHZ) 8 Canales	UND	5
Chalecos reflectivos	UND	0
Planos Plan de Manejo de Tráfico	UND	0

ANEXO 10. Facturas

14.2. Registro fotográfico



JPNTELLO









15. DOTACION Y EPP

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se ha realizado la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores vinculados a la obra, garantizando su seguridad y bienestar durante la ejecución de las actividades.

La dotación y los EPP suministrados cumplen con los estándares de calidad y normativas vigentes, asegurando su adecuada protección. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Protección para la cabeza: Casco de seguridad con suspensión ajustable.
- Protección ocular y facial: Gafas de seguridad
- Protección auditiva: Tapones o protectores auditivos.
- Protección respiratoria: Tapabocas.
- Protección de manos: Guantes de seguridad
- Protección corporal: Pantalón, camisas y chaleco reflectivo para alta visibilidad.
- Protección de pies: Botas de seguridad con puntera de acero.

Se ha registrado la entrega de los elementos a cada trabajador mediante actas de recepción firmadas, como también se capacita al personal en el uso correcto de los elementos entregados y su mantenimiento.
El suministro y control de la dotación y los EPP hacen parte del compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

ANEXO 11. Registros entrega de epp y dotación

16. ACCIDENTES DE TRABAJO

Un accidente de trabajo es todo suceso que cause daño o perjuicio a la salud del trabajador mientras desempeña sus actividades laborales, ya sea en el lugar de trabajo o durante el desempeño de las labores, siempre que exista una relación directa con la actividad laboral.

Durante el periodo del mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo.

17. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) es una herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la cual se identifican, analizan y valoran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales.

Esta matriz permite determinar el nivel de riesgo de cada actividad, establecer controles existentes y proponer medidas de intervención para prevenir accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad o al medio ambiente.

ANEXO 12. Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos

18. PLAN DE MANEJO AMBIETAL (PMA)

El **Plan de Manejo Ambiental (PMA)** es un conjunto de medidas y estrategias implementadas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados por la ejecución de la obra. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de la normatividad vigente.

El **PMA** nos permite:

- Minimizar los impactos ambientales negativos generados por la obra.
- Promover el uso eficiente de los recursos naturales.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
- Fomentar buenas prácticas ambientales entre los trabajadores.

JPNTELLO

18.1. PMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD:
I-GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL		
Descripción	Unidad	Cantidad
Reuniones informativas con la comunidad del Área de influencia directa e indirecta del proyecto - socialización de inicio, avance y fin de obra	Und	0
II-CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES		
Descripción	Unidad	Cantidad
Baños Portátiles (Incluye mantenimiento y disposición de aguas residuales)	mes	0
III-PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Desmantelamiento obras provisionales	m2	0
Restauración de las áreas intervenidas (zonas de depósito, campamento y acopio de material sobrante)	m2	0
Riego de plantas tapizantes, de cobertura y de empradización durante cuatro meses desde el primer día, cada ocho días (10 lts)	m2	0
IV-MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENTES A ESCOMBROS Y LODOS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit para desperdicios sólidos (Incluye kits antiderrames, cubrimientos y señalización de la obra, cinta de peligro, avisos proximidad)	Und	1
V-ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD		
Descripción	Unidad	Cantidad
Talleres ambientales dirigidos a los centros educativos ubicados en el área de influencia del proyecto	Und	0
VI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit de primeros auxilios y extintores	Und	0

NOTA: ver anexo 10 facturas

18.2. PUNTO ECOLOGICO

Como parte de las estrategias de gestión ambiental y en cumplimiento del **Plan de Manejo Ambiental (PMA)**, se ha implementado un Punto Ecológico dentro de la obra, con el propósito de promover la separación adecuada de residuos y minimizar el impacto ambiental generado por las actividades laborales.

El punto ecológico se establece con el fin de:

- Facilitar la clasificación y disposición adecuada de los residuos generados en la obra.
- Fomentar la cultura de reciclaje y el manejo responsable de los desechos.
- Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
- Cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto a gestión de residuos.

El adecuado funcionamiento del **Puntos Ecológico** refleja el compromiso del consorcio con la **gestión ambiental sostenible**, promoviendo una cultura de responsabilidad ecológica dentro del entorno laboral.

18.2.1. Registro fotográfico



18.3. Orden y Aseo

El mantenimiento del orden y aseo en el área de trabajo es fundamental para garantizar un ambiente seguro, eficiente y saludable dentro de la obra. Estas acciones permiten prevenir accidentes, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de las normas de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Plan de manejo ambiental (PMA)**

las jornadas de orden y aseo tienen como finalidad:

- prevenir accidentes laborales causados por desorden o acumulación de materiales.
- Mantener los diferentes frentes de trabajo organizados, facilitando la movilidad del personal y el almacenamiento adecuado de implementos de obra.
- Cumplir con normativas ambientales, promoviendo una correcta separación y disposición de residuos.

Se realizó la conformación de la brigada de orden y aseo durante el mes de marzo.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

El compromiso con el **orden y aseo** no solo mejora la seguridad y eficiencia operativa, sino que también refuerza una cultura de prevención de riesgos y responsabilidad ambiental dentro de la empresa.

NOTA: La solicitud de recolección de residuos reposa en el informe No. 1

ANEXO 13. Acta conformación de brigada orden y aseo

18.3.1. Registro fotográfico



18.4. Permiso disposición final de material

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente y del **Plan de Manejo Ambiental (PMA)** se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.

NOMBRE	PERMISO Y /O AUTORIZACION	FECHA / ENTIDAD APROBATORIA
JHON FRANT RIVERA MACIAS C.C. 7.706.939	Autorización para el suministro de material de excavación para el mejoramiento del piso de mi vivienda ubicada en el barrio la portada.	28 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila
EDID VILLALBA CASTAÑEDA	Autorización para el suministro de material de excavación para el mejoramiento del piso de mi vivienda ubicada en el barrio la portada.	28 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila
ERLENDY TAFUR GULUMA C.C. 97.446.701	Autorización para el suministro de material de excavación para el relleno del predio ubicado en el barrio julio bahamon.	28 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila
JOSE YAMIR GOMEZ MEDINA C.C. 4.943.233	Autorización para el suministro de material de excavación para el mejoramiento del piso de mi vivienda ubicada en el barrio brisas de Villavieja.	28 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila
JUAN CARLOS MEDINA ROBLES	Autorización para el suministro de material de excavación para ser acopiado en predio del municipio	17 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente y del **Plan de Manejo Ambiental (PMA)** se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.

ANEXO 14. Permiso disposición de material

19. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

El mantenimiento mensual de la maquinaria se basa en el **cambio de filtros y aceite cada 250 horas de operación**. Este procedimiento se realizará **en el sitio de trabajo**, con la excepción de las volquetas, cuyo mantenimiento se llevará a cabo en el taller correspondiente.

Para garantizar una adecuada gestión ambiental, los **aceites y filtros usados** serán recolectados en **recipientes específicos** y almacenados en **sitios adecuados** para su correcta disposición final, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y evitando la contaminación del entorno.

NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1

20. GESTIÓN SOCIAL

20.1. Localización general del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del huila entre el cruce de Villavieja (cucara) y la cabecera municipal de Tello, consiste en el mantenimiento del 5,33 kilómetro de vía en los sectores mas deteriorados de la misma distribuidos en 25 tramos seleccionados previamente, de acuerdo a ales necesidades.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

20.2. Conformación de veedurías

Las **veedurías ciudadanas** son mecanismos de participación social que permiten a la comunidad hacer seguimiento, control y vigilancia a la gestión pública, especialmente en la ejecución de proyectos, obras y programas de interés colectivo.

Su objetivo principal es garantizar la **transparencia, eficiencia y cumplimiento** de los recursos y acciones gubernamentales

Las veedurías conformadas para el proyecto son

VEEDURIA TRANSPARENCIA

NOMBRE	C.C	CARGO
DEICI ALEJANDRA GUTIÉRREZ TOBAR	26.585.822	PRESIDENTE
ADRIANA MARÍA DÍAZ	26.585.849	VEEDOR
JOSÉ VICENTE SOLANO VARGAS	12.126.709	VEEDOR

"VEEDURÍA CIUDADANA REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE FORTALECILLAS-TELLO

NOMBRE	C.C	CARGO
JESÚS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	12.109.567	PRESNIDENTE
JAMITH SEFAIR GARCÍA	83.242.512	VICEPRESIDENTE
ARMANDO SÁNCHEZ MOSQUERA	83.243.590	SECRETARIO

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO

NOMBRE	C.C	CARGO
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	N/A
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	N/A
RAÚL CARDOZO RODRÍGUEZ	4.942.911	N/A

NOTA: El anexo de la conformación de las veedurías reposa en el informe No. 1

JPNTELLO

20.3. Directorio del municipio de Tello

A continuación, se relaciona las entidades públicas para las atenciones a la comunidad

NOMBRE	CARGO	E-MAIL	CONTACTO
Fernando Alipio Solano G	Alcalde Municipal	contactenos@tello-huila.gov.co	3209013619
Edna Lorena Diaz	Secretaria de planeación	contactenos@tello-huila.gov.co	3123668197
Juan Carlos Medina R	Secretario general y de gobierno	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Erit Francisco	Comisario de familia	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Ivon Duarte	Inspector de policía	contactenos@tello-huila.gov.co	3228169110
Maidy Cangrejo Quintero	Personería	Personeria@tello-huila.gov.co	3158232480
Yuli Paola González	Gerente Miguel Barreto López	contactenos@esemiguelbarretolopez.gov.co	3185672046
Bomberos	Cuerpo voluntario de Tello	bomberosvoluntariosdetello@gmail.com	3144835629

JPNTELLO

20.4. Gestión humana y contratación mano de obra de la región

listado del personal contratado de la región para la ejecución del proyecto

PERSONAL DE LA ZONA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	MUNICIPIO
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Tello
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Tello
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Tello
SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Tello
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Baraya
KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	AUXILIAR SST	Tello
ISIDRO MANJARRES VANEGAS	11.323.894	CELADOR	Tello
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Tello
ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	Baraya

20.5. PAC punto de atención al ciudadano

El punto de atención al ciudadano se encuentra ubicado en el tramo 17 ubicado en el sector los guásimos, donde se atiende a la comunidad y personal de obra y los PQRS. De igual manera se recibe y atiende via correo electrónico para mayor facilidad.

El PAC se encuentra dotado por escritorios, sillas, computador, impresora, tableros, archivadores, todo esto con el fin de dar la mejor atención a la comunidad.

Para el mes de marzo no se recibieron PQRS

JPNTELLO

20.5.1. Registro fotográfico



20.6. Reuniones informativas con la comunidad

Para el mes de marzo no se realizaron reuniones informativas al Área de influencia directa e indirecta del proyecto.

ANEXO 1 ASISTENCIA INDUCCION

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Inducción SST			
HORA	8:00 am - 8:30 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA	FIRMA
1	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR VOLQUETA	8-03-2025	Lunio Quintero

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Pardo Hoyos

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Inducción SST			
HORA	7:00 am - 7:15 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN	X	CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA	FIRMA
1	HENRRY VARGAS	83253808	CONDUCTOR VOLQUETA	19-03-2025	Henry Vargas

FIRMA PROFESIONAL SST: [signature]

NOMBRE: Daniela Perdomo Ortiz

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
TEMA	Inducción SST				
HORA	7:25 am - 7:40 am				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD		
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA	FIRMA
1	DARIO FLORES MOTTA	7710473	OPE. RETRO EXCABADORA	26-03-2025	

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Inducción SST.			
HORA	7:25 am 7:45 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN	x	CHARLA SEGURIDAD	x
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA	FIRMA
1	HECTOR ACOSTA	12097084	OPE. MOTONIVELADORA	28-03-2025	Hector Acosta

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta

Scanned with CamScanner

ANEXO 2 EXAMENES DE INGRESO

Salud Vital IPS

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA:2025-03-04HORA: 11:56

DATOS DEL TRABAJADOR



PACIENTE: LUNIO QUINTERO POLANIA
EDAD: 60 Años ID: CC 83233181
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-23 SEXO: M
TEL. 3118662562 TIPO DE SANGRE: O+
DIRECCION: CALLE 13 N 6-46 PALERMO (HUILA)
CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA
EPS: E.P.S SANITAS
EMPRESA USUARIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS
CONVENIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS

TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS ☐ CONDUCTORES

☑ ENFASIS OSTEOMUSCULAR OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

CONCEPTO DE EGRESO: -

CONCEPTO PERIÓDICO: -

CONCEPTO REINTEGRO: -

CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -

MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (Aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXÁMENES REALIZADOS

☑ AUDIOMETRIA	☐ ELECTROCARDIOGRAMA	☐ OPTOMETRIA	☐ ESPIROMETRIA
☐ PSICOTECNICO	☑ EXAMEN OSTEOMUSCULAR	☑ VISIOMETRIA	
☐ OXIMETRIA DE PULSO	☐ PRUEBA PSICOLÓGICA	☐ PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA	
☐ RX COLUMNA CERVICAL	☐ RX COLUMNA DORSAL	☐ RX COLUMNA DORSOLUMBAR	
☐ RX COLUMNA TOTAL	☐ RX TÓRAX AP Y LATERAL	☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA	
☑ E.LABORATORIO EN SANGRE			

CONDUCTA		
• Conducta de manejo médico: ☐ a. Continuar manejo médico ☐ b. Remisión a EPS. ☐ c. Seguimiento por la ARL. ☑ d. Asistir a programas de promoción y prevención EPS, de acuerdo a la edad ☐ e. Usar medias de compresión antivarices ☐ f. Usar lentes de corrección óptica ☐ g. Usar lentes de protección óptica frente a luces naturales y artificiales Otros:	• Conducta médica laboral: ☑ a. Capacitación y verificación en uso adecuado de los elementos de protección personal. ☑ b. Autocapación higiene postural. ☑ c. Pausas activas ☑ d. Ingreso a programa de vigilancia epidemiologica: - VISUAL, AUDITIVO ☐ e. Educación en manejo de cargas **f. Otros:**	• Cond. sobre hábitos y est. de vida saludables: ☐ a. Actividad física regular mínimo 150 minutos semana ☑ b. Alimentación sana y balanceada ☐ c. Desestimular consumo de ☐ Cigarrillo ☐ Alcohol ☐ Sustan. psicoactivas **d. Otro:**

Remision:

Observaciones: ***AUDIOMETRIA ALTERADA, VISIOMETRIA ALTERADA ,GLICEMIA,PERFIL LIPIDICO: NORMALES***

RECOMENDACIONES:

SE SUGIERE GAFAS DE LECTURA

CONTROL DE PESO POR NUTRICION EN EPS

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN EXPOSICION.

PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA.

VALORACION POR OTORRINO EN EPS.

VALORACION POR AUDIOLOGIA EN EPS.

AUDIOMETRIA DE CONTROL EN EPS.

NO EXPOSICION A RUIDO MAYOR A 85 DB SIN EL USO DE PROTECCION AUDITIVA.

SE SUGIERE TENER PRECAUCION CON ACTIVIDADES QUE REQUIERAN COMUNICACION VERBAL.

NO ACTIVIDADES EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (no aplican énfasis para): trabajo en Alturas, Manipular Alimentos, Espacios Confinados, conducción,trabajos especiales, brigadista, porte de armas, exposición a sustancias químicasmaterial particulado.

CONDICIONES:

RESTRICCIONES:

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y EN ESTA HISTORIA CLINICA CONSIGNADA, ES VERAZ Y PUEDE SER VERIFICADA, QUE HE RECIBIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MEDICO Y QUE NO HE OCULTADO NINGUNA PATOLOGÍA.

Jesús Hebert Díaz

Salud Vital IPS

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA:2025-03-25HORA: 16:50

DATOS DEL TRABAJADOR



PACIENTE: JOSE DARIO FLOREZ MOTTA
EDAD: 46 Años ID: CC 7710473
FECHA DE NACIMIENTO: 1978-07-17 SEXO: M
TEL. 3117272012 TIPO DE SANGRE: O+
DIRECCION: CRA 40 N 2 D 04 NEIVA (HUILA)
CARGO: OPERADOR RETROEXCAVADORA
EPS: NUEVA EPS
EMPRESA USUARIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS
CONVENIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS

TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS ☐ CONDUCTORES

☑ ENFASIS OSTEOMUSCULAR OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

CONCEPTO DE EGRESO: -

CONCEPTO PERIÓDICO: -

CONCEPTO REINTEGRO: -

CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -

MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (Aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXÁMENES REALIZADOS

☑ AUDIOMETRIA	☐ ELECTROCARDIOGRAMA	☐ OPTOMETRIA	☐ ESPIROMETRIA
☐ PSICOTECNICO	☑ EXAMEN OSTEOMUSCULAR	☑ VISIOMETRIA	
☐ OXIMETRIA DE PULSO	☐ PRUEBA PSICOLÓGICA	☐ PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA	
☐ RX COLUMNA CERVICAL	☐ RX COLUMNA DORSAL	☐ RX COLUMNA DORSOLUMBAR	
☐ RX COLUMNA TOTAL	☐ RX TÓRAX AP Y LATERAL	☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA	
☑ E.LABORATORIO EN SANGRE			

CONDUCTA		
• Conducta de manejo médico: ☐ a. Continuar manejo médico ☐ b. Remisión a EPS. ☐ c. Seguimiento por la ARL. ☑ d. Asistir a programas de promoción y prevención EPS, de acuerdo a la edad ☐ e. Usar medias de compresión antivarices ☐ f. Usar lentes de corrección óptica ☐ g. Usar lentes de protección óptica frente a luces naturales y artificiales Otros:	• Conducta médica laboral: ☑ a. Capacitación y verificación en uso adecuado de los elementos de protección personal. ☑ b. Autocapación higiene postural. ☑ c. Pausas activas ☑ d. Ingreso a programa de vigilancia epidemiologica: - AUDITIVO,VISUAL ☑ e. Educación en manejo de cargas f. Otros:	• Cond. sobre hábitos y est. de vida saludables: ☐ a. Actividad física regular mínimo 150 minutos semana ☑ b. Alimentación sana y balanceada ☐ c. Desestimular consumo de ☐ Cigarrillo ☐ Alcohol ☐ Sustan. psicoactivas d. Otro:

Remision:

Observaciones: AUDIOMETRIA,VISIOMETRIA: ALTERADOS,
GLIECMIA,PERFIL LIPIDICO: NORMALES

RECOMENDACIONES:

CONTROL DE PESO POR NUTRICION EN EPS.

SE SUGIERE TENER PRECAUCION CON ACTIVIDADES QUE REQUIERAN COMUNICACION VERBAL.

USO DE CORRECCION VISUAL CONTINUO.

AUDIOMETRIA DE CONTROL EN EPS.

VALORACION POR OTORRINO, AUDIOLOGIA EN EPS.

NO EXPOSICION A RUIDO MAYOR A 85 DB SIN EL USO DE PROECCION AUDITIVA

CONTINUAR CONTROLES EN EPS DE SU PATOLOGIA DE BASE.

SE RECOMIENDA REALIZAR ECOGRAFIA DE PARED ABDOMINAL EN EPS.

NO EXCEDER LOS LIMITES PERMITIDOS POR NORMATIVIDAD PARA EL LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS, MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS, VALORACION POR CIRUGIA GENERAL EN EPS.

CONTROL CON SOPORTE DE LA VALORACION EN EPS.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN EXPOSICION.

PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA.

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (no aplican énfasis para): trabajo en Alturas, Manipular Alimentos, Espacios Confinados, conducción,trabajos especiales, brigadista, porte de armas, exposición a sustancias químicasmaterial particulado.

CONDICIONES:

RESTRICCIONES:

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y EN ESTA HISTORIA CLINICA CONSIGNADA, ES VERAZ Y PUEDE SER VERIFICADA, QUE HE RECIBIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MEDICO Y QUE NO HE OCULTADO NINGUNA PATOLOGÍA.

Salud Vital IPS

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA:2025-03-10HORA: 15:14

DATOS DEL TRABAJADOR



PACIENTE: HENRY VARGAS RAMIREZ
EDAD: 49 Años ID: CC 83253808
FECHA DE NACIMIENTO: 1975-12-19 SEXO: M
TEL. 3209527158 TIPO DE SANGRE: O+
DIRECCION: CALLE 23 SUR N 24-21 NEIVA (HUILA)
CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA
EPS: NUEVA EPS
EMPRESA USUARIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS
CONVENIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS

TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS ☐ CONDUCTORES
☑ ENFASIS OSTEOMUSCULAR OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO
CONCEPTO DE EGRESO: -
CONCEPTO PERIÓDICO: -
CONCEPTO REINTEGRO: -
CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -
MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (Aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXÁMENES REALIZADOS

☑ AUDIOMETRIA	☐ ELECTROCARDIOGRAMA	☐ OPTOMETRIA	☐ ESPIROMETRIA
☐ PSICOTECNICO	☑ EXAMEN OSTEOMUSCULAR	☑ VISIOMETRIA	
☐ OXIMETRIA DE PULSO	☐ PRUEBA PSICOLÓGICA	☐ PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA	
☐ RX COLUMNA CERVICAL	☐ RX COLUMNA DORSAL	☐ RX COLUMNA DORSOLUMBAR	
☐ RX COLUMNA TOTAL	☐ RX TÓRAX AP Y LATERAL	☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA	
☑ E.LABORATORIO EN SANGRE			

CONDUCTA		
• Conducta de manejo médico: ☐ a. Continuar manejo médico ☐ b. Remisión a EPS. ☐ c. Seguimiento por la ARL. ☑ d. Asistir a programas de promoción y prevención EPS, de acuerdo a la edad ☐ e. Usar medias de compresión antivarices ☐ f. Usar lentes de corrección óptica ☐ g. Usar lentes de protección óptica frente a luces naturales y artificiales Otros:	• Conducta médica laboral: ☑ a. Capacitación y verificación en uso adecuado de los elementos de protección personal. ☑ b. Autocapación higiene postural. ☑ c. Pausas activas ☑ d. Ingreso a programa de vigilancia epidemiologica: - AUDITIVO,VISUAL ☐ e. Educación en manejo de cargas **f. Otros:**	• Cond. sobre hábitos y est. de vida saludables: ☐ a. Actividad física regular mínimo 150 minutos semana ☑ b. Alimentación sana y balanceada ☐ c. Desestimular consumo de ☐ Cigarrillo ☐ Alcohol ☐ Sustan. psicoactivas **d. Otro:**

Remision:

Observaciones: ***AUDIOMETRIA ALTERADA, VISIOMETRIA ALTERADA ,HEMOGRAMA, GLICEMIA: NORMALES***

RECOMENDACIONES:

AUDIOMETRIA DE CONTROL EN EPS.

USO DE CORRECCION VISUAL CONTINUO.

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN EXPOSICION.

PAUSAS ACTIVAS SEGÚN PROTOCOLO DE LA EMPRESA.

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (no aplican énfasis para): trabajo en Alturas, Manipular Alimentos, Espacios Confinados, conducción,trabajos especiales, brigadista, porte de armas, exposición a sustancias quimicasmaterial particulado.

CONDICIONES:

RESTRICCIONES:

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y EN ESTA HISTORIA CLINICA CONSIGNADA, ES VERAZ Y PUEDE SER VERIFICADA, QUE HE RECIBIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MEDICO Y QUE NO HE OCULTADO NINGUNA PATOLOGÍA.

Jessica Medina Díaz

JESSICA MEDINA DIAZ
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
R.M. 86257 - LO 0332

PACIENTE: HENRY VARGAS RAMIREZ
ID. CC 83253808

CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL

FECHA:2025-03-26HORA: 15:19

DATOS DEL TRABAJADOR



PACIENTE: HECTOR ULISES ACOSTA
EDAD: 78 Años ID: CC 12097084
FECHA DE NACIMIENTO: 1946-04-30 SEXO: M
TEL. 3132069660 TIPO DE SANGRE: O+
DIRECCION: CRA 4 A W N 30 A 46 NEIVA (HUILA)
CARGO: OPERADOR MOTONIVELADORA
EPS: NUEVA EPS
EMPRESA USUARIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS
CONVENIO: INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS

TIPO DE EXAMEN

- PREINGRESO

ENFASIS

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ TRABAJO EN MANIPULACION DE ALIMENTOS ☐ CONDUCTORES
☑ ENFASIS OSTEOMUSCULAR OTRO:

CONCEPTO DE APTITUD

CONCEPTO DE INGRESO: APLAZADO
CONCEPTO DE EGRESO: -
CONCEPTO PERIÓDICO: -
CONCEPTO REINTEGRO: -
CONCEPTO POST-INCAPACIDAD: -
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE SEGUIMIENTO: -
MOTIVO DE APLAZAMIENTO:

REQUISITOS DE SALUD

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SALUD PARA:
TRABAJO EN ALTURAS: NO
MANIPULACION ALIMENTOS: SELECCIONE
ESPACIOS CONFINADOS: NO
BRIGADISTA: NO
TRABAJOS ESPECIALES: NO

LIMITACIONES O RESTRICCIONES (Aplica cuando en el CONCEPTO DE APTITUD se selecciono con limitaciones o restricciones para el cargo o cuando NO cumple con los requisitos de salud)

¿CUALES?	FUNCIONES	AGENTES O FACTORES DE RIESGO	RECOMENDACIONES

EXÁMENES REALIZADOS

☑ AUDIOMETRIA	☐ ELECTROCARDIOGRAMA	☐ OPTOMETRIA	☐ ESPIROMETRIA
☐ PSICOTECNICO	☑ EXAMEN OSTEOMUSCULAR	☑ VISIOMETRIA	
☐ OXIMETRIA DE PULSO	☐ PRUEBA PSICOLÓGICA	☐ PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA	
☐ RX COLUMNA CERVICAL	☐ RX COLUMNA DORSAL	☐ RX COLUMNA DORSOLUMBAR	
☐ RX COLUMNA TOTAL	☐ RX TÓRAX AP Y LATERAL	☐ RX COLUMNA LUMBOSACRA	
☑ E.LABORATORIO EN SANGRE			

CONDUCTA

• Conducta de manejo médico: ☐ a. Continuar manejo médico ☐ b. Remisión a EPS. ☐ c. Seguimiento por la ARL. ☑ d. Asistir a programas de promoción y prevención EPS, de acuerdo a la edad ☐ e. Usar medias de compresión antivarices ☐ f. Usar lentes de corrección óptica ☐ g. Usar lentes de protección óptica frente a luces naturales y artificiales **Otros:**	• Conducta médica laboral: ☐ a. Capacitación y verificación en uso adecuado de los elementos de protección personal. ☐ b. Autocapación higiene postural. ☐ c. Pausas activas ☐ d. Ingreso a programa de vigilancia epidemiologica: ☐ e. Educación en manejo de cargas **f. Otros:**	• Cond. sobre hábitos y est. de vida saludables: ☐ a. Actividad física regular mínimo 150 minutos semana ☐ b. Alimentación sana y balanceada ☐ c. Desestimular consumo de ☐ Cigarrillo ☐ Alcohol ☐ Sustan. psicoactivas **d. Otro:**

Remision:

Observaciones: AUDIOMETRIA,VISIOMETRIA, GLICEMIA ALTERADO
HEMOGRAMA NORMAL

RECOMENDACIONES: VALORACION POR OPTOMETRIA EN EPS.
SEGUMIENTO DE PRESION ARTERIAL EN EPS
CONTROL DE GLICEMIA EN EPS
AUDIOMETRIA DE CONTROL EN EPS.
CONTROL CON SOPORTES DE LA VALORACION EN EPS PARA DETERMINAR RECOMENDACIONES LABORALES.

CONDICIONES:

RESTRICCIONES:

OBSERVACIONES: LAS RECOMENDACIONES Y/O RESTRICCIONES DEBEN TENERSE EN CUENTA A NIVEL LABORAL Y POR FUERA DEL TRABAJO.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y EN ESTA HISTORIA CLINICA CONSIGNADA, ES VERAZ Y PUEDE SER VERIFICADA, QUE HE RECIBIDO TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL MEDICO Y QUE NO HE OCULTADO NINGUNA PATOLOGÍA.

Jessica Medina Díaz

JESSICA MEDINA DIAZ
ESP. MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL
R.M. 86257 - LO 0332

PACIENTE: HECTOR ULISES ACOSTA
ID. CC 12097084

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 24 de marzo 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **JOHAN CAMILO POLANIA DEL VALLE**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.075.287.658** expedida en **Neiva-Huila**, quien desempeño funciones hasta la fecha 21 de marzo de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE RETROEXCAVADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.**

Cordialmente;

JOHAN CAMILO POLANIA

JOHAN CAMILO POLANIA DEL VALLE
C.C. 1.075.287.658 de Neiva

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 03 de abril 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **GERSON ANDRES OBANDO CEDEÑO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.075.248.646** expedida en **Neiva-Huila**, quien desempeño funciones hasta la fecha 31 de marzo de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE MOTONIVELADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.**

Cordialmente;

Gerson Andres Obando C.

GERSON ANDRES OBANDO CEDEÑO
C.C. 1.075.248.646 de Neiva

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 03 de abril 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **ALBEIRO CUENCA MINU**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.078.777.227** expedida en **Baraya-Huila**, quien desempeño funciones hasta la fecha 01 de abril de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE MOTONIVELADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.**

Cordialmente;

Albeiro Cuenca M.
ALBEIRO CUENCA MINU
C.C. 1.078.777.227 de Baraya

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 07 de abril 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **ANDRES IBARRA ROJAS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.081.160.572** expedida en Rivera-Huila, quien desempeño funciones hasta la fecha 04 de abril de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE RETROEXCAVADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.**

Cordialmente;

Andres Ibarra Rojas.
ANDRES IBARRA ROJAS
C.C. 1.081.160.572 de Rivera

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 07 de mayo 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **HECTOR ULISES ACOSTA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **12.097.084** expedida en **Neiva-Huila**, quien desempeño funciones hasta la fecha 05 de mayo de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE MOTONIVELADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS**.

Cordialmente;

Hector Ulises Acosta
HECTOR ULISES ACOSTA
C.C. 12.097.084 de Neiva

INGEMAQ M&A S.A.S
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 12 de marzo 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS
Ciudad

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **JOSE DARIO FLOREZ MOTTA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.710.473 expedida en Neiva-Huila, quien desempeño funciones hasta la fecha 08 de mayo de 2025, en el cargo de **OPERADOR DE RETROEXCAVADORA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS**.

Cordialmente;

Jose Dario Florez.

JOSE DARIO FLOREZ MOTTA
C.C. 7.710.473 de Neiva

ANEXO 3 AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1427250178	9485012464	E	2025/03/20	2025/04/22	BANCOLOMBIA	33	$2,969,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)																						$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900
1	CC	1082804794	ALDANA HOYOS MARIA EDITH	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
2	CC	12101945	CUBIDES RODRIGUEZ AURELIO	X																		0	$0	$0	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF32	12	$1,600,000	$64,000	14-7	12	$1,600,000	6.960%	$111,400	12	$0	$0	Si	$239,400
3	CC	1082807042	ESPINOSA VALDERRAMA SMITH SAMARA	X																	230201	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
4	CC	1082804610	LOPEZ VEGA ANLLY ASTRID	X																	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
5	CC	12127850	LUCUARA PARRACI CARLOS ALBERTO	X																	230201	12	$720,000	$115,200	EPS005	12	$720,000	$28,800	CCF32	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	6.960%	$50,200	12	$0	$0	Si	$223,000
6	CC	12138187	MEJIA GUTIERREZ CLAUDIO CESAR	X																	231001	12	$1,600,000	$256,000	EPS037	12	$1,600,000	$64,000	CCF32	12	$1,600,000	$64,000	14-7	12	$1,600,000	6.960%	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
7	CC	1075296777	MURCIA SOTO KELLYA YARETH	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	6.960%	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
8	CC	26586026	OLIVEROS SOTTO MAGALY	X																	230201	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
9	CC	1078778338	PERDOMO HORTA DANIELA	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF32	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	6.960%	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
10	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	X																	25-14	12	$1,200,000	$192,000	EPS037	12	$1,200,000	$48,000	CCF32	12	$1,200,000	$48,000	14-7	12	$1,200,000	6.960%	$83,600	12	$0	$0	Si	$371,600
11	CC	19105846	RUBIO DIAZ HECTOR	X																		0	$0	$0	EPS037	12	$720,000	$28,800	CCF32	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	6.960%	$50,200	12	$0	$0	Si	$107,800
12	CC	4945986	TRUJILLO SALAZAR JAIME	X																		0	$0	$0	EPS005	12	$1,800,000	$72,000	CCF32	12	$1,800,000	$72,000	14-7	12	$1,800,000	6.960%	$125,300	12	$0	$0	Si	$269,300
Total			**Afiliados(12)**																			$7,397,600	$1,184,000			$11,517,600	$460,800			$11,517,600	$460,800			$11,517,600		$802,300		$0	$0		$2,907,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1427250178	9485012464	E	2025/03/20	2025/04/22	BANCOLOMBIA	33	$2,969,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,184,000	$25,100	$0	$1,209,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$5,400	$0	$261,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$4,100	$0	$196,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$438,400	$9,300	$0	$447,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$297,600	$6,300	$0	$303,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$802,300	$17,000	$0	$819,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$802,300	$17,000	$0	$819,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$460,800	$9,800	$0	$470,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$460,800	$9,800	$0	$470,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$460,800	$9,900	$0	$470,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$204,800	$4,400	$0	$209,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$45,600	$1,000	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$210,400	$4,500	$0	$214,900
TOTAL				**12**	**$2,907,900**	**$61,800**	**$0**	**$2,969,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1390066937	9484254872	E	2025/03/05	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	33	$907,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA TELLO (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																						$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000
1	CC	1081160572	IBARRA ROJAS ANDRES	X																	230201	13	$953,334	$152,600	EPS037	13	$953,334	$38,200	CCF32	13	$953,334	$38,200	14-11	13	$953,334	6.960%	$66,400	13	$0	$0	Si	$295,400
2	CC	11323894	MANJARRES VANEGAS ISIDRO	X																	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
3	CC	1075248646	OBANDO CEDEÑO GERSON ANDRES	X																	230201	6	$440,000	$70,400	EPS005	6	$440,000	$17,600	CCF32	6	$440,000	$17,600	14-11	6	$440,000	6.960%	$30,700	6	$0	$0	Si	$136,300
4	CC	1075287658	POLANIA DELVALLE JOHAN CAMILO	X																	230301	13	$953,334	$152,600	EPS037	13	$953,334	$38,200	CCF32	13	$953,334	$38,200	14-11	13	$953,334	6.960%	$66,400	13	$0	$0	Si	$295,400
5	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO JAVIER	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
Total			**Afiliados(5)**																			$2,868,618	$459,200			$2,868,618	$114,900			$2,868,618	$114,900			$2,868,618		$200,000		$0	$0		$889,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1390066937	9484254872	E	2025/03/05	2025/04/07	BANCO DE BOGOTA	33	$907,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$459,200	$9,700	$0	$468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$800	$0	$38,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$198,200	$4,200	$0	$202,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$223,000	$4,700	$0	$227,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$200,000	$4,200	$0	$204,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$200,000	$4,200	$0	$204,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$114,900	$2,400	$0	$117,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$114,900	$2,400	$0	$117,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$114,900	$2,500	$0	$117,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,400	$1,600	$0	$78,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,400	$300	$0	$11,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$27,100	$600	$0	$27,700
TOTAL				**5**	**$889,000**	**$18,800**	**$0**	**$907,800**

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 10/03/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8487562	10/03/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	83253808	HENRY VARGAS RAMIREZ	1800000	CONDUCTOR VOLQUETA	2025-03-11

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Marzo del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

119

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 28/03/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8575657	28/03/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	12097084	HECTOR ULISES ACOSTA	2200000	OPERADOR DE MAQUINARIA AGRICOLA	2025-03-29

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de Marzo del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 26/03/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8559803	26/03/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	7710473	JOSEDARIO FLOREZ MOTTA	2200000	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	2025-03-27

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Marzo del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

121

NUMERO DE RADICADO : 6471564

EPS Sanitas

Negocio Corporativo en Colombia

INGEMAQ M&A S.A.S

Neiva, 07 de Marzo de 2025 CVM91 CIO1478-23-068

Señores
EPS Sanitas
Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como **C.C. 901759608 - 4 – INGENIERIA Y EQUIPO M&A S.A.S**, para las personas que se detallan a continuación

#	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	CC	83233151	LUPO QUINTERO POLANIA	1.600.000	03/03/2025	N/A	CALLE 13 No. 6 - 46	PALERMO/HUILA	3116652552	lalunlo@gmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

LEIDY JOHANNA ROA MAGNIOS
COORDINADORA MAQUINARIA

Carrera 7 No. 4 - 34 8770825) 3125233942 - Neiva (Huila)
E-mail: ingemaqmyas.sst@gmail.com

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo

Bogota 10.03.2025

Señores,
INGENIERIA Y EQUIPOS M Y A SAS - NI 901759608
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2025-03-10 con numero de radicado 6471564 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

244998-83233181-6

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

El señor **LUNIO QUINTERO POLANIA** identificado con cedula de ciudadania No. **83.233.181** se encuentra afiliado a esta Entidad como **DEPENDIENTE** en la modalidad de SUBSIDIO EN DINERO por intermedio de la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS** Nit No. **901.759.608**, con fecha de ingreso el 08 del mes de Marzo de 2025.

Dicha certificación se expide a los 07 días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO

Comfamiliar Huila
Por un mejor progreso para todos

853396-7710473-6

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

El señor **JOSE DARIO FLOREZ MOTTA** identificado con cedula de ciudadania No. **7.710.473** se encuentra afiliado a esta Entidad como **DEPENDIENTE** en la modalidad de SUBSIDIO EN DINERO por intermedio de la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS** Nit No. **901.759.608**, con fecha de ingreso el 27 del mes de Marzo de 2025.

Dicha certificación se expide a los 26 días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO

Comfamiliar Huila
Por un progreso feliz

823905-12097084-6

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

El señor **HECTOR ULISES ACOSTA** identificado con cedula de ciudadania No. **12.097.084** se encuentra afiliado a esta Entidad como **DEPENDIENTE** en la modalidad de SERVICIOS por intermedio de la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS** Nit No. **901.759.608** , con fecha de ingreso el 29 del mes de Marzo de 2025.

Dicha certificación se expide a los 28 días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

377916-83253808-6

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

El señor **HENRY VARGAS RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadania No. **83.253.808** se encuentra afiliado a esta Entidad como **DEPENDIENTE** en la modalidad de SERVICIOS por intermedio de la empresa **INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS** Nit No. **901.759.608** , con fecha de ingreso el 11 del mes de Marzo de 2025.

Dicha certificación se expide a los 10 días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO

ARL | sura

Medellín, 26 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C7710473	FLOREZ MOTTA JOSE DARIO	27/03/2025		YZD194B2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/03/2025 07:24:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.23, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 28 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C12097084	ACOSTA HECTOR ULISES	29/03/2025		20722922	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/03/2025 15:04:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.23, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 07 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C83233181	QUINTERO POLANIA LUNIO	08/03/2025		2363240³	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/03/2025 14:20:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.43, 172.16.42.57

130

ARL | sura

Medellín, 10 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C83253808	VARGAS RAMIREZ HENRY	11/03/2025		13713022	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/03/2025 10:43:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.41.43, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 4 REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	1/03/2025				
TEMA	Comunicación				
HORA	7:10 am - 7:25 am				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD		
	DIVULGACIÓN	X	SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.84.6100	PALETERA	Anlly Astrid Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	CONSTANTINO ROBAYO CABALLERO	7.693.077	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
16	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra k.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Osp
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	3/03/2025			
TEMA	Riesgo biologico			
HORA	7:05 am - 7:25 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN	X	SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.84.6100	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	CONSTANTINO ROBAYO CABALLERO	7.693.077	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra R.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J.S
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	41.03/2025			
TEMA	EPP - orden y aseo			
HORA	7:00 Am - 7:20 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	X

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.84.6100	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	CONSTANTINO ROBAYO CABALLERO	7.693.077	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra R.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo T.S
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	5/03/2025				
TEMA	Riesgo físico				
HORA	7:15 am - 7:25 am				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN	X	SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.84.6100	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	CONSTANTINO ROBAYO CABALLERO	7.693.077	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.061.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra R.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Osp
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	7/03/2025				
TEMA	orden y aseo				
HORA	7:05 Am - 7:20 Am				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD		
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	X	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONÁL SST	Kellya M. S.
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	CONSTANTINO ROBAYO CABALLERO	7.693.077	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.659	OPE. RETRO EXCAVADORA	Johan camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra R.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	63.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis carlos ospina
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	08-03-2025			
TEMA	EPP -			
HORA	7.10 Am - 7:30 Am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUGUARA PARRAGI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa.
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Y. Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	Wilson Damian P.
13	LINIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra Rojas
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.698.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.246.646	OPE. MOTONIVELADORA	Gerson Obando C.
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	10-03-2025			
TEMA	Conformación del Copasst			
HORA	7:10 am - 7:25 Am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo.
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Y. Murcia.
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	LINIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres Ibarra Rojas
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.246.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	11/03/2025.			
TEMA	Conformacion de brigadas			
HORA	7:05 am - 7:20 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN	X	SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUCUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	LINIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	12-03-2025				
TEMA	EPP - Cargado de Volquetas				
HORA	7:10 am - 7:25 am				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUGUARA PARRACI	12.127.850	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	
11	ARISTIDES ESPEJO	14.268.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	LUNIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR	
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST:

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	13 / 03 / 2025 .			
TEMA	Ambiente laboral			
HORA	7:00 am - 7:15 am			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	JAIME TRUJILLO SALAZAR	4.945.986	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	CARLOS ALBERTO LUGUARA PARRACI	12.127.650	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Samara Espinosa V.
9	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
10	KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	PROFESIONAL SST	Kellya Murcia
11	ARISTIDES ESPEJO	14.266.122	CONDUCTOR	
12	WILSON DAMIAN POLANCO	6.802.193	CONDUCTOR	
13	LUNIO QUINTERO POLANIA	83.233.181	CONDUCTOR	Lunio Quint
14	JOHAN CAMILO POLANIA DELVALLE	1.075.287.658	OPE. RETRO EXCAVADORA	Camilo Polania
15	ANDRES IBARRA ROJAS	1.081.160.572	OPE. RETRO EXCAVADORA	Andres I. P.
16	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
17	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
18	ALBEIRO CUENCA	1.078.777.227	OPE. MOTONIVELADORA	
19	GERSON ANDRES OBANDO CEDELO	1.075.248.646	OPE. MOTONIVELADORA	
20				
21				
22				

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Scanned with CamScanner
