INFORME DE OBRA No 6

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 1/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA DEL INFORME: 31/07/2025

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VG

JULIO DE 2025

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4

2. ASPECTO TÉCNICO. 6

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA 7

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO 13

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 15

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL. 15

5. SEGURIDAD SOCIAL 16

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA 16

7. REGISTRO FOTOGRAFICO 16

8. ASPECTO JURÍDICO 17
8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 17
8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 18

9. ENSAYOS DE LABORATORIO 22

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS 22

11. COMITES DE OBRA 24

12. CORRESPONDENCIA 24

13. CALIBRACION DE EQUIPOS 25

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS 25

15. CONCLUSIONES 26

Dirección: CARRERA 7 No. 4-34
Correo Electrónico: claudiomejiag@gmail.com
Neiva – Huila

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios a intervenir: 5
Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra 5
Tabla 3 Control de programación y avance de obra. 8
Tabla 4. Control de inversión ejecutado 14
Tabla 5. Tabla pluviométrica. 17
Tabla 6. Gráfica de precipitación 22
Tabla 7. Maquinaria mínima requerida. 27
Tabla 8. Personal Técnico requerido 27
Tabla 9. Condiciones contrato de obra. 29


ANEXOS

Anexo 1 Registro Fotográfico
Anexo 2 Programación
Anexo 3 Bitacora de Obra
Anexo 4 Comités de Obra
Anexo 5 Control Personal Obra
Anexo 6 Informe SST
Anexo 7 Correspondencia
Anexo 8 Calibración de equipos
Anexo 9 Laboratorios
Anexo 10 Cartera topográfica

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto a ejecutar se encuentra en el norte del Departamento del Huila partiendo de la ciudad de Neiva por la vía departamental cuyo código es 45 A01, en una longitud de 9.2km aproximadamente desde el inicio del primer tramo hasta el final del último tramo, el cual se encuentra el municipio de Tello, Departamento del Huila.

Esta vía actualmente cuenta con pavimento flexible, el cual presenta deterioro en su estructura, identificando veinticinco (25) tramos críticos para ser intervenidos y cuya rehabilitación es el objeto del presente contrato. Maokiller9008

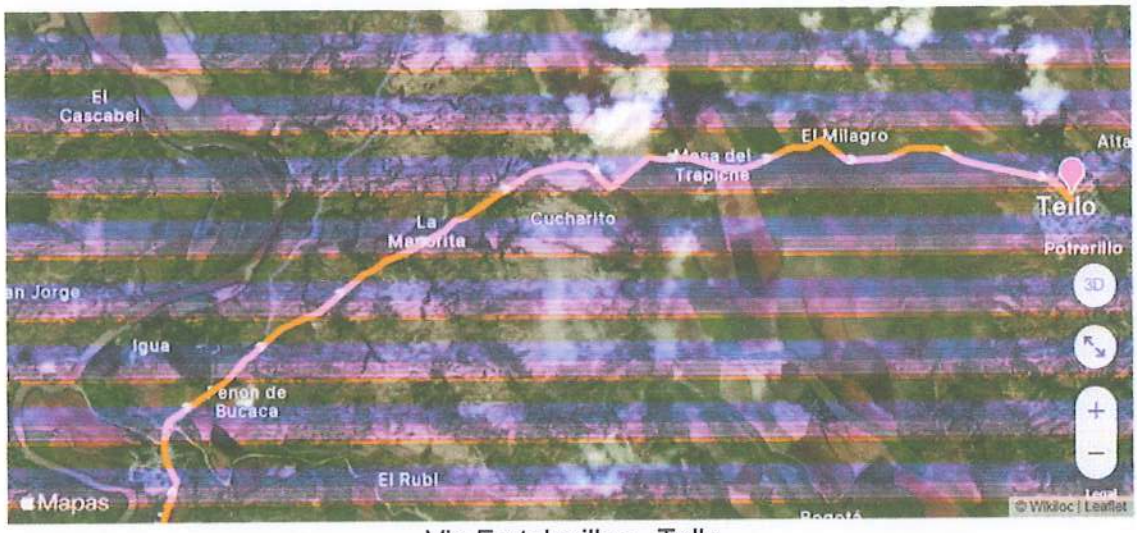

Via Fortalecillas - Tello

El proyecto a desarrollar corresponde a la vía Fortalecillas- Tello, según la resolución 4611 de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte y comprende la construcción de 5,33 km de pavimento flexible distribuidos en 25 tramos, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

De acuerdo al anexo técnico del contrato de obra 015 de 2024 los tramos están comprendidos en las siguientes coordenadas así:

TRAMO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LONGITUD POR TRAMO (mts)	VIA	COORDENADA INICIO	COORDENADA FINAL
1	TELLO	VEREDA CUCHARITO	21,78	VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN COD 45A01 NEIVA SAN ANTONIO	E: 8708117.813	E: 870834.389
					N: 829114.321	N: 829128.151
2		VEREDA CUCHARITO	193		E: 872465.259	E: 872626.413
					N: 830243.272	N: 830349.328
3		VEREDA CUCHARITO	91,52		E: 872911.689	E: 872994.247
					N: 830480.790	N: 830520.292
4		VEREDA CUCHARITO	74,7		E: 873014.910	E: 873080.364
					N: 830529.547	N: 830565.457
5		VEREDA CUCHARITO	78		E: 873288.448	E: 873355.103
					N: 830691.417	N: 830731.927
6		VEREDA CUCHARITO	66		E: 873549.081	E: 873600.478
					N: 830870.461	N: 830911.783
7		VEREDA CUCHARITO	30		E: 873783.309	E: 873809.183
					N: 830988.643	N: 831003.786
8		VEREDA CUCHARITO	130		E: 873874.551	E: 873983.477
					N: 831045.673	N: 831116.631
9		VEREDA CUCHARITO	121,64		E: 873993.756	E: 874095.676
					N: 831123.447	N: 831189.854
10		VEREDA CUCHARITO	24,98		E: 874104.910	E: 874125.811
					N: 831195.799	N: 831209.475
11		VEREDA CUCHARITO	107,12		E: 874180.040	E: 874269.915
					N: 831245.012	N: 831303.300
12		VEREDA CUCHARITO	56,02		E: 874374.500	E: 874421.628
					N: 831370.522	N: 831400.812
13		VEREDA CUCHARITO	48,71		E: 874438.217	E: 874479.108
					N: 831411.498	N: 831437.974
14		VEREDA CUCHARITO	103,65		E: 874486.186	E: 874572.812
					N: 831442.528	N: 831499.437
15		VEREDA CUCHARITO	94,37		E: 874811.921	E: 874904.457
					N: 831595.297	N: 831613.806
16		VEREDA CUCHARITO	88,32		E: 874964.772	E: 876488.492
					N: 831626.175	N: 831727.129
17		VEREDA CUCHARITO	725,07		E: 875879.397	E: 876488.492
					N: 831449.881	N: 831727.129
18		VEREDA CUCHARITO	200,04		E: 876532.198	E: 876731.150
					N: 831728.958	N: 831745.452
19		MESA DEL TRAPICHE	1361,97		E: 876759.269	E: 878067.835
					N: 831741.316	N: 831795.883
20		MESA DEL TRAPICHE	206,36		E: 878254.143	E: 878459.126
					N: 831866.245	N: 831890.036
21		MESA DEL TRAPICHE	66,98		E: 878489.106	E: 878545.532
					N: 831897.396	N: 831932.956
22		VEREDA CUCHARITO	52		E: 879068.291	E: 879120.280
					N: 831700.165	N: 831701.231
23		VEREDA CUCHARITO	126		E: 879212.267	E: 879338.252
					N: 831702.244	N: 831704.152
24		VEREDA CUCHARITO	826,99		E: 879437.818	E: 880235.376
					N: 831710.540	N: 831827.137
25		VEREDA CUCHARITO	446,63		E: 880338.945	E: 880756.615
					N: 831793.934	N: 831640.332
TOTAL			5341,85			

Tabla 1. Municipios a intervenir:

UBICACIÓN		
MUNICIPIO	**NOMBRE DE LA VIA**	**LONGITUD A INTERVENIR (KM)**
TELLO	Ruta Código 45 A01 NEIVA- SAN ANTONIO	5,33 km

Fuente: Autor

Valor Costo Inicial del Proyecto.

Tabla 2. Valor inicial del contrato de obra

MUNICIPIO	CATEGORIA	VALOR TOTAL
TELLO	Vía de primer Orden	$ 8.258.002.715,00
VALOR TOTAL		**$ 8.258.002.715,00**

Fuente: Autor

Valor adicional según ajuste No 1 del contrato de obra

TELLO	Vía de primer Orden
VALOR ADICIONAL	$3.370.776.617,36
VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 11.628.779.332,36

Plazo Inicial = Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo adicional = Tres y medio (3.5) meses.
Plazo total contrato de obra = 7.5 meses.

2. ASPECTO TÉCNICO.

2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En anexo se adjunta las descripciones de las actividades que se realizaron hasta la fecha. (**Anexos 3** Copia Libro De Bitácora).

2.2. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA

Se presentan las actividades ejecutadas: Hasta la fecha ha transcurrido cuatro y medio (6) meses (17 de junio de 2024 fecha de inicio).

A continuación, se detalla la trazabilidad del proyecto, los inconvenientes y el estado de avance de estos:

El día 11/07/2025 se envió comunicado CO-15-24-32 a la secretaría de Planeación Municipal de Tello con respecto a la solicitud de certificado de disposición de materiales de excavación y fresado del contrato de obra.

El día 28/07/2025 se envió comunicado CO-15-24-33 a la Interventoría en donde se le solicita comité de obra.

De acuerdo a que la obra presenta un atraso considerable debido al factor climático y protestas sociales, el contratista de obra esta realizando una reprogramación, con el fin de presentar una solicitud de prorroga y poder cumplir con el alcance del proyecto.

Actividades de obra física.

Vía Fortalecillas- Tello.

Actividades ejecutadas durante el periodo. (**Anexo.1** Registro fotográfico)

- **Ítem 2,1.** Se ejecutó corte en conglomerado para el cajeo en el tramo No 22 con una cantidad de 145,6 m3; tramo No 23 con una cantidad de 336 m3; excavación para cunetas desde el tramo No 18 al tramo No 24 sobre ambas márgenes con una cantidad de 471,39 m3; excavación de filtro en el tramo No 24 sobre la margen derecha con una cantidad de 50,40 m3 para un total de 1003,39 m3 que suma un valor de $ 18.136.714,40, teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 12,53%.

- **Ítem 3,1.** Se ejecutó conformación de calzada en el tramo No 22 con una cantidad de 364 m2; en el tramo No 23 con una cantidad de 840 m2; en el tramo No 24 una cantidad de 5781,93 m2; en el tramo No 25 una cantidad de 3126,41 m2 para un total de 10112,34 m2 que suma un valor de $ 21.702.637,38 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 75,07%.

- **Ítem 3,2.** Se ejecutó instalación de base granular en el tramo No 19 con una cantidad de 374,40 m3; en el tramo No 20 con una cantidad de 288,89 m3; en el tramo No 21 una cantidad parcial de 93,76 m3; en el tramo No 22 una cantidad de 72,80 m3; en el tramo No 23 una cantidad de 168 m3 para un total de 997,85 m3 que suma un valor de $ 111.298.430,77 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 51,83%.

- **Ítem 3,3.** Se ejecutó instalación de Mezcla asfáltica MDC-19 en el tramo No 19 una cantidad de 369,60 m3; en el tramo No 20 una cantidad de 136,19 m3; en el tramo No 21 una cantidad de 44,20 m3; en el tramo No 22 una cantidad de 41,18 m3; en el tramo No 23 una cantidad parcial de 61,38 m3 para un total de 652,56 m3 que suma un valor de $ 762.595.583,38 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 46,05%.

- **Ítem 3,4.** Se ejecutó instalación de sub-base granular en el tramo No 22 una cantidad de 72,80 m3; en el tramo No 23 una cantidad de 168 m3; en el tramo No 24 una cantidad de 444 m3 para un total de 684,80 m3 que suma un valor de $ 57.944.615,38 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 58,76%.

- **Ítem 3,5.** Se ejecutó riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 en el tramo en el tramo No 19 una cantidad de 3696 m2; en el tramo No 20 una cantidad de 1361,91 m2; en el tramo No 21 una cantidad 442 m2; en el tramo No 22 una cantidad de 343,20 m2; en el tramo No 23 una cantidad de 792 m2 para un total de 6635,11 m2 que suma un valor de $ 17.435.032,76 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 48,86%.

- **Ítem 4,1.** Se ejecutó fundición de cuneta en concreto en el tramo No 18 con una cantidad parcial de 60 m3, para un total de 60 m3 que suma un valor de $ 44.087.123,08 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 3,75%.

- **Ítem 4,2.** Se ejecutó la instalación de material filtrante en el tramo No 24 con una cantidad 50,40 m3, para un total de 50,40 m3 que suma un valor de $ 6.860.259,60 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 13,03%.

- **Ítem 4,3.** Se ejecutó la instalación geotextil no tejido en el tramo No 24 una cantidad 319,20 m2, para un total de 319,20 m2 que suma un valor de $ 5.480.488,44 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 12,96%.

- **Ítem 4,4.** Se ejecutó la instalación de tubería perforada de 4" en el tramo No 24 una cantidad de 84 ml para un total de 84 ml que suma un valor de $ 2.449.965 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 13,03%.

- **Ítem 4,5.** Se está construyendo un muro en Gavión en la parte final del tramo No 17 sobre la margen izquierda con una cantidad de 145,20 m3, para un total de 145,20 m3 que suma un valor de $ 55.034.274,64 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 100,00%.

- **Ítem 6,1.** Se ejecutó el transporte de material proveniente del corte en conglomerado de las excavaciones de los tramos No 22 y 23, cunetas de los tramos No 18 al 24, filtros en el tramo No 24 margen derecha, para un total de 7023,75 m3-km que suma un valor de $ 8.104.328,08 teniendo un avance ejecutado acumulado en esta actividad del 18,70%.

Tabla 3 Control de programación y avance de obra de acuerdo a condiciones actualizadas dentro del contrato de obra.

ITEMS	FRENTE DE TRABAJO	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA EN EL CONTRATO	% PROGRAMADO MES	% EJECUTADO MES	% PROGAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LO PROGRAMADO
1.1	Localización y replanteo	Km	5,33	14,29%	0,00%	85,71%	75,10%	87,62%
1.2	Fresado de Pavimento asfáltco	M2	35.195,49	17,39%	0,00%	100,00%	75,07%	75,07%
2.1	Corte en Conglomerado	M3	22.483,80	17,39%	4,46%	86,96%	12,53%	14,41%
3.1	Conformación de calzada	M2	37.328,55	16,67%	27,09%	83,33%	75,07%	90,09%
3.2	base granular	M3	7.465,71	16,67%	13,37%	75,00%	51,83%	69,11%
3.3	*Mezcla Densa en caliente MDC-19*	M3	3.710,24	22,73%	17,59%	69,70%	46,05%	66,07%
3.4	Sub-base granular	M3	7.465,71	18,18%	9,17%	81,82%	58,76%	71,82%
3.5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	M3	35.195,49	18,18%	18,85%	72,73%	48,86%	67,18%
4.1	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	1.599,80	22,22%	3,75%	66,67%	3,75%	5,62%
N.P 4.2	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE. ESP. 673-13 INV.	M3	2.739,68	25,00%	1,84%	75,00%	13,03%	17,37%
N.P 4.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	16.260,99	25,00%	1,96%	75,00%	12,96%	17,28%
N.P 4.4	*SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA* PERFORADA DE 4"	ML	4.566,14	25,00%	1,84%	75,00%	13,03%	17,37%
N.P 4.5	GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÌA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	M3	291,00	0,00%	49,90%	100,00%	100,00%	100,00%
N.P 4.6	CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	225,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
N.P 4.7	BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	M3-KM	174.632,53	19,05%	4,02%	95,24%	18,70%	19,63%

Tabla 4. Control de inversión ejecutado y programado

OBRA		
DESCRIPCION	**PERIODO DEL INFORME No 6**	**ACUMULADO**
obra programada (%)	21,00%	73,38%
valor de la obra programada	$2.442.538.030,38	$8.532.681.899,39
obra ejecutada (%)	12,46%	37,84%
valor de la obra ejecutada	$1.448.882.098,67	$4.400.159.394,02



De acuerdo a la ejecución en el periodo del presente se evidencia un atraso considerable, debido al factor climático y las protestas sociales de los últimos meses. Por ende, se va a presentar a la interventoría y al ente contratante una reprogramación de obra donde se solicita una prórroga de tiempo.

Plan de inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO					
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA				
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO				
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024				
1. DESCRIPCIÓN DE OBRAS					
REHABILITACIÓN VÍAS					
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR CONTRATO	$8.258.002.715				
% ANTICIPO	30%				
VALOR ANTICIPO	$2.477.400.815,00				
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$2.477.400.815,00				
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$123.870.041,00				
VALOR NETO GIRADO.	$2.353.530.774,00				
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	ALQUILER DE MAQUINARIA	HORA	25,000%	$588.382.693,50	$588.382.693,50
2	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	22,000%	$517.776.770,28	$517.776.770,28
3	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	30,000%	$706.059.232,20	$706.059.232,20
4	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA	GLB	14,000%	$329.494.308,36	$329.494.308,36
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	9,000%	$211.817.769,66	$211.817.769,66
			100,000%		$2.353.530.774,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$2.353.530.774,00
SON	$2.353.530.774,00				
VALOR EN LETRAS	DOS MIL TRECIENTOS CIENCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.				
CONTRATISTA:				INTERVENTORIA:	
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO Contratista				ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ R.L. CONSORCIO VG Interventoria	

Este plan de inversión del anticipo del valor inicial del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, en el que se realizaron las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO					
NIT 901.785.282-7					
No Fiducia 19100003460					
No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
6	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 253.840.532,19	1
7	901046409	DISTRIBUCIONES MEJIA UNO SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 329.494.308,36	4
8	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 517.776.770,28	2
9	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 56.059.232,00	3
10	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 650.000.000,00	3
12	813008120	PA COLOMBIA SAS	CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA	$ 293.996.604,00	1
13	900558342	CONCREMACK SAS	LUIS ENRIQUE JARAMILLO PEÑA	$ 211.817.769,66	5
14	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 40.000.000,00	1

Plan de inversión del Anticipo Otro si No 1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
CONTRATO DE OBRA No.	15-2024
1. DESCRIPCION DE OBRAS	
REHABILITACIÓN VIAS	
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1	$ 3.370.776.617,36
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	$1.011.232.986,00
VALOR ANTICIPO AJUSTADO AL PESO	$1.011.232.986,00
DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS (5%).	$50.561.649,00
VALOR NETO GIRADO.	$960.671.337,00

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	% OBRA	VALOR	VALOR NETO
1	SUMINISTRO MATERIALES GRANULARES	M3	25,000%	$240.167.834,25	$240.167.834,25
2	SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	M3	40,000%	$384.268.534,80	$384.268.534,80
3	MANO DE OBRA	GLB	20,000%	$192.134.267,40	$192.134.267,40
4	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	GLB	15,000%	$144.100.700,55	$144.100.700,55
			100,000%		$960.671.337,00
				TOTAL ANTICIPO A DESEMBOLSAR	$960.671.337,00

SON	$960.671.337,00
VALOR EN LETRAS	NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA RL. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO Contratista	ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ R.L CONSORCIO VG Interventoria

Este plan de inversión del anticipo del valor adicional del contrato de obra se aprobó por parte de la interventoría y el ente contratante, y se encuentra en proceso de realizar las siguientes ordenes de operaciones de pago:

ORDENES DE OPERACIONES CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT 901.785.282-7

No Fiducia 19100003460

No ORDEN	NIT	BENEFICIARIO	REPRESENTANTE LEGAL	VALOR	ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSION
15	901759608	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 80.167.834,25	2
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 134.268.534,80	3
			CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 192.134.267,40	6
16	813001515	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA	JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA	$ 250.000.000,00	3
17	12138187	INGENIERIA CIVIL CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ	$ 144.100.700,55	5
18	900340491	MULTIMEZCLAS AGREGADOS SAS	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2
19	1075237530	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	$ 80.000.000,00	2

3. RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO

- Durante el periodo de este informe no se presentaron muchas precipitaciones lo que permitió ejecutar las actividades con un buen rendimiento, pero que todavía se tiene un atraso considerable debido al fuerte invierno de los meses anteriores. A continuación, en las siguientes tablas se grafica el comportamiento meteorológico en el área de influencia del proyecto:

Tabla 5. Tabla pluviométrica

Entidad	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES				
Codigo Estacion	**Nombre Estación**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**categoría**
21110040	HATO MILAGRO [21110040]	30.748.888.890,00	-75,16841667	548	Pluviometria
Municipio	**Fecha Instalación**	**Id Parámetro**	**Etiqueta**		
Tello	15/09/1971	PRECIPITACIÓN	PTPM_CON		
Descripción Serie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Nivel Aprobación
Dia pluviometro	Diaria	1-jul-25	1	50	900
Dia pluviometro	Diaria	2-jul-25	3	50	900
Dia pluviometro	Diaria	3-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	4-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	5-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	6-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	7-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	8-jul-25	1	50	900
Dia pluviometro	Diaria	9-jul-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	10-jul-25	5	50	900
Dia pluviometro	Diaria	11-jul-25	8	50	900
Dia pluviometro	Diaria	12-jul-25	3	50	900
Dia pluviometro	Diaria	13-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	14-jul-25	2	50	900
Dia pluviometro	Diaria	15-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	16-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	17-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	18-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	19-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	20-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	21-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	22-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	23-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	24-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	25-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	26-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	27-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	28-jul-25	3	50	900
Dia pluviometro	Diaria	29-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	30-jul-25	0	50	900
Dia pluviometro	Diaria	31-jul-25	0	50	900
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Esttudios Ambientales (IDEAM) URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/					

De acuerdo a la estación meteorológica del IDEAM más cercana a la zona de influencia del proyecto, se puede observar pocas precipitaciones a lo largo del periodo del presente, lo que permitió un avance considerable en las diferentes actividades. Sin embargo, todavía se presenta un atraso debido al fuerte invierno de los meses anteriores.

Table 6. Grafica de precipitación

FRECUENCIA	DIARIA
MESES	JULIO
DIAS	mm/día
1-jul	1
2-jul	3
3-jul	0
4-jul	0
5-jul	0
6-jul	0
7-jul	0
8-jul	1
9-jul	2
10-jul	5
11-jul	8
12-jul	3
13-jul	0
14-jul	2
15-jul	0
16-jul	0
17-jul	0
18-jul	0
19-jul	0
20-jul	0
21-jul	0
22-jul	0
23-jul	0
24-jul	0
25-jul	0
26-jul	0
27-jul	0
28-jul	3
29-jul	0
30-jul	0
31-jul	0



Elaboró: Ingeniero residente de Obra. Consorcio Infraestructura JPN Tello
Información obtenida del banco de datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM)
URL: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

4.1. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL.

Informe De Equipo Del Contratista

En la siguiente tabla se muestra la maquinaria mínima exigida pliegos de condiciones, a continuación, los relacionamos.

Tabla 7. Maquinaria mínima requerida

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.	2
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	2
Mezcladora de concreto 9P3.	2
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	2
Carrotanque de agua (1000 galones)	2
Cortadora de pavimento	2
Formaleta metálica (Concreto hidráulico)	4
Vibrador de concreto	4
Camioneta D-300	1

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

Informe De Personal

En el presente periodo se presenta a la interventoría las planillas de seguridad social del personal de obra mínimo requerido. **Anexo 5.** Control Personal Obra.

Tabla 8. Personal Técnico requerido

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	2	100%
INSPECTOR DE OBRA	2	100%
PROFESIONAL SISO	2	80%
TOPOGRAFO	2	50%
AUX. TRANSITO	4	80%

Fuente. Anexo Técnico Cto No. 015-2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

- De acuerdo a las obligaciones contractuales y según el pliego de condiciones se hacen las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato, a un sistema de seguridad social (ARL, pensiones y salud).

- El Contratista de obra a la fecha del presente informe presentó el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. **Anexo 5**. Control Personal Obra.

6. MEMORIA DIARIA O BITACORA

- La Interventoría indica en la bitácora los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en conjunto (Contratista e Interventoría) de la ejecución de los trabajos, registrando la visita de los funcionarios, permitiendo la compresión general de la obra y desarrollo de las actividades. **Anexo 3** Copia libro de bitácora.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

- En el registro fotográfico se anexan las actividades más relevantes desarrolladas en el presente mes. **Anexo 1**. Registro fotográfico.

8. ASPECTO JURÍDICO

La Gobernación del Huila realizó seguimiento a las pólizas correspondientes al contrato de obra No.015-2024.

8.1. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 9. Condiciones contrato de obra

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	TRES Y MEDIO (3.5) MESES
PLAZO TOTAL	7.5 MESES
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.2. ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las pólizas del Contrato de Obra, con base en el Acta de Inicio.

Aseguradora: Seguros del Estado S.A, póliza responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101019508, póliza cumplimiento entidades estatales No. 61-44-101053603.

Según contrato:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	23/02/2024	30/12/2024	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	23/02/2024	30/12/2024	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	23/02/2024	30/06/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -0 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	23/02/2024	30/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de inicio:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	24/04/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	24/04/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	23/10/2027	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	23/10/2024	$ 650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	24/10/2023	24/06/2024	$ 650,000,000.00
TOTAL			**$ 650,000,000.00**

Fuente. Autor

Según acta de Acta de reinicio No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	04/12/2025	$ 1,651,600,543.00
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	04/12/2025	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIO	17/06/2024	04/06/2028	$ 825,800,271.50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 1,651,600,543.00
TOTAL			**$ 6,606,402,172.00**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	03/06/2025	$ 711,500,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

Según OTRO SI No 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO –N° 61-44-101053603 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,325,755,866.47
BUEN MANEJO DELANTICIPO	17/06/2024	19/03/2026	$ 2,477,400,814.50
PAGO DE SALARIOS	17/06/2024	19/09/2028	$ 1,162,877,933.24
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años, o meses y -1 dias		$ 2,325,755,866.47
TOTAL			**$ 8,291,790,480.68**

Fuente. Autor

RESPONSABILIDAD CIVIL –N° 61-40-101019508 SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**MONTO ASEGURADO**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOSY NO PROPIOS	17/06/2024	19/09/2025	$ 711,750,000.00
TOTAL			**$ 711,500,000.00**

Fuente. Autor

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

En este periodo del informe se realizaron los siguientes ensayos (Ver anexo 9):

- Peso unitario del suelo en el terreno. Método del cono de arena.

DENSIDADES DEL CONO DE ARENA		
Tramo No	**Fecha**	**Material**
19	8/07/2025	BASE
20	23/07/2025	BASE

- Control de asfalto MDC-19.

CONTROL DE ASFALTO MDC-19		
Ensayo	**Fecha**	**Material**
Analisis granulometrico;Gravedad especifica máxima; Resistencia de mezclas bituminoas	4/07/2025	MDC-19
Analisis granulometrico;Gravedad especifica máxima; Resistencia de mezclas bituminoas	5/07/2025	MDC-19

10. ESTUDIOS Y DISEÑOS

De acuerdo a lo considerado en el comité técnico el día 26 de junio de 2024, el contratista realizó la revisión y ajuste al diseño con los parámetros iniciales con la firma Especializada INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda, cuyo representante legal es el Ingeniero Mario Trujillo Calderón Castro (Esp. En Ingeniería de Vías, T.P. 1920240632CAU) y se presentó a la interventoría el 10 de julio de 2024 a través del oficio CO-15-24-07 para la respectiva revisión. El ajuste del diseño por el método de la AASHTO y con revisión por el método racional se presentó una estructura homogénea para las secciones 1 y 2, teniendo en cuenta la poca diferencia en los CBR y una estructura para la sección 3.

Una vez presentada el ajuste de diseño a la interventoría. El Especialista de la interventoría realiza observaciones técnicas en cuanto a parámetros y factores utilizados para la utilización del método de la AASHTO y Método Racional. Dichas observaciones son contestadas y aclaradas por el Especialista del Contratista y aceptadas por la Interventoría.

Aclaradas las observaciones al ajuste del diseño se presenta el ajuste del diseño a la Secretaría de Vías e Infraestructura para la revisión y aprobación el día 23 de agosto de 2024 a través del oficio CO-15-24-11. Finalmente, la firma INGESUELOS DE COLOMBIA Ltda realiza el diseño completo con los parámetros iniciales reiterando la estructura de pavimento para las secciones 1, 2 y 3. Se unifica una estructura para las secciones 1 y 2 y otra estructura para la sección 3.

Sección 1.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 1				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3167.68	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1417.13	200
	Subrasante	0.5	823.72	∞

Sección 2.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 2				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	100
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	3407.74	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1524.53	200
	Subrasante	0.5	923.86	∞

Sección 3.

ESPESORES PROPUESTOS PARA ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS EN SECCION 3				
ESTRUCTURA PROPUESTA	DETALLE DE CAPA	μ	Modulo E (Kg/cm2)	ESPESOR (mm)
DESCARGADERO				
	Rodadura en MDC-19	0.35	17569.78	120
	Base Granular (CBR>80%)	0.4	2777.83	200
	Subbase Granular (CBR>30%)	0.45	1242.73	200
	Subrasante	0.5	674.33	∞

Una vez presentada la solicitud del ajuste No 1 el día 21 de noviembre de 2024 a la Secretaría de Vías e Infraestructura y surtidos todos los procesos de revisión, finalmente mediante resolución No 283 de 2024 de fecha 30 de diciembre de 2024 y mediante decreto No 021 de 2025 de fecha 31 de enero de 2025, se aprueba la incorporación al presupuesto departamental del referido ajuste No 1.

11. COMITES DE OBRA

Durante el periodo del presente informe se realizó comité de obra el día 21 de julio de 2025 : **Anexo 4** Comités de obra.

12. CORRESPONDENCIA

Durante el periodo del presente informe se tiene la siguiente correspondencia: **Anexo 7** Correspondencia.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 6						
ITEM	PROCENDENCIA			DETALLE		
	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	N° DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	Secretaría de Planeación de Tello	NEIVA	CO-15-24-32	11/07/2025	Solicitud de certificado de disposición de materiales de excavación y fresado del contrato de la referencia a fecha 15 de junio de 2025.	Contrato de Obra No 015 DE 2024
2	CONSORCIO VG	NEIVA	CO-15-24-33	24/06/2025	Solicitud de comité técnico de obra	Contrato de Obra No 0015 DE 2024

13. CALIBRACION DE EQUIPOS

Durante el periodo del presente informe para la localización y replanteo se utilizó el siguiente equipo: **Anexo 8** Calibración de equipos.

- Estación Total de marca HI TARGET modelo HTS 720 con serie No VAWN16431991.

14. CARTERAS TOPOGRAFICAS

Durante el periodo del presente informe se instaló Base granular, Mezcla asfáltica MDC-19 en los tramos No 19, No 20, No 21, No 22, No 23: **Anexo 10** Cartera Topográfica.

15. CONCLUSIONES

De acuerdo a la ejecución en el periodo del presente se evidencia un atraso considerable, debido al factor climático y las protestas sociales de los últimos meses. Por ende, se va a presentar a la interventoría y al ente contratante una reprogramación de obra donde se solicita una prórroga de tiempo.

A la fecha de cierre del informe No 6 no se han presentado actas parciales de obra para revisión de la interventoría y el ente contratante, pero se está proyectando una para el mes de agosto de 2025.

El día 21 de julio de 2025 realizó comité de obra, en el cual asistió también la Supervisora del contrato, haciendo el recorrido a los diferentes frentes de obra y evidenciando el avance físico de la obra y los tramos que se están interviniendo.

ING. CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ
Director de Obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA FORTALECILLAS- TELLO RUTA 45 A01

Excavación de filtros en el tramo No 24 y cajeo tramo No 22 y No 23









Instalación de base granular Tramo No 19,20,21,22,23









Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en el Tramos No 19,20,21,22,23









Instalación de sub-base granular Tramo No 22,23










Riego de imprimación con emulsión asfáltica en los Tramos No 19,20,21,22,23





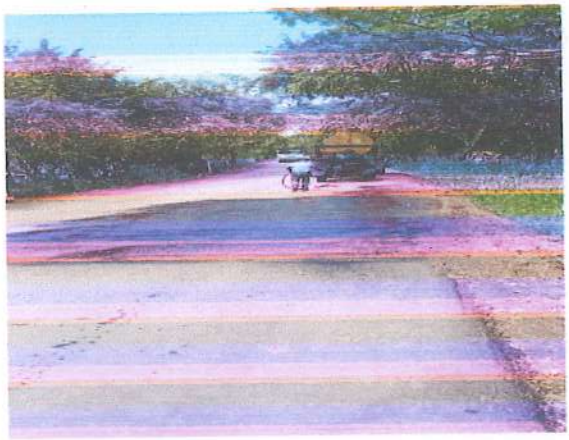



Cuneta en concreto en el Tramo No 18










Material granular filtrante. ESP. 673-13 INV para filtros tramo No 24



Geotextil no tejido 2500. ESP. 673-13 INV. y suministro e instalación de tubería perforada de 4" para filtros tramo No 24





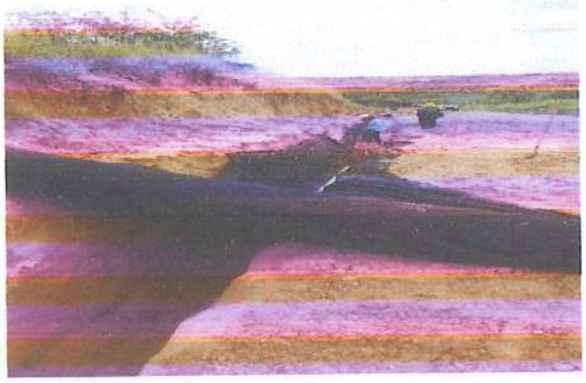



Gavión en piedra zonga y media zonga, malla c-12, escuadrìa 10cm x 8cm, vena c-10. incluye atirantamiento horizontal y vertical. ESP. 681 INV en el tramo No 17










Transporte proveniente de la excavación





Anexo 2
Programación

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES
		PRELIMINARES									
1	1,1	Localización y replanteo	Km	5,336	$ 4.463.813,00	$ 23.817.857,29	0,21	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04	$ 3.413.951,04
2	1,2	Fresado de pavimento asfáltico	m2	35.185,49	$ 3.837,00	$ 135.065.997,13	1,19	$ 16.896.434,41	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54	$ 22.261.912,54
SUBTOTAL PRELIMINARES						$ 158.883.854,42	1,31				
		EXPLANACIONES									
3	2,1	Corte en Conglomerado	M3	22.483,80	$ 23.492,00	$ 528.324.968,96	4,64		$ 45.941.249,78	$ 114.853.101,95	$ 114.853.101,95
SUBTOTAL EXPLANACIONES						$ 528.324.968,96	4,64				
		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE									
4	3,1	Conformación de la calzada	M2	97.326,55	$ 2.700,00	$ 184.146.864,50	0,00		$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75	$ 17.357.775,75
5	3,2	base granular	M3	7.463,71	$ 145.000,00	$ 1.082.527.950,00	9,51		$ 90.210.662,50	$ 180.421.325,00	$ 180.421.325,00
6	3,3	Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	M3	3.210,24	$ 1.519.219,00	$ 5.036.985.345,27	48,47			$ 341.615.081,23	$ 1.024.845.243,69
7	3,4	Sub-base granular	M3	7.463,71	$ 110.000,00	$ 821.208.100,00	7,08		$ 74.557.100,00	$ 140.314.200,00	$ 140.314.200,00
8	3,5	Riego de imprimación con emulsion asfáltica CRL-0	M2	35.185,49	$ 3.416,00	$ 120.227.793,84	1,03			$ 21.559.598,88	$ 21.559.598,88
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE						$ 7.764.795.838,61	69,77				
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS									
9	4,1	Cunela de Concreto Vaciada In Sitio no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	1.599,99	$ 955.221,00	$ 1.526.157.779,79	13,14				$ 359.560.617,71
10		ITEMS NO PREVISTOS					0,00				
11	N.P 4.2	ITEM : MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, ESP. 673-13 INV.	M3	2.739,69	$ 176.951,14	$ 484.736.201,58	4,17				$ 121.197.550,39
12	N.P 4.3	ITEM : GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500, ESP. 673-13 INV.	M2	16.205,99	$ 22.326,29	$ 362.049.931,19	3,12				$ 90.737.482,80
13	N.P 4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	ML	4.399,14	$ 27.914,13	$ 172.130.329,91					$ 43.982.583,75
14	N.P 4.5	ITEM : GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÍA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 691 INV.	M3	291,99	$ 492.731,11	$ 143.894.752,72	1,23				$ 71.592.376,36
15	N.P 4.6	ITEM: CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	M3	225,09	$ 133.936,45	$ 30.149.266,56	0,26				
16	N.P 4.7	ITEM: BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	M3	27,09	$ 1.022.676,96	$ 27.812.323,74	0,24				$ 27.812.323,74
17	N.P 4.8	ITEM:RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	M3	129,09	$ 122.665,63	$ 15.073.545,75	0,13				
SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS						$ 2.765.949.971,23	23,79				
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
17	5,1	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	15.997,95	$ 2.917,00	$ 46.660.920,15	0,40				
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						$ 46.660.920,15	0,40				
		TRANSPORTES									
18	6,1	Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de 1Kilometros	M3/KM	174.532,53	$ 1.500,00	$ 261.948.792,00	2,25		$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00	$ 49.895.008,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						$ 261.948.792,00	2,25				
					SUBTOTAL OBRAS	$ 11.519.566.845,36					
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 11.519.566.845,36					
					PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (VER INFORME PMT)	$ 49.554.000,00	0,43	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00	$ 6.607.200,00
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL)	$ 59.715.987,00	0,51	$ 7.962.491,90	$ 7.962.491,90	$ 7.962.491,90	$ 7.962.491,90
					VALOR TOTAL	$ 11.628.779.332,36					
								$ 34.680.077,05	$ 318.307.342,21	$ 915.562.645,99	$ 2.292.907.743,19
					%			0,30%	2,74%	7,87%	19,72%
					% ACUMULADO			0,30%	3,04%	10,91%	30,63%
					VALOR PROGRAMADO ACUMULADO			$ 34.680.077,05	$ 352.987.419,26	$ 1.268.550.065,25	$ 3.561.457.808,45

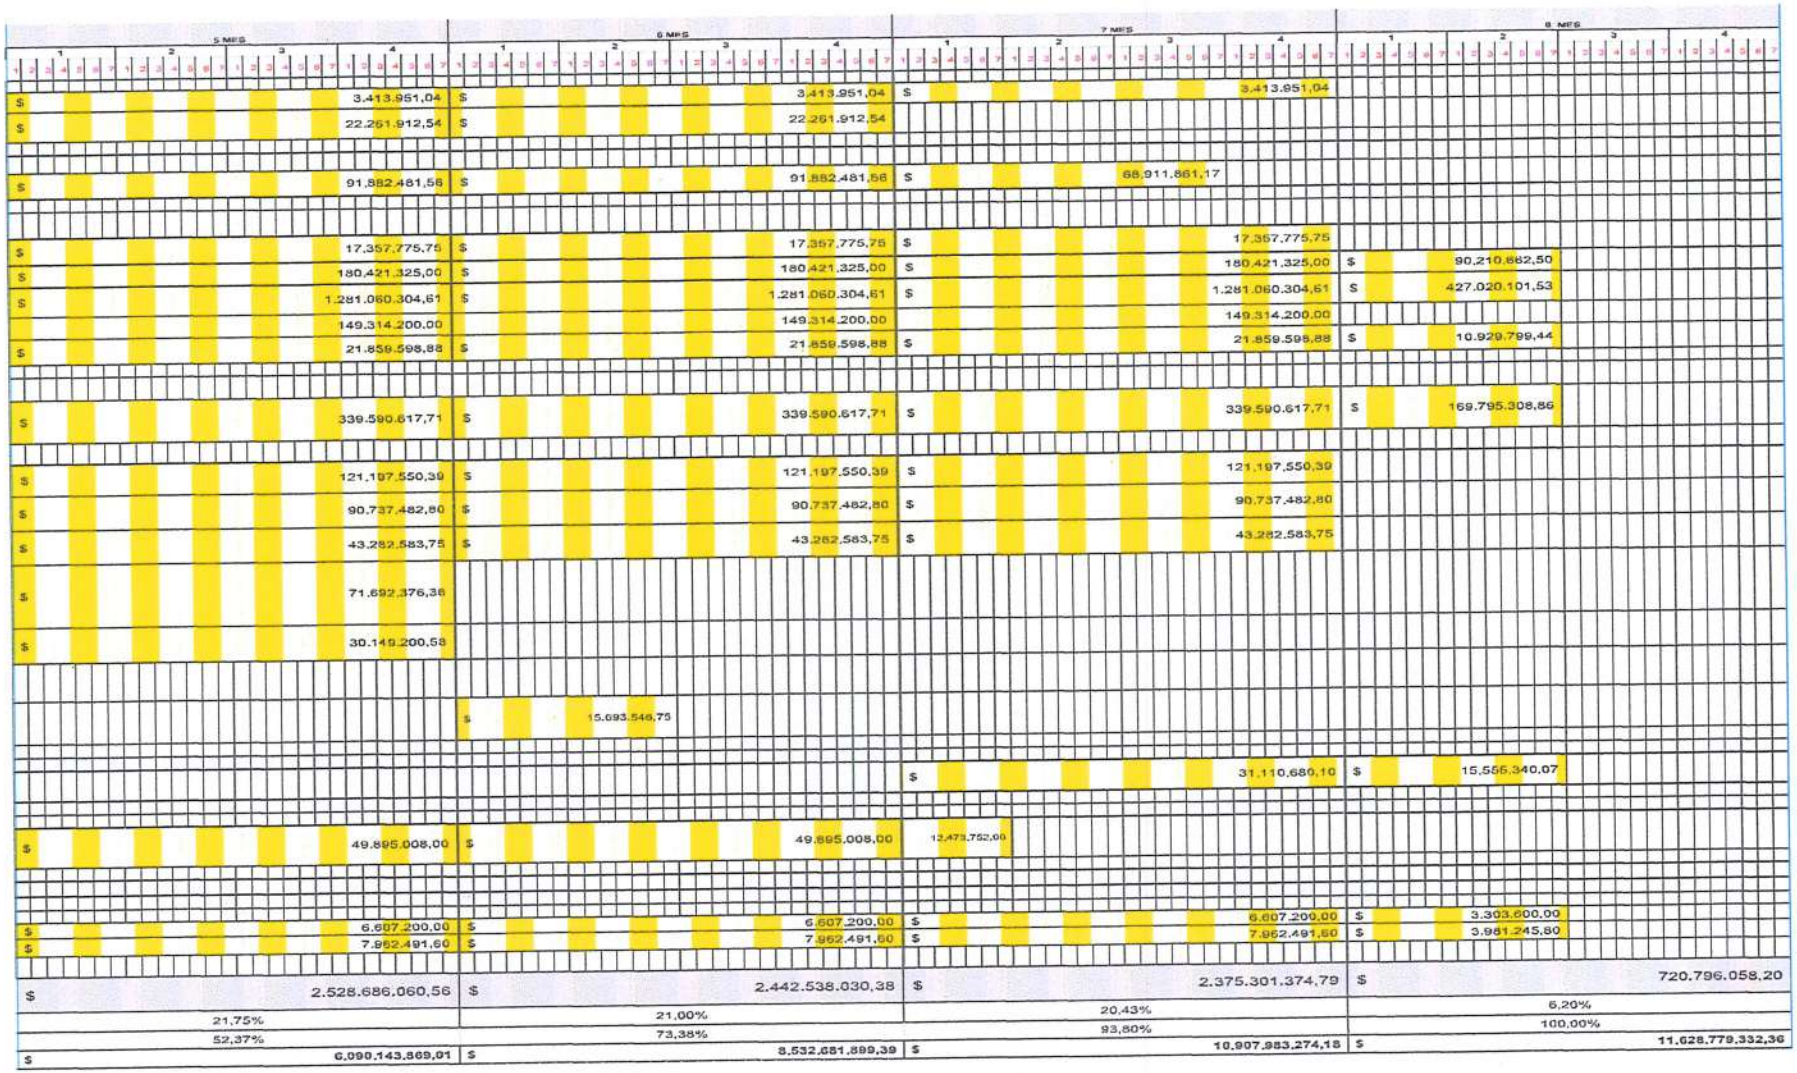
5 MES
6 MES
7 MES
8 MES
$ 3.413.951,04
$ 22.261.912,54
$ 91.882.481,56
$ 17.357.775,75
$ 180.421.325,00
$ 1.281.060.304,61
149.314.200,00
$ 21.859.598,88
$ 339.590.617,71
$ 121.197.550,39
$ 90.737.482,80
$ 43.282.583,75
$ 71.692.376,36
$ 30.149.200,58
$ 15.693.546,75
$ 49.895.008,00
$ 6.607.200,00
$ 7.962.491,60
$ 2.528.686.060,56
21,75%
52,37%
$ 6.090.143.869,01
$ 3.413.951,04
$ 22.261.912,54
$ 91.882.481,56
$ 17.357.775,75
$ 180.421.325,00
$ 1.281.060.304,61
149.314.200,00
$ 21.859.598,88
$ 339.590.617,71
$ 121.197.550,39
$ 90.737.482,80
$ 43.282.583,75
$ 15.693.546,75
$ 49.895.008,00
$ 6.607.200,00
$ 7.962.491,60
$ 2.442.538.030,38
21,00%
73,38%
$ 8.532.681.899,39
$ 3.413.951,04
$ 66.911.861,17
$ 17.357.775,75
$ 180.421.325,00
$ 1.281.060.304,61
149.314.200,00
$ 21.859.598,88
$ 339.590.617,71
$ 121.197.550,39
$ 90.737.482,80
$ 43.282.583,75
$ 31.110.680,10
12.473.752,00
$ 6.607.200,00
$ 7.962.491,60
$ 2.375.301.374,79
20,43%
93,80%
$ 10.907.983.274,18
$ 90.210.882,50
$ 427.020.101,53
$ 10.929.799,44
$ 169.795.308,86
$ 15.556.340,07
$ 3.303.600,00
$ 3.981.245,80
$ 720.796.058,20
6,20%
100,00%
$ 11.628.779.332,36

Anexo 3
Bitacora de Obra

Julio 1/25 bharda a cargo de las prof. S150
Base en el sector 21 bunetas en el sector 18
gaviones en el sector 17
Labores de topografía

Scanned with CamScanner

Julio 2/25 bharda a cargo de las prof. SISO
barrita asfaltica en el sector 20
base en el sector 21
Topografia en el sector 21
bunetas en el sector 18

[redacted]

Julio 3/25 bharda a cargo de las prof. SISO
barrita en el sector 20
base en el sector 21
lluvias en el sector en horas de la tarde

[redacted]

Julio 4/25 bharda a cargo de las prof. SISO
Gaviones en el sector 17
Sub base en el sector 22
Topografia en el sector 22.
bunetas en el sector 18
Se realizaron rellenos en los gavio
nes del sector 17

[redacted]

Scanned with CamScanner

Julio 5/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Topografía en el sector 22.
Rellenos en los gaviones del sector 17

Julio 7/25 Charla a cargo de las prof. SISO
Captta en el sector 20
Sub base en el sector 22.
Topografía en el sector 23.
Toma de muestras de mat. Sub base

Julio 8/25 Charla a cargo de las prof. SISO
base en el sector 22.
Topografía en el sector 22
Gaviones en el sector 17
Cunetas en el sector 18.

Julio 9/25 Charla a cargo de las prof. SISO
base en el sector 22.
Topografía sector 22
Gaviones en el sector 17

Scanned with CamScanner

Julio 10/25 bharda a cargo de las prof. SISO
impermeacion sector 22.
Topografia sector 23
gaviones sector 17
Sub base sector 23.

Julio 11/25 bharda a cargo de las prof. SISO
carpeta asfaltica sector 22.
Sub base sector 23
bunetas sector 17
gaviones sector 17

Julio 12/25 bharda a cargo de las prof. SISO
lluvias en el sector
bunetas sector 17
Gaviones sector 17.

Scanned with CamScanner

Jul/10 14/25 bharla a cargo de las prof. SISO
barpita asfaltica sector 22
Topografia sector 23.
Sub base sector 23.
bunetas sector 17.
Relleno gaviones sector 17

Jul/10 15/25 bharla a cargo de las prof. SISO
Topografia sector 23
Sub base sector 23
gaviones sector 17
Relleno gaviones sector 17

Jul/10 16/25 bharla a cargo de prof. SISO
Topografia sector 23.
Sub base sector 23.
bunetas sector 18
barque de material para rellenos.

Scanned with CamScanner

Julio 17/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografia sector 23
base sector 23
cunetas sector 18
Rellenos en gaviones sector 17
Labores de limpieza de obra

Julio 18/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografia sector 24
base sector 23.
cunetas sector 18.
Gaviones sector 17.

Julio 19/25 charla a cargo de las prof. SISO
imprimación sector 23.
cunetas sector 18.
Labores de conformación mecánica
en el sector 24 y 25 con el objeto
de mejorar la transitabilidad

Julio 21/25 charla a cargo de las prof. SISO
lluvias en el sector en horas de la ma
rance
Topografia sector 24
Sub base en sector 24

[redacted] 10AM: SE REALIZA VISITA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA.

Julio 22/25 charla a cargo de las prof. SISO
barpeta asfaltica en el sector 23
Topografia en el sector 24
Sub base en el sector 24

[redacted]

Julio 23/25 charla a cargo de las prof. SISO
barpeta asfaltica en el sector 23
Topografía en el sector 24
Sub base en el sector 24

[redacted]


Scanned with CamScanner

Julio 24/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografía en el sector 24
Sub base en el sector 24
cunetas en el sector 18


Julio 25/25 charla a cargo de las prof. SISO
Sub base en el sector 24
cunetas 17
Topografía en el sector 24

Julio 26/25 charla a cargo de las prof. SISO
comité tecnico en obra, con las veeduria el presidente del concejo de Tello, la interventoria, contratista y la guardia indigena donde:
- Se rindió informe del avance de la obra
- Se analizaron inconvenientes por la permanente transitabilidad durante la ejecución de los trabajos
- El irrespeto y desacato por parte de los usuarios de la vía con relación a los cortes de tránsito parciales
- Se adquirieron algunos compromisos por las partes que quedaron en acta


Julio 28/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografía en el sector 24
Sub base en el sector 24
cunetas 18



Julio 29/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografía en el sector 24
base en el sector 24
cunetas 18
relleno en gaviones.



Julio 30/25 charla a cargo de las prof. SISO
Topografía sector 24
base sector 24
cunetas 18



Scanned with CamScanner

Julio 31/25 Planta a cargo de las prof. SISO
Topografía sector 24
Impimación sector 24
base Sector 24

Scanned with CamScanner

Anexo 4
Comités de Obra

ACTA No: 06

CONTRATO DE OBRA Nro:	15 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO		
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro:	20 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VG		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SANANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACION**	**DURACION**
21 de julio de 2025	2:30 pm	4:00 pm	2.5 horas.

I. OBJETIVO DE LA REUNION:

Realizar el seguimiento al Contrato de Obra No. 15 de 2024 cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"; Así mismo, evaluar el avance de obra, calidad de las obras ya ejecutadas, recorrido a los Tramos ya intervenidos y aclarar posibles soluciones a situaciones que han afectado el rendimiento óptimo del proyecto.

II. PARTICIPANTES:

NOMBRES	CARGO
ING ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	Supervisora del Contrato - Secretaría de Vías
ING. CLAUDIO MEJÍA	Director de obra - Consorcio Infra. JPN Tello
ING. AURELIO CUBIDES	Residente de obra
ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ	Director de Interventoría

ING. PABLO CLARK	Residente de Interventoría
ING JESSICA ACOSTA	Inspectora SST - Interventoría
ING. ANGIE SÁNCHEZ	Ing. Administrativa - Técnico Interventoría.
ING. MAURICIO PERDOMO	Ing Residente de obra
DANIELA PERDOMO HOYOS	SST obra
BRAYAN NICOLAS ESPINOSA	Inspector de Interventoría
ING. AURELIO ANACONA	Ing Residente de Interventoría.

Se anexan firmas de participantes a la reunión.


III. TEMAS TRATADOS


1. Verificación del avance físico y técnico de la obra.
2. Revisión de las condiciones climáticas y su impacto en el cronograma.
3. Evaluación integral del impacto en el cronograma por los diferentes paros en el sector y paro nacional agrario
4. Calidad y terminado de las obras ya ejecutadas.
5. Recorrido a frentes intervenidos.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se informó a los asistentes que el contrato de obra No. 15 de 2024, que tiene por objeto la Rehabilitación de pavimento Flexible entre Fortalecillas y Tello, presenta un avance físico ejecutado del 32% con fecha de Terminación del 19 de septiembre del 2025.
- Que los tramos intervenidos a la fecha son los Tramos del 17 al 25, en total 9 tramos. En donde los tramos de mayor longitud son los T19 - T24 - T18 - T17.
- Teniendo en cuenta el atraso que presenta la obra es necesario que el contratista de obra presente de manera urgente un Plan de Contingencia (Plan de choque), que garantice el cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos, y el contrato retorne a los valores esperados.
- La supervisión a cargo de la Secretaría de Vías e Infraestructura sugiere ampliar los plazos de "pare y siga", con el propósito de que el contratista de obra pueda trabajar y ejecutar las actividades de forma continúa. Es importante que ese Plan de Cierre debe socializarse para la comunidad y empresas de Transporte.
- El contratista de obra manifiesta que ha presentado mayor distancia de acarreo, por ejemplo, en el APU de mezcla la distancia de acarreo es de 14 Km, pero Omega está a una distancia a más de 14 Km. En el mismo sentido con el transporte de Base y Subbase. La entidad sugiere que se haga una solicitud formal de manera escrita, cuantificando el valor de la mayor distancia de acarreo.

- En el recorrido de los Tramos 17 y 19, se identificaron diferentes falencias en el acabado de la carpeta asfáltica instada, a causa de posibles inconvenientes durante el proceso de construcción de las juntas transversales y longitudinales, así como la mala compactación en puntos críticos de la carpeta asfáltica, como son los hombros (bordes de la vía).
- El contratista de obra se compromete a subsanar las falencias encontradas, por lo tanto, es necesario la entrega del Procedimiento a realizar y la programación de las actividades, para la corrección de las falencias del acabado del pavimento.

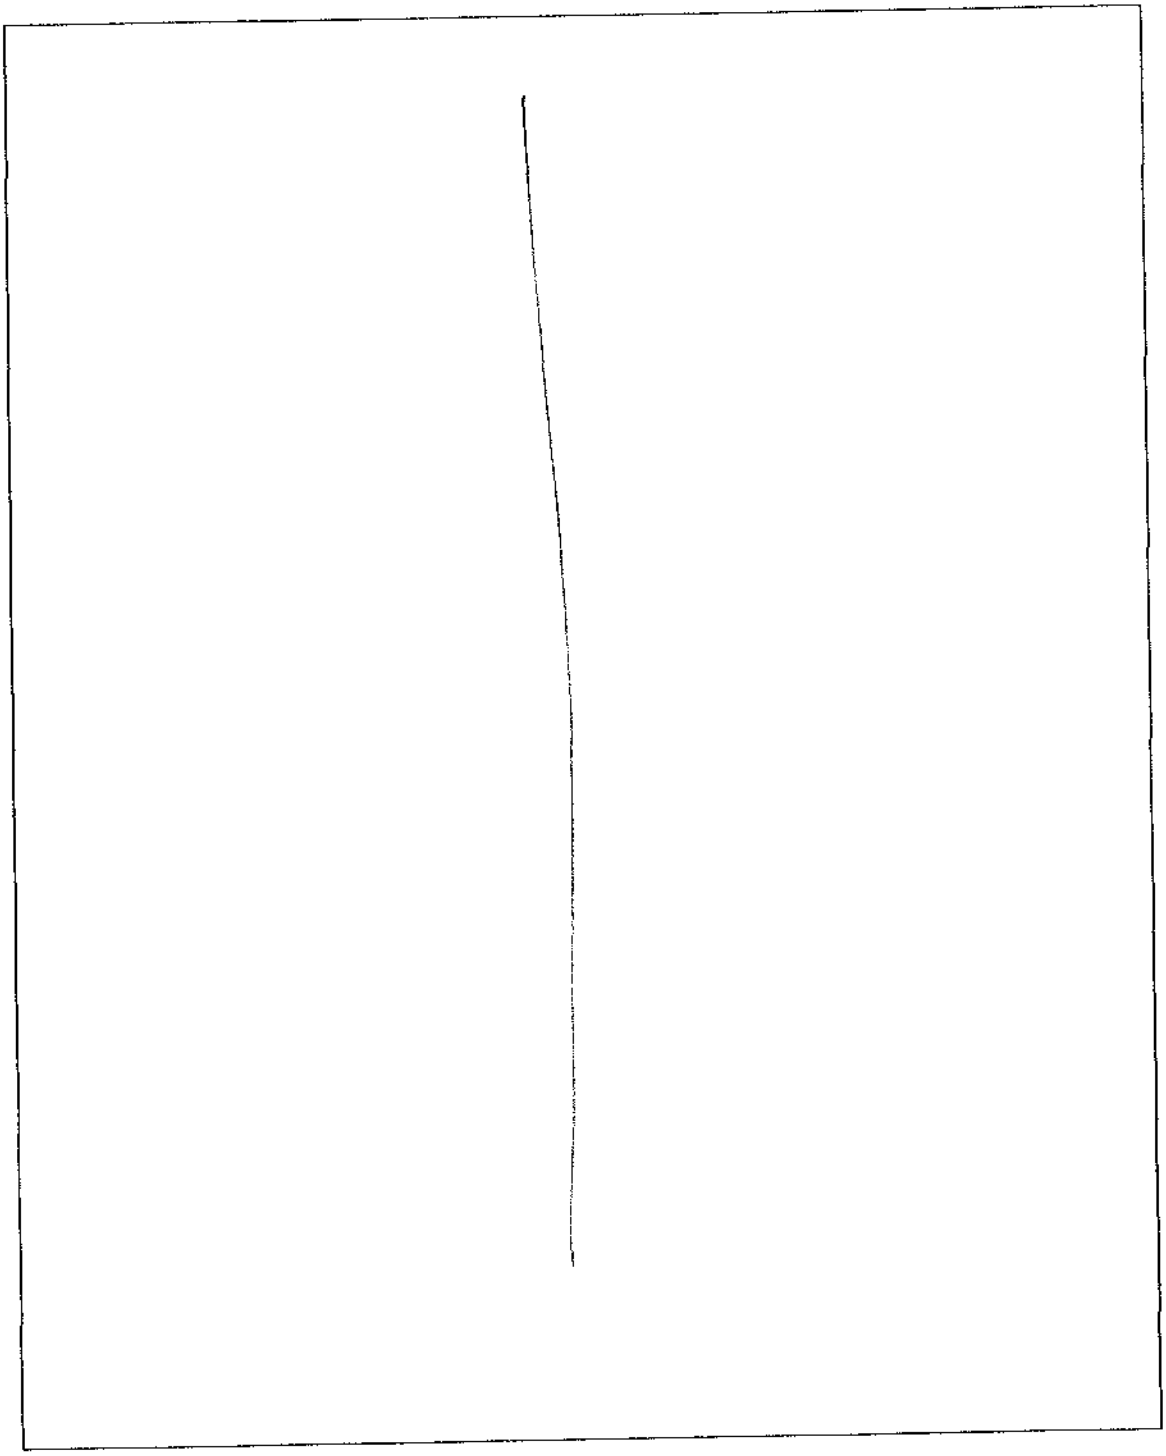

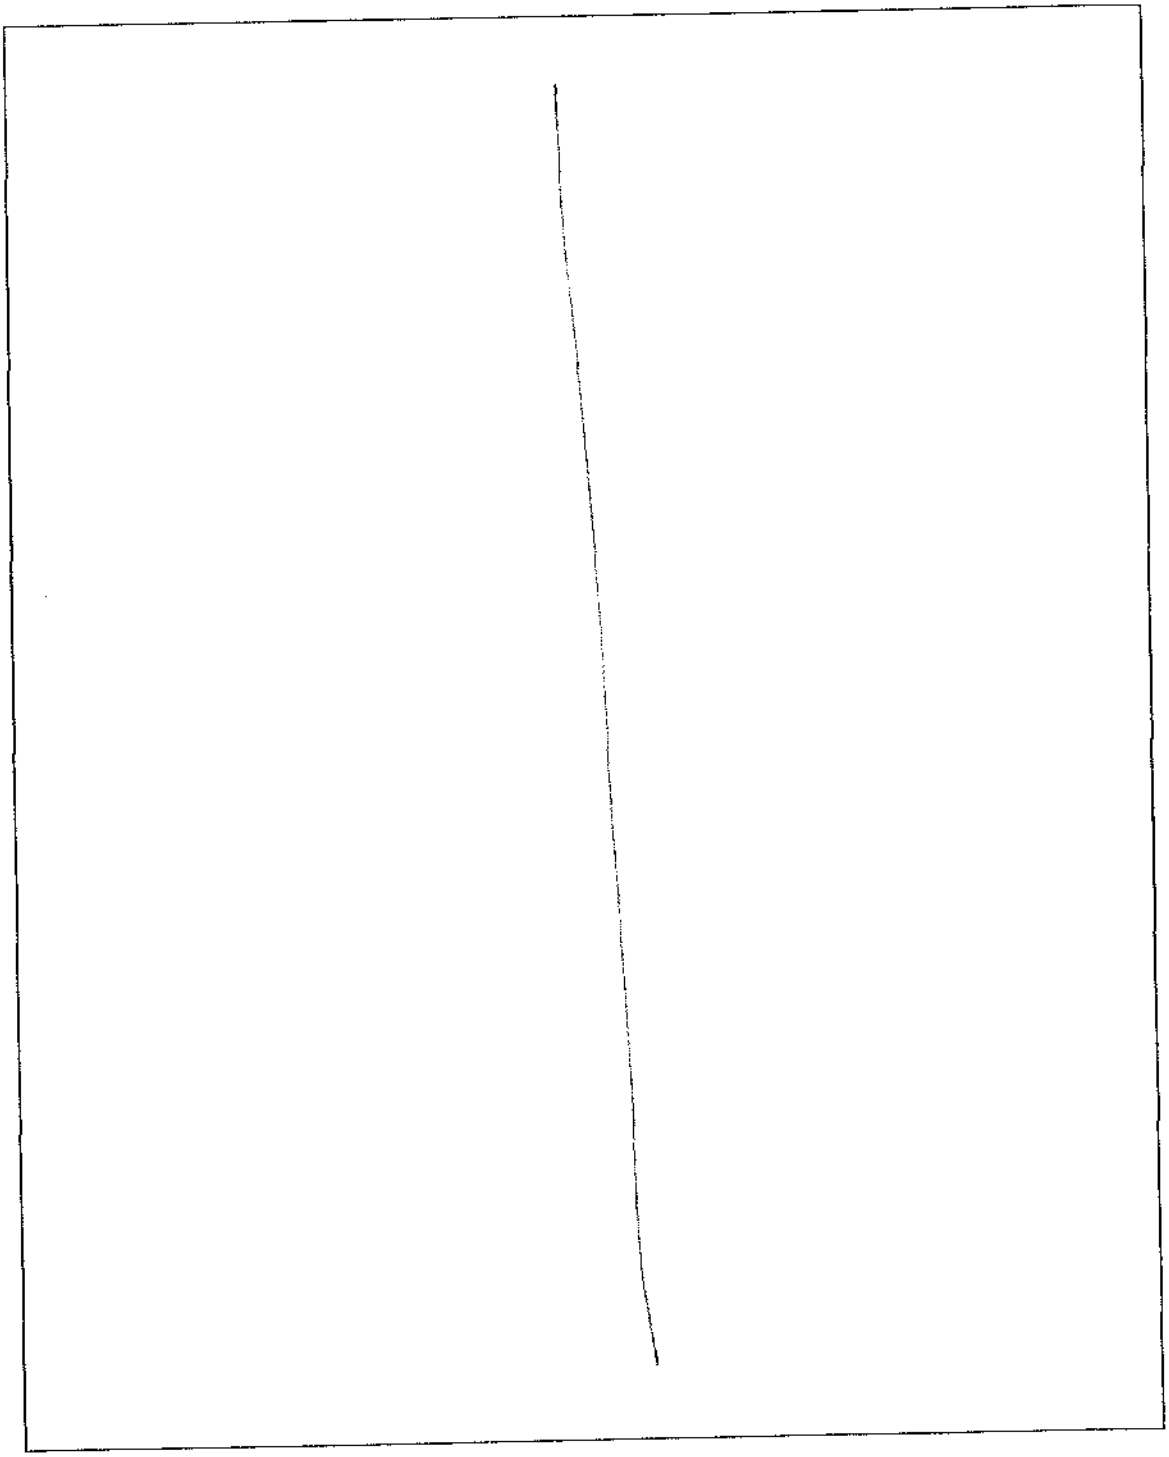

V. COMPROMISOS

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1	Programación de Plan de Manejo de Tránsito (Plan de Cierre)	Contratista de Obra	Esta Semana
2.	Reprogramación de Obra	Contratista de obra.	Esta Semana
3	Informe donde se incluya el procedimiento a realizar y programación de actividades para subsanar falencias en el acabado.	Contratista de Obra.	
4.	Oficio en donde se justifica la mayor distancia de Acarreo para la subbase, Base y Mezcla Asfáltica.	Contratista de Obra.	

Siendo las ~~11:30 AM~~, se dio por finalizada la sesión de esta reunión.
4:00 PM

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCION	MUNICIPIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	VICTOR G. RODRIGUEZ.	DIRECTOR.	INTERV.		3206[illegible]		
	PABLO R. CLARK	RESIDENTE INT.	CONSORCIO VG		3106185587		
	Aurelio Anacona G	Ing Residen	interv		3212304793		
	Claudia C Mejía G.	Ing. Director	Cons. JPN		3125233942		
	aurelio Bustos	INGRESO	CON JPN		3165243196		
	Jessica Acosta C.	Insp. SST.	Interv.		3174318346		Jessica A.
	Angela Zambrano R.	Supervisor Gobernación	~~Inter~~ Gobernación SJT	Tello	3202[illegible]		
	Edgar Mauricio Perdomo V.	Ins. Residente	Cons JPN Tello	Tello	3176234346		
	Daniela Perdomo Huila	SST	JPN TELLO	Tello	3202937606		
	Brayan Nicolas Espinosa	Inspector	Interv		3108151764		Brayan Espinosa
	Angie Katherine Sánchez	Ing. Auxiliar Técnico Interventoría	Interventoría.	Tello	3012335185		

P

Anexo 5
Control Personal Obra

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698907949	9490279439	E	2025/08/22	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,111,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)						$23,394,000	$3,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						$23,394,000	$3,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)						$23,394,000	$3,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12101945	CUBIDES AURELIO		0	$0	$0	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	1075242622	GALLEGO HANER	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
4	CC	93129015	GUZMAN JOAQUIN	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF32	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
5	CC	1082804610	LOPEZ ANLLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
8	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1078778338	PERDOMO DANIELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
10	CC	1075246303	PERDOMO EDGAR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	19105846	RUBIO HECTOR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1079184726	SALAS NASLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total			Afiliados(12)			$23,394,000	$3,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0

2025/08/14 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901785282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698907949	9490279439	E	2025/08/22	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,111,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,743,200	$0	$0	$3,743,200
COLFONDOS	231901	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,395,400	$0	$0	$2,395,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$652,000	$0	$0	$652,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$459,000	$0	$0	$459,000
TOTAL				12	$8,111,300	$0	$0	$8,111,300

2025/08/14 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	17008981S7	94903002I4	E	2025/08/05	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	9	$9,094,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$2,722,300	$485,700			$4,722,300	$689,000			$4,722,300	$689,000			$4,722,300	$245,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)					$1,298,800	$207,900			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$6,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,298,800	$207,900			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$6,800		$0	$0
1	CC 1029880078	BUSTOS ANA	25-14	24	$1,298,800	$207,900	EPS005	24	$1,298,800	$52,000	CCF32	24	$1,298,800	$52,000	14-11	24	$1,298,800	$6,800	24	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$238,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$238,300		$0	$0
2	CC 12121406	FERREIRA JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC 5854062	GUTIERREZ FERMIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (23 Afiliados)					$25,090,734	$4,015,300			$28,940,284	$1,141,500			$26,834,234	$1,074,000			$28,511,284	$1,752,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
4	CC 1003819875	CHARRY KIMBERLY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (9 Afiliados)					$11,333,334	$1,813,400			$13,340,384	$533,700			$11,653,334	$466,200			$13,340,384	$811,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)					$11,333,334	$1,813,400			$13,340,384	$533,700			$11,653,334	$466,200			$13,340,384	$811,500		$0	$0
5	CC 85449283	DE LUQUE JAVIER	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC 1075252102	DIAZ JESUS	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
7	CC 4896798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
8	CC 83233181	QUINTERO LUNIO	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC 17627931	QUINTERO OMAR		0	$0	$0	EPS017	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-11	6	$320,000	$22,300	6	$0	$0
10	CC 7712983	ROJAS DIEGO	231001	6	$320,000	$51,200	EPS037	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-11	6	$320,000	$22,300	6	$0	$0
11	CC 1082215917	ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC 4890677	SANCHEZ MILER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,687,050	$67,500	CCF32	0	$0	$0	14-11	30	$1,687,050	$0	0	$0	$0
13	CC 1075236051	VICTORIA FERNEY	25-14	19	$1,013,334	$162,200	EPS037	19	$1,013,334	$40,600	CCF32	19	$1,013,334	$40,600	14-11	19	$1,013,334	$70,600	19	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (13 Afiliados)					$11,957,400	$1,913,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$931,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)					$11,957,400	$1,913,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$931,900		$0	$0
14	CC 1075285589	ALVAREZ MILTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC 12131447	ARCOS JOSE	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
16	CC 1006528347	JIMENEZ HOLMAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
17	CC 1075309073	MANIOS JUAN	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
18	CC 17667482	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC 1082806583	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC 1079604610	MONTEALEGRE LORENZO	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
21	CC 7695099	PENAGOS JAIRO	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
22	CC 83242741	QUINTERO SAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC 4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC 83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC 1075225724	VALDERRAMA AVICELVIS	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC62	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0

2025/08/15 08:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
26	CC 1003801176	VALDERRAMA DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**				$27,613,034	$4,450,900			$33,243,584	$1,330,500			$31,556,534	$1,263,000			$33,243,584	$1,997,900		$0	$0

2025/08/15 08:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1700398157	9490300214	E	2025/08/05	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	9	$9,094,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,450,900	$25,500	$0	$4,476,400
COLFONDOS	23I801	800,227,940	6	5	$1,175,000	$6,700	$0	$1,181,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,169,700	$6,700	$0	$1,176,400
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	8	$1,298,600	$7,400	$0	$1,306,000
PROTECCION	Z30Z01	800,229,739	0	3	$807,600	$4,700	$0	$812,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,997,900	$11,400	$0	$2,009,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,997,900	$11,400	$0	$2,009,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,263,000	$7,200	$0	$1,270,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	26	$1,263,000	$7,200	$0	$1,270,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,330,500	$7,800	$0	$1,338,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$28,500	$200	$0	$28,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$69,800	$400	$0	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$596,900	$3,500	$0	$600,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$136,800	$800	$0	$137,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$498,500	$2,900	$0	$501,400
TOTAL				26	$9,042,300	$51,900	$0	$9,094,200

2025/08/15 08:34 AM

Anexo 6
Informe SST

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No 6

CONTRATO DE OBRA No. 015 DE 2024:

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DEL INFORME: 31/07/2025

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VG

JULIO DE 2025

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
4. INDUCCION 9
ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción 9
4.1. Registro fotográfico 9
5. EXAMENES MEDICO LABORALES 10
5.1. Exámenes de ingreso 10
ANEXO 2. Exámenes de ingreso 11
5.2. Exámenes de egreso 11
ANEXO 3. Exámenes de egreso 11
6. RECURSOS 11
6.1. Recursos humanos 11
6.2. Recursos técnicos 12
6.3. Recursos financieros 12
7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL 12
Relación personal julio. 13
ANEXO 4. Afiliaciones 13
7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL 13
7.1.1. RELACION DE PERSONAL 13
ANEXO 5. Planillas seguridad social 14
8. CHARLAS DE SEGURIDAD 14
ANEXO 6. Registros de asistencia 16
8.1. Registro fotográfico 16
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO 17
10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 17
11. BRIGADAS DE EMERGENCIA 17
12. CONTROL DE VEHICULOS 18

NOTA: Durante el periodo del mes de julio no hubo ingreso de maquinaria. 19

La documentación del resto de maquinaria y vehículos reposa en el informe 1 del mes de febrero del 2025.....19

13. INSPECCIONES 19

13.1. Inspección de vehículos y maquinaria 19

13.2. Registro de maquinaria en el mes de julio.....20

ANEXO 7. Inspección pre operacional 20

Registro fotográfico.....20

.....21

.....21

13.3. Inspecciones de equipos de emergencia 22

ANEXO 8. Inspección equipos de emergencia 22

13.4. Registro fotográfico 22

14. DOTACION Y EPP..... 23

ANEXO 9. Registros entrega de epp y dotación.....23

15.1. Registro fotográfico. 23

15. ACCIDENTES DE TRABAJO 25

NOTA: Durante el periodo del mes de julio no se presentó accidentes de trabajo. 25

16. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS 25

17. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL..... 25

17.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental.....26

17.1.1. Indicador 26

17.2. Capacitación ambiental al personal en obra.....26

NOTA: ver anexo 6 asistencia charlas.....27

17.2.1. Indicador 27

17.3. Cumplimiento de los requisitos legales..... 27

Nota: Titulo minero y licencia ambiental reposa en el informe # 3 ANEXO 12.....27

17.3.1. Indicador 27

18. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS..... 28

18.1. Almacenamiento y manejo integral de los materiales de construcción. 28

18.1.1. Indicador 28

18.2. Registro fotográfico 29

18.3. Señalización frentes de obra y sitios temporales 29

18.3.1. Indicador 30

18.4. Presupuesto PMT 30

18.4. Registro fotográfico 32

18.5. PRESUPUESTO PMA 33

18.6. Manejo y disposicion final de escombros 34

Durante este periodo se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra. 34

NOTA: el permiso reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025 34

18.6.1. Indicador 34

18.7. Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales y especiales 34

18.8. Registro fotográfico 35

18.9. Orden y Aseo 36

NOTA: La solicitud de recolección de residuos reposa en el informe No. 1 y el acta de conformación de brigada de orden y aseo fue actualizada para este periodo. 36

NOTA: Actualización Brigada de Orden y Aseo reposa en el informe N° 5 junio 2025 Anexo 14. 36

18.10. Registro fotográfico 37

19. GESTION RECURSO HIDRICO 38

19.1. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales 38

20. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 38

20.1. Indicador 39

20.2. Manejo de maquinaria equipos y vehículos 39

20.3. Registro de maquinaria del mes de junio 39

NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1 del mes de febrero del 2025 39

20.4. Indicador 39

21. GESTIÓN SOCIAL 40

21.1. Localización del proyecto 40

21.2. Proyecto de atención a la comunidad 40

21.2.1. Registro fotográfico 41

21.3. Información y divulgación 41

21.3.1. Indicador 41

21.4. Conformación de veedurías 42

NOTA: El anexo de la conformación de las veedurías reposa en el informe No. 1 del mes de febrero del 2025 43

21.5. Directorio del municipio de Tello 43

21.6. Contratación mano de obra 44

21.6.1. Indicador 44

21.7. Perfil sociodemográfico 45

ANEXO 10. Perfil sociodemográfico "Actualizado". 45

1. INTRODUCCION

El presente documento relaciona las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo que corresponden, al mes de julio del presente año, realizadas en la ejecución del proyecto **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 15 DE 2024, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un pilar fundamental de la empresa, ya que busca garantizar condiciones laborales seguras, prevenir accidentes y proteger el bienestar físico y mental de los trabajadores. A través de la identificación, evaluación y control de riesgos, se promueve un entorno de trabajo saludable y eficiente.

La ejecución de medidas de SST no solo cumple con normativas legales, sino que también mejora la productividad, reduce costos asociados a incidentes laborales y fortalece la cultura organizacional. Una adecuada gestión de la seguridad laboral es clave para fomentar el compromiso de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de la empresa.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT:	901.785.282-7
CONTRATO No.:	015 DE 2024
OBJETO.:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA
VALOR INICIAL:	$ 8.258.002.715,00
VALOR ADICIONAL:	$ 3.370.776.617,36
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.628.779.332,36
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	26 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	27 DE MAYO DE 2025

3. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un modelo estructurado que permite a las empresas identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Su ejecución es un requisito legal, el cual está diseñado para mejorar continuamente las condiciones de trabajo, promoviendo un ambiente seguro y saludable para los empleados.

Un SG-SST bien ejecutado no solo protege la vida y la salud de los trabajadores, sino que también beneficia a la empresa al reducir costos asociados a incidentes laborales, mejorar la moral del equipo y fortalecer la reputación de la organización. Su correcta gestión contribuye a crear un entorno laboral más seguro, cumpliendo con las normativas legales y promoviendo el bienestar de todos los colaboradores.

4. INDUCCION

La **inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** es un proceso fundamental para garantizar que todos los trabajadores de la obra conozcan los riesgos laborales y las medidas preventivas que deben seguir para desarrollar sus actividades de manera segura.

En la inducción al personal se les dio a conocer la siguiente información:

- Explicar las normas y procedimientos de seguridad que deben cumplir.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la ejecución de sus actividades.
- Reglamento y horarios de trabajo
- capacitar sobre en el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP).
- Sensibilizar sobre la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

En el mes de julio se realizó la inducción a 3 personas que ingresaron al proyecto.

ANEXO 1. Registro de asistencia a inducción

4.1. Registro fotográfico



5. EXAMENES MEDICO LABORALES

En cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores, se han realizado los **exámenes médicos laborales** requeridos para la ejecución de las actividades en obra.

Estos exámenes permiten evaluar la condición física y aptitud médica del personal, asegurando que se encuentren en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones sin riesgo para su bienestar.

- Todos los trabajadores han sido evaluados de acuerdo con el perfil ocupacional de su cargo.
- Se cuenta con los certificados médicos que respaldan la aptitud del personal.
- Se garantiza la confidencialidad de los resultados y el cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional.

La realización de estos exámenes médicos contribuye a la prevención de enfermedades laborales y refuerza el compromiso de la empresa con la seguridad y el bienestar de su equipo de trabajo

5.1. Exámenes de ingreso

- Verificar que el trabajador se encuentra **apto física y mentalmente** para desempeñar el cargo.
- Identificar condiciones de salud preexistentes.
- Garantizar que las tareas asignadas no representen un riesgo para su salud ni para la de terceros

Personal que realizaron los exámenes de ingreso el mes julio

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LORENZO MONTEALEGRE CESPEDES	1.079.604.610	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO PENAGOS	7.685.099	AYUDANTE DE OBRA
OMAR VARGAS QUINTERO	17.627.931	CONDUCTOR DE VOLQUETA

ANEXO 2. Exámenes de ingreso

5.2. Exámenes de egreso

NOMBRE	CARGO	FECHA DE SALIDA
FERNEY VICTORIA CHAVARRO	OPERADOR VOLQUETA	19/07/2025
AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR.	AYUDANTE	15/07/2025
HOLMAN JIMENEZ DIAZ	AYUDANTE	15/07/2025

- Evaluar el estado de salud del trabajador al momento de su retiro.
- Identificar si se produjo algún deterioro relacionado con la exposición a factores de riesgo durante su permanencia en la empresa.
- Dejar un registro clínico oficial que pueda usarse en caso de reclamaciones o procesos legales.

ANEXO 3. Exámenes de egreso

6. RECURSOS

6.1. Recursos humanos

Responsable del SG-SST: Profesional en seguridad y salud en el trabajo encargado de la gestión y supervisión del sistema.

Nombre Profesional	Cargo
Brian Alexander Hernández Olaya	Profesional SST
Nasly Melisa Salas Sánchez	Auxiliar SST
Daniela Perdomo Horta	Profesional SST

6.2. Recursos técnicos

- Equipos de Protección Personal (EPP): Cascos, guantes, gafas de seguridad, botas punta de acero, chalecos reflectivos, entre otros.
- Señalización y demarcación: Avisos de prevención, zonas de riesgo y prohibiciones.
- Herramientas y equipos seguros: Equipos en buen estado, revisados periódicamente para evitar fallos o accidentes.

6.3. Recursos financieros

- Presupuesto para seguridad y salud en el trabajo: Inversión en capacitación, compra de EPP, señalización y equipos de seguridad

7. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con las obligaciones contractuales y en cumplimiento del pliego de condiciones, se han realizado las respectivas afiliaciones del personal que ejecuta el contrato a los sistemas de seguridad social obligatorios. Estas afiliaciones incluyen:

- Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Garantiza la cobertura en caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Fondo de Pensiones: Asegura la cotización para la jubilación o protección en casos de invalidez o fallecimiento.

- Sistema de Salud: Proporciona acceso a servicios médicos y prestaciones asistenciales.

Se cuenta con los soportes correspondientes que evidencian la afiliación y pago de aportes del personal vinculado. Además, se han implementado medidas de control para garantizar el cumplimiento continuo de estas obligaciones durante la ejecución del contrato.

Relación personal julio.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LORENZO MONTEALEGRE CESPEDES	1.079.604.610	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO PENAGOS	7.685.099	AYUDANTE DE OBRA
OMAR VARGAS QUINTERO	17.627.931	AYUDANTE DE OBRA

ANEXO 4. Afiliaciones

7.1. PLANILA SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normatividad legal vigente en Colombia y de las obligaciones contractuales establecidas, la empresa realizo el pago de la **Planilla Integrada de Liquidación de Aportes**, como evidencia del cumplimiento de las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el personal vinculado al proyecto.

7.1.1. RELACION DE PERSONAL

PERSONAL CONSORCIO JPN		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
CLAUDIO MEJIA GUTIERREZ	12.138.187	ING. DIRECTOR
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE
HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO
HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2
JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	AUX. SST
PERSONAL INGENIERIA Y EQUIPOS MA SAS		
GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE. RETRO EXCAVADORA

LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR
JESUS DAVID DIAZ GONZALES	1.075.252.102	OPE. RETRO EXCAVADORA
JAVIER JESUS DE LUQUE CABARGA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE
FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR DE VOLQUETA
LUNIO POLANIA QUINTERO	83.233.181	CONDUCTOR DE VOLQUETA
MILLER SANCHEZ LEON	4.980.672	CONDUCTOR DE VOLQUETA
MILTON ANDRES ALVAREZ	1.075.285.580	OFICIAL
DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFICIAL
EVERLEDETH REYES DIAZ	83.242.741	AYUDANTE
HOLMAN JIMENEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE

ANEXO 5. Planillas seguridad social

8. CHARLAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, antes de iniciar la jornada laboral se realizan charlas de seguridad con el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención de riesgos.

Estas charlas reflejan el compromiso de la empresa contratista con la seguridad y el bienestar del personal, permitiendo:

- Analizar situaciones que podrían derivar en accidentes.
- Evaluar los riesgos a los cuales están expuestos en la ejecución de las actividades.
- Identificar y aplicar medidas de control adecuadas.

El profesional SST es el encargado de dirigir estas charlas diarias, explicando las tareas programadas, los riesgos asociados y las acciones preventivas a implementar.
La capacitación o charla pre operacional es de carácter obligatorio y debe realizarse todos los días antes del inicio de las actividades con la participación de todo el personal de obra.
Se llevan registros de asistencia y temas tratados durante el mes de julio como evidencia del cumplimiento de este requisito.

FECHA	TEMA
01-07-2025	Inspección pre operacional de herramientas
02-07-2025	Hidratación adecuada durante la jornada laboral
03-07-2025	Uso adecuado de EPP
04-07-2025	Reporte de actos y condiciones inseguras
05-07-2025	Orden y aseo en los puestos de trabajo
07-07-2025	Respeto y sana convivencia
08-07-2025	Riesgo psicosocial
09-07-2025	Reporte de incidentes
10-07-2025	Calestenia- recomendaciones generales
11-07-2025	Riesgo ergonómico
12-07-2025	Prevención de enfermedades laborales
14-07-2025	Recolección de residuos
15-07-2025	Exceso de confianza en el trabajo
16-07-2025	Pausas activas – recomendaciones generales
17-07-2025	Diferencia entre peligro y riesgo
18-07-2025	Socialización nuevo horario
19-07-2025	Pausas activas
21-07-2025	Prevención en riesgos específicos del entorno
22-07-2025	Contaminación atmosférica
23-07-2025	Seguridad vial
24-07-2025	Accidente e incidente de trabajo
25-07-2025	Prevención del sedentarismo
26-07-2025	Clasificación de residuos
28-07-2025	Calistenia y recomendaciones
29-07-2025	Hábitos y estilos de vida saludable
30-07-2025	Prevención bipedestación prolongada

31-07-2025	Respeto y buena comunicación


ANEXO 6. Registros de asistencia

8.1. Registro fotográfico







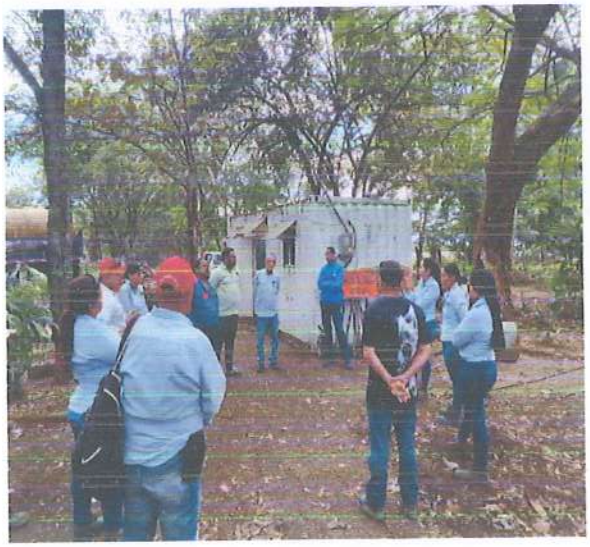

9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SAUD EN ELTRABAJO

En cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se encuentra conformado y actualizado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el cual tiene como función principal la promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas y programas de prevención de riesgos laborales dentro de la obra.

NOTA: La Actualización COPASST, reposa en el ANEXO 7 del informe N° 5 del mes de junio del 2025.

10. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar organizacional, se encuentra conformado y actualizado el Comité de Convivencia Laboral (CCL), con el propósito de prevenir y atender situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente de trabajo sano, respetuoso y armonioso.

NOTA: La Actualización COCOLA, reposa en el ANEXO 8 del informe N° 5 del mes de junio del 2025.

11. BRIGADAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento del Plan de Emergencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se encuentran conformadas las Brigadas de Emergencia, con el propósito de garantizar:

- actuar de manera organizada y eficiente ante situaciones de emergencia.
- Proteger la vida e integridad de los trabajadores y visitantes en la obra.

- coordinar acciones de prevención, atención y recuperación en caso de incidentes.
- Reducir el impacto de emergencias mediante respuestas rápidas y efectivas.

NOTA: El acta de conformación reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025

12. CONTROL DE VEHICULOS

El control adecuado de vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla es clave para la seguridad vial en la obra. Implementar protocolos de inspección, mantenimiento y capacitación ayuda a reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y cumplir con la normativa vigente

Durante el mes de junio el consorcio conto con vehículos Livianos, pesados y maquina amarilla para la ejecución de actividades en obra, se relacionan a continuación

LISTADO DE MAQUINARIA AMARILLA

No.	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO	TARJETA REGISTRO
1	Motoniveladora	Champión	710 a	1989	157-694-19629
2	Motoniveladora	Champión	715 a	2006	715ª-101-0705-2
3	Retroexcavadora	Caterpilar	320 D	2008	CPPAB06905
4	Retroexcavadora	Caterpilar	320 CL	2006	CAT0320CPPAB06905
5	Vibro compactador	Dynapac	CA125D	1998	64220324
6	Vibro compactador	Dynapac	CA 15	1989	MC107136
7	Finisher	Rodatec	207 with eagle	2006	RP-190

LISTADO DE VEHICULOS LIVIANOS					
No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	Camioneta	CHEVROLET	LUV D MAX DSL	2006	CMQ 423
2	Camioneta	FORD	RANGER	2012	TDS 050

LISTADO DE VOLQUETAS					
No.	VEHICULO	MARCA	REFERENCIA	MODELO	PLACA
1	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1998	OWH 749
2	VOLQUETA	CHEVROLET	C 70 149	1983	OZD 276
3	VOLQUETA	CHEVROLET	C 79 189	1982	OWH 442

NOTA: Durante el periodo del mes de julio no hubo ingreso de maquinaria.

La documentación del resto de maquinaria y vehículos reposa en el informe 1 del mes de febrero del 2025.

13. INSPECCIONES

13.1. Inspección de vehículos y maquinaria

Las inspecciones de seguridad y pre operacionales de maquinaria son estrategias preventivas implementadas por la empresa para identificar peligros y controlar riesgos antes de que puedan ocasionar daños a los trabajadores o afectar el entorno donde se desarrollan las actividades.

A través de estas inspecciones se busca:

- Verificar el estado mecánico y operativo de la maquinaria.
- Detectar posibles fallas o condiciones inseguras que puedan generar accidentes.

- Asegurar que los equipos cumplan con las normas de seguridad y mantenimiento establecidas.
- Evaluar el correcto uso de los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria.

Estas inspecciones son realizadas antes del inicio de cada jornada laboral o previo a la operación de cualquier equipo, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar riesgos.

Se lleva un registro detallado de cada inspección y documentando.

13.2. Registro de maquinaria en el mes de julio


NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec

ANEXO 7. Inspección pre operacional

Registro fotográfico





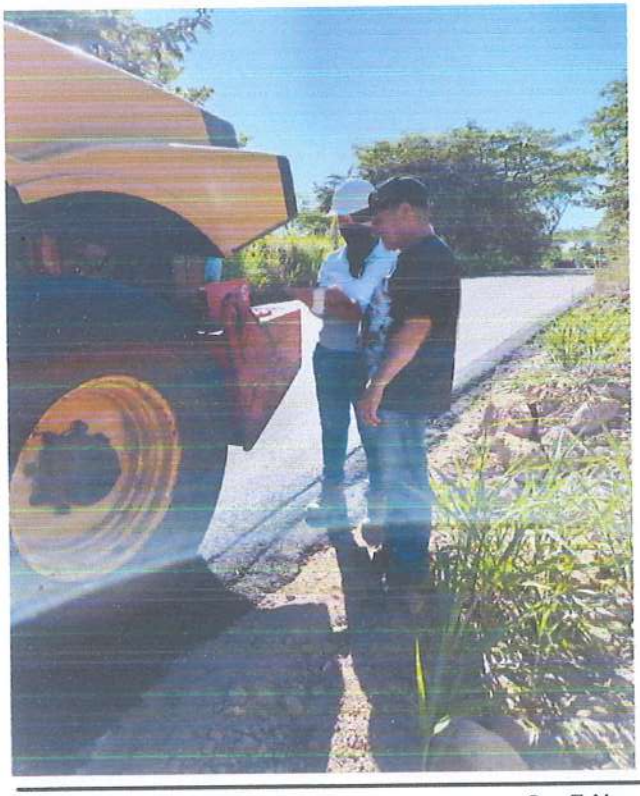



13.3. Inspecciones de equipos de emergencia

En el mes de junio se realizan inspecciones a los equipos de emergencia con el objetivo de verificar su estado, funcionamiento y disponibilidad, garantizando una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad en la obra.

En la locación contamos con

- Camilla de emergencia con inmovilizador cervical
- Extintores
- Botiquines
- Kit antiderrame
-

ANEXO 8. Inspección equipos de emergencia

13.4. Registro fotográfico





14. DOTACION Y EPP

En cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se ha realizado la entrega de dotación y elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores vinculados a la obra, garantizando su seguridad y bienestar durante la ejecución de las actividades.

La dotación y los EPP suministrados cumplen con los estándares de calidad y normativas vigentes, asegurando su adecuada protección. Entre los elementos entregados se encuentran:

- Protección para la cabeza: Casco de seguridad con suspensión ajustable.
- Protección ocular y facial: Gafas de seguridad
- Protección auditiva: Tapones o protectores auditivos.
- Protección respiratoria: Tapabocas.
- Protección de manos: Guantes de seguridad
- Protección corporal: Pantalón, camisas y chaleco reflectivo para alta visibilidad.
- Protección de pies: Botas de seguridad con puntera de acero.


Se ha registrado la entrega de los elementos a cada trabajador mediante actas de recepción firmadas, como también se capacita al personal en el uso correcto de los elementos entregados y su mantenimiento.
El suministro y control de la dotación y los EPP hacen parte del compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

ANEXO 9. Registros entrega de epp y dotación

15.1. Registro fotográfico.




JPNTELLO

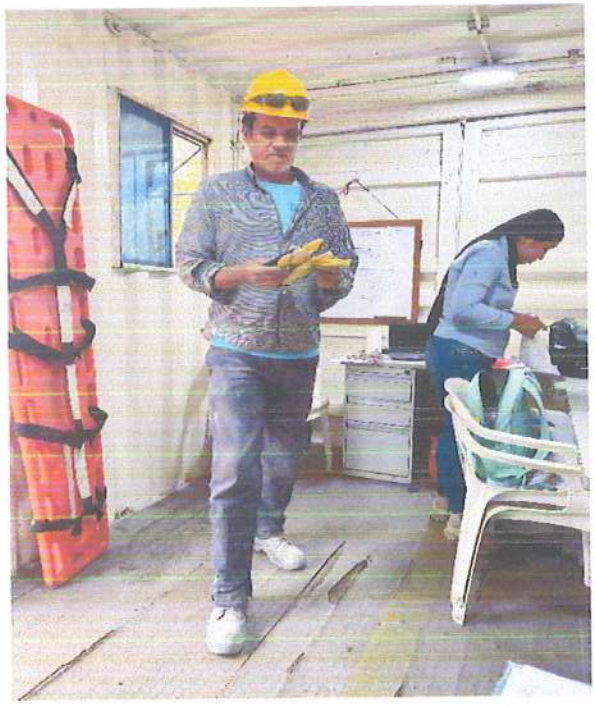



15. ACCIDENTES DE TRABAJO

Un accidente de trabajo es todo suceso que cause daño o perjuicio a la salud del trabajador mientras desempeña sus actividades laborales, ya sea en el lugar de trabajo o durante el desempeño de las labores, siempre que exista una relación directa con la actividad laboral.

NOTA: Durante el periodo del mes de julio no se presentó accidentes de trabajo.

16. MATRIZ DE INDENTIFICACION DE PELIGROS

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) es una herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la cual se identifican, analizan y valoran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades laborales.

Esta matriz permite determinar el nivel de riesgo de cada actividad, establecer controles existentes y proponer medidas de intervención para prevenir accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad o al medio ambiente.

NOTA: La matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos reposa en el informe No.2 del mes de marzo del 2025

17. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

Es un instrumento de planificación y ejecución ambiental diseñado para garantizar la incorporación efectiva de criterios de sostenibilidad ambiental en el proyecto, desde la etapa de diseño hasta la construcción, operación, mantenimiento y cierre. Este programa busca prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos derivados de actividades humanas.

El DAGA no solo busca cumplir con las exigencias legales y normativas ambientales, sino también establecer una cultura organizacional orientada al

respeto por el medio ambiente, al uso eficiente de los recursos y a la participación de todo el personal del proyecto.

17.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

La brigada del grupo de gestión ambiental se encuentra conformada, garantizando el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa de la GUIA Ambiental (PAGA).

NOTA: Acta de Conformación del Grupo Ambiental reposa en el informe No.4 del mes de mayo del 2025 Anexo N° 10.

17.1.1. Indicador

(4/4) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos)

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.2. Capacitación ambiental al personal en obra

Durante el mes de julio, se llevaron a cabo charlas de sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo y técnico de la obra, con enfoque en los siguientes temas clave:

- Orden y aseo en los puestos de trabajo en frentes de trabajo y zonas comunes.
- Recolección de residuos
- Contaminación atmosférica
- Clasificación de residuos (orgánicos, inorgánicos reciclables, peligrosos).

Estas actividades formaron parte de las acciones del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), con el objetivo de reducir los impactos ambientales generados por las actividades constructivas, promover el cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y fomentar una cultura ambiental responsable dentro del equipo de trabajo.

NOTA: ver anexo 6 asistencia charlas

17.2.1. Indicador

(4/4) *100= 100% Siendo (Número de profesionales contratados/Número de profesionales Requeridos

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

17.3. Cumplimiento de los requisitos legales

En cumplimiento de la normativa ambiental vigente para el desarrollo del proyecto, se cuenta con el abastecimiento de materiales provenientes de las empresas **Construcciones Lagos Ltda y pavimentos y construcciones OMEGA LMTA.**, las cuales poseen un título minero vigente que la habilita legalmente para la explotación y comercialización de materiales de construcción.

Estas empresas cumplen con los requisitos establecidos en la normativa ambiental y minera, garantizando que los materiales suministrados al proyecto:

- Provienen de fuentes autorizadas y con licencia ambiental.
- Cuentan con los permisos y autorizaciones requeridos por la autoridad competente.
- Se extraen bajo criterios técnicos y ambientales que minimizan el impacto al entorno natural.

El abastecimiento responsable de materiales es una parte fundamental del Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA), ya que contribuye al cumplimiento de los requisitos legales, al uso sostenible de los recursos naturales y a la trazabilidad de las materias primas utilizadas en obra.

Nota: Titulo minero y licencia ambiental reposa en el informe # 3 ANEXO 12.

17.3.1. Indicador

(2/2) *100= 100% Siendo (Número de Permisos otorgados /Número de Permisos requeridos

*100 donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

18. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

18.1. Almacenamiento y manejo integral de los materiales de construcción.

Durante el periodo correspondiente al mes de julio, evidencio 2 acopio temporal de materiales en obra. Todos los materiales requeridos para las actividades constructivas son transportados directamente desde la planta de producción (empresa Construcciones Lagos Ltda.) hasta los puntos específicos de utilización en el frente de trabajo.

Esta modalidad de operación responde a una estrategia de optimización logística y ambiental, con los siguientes beneficios:


- Reducción de riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado de materiales (dispersión de partículas, escurrimientos, contaminación del suelo).
- Minimización del uso de áreas de acopio, evitando la afectación de zonas naturales o espacios improductivos.
- Mejor control del volumen de materiales ingresados y utilizados, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos.


18.1.1. Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

18.2. Registro fotográfico

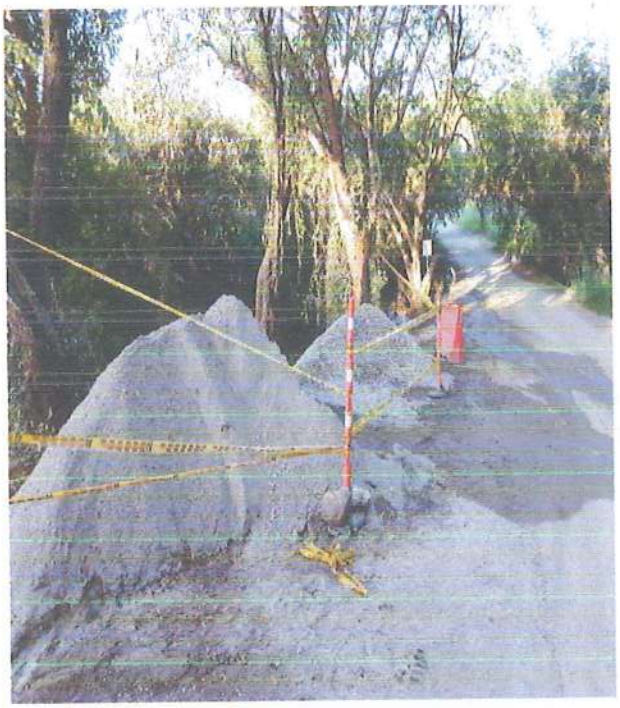

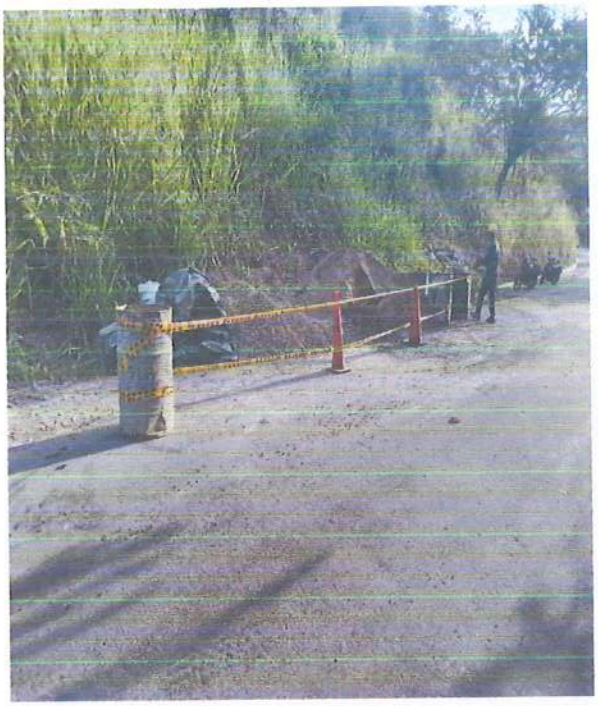

18.3. Señalización frentes de obra y sitios temporales

De acuerdo al plan de manejo de tránsito (PMT) La señalización de la obra es un elemento fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y conductores que transitan por la zona de intervención. Su correcta implementación permite informar, advertir y regular la circulación, minimizando riesgos y evitando accidentes.

La señalización vial debe cumplir con las normativas vigentes y ser visible en todo momento, asegurando que los usuarios de la vía puedan identificar oportunamente las condiciones del tránsito y las restricciones generadas por la obra.

Diariamente se realiza una verificación de la señalización para garantizar su correcto estado y visibilidad, asegurando que:

- Las señales estén bien ubicadas y en condiciones óptimas.
- Los dispositivos de seguridad cumplan su función.
- Se implementen ajustes según el avance de la obra y las condiciones del tráfico.

La correcta aplicación de la señalización en obra vial contribuye a la prevención de accidentes y al ordenamiento del tránsito, garantizando un entorno seguro para todos los involucrados.

18.3.1. Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra
*100 donde los demuestran el cumplimiento de este indicador para este periodo.

18.4. Presupuesto PMT

Descripción	Unidad	Cantidad
Barricada de listones, con tablero "SEÑAL VÍA CERRADA"	UND	0
Paleta de control PARE-SIGA	UND	0
Señal INICIO DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	0
Señal FIN DE OBRA (Velocidad menor o igual de 50km/h)	UND	0
Señal SPO-1 TRABAJOS EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Señal SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Señal SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO (Velocidad menor o igual de 50km/h) Vía rural	UND	0
Delineador compuesto separado cada 11 metros	UND	0
Cinta de demarcación (500m)	UND	0
Radio teléfono Banda VHF (Frecuencia 151-161 MHZ) Banda UHF (Frecuencia 462-469 MHZ) 8 Canales	UND	0
Chalecos reflectivos	UND	0
Planos Plan de Manejo de Tráfico	UND	0

18.4. Registro fotográfico









18.5. PRESUPUESTO PMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD:
I-GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL		
Descripción	Unidad	Cantidad
Reuniones informativas con la comunidad del Área de influencia directa e indirecta del proyecto - socialización de inicio, avance y fin de obra	Und	0
II-CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES		
Descripción	Unidad	Cantidad
Baños Portátiles (Incluye mantenimiento y disposición de aguas residuales)	mes	0
III-PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Desmantelamiento obras provisionales	m2	0
Restauración de las áreas intervenidas (zonas de depósito, campamento y acopio de material sobrante)	m2	0
Riego de plantas tapizantes, de cobertura y de empradización durante cuatro meses desde el primer día, cada ocho días (10 lts)	m2	0
IV-MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIFERENTES A ESCOMBROS Y LODOS		
Descripción	Unidad	Cantidad
Kit para desperdicios sólidos (Incluye kits antiderrames, cubrimientos y señalización de la obra, cinta de peligro, avisos proximidad)	Und	
V-ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD		
Descripción	Unidad	Cantidad
Talleres ambientales dirigidos a los centros educativos ubicados en el área de influencia del proyecto	Und	0
VI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Descripción	Unidad	Cantidad

Kit de primeros auxilios y extintores	Und	0

18.6. Manejo y disposicion final de escombros

Durante este periodo se han gestionado diferentes Permisos para la Disposición Final del Material de excavación, el cual autoriza la disposición adecuada de los residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.

NOMBRE	PERMISO Y /O AUTORIZACION	FECHA / ENTIDAD APROBATORIA
JUAN CARLOS MEDINA ROBLES	Autorización para el suministro de material de excavación para ser acopiado en predio del municipio	17 marzo del 2025 Sec. General y de gobierno Alcaldía de Tello- Huila

NOTA: el permiso reposa en el informe No. 2 del mes de marzo del 2025

18.6.1. Indicador

(0 m3 /0 m3 *100= 100% Siendo (Volumen de materiales de escombro excavación de cajeo dispuestos /Volumen de material de escombro generado *100 donde los valores > 100.

18.7. Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales y especiales

Como parte de las estrategias de gestión ambiental, se ha implementado un Punto Ecológico dentro de la obra, con el propósito de promover la separación adecuada de residuos y minimizar el impacto ambiental generado por las actividades laborales.

El punto ecológico se establece con el fin de:

- Facilitar la clasificación y disposición adecuada de los residuos generados en la obra.

- Fomentar la cultura de reciclaje y el manejo responsable de los desechos.
- Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental.
- Cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto a gestión de residuos.

El adecuado funcionamiento del **Puntos Ecológico** refleja el compromiso del consorcio con la **gestión ambiental sostenible**, promoviendo una cultura de responsabilidad ecológica dentro del entorno laboral.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

18.8. Registro fotográfico



18.9. Orden y Aseo

El mantenimiento del orden y aseo en el área de trabajo es fundamental para garantizar un ambiente seguro, eficiente y saludable dentro de la obra. Estas acciones permiten prevenir accidentes, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de las normas de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental.**

las jornadas de orden y aseo tienen como finalidad:

- prevenir accidentes laborales causados por desorden o acumulación de materiales.
- Mantener los diferentes frentes de trabajo organizados, facilitando la movilidad del personal y el almacenamiento adecuado de implementos de obra.
- Cumplir con normativas ambientales, promoviendo una correcta separación y disposición de residuos.

La entidad encargada de realizar la recolección de residuos es **EMPRESAS PUBLICAS DE TELLO (EPT)**

El compromiso con el **orden y aseo** no solo mejora la seguridad y eficiencia operativa, sino que también refuerza una cultura de prevención de riesgos y responsabilidad ambiental dentro de la empresa.

NOTA: La solicitud de recolección de residuos reposa en el informe No. 1 y el acta de conformación de brigada de orden y aseo fue actualizada para este periodo.

NOTA: Actualización Brigada de Orden y Aseo reposa en el informe N° 5 junio 2025 Anexo 14.

18.10. Registro fotográfico













19. GESTION RECURSO HIDRICO

19.1. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Para el periodo del mes de julio no contamos con baterías sanitarias.

20. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante la ejecución del proyecto, se ha dispuesto la instalación de infraestructura temporal para el soporte de las actividades constructivas, en cumplimiento con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental (DAGA).

El proyecto cuenta con un **campamento de obra debidamente establecido en el Tramo 17**, específicamente en el **sector de Los Guásimos**. Este campamento cumple la función de centro operativo para el personal técnico y operativo del proyecto, y se encuentra adecuadamente habilitado para apoyar las actividades constructivas en la zona.

20.1. Indicador

(2/2)*100 Número de acopios debidamente demarcados y señalizados / Número de acopios de material de obra

*100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

20.2. Manejo de maquinaria equipos y vehículos

El mantenimiento mensual de la maquinaria se basa en el **cambio de filtros y aceite cada 250 horas de operación**. Este procedimiento se realizará **en el sitio de trabajo**, con la excepción de las volquetas, cuyo mantenimiento se llevará a cabo en el taller correspondiente.

Para garantizar una adecuada gestión ambiental, los **aceites y filtros usados** serán recolectados en **recipientes específicos** y almacenados en **sitios adecuados** para su correcta disposición final, cumpliendo con las normativas ambientales vigentes y evitando la contaminación del entorno.

20.3. Registro de maquinaria del mes de junio

NOMBRE	CODIGO
Volqueta	OWH 749
Volqueta	OZD 276
Volqueta	OWH 442
Motoniveladora	710 A
Retro excavadora	CAT 320 CL
Vibrocompactador	CA 152
Finisher	Rodatec

NOTA: el anexo de este numeral reposa en el informe No.1 del mes de febrero del 2025.

20.4. Indicador

(3/3)*100 Número de volquetas con revisión tecno mecánica vigente / Número total de volquetas utilizadas en el mes. X 100 donde los demuestran que no fueron establecidos para este periodo.

21. GESTIÓN SOCIAL

21.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Huila entre el cruce de Villavieja (cucara) y la cabecera municipal de Tello, consiste en el mantenimiento del 5,33 kilómetro de vía en los sectores más deteriorados de la misma distribuidos en 25 tramos seleccionados previamente, de acuerdo a ales necesidades.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 5,33 km de pavimento flexible, donde se incluye el fresado de pavimento asfáltico, conformación de calzada, construcción de estructura de pavimento en base y sub base granular, mezcla densa en caliente MDC-19, riego de imprimación, construcción de filtros, fundición cunetas, muros en gaviones y líneas de demarcación para la señalización horizontal.

21.2. Proyecto de atención a la comunidad

El punto de atención al ciudadano se encuentra ubicado en el tramo 17 ubicado en el sector los guásimos, donde se atiende a la comunidad y personal de obra y los PQRS. De igual manera se recibe y atiende via correo electrónico para mayor facilidad.

El PAC se encuentra dotado por escritorios, sillas, computador, impresora, tableros, archivadores, todo esto con el fin de dar la mejor atención a la comunidad.

Para el mes de julio no se recibieron PQRS





21.3. Información y divulgación

Durante el mes de julio se realizó (1) socialización en el punto de atención al ciudadano, con presencia de veedurías, interventoría y contratista, donde se aclaran temas a la veeduría sobre los avances de obra las cuales se realizan en cumplimiento de los lineamientos y con el fin de promover la participación ciudadana y la transparencia en la ejecución del proyecto.

21.3.1. Indicador

(1/1)*100 Número reuniones programadas/ Nº de reuniones realizadas X100
donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador

21.4. Conformación de veedurías

Las **veedurías ciudadanas** son mecanismos de participación social que permiten a la comunidad hacer seguimiento, control y vigilancia a la gestión pública, especialmente en la ejecución de proyectos, obras y programas de interés colectivo. Su objetivo principal es garantizar la **transparencia, eficiencia y cumplimiento** de los recursos y acciones gubernamentales

Las veedurías conformadas para el proyecto son

VEEDURIA TRANSPARENCIA		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
DEICI ALEJANDRA GUTIÉRREZ TOBAR	26.585.822	PRESIDENTE
ADRIANA MARÍA DÍAZ	26.585.849	VEEDOR
JOSÉ VICENTE SOLANO VARGAS	12.126.709	VEEDOR

"VEEDURÍA CIUDADANA REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE FORTALECILLAS-TELLO		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
JESÚS ANTONIO TRUJILLO TOVAR	12.109.567	PRESNIDENTE
JAMITH SEFAIR GARCÍA	83.242.512	VICEPRESIDENTE
ARMANDO SÁNCHEZ MOSQUERA	83.243.590	SECRETARIO

VEEDURÍA SOCIAL POR TELLO		
NOMBRE	**C.C**	**CARGO**
OSCAR IVÁN MARTÍNEZ	83.242.784	N/A
JOSÉ EDGAR TELLO BERRIO	12.225.095	N/A
RAÚL CARDOZO RODRÍGUEZ	4.942.911	N/A

21.6. Contratación mano de obra

listado del personal contratado de la región para la ejecución del proyecto

PERSONAL DE LA ZONA			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**MUNICIPIO**
ANLLY ASTRRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Tello
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Tello
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Tello
SMITH SAMARA ESPINOSA VALDERRAMA	1.082.807.042	PALETERA	Tello
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Baraya
KELLYA YARETH MURCIA SOTO	1.075.296.777	AUXILIAR SST	Tello
ISIDRO MANJARRES VANEGAS	11.323.894	CELADOR	Tello
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Tello
YASMIN ROCIO MARTINES MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Tello
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Baraya
MILLER SANCHEZ	4.890.672	CONDUCTOR VOLQUETA	Fortalecillas
EDINSON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	Tello
EVERLEDETH REYES ROCHA	4.943.631	AYUDANTE	Tello

21.6.1. Indicador

(12/12)*100 Número de trabajadores contratados del área de influencia/por Número de trabajadores en obra x100% donde los valores > 100 demuestran el cumplimiento del indicador.

21.7. Perfil sociodemográfico

La caracterización sociodemográfica del personal que participa en el desarrollo del proyecto tiene como propósito identificar y comprender las condiciones sociales, culturales, educativas y de salud que pueden incidir directa o indirectamente en la gestión de los riesgos laborales y en el desempeño de las actividades. Esta información permite establecer estrategias más eficaces de intervención, promoción y prevención desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

la población trabajadora vinculada al proyecto presenta una composición diversa en términos de edad, nivel educativo, procedencia y condiciones de salud. Esta diversidad implica una responsabilidad institucional en la adopción de medidas de gestión del riesgo que consideren las características individuales y colectivas del recurso humano, priorizando estrategias de intervención ajustadas al perfil real de los trabajadores.

ANEXO 10. Perfil sociodemográfico "Actualizado".

ANEXO 1. INDUCCIONES SST

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Induccion SST.			
HORA	8:15 - 8:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	JAIRO PENAGOS	7.685.099	AYUDANTE	Jairo Penagos

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Pardomo Ibrty.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
TEMA	Induccion SST.			
HORA	8:15 - 8:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR VOLQUETA	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Horta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901705282 -7 FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	JPNTELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
TEMA	Induccion SST.				
HORA	8:15 - 8:25				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: Daniela Perdomo Ibla

Powered by CamScanner

ANEXO 2. EXAMENES DE INGRESO

COMPAÑÍA LÍDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S
NIT. 900.304.743-4
Dir: Cll 18 # 5a - 46 Barrio Quirinal
Cel: 318 291 7591
Neiva, Huila
E-mail: facturacionycartera@clipsalud.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

Nº 14.328

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DÍA	07 MES	2025 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MONTEALEGRE CESPEDES LORENZO	MASCULINO	45 AÑOS 0 MESES 22 DÍAS	CC (Tipo)	1079604610 (Número)

Cargo
AYUDANTE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA-	✓
VISIOMETRÍA	✓	PERFIL LIPIDICO -	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL		HABITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO		CONTROL DE PESO
VALORACIÓN POR EPS : MEDICO GENERAL Y OPTOMETRIA		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR.
-ALTERACION VISUAL NO CORREGIDA REQUIERE COPTICA POR OPTOMETRIA.
-REALIZAR CONTROL LIPIDICO POR MEDICO GENERAL EN EPS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mi en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

DRA. CAROLINA LOSADA ROJAS
MEDICA OCUPACIONAL
U. IBEROAMERICANA
LIC. 6969

Firma:

Nombre: CC: 1127625985 - CAROLINA LOSADA

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MONTEALEGRE CESPEDES LORENZO

COMPAÑÍA LÍDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S
NIT. 900.304.743-4
Dir: Cll 18 # 5a - 46 Barrio Quirinal
Cel: 318 291 7591
Neiva, Huila
E-mail: facturacionycartera@clipsalud.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

Nº 14.330

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
19 DIA	07 MES	2025 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
PENAGOS JAIRO	MASCULINO	59 AÑOS 6 MESES 5 DIAS	Tipo: CC	Número: 7685099

Cargo
AYUDANTE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
APTO CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

Observaciones: *ALTERACION VISUAL NO CORREGIDA*

N/A | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA-	✓
VISIOMETRÍA	✓	PERFIL LIPIDICO -	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR.

-REQUIERE CORRECION OPTICA POR OPTOMETRIA ALTUALMENTE NO CORREGIDO.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

DRA. CAROLINA LOSADA RENTA
MEDICO OCUPACIONAL
U. IBEROAMERICANA
T.P.C. 6899

Firma:

Nombre: CC: 1127625985 - CAROLINA LOSADA

Aspirante o Trabajador

RD 7685099

Firma:

Nombre: PENAGOS JAIRO

COMPAÑÍA LÍDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S
NIT. 900.304.743-4
Dir: Cll 18 # 5a - 46 Barrio Quirinal
Cel: 318 291 7591
Neiva, Huila
E-mail: facturacionycartera@clipsalud.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 14.640

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
24 DÍA	07 MES	2025 AÑO	NEIVA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
QUINTERO VARGAS OMAR	MASCULINO	67 AÑOS 8 MESES 8 DÍAS	CC (Tipo)	17627931 (Número)

Cargo
CONDUCTOR

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES PARA EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	GLICEMIA-	✓
VISIOMETRÍA	✓	PERFIL LIPIDICO-(Triglicéridos, Colesterol total, HDL, LDL)	✓
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : OTORRINO	USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HABITOS SALUDABLES CONTROL DE PESO HACER DEPORTE DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-MANTENER UN PESO SALUDABLE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EQUILIBRADOS Y ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR.

-SE RECOMIENDA REALIZAR AUDIOMETRIA CLINICA COMFIRMATORIA Y VALORACION POR OTORRINO EN EPS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

DRA. CAROLINA LOSADA PEÑA
MÉDICA OCUPACIONAL
U. IBEROAMERICANA
REG. 6890

Firma:

Nombre: CC: 1127625985 - CAROLINA LOSADA

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: QUINTERO VARGAS OMAR

ANEXO 3. EXAMENES DE EGRESO

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 21 de julio 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **FERNEY VICTORIA CHAVARRO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.075.236.051** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 19 de julio del 2025, en el cargo de **CONDUCTOR DE VOLQUETA** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

FERNEY VICTORIA CHAVARRO
C.C No. 1.075.236.051

Powered by CamScanner

INGEMAO M&A S.A.S.
Ingeniería Civil y Maquinaria Pesada

DESISTIMIENTO DE LA PRACTICA DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Neiva, 16 de julio 2025

Señores:
INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS

Asunto: Examen médico ocupacional de Egreso

Por medio de la presente Yo, **AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.075.225.724** expedida en Neiva, quien desempeño funciones hasta la fecha 15 de julio del 2025, en el cargo de **AYUDANTE** manifiesto que por voluntad propia y por razones ajenas a la empresa desisto a realizarme el examen médico de egreso y eximo de toda responsabilidad a la empresa INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

Cordialmente

Avicelvis Valderrama
AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR
C.C No. 1.075.225.724

Powered by CamScanner

ANEXO 4. AFILIACIONES

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

LORENZO MONTEALEGRE CESPEDES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.079.604.610,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 28 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JAIRO PENAGOS** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **7685099,** se encuentra afiliado/a desde **18/12/1995** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de julio de 2025.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Colpensiones
Dirección: Carrera 10 No.72 - 33 Torre B Piso 11, Bogotá D.C., Colombia Conmutador: (+57) 601 489 0909; Línea Gratuita: 01 8000 410909 www.colpensiones.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL CAQUETA

RESOLUCION NUMERO 54 DE 19

(07 III 1995)

Por medio de la cual se reconoce y paga una pensión mensual por Convención Colectiva de Trabajo a favor del señor OMAR QUINTERO VARGAS

EL GOBERNADOR DEL CAQUETA
en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

a) Que el señor OMAR QUINTERO VARGAS, con cédula de ciudadanía número 17.627.931 de Florencia (C), presentó solicitud para que sea reconocida y pagada a su favor una pensión mensual por Convención Colectiva de Trabajo, por haber laborado al servicio del Estado, por un período superior a los veinte años de acuerdo con la cláusula (18) y (10a) de las Convenciones Colectivas de Trabajo, celebrada entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales al servicio del Departamento del Caquetá "SINTRADEPARTAMENTALES CAQUETA" de los años de 1987 y 1988.

b) Que para justificar su pedimento, presenta el certificado de tiempo de servicio, el cual se distribuye así:

	A	M	D	T.D.
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Ultimo cargo: CONDUCTOR Del 07-II-75 al 30-II-95	20	-	-	7.200
Sub total	20	-	-	7.200
Después de 20 años Del 02-II-95 al 07-III-95	-	-	22	22
Total	20	-	22	7.222

c) Que al momento de presentar la solicitud se encontraba legalmente [illegible] años y la Caja de Previsión Social Departamental del Caquetá.

d) Que para acreditar su edad, acompaña registro civil de nacimiento [illegible] 31 años de edad, razón por la cual y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 33 de 1985, la Caja [illegible] Departamental del Caquetá, no puede entrar a pensionarlo

32

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL CAQUETA

RESOLUCION NUMERO 5[illegible] DE 19

(07 JUN 1985)

Por medio de la cual se reconoce y paga una pensión mensual [illegible]

a) Que en las cláusulas 3a y 18 de las Convenciones Colectivas de Trabajo de 1977 y 1983 celebradas entre el Departamento del Caquetá y SINTRADEPARTAMENTALES CAQUETA, acordaron que: "A partir del 1º de enero de 1977, la Intendencia Nacional del Caquetá, pensionará a los trabajadores oficiales que tengan más de cinco (5) años continuos o discontinuos y que hallándose al servicio de la Intendencia cumplieran veinte años al servicio de Entidades oficiales de los señalados en el Decreto 1848 de 1969, sin tener en cuenta su edad;

b) Que de conformidad en lo pactado en la cláusula 18 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1983, el causante esta en el derecho de pedir al Departamento del Caquetá, el pago de la totalidad de la pensión.

c) Que según se desprende del certificado de tiempo, jornales, primas causadas y percibidas por el peticionario, se puede computar el promedio devengado en el último año de servicio, lo mismo que en su pensión de la siguiente manera:

	1984 (1º-III-a31-XII)	1985 (1º-I-a 25-II)
JORNAL	$2'347.700=	781.062=
PRIMA ALIMENTACION	166.040=	30.995=
AUXILIO TRANSPORTE	93.710=	22.676=
PRIMA NAVIDAD	332.680=	91.497=
PRIMA SERVICIO	354.140=	265.552=
PRIMA VACACIONES	-0-	717.469=
PRIMA NAVIDAD	-0-	666.716=
PRIMA MOVIL	90.975=	105.678=
AUXILIO MOVIL	6.915=	-0-

TOTAL DEVENGADO EN EL AÑO $6'948.560,00

c) [illegible] de la cláusula 18a de la Convención Colectiva de Trabajo de 1983 se acordó que "todos los trabajadores al servicio del Departamento del Caquetá que reunan la documentación para disfrutar de [illegible] tendrán derecho a una [illegible] de acuerdo con lo percibido [illegible] remuneración"

[illegible] Convención Colectiva de Trabajo del [illegible]

ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase:	5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C7685099	PENAGOS JAIRO	22/07/2025		5910o146	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 11:56:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.37.4, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL HUILA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1079604610	MONTEALEGRE CESPEDES LORENZO	22/07/2025		139K2024	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2025 11:58:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.158.248.29, 198.143.37.4, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 28/07/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9079134	28/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	7685099	JAIRO PENAGOS	1423500	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2025-07-22

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 28/07/2025, el empleador INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS identificado con NIT número 901759608 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9079202	28/07/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1079604610	LORENZO MONTEALEGRE CESPEDES	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-07-22

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar
NIT 830.003.564-7

9012200317

No. de Radicación CAT: 29558630

Fecha de Radicación: 28 07 2025

I. DATOS DEL TRAMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Contribución solidaria	5. Tipo de afiliado	6. Tipo de cotizante	7. Código
B. Traslado X	A. Cotizante X	A. Contributivo X		A. Cotizante X	A. Dependiente X	

II. A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

3. Apellidos y nombres					
QUINTERO	VARGAS	OMAR			

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	13. Nacionalidad
CC	17627931	Masculino X		

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento		
				14	11	1957

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBEN	20. Clasificación SISBEN	21. Grupo de población especial
		SI NO X	SI NO		

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa contribución solidaria
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA		$1.423.500	

26. Residencia

Cabecera Municipal | Resto Urbano | Centro Poblado | Rural Disperso

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres					

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	32. Nacionalidad
		Masculino		

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. Apellidos y nombres	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
01								
02								
03								
04								
05								

Datos complementarios del beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBEN	48. Clasificación SISBEN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
01								
02								
03								
04								
05								

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio / Distrito	Zona	Cabecera Municipal	Resto Disperso	Centro Poblado	Rural	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional
01									
02									
03									
04									
05									

	Dirección	Localidad / Comuna	Correo electrónico
01			
02			
03			
04			
05			

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

54. Código de la IPS (a diligenciar por la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social: **INGENIERIA Y EQUIPOS M Y A SAS**

56. Tipo de documento de identificación: **NT**

57. Número del documento de identificación: **901759608**

58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a diligenciar por la EPS)

59. Ubicación: **CR 7 4 34** — **31252339** — **NEIVA** — **HUILA**

II. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad: [illegible] ... 9. Inicio de relación laboral [illegible] **X**

10. [illegible] 11. Inscripción EPS retorno al país 12. [illegible]

[illegible] 14. [illegible] Régimen Contributivo 15. Régimen Subsidiado

[illegible] 17. Reporte del trámite de protección al cesante

[illegible] 19. Reporte de la calidad de Pensionado 20. [illegible] Solidaria 21. Retiro de Contribución Solidaria

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 62. Sexo biológico (Femenino / Masculino) | 63. Sexo identificación | 64. Fecha de nacimiento

65. EPS anterior | 66. Fecha de novedad: **25 07 2025** | 67. Motivo de traslado — Código | 68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales

70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción

71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios

72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud

73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto

77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.

78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas de Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisben vigente

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Apellidos y nombres

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad

IX. FIRMAS

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad — TOTAL ANEXOS

[illegible]

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial — Código del municipio — Código del departamento

93. Nombre de la institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 95. Firma del funcionario

96. Fecha de radicación | 97. Fecha de validación

OBSERVACIONES:

CARGO: CONDUCTOR VOLQUETA

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

ANEXO 5. SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901765282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698907949	9490279439	E	2025/08/22	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,111,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO (12 Afiliados)						$23,394,000	$1,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						$23,394,000	$1,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
Ciudad: TELLO Depto: HUILA (12 Afiliados)						$23,394,000	$1,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0
1	CC	1082804794	ALDANA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,600	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	12101945	CUBIDES AURELIO		0	$0	$0	EPS085	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	1075242622	GALLEGO HANER	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
4	CC	93129615	GUZMAN JOAQUIN	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF32	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
5	CC	1082804610	LOPEZ ANELLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1082803924	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	12138187	MEJIA CLAUDIO	231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
8	CC	26586026	OLIVEROS MAGALY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	1078778338	PERDOMO DANIELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
10	CC	1075244303	PERDOMO EDGAR	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	19105846	RUBIO HECTOR		0	$0	$0	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1079184726	SALAS NASLY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					$23,394,000	$1,743,200			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$1,168,000			$29,194,000	$2,032,100		$0	$0

2025/08/14 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185282	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO	CALLE 104 No 14A 45 OF 401	TELLO-HUILA	2150482	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698907949	9490279439	E	2025/08/22	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	$8,111,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,743,200	$0	$0	$3,743,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,395,400	$0	$0	$2,395,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$2,032,100	$0	$0	$2,032,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,168,000	$0	$0	$1,168,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$652,000	$0	$0	$652,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$459,000	$0	$0	$459,000
TOTAL				12	$8,111,300	$0	$0	$8,111,300

2025/08/14 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901179608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 4 54	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	17008981157	9490300214	E	2025/08/05	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	9	$9,094,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$2,724,100	$435,700			$4,722,900	$189,000			$4,722,900	$189,000			$4,722,900	$248,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)					$1,298,800	$207,900			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$6,800		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,298,800	$207,900			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$52,000			$1,298,800	$6,800		$0	$0
1	CC	1029686078	BUSTOS ANA	25-14	24 $1,298,800	$207,900	EPS005	24	$1,298,800	$52,000	CCF32	24	$1,298,800	$52,000	14-11	24	$1,298,800	$6,800	24	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$236,300		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$137,000			$3,423,500	$236,300		$0	$0
2	CC	12121406	FERREIRA JOSE		0 $0	$0	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	5854062	GUTIERREZ FERMIN	230201	30	$1,423,500	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA TELLO (25 Afiliados)					$26,698,734	$4,015,200			$28,521,234	$1,141,500			$26,634,234	$1,074,000			$28,521,234	$1,715,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS TELLO (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
4	CC	1003811875	CHARRY KIMBERLY	231001	30 $1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS MAQUINARIA TELLO (9 Afiliados)					$11,333,334	$1,813,400			$13,340,384	$533,700			$11,653,334	$466,200			$13,340,384	$811,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (9 Afiliados)					$11,333,334	$1,813,400			$13,340,384	$533,700			$11,653,334	$466,200			$13,340,384	$811,500		$0	$0
5	CC	85449283	DE LUQUE JAVIER	25-14	30 $2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
6	CC	1075252102	DIAZ JESUS	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
7	CC	4898798	OSPINA LUIS	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
8	CC	83253181	QUINTERO LUNIO	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	17627931	QUINTERO OMAR		0	$0	EPS017	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-11	6	$320,000	$22,300	6	$0	$0
10	CC	7712983	ROJAS DIEGO	231001	6	$320,000	$51,200	EPS037	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-11	6	$320,000	$22,300	6	$0	$0
11	CC	1082215917	ROJAS GUSTAVO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC	4890672	SANCHEZ MILLER		0	$0	$0	EPS037	26	$1,687,050	$67,500	CCF32	0	$0	$0	14-11	30	$1,687,050	$0	0	$0	$0
13	CC	1075236051	VICTORIA FERNEY	25-14	19	$1,013,334	$162,200	EPS037	19	$1,013,334	$40,600	CCF32	19	$1,013,334	$40,600	14-11	19	$1,013,334	$70,600	19	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS TELLO (13 Afiliados)					$11,957,400	$1,913,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$931,900		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)					$11,957,400	$1,913,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$535,800			$13,380,900	$931,900		$0	$0
14	CC	1075285580	ALVAREZ MELTON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	12131447	ARCOS JOSE	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
16	CC	1006528347	JIMENEZ MOLMAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
17	CC	1075305073	MANIOS JUAN	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
18	CC	17667482	MEDINA ARCENIO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1082866583	MENDEZ EDINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	1079604619	MONTEALEGRE LORENZO	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
21	CC	7685099	PENAGOS FAIRO	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF32	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
22	CC	83242741	QUINTERO SAUL	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	4943631	REYES EVERLEDETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	83242768	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1075225724	VALDERRAMA AVICELVIS	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC62	15	$711,750	$28,500	CCF32	15	$711,750	$28,800	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1003801176	VALDERRAMA DIEGO	230305	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$27,813,034	$4,450,900			$33,243,584	$1,330,500			$31,556,534	$1,263,000			$33,243,584	$1,997,900		$0	$0

2025/08/15 08:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759608	4	INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 7 # 34	NEIVA-HUILA	3143131943	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1700898157	9490300214	E	2025/08/05	2025/08/14	BANCO DE BOGOTA	9	$9,094,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,450,900	$25,500	$0	$4,476,400
COLFONDOS	231001	800.227,940	6	5	$1,175,000	$6,700	$0	$1,181,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,169,700	$6,700	$0	$1,176,400
PORVENIR	230301	800.224,808	8	8	$1,298,600	$7,400	$0	$1,306,000
PROTECCION	230201	800.229,739	0	3	$807,600	$4,700	$0	$812,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,997,900	$11,400	$0	$2,009,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,997,900	$11,400	$0	$2,009,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,263,000	$7,200	$0	$1,270,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180,008	2	26	$1,263,000	$7,200	$0	$1,270,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,330,500	$7,800	$0	$1,338,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$28,500	$200	$0	$28,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$69,800	$400	$0	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$596,900	$3,500	$0	$600,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$136,800	$800	$0	$137,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$498,500	$2,900	$0	$501,400
TOTAL				26	$9,042,300	$51,900	$0	$9,094,200

2025/08/15 08:34 AM

ANEXO 6. REGISTRO DE ASISTENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNTELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	1 - Julio - 2025.				
TEMA	Inspección Preoperacional de Herramientas.				
HORA	7:10 - 7:25.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNIELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.031	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.076.225.724	AYUDANTE	
26	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7 FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	2 - Julio - 2025.				
TEMA	Hidratación adecuada durante la Jornada.				
HORA	7:15 - 7:25				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.595.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly M. Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1 082 215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNIELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.683	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.075.225.724	AYUDANTE	
26	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN IELLO
NIT. 901785287 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN IELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	3 - Julio - 2025.			
TEMA	Uso Correcto de Epp. (Elementos de protección p)			
HORA	7:05 - 7:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.822	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.589.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890872	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.656.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Mar
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly M salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	WILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNIELLO

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.002.006.683	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	AVICELVIS VALDERRAMA SALAZAR	1.076.225.724	AYUDANTE	
26	DIOGENES YUGUMA	4.697.316	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	4 - Julio - 2025.			
TEMA	Reporte Condiciones inseguras y actos inseguros.			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.075.779.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.595.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martin
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	5 - Julio - 2025.			
TEMA	Orden y Aseo. en los puestos de trabajo			
HORA	7:15 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Alda
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.075.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quin
10	MILLER SANCHEZ	4890872	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.696.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio M
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082 215 917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785262 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	7 - Julio - 2025.			
TEMA	Respeto y Sana Convivencia			
HORA	7:05 - 7:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.772.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890572	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.598.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	WILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

JPN TELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	2 - 3/12/2025			
TEMA	Riesgo Psicosocial			
HORA	7:15 - 9:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	1
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.822	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO CUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.062.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	28.566.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.062.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.075.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890872	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHEZ	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.596.795	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Osp
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCAVADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCAVADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.178	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPM TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPM TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	9- Julio - 2025.			
TEMA	Reporte de Incidentes -			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.698.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082 215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	10 - Julio - 2025				
TEMA	Calestenia - Recomendaciones				
HORA	7:15 - 7:25.				
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X.	
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.810	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.238	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.696.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	11 - Julio - 2025			
TEMA	Ergonomía			
HORA	7:15 - 7:25 .			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890872	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.696.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly M. Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901765382 -7

JPN TELLO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 12 - Julio - 2025.

TEMA: Reunión de actividades cotidianas.

HORA: 7:15 - 7:35.

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN | CHARLA SEGURIDAD: X
DIFUSIÓN | SENSIBILIZACIÓN

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HAMER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.822	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ARLEY Y ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.904.819	PALETERA	
6	MARIAN Y OLIVEROS SOTTO	26.595.926	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.304.764	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.073.771.329	PROFESIONAL SST	
9	LUMBO QUINTERO POLANIA	92233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4930572	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.758	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.546.756	OPE VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.245.323	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	MARLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.073.154.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.223	OPE MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCAVADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCAVADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFICIAL	
21	WILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.265.560	OFICIAL	
22	HOLMAN JIMENEZ DIAZ	1.066.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	14 - Julio - 2025				
TEMA	Recolección de Residuos Ambiental				
HORA	7:15 - 7:25.				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	María Aldana.
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.339	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.598.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocío Martínez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesús David Díaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901765282 -7	JPN ELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	15 - Julio - 2025.			
TEMA	Exceso de Continuidad Laboral			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly López
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Olivero S.
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN HELLO
NIT 901784282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPNHELLO

STRO DE ASISTENCIA

IA 10 JUL 2025.

Pausas Activas - Recomendaciones SST

7:15 - 7:25.

DE ACTIVIDAD

CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
JANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Recado T. S.
LUIS CARLOS OSPINA	4.598.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	17 - Julio - 2025			
TEMA	Diferencia Peligro y Riesgo.			
HORA	7:15 - 7:25.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.845	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.779.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	Lunio Quintero
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.695.795	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Nasly Melisa Salas
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Yasmin Rocio Martinez
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.285.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	18 - JULIO - 2025.			
TEMA	Socialización Nuevo Horario			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.779.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.560	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	19 - Julio - 2025.			
TEMA	Pausas activas + Recomendaciones			
HORA	2:15 - 2:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.848	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.339	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890572	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.698.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.245.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.526.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785247 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	21 - Julio - 25.			
TEMA	Prevención de Riesgos Específicos del Entorno			
HORA	7:15 - 7:20.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	NAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Nagaly Olivero Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.075.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.896.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G.
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785262 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	22 - Julio -25			
TEMA	Contaminación Atmosferica			
HORA	7:15 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anlly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto.
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.328	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.698.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez.
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082 215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INTRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	23 - Julio - 25			
TEMA	Seguridad vial.			
HORA	7:11 - 7:25			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	✓
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.079.778.329	PROFESIONAL SST	Daniela Perdomo H
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo S
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.598.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.295.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	24. julio - 2025			
TEMA	Accidente e incidente de trabajo.			
HORA	7:15 - 7:26			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	Anilly Lopez
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	Daniela P. H.
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.696.756	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas S.
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785287 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

TRO DE ASISTENCIA	
N	25 - Julio - 2025.
	Proteccion del Sedentarismo
	8:00 am. a. 8:15 am
DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN ☐ CHARLA SEGURIDAD ☐
	DIVULGACIÓN ☐ SENSIBILIZACIÓN ☐

OMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
URELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
IANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
ECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
OAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
NILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.810	PALETERA	Anlly Lopez
MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.588.028	PALETERA	Magaly Oliveros Sotto
MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana.
ANIELA PERDOMO HORTA	1.078.779.338	PROFESIONAL SST	Daniela P.H
LINIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
MILLER SANCHEZ	4890672	CONDUCTOR	
RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	Ricardo J. S.
LUIS CARLOS OSPINA	4.596.796	OPE. VIBRO COMPACTADOR	Luis Carlos Ospina
EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
NABLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nably Melisa salas.
FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	Jesus David Diaz G
GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.560	OFCIAL	
HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.526.347	AYUDANTE	

OMAR ADOLFO VARGAS 17627931 F.

DIEGO FERNANDO DIAZ 77298

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 - 7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	26-07-2025.			
TEMA	Clasificación de Residuos			
HORA	8:00 am - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	✓
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANILLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.779.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNID QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	MILLER SANCHEZ	4890572	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.696.793	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	FERNEY VICTORIA CHAVARRO	1.075.236.051	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1 082 215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	HOLMAN JIMÉNEZ DIAZ	1.006.528.347	AYUDANTE	

Omar Quintero V 1069731 conductor

1 1890721 Nara Hfo 771291.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	JOSE LIBARDO ARCOS GUEVARA	12.131.447	AYUDANTE	
26	JUAN DAVID MOSQUERA	1.075.309.073	AYUDANTE	
27	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
28	DIOGENES YUCUMA	4.697.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901785282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA				
FECHA	28 - 07 - 2025			
TEMA	Calentamiento - Recomendaciones SST			
HORA	8:00 am - 8:15.			
TIPO DE ACTIVIDAD	**CAPACITACIÓN**		**CHARLA SEGURIDAD**	X
	DIVULGACIÓN		**SENSIBILIZACIÓN**	

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.686.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	Maria Aldana
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	Yasmin Rocio Martinez
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	Nasly Melisa Salas.
16	DIEGO FERNANDO ROJAS	7.712.983	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.580	OFCIAL	
22	JAIRO PENAGOS	7.685.099	AYUDANTE	Jairo penagos

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901785282 -7	JPN TELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	JOSE LIBARDO ARCOS GUEVARA	12.131.447	AYUDANTE	
26	JUAN DAVID MOSQUERA	1.075.309.073	AYUDANTE	
27	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
28	DIOGENES YUCUMA	4.897.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO
NIT. 901705282 -7

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

JPN TELLO

REGISTRO DE ASISTENCIA					
FECHA	29 - 01 - 2025.				
TEMA	Habitos y Estilos de vida Saludable				
HORA	8:00 am. a 8:15				
TIPO DE ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN		CHARLA SEGURIDAD	X	
	DIVULGACIÓN		SENSIBILIZACIÓN		

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	AURELIO CUBIDES RODRIGUEZ	12.101.945	ING. RESIDENTE	
2	HANER ALBERTO GALLEGO MEJIA	1.075.242.622	TOPOGRAFO	
3	HECTOR RUBIO DIAZ	19.105.846	CADENERO 2	
4	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	93.129.015	CADENERO 1	
5	ANLLY ASTRID LOPEZ VEGA	1.082.804.610	PALETERA	
6	MAGALY OLIVEROS SOTTO	26.586.026	PALETERA	
7	MARIA EDITH ALDANA HOYOS	1.082.804.794	PALETERA	
8	DANIELA PERDOMO HORTA	1.078.778.338	PROFESIONAL SST	
9	LUNIO QUINTERO POLANIA	83233181	CONDUCTOR	
10	OMAR QUINTERO VARGAS	17.627.931	CONDUCTOR	
11	RICARDO JAVIER SANCHES	83.242.768	AYUDANTE	
12	LUIS CARLOS OSPINA	4.898.798	OPE. VIBRO COMPACTADOR	
13	EDGAR MAURICIO PERDOMO	1.075.246.303	ING. RESIDENTE	
14	YASMIN ROCIO MARTINEZ MEDINA	1.082.803.924	PALETERA	
15	NASLY MELISA SALAS SANCHEZ	1.079.184.726	PROFESIONAL SST	
16	DIEGO FERNANDO ROJAS	7.712.983	CONDUCTOR	
17	JAVIER JESUS DE LUQUE CABARCA	85.449.283	OPE. MOTONIVELADORA	
18	JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ	1.075.252.102	OPE.RETRO EXCABADORA	
19	GUSTAVO ADOLFO ROJAS VARGAS	1.082.215.917	OPE.RETRO EXCABADORA	
20	DIEGO ARMANDO VALDERRAMA	1.003.801.176	OFCIAL	
21	MILTON ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	1.075.205.560	OFCIAL	
22	JAIRO PENAGOS	7.665.090	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO NIT. 901765282 -7	JPNTELLO
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

23	EDISON MENDEZ PERDOMO	1.082.806.583	AYUDANTE	
24	EVERLEDETH REYES ROCHA	4'943.631	AYUDANTE	
25	JOSE LIBARDO ARCOS GUEVARA	12.131.447	AYUDANTE	
26	JUAN DAVID MOSQUERA	1.075.309.073	AYUDANTE	
27	LORENZO MONTEALEGRE	1.079.604.610	AYUDANTE	
28	DIOGENES YUCUMA	4.697.318	OPE. MINICARGADOR	

FIRMA PROFESIONAL SST: _____

NOMBRE: _____

Powered by CamScanner

ANEXO 7. INSPECCION PREOPERACIONAL

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3 - Julio - 2025 | Operador: Jon Mayl.

Código Equipo: RODILLO. | Marca y Serie: RP - 190 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silln del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

EQUIPO DE SEGURIDAD	B	M	N/A
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina	X		
Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765262 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4 - Julio - 2023 | Operador: Juan M y M.

Código Equipo: Rodillo | Marca y Serie: Dd - 110 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horómetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Eviteso amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5 - Julio - 2025		Operador: Thon Myt.	
Código Equipo: EXCAVADORA	Marca y Serie: KO - 190	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X	Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste			X	Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible			X	Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores			X	Ruedas Tenseras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin		X		Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN BELLO

NIT. 901785282 -7

JPN BELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16 - Julio - 2025 | Operador: Jhon YM Y M

Código Equipo: Grúa Pluma 45 TON | Marca y Serie: RR - 140 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillìn del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD Extintor y botiquin			X
SEGURIDAD Silla de la cabina		X	
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	D	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pomos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Sillelas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas	X	
Fuga Aceite Motor	X	
Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN 0110

NIT. 901285282 - 1

JPN ELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 29 - Julio - 2021 | Operador: Sr. Mario

Código Equipo: Minicargador | Marca y Serie: [illegible] | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horómetro o contador de kms.			X
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL.	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Eviteas amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que este tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN BELLO

JPN BELLO

NIT. 901705282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 25 - Julio - 25 | Operador: Jhon M. Y M.

Código Equipo: Pavimentadora | Marca y Serie: Dp - 190 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y boliquin		X	
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servicio			X
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN ELLO

NIT. 901705282 -7

JPN ELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 26 - Julio - 2024 | Operador: Shn MYM

Código Equipo: Pisha | Marca y Serie: KZC - 190 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin		X	
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante	X	
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas	X	
Fuga Aceite Motor	X	
Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: *El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.*

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor d Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901285282-7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 21 / Ene / 2021 | Operador: Juan Reyes

Código Equipo: EXCAVA | Marca y Serie: CAT 320 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Cerraduras de desgaste			X
Vidrios, Espejos Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horometro e contador de kms.	X		
Silin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y tuas	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que este tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN ELLO

NIT. 901786282 -7

JPN ELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 30 - 29/10 - 2023 | Operador: Jhon Ayala

Código Equipo: RODILLO | Marca y Serie: Dp - 130 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura			X
Elementos de desgaste			X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible			X
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillìn del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
EGURIDAD Extintor y botiquin		X	
EGURIDAD Silla de la cabina	X		
EGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR | NOMBRE PROFESIONAL SST | FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO IBERAL ESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

VLA Tello

OWL 149 — 1988. — Lunes Quintero. — 83 253 181.

SEMANA DEL 1 AL 5 DE Julio 24.

	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES MA	MARTES B	MARTES M	MARTES MA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES MA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES MA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES MA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO MA	OBSERVACIONES
	A. INSPECCIÓN EXTERIOR DEL VEHÍCULO										X									
1					X						X						X			
2					X						X						X			
3							X						X					X		
4					X						X						X			
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5					X						X						X			
6					X						X						X			
7					X						X						X			
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido				X						X						X			
9	Estado y tensión de correas				X						X						X			
10	Estado y sujeción de las mangueras.				X						X						X			
11	Sin fugas de fluidos				X						X						X			
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				X						X						X			
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alfombra y pintura				X						X						X			
14	Estado de las puertas				X						X						X			
15	Espejo retrovisor				X						X						X			
16	Vidrio parabrisas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				X						X						X			
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas				X						X						X			
18	Estado general del basculante				X						X						X			
19	Compuerta				X						X						X			
20	Sistema de fijación de volquete				X						X						X			
21	Bastidor				X						X						X			
22	Capa de protección de la carga				X						X						X			
	F. PARA SER LA VOLQUETA																			
23	Extintor de seguridad en todos los asientos				X						X						X			
24	Luz de Cabina				X						X						X			
25	Cinturón de seguridad en todos los asientos				X						X						X			
26	Pito y alarma de reversa				X						X						X			
	G. LLANTAS Y RUEDAS																			
27	Tuercas				X						X						X			
28	Llantas				X		X				X		X				X		X	
29	Estado				X						X						X			
	FIRMA DEL CONDUCTOR	SI		NO																
	NOMBRE COMPLETO	Lunes Quintero.																		
	REVISADO POR: PROFESIONAL SST																			
	FIRMA																			
	OBSERVACIONES																			

Powered by CamScanner

CONSORCIO RURAL ESTRUCTURA JPR TELLO

JPR TELLO

INSPECCION PRE OPERACIONAL TELLO

SEMANA DEL 7 AL 12 DE 09 2025.

VOLQUETE VOLVO FH 440 — MODELO 1988 — CONDUCTOR Luis Quiroz — PLACA C3. 233 181

INSPECCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
Tarjeta de propiedad del vehículo	X			X			X						X						
SOAT (Seguro obligatorio de accidentes de tránsito)	X			X			X						X						
Revisión de gases		X			X			X							X				
Revisión técnico mecánica de vehículos (Vigente) (Si aplica)	X			X			X						X						
B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
Licencia de conducción (Vigente) (Si aplica)	X			X			X						X						
EPS, ARP, AFP	X			X			X						X						
Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X			X						X						
C. ESTADO MECÁNICO																			
Niveles de fluido	X			X			X						X						
Estado y tensión de correas	X			X			X						X						
Estado y sujeción de las manguetas	X			X			X						X						
Sin fugas de fluidos	X			X			X						X						
Estado y sujeción de la batería (bornes, cables)	X			X			X						X						
D. PARTE EXTERNA																			
Estado general de la carrocería y pintura	X			X			X						X						
Estado de las puertas	X			X			X						X						
Espejo retrovisor	X			X			X						X						
Vidrio parabrisas (ventanas) (Sin roturas / manchas / distorciones / No polarizados)																			
E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
Copetes y grapas	X			X			X						X						
Estado general del volqueta	X			X			X						X						
Compuerta	X			X			X						X						
Sistema de levante de volqueta	X			X			X						X						
Gatillo	X			X			X						X						
Carga de proporción de la carga	X			X			X						X						
F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
Cinturón de seguridad en buen estado	X			X			X						X						
Llanta	X			X			X						X						
Tuercas de la llanta en buen estado	X			X			X						X						
Extintor (Presión / Fecha vencimiento)	X			X			X						X						
Botiquín	X			X			X						X						
G. EQUIPO DE PROTECCIÓN																			
Casco	X			X			X						X						
Botas	3			X			X						X						
Guantes	9			X			X						X						

LA VOLQUETA ES OPERATIVA: SI Luis Quiroz NO

FIRMA CONDUCTOR

REVISADO POR: PROVISIONAL SST

FIRMA:

DIRECTORES

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPNTELLO

INSPECCION PRE OPERACIONAL TELLO

PLACA: C4H749. | PUESTO: 1 1488.

CONDUCTOR: LUNA Ramirez.

FECHA: 21/08/2025

KILOMETRAJE: 93233181.

ITEM	DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SABADO B	SABADO M	SABADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Vigente y disponible en el vehículo)	X						X						X						
2	SOAT y Seguro Extracontractual (Vigente y disponible en el vehículo)	X						X						X						
3	Identificación de cargo		X						X						X					
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X						X						X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min.	X						X						X						
6	EPS- ARP-AFP	X						X						X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X						X						X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X						X						X						
9	Estado y tensión de correas	X						X						X						
10	Estado y sujeción de las manguera	X						X						X						
11	Sin fugas de fluidos	X						X						X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X						X						X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alcneria y pintura	X						X						X						
14	Estado de las puertas	X						X						X						
15	Espejo retrovisor	X						X						X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X						X						X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X						X						X						
18	Estado general del volquete	X						X						X						
19	Compuerta	X						X						X						
20	Sistema de levanta de volquete	X						X						X						
21	Bandidor	X						X						X						
22	Carpa de protección de la carga	X						X						X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cantón de seguridad en todos los ejes/ejes	X						X						X						
24	Luz de cabina	X						X						X						
25	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X						X						X						
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)	X						X						X						
27	Pito y sonido de reversa	X						X						X						
	E. EQUIPO DE PROTECCIÓN																			
28	Casco, botas, dos tapabocas de carnaza en buen estado, Una bata para trabajo	X						X						X						
29	Botiquín	X						X						X						
30	Extintor	X						X						X						
31	**LA VOLQUETA ES OPERATIVA**	SI		NO																
	FIRMA CONDUCTOR																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA

CONVENCIONES

B. Bueno	M. Malo	Mal. No op

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN HELLO

NIT: 901295362-1

JPN HELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL HELLO

UNIDAD: Hyd Hello. | SEMANA DEL: 21 al 26 de 09 2025

PLACA: 910276. | MODELO: 1983. | MARCA: | KILOMETRAJE:

CONDUCTOR: Luis Quintero | CEDULA:

ITEM	DESCRIPCION	LUNES D	LUNES M	LUNES NA	MARTES D	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES D	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES D	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES D	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO D	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO																			
1	Licencia de tránsito (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X						X						
2	(SOAT) Seguro Extracontractual (Legible y disponible en el vehículo)	X			X			X						X						
3	Manifiesto de carga	X			X			X						X						
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)	X			X			X						X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min	X			X			X						X						
6	EPS- ARP-AFP	X			X			X						X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)	X			X			X						X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X			X						X						
9	Estado y tensión de correas	X			X			X						X						
10	Estado y sujeción de las mangueras.	X			X			X						X						
11	Sin fugas de fluidos	X			X			X						X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X			X						X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alomería y pintura	X			X			X						X						
14	Estado de las puertas	X			X			X						X						
15	Espejo retrovisor	X			X			X						X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	X			X			X						X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X			X						X						
18	Estado general del volqueta	X			X			X						X						
19	Compuerta	X			X			X						X						
20	Sistema de levante de volqueta	X			X			X						X						
21	Bastidor	X			X			X						X						
22	Carpa de protección de la carga	X			X			X						X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos	X			X			X						X						
2	Luz de cabina	X			X			X						X						
24	Llantas (Sin cortaduras, sin abultamientos)	X			X			X						X						
27	Luces (Frontales - De posición - Traseras - De parqueo - De reversa)	X			X			X						X						
28	Pito y alarma de reversa	X			X			X						X						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
29	Cinta, Cuerda, dos señales de carretera en forma de triángulo, Dos tacos para bloqueo		X			X			X						X					
30	Extintor	X			X			X						X						
31	LA VOLQUETA ES OPERATIVA	SI			SI			SI						SI						
	CINTA CUARENTA																			
	NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA LA OPERACIÓN																			

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA:

CONVENCIONES

B: Bueno	M: Malo	NA: No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO FEDERAL ESTRUCTURA APPELLO

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DIARIA

Jarvey. Jello

OWI1442.

FECHA 7 / 12 / 04 2025

10 25 230.057

	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
		B	R	NA	B	R	NA	B	R	NA	B	R	NA	B	R	NA	B	R	NA	
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO																			
1	Tarjeta de propiedad del vehículo	X			X			X						X						
2	SOAT	X			X			X						X						
3	Revisión técnico mecánica (vigente)		X			X			X						X					
4	Seguro de responsabilidad civil extracontractual (vigente)	X			X			X						X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (vigente) Cat. 3 mín	X			X			X						X						
6	EPS y ARL	X			X			X						X						
7	Examen médico ocupacional (vigente)	X			X			X						X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido	X			X			X						X						
9	Estado y presión de llantas	X			X			X						X						
10	Estado y sujeción de las mangueras	X			X			X						X						
11	Sin fugas de fluidos	X			X			X						X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)	X			X			X						X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alfombra y pintura	X			X			X						X						
14	Estado de las puertas	X			X			X						X						
15	Espejo retrovisor		X			X			X						X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No pelizcados)	X			X			X						X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas	X			X			X						X						
18	Estado general del volquete	X			X			X						X						
19	Compuerta	X			X			X						X						
20	Sistema de levante de volqueta	X			X			X						X						
21	Bastidor	X			X			X						X						
22	Cargo de protección de la carga	X			X			X						X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cumple con seguridad en todos los sentidos	X			X			X						X						
24	Cuerpo / Cabina	X			X			X						X						
25	Tanques / Compartimentos / Cilindros / Ejes	X			X			X						X						
26	Luces: Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	X			X			X						X						
27	Llantas y aros de repuesto	X			X			X						X						
	G. CABINA DE SUPERVISIÓN																			
28	Cinturón de seguridad (Verificar anclajes, hebillas y pretensor)	X			X			X						X						
29	Radio	X			X			X						X						
30	Extintor	X			X			X						X						
	H. VISTO BUENO SUPERVISOR																			
	Firma																			

B: BUENO R: REGULAR NA: NO APLICA

FIRMA

CONVENCIONES

Powered by CamScanner

JPM FELLO

Via Tello
OWH 447.
Fierro.

14 - 11 - 07 2025

1075 236 051

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
	B	M	MA	B	M	MA	B	M	MA	B	M	MA	B	M	MA	B	M	MA
A. DOCUMENTACION																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
		X			X						X						X	
	X			X						X						X		
B. IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
C. ESTADO MECÁNICO																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
D. PARTE EXTERNA																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
		X			X						X						X	
	X			X						X						X		
E. CARROCERÍA VOLQUETA																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
F. PARTES DE LA VOLQUETA																		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		
	X			X						X						X		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL TELLO

JPNTELLO

LUGAR: Vía Tello
PLACA: OOW 442
CONDUCTOR: Diego Rojas

SEMANA DEL: 24 / 10 / 2025 — 702

MARCA: FERRA
MODELO: 2012 793

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES D	LUNES M	LUNES NA	MARTES D	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES D	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES D	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES D	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO D	SÁBADO M	SÁBADO NA	OBSERVACIONES
	A. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO																			
1	Licencia de tránsito (Vigente y disponible en el vehículo)				X						X			X						
2	SOAT (Vigente y disponible en el vehículo)				X						X			X						
3	Manifiesto de carga					X						X			X					
4	Revisión técnico mecánica y de gases (Vigente y disponible en el vehículo)				X						X			X						
	B. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR																			
5	Licencia de conducción (Vigente) Cat. 5 min				X						X			X						
6	EPS- ARP-AFP				X						X			X						
7	Certificado de manejo defensivo (Vigente)				X						X			X						
	C. ESTADO MECÁNICO																			
8	Niveles de fluido				X						X			X						
9	Estado y tensión de correas				X						X			X						
10	Estado y sujeción de las mangueras				X						X			X						
11	Sin fugas de fluidos				X						X			X						
12	Estado y sujeción de la batería (bornes y cables)				X						X			X						
	D. PARTE EXTERNA																			
13	Estado general de la alzonería y pintura				X						X			X						
14	Estado de las puertas				X							X			X					
15	Espejo retrovisor					X					X			X						
16	Vidrio parabrisas / ventanas (Sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)				X						X			X						
	E. CARROCERÍA VOLQUETA																			
17	Soportes y grapas				X						X			X						
18	Estado general del volquete				X						X			X						
19	Compuerta				X						X			X						
20	Sistema de levante de volqueta				X						X			X						
21	Bastidor				X						X			X						
22	Carpa de protección de la carga				X						X			X						
	F. PARTES DE LA VOLQUETA																			
23	Cinturón de seguridad en todos los asientos				X						X			X						
24	Luz de cabina				X						X			X						
25	Cornetas (Sin cortocircuitos, sin alambramientos)				X						X			X						
26	Luces (Frontales - Direccionales - Traseras - De parqueo - De reversa)				X						X			X						
27	Pito y alarma de reversa				X						X			X						
	E. EQUIPO DE PREVENCIÓN																			
28	Extintor (Vigente, con sellos de garantía en buen estado y con tarjeta de inspección)				X						X			X						
29	Botiquín				X						X			X						
30	Estibas				X						X			X						

LA VOLQUETA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA OPERACIÓN

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

REVISADO POR: PROFESIONAL SST

FIRMA:

CONVENCIONES

B: Bueno | M: Malo | NA: No aplica

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3 - Julio - 2025.		Operador: Jesus David.	
Código Equipo: Retro.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos, Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Liquadora			X
Conectores	X		

EQUIPO DE SEGURIDAD	B	M	N/A
Extintor y botiquin		X	
Silla de la cabina		X	
Espejos y sonido de reversa	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Fugas aceites y liquidos			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeción			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas			X
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M
Aceite Motor	X	
Aceite transmisión o caja	X	
Aceite diferenciales		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante		
Aceite Caja Direccion Hidraulica		
Fuga Aceite Hidraulicas		
Fuga Aceite Motor		X
Fuga Aceite Transmisiones		X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

JESÚS DAVID DIAZ GONZALEZ		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4 - JUN - 2025		Operador: Jesus David.	
Código Equipo: Retro	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Cabina del operador y Tapicería		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO Extintor y botiquin		X	
EQUIPO Silla de la cabina		X	
EQUIPO Cinturones y apoya de espaldas	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carnes superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion		X	
Cadenas de las Traslacion	X		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidraulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Díaz González		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5 - Julio - 2025		Operador: Jesus David	
Código Equipo: EC-110	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas		X	
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas			X	Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X		Presiones de inflado			X	Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			X	Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Silla retenida a bordes			X	Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores			X	Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire			X	Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape			
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción			X	SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servico			X	Cilindros hcos. y vástagos		X	
Pedal del pasador Tranquila	X			Freno de parqueo			X	Motor arranque	X		
Palancas y perillas			X	UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo			X	Barra principal de dirección			X	Aceite Motor	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales			X	Aceite transmisión o caja	X		
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga		X		Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Licuadora			X	Zapatas, bujes y pasadores		X		Refrigerante			X
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Extintor y botiquin			X	Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas			X
Silla de la cabina			X	Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor		X	
Pasaderas y cinturon de seguridad	X			Cadenas de las Traslacion		X		Fuga Aceite Transmisiones	X		

EQUIPO

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesús David Díaz González		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se deba informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN IELLO

NIT. 901766262 -7

JPNIELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9 - Julio - 2025		Operador: Jesus David	
Código Equipo: Retro.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillìn del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito			
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores	X		
EQUIPO: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO: Silla de la cabina		X	
EQUIPO: Escaleras y apoyo de acceso	X	X	

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
(zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion		X	
Cadenas de las Traslacion	X		

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X	X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			
Liquido de frenos			
Aceite Caja Direccion Hidraulica			
Fuga Aceite Hidraulicas			
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

JESUS DAVID DIAZ GONZALEZ.		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11 - Julio - 2025.		Operador: Jesus Diaz	
Código Equipo: Retro.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria		X	
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de Inflado			X
Pernos de ruedas y rines			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujeciòn			X
Freno de servico			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn			V
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
(zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores e inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas		X
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	

SISTEMA HIDRAULICO	B	M
Cilindros hcos. y vàstagos		X
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante		
Liquido de frenos		
Aceite Caja Direccion Hidraulica		
Fuga Aceite Hidraulicas		X
Fuga Aceite Motor		X
Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesus David Diaz Gonzales		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901766282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 14 Julio - 2025.		Operador: Jesus Diaz	
Código Equipo: RC-110.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles			X	Correas y poleas		X	
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas			X	Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas		X		Presiones de inflado			X	Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines			X	Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes			X	Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores			X	Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores			X	Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn			X	**SISTEMA HIDRAULICO**	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servicio			X	Cilindros hcos. y vàstagos		X	
Sillin del operador y Tapiceria		X		Freno de parqueo			X	Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	**DIRECCION**	B	M	N/A	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de direcciòn			X	Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal			X	Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales			X	Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	B	M	N/A	Aceite diferenciales			
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga		X		Aceite de mandos finales o Catalinas			
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores		X		Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores		X		Liquido de frenos			
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica			
SEGURIDAD Extintor y botiquin		X		*Sprocket*			X	Fuga Aceite Hidraulicas			
SEGURIDAD Silla de la cabina		X		Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor		X	
SEGURIDAD Escaleras y *epoyo de acceso*	X			Cadenas de las Traslacion		X		Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesus David Diaz Gonzales.		
NOMBRE OPERADOR	**NOMBRE PROFESIONAL SST**	**FIRMA DEL ING. RESIDENTE**

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA INFRAESTRUCTURA JPN E.U.U.

NIT 901183267-1

JPNELLO

INSPECCION PRE OPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 01 Julio 2021 | Operador: Jesus David Diaz Gonzalez

Codigo Equipo: EXC-01 | Marca y Modelo: | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elemento de desgaste		X	
Vidrios, Espejos y Pinturas		X	
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presion aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horometro o contador de kms	X		
Silla del operador y Tapiceria			X
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Bocina	X		
Cableado	X		
Conectores	X		

ESENCIALES				
	Extintor y botiquin		X	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles			X
Estado de llantas			X
Presiones de inflado			X
Pernos de ruedas y tuna			X
Eje muerto y bujes			X
Balancines y pasadores			X
Amortiguadores			X
Silletas muelles y sujecion			X
Freno de servicio			X
Freno de parqueo			X

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardan ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direccion			X
Barra transversal			X
Terminales			X

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga		X	
Zapatas, bujes y pasadores		X	
Carriles superiores o inferiores		X	
Ruedas Tensoras	X		
Sprocket			X
Motores de Traslacion	X		
Cadenas de las Traslacion		X	

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas		X	
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Unidad de admisión	X		
Escape y tubería de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hros. y vástagos		X	
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor		X	
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Jesus David Diaz Gonzalez		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

209

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPNTELI

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 1 JULIO 2025.		Operador: Luis Ospina	
Código Equipo: VIBN.	Marca y Serie: 250. CB.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CARINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X
Indicador Temperatura Motor	X			Ejes muertos y bujes	X			Radiador	X
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X
Indicador de presión aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tubería de escape	X
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B
Ametro o contador de kms.	X			Freno de servicio	X			Cilindros hcos. y vástagos	X
Nivel del amortiguador Trasero	X			Freno de parqueo	X			Bomba hidraulica	X
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B
Luces de trabajo	X			Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	
Licuadora			X	Izapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X
Extintor y botiquin	X			Sprooket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X
Escalera y agarre de acceso		X		Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X

EQUIPO

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Luis Carlos Ospina		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisc

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 2 - Julio - 2025		Operador: LUIS OZUNA	
Código Equipo: VIBO	Marca y Serie: 250 CA	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Conectores			X
EQUIPO: Extintor y botiquin			X
EQUIPO: Silla de la cabina	X		
EQUIPO: Escaleras y grupo de acceso			X

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Previones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muelle y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardán ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5 Julio - 2023. Operador: Luis Ospina

Código Equipo: VIBO Marca y Serie: CAT 250 Horometro Inicial: Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire	✓		X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Conectores			X

EQUIPO			
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
			X

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			✓

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 9- JULIO -2025.		Operador: LUIS OSPINO	
Código Equipo: VIBRO. CA150	Marca y Serie: CA 250.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Silln del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso		X		Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

2-12

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 10 -Julio-2025.		**Operador:** LUIS OTERO	
Código Equipo: Vibro.	**Marca y Serie:** CAT 250	**Horometro Inicial:**	**Horometro Final:**

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

EQUIPADO				
	Extintor y botiquin	X		
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso			X

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11 - JULIO - 2025		Operador: Luis O Soto	
Código Equipo: VIBRO	Marca y Serie: CA 250	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin	X		
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso		X	

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Sillatas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

HOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 17 - Nov - 2025		Operador: Luis Espino	
Código Equipo: V100	Marca y Serie: CB 250	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos, Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Silla del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso		X	

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardan ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidráulico	X		
Aceite transmisión o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 18 - Julio - 2023 | Operador: luis ospina

Código Equipo: Vibro Dynapac | Marca y Serio: CA 250 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire			X
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin			
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas			X

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica			X

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja			X
Aceite diferenciales			X
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

HOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 24 - Julio - 2025.		Operador: Luis Diaz	
Código Equipo: Vibro Dynapac	Marca y Serie: CA 250.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuradora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin			X	Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
Escaleras y apoyo de acceso		X		Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

HOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 25 - Julio - 2021		Operador: Luis Ospina	
Código Equipo: Vib Dinapac	Marca y Serie: CA 150	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire			X	Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vástagos	X		
Silln del operador y Tapicería	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo	X			Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisión o caja			X
Luces Direccionales			X	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin			X	Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso	X	X		Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Luis Carlos Ospina		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese anotaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 28 - julio - 2025. | Operador: [illegible] | Horometro Inicial: | Horometro Final:

Código Equipo: Vibro Dynapac | Marca y Serie: CA 25.

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillìn del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			√
Conectores			√
SEGURIDAD: Extintor y botiquin			√
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso		X	

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	√		
Estado de llantas	√		
Presiones de inflado	√		
Pernos de ruedas y rines	√		
Eje muerto y bujes	√		
Balancines y pasadores	√		
Amortiguadores	√		
Silletas muelles y sujeción	√		
Freno de servico	√		
Freno de parqueo	√		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas			X
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	√		
Barra transversal	√		
Terminales	√		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			√
(zapatas, bujes y pasadores			√
Carriles superiores e inferiores			√
Ruedas Tensoras			√
Sprocket			√
Motores de Traslacion			√
Cadenas de las Traslacion			√

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	√		
Ventilador	√		
Soportes del motor	√		
Mangueras radiador	√		
Radiador	√		
Ductos de admisión	√		
Exhosto y tuberia de escape	√		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hidr. y vastagos	√		
Bujes y pasadores	√		
Mangueras y conexiones	√		
Bomba Hidraulica	√		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	√		
Aceite Hidráulico			
Aceite transmisión o caja			
Aceite diferenciales			
Aceite de mandos finales o Catalinas			
Refrigerante	X		
Liquido de frenos			
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	√		
Fuga Aceite Motor	√		
Fuga Aceite Transmisiones	√		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

220

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 29 - Julio - 2025		Operador: Luis Ospina	
Código Equipo: VIBRO DINAPAC	Marca y Serie: CA 25D	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste	X			Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X	Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo			X	Balancines y pasadores	X			Ductos de admisiòn	X		
Indicador de presiòn aire				Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeciòn	X			**SISTEMA HIDRAULICO**	**B**	**M**	**N/A**
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			**UNION CARDANICA**	**B**	**M**	**N/A**	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas			X	Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**	**DIRECCION**	**B**	**M**	**N/A**	**NIVELES Y FUGAS FLUIDOS**	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X			Barra principal de direcciòn	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja			X
Luces Direccionales			X	**TREN DE RODAJE**	**B**	**M**	**N/A**	Aceite diferenciales			X
Luces de Parqueo			X	Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Licuadora			X	(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado			X	Carriles superiores e Inferiores			X	Liquido de frenos			X
Conectores			X	Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD Extintor y botiquin			X	Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD Escaleras y apoyo de acceso		X		Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese anotaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3 - Julio - 2025 | Operador: Luis Ojeda

Código Equipo: Vibro. Rodillo | Marca y Serie: CA 152 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito			X
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		X
Conectores	X		

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin	X	/	
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante			X
Liquido de frenos			X
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que ésto tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4 - Julio - 2025 | Operador: Luis Ojeda

Código Equipo: Vibro Pilotado | Marca y Serie: CA. 152 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito			X
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado	X		
Conectores	X		
EQUIPO DE SEGURIDAD: Extintor y botiquin			X
EQUIPO DE SEGURIDAD: Silla de la cabina			
EQUIPO DE SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de Inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vástagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas		
Refrigerante		
Liquido de frenos	X	
Aceite Caja Direccion Hidraulica		
Fuga Aceite Hidraulicas		X
Fuga Aceite Motor		X
Fuga Aceite Transmisiones		X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese anonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor d Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901765282 -7

JPNTELL

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

echa: 5. Julio - 2025. | Operador: [illegible] | Horometro Inicial: | Horometro Final:

ódigo Equipo: Volvo reciclado | Marca y Serie: CA 982.

INSPECCION PREOPERACIONAL

HASIS Y CABINA	B	M	N/A
hasis y Estructura	X		
lementos de desgaste	X		
idrios, Espejos,Plumillas			X
idicador Presion Aceite Motor	X		
idicador Temperatura Motor	X		
idicador Temperatura Servo			X
idicador de presiòn aire	X		
idicador Nivel Combustible	X		
oròmetro o contador de kms.	X		
illin del operador y Tapiceria	X		
alancas y perillas	X		
inturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
uces de trabajo	X		
ito			X
larma de Reversa			X
uces Direccionales			X
uces de Parqueo			X
icuadora			X
Cableado			X
Conectores	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
EQUIPO SEGURIDAD: Silla de la cabina		X	
EQUIPO SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL.	B	M
Correas y poleas	X	
Ventilador	X	
Soportes del motor	X	
Mangueras radiador	X	
Radiador	X	
Ductos de admisiòn	X	
Exhosto y tuberia de escape	X	
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**
Cilindros hcos. y vàstagos	X	
Bujes y pasadores	X	
Mangueras y conexiones	X	
Bomba Hidraulica	X	
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**
Aceite Motor	X	
Aceite Hidràulico	X	
Aceite transmisiòn o caja	X	
Aceite diferenciales	X	
Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Refrigerante		
Liquido de frenos		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Fuga Aceite Hidraulicas	X	
Fuga Aceite Motor	X	
Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

[illegible]

NOMBRE OPERADOR | NOMBRE PROFESIONAL SST | FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN ELLO

NIT. 901785202 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 16 - Julio - 2025 | Operador: Luis Ospina

Código Equipo: Vibro pequeño | Marca y Serie: CN 452 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito			X
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores	X		

EQUIPO DE SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin	X		
	Silla de la cabina		X	
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante			X
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Luis Carlos Ospina		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Eviteselas amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 24 - Feb - 2026 | Operador: Luis Ospina

Código Equipo: Vibro pisonado | Marca y Serie: CA 152 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo	X		
Pito			X
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores			X

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquin	X		
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante			X
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas			X
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Luis carlos Ospina		
NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901705202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 23 - Julio - 2025 | Operador: Luis Ospina

Código Equipo: Vibro pisonero | Marca y Serie: CA 112 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas			X
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo			X
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silfin del operador y Tapicería	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo	X		
Pito			X
Alarma de Reversa			X
Luces Direccionales			X
Luces de Parqueo			X
Licuadora			X
Cableado			X
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquín	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina		X	
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Refrigerante			X
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE
Luis Carlos Ospina		

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

223

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

JPNTELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 1 - Ago - 2025 | Operador: Johan D. Lyre | Horometro Inicial: | Horometro Final:

Código Equipo: Ho10. | Marca y Serie: 310

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Pito del operador y Testigo	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Limpiadora	X		
Conectores	X		

EQUIPO			
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Escaleras y sitios de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y tines	X		
Ejes, rotula y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servicio	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

apoyo la motoniveladora 310 Alquilada.
durante que se encuentre operativa

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE PROFESIONAL SST

FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evítese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 2 - Julio 2025 | Operador: Jhon Deluque

Código Equipo: MOTO | Marca y Serie: 710 | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios Espejos Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presión aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horómetro o contador de kms.	X		
Pitos retrocesos Timonera	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Limpiadores	X		
Conectores	X		
Extintor y botiquin	X		
Silla de la cabina	X		
Cinturones y seguro de cerraduras	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Ejes rueda y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardán ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de dirección	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Izapatas, bujes y pasadores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisión	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vástagos	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite transmisión o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL RES. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785262 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 3 - Julio - 2025 | Operador: Jairo Peluzo.

Código Equipo: Fluid. | Marca y Serie: 210 . Chevrolet | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CARAVA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Ejes, muelle y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vástagos	X		
Pedal del acelerador	X			Freno de parqueo	X			Mangueras hidraulicas	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisión o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Limpiadora	X			Zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Pito	X			Rodillos superiores			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Motor	X		
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		
Cerraduras y seguro de acceso	X			Cadenas de tas Traslacion			X				

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del opetador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901185202 -7

JPN TELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 4- Julio - 2023 | Operador: Jairo deluque.

Código Equipo: Moto 310 | Marca y Serie: Champion | Horometro Inicial: | Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Ejes, muelles y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horòmetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vástagos	X		
Cinturon de seguridad y pretensor	X			Frenos de parqueo	X						
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Alarma de Reversa	X			Terminales	X			Aceite transmisión o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga	X			Aceite de mandos finales o Catalinas			X
Luz marcha	X			Zapatas, bujes y pasadores	X			Refrigerante	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras	X			Aceite Caja Direccion Hidraulica			X
Extintor y botiquin	X			Sprocket	X			Fuga Aceite Hidraulicas			X
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion	X			Fuga Aceite Motor			X
Cinturones y arnes de seguridad	X			Cadenas de las Traslacion	X			Fuga Aceite Transmisiones			X

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN ELLI

NIT. 901785292-7

JPNELLI

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 7 - Feb - 2023		Operador: Jhon Delgado	
Código Equipo: Moto 710	Marca y serie: Caterpillar	Horometro Inicial:	Horometro Final:

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X	
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X	
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X	
Indicador Temperatura Motor	X			Ejes, muelles y bujes	X			Radiador	X	
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X	
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X	
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servicio	X			Cilindros hcos. y vástagos	X	
	X				X				Y	
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X	
Cinturon de Seguridad	X			Cardán ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X	
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X	
	X				X				X	
Alarma de Reversa		X		Terminales	X			Aceite transmisión o caja	X	
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X	
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X	
Limpiadora	X			Zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X	
	X						X		X	
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X	
Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X	
Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X	
Espejos y pernos de pernos	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X	

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Motoniveladora 710 Alarma Mbuzo.
Bruscla operativa OK.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Superv

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785202 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 5/6 -2025		Operador: Javier Debotte	
Código Equipo: MOTO 310	Marca y Serie: Changai	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillòn del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 20 - Julio - 2022	Operador: Jaiver Beltre		
Código Equipo: Hdlo 3-10	Marca y Serie: Chongqing	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silln del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
Izapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786202 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 11 - JUN - 2021		Operador: Javier Delgado	
Código Equipo: MOTO-10	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		

SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		

SEGURIDAD				
	Extintor y botiquín	X		
	Silla de la cabina	X		
	Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		

UNION CARDANICA	B	M	N/A
Cardàn ,yugos y crucetas	X		

DIRECCION	B	M	N/A
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		

TREN DE RODAJE	B	M	N/A
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		

SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		

NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Falla Horometro.
Fuga de aceite de transmisiòn y Cambio de Aceite pan Motor.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901786282 -7

JPNTELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 19 - Julio - 2023.		Operador: Edwin Pelaez.	
Código Equipo: MOTO 910.	Marca y Serie: Chamaco.	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Sillin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeción	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de dirección	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
(zapatas, bujes y pasadores			X
Carriles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	**N/A**
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

Operativo - No Avisò el operador.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN YELLO

NIT. 901705282 -7

JPNIELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 18 - Julio - 2025	Operador: Javer bebye.		
Código Equipo: Mod 110.	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X		
Elementos de desgaste		X	
Vidrios, Espejos,Plumillas	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X		
Indicador Temperatura Motor	X		
Indicador Temperatura Servo	X		
Indicador de presiòn aire	X		
Indicador Nivel Combustible	X		
Horòmetro o contador de kms.	X		
Silfin del operador y Tapiceria	X		
Palancas y perillas	X		
Cinturon de Seguridad	X		
SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
Luces de trabajo		X	
Pito	X		
Alarma de Reversa		X	
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Licuadora	X		
Cableado	X		
Conectores	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X		

SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A
Estado de muelles	X		
Estado de llantas	X		
Presiones de inflado	X		
Pernos de ruedas y rines	X		
Eje muerto y bujes	X		
Balancines y pasadores	X		
Amortiguadores	X		
Silletas muelles y sujeciòn	X		
Freno de servico	X		
Freno de parqueo	X		
UNION CARDANICA	**B**	**M**	**N/A**
Cardàn ,yugos y crucetas	X		
DIRECCION	**B**	**M**	**N/A**
Barra principal de direcciòn	X		
Barra transversal	X		
Terminales	X		
TREN DE RODAJE	**B**	**M**	**N/A**
Cadenas de las oruga			X
Zapatas, bujes y pasadores			X
Camiles superiores e inferiores			X
Ruedas Tensoras			X
Sprocket			X
Motores de Traslacion			X
Cadenas de las Traslacion			X

MOTOR DIESEL	B	M	P
Correas y poleas	X		
Ventilador	X		
Soportes del motor	X		
Mangueras radiador	X		
Radiador	X		
Ductos de admisiòn	X		
Exhosto y tuberia de escape	X		
SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	
Cilindros hcos. y vàstagos	X		
Bujes y pasadores	X		
Mangueras y conexiones	X		
Bomba Hidraulica	X		
NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	**B**	**M**	
Aceite Motor	X		
Aceite Hidràulico	X		
Aceite transmisiòn o caja	X		
Aceite diferenciales	X		
Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Refrigerante	X		
Liquido de frenos	X		
Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
Fuga Aceite Hidraulicas	X		
Fuga Aceite Motor	X		
Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

* presenta falla en el horometro.

HOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

247

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN YELLO

NIT. 901765262 -7

JPNIELLO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha: 27 - Julio - 2025.	Operador: Jaime Deluque.		
Codigo Equipo: M036 116	Marca y Serie:	Horometro Inicial:	Horometro Final:

INSPECCION PREOPERACIONAL

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSION Y FRENOS	B	M	N/A	MOTOR DIESEL	B	M	N/A
Chasis y Estructura	X			Estado de muelles	X			Correas y poleas	X		
Elementos de desgaste		X		Estado de llantas	X			Ventilador	X		
Cristales, Espejos,Plumillas	X			Presiones de inflado	X			Soportes del motor	X		
Indicador Presion Aceite Motor	X			Pernos de ruedas y rines	X			Mangueras radiador	X		
Indicador Temperatura Motor	X			Eje muerto y bujes	X			Radiador	X		
Indicador Temperatura Servo	X			Balancines y pasadores	X			Ductos de admisión	X		
Indicador de presión aire	X			Amortiguadores	X			Exhosto y tuberia de escape	X		
Indicador Nivel Combustible	X			Silletas muelles y sujeción	X			SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.	X			Freno de servico	X			Cilindros hcos. y vástagos	X		
Asiln del operador y Tapicería	X			Freno de parqueo	X			Bujes y pasadores	X		
Palancas y perillas	X			UNION CARDANICA	B	M	N/A	Mangueras y conexiones	X		
Cinturon de Seguridad	X			Cardàn ,yugos y crucetas	X			Bomba Hidraulica	X		
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCION	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo		X		Barra principal de dirección	X			Aceite Motor	X		
Pito	X			Barra transversal	X			Aceite Hidràulico	X		
Alarma de Reversa		X		Terminales	X			Aceite transmisiòn o caja	X		
Luces Direccionales	X			TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	X		
Luces de Parqueo	X			Cadenas de las oruga			X	Aceite de mandos finales o Catalinas	X		
Bocinas	X			(zapatas, bujes y pasadores			X	Refrigerante	X		
Cableado	X			Carriles superiores e inferiores			X	Liquido de frenos	X		
Conectores	X			Ruedas Tensoras			X	Aceite Caja Direccion Hidraulica	X		
SEGURIDAD: Extintor y botiquin	X			Sprocket			X	Fuga Aceite Hidraulicas	X		
SEGURIDAD: Silla de la cabina	X			Motores de Traslacion			X	Fuga Aceite Motor	X		
SEGURIDAD: Escaleras y apoyo de acceso	X			Cadenas de las Traslacion			X	Fuga Aceite Transmisiones	X		

REPORTE DE FALLAS O PROBLEMAS DEL EQUIPO

* Falla en el Horometro.
* Fuga aceite Motor.

NOMBRE OPERADOR	NOMBRE PROFESIONAL SST	FIRMA DEL ING. RESIDENTE

NOTA: El diligenciamiento diario y de manera completa de este formato es de absoluta obligatoriedad por parte del operador. Evitese amonestaciones.

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de alguna de las partes del equipo, se debe informar inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento, para que éste tome las acciones correctivas a realizar.

Powered by CamScanner

ANEXO 8. INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

NIT. 901785282 -7

INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA

JPN TELLO

FECHA DE INSPECCION: 22 julio -2025 **AREA:** Campamento PAC.

LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

EQUIPO	REQUISITOS MÍNIMOS	CUMPLE			ESTADO			RECOMENDACIÓN
		SI	NO	N.A	B	M	R	
EXTINTORES	Estan ubicados correctamente	X			X			
	Peso y tipo de extintor	X			X			
	Son de facil acceso en caso de incendio	X			X			
	Son apropiados para la clase de riesgo	X			X			
	Cuentan con la señalizacion adecuada	X			X			
	Son recargados y reparados anualmente	X			X			
	Cuentan con recarga vigente	X			X			
	Se identifican fechas de vigencia y recarga	X			X			
	El area donde estan ubicados se encuentra despejada y libre de obstaculos	X			X			
	Cuenta con pasador de seguridad	X			X			
	Tiene manguera y boquilla	X			X			
	El manometro se encuntra en el nivel adecuado	X			X			
	Cuenta con manija de descarga	X			X			
	La manija de transporte es de facil agarre	X			X			
CAMILLA DE EMERGENCIA	Esta ubicada adecuadamente	X			X			
	Es de facil acceso en caso de emergencia	X			X			
	Cuenta con la señalizacion correspondiente	X			X			
	Cuenta con cuello rigido ajustable	X			X			
	Cuenta con cintas y/o correas de ajuste	X			X			
	Son de material rigido de facil limpieza	X			X			
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	X			X			
	Estan señalizadas las rutas de evacuacion	X			X			
	Las salidas de emergencia y rutas de evacuacion se encuentran despejadas	X			X			
	Esta definido el punto de encuentro en caso de evacuacion	X			X			
	Las escaleras para la evacuacion del personal cuentan con barandas			X				
	Las escaleras cuentan con antideslizantes			X				
	Los equipos de emergencia se encuentran señalizados				X			
	La señalizacion de emergencia es visible	X			X			
	Los numeros de emergencia se encuentran publicados en un lugar visible	X			X			
	Esta publicado en plano de evacuacion en un lugar visible	X			X			
BRIGADA DE EMERGENCIA	Esta conformada y definida	X			X			
	Los miembros de la brigada se encuentran identificados	X			X			
	Cuenta con equipos de comunicación en caso de emergencia	X			X			
	Se cuenta con el MEDEVAC del personal de la empresa	X			X			
	Esta debidamente capacitada y entrenada	X			X			

Powered by CamScanner

ANEXO 9. REGISTRO DE ENTREGA EPP
