Espacio para
Logo Corporativo

CN CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.060.695-3
CR 31 45 61 OF 301 BRR EL TRIUNFO
Tel: (608) 3124440577
Villavicencio - Colombia
divisiontributaria1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 23

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		
NIT	800.165.872-6	**Teléfono**	(000) 7293189 - Ext. 000
Dirección	CL 19 23 00	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/09/2025, 17:39
Expedición	10/09/2025, 17:39
Vencimiento	21/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7947464 DE JUNIO DE 2025 CUYO OBJETO CONSTRUIR LA SEDE JUDICIAL DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1.00	60,951,157.10
2	ADMINITRACION 29%	1.00	17,675,836.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	1,828,535.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	3,626,594.02

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro millones ochenta y dos mil ciento veintidos pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-21 por $ 84,082,122.12

Total Bruto	83,503,086.10
IVA 19%	579,036.02
Total a Pagar	**84,082,122.12**

Observaciones:
PCI#$27-01-02-016;CtoNoCO1.PCCNTR.7947464;dvivancbu@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098452724 aprobado en 20250910 prefijo FEV desde el número 23 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: abaecc97da7529f98a4fe70be0382fa2e7a64d8fa6c8261443872f8dc13de28b40e42a75bf120fed3da7e5ba57b87c02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ROLANDO GUERRERO ROSAS
INGENIERO CIVIL .
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS .
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS.

Certificado de Cumplimiento y Aprobación de Pago

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la sede judicial de El Tablón de Gómez.

Contratante: Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
Contrato No.: CO1.PCCNTR.7947464 de 2025
Objeto del Contrato: Construcción de la Sede Judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez.
Contratista: CN CONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor: Rolando Guerrero Rosas
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2025
Periodo Evaluado: Desde el día 01/08/2025 hasta el día 31/08/2025

Certificado de Cumplimiento

El suscrito, Rolando Guerrero Rosas en calidad de Interventor del contrato mencionado, certifica que el contratista CN CONSTRUCCIONES S.A.S., ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales correspondientes al periodo evaluado, conforme a lo establecido en:

- Las condiciones técnicas pactadas en el contrato.
- El cronograma de ejecución aprobado.
- Las especificaciones de calidad exigidas por la entidad contratante.
- Las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Aprobación de Pago

En virtud del cumplimiento verificado, se aprueba el pago correspondiente al siguiente concepto:

Concepto	Valor Aprobado	Observaciones
Acta de Obra No. 2	$84.082.122,12	Avance del 11.85%

Documentación Soporte

- Acta de avance No. 1
- Memoria de Cantidades ejecutadas
- Informe técnico de Obra
- Informe Ambiental
- Informe Seguridad y Salud en el Trabajo

Cordialmente,

Ing. Rolando Guerrero Rosas
Interventor

Carrera 24 # 11 -55 San Juan de Pasto Telefax 7335833 Móvil 3117207735
Email rolandoguerreror@yahoo.es

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2
PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1,00	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo predio, incluye elaboración de planos record	Mt2	196,0	5804,00	1.137.584,00	155,8	$ 904.263,20	0,0	$ -	155,8	$ 904.263,20
1,2	Suministro e instalación de cerramiento en poli sombra verde y guadua H= 2,0m	Ml	40,00	8.810,00	352.400,00	36,0	$ 317.160,00	0,0	$ -	36,0	$ 317.160,00
1,3	Suministro e instalación de kit de señales informativas de acuerdo con PMA. (informativas, localización de espacios, baños, rutas de evacuación, almacenamiento, herramientas, circulación, salidas de emergencia, seguridad y demás aplicables al proyecto)	Und	1,00	168.410,00	168.410,00	1,0	$ 168.410,00	0,0	$ -	1,0	$ 168.410,00
1,4	Suministro e instalación de valla informativa en lona. 100cmsx70cms base metálica, arte entregado por la entidad	Und	1,00	197.642,00	197.642,00	1,0	$ 197.642,00	0,0	$ -	1,0	$ 197.642,00
1,5	Desmonte de cubierta en teja A.C. (incluye estructura) e incluye cargue a volqueta	Mt2	52,00	48.096,00	2.500.992,00	52,0	$ 2.500.992,00	0,0	$ -	52,0	$ 2.500.992,00
1,6	Demolición de mampostería estructural E<= 0.15m incluye cortes con pulidora, incluye cargue a volqueta	Mt2	288,00	36.437,00	10.493.856,00	206,3	$ 7.516.953,10	0,0	$ -	206,3	$ 7.516.953,10
1,7	Demolición de estructuras en concreto reforzado columnas incluye zapatas, incluye cargue a volqueta	M3	4,00	428.305,00	1.713.220,00	3,2	$ 1.370.576,00	0,0	$ -	3,2	$ 1.370.576,00
1,8	Demolición concretos reforzados (anden y losa de contrapiso), incluye cargue a volqueta	M2	183,00	46.400,00	8.491.200,00	172,9	$ 8.022.560,00	0,0	$ -	172,9	$ 8.022.560,00
1,9	Demolición concretos reforzados losa de entrepiso, incluye cargue a volqueta	M2	108,00	55.680,00	6.013.440,00	59,6	$ 3.318.528,00	0,0	$ -	59,6	$ 3.318.528,00
1,10	Demolición de estructuras en concreto reforzado vigas aéreas y de cimentación, incluye cargue a volqueta	M3	8,00	398.090,00	3.184.720,00	8,0	$ 3.184.720,00	0,0	$ -	8,0	$ 3.184.720,00
1,11	Desmonte puertas y ventanas, vidrios y antepechos, incluye cargue a volqueta	Und	16,00	20.829,00	333.264,00	16,0	$ 333.264,00	0,0	$ -	16,0	$ 333.264,00
1,12	Retiro tanque de reserva actual, incluye cargue a volqueta	Und	1,00	134.247,00	134.247,00	1,0	$ 134.247,00	0,0	$ -	1,0	$ 134.247,00
1,13	Retiro de medidores de agua y energía	Und	2,00	83.440,00	166.880,00	2,0	$ 166.880,00	0,0	$ -	2,0	$ 166.880,00
1,14	Excavación a mano suelo limo arenoso cimentación, H promedio = 1.30m	Mt3	32,00	31.787,00	1.017.184,00	23,0	$ 731.101,00	0,0	$ -	23,0	$ 731.101,00
1,15	Excavación a máquina para nivelación de terreno, incluye cargue a volqueta	Mt3	64,00	32.834,00	2.101.376,00	42,1	$ 1.382.311,40	0,0	$ -	42,1	$ 1.382.311,40
1,16	Retiro y demolición de acometidas de acueducto alcantarillado, incluye (retiro de tubería anterior, demolición de cajas de inspección, retiro de accesorios) cargue a volqueta	Und	1,00	236.414,00	236.414,00	1,0	$ 236.414,00	0,0	$ -	1,0	$ 236.414,00
1,17	Relleno compactado con material proveniente de la excavación	Mt3	9,00	21.993,00	197.937,00	8,2	$ 180.342,60	0,0	$ -	8,2	$ 180.342,60
1,18	Retiro de escombros, incluye cargue a volqueta	Mt3	137,00	47.475,00	6.504.075,00	136,6	$ 6.485.085,00	0,0	$ -	136,6	$ 6.485.085,00
1,19	Relleno compactado con recebo seleccionado.	Mt3	56,00	81.004,00	4.536.224,00		$ -	56,0	$ 4.536.224,00	56,0	$ 4.536.224,00
1,20	Actualización permiso de demolición, secretaria de Planeación Municipal de El Tablón de Gómez	Und	1,00	79.901,00	79.901,00	1,0	$ 79.901,00	0,0	$ -	1,0	$ 79.901,00
		SUBTOTAL PRELIMINARES			**49.560.966,00**		**$ 37.231.350,30**		**$ 4.536.224,00**		**$ 41.767.574,30**
2,00	**ESTRUCTURAS**									0,0	$ -
2,01	Solado de concreto espesor = 10 cms. En concreto clase F (14 MPA)	Mt3	2,00	567.588,00	1.135.176,00	2,0	$ 1.135.176,00	0,0	$ -	2,0	$ 1.135.176,00
2,02	Zapatas en concreto clase D (21 MPA)	Mt3	7,00	1.033.857,00	7.236.999,00	-	$ -	7,0	$ 7.236.999,00	7,0	$ 7.236.999,00
2,03	Viga de cimentación de 0.30*0.40 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	78,30	137.978,00	10.803.677,00	-	$ -	77,9	$ 10.748.486,20	77,9	$ 10.748.486,20
2,04	Columnas de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	52,40	131.501,00	6.890.652,00	-	$ -	46,2	$ 6.075.346,20	46,2	$ 6.075.346,20
2,05	Columnetas de 0.10*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	72,00	16.729,00	1.204.488,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,06	Vigueta de corona de 0.10*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	247,00	16.585,00	4.096.495,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,07	Vigas de amarre de 0.30*0.40 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	78,30	145.651,00	11.404.473,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,08	Vigueta losa de 0.15*0.40 en concreto clase D (21MPA)	Ml	33,20	82.081,00	2.725.089,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,09	Losa en concreto reforzado maciza e=0.12 m en concreto clase D (21 MPA)	Mt2	128,60	167.202,00	21.502.177,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,10	Rampa en concreto clase D (21 MPA)	Mt3	0,20	1.094.857,00	218.971,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,11	Material de relleno en recebo compactado Tipo Invias	Mt3	74,80	94.948,00	7.102.110,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,12	Alfajía superior de 0.10*0.25 en concreto clase D (21 MPA) debe tener corta goteras de acuerdo con diseño arquitectónico.	Ml	21,90	29.234,00	640.225,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,13	Losa de contrapiso e=0.10m, en concreto F'c 21 Mpa	Mt2	107,30	156.721,00	16.816.163,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,14	Mesón de espesor=10 cms, ancho 60cms en concreto clase D (21 MPA). Incluye ref. D=3/8" cada 10 cms. En ambas direcciones. Incluye mochetas. Faldones en mampostería.	Ml	1,20	162.699,00	195.239,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
2,15	Hierro. corte, fleje y amarre	Kg	7.634,00	6.697,00	51.124.898,00	1.841,1	$ 12.329.615,70	**3.416,80**	$ 22.882.309,60	5.257,9	$ 35.211.925,30
		SUBTOTAL ESTRUCTURAS			**143.096.832,00**		**$ 13.464.791,70**		**$ 46.943.141,00**		**$ 60.407.932,70**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2

PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
3,00	**MAMPOSTERIA**										$ -
3,01	Construcción de muros en ladrillo común	Mt2	301,20	83.300,00	25.089.960,00	-	$ -	71,70	$ 5.972.610,00	71,7	$ 5.972.610,00
3,02	Construcción de muros dos caras en fibro cemento (10 mm) incluye estructura	Mt2	7,00	169.401,00	1.185.807,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
3,03	Repello sobre muro espesor 1.5 cm. Mortero 1:3	Mt2	709,00	27.500,00	19.497.500,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
3,04	Estuco plástico sobre muro repellado para interiores	Mt2	451,50	22.369,00	10.099.604,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
3,05	Repello impermeabilizado 1:3 para muros exteriores	Mt2	245,00	27.198,00	6.663.510,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
3,06	Estuco acrílico sobre muro repellado para exteriores.	Mt2	105,20	22.369,00	2.353.219,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL MAMPOSTERIA			**64.889.600,00**		$ -		**5.972.610,00**	0,0	**5.972.610,00**
4,00	**PISOS Y ACABADOS**										$ -
4,01	Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado de 0,45*0,45m.	Mt2	104,10	76.905,00	8.005.811,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,02	Suministro e instalación de granito lavado color café - marron para rampa.	Mt2	1,25	77.478,00	96.848,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,03	Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado 0.33x0,33m para baños	Mt2	29,40	66.528,00	1.955.923,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,04	Cerámica estructurada cara única para pared de baños y cocina 0.30mx0.60m COLOR DEFINE LA ENTIDAD	Mt2	14,00	82.123,00	1.149.722,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,05	Guarda escoba en cerámica tráfico 5 o comercial moderado para oficinas. H= 0,07m	Ml	99,00	17.912,00	1.773.288,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,06	Pintura con vinilo sobre muros para interiores Tipo 1, tres manos.	Mt2	575,40	13.830,00	7.957.782,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,07	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 0,60m, incluye estructura	Mt2	119,70	98.361,00	11.773.812,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,08	Mortero de nivelación 1:4 para instalación de piso, espesor 3cms.	Mt2	132,00	40.001,00	5.280.132,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
4,09	Pintura acrílica sobre muros para exteriores, tres manos.	Mt2	80,00	14.674,00	1.173.920,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS			**39.167.238,00**		$ -		$ -	0,0	$ -
5,00	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERAS**										$ -
5,01	Suministro e instalación de escalera tipo gato metálica ancho 0,60m, peldaños 0,30m, altura= 3,58m, incluye epóxico para varillas	Und	1,00	751.995,00	751.995,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,02	Suministro e instalación de accesorios y barras de seguridad baño PMR, incluye: 1 barra de seguridad de pared en acero inoxidable clase 304 de 60cms, 1 barra de seguridad abatible de 76cms en acero inoxidable clase 304, 1 dispensador metálico de jabón de un litro en acero inoxidable clase 304, 1 gancho metálico portamaletas en acero inoxidable clase 304.	Und	1,00	1.142.260,00	1.142.260,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,03	Suministro e instalación de ventana en vidrio templado 10mm, accesorios en acero inoxidable clase 304	Mt2	1,20	827.404,00	992.885,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,04	Suministro e instalación de ventanas en aluminio incluye instalación de vidrio es=4 mm. De acuerdo a diseño, incluye batientes y manijas	Mt2	22,30	288.494,00	6.433.416,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,05	Suministro e instalación de puertas en aluminio, incluye chapa, marco y vidrio de 4mm según diseño	Mt2	30,00	405.422,00	12.162.660,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,06	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio 5mm	Mt2	16,00	288.494,00	4.615.904,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,07	Suministro e instalación de mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.	Ml	2,90	486.857,00	1.411.885,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
5,08	Suministro e instalación de puerta en aluminio para baño PMR, incluye chapa, marco y barra de apertura según diseño	Mt2	2,10	517.478,00	1.086.704,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y DE MADERAS			**28.597.709,00**		$ -		$ -	0,0	$ -
6,00	**CUBIERTA**									0,0	$ -
6,01	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 23 con sus respectivos anclajes Ancho= 50cms	Ml	12,60	41.507,00	522.988,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
6,02	Cubierta en Policarbonato macizo 4mm (incluye estructura en aluminio tubo tubular cuadrado de 1 1/2"x1 1/2") según diseño	Mt2	27,30	406.905,00	11.108.507,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
6,03	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	Mt2	132,80	59.402,00	7.888.586,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL CUBIERTA			**19.520.081,00**		$ -		$ -	0,0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2

PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
7,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										$ -
7,01	Punto hidráulico tubería en PVC 1/2"	Und	12,00	47.976,00	575.712,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,02	Punto sanitario PVC 2"	Und	6,00	57.081,00	342.486,00	-	$ -	6,00	$ 342.486,00	6,0	$ 342.486,00
7,03	Punto sanitario PVC 3"	Und	6,00	74.511,00	447.066,00	-	$ -	3,00	$ 223.533,00	3,0	$ 223.533,00
7,04	Punto sanitario tubería PVC 4"	Und	3,00	87.116,00	261.348,00	-	$ -	3,00	$ 261.348,00	3,0	$ 261.348,00
7,05	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	Ml	51,60	4.564,00	235.502,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,06	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	Ml	26,30	11.248,00	295.822,00	-	$ -	17,40	$ 195.715,20	17,4	$ 195.715,20
7,07	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 3"	Ml	4,70	17.772,00	83.528,00	-	$ -	4,70	$ 83.528,40	4,7	$ 83.528,40
7,08	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	Ml	18,20	29.261,00	532.550,00	-	$ -	15,50	$ 453.545,50	15,5	$ 453.545,50
7,09	Suministro e instalación tubería PVC presión 3/4"	Ml	2,40	9.471,00	22.730,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,10	Suministro e instalación tubería PVC 3" bajante aguas lluvias	Ml	67,60	18.497,00	1.250.397,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,11	Suministro e instalación canal aguas lluvias en lámina galvanizada pintada cal 23, Desarrollo 0.7m incluye soscos cada 3 metros a tubería 3" apoyo cada 1.20m en Angulo de 1 1/8" y tapa de inicio y fin	Ml	12,50	67.151,00	839.388,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,12	Suministro e instalación llave de paso de 1/2", incluye tapa de registro plástica 15x15 cm	Und	7,00	48.332,00	338.324,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,13	Suministro e instalación de tanque plástico 1000lts incluye válvulas, válvula lateral de cierre 747u de 1/2", accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC.	Und	1,00	856.735,00	856.735,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,14	Suministro e instalación tasa sanitaria blanca, incluye acople 1/2"	Und	2,00	348.797,00	697.594,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,15	Suministro e instalación lavamanos color blanco institucional, incluye grifería, sifón tipo botella y acople 1/2"	Und	2,00	299.103,00	598.206,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,16	Suministro e instalación de lavaplatos de incrustar en acero inoxidable 100x50cm con escurridor y poceta izquierda, incluye grifería lavaplatos venus	Und	2,00	291.999,00	583.998,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,17	Caja de inspección de 80*80 cms. En ladrillo tolete común y concreto clase E (17,5 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones. Trampa grasas incluye accesorios PVC, con marco y contramarco en Angulo 1/8" x 1 1/2"	Und	9,00	323.171,00	2.908.539,00	-	$ -	6,00	$ 1.939.026,00	6,0	$ 1.939.026,00
7,18	Suministro e instalación de grifo de 1/2", incluye niple y uniones HG	Und	3,00	59.280,00	177.840,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,19	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado Lavaderos 80 x 60 x 25 cm Granito Pulido, incluye tapa pozuelo.	Und	1,00	437.226,44	437.226,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,20	Suministro e instalación de sanitario Borneo color blanco con sensor para PMR corona o similar	Und	1,00	1.999.564,00	1.999.564,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,21	Suministro e instalación de lavamanos Aquajet para baño PMR, incluye grifería	Und	1,00	541.417,00	541.417,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,22	Suministro e instalación rejilla de piso sistema anti cucarachas y anti olores con tres componentes	Und	6,00	50.765,00	304.590,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,23	Suministro e instalación de rejilla de piso tipo granada con sosco 4x2" para terraza de cubierta	Und	5,00	27.789,00	138.945,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
7,24	Suministro y montaje de acometida sanitaria 6", incluye silla Y 12"x6", codo 45 4", adaptador 6" a 4", excavación, reemplazo material de relleno, rotura y reposición de adoquín vía y bordillo.	Und	1,00	2.801.277,00	2.801.277,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**17.270.784,00**		$ -		**3.499.182,10**	0,0	**3.499.182,10**
8,00	**INSTALACIONES REDES ELECTRICAS**										$ -
8,01	Bajante acometida B.T. 2 tubos IMC de 11/2" x 3m	Und	1,00	590.569,00	590.569,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,02	Equipo de medida electrónico bifásico trifilar, medida activa y reactiva, clase de precisión 1, tensión 3x120/208V, corriente 5 a 100A	Und	1,00	1.305.251,00	1.305.251,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,03	Acometida en baja tensión desde caja de distribución existente hasta medidor - 2F#6+1N#6 AWG cobre THHN/THWN 90°C - tubo conduit PVC 2 x 1 1/2"	ml	20,00	75.310,00	1.506.200,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,04	UPS on line monofásica de 3000VA	Und	1,00	5.925.315,00	5.925.315,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,05	Sistema de puesta a tierra, conformada por 2 electrodos interconectados mediante cable de cobre desnudo #2/0AWG. Incluye tratamiento para tierra, soldadura exotérmica y cajas de inspección prefabricadas.	Und	1,00	2.758.746,00	2.758.746,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,06	Caja de inspección 0,6 x 0,6 x 0,8 m tapa marco metálico para acometidas BT	Und	2,00	323.171,00	646.342,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,07	Acometida desde medidor hasta transferencia automática, y desde transferencia automática hasta tablero distribución TD1, y desde planta eléctrica hasta transferencia automática (2#6F + 1#6N + 1#8T) cobre HF LS 80°C - tubo conduit PVC 1 1/2"	ml	35,00	88.180,00	3.086.300,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2

PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
8,08	Transferencia automática de 50A, según diagrama unifilar	Und	1,00	4.597.816,00	4.597.816,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,09	Suministro, instalación y puesta en marcha Planta eléctrica bifásica 120-220V, diésel de 9.5 kVA stanby, incluye cargador de baterías y 5m de tubo de escape	Und	1,00	28.077.744,00	28.077.744,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,10	Tablero de distribución bifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, puerta y chapa, incluye	Und	1,00	1.263.842,00	1.263.842,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,11	Tablero de distribución monofásico de 6 circuitos	Und	1,00	401.030,00	401.030,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,12	Salida de iluminación 1#12F+1#12N+1#12T cobre HF LS 90°C - tubo SCH40 1/2"	Und	46,00	176.306,00	8.110.076,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,13	Salida de interruptor sencillo conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	13,00	131.616,00	1.711.008,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,14	Salida de interruptor doble conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	3,00	215.535,00	646.605,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,15	Sensor de movimiento conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	3,00	267.896,00	803.688,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,16	Sensor de movimiento conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	3,00	267.896,00	803.688,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,17	Sensor bidireccional (de presencia para baño PMR) conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	1,00	330.144,00	330.144,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,18	Salida de tomacorriente doble con polo a tierra, 1#12F+1#12N+1#12T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	23,00	162.866,00	3.745.918,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,19	Circuito ramal para UPS 1#10F+1#10T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 de 3/4"	ml	18,00	42.812,00	770.616,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,20	Circuito ramal para AA 2#12F+1#12T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	ml	26,00	38.026,00	988.676,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,21	Interruptor sencillo	Und	12,00	14.943,00	179.316,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,22	Interruptor doble	Und	3,00	18.841,00	56.523,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,23	Aplique pared LED tipo tortuga de 12 W	Und	4,00	86.258,00	345.032,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,24	Suministro, transporte e instalación de luminaria de uso interior 610x600x80mm,5000K flujo lumínico de 6400Lm con sistema de control 0-10V, con potencia máxima de 45.22W.	Und	10,00	426.729,00	4.267.290,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,25	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	Und	10,00	68.051,00	680.510,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,26	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12,00	146.931,00	1.763.172,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,27	S.I.P Luminaria tipo bala GS 20W 5000K	Und	4,00	196.731,00	786.924,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,28	S.I.P Luminaria APLIQUE DE PARED NEW FLASH 15.8W 3000K 1500lm 100-240V PX-0507-NEG	Und	1,00	149.083,00	149.083,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,29	S.I.P Luminaria de emergencia 600L 90 E 185x50x108 sobreponer2-BL 2W	Und	6,00	151.096,00	906.576,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,30	Aviso salida de emergencia LED 5W	Und	3,00	127.242,00	381.726,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,31	Tomacorriente doble con polo a tierra 15A 120V	Und	13,00	20.160,00	262.080,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,32	Tomacorriente doble con polo a tierra tipo GFCI 15A 120V	Und	3,00	84.741,00	254.223,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,33	Tomacorriente doble con polo a tierra REGULADO 15A 120V	Und	7,00	36.105,00	252.735,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,34	CERTIFICADO RETIE	Und	1,00	3.118.080,00	3.118.080,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
8,35	CERTIFICADO RETILAP	Und	1,00	2.825.760,00	2.825.760,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL INSTALACIONES REDES ELECTRICAS			**84.298.604,00**		$ -		$ -	0,0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2
PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
9,00	**INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS**										$ -
9,01	RACK DE 10RU 50cm x 60cm x 51cm (alto, ancho, profundidad) incluye bandeja para fibra óptica, bandejas para rack, organizadores y multitoma	UND	1,00	2.369.734,00	2.369.734,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,02	SWITCH de 24 puertos (ARUBA 2930F) RJ45 POE + 10/100/1000 Y 4FO SSP/SFP+	UND	1,00	11.971.136,00	11.971.136,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,03	PATCH panel de 24 puertos categoría 6a 1 UR	UND	1,00	344.400,00	344.400,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,04	PATCH CORD NEGRO CATEGORIA 6A DE 1m	UND	14,00	44.420,00	621.880,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,05	Jack rj45 negro categoría 6a	UND	14,00	78.196,00	1.094.744,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,06	Jack rj45 azul categoría 6a	UND	7,00	78.196,00	547.372,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,07	Jack rj45 rojo categoría 6a	UND	7,00	78.196,00	547.372,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,08	Salida para datos	UND	7,00	22.824,00	159.768,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,09	FACE PLATE dos puertos, color blanco	UND	7,00	19.964,00	139.748,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,10	Cable F/UTP, 4 pares, 23 AWG sólido, LSZH categoría 6a	ML	315,70	17.409,00	5.496.021,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,11	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 54x300x3000 mm INCLUYE SOPORTES Y SPT	ML	32,00	210.593,00	6.738.976,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,12	Tubería PVC SCH40 de 3/4" incluye accesorios	UND	35,00	23.015,00	805.525,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
9,13	Certificación salidas de datos	UND	14,00	24.360,00	341.040,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL INSTALACIONES RED DE VOZ Y DATOS			**31.177.716,00**		$ -		$ -	0,0	$ -
10,00	**INSTALACIONES REDES DE CCTV**										$ -
10,01	DVR FULL HD 8 canales, incluye disco duro de 1tb	UND	1,00	1.128.956,00	1.128.956,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
10,02	Cámaras domo full color, incluye un par de video BALUN, adaptadores de corriente y caja plástica de 4"	UND	3,00	267.252,00	801.756,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
10,03	Cámaras BULLET, incluye un par de video BALUN, incluye un par de adaptadores de corriente y caja plástica de 4"	UND	1,00	406.519,00	406.519,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
10,04	Cable UTP, 4 pares, 23 AWG sólido, categoría 6	ML	82,00	11.231,00	920.942,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
10,05	Tubería PVC SCH 40 de 3/4" incluye accesorios	UND	12,00	23.015,00	276.180,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL INSTALACIONES REDES DE CCTV			**3.534.353,00**		$ -		$ -	0,0	$ -
11,00	**INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS**										$ -
11,01	Suministro e instalación de extintor CO2 (incluye soporte de pared y aviso)	Und	1,00	346.121,00	346.121,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
11,02	Suministro e instalación de extintor multipropósito ABC	Und	2,00	58.673,00	117.346,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
11,03	Suministro e instalación de sistema de alarma estación contraincendios (incluye pulsador y alarma)	Und	2,00	255.424,00	510.848,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
11,04	Suministro e instalación de sensor detector de humo inalámbrico (incluye batería 9v)	Und	3,00	80.032,00	240.096,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL OTROS			**1.214.411,00**		$ -		$ -	0,0	$ -
12,00	**AIRE ACONDICIONADO**										$ -
12,01	Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Mini Split Pared. 9000 BTU	Und	1,00	6.080.256,00	6.080.256,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
12,02	Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Mini Split Pared. 12000 BTU	Und	2,00	7.785.456,00	15.570.912,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO			**21.651.168,00**		$ -		$ -	0,0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	5 meses
NIT No:	901060695-3	**FECHA DE INICIO**	27 de junio de 2025
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	**FECHA DE TERMINACION**	27 de noviembre de 2025
LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	**COSTO DEL PROYECTO**	$ 709.691.098,00

ACTA DE COBRO No. 2

PERIODO COMPRENDIDO: 01 de agosto de 2025 hasta 31 de agosto de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA 01		CANTIDAD EJECUTADA ACTA 02		CANTIDAD ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
13,00	**VARIOS**										$ -
13,01	Suministro e instalación de letras en lámina de acero inoxidable calibre 1/4" con acabado en pintura electrostática transparente. Con la frase: "Sede Judicial El Tablón de Gómez", tamaño de letra 20 cms cada una y el escudo de rama judicial 50 cm, según diseño. Incluye limpieza de área previa al pegado y las letras incluyen cinta doble faz adherente con pegante instantáneo.	Und	1,00	3.905.249,00	3.905.249,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
13,02	Suministro e instalación de placa de señalización con base en madera y ranura para intercambio de lámina en aluminio dorada sublimada interna. 0,30 m x 0,18 m. Incluye desmonte de placa actual.	Und	2,00	104.261,00	208.522,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
13,03	Black out enrollable en PVC, color crema	M2	22,00	194.740,00	4.284.280,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
13,04	Suministro de punto ecológico 3 puestos 40litros Blanco, negro y verde con tapa	Und	3,00	191.957,00	575.871,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
13,05	Aseo General	Gl	1,00	1.501.925,00	1.501.925,00	-	$ -	-	$ -	0,0	$ -
		SUBTOTAL VARIOS			**10.475.847,00**		**-**		**-**	0,0	$ -

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**514.455.309,00**		**50.696.142,00**		**60.951.157,10**		**111.647.299,10**
ADMINISTRACIÓN	**29%**	**149.192.040,00**		**14.701.881,00**		**17.675.836,00**		**32.377.717,00**
IMPREVISTOS	**3%**	**15.433.659,00**		**1.520.884,00**		**1.828.535,00**		**3.349.419,00**
UTILIDAD	**5%**	**25.722.765,00**		**2.534.807,00**		**3.047.558,00**		**5.582.365,00**
IVA (19% SOBRE EL VALOR TOTAL)	**19%**	**4.887.325,00**		**481.613,33**		**579.036,02**		**1.060.649,35**
VALOR TOTAL PROYECTO		**709.691.098,00**		**69.935.327,33**		**84.082.122,12**		**154.017.449,45**
		PORCENTAJE EJECUTADO		**9,85%**		**11,85%**		**21,70%**

REALIZO

CN CONSTRUCTORES SAS R.L:CAMILO ANDRES NIÑO MORALES

CONTRATISTA DE OBRA

APROBO

ING ROLANDO GUERRERO ROSAS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Vo.Bo.

ING DIANA MARIA VIVANCO BURBANO

LIDER DEL PROYECTO

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante	CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación	901060695
Fecha solicitud	2025-07-02
Fecha vence	2025-07-31
Acto gravado	

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura			
		Total	**$ 0**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20717920

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante	CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación	901060695
Fecha solicitud	2025-07-02
Acto gravado	

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura			
		Total	**$ 0**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-07-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1637171801

PAGADO

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación 901060695
Fecha solicitud 2025-07-02 Fecha vence 2025-07-31
Acto gravado

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo			
		Total	**$ 0**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20717920

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación 901060695
Fecha solicitud 2025-07-02
Acto gravado

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo			
		Total	**$ 0**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-07-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1637171801

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación 901060695
Fecha solicitud 2025-07-02 Fecha vence 2025-07-31
Acto gravado

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 709,691,098	0.5	$ 3,548,500
		Total	**$ 3,548,500**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20717920

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10374198** PIN No. **20717920**

Solicitante CN CONSTRUCTORES SAS
Identificación 901060695
Fecha solicitud 2025-07-02
Acto gravado

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto- Contrato CO1.PCCNTR.7947464- 901060695

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 709,691,098	0.5	$ 3,548,500
		Total	**$ 3,548,500**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-07-18 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1637171801

Gmail **CN CONSTRUCTORES JUZGADO <cnconstructoresjuzgado@gmail.com>**

Confirmación Transacción CUS 1694138158

1 message

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> Mon, Aug 11, 2025 at 4:01 PM
To: cnconstructoresjuzgado@gmail.com

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 Ext: 1147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

No. Pago:	1850
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/08/2025
Ticket ID:	1850
Transacción/CUS:	1694138158
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	pago timbre en el marco del contrato denominado construir la sede judicial del j
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1029
Total:	3548500
Total Iva:	0

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.548.500,00

Número de aprobación
00138158

Motivo
pago timbre en el marco del contrato denominado construir la sede judicial del j

Fecha del pago
11/08/2025

Referencia 1
191.107.230.34

Hora del pago
04:01 PM

Referencia 2
CO1.PCCNTR.7947464

Número de producto origen
**********7002

Referencia 3
Rama judicial , consejo superior de la judicatura sede pasto

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1694138158

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO IBED YOMARA PUERTA ORTIZ IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO Y TARJETA PROFESIONAL No. 79.575-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO:

Que, la Persona Jurídica **CN CONSTRUCTORES SAS** identificado con el Nit. 901.060.695-3 efectúa aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud;

Igualmente certifico que cancelo los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar mediante la siguiente planilla:

PERIODO		PLANILLA	VALOR
PENSION	SALUD		
2025-08	2025-09	1074519667	$ 5.199.200

La presente certificación se expide con destino al **INTERESADO** a los tres (03) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Contador Público
TP 79.575-T





DESTINO
A LA PERSONA JURIDICA:
CN CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.060.695-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1DA154381E80E779

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

QUE EN INTERESE

Que el contador público **IBED YOMARA PUERTA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 40412125 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y de los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DESTINO A LA PERSONA JURIDICA: CN CONSTRUCTORES SAS NIT: 901.060.695-3



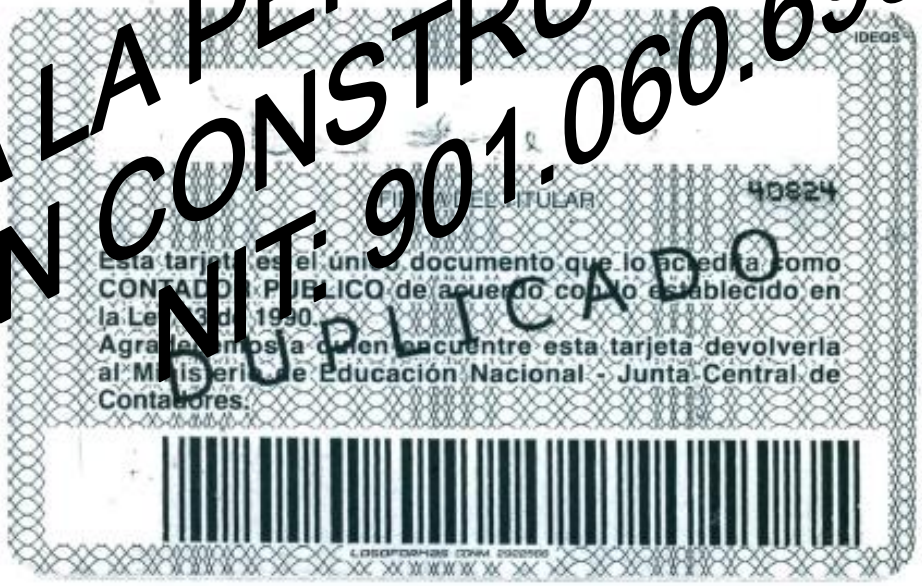

DESTINO A LA PERSONA JURIDICA: CN CONSTRUCTORES SAS NIT: 901.060.695-3

DUPLICADO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-02, 02:54:48 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074519667

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CN CONSTRUCTORES SAS		
Documento	NI901060695	**Dirección**	CR 31 #45 - 61 OFC 301 EL TRIUNFO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3124440577
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	NIÑO MORALES CAMILO ANDRES	**Identificación**	CC 1121827016
Total Afiliados	12	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007520438	JULIANA CAROLINA PASAJE YELA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1085316789	DARIO FERNANDO CORAL CHAMORRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1120558827	YIBER FARDEY ACEVEDO BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1120924814	GABRIEL QUINTERO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1120954136	DANIEL JULIAN NIÑO MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1121889737	ROSA ELENA ONOFRE RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1121949812	MARIA CAMILA CHAVARRO ANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1193079351	BREYNER ANDRES HERNANDEZ ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 80417068	YALIN EVELIO ACEVEDO PLAZAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 86011606	DIEGO IVAN SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 86072023	CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 97612749	GABRIEL QUINTERO MOTTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 17.082.000	$ 2.733.600	$ 684.000	$ 1.097.600	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.199.200	$ 0	$ 5.199.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79690097		GARAVITO CASTELLANOS CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 #34C-33	VILLAVICENCIO-META	6641529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1740791348	9490030566	I	2025/08/26	2025/09/01	BANCOLOMBIA		$407,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79690097	GARAVITO CARLOS		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79690097		GARAVITO CASTELLANOS CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 #34C-33	VILLAVICENCIO-META	6641529	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1740791348	9490030566	I	2025/08/26	2025/09/01	BANCOLOMBIA		$407,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$228,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$178,700
TOTAL				1	$405,800	$0	$407,400
