REGIONAL	OCCIDENTE		
ÁREA FUNCIONAL	GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL		
AEROPUERTO/ESTACIÓN	AEROPUERTO BONILLA ARAGON, CALI- EL EDEN - ARMENIA		
FUNCIONARIOS	**Héctor Iván Bedoya Díaz** Especialista Aeronáutico		
OBJETIVO COMISIÓN	Recibir en compañía del funcionario del almacén del aeropuerto Bonilla Aragón equipos del contrato 25000722 H2 de 2025 (ítems 1, 2, 3) de parte del contratista, verificar avance en la instalación de los equipos en el aeropuerto el Edén de Armenia		
ESTADO ACTUAL	N/A		
FECHA INFORME	01/12/2025		
FECHA INICIO PROGRAMADA	27/11/2025	FECHA FINAL PROGRAMADA	28/11/2025
FECHA INICIO REAL	27/11/2025	FECHA FINAL REAL	28/11/2025

Trabajos realizados

Aeropuerto Bonilla Aragón

Recibir en compañía del funcionario del almacén Jorge Iván Cardona del aeropuerto Bonilla Aragón los equipos del contrato 25000722 H2 de 2025 (ítems 1, 2, 3) de parte del contratista, UT AERORADARES T&V 2025

se reciben los equipos del contrato 25000722 H2 de 2025 (ítems 1, 2, 3) de parte del contratista, UT AERORADARES T&V 2025, EN compañía del funcionario del almacén Jorge Iván Cardona.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	Radar para vigilancia perimetral mínimo de 1000 mts de alcance	UND	2

Se recibieron 2 radares para vigilancia perimetral mínimo de 1000 mts. de alcance.

Seriales SP30980, SP30981





2	Radar para vigilancia perimetral mínimo 800 mts de alcance	UND	2

Se recibieron 2 radares para vigilancia perimetral mínimo de 800 mts. de alcance.
Seriales SP30910, SP31024





3	Servidor para Sistema de Radares con Licenciamiento incluido	UND	1

Servidor serial 515520



Aeropuerto El EDÉN

Se hace seguimiento a la ejecución del contrato.

- Se encuentra instalado y funcionando el Aire acondicionado en la parte posterior del CCTV.
- Se encuentra instalado el monitor de 55 pulgadas en el CCTV




- Se instala RACK con UPS, switch, Patch Panel en el CCTV y en el cuarto Técnico de la TWR





- Se instala Fibra Óptica entre el cuarto Técnico de la TWR y el CCTV, se certifica la fibra Óptica.

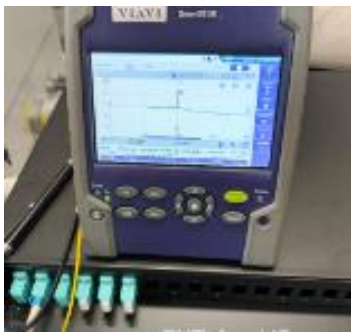



El día 4 de diciembre se empieza la ejecución de la obra Civil lado aire, en Armenia y el 11 de diciembre se inicia en Barranquilla.

CONCLUSIONES:
A la fecha el contrato tiene un incumplimiento en la ejecución, debido a la demora en la autorización del estudio de altura de obstáculos de superficie la cual fue remitida por la dirección de la Autoridad el 17 de noviembre.

Los equipos complementarios se entregan en el almacén de la Aerocivil en Cali y en Barranquilla la semana del 9 de diciembre

Atentamente,

Héctor Iván Bedoya Díaz
Especialista Aeronáutico
Dirección de Operaciones Aeroportuaria
