ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 13

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	ESTRUTECNIA S.A.S.
Contrato No.	2506040749
Valor Inicial:	$ 1,490,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,490,000,000.00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de Iniciación:	16/06/2025
Fecha de Vencimiento:	30/10/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA MITIGACION DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES LOTE 2

Semana Número: **13** Del: 8-sep Al: 14-sep Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 91 días

Nombre del Supervisor: CINTE S.A.S. Restantes 44.0 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.72%	58.55%
Valor de la Obra	$ 85,275,625	$ 872,442,625

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9.55%	81.18%
Valor de la Obra	$ 142,225,183	$ 1,209,512,183

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	52.83%	71.63%	22.62%
Durante el periodo	5.72%	9.55%	
Acumulado actual	58.55%	81.18%	

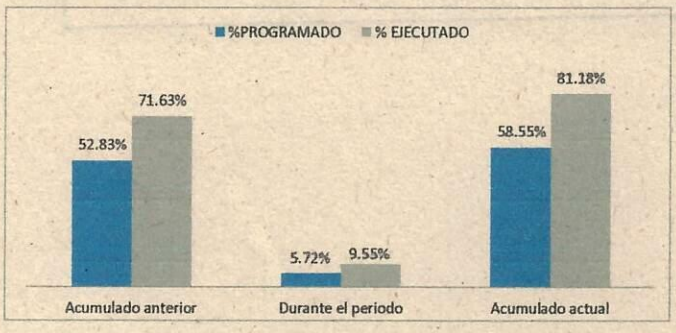

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









Septiembre 8 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion talud y zanja colectora.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado zapata muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Demolición, perfilación talud.
Septiembre 9 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion talud y zanja colectora.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado zapata muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Demolición, perfilación talud.
Septiembre 10 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion talud y zanja colectora.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado zapata muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 11 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Perfilacion talud y zanja colectora.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado zapata muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 12 de 2025

ALCALDÍA DE MANIZALES

INFORME SEMANAL DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FRENTE ZAGALES. Acero refuerzo zapata y vastago muro.



FRENTE ZAGALES. Acero refuerzo zapata muro.



FRENTE ZAGALES. Formaleta zapata muro.



FRENTE ZAGALES. Vaciado zapata muro.



FRENTE BARRIO COLOMBIA. Formaleta y vaciado pantalla.



FRENTE GONZALEZ. Zanjas colectoras.
