ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 14

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	ESTRUTECNIA S.A.S.
Contrato No.	2506040749
Valor Inicial:	$ 1,490,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,490,000,000.00
Plazo Inicial:	4,5 MESES
Fecha de Iniciación:	16/06/2025
Fecha de Vencimiento:	30/10/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA MITIGACION DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES LOTE 2

Semana Número: 14 Del: 15-sep Al: 21-sep Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 98 días

Nombre del Supervisor: CINTE S.A.S. Restantes 37.0 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.80%	64.35%
Valor de la Obra	$ 86,419,403	$ 958,814,403

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4.04%	85.22%
Valor de la Obra	$ 60,237,198	$ 1,269,819,198

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	58.55%	81.18%	
Durante el periodo	5.80%	4.04%	20.87%
Acumulado actual	64.35%	85.22%	

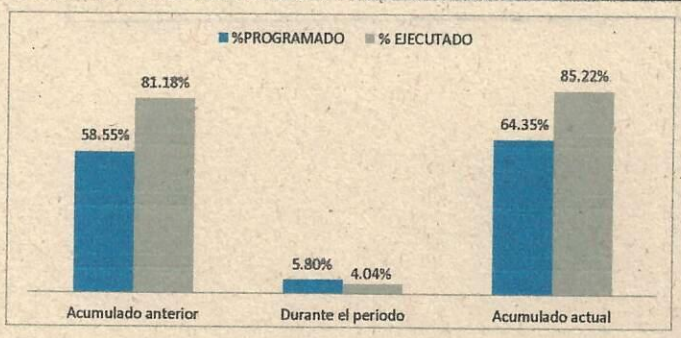

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA










Septiembre 15 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Zanja colectora, empradizacion talud.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado vastago muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Perfilado y retiro de materiales, formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 16 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Zanja colectora, empradizacion talud.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado vastago muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Perfilado y retiro de materiales, formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 17 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Zanja colectora, empradizacion talud, tuberia sanitaria y aguas lluvias.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado vastago muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Perfilado y retiro de materiales, formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 18 de 2025
Frente: Gonzalez.
Actividades: Zanja colectora, tuberia sanitaria y aguas lluvias.
Frente: Zagales
Actividades: Formaleta y vaciado vastago muro.
Frente: Barrio Colombia
Actividades: Perfilado y retiro de materiales, formaleta y vaciado pantalla.
Septiembre 19 de 2025

ALCALDÍA DE MANIZALES

INFORME SEMANAL DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

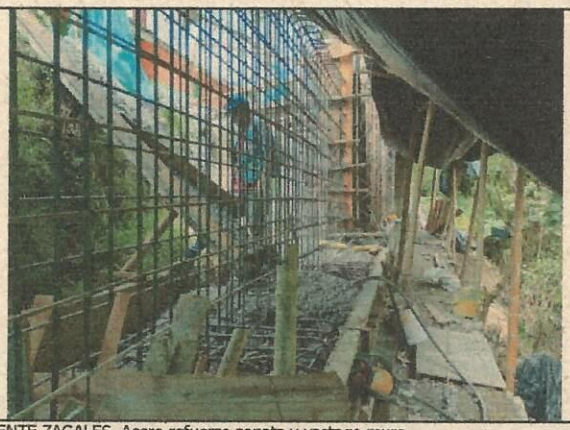

FRENTE ZAGALES. Acero refuerzo zapata y vastago muro.



FRENTE ZAGALES. Vista general.



FRENTE GONZALEZ. Canal de rapidas con tapa.



FRENTE GONZALEZ. Canal de rapidas con tapa.



FRENTE ZAGALES. Afirmado compactado trasdos muro.



FRENTE BARRIO COLOMBIA. Reguladores de tránsito.
