CONSORCIO
SAN MIGUEL
CALDAS

CTO-LP-SI-006-2023-CSM-1209

Norcasia, 19 de noviembre de 2025

Ingeniero:
Juan David Duque Pedraza
Supervisor del contrato
Gobernación de Caldas

Referencia: CONTRATO LICITACIÓN PUBLICA 29092023-1456 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS".

Asunto: Acta de Obra Nro 23

Cordial saludo.

Anexo al presente el acta de obra nro 23 correspondiente al mes de octubre de 2025 con sus respectivos anexos, para su firma y tramite respectivo.

Cordialmente,

RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
Director de Obra
CONSORCIO SAN MIGUEL

19/11/2025

Elaboro: RGC
Reviso: RGC

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE ORDENACIÓN DEL GASTO No. 23

Código: PG-GO-02-018
Versión: 1
Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	miércoles, 19 de noviembre de 2025
Número Radicación SECOP, Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art.19 Decreto 1510/2013	SECOP II LP-SI-004-2023 CO1.PCCNTR.5068825	Número Radicado Interno del Contrato	20232023-1450
Número de Identificación del contratista - NIT	900.740.908-5	No. Ficha SPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	5602	NOMBRE DE LA VIA	LA DORADA - SONSON, MUNICIPIOS DE VICTORIA Y SAMANA, CALDAS
Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Objeto de Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 93,499,514,647.00	$ 13,820,000,000	$ 9,349,951,464.00

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento	100%	$ 107,319,514,647	DEPARTAMENTAL
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	Fecha de Iniciación	12/12/2025
	Fecha de Terminación (fin de ejecución)	11/12/2030
	Prórrogas	

Nº PERDC - HPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500074261	$ 616,179,888.00	$ 616,179,888.00	$ -	2 - DAGE
4500077001	$ 5,563,613,969.00		$ 5,563,613,969.00	0-2400
VALOR ACTA	$ 6,161,793,857.00	$ 616,179,888.00	$ 5,563,613,969.00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato		93,499,514,647.00	Valor del Anticipo		$ 9,349,951,464.00
Adición del Contrato		13,820,000,000.00			
Valor Acta Nro. 1	436,314,801.00		Amortización Acta 1	43,631,480.00	
Valor Acta Nro. 2	553,009,668.00		Amortización Acta 2	55,300,967.00	
Valor Acta Nro. 3	443,010,919.00		Amortización Acta 3	44,301,092.00	
Valor Acta Nro. 4	544,483,205.00		Amortización Acta 4	54,448,321.00	
Valor Acta Nro. 5	567,926,924.00		Amortización Acta 5	56,792,692.00	
Valor Acta Nro. 6	207,282,965.00		Amortización Acta 6	20,728,297.00	
Valor Acta Nro. 7	1,340,514,676.00		Amortización Acta 7	134,051,468.00	
Valor Acta Nro. 8	4,116,961,935.00		Amortización Acta 8	411,696,194.00	
Valor Acta Nro. 9	4,779,577,355.00		Amortización Acta 9	477,957,736.00	
Valor Acta Nro. 10	5,374,166,889.00		Amortización Acta 10	537,416,689.00	
Valor Acta Nro. 11	3,384,977,063.00		Amortización Acta 11	338,497,706.00	
Valor Acta Nro. 12	2,725,325,241.00		Amortización Acta 12	272,532,524.00	
Valor Acta Nro. 13	1,963,472,425.00		Amortización Acta 13	196,347,243.00	
Valor Acta Nro. 14	2,064,225,660.00		Amortización Acta 14	206,422,566.00	
Valor Acta Nro. 15	2,138,469,406.00		Amortización Acta 15	213,846,941.00	
Valor Acta Nro. 16	1,556,885,585.00		Amortización Acta 16	155,688,560.00	
Valor Acta Nro. 17	1,514,027,640.00		Amortización Acta 17	151,402,764.00	
Valor Acta Nro. 18	1,571,696,334.00		Amortización Acta 18	157,169,633.00	
Valor Acta Nro. 19	2,335,852,025.00		Amortización Acta 19	233,585,203.00	
Valor Acta Nro. 20	2,310,737,533.00		Amortización Acta 20	231,073,753.00	
Valor Acta Nro. 21	3,937,924,491.00		Amortización Acta 21	393,792,449.00	
Valor Acta Nro. 22	3,974,219,391.00		Amortización Acta 22	397,421,939.00	
Valor Acta Nro. 23	6,161,793,857.00		Amortización Acta 23	616,179,888.00	
Saldo del Contrato	52,830,589,462.00		Saldo por Amortizar	8,571,083,942.00	
Sumas Iguales	107,319,514,647.00	107,319,514,647.00	Sumas Iguales	9,349,951,464.00	9,349,951,464.00

OBSERVACIONES:

Nota: Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES . EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ART CULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1º ("El servidor público que en cada caso no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente Artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Colaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma
Nombre: ABEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
WAB INGENIERIA DE VALOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FSMC 26

Autorización: 18764099648723 de 03/10/2025

Desde 25 Hasta 50 Vigencia 03/10/2026 Prefijo FSMC

CONSORCIO SAN MIGUEL

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		18/11/2025 12:00:00	18/11/2025	23/11/2025
Número contrato	Centro de costos		Tipo de operación		
	CS010121000 CSMIGUEL CALDAS - ADMINISTRATIVO		Estándar		
Dirección de entrega bien o servicio		Obra			
CRA 48 48 SUR 75 BG 161		LEGALIZACIÓN CAJA MENOR			

DEPARTAMENTO DE CALDAS

NIT 890801052 - 1

Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CR 21 22

Departamento Antioquia
Ciudad Caldas
Teléfono 018000916944
Correos electrónicos Aocampo@caldas.gov.co - analistacontable@intramag.co

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT 901740908 - 5

Actividad económica 4290
Dirección CRA 48 48 SUR 75 BG 161

Departamento Antioquia
Ciudad Envigado
Teléfono 4483012
Correo Electrónico facturacionelectronica@intramag.co

No somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autorretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Item	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	Acta Parcial N°23 Según Radicado Contrato de Obra 29092023-1456 MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	1,00	94	4.716.930.423,67	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.930.423,67
2	1	ADMINISTRACIÓN 26%	1,00	94	1.226.921.910,15	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.921.910,15
3	1	UTILIDAD 5%	1,00	94	235.946.521,18	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.946.521,18

Notas finales

Descripción

CONSORCIADOS: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 901.262.851-3 (10% PARTICIPACIÓN) E INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268 (45% PARTICIPACIÓN) MINOICA INGENIERÍA S.A.S (45% PARTICIPACIÓN)

Observaciones

Tramo 1 , y de tramo 1 Subtramo 3 Victoria Caldas $ 2.093.584.295 - Tramo 1 Subtramo 1 Narcasia Caldas $ 688.464.553 - Tramo 3 Samaná Caldas $ 2.443.033.112 – Tramo 4 Norte Antioquia $ 956.716.895).

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$6,181,798,855.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$6,181,798,855.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$6,181,798,855.00**

Valor a pagar en letras

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Código único de facturación electrónica

f16de1ffc8a3ccc28e5fa4d2212c291a2642564c762d60b7167862c6c41dbcb44395e541840c689ac6769b502cce1bl

Valor firma digital

xWnDvUNqOzrG+sN+SQgnySP66t/4AvxkiOkRYOKqGn0fhySCAHwAG2I6S32OHZKNo8WFRASJ3p4DACIYLv93OwrHyXuwcWy9+CsruJowd23h0yk+R3gVvv2Xapc168dEyYJ11fm0mcWQ2ihos
ouSbA+soGv/NkpLrFqvwdDZGY/+m5999eNW3a9ES17++pcq/4k0dzlGTa1+SMV5JUckmvoYTDdkan3q+t5Ws+SUP4a534bGCYKXoZUFlmlwAXBOxCNrYOqiCxP8UFC52e0CNk2m4+1PXqmzakWyB
06jB4ROOGsn9zbXShGAID+KcadL1nQbGRA==

Fecha y hora de expedición
18/11/2025 12:00:00

Numero fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

CONSORCIO
SAN MIGUEL
CALDAS

Envigado, 19 de noviembre de 2025

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
Manizales

Asunto: Certificación pago seguridad social

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SAN MIGUEL**, identificado con Nit. 901.740.908-5, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de suscripción del presente documento, la empresa a la cual represento, ha realizado los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo contenido en el Decreto 780 de 2016.

Atentamente,

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CC. 71.788.628

Carrera 48 # 48sur-75, Bodega 163
Envigado – Antioquia
Teléfono: 604 4483012

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Medellín

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Referencia: Mejoramiento de la vía Dorada – Sonsón, ruta del renacimiento
Fecha: 19 de noviembre de 2025

ZULIMA LOPEZ ARANGO, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa **INTRAMAQ S.A.S.**, certifico que a la fecha, la sociedad arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, del personal usado en el contrato de la referencia, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

Firma: Zulima Lopez Arango.
Nombre: **ZULIMA LOPEZ ARANGO**
Cargo: Revisora Fiscal
Número de identificación: 1.037.579.884 de Envigado
Tarjeta Profesional: 151637-T



INTRA MAQ
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151637-T



ZULIMA
LOPEZ ARANGO
C.E. 1037579884
RESOLUCION INSCRIPCION 252
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 27/08/2010

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ CARRIZO 16175

FIRMA DEL TITULAR 76798

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



www.intramaq.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BCECE538C2050FFB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULIMA LOPEZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037579884 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 151637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

minoica
ingeniería S.A.S.

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA MARIA GARCIA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía No. **43.156.715**, en mi condición de Representante Legal de **MINOICA INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT **901.848.505-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Envigado, el día (19) de noviembre de 2025.

SANDRA MARIA GARCIA HENAO
Representante legal
MINOICA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.848.505-6

hnv
harinsa · navasfalt

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.808.275 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 317795-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.,** identificada con NIT **901.262.851-3**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante el último mes, correspondiente a Noviembre.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Se expide en **BUCARAMANGA**, a los **19** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2025.**

JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.262.851-3

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

317795-T



JEFERSON ANDRES
GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 1000808275
RES. INSCRIPCION 485 DEL 01/11/2023
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

367671 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 372379
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6A80C819A47AD62

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFERSON ANDRES GARCIA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000808275 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 317795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141185705187

(415)7707212489984(8020) 000014118570518 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN MIGUEL

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 163

42. Correo electrónico analistacontable@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 1 2	4 2 2 0	2 0 2 3 0 5 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

7- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-06-2025 04:25:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185705187

(415)7707212489984(8020) 000014118570518 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 9 0 5 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 6 0 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 10-06-2025 04:25:19PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185705187

(415)7707212489984(8020) 000014118570518 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185705187

(415)7707212489984(8020) 000014118570518 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 9 0 8	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 3 0 5 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 4 8 5 0 5	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MINOICA INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 5 0 6 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185705187

[415]7707212489984[8020] 000014118570518 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 4 0 9 0 8 | 6. DV 5

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

13. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación: 1 0 8 2 9 0 6 9 9 3 | 150. DV: 7 | 151. Número de tarjeta profesional: 1 8 8 9 1 6 T

152. Primer apellido: BAENA | 153. Segundo apellido: DIAZ | 154. Primer nombre: JUAN | 155. Otros nombres: JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 3 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DEPARTAMENTO DE CALDAS

Acta de Protocolización de Cesión de Derechos Económicos del Contrato de Obra Pública derivado de la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 cuyo objeto es: ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

Entre los suscritos a saber: **JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA**, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.209 Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto No. 296 del 28 de junio de 2024 y posesionado mediante Acta del 02 de julio de 2024, actuando como delegatario del señor Gobernador según la delegación realizada a través del Decreto No. 4 del 2024-01-01 Modificado por el Decreto 174 del 18 de abril de 2024 *"por medio del cual se delegan unas funciones en materia de contratación"*, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** de una parte, y de otra, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** identificado con el NIT número 901.740.908-5 integrado por **HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.** persona jurídica identificada con NIT 901.262.851-3, **GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S** identificada con el NIT 830.136.490-1 e **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** quien se identifica con el NIT 900.102.268-1; Consorcio representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.788.628 de Medellín, quien para efectos del presente documento se denominará el **CEDENTE** y, el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en adelante el **CESIONARIO;** se suscribe la presente acta de protocolización de Cesión de Derechos Económicos, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas suscribió el Contrato de Obra Pública número 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023 con el CONSORCIO SAN MIGUEL el cual tiene por objeto el ***MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.***

II. Que, el contratista de Obra **CONSORCIO SAN MIGUEL**; mediante oficio fechado el día dieciocho (18) de octubre del año en curso, presentó a través de su representante **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA**, documento donde notifica a la Gobernación de Caldas de la Cesión de Derechos Económicos en el marco de la ejecución del proceso contractual antes referido.

Dicha comunicación fue acompañada con el *"Contrato de Cesión de Derechos Económicos"* y copia del *"Certificado Bancario"* emitido por la entidad financiera Banco de Occidente, donde se puede apreciar que la cuenta Corriente número *477-00558* está a nombre de la firma **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"**; contrato celebrado el día 18 de octubre de 2024 mediante

documento privado suscrito entre **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** en calidad de CEDENTE, y el señor **JUAN CAMILO MEJIA LALINDE**, identificado con la cédula de ciudadanía número **71.607.654** quien funge como representante legal de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS",** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1 en calidad de CESIONARIO.

III. Que, la Cesión de Derechos Económicos deviene del acuerdo civil, privado y particular entre las partes que lo acuerdan, esto se ve reflejado y materializado por Cedente y Cesionario en el acuerdo de voluntades que, para el caso concreto aporta el contratista de obra.

IV. Que, el contrato de Cesión de Derechos Económicos se suscribió como documento privado y fue aportado por el representante del CONSORCIO SAN MIGUEL tal como se puede evidenciar en la copia allegada por el Contratista con el oficio del 18 de octubre.

V. Que, de acuerdo con la ejecución restante del contrato de obra y la meta física pendiente por realizar a la fecha, el valor a pagar del contrato, asciende a la suma de **SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS ($74.773.545.320).**

VI. Que, a propósito de la cesión de Derechos Económicos o cesión de créditos derivados de un contrato estatal, ha manifestado el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero[1] que:

> ***"En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda. (...)".***

VII. Que, Respecto al fundamento doctrinario, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE emitió concepto No. 4201714000004797 - cesión derechos económicos, 2018-04-17: "(...) en el contrato de cesión de derechos económicos debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos de un contrato estatal está permitida y produce efectos cuando: (i) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y (ii) es aceptada por la Entidad Estatal (...)". Por ende, de los referidos desarrollos doctrinario y jurisprudencial, se puede concluir que un contratista está en capacidad legal de ceder a un tercero los créditos por concepto de honorarios causados a su favor en los términos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, y que una vez cedido el crédito, el cesionario puede proceder al cobro de dicha acreencia a la entidad deudora presentando el documento a que haya lugar según la normatividad que le aplique.

[1] **Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817)**

VIII. Que, el Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL, hoy en calidad de CEDENTE de los créditos económicos del contrato de Obra Pública derivado de la Licitación No. LP-SI-004-2023, declara con la suscripción del contrato de Cesión de Derechos Económicos, que no se encuentra incurso en demandas o en fallos judiciales donde se ordenen cumplimientos de obligaciones, que puedan defraudar acreedores y terceros con la cesión de los créditos derivados del contrato estatal; de lo contrario, la Gobernación de Caldas representada en la Secretaría de Infraestructura, no asumirá responsabilidades y anulará la aceptación de la Cesión de los Derechos Económicos aquí materializada.

IX. Que el supervisor del contrato, mediante oficio del 28 de octubre de 2024 solicitó al Secretario de Infraestructura, aprobar la Cesión de Derechos Económicos presentada por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA corroborando que a la fecha, el contratista se encuentra ejecutando el objeto contractual y que existen pagos pendientes de realizar, sujetos al avance y a la ejecución del contrato.

X. Que, la Gobernación de Caldas contempla en el Manual de Contratación - Decreto 633 del 29 de noviembre de 2022, subnumeral 8.5, las modificaciones durante la ejecución contractual incluyendo la Cesión de los Derechos Económicos, estableciendo que será la entidad contratante quien autorice previa verificación, dicha Cesión de Derechos Económicos, advirtiendo que en ningún caso el contratista se sustraerá de sus obligaciones primigenias.

XI. Que, en virtud de la Cesión de Derechos Económicos realizada por el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado legalmente por el señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA, **identificado con cedula de ciudadanía número 71.788.628 Medellín, al señor JUAN** CAMILO MEJIA LALINDE identificado con la cédula de ciudadanía número 71.607.654 quien funge como representante legal Suplente de la Sociedad **INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S "INTRAMAQ SAS"** persona jurídica identificada con el NIT 900.102.268-1; la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, realiza las siguientes constancias:

A. Que de acuerdo al documento privado suscrito entre los particulares, se realiza la Cesión de Derechos Económicos del 18 de octubre de 2024, la cual en ningún momento puede entenderse como la Cesión de la Posición Contractual ni como la Cesión plena del Contrato de obra, mismo que fuere adjudicado al **CONSORCIO SAN MIGUEL** en el la Licitación Pública No. LP-SI-004-2023 de la cual derivó el Contrato 29092023-1456.

B. Que, el **CONSORCIO SAN MIGUEL** quien se identifica con el NIT número 901.740.908-5 y está representado por el señor **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA** identificado con la cédula de ciudadanía 71.788.628, es el responsable de las obligaciones contractuales que le asisten en virtud del contrato de Obra Pública No. 29092023-1456 derivado de la Licitación LP-SI-004-2023.

C. Que, la Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura, en su condición de deudor cedido, conserva la potestad de oponer al cesionario o nuevo acreedor de las prestaciones económicas derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato 29092023-1456, las mismas excepciones que

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** identificada con el número de documento **9001022681** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de diciembre de 2013 con la Cuenta Corriente 477-005581 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **13 de mayo de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

37. Sigla
INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 8 3 0 1 2	3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 2 1 0	2 0 0 6 0 7 1 3	4 3 1 2	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 08 / 13 : 50: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 01:51:36PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 7 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	3 3
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 1 7 0 2 0 9
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 1 7 0 5 0 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 7 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 2 4 8 9 3 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	DE CADAVID	ANA	MARIA LUISA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
3	Cédula de Ciudada 1 3	9 8 5 6 2 6 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	JUAN	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
4	Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 5 5 0 1 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ECHAVARRIA	SOTO	ROBERTO	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
5	Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 5 de 7 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 1 5 6 7 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	HENAO	SANDRA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 5 3 4 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CADAVID	RESTREPO	GABRIEL	LORENZO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 3 4 9 6 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
URIBE	DIAZ	JUAN	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 9 5 3 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RESTREPO	PAREJA	DIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 9 7 1 6 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	LALINDE	CLARA	OLGA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 3 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 5 7 9 8 8 4		1 5 1 6 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	ARANGO	ZULIMA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 2 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 6 3 7 2 5	0	3 0 1 1 0 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MURIEL	MANRIQUE	JUAN	PABLO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 1 1 0 4 4 4 0 6	8	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 2 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989516799

(415)7707212489984(8020) 000001498951679 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6	

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185982786

(415)7707212489984(8020) 000014118598278 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 4 8 5 0 5 | 6. DV 6

12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 1 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social: MINOICA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico: facturacionelectronica@intramaq.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 0 4 4 4 8 3 0 1 2

45. Teléfono 2: 3 1 0 4 6 1 3 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 4 3 0	4 2 2 0	2 0 2 4 0 4 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 42 47 48 52 55

- 7 - Retención en la fuente a título de renta
- 14 - Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

965. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-06-2025 07:23:30AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social
HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 156 C 98 37

42. Correo electrónico harinsacol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 6 6 3 0 0 2 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 9 0 3 0 7	4 9 2 2	2 0 1 9 0 3 0 7	4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- - Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO PEROMINGO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-04-2025 11:39:38AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 0 7	2 0 2 3 0 3 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 0 7	2 0 2 3 0 3 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 7 9 6 4 9	0 3 0 7 9 6 4 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 0 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 9 0 3 0 7		
2	8 0	2 0 2 4 1 0 2 2		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 22-04-2025 11:39:38AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A T 4 3 9 2 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	PEROMINGO	ALFONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174393013

(415)7707212489984(8020) 000014117439301 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 2 8 5 1	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 8 0 8 2 7 5	9	3 1 7 7 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARCIA	RODRIGUEZ	JEFERSON	ANDRES

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

Re

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102268	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR -75 BG161	MONTELIBANO-CORDOBA	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1850404583	9493169756	E	2025/10/16	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$269,938,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$8,613,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,427,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$4,629,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,556,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$3,041,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,041,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$2,114,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$168,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,945,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$2,132,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,057,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$533,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$176,400
TOTAL				2	$365,300
				12	$15,901,400

2025/10/17 07:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900102265	1	INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 48 48SUR -75 BG161	MONTELIBANO-CORDOBA	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1850404388	94931189756	E	2025/10/16	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$269,936,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)					$53,295,883	$8,613,600			$53,295,883	$2,132,300			$52,839,236	$2,114,000			$53,295,883	$3,041,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO SEDE PPAL. ENV (1 Afiliados)					**$4,000,001**	**$640,100**			**$4,000,001**	**$160,100**			**$4,000,001**	**$160,100**			**$4,000,001**	**$20,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$4,000,001**	**$640,100**			**$4,000,001**	**$160,100**			**$4,000,001**	**$160,100**			**$4,000,001**	**$20,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1036663052	URIAN MESA YULIETH NATALIA	230301	29	$3,866,667	$618,700	EPS010	29	$3,866,667	$154,700	CCF03	29	$3,866,667	$154,700	14-25	29	$3,866,667	$20,200	29	$0	$0
2	CC	1036663052	URIAN MESA YULIETH NATALIA	230301	1	$133,334	$21,400	EPS010	1	$133,334	$5,400	CCF03	1	$133,334	$5,400	14-25	1	$133,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CALDAS/ OFICIOS VARIOS (1 Afiliados)					**$4,922,273**	**$787,600**			**$4,922,273**	**$196,900**			**$4,922,273**	**$196,900**			**$4,922,273**	**$120,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$4,922,273**	**$787,600**			**$4,922,273**	**$196,900**			**$4,922,273**	**$196,900**			**$4,922,273**	**$120,000**		**$0**	**$0**
3	CC	7713694	DEVIA GUTIERREZ EDWIN MAURICIO	230301	30	$4,922,273	$787,600	EPS009	30	$4,922,273	$196,900	CCF03	30	$4,922,273	$196,900	14-25	30	$4,922,273	$120,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA AMALFI (4 Afiliados)					**$22,135,840**	**$3,627,700**			**$22,135,840**	**$885,600**			**$21,676,140**	**$875,200**			**$22,135,840**	**$1,477,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					**$4,209,545**	**$673,600**			**$4,209,545**	**$168,400**			**$4,209,545**	**$168,400**			**$4,209,545**	**$293,000**		**$0**	**$0**
4	CC	16457957	DELGADO AVENDAÑO EDGAR	230301	30	$4,209,545	$673,600	EPS005	30	$4,209,545	$168,400	CCF21	30	$4,209,545	$168,400	14-25	30	$4,209,545	$293,000	30	$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$8,580,000**	**$1,458,600**			**$8,580,000**	**$343,200**			**$8,580,000**	**$343,200**			**$8,580,000**	**$597,200**		**$0**	**$0**
5	CC	75088803	GARCIA CAMPINO RODRIGO	25-14	30	$8,580,000	$1,458,600	EPS037	30	$8,580,000	$343,200	CCF03	30	$8,580,000	$343,200	14-25	30	$8,580,000	$597,200	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					**$9,346,295**	**$1,495,300**			**$9,346,295**	**$374,000**			**$9,086,595**	**$363,600**			**$9,346,295**	**$587,700**		**$0**	**$0**
6	CC	15456130	BETANCUR TABARES ALIRIO OSWALDO DE JESUS	25-14	30	$4,603,636	$736,600	EPS010	30	$4,603,636	$184,200	CCF03	30	$4,603,636	$184,200	14-25	30	$4,603,636	$320,500	30	$0	$0
7	CC	10184841	LUNA CASTILLO NODIER	25-14	25	$3,839,045	$614,300	EPS037	25	$3,839,045	$153,600	CCF03	25	$3,839,045	$153,600	14-25	25	$3,839,045	$267,200	25	$0	$0
8	CC	10184841	LUNA CASTILLO NODIER	25-14	5	$903,614	$144,600	EPS037	5	$903,614	$36,200	CCF03	5	$640,914	$25,600	14-25	5	$903,614	$0	5	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA DONMATIAS (5 Afiliados)					**$19,057,938**	**$3,049,400**			**$19,057,938**	**$762,500**			**$18,860,991**	**$754,600**			**$19,057,938**	**$1,285,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					**$7,358,619**	**$1,177,500**			**$7,358,619**	**$294,500**			**$7,161,672**	**$286,600**			**$7,358,619**	**$470,700**		**$0**	**$0**
9	CC	1037233292	RENDON AGUDELO CARLOS ANDRES	230301	30	$4,356,137	$697,000	EPS010	30	$4,356,137	$174,300	CCF03	30	$4,356,137	$174,300	14-25	30	$4,356,137	$303,200	30	$0	$0
10	CC	98503450	SEPULVEDA MONSALVE ALEANDRO NICOLAS	25-14	25	$2,405,902	$385,000	EPS010	25	$2,405,902	$96,300	CCF03	25	$2,405,902	$96,300	14-25	25	$2,405,902	$167,500	25	$0	$0
11	CC	98503450	SEPULVEDA MONSALVE ALEANDRO NICOLAS	25-14	5	$596,580	$95,500	EPS010	5	$596,580	$23,900	CCF03	5	$399,633	$16,000	14-25	5	$596,580	$0	5	$0	$0
Ciudad: MACEO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$3,000,000**	**$480,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$120,000**			**$3,000,000**	**$208,800**		**$0**	**$0**
12	CC	16015671	MENDEZ GRATEROL JHON EDISSON	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF03	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					**$8,699,319**	**$1,391,900**			**$8,699,319**	**$348,000**			**$8,699,319**	**$348,000**			**$8,699,319**	**$605,500**		**$0**	**$0**
13	CC	1018345973	CARTAGENA MONTOYA JOHN EDWAR	230301	30	$4,409,319	$705,500	EPS002	30	$4,409,319	$176,400	CCF03	30	$4,409,319	$176,400	14-25	30	$4,409,319	$306,900	30	$0	$0
14	CC	94395349	RIOS CUERVO YOVANNY	25-14	30	$4,290,000	$686,400	EPS010	30	$4,290,000	$171,600	CCF03	30	$4,290,000	$171,600	14-25	30	$4,290,000	$298,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERADORES, CONDUCTORES, M/O (1 Afiliados)					**$3,179,831**	**$508,800**			**$3,179,831**	**$127,200**			**$3,179,831**	**$127,200**			**$3,179,831**	**$138,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$3,179,831**	**$508,800**			**$3,179,831**	**$127,200**			**$3,179,831**	**$127,200**			**$3,179,831**	**$138,400**		**$0**	**$0**
15	CC	15322099	LONDOÑO PEÑA HERNAN DE JESUS	25-14	30	$3,179,831	$508,800	EPS010	30	$3,179,831	$127,200	CCF03	30	$3,179,831	$127,200	14-25	30	$3,179,831	$138,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**				**$53,295,883**	**$8,613,600**			**$53,295,883**	**$2,132,300**			**$52,839,236**	**$2,114,000**			**$53,295,883**	**$3,041,500**		**$0**	**$0**

2025/10/17 07:17 AM

aportes en línea

Pla"la Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur -75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909136113	949444689	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$141,333,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$244,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$3,107,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$509,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	56	$6,454,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$514,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$2,225,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$846,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	20	$1,862,600
TOTAL				145	$121,038,200

171	CC	1147934648	TORO PEREZ JOSE JAIMBER									X									230201	30	$2,144,309	$343,100	EPS040	30	$2,144,309	$85,800	CCF03	30	$2,144,309	$85,800		30	$2,144,309	$149,300	30	$0	$0	$654,000
172	CC	1036190663	VALENCIA HERRERA CAMILO									X									230301	29	$2,217,857	$354,900	EPS040	29	$2,217,857	$88,800	CCF03	29	$2,217,857	$88,800		29	$7,217,857	$154,400	29	$0	$0	$686,900
173	CC	1036190663	VALENCIA HERRERA CAMILO													X					230301	1	$70,669	$11,400	EPS040	1	$70,669	$2,900	CCF03	1	$47,450	$1,900		1	$70,669	$0	1	$0	$0	$16,200
174	CC	3059488	VERA GUZMAN ABRAHAM									X									230201	29	$3,183,092	$509,300	EPS037	29	$3,183,092	$127,400	CCF03	29	$3,183,092	$127,400		29	$3,183,092	$221,600	29	$0	$0	$985,700
175	CC	3059488	VERA GUZMAN ABRAHAM													X					230201	1	$100,498	$16,100	EPS037	1	$100,498	$4,100	CCF03	1	$70,000	$2,800		1	$100,498	$0	1	$0	$0	$23,000
176	CC	98661977	VERA CASTRILLON HECTOR ANDRES									X									25-14	29	$4,813,865	$770,300	EPS010	29	$4,813,865	$192,600	CCF03	29	$4,813,865	$192,600		29	$4,813,865	$335,100	29	$0	$0	$1,490,600
177	CC	98661977	VERA CASTRILLON HECTOR ANDRES													X					25-14	1	$158,535	$25,400	EPS010	1	$158,535	$6,400	CCF03	1	$100,000	$4,000		1	$158,535	$0	1	$0	$0	$35,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 6 (2 Afiliados)																							$7,682,341	$1,229,300			$7,682,341	$307,400			$7,682,341	$307,400			$7,682,341	$80,300		$0	$0	$1,924,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$3,921,308	$627,500			$3,921,308	$156,900			$3,921,308	$156,900			$3,921,308	$41,000		$0	$0	$982,300
178	CC	79793903	DONATO HOYOS HORMER ANTONIO									X									25-14	30	$3,921,308	$627,500	EPS002	30	$3,921,308	$156,900	CCF11	30	$3,921,308	$156,900		30	$3,921,308	$41,000	30	$0	$0	$982,300
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$3,761,033	$601,800			$3,761,033	$150,500			$3,761,033	$150,500			$3,761,033	$39,300		$0	$0	$942,100
179	CC	98453608	PEREZ JHON FREDY									X									230301	30	$3,761,033	$601,800	EPS010	30	$3,761,033	$150,500	CCF03	30	$3,761,033	$150,500		30	$3,761,033	$39,300	30	$0	$0	$942,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 9 (2 Afiliados)																							$7,934,318	$1,269,500			$7,934,318	$317,400			$7,934,318	$317,400			$7,934,318	$193,400		$0	$0	$2,097,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$3,434,318	$549,500			$3,434,318	$137,400			$3,434,318	$137,400			$3,434,318	$83,700		$0	$0	$908,000
180	CC	1079509336	BORRERO QUINTERO JAIR									X									231001	30	$3,434,318	$549,500	EPS005	30	$3,434,318	$137,400	CCF11	30	$3,434,318	$137,400		30	$3,434,318	$83,700	30	$0	$0	$908,000
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$109,700		$0	$0	$1,189,700
181	CC	98578430	ZAPATA SOSSA JUAN CARLOS																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF03	30	$4,500,000	$180,000		30	$4,500,000	$109,700	30	$0	$0	$1,189,700
Total	**Afiliados(145)**																						$404,126,056	$64,732,300			$407,772,297	$16,312,800			$409,532,421	$16,261,500			$407,772,297	$23,731,600		$0	$0	$121,038,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur -75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909136113	9494446689	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$141,353,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				144	$64,732,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,893,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$16,223,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$35,139,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$10,476,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	$23,731,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	145	$23,731,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)	-			147	$16,261,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$182,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$557,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$139,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	48	$5,895,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	93	$9,486,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				145	$16,312,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$150,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$136,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$259,100

133	CC	3593507	ATEHORTUA AGUDELO YIM NORBERTO																		230301	30	$3,350,000	$536,000	EPS037	30	$3,350,000	$134,000	CCF03	30	$3,350,000	$134,000		30	$3,350,000	$233,200	30	$0	$0	$1,037,200
134	CC	1193129630	CATAÑO MONTIEL JOSE JAVIER									X									230301	22	$1,458,656	$233,400	EPS002	22	$1,458,656	$58,400	CCF03	22	$1,458,656	$58,400		22	$1,458,656	$101,600	22	$0	$0	$451,800
135	CC	1193129630	CATAÑO MONTIEL JOSE JAVIER																X		230301	8	$524,712	$84,000	EPS002	8	$524,712	$21,000	CCF03	8	$524,712	$0		8	$524,712	$0	8	$0	$0	$105,000
136	CC	1069713713	CORDOBA OCHOA OSCAR FERNANDO									X									230301	30	$2,411,054	$385,800	EPS005	30	$2,411,054	$96,500	CCF03	30	$2,411,054	$96,500		30	$2,411,054	$167,900	30	$0	$0	$746,700
137	CC	75088803	GARCIA CAMPIÑO RODRIGO	X																	25-14	14	$4,004,000	$640,700	EPS037	14	$4,004,000	$160,200	CCF03	14	$4,004,000	$160,200		14	$4,004,000	$278,700	14	$0	$0	$1,239,800
138	CC	1093915126	GARZON MERCHAN FRANCISCO									X									230301	30	$3,685,022	$589,700	EPS037	30	$3,685,022	$147,500	CCF03	30	$3,685,022	$147,500		30	$3,685,022	$256,500	30	$0	$0	$1,141,200
139	CC	1001440344	GIRALDO LONDOÑO LUIS DAVID	X	X							X									230301	14	$680,476	$108,900	EPS002	14	$680,476	$27,300	CCF03	14	$708,709	$28,400		14	$680,476	$47,400	14	$0	$0	$217,000
140	CC	1001440344	GIRALDO LONDOÑO LUIS DAVID										X								230301	3	$144,460	$17,400	EPS002	3	$144,460	$0	CCF03	3	$142,350	$0		3	$144,460	$0	3	$0	$0	$17,400
141	CC	1122122753	HOLGUIN BARRERA OSCAR FABIAN									X									230301	30	$3,140,500	$502,500	EPS037	30	$3,140,500	$125,700	CCF03	30	$3,140,500	$125,700		30	$3,140,500	$218,600	30	$0	$0	$972,500
142	CC	98563581	IDARRAGA PALACIO ALEX EDUARDO																		230301	30	$5,260,000	$841,600	EPS010	30	$5,260,000	$210,400	CCF03	30	$5,260,000	$210,400		30	$5,260,000	$366,100	30	$0	$0	$1,628,500
143	CC	8105700	ISAZA OSPINA ELVER JULIAN									X									231001	30	$5,048,524	$807,800	EPS010	30	$5,048,524	$202,000	CCF03	30	$5,048,524	$202,000		30	$5,048,524	$351,400	30	$0	$0	$1,563,200
144	CC	71725237	LOAIZA TORRES JOSE WIRO									X									25-14	30	$2,533,764	$405,500	EPS037	30	$2,533,764	$101,400	CCF03	30	$2,533,764	$101,400		30	$2,533,764	$176,400	30	$0	$0	$784,700
145	CC	1237438189	LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO									X									230301	29	$2,039,757	$326,400	EPS040	29	$2,039,757	$81,600	CCF03	29	$2,039,757	$81,600		29	$2,039,757	$142,000	29	$0	$0	$631,600
146	CC	1237438189	LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO													X					230301	1	$67,024	$10,800	EPS040	1	$67,024	$2,700	CCF03	1	$47,450	$1,900		1	$67,024	$0	1	$0	$0	$15,400
147	CC	1002580821	LOPEZ GONZALEZ JOSE JESUS									X									25-14	29	$2,074,859	$332,000	EPS040	29	$2,074,859	$83,000	CCF03	29	$2,074,859	$83,000		29	$2,074,859	$144,500	29	$0	$0	$642,500
148	CC	1002580821	LOPEZ GONZALEZ JOSE JESUS													X					25-14	1	$68,253	$11,000	EPS040	1	$68,253	$2,800	CCF03	1	$47,450	$1,900		1	$68,253	$0	1	$0	$0	$15,700
149	CC	1038062742	MARIN VALENCIA ANGEL EUCARIO									X									25-14	30	$2,221,306	$355,500	EPS010	30	$2,221,306	$88,900	CCF03	30	$2,221,306	$88,900		30	$2,221,306	$154,700	30	$0	$0	$688,000
150	CC	1036838964	MARQUEZ JORGE ISLAM									X									230301	30	$2,139,780	$342,400	EPS040	30	$2,139,780	$85,600	CCF03	30	$2,139,780	$85,600		30	$2,139,780	$149,000	30	$0	$0	$662,600
151	CC	1015278028	MARULANDA SANCHEZ SEBASTIAN																		230301	29	$4,350,000	$696,000	EPS010	29	$4,350,000	$174,000	CCF03	29	$4,350,000	$174,000		29	$4,350,000	$302,800	29	$0	$0	$1,346,800
152	CC	1015278028	MARULANDA SANCHEZ SEBASTIAN													X					230301	1	$150,000	$24,000	EPS010	1	$150,000	$6,000	CCF03	1	$150,000	$6,000		1	$150,000	$0	1	$0	$0	$36,000
153	CC	70193770	MORALES RESTREPO GUSTAVO									X									230301	30	$3,426,341	$548,300	EPS037	30	$3,426,341	$137,100	CCF03	30	$3,426,341	$137,100		30	$3,426,341	$238,500	30	$0	$0	$1,061,000
154	CC	1036840963	OCAMPO HERRERA JUAN GUILLERMO									X									230301	30	$2,055,340	$328,900	EPS040	30	$2,055,340	$82,300	CCF03	30	$2,055,340	$82,300		30	$2,055,340	$143,100	30	$0	$0	$636,600
155	CC	1106483675	PENAGOS REYES GUSTAVO ADOLFO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF03	30	$3,000,000	$120,000		30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	$928,800
156	CC	1036190117	PEREZ LOPEZ SANTIAGO									X									230301	30	$2,166,631	$346,700	EPS040	30	$2,166,631	$86,700	CCF03	30	$2,166,631	$86,700		30	$2,166,631	$150,800	30	$0	$0	$670,900
157	CC	1046955162	PUERTA BETANCUR GABRIEL ENRIQUE									X									230301	23	$2,450,000	$392,000	ESSC24	23	$2,450,000	$98,000	CCF03	23	$2,450,000	$98,000		23	$2,450,000	$170,600	23	$0	$0	$758,600
158	CC	1046955162	PUERTA BETANCUR GABRIEL ENRIQUE													X					230301	7	$777,486	$124,400	ESSC24	7	$777,486	$31,100	CCF03	7	$553,690	$22,200		7	$777,486	$0	7	$0	$0	$177,700
159	CC	71623136	RAMOS ARBOLEDA LUIS EDUARDO									X										0	$0	$0	EPS010	30	$3,646,239	$145,900	CCF03	30	$3,646,239	$145,900		30	$3,646,239	$253,800	30	$0	$0	$545,600
160	CC	1105786929	RENGIFO VARGAS JUAN SEBASTIAN																		230301	27	$1,530,000	$244,800	EPS037	27	$1,530,000	$61,200	CCF03	27	$1,530,000	$61,200		27	$1,530,000	$106,500	27	$0	$0	$473,700
161	CC	1105786929	RENGIFO VARGAS JUAN SEBASTIAN													X					230301	3	$146,959	$23,600	EPS037	3	$146,959	$5,900	CCF03	3	$171,827	$6,900		3	$146,959	$0	3	$0	$0	$36,400
162	CC	1046952185	RESTREPO BEDOYA LUZ MARIA	X																	230301	27	$2,700,000	$432,000	EPS010	27	$2,700,000	$108,000	CCF03	27	$2,700,000	$108,000		27	$2,700,000	$188,000	27	$0	$0	$836,000
163	CC	94422236	REYES TORRES JESUS IVAN									X									230301	30	$3,272,398	$523,600	EPS037	30	$3,272,398	$130,900	CCF03	30	$3,272,398	$130,900		30	$3,272,398	$227,800	30	$0	$0	$1,013,200
164	CC	1001440599	RIOS CIFUENTES YOJAN ALEXIS									X									25-14	30	$2,253,012	$360,500	EPS040	30	$2,253,012	$90,200	CCF03	30	$2,253,012	$90,200		30	$2,253,012	$156,900	30	$0	$0	$697,800
165	CC	71790548	RIVERA BERNAL RODRIGO ANDRES																		25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS010	30	$2,420,000	$96,800	CCF03	30	$2,420,000	$96,800		30	$2,420,000	$168,500	30	$0	$0	$749,300
166	CC	1047968527	SANCHEZ SANCHEZ DAIRON									X									230301	30	$1,957,960	$313,300	EPS037	30	$1,957,960	$78,400	CCF03	30	$1,957,960	$78,400		30	$1,957,960	$136,300	30	$0	$0	$606,400
167	CC	1030420681	SANCHEZ SANCHEZ JOHN FREDY									X									25-14	30	$4,567,977	$730,900	EPS010	30	$4,567,977	$182,800	CCF03	30	$4,567,977	$182,800		30	$4,567,977	$318,000	30	$0	$0	$1,414,500
168	CC	1039682737	SANCHEZ CARO WILSON ALBERTO									X									25-14	25	$2,816,705	$450,700	EPS037	25	$2,816,705	$112,700	CCF03	25	$2,816,705	$112,700		25	$2,816,705	$196,100	25	$0	$0	$872,200
169	CC	1039682737	SANCHEZ CARO WILSON ALBERTO																X		25-14	5	$516,171	$82,600	EPS037	5	$516,171	$20,700	CCF03	5	$516,171	$0		5	$516,171	$0	5	$0	$0	$103,300
170	CC	4180080	TIBATA CHITIVO JOAQUIN ANTONIO																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF03	30	$7,000,000	$280,000		30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	$2,237,200

95	CC	1036840364	MARTINEZ GUZMAN LUIS ALBERTO									X									230201	30	$2,475,435	$396,100	EPS002	30	$2,475,435	$99,100	CCF11	30	$2,475,435	$99,100		30	$2,475,435	$172,300	30	$0	$0	$766,600
96	CC	1047966046	MELO SALAZAR MONICA JOHANNA									X									230301	30	$2,509,728	$401,600	EPS040	30	$2,509,728	$100,400	CCF11	30	$2,509,728	$100,400		30	$2,509,728	$174,700	30	$0	$0	$777,100
97	CC	1001112575	MESA GONZALEZ VICTOR MANUEL																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF11	30	$3,000,000	$120,000		30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	$928,800
98	CC	1128627598	MONTOYA ECHEVERRY YULIET ANDREA									X									230301	30	$2,423,671	$387,800	EPS002	30	$2,423,671	$97,000	CCF11	30	$2,423,671	$97,000		30	$2,423,671	$168,700	30	$0	$0	$750,500
99	CC	1054558302	MORA BUITRAGO JOSE ESMID									X									230301	28	$1,844,619	$295,200	EPS037	28	$1,844,619	$73,800	CCF11	28	$1,844,619	$73,800		28	$1,844,619	$128,400	28	$0	$0	$571,200
100	CC	1054558302	MORA BUITRAGO JOSE ESMID											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF11	2	$94,900	$0		2	$94,900	$0	2	$0	$0	$19,000
101	CC	1054561204	MUÑOZ VARGAS CARLOS ARTURO									X									230301	30	$2,073,133	$331,800	EPS037	30	$2,073,133	$83,000	CCF11	30	$2,073,133	$83,000		30	$2,073,133	$144,300	30	$0	$0	$642,100
102	CC	1027520652	OROZCO AGUIRRE ANGEL GABRIEL	X								X									230301	16	$1,176,059	$188,200	EPS002	16	$1,176,059	$47,100	CCF11	16	$1,176,059	$47,100		16	$1,176,059	$81,900	16	$0	$0	$364,300
103	CC	1002799234	OROZCO AGUIRRE CARLOS MANUEL									X									25-14	29	$2,360,530	$377,700	EPS037	29	$2,360,530	$94,500	CCF11	29	$2,360,530	$94,500		29	$2,360,530	$164,300	29	$0	$0	$731,000
104	CC	1002799234	OROZCO AGUIRRE CARLOS MANUEL													X					25-14	1	$72,335	$11,600	EPS037	1	$72,335	$2,900	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$72,335	$0	1	$0	$0	$16,400
105	CC	1214741295	PANESO OROZCO LEIDY YOHANA									X									230201	30	$2,111,310	$337,900	EPS040	30	$2,111,310	$84,500	CCF11	30	$2,111,310	$84,500		30	$2,111,310	$147,000	30	$0	$0	$653,900
106	CC	1036838280	PEREZ BUITRAGO EDUAR ALONSO									X									230201	30	$2,325,968	$372,200	EPS040	30	$2,325,968	$93,100	CCF11	30	$2,325,968	$93,100		30	$2,325,968	$161,900	30	$0	$0	$720,300
107	CC	1059118186	QUINTERO HENAO DANIEL FELIPE									X									230301	15	$1,189,269	$190,300	EPS010	15	$1,189,269	$47,600	CCF11	15	$1,189,269	$47,600		15	$1,189,269	$82,800	15	$0	$0	$368,300
108	CC	1059118186	QUINTERO HENAO DANIEL FELIPE													X					230301	15	$988,524	$158,200	EPS010	15	$988,524	$39,600	CCF11	15	$783,439	$31,400		15	$988,524	$0	15	$0	$0	$279,200
109	CC	1072752752	RAMIREZ REYES LUIS HERNAN									X									230301	30	$2,522,682	$403,700	EPS037	30	$2,522,682	$101,000	CCF11	30	$2,522,682	$101,000		30	$2,522,682	$175,600	30	$0	$0	$781,300
110	CC	1058847500	RAMIREZ BORJA MAICOL ANDRES									X									230301	30	$2,132,661	$341,300	EPS037	30	$2,132,661	$85,400	CCF11	30	$2,132,661	$85,400		30	$2,132,661	$148,500	30	$0	$0	$660,600
111	CC	1046952165	RESTREPO BEDOYA LUZ MARIA		X																230301	3	$300,000	$48,000	EPS010	3	$300,000	$12,000	CCF11	3	$1,800,000	$72,000		3	$300,000	$20,900	3	$0	$0	$152,900
112	CC	1002580399	RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN DIEGO									X									230301	29	$2,135,520	$341,700	EPS002	29	$2,135,520	$85,500	CCF11	29	$2,135,520	$85,500		29	$2,135,520	$148,700	29	$0	$0	$661,400
113	CC	1002580399	RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN DIEGO											X							230301	1	$47,730	$7,700	EPS002	1	$47,730	$2,000	CCF11	1	$47,730	$0		1	$47,730	$0	1	$0	$0	$9,700
114	CC	1036839377	ROMERO PEREZ JESUS ALBEIRO									X									230301	29	$2,503,364	$400,600	EPS017	29	$2,503,364	$100,200	CCF11	29	$2,503,364	$100,200		29	$2,503,364	$174,300	29	$0	$0	$775,300
115	CC	1036839377	ROMERO PEREZ JESUS ALBEIRO													X					230301	1	$79,975	$12,800	EPS037	1	$79,975	$3,200	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$79,975	$0	1	$0	$0	$17,900
116	CC	1082124254	SALAZAR AVILA JHON FREDY									X									230301	30	$5,210,455	$833,700	EPS005	30	$5,210,455	$208,500	CCF11	30	$5,210,455	$208,500		30	$5,210,455	$362,700	30	$0	$0	$1,613,400
117	CC	1192749083	SALAZAR OROZCO YEISON ALEJANDRO									X									230301	30	$2,354,922	$376,800	EPS037	30	$2,354,922	$94,200	CCF11	30	$2,354,922	$94,200		30	$2,354,922	$164,000	30	$0	$0	$729,200
118	CC	1036190074	SUAREZ OSPINA DIANA MARCELA		X							X									230301	25	$2,118,697	$339,000	EPS010	25	$2,118,697	$84,800	CCF11	25	$2,480,993	$99,300		25	$2,118,697	$147,500	25	$0	$0	$670,600
119	CC	1007247766	TABARES VASQUEZ ALEJANDRO									X									230301	30	$2,017,326	$322,800	EPS041	30	$2,017,326	$80,700	CCF11	30	$2,017,326	$80,700		30	$2,017,326	$140,500	30	$0	$0	$624,700
120	CC	1054542590	TAPAZCO SILVA JUAN ESTEBAN									X									230301	30	$2,318,364	$371,000	EPS037	30	$2,318,364	$92,800	CCF11	30	$2,318,364	$92,800		30	$2,318,364	$161,400	30	$0	$0	$718,000
121	CC	1014859467	TIBANA HINESTROZA JUAN PABLO									X									230301	29	$2,315,399	$370,500	EPS037	29	$2,315,399	$92,700	CCF11	29	$2,315,399	$97,700		29	$2,315,399	$161,200	29	$0	$0	$717,100
122	CC	1014859467	TIBANA HINESTROZA JUAN PABLO													X					230301	1	$72,777	$11,700	EPS037	1	$72,777	$3,000	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$72,777	$0	1	$0	$0	$16,600
123	CC	7697913	TRUJILLO ALEXANDER									X									230201	30	$5,230,909	$837,000	EPS037	30	$5,230,909	$209,300	CCF11	30	$5,230,909	$209,300		30	$5,230,909	$364,100	30	$0	$0	$1,619,700
124	CC	70185960	VALENCIA ARISMENDI EFREN									X									230301	30	$3,145,705	$503,400	EPS037	30	$3,145,705	$125,900	CCF11	30	$3,145,705	$125,900		30	$3,145,705	$219,000	30	$0	$0	$974,200
125	CC	1058847311	VALENCIA MURILLO ESTEBAN									X									230301	30	$2,639,136	$422,300	EPS037	30	$2,639,136	$105,600	CCF11	30	$2,639,136	$105,600		30	$2,639,136	$183,700	30	$0	$0	$817,200
126	CC	1058847446	VASQUEZ CALDERON MARYORY									X									230201	30	$2,325,967	$372,200	EPS010	30	$2,325,967	$93,100	CCF11	30	$2,325,967	$93,100		30	$2,325,967	$161,900	30	$0	$0	$720,300
127	CC	10187857	VILLA CARO JORGE EDUARDO									X									230301	30	$3,026,864	$484,300	EPS037	30	$3,026,864	$121,100	CCF11	30	$3,026,864	$121,100		30	$3,026,864	$210,700	30	$0	$0	$937,200
128	CC	1036190487	ZAPATA OCAMPO JOHN HEIDER									X									230301	30	$2,454,245	$392,700	EPS040	30	$2,454,245	$98,200	CCF11	30	$2,454,245	$98,200		30	$2,454,245	$170,900	30	$0	$0	$760,000
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (37 Afiliados)																							$108,291,766	$17,392,700			$111,938,005	$4,473,700			$111,850,839	$4,428,300			$111,938,005	$7,595,000		$0	$0	$13,889,700
129	CC	86709965	AGUILAR MOLINA LUIS ALFREDO									X									230201	30	$3,437,557	$550,100	EPS037	30	$3,437,557	$137,600	CCF03	30	$3,437,557	$137,600		30	$3,437,557	$239,300	30	$0	$0	$1,064,600
130	CC	98606263	ARANGO MUNERA GERMAN RODOLFO		X							X									25-14	6	$443,864	$71,100	EPS002	6	$443,864	$17,800	CCF03	6	$720,519	$28,900		6	$443,864	$30,900	6	$0	$0	$148,700
131	CC	1096198034	ARRIETA ARDILA MAURICIO									X									230301	29	$3,199,006	$511,900	EPS017	29	$3,199,006	$128,000	CCF03	29	$3,199,006	$128,000		29	$3,199,006	$222,700	29	$0	$0	$990,600
132	CC	1096198034	ARRIETA ARDILA MAURICIO													X					230301	1	$113,387	$18,200	EPS017	1	$113,387	$4,600	CCF03	1	$75,000	$3,000		1	$113,387	$0	1	$0	$0	$25,800

57	CC	1002941630	CARVAJAL HERRERA JHONIER	X			230201	30	$2,382,745	$381,300	EPS041	30	$2,382,745	$95,400	CCF11	30	$2,382,745	$95,400		30	$2,382,745	$165,900	30	$0	$0	$738,000
58	CC	1056843410	CHAMORRO CIFUENTES YHONATAN	X			231001	29	$2,333,354	$373,400	EPS010	29	$2,333,354	$93,400	CCF11	29	$2,333,354	$93,400		29	$2,333,354	$162,500	29	$0	$0	$723,700
59	CC	1038843410	CHAMORRO CIFUENTES YHONATAN			X	231001	1	$74,637	$12,000	EPS010	1	$74,637	$3,000	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$74,637	$0	1	$0	$0	$16,900
60	CC	1036190553	CIFUENTES OSPINA ANDREA	X			230301	30	$2,248,322	$359,800	EPS010	30	$2,248,322	$90,000	CCF11	30	$2,248,322	$90,000		30	$2,248,322	$156,500	30	$0	$0	$696,300
61	CC	1121554299	CLEMENTE SICAFA EDUARDO MANUEL	X			230101	30	$2,766,443	$442,700	EPS017	30	$2,766,443	$110,700	CCF11	30	$2,766,443	$110,700		30	$2,766,443	$192,600	30	$0	$0	$856,700
62	CC	1007508492	DIAZ MARTINEZ WILSON JOSE	X			230301	30	$3,409,750	$545,600	CCFC55	30	$3,409,750	$136,400	CCF11	30	$3,409,750	$136,400		30	$3,409,750	$237,400	30	$0	$0	$1,055,800
63	CC	24673313	DUQUE BERNAL BEATRIZ ELENA	X			230301	30	$2,211,763	$353,900	EPS010	30	$2,211,763	$88,500	CCF11	30	$2,211,763	$88,500		30	$2,211,763	$154,000	30	$0	$0	$684,900
64	CC	30388919	DUQUE MUÑOZ GLORIA BEATRIZ	X			230201	30	$2,471,715	$395,500	EPS037	30	$2,471,715	$98,900	CCF11	30	$2,471,715	$98,900		30	$2,471,715	$172,100	30	$0	$0	$765,400
65	CC	1037370430	ESPINOSA SANCHEZ JUAN CAMILO	X			230201	19	$2,154,250	$344,700	EPS002	19	$2,154,250	$86,200	CCF11	19	$2,154,250	$86,200		19	$2,154,250	$150,000	19	$0	$0	$667,100
66	CC	1037370430	ESPINOSA SANCHEZ JUAN CAMILO		X		230201	9	$625,756	$100,200	EPS002	9	$625,756	$25,100	CCF11	9	$625,756	$0		9	$625,756	$0	9	$0	$0	$125,300
67	CC	1037370430	ESPINOSA SANCHEZ JUAN CAMILO		X		230201	2	$140,000	$22,400	EPS002	2	$140,000	$5,600	CCF11	2	$140,000	$0		2	$140,000	$0	2	$0	$0	$28,000
68	CC	1036840031	GAÑAN CUERVO ROBINSON	X			230301	30	$2,887,607	$462,100	ESSC74	30	$2,887,607	$115,600	CCF11	30	$2,887,607	$115,600		30	$2,887,607	$201,000	30	$0	$0	$894,300
69	CC	1128627903	GARCIA OSORIO JAIRO ANDRES	X			230301	30	$2,255,923	$361,000	EPS037	30	$2,255,923	$90,300	CCF11	30	$2,255,923	$90,300		30	$2,255,923	$157,100	30	$0	$0	$698,700
70	CC	25235410	GARCIA ROJAS SANDRA MILENA				25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000		30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	$1,238,400
71	CC	1002579296	GARCIA TORO YEIMY CATALINA	X			230301	29	$2,405,662	$385,000	EPS002	29	$2,405,662	$96,300	CCF11	29	$2,405,662	$96,300		29	$2,405,662	$167,500	29	$0	$0	$745,100
72	CC	1002579296	GARCIA TORO YEIMY CATALINA			X	230301	1	$81,960	$13,200	EPS002	1	$81,960	$3,300	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$81,960	$0	1	$0	$0	$18,400
73	CC	1039694577	GIRALDO BARRAGAN GUSTAVO ADOLFO	X			230301	30	$2,091,252	$334,700	EPS037	30	$2,091,252	$83,700	CCF11	30	$2,091,252	$83,700		30	$2,091,252	$145,600	30	$0	$0	$647,700
74	CC	1050547020	GONZALEZ TORRES EDILSON	X			230301	30	$2,421,891	$387,600	EPS041	30	$2,421,891	$96,900	CCF11	30	$2,421,891	$96,900		30	$2,421,891	$168,600	30	$0	$0	$750,000
75	CC	1036840027	GRANADA HURTADO MARTA	X			230301	30	$2,545,153	$407,300	EPS041	30	$2,545,153	$101,900	CCF11	30	$2,545,153	$101,900		30	$2,545,153	$177,200	30	$0	$0	$788,300
76	CC	1192741578	GRISALES CARDONA DANIEL ALEXANDER	X			230301	30	$2,140,427	$342,500	EPS002	30	$2,140,427	$85,700	CCF11	30	$2,140,427	$85,700		30	$2,140,427	$149,000	30	$0	$0	$662,900
77	CC	1128628244	GUTIERREZ OCAMPO WILSON ALBERTO	X			230301	30	$2,075,723	$332,200	EPS037	30	$2,075,723	$83,100	CCF11	30	$2,075,723	$83,100		30	$2,075,723	$144,500	30	$0	$0	$642,900
78	CC	1070614230	GUZMAN BARRIOS RUBEN DAVID				25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS009	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000		30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	$1,238,400
79	CC	21896330	HENAO OSPINA GLADYS	X			25-14	30	$2,391,804	$382,700	EPS017	30	$2,391,804	$95,700	CCF11	30	$2,391,804	$95,700		30	$2,391,804	$166,500	30	$0	$0	$740,600
80	CC	1073321149	HERNANDEZ RIVERA ANDERSON	X			230301	30	$2,173,265	$347,800	EPS017	30	$2,173,265	$87,000	CCF11	30	$2,173,265	$87,000		30	$2,173,265	$151,300	30	$0	$0	$673,100
81	CC	1036840738	HERRERA OROZCO JUAN ESTEBAN	X			230301	30	$2,274,041	$363,900	EPS010	30	$2,274,041	$91,000	CCF11	30	$2,274,041	$91,000		30	$2,274,041	$158,300	30	$0	$0	$704,200
82	CC	1036190256	HERRERA HERRERA VICTOR MANUEL	X			230301	21	$1,401,501	$224,300	EPS040	21	$1,401,501	$56,100	CCF11	21	$1,401,501	$56,100		21	$1,401,501	$97,600	21	$0	$0	$434,100
83	CC	1036190256	HERRERA HERRERA VICTOR MANUEL			X	230301	9	$611,847	$97,900	EPS040	9	$611,847	$24,500	CCF11	9	$474,976	$19,000		9	$611,847	$0	9	$0	$0	$141,400
84	CC	1002941819	HINCAPIE CASTAÑEDA ALEJANDRO	X			230201	30	$2,387,274	$382,000	EPS002	30	$2,387,274	$95,500	CCF11	30	$2,387,274	$95,500		30	$2,387,274	$166,200	30	$0	$0	$739,200
85	CC	1054542154	HINESTROZA NARVAEZ ANDRES LIBARDO	X			230301	30	$4,134,023	$661,500	EPS037	30	$4,134,023	$165,400	CCF11	30	$4,134,023	$165,400		30	$4,134,023	$287,800	30	$0	$0	$1,280,100
86	CC	1036840760	JURADO RIVERA JUAN DANIEL	X			230301	29	$2,324,296	$371,900	EPS040	29	$2,324,296	$93,000	CCF11	29	$2,324,296	$93,000		29	$2,324,296	$161,800	29	$0	$0	$719,700
87	CC	1036840760	JURADO RIVERA JUAN DANIEL			X	230301	1	$69,434	$11,200	EPS040	1	$69,434	$2,800	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$69,434	$0	1	$0	$0	$15,900
88	CC	1036838474	LEON OCAMPO GELMAR ESTIVEN	X			25-14	30	$2,205,131	$352,900	EPS037	30	$2,205,131	$88,300	CCF11	30	$2,205,131	$88,300		30	$2,205,131	$153,500	30	$0	$0	$683,000
89	CC	1061621130	LOAIZA BETANCURTH SANTIAGO	X			230201	30	$1,897,138	$303,600	EPS002	30	$1,897,138	$75,900	CCF11	30	$1,897,138	$75,900		30	$1,897,138	$132,100	30	$0	$0	$587,500
90	CC	1001440604	LONDOÑO RAMOS WILMAR	X			230301	29	$1,828,982	$292,700	EPS040	29	$1,828,982	$73,200	CCF11	29	$1,828,982	$73,200		29	$1,828,982	$127,300	29	$0	$0	$566,400
91	CC	1001440604	LONDOÑO RAMOS WILMAR			X	230301	1	$62,009	$10,000	EPS040	1	$62,009	$2,500	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$62,009	$0	1	$0	$0	$14,400
92	CC	1002579807	LOPEZ GALLEGO JHON SEBASTIAN	X			230301	29	$2,389,000	$382,300	EPS002	29	$2,389,000	$95,600	CCF11	29	$2,389,000	$95,600		29	$2,389,000	$166,300	29	$0	$0	$739,800
93	CC	1002579807	LOPEZ GALLEGO JHON SEBASTIAN			X	230301	1	$74,826	$12,000	EPS002	1	$74,826	$3,000	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$74,826	$0	1	$0	$0	$16,900
94	CC	71684578	MARIN VELASQUEZ ALBEIRO DE JESUS	X			25-14	30	$5,057,727	$809,300	EPS002	30	$5,057,727	$202,400	CCF11	30	$5,057,727	$202,400		30	$5,057,727	$352,100	30	$0	$0	$1,566,200

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)											$3,655,489	$584,900			$3,655,489	$146,300			$3,655,489	$146,300			$3,655,489	$89,100		$0	$0	$966,600
24	CC	79005580	GONZALEZ GUERRERO JHON DARIO		X				230301	30	$3,655,489	$584,900	EPS017	30	$3,655,489	$146,300	CCF22	30	$3,655,489	$146,300		30	$3,655,489	$89,100	30	$0	$0	$966,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)											$18,365,251	$2,938,700			$18,365,251	$734,800			$18,365,251	$734,800			$18,365,251	$447,600		$0	$0	$4,855,900
25	CC	6024990	ARCINIEGAS CHIVARA JULIO		X				25-14	30	$3,598,808	$575,900	EPS017	30	$3,598,808	$144,000	CCF11	30	$3,598,808	$144,000		30	$3,598,808	$87,700	30	$0	$0	$951,600
26	CC	71364635	CARDONA LOPEZ RANDOLPH		X				230101	30	$2,987,523	$478,100	EPS037	30	$2,987,523	$119,600	CCF11	30	$2,987,523	$119,600		30	$2,987,523	$72,800	30	$0	$0	$790,100
27	CC	1099370408	GAMEZ VIVIESCAS CESAR AUGUSTO						230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF11	30	$3,900,000	$156,000		30	$3,900,000	$95,100	30	$0	$0	$1,031,100
28	CC	1118072693	NIÑO MORA PAULA ANDREA		X				230301	30	$3,761,829	$601,900	ESSC62	30	$3,761,829	$150,500	CCF11	30	$3,761,829	$150,500		30	$3,761,829	$91,700	30	$0	$0	$994,600
29	CC	16113621	VILLADA SALAZAR WILTON FREIMAN		X				25-14	30	$4,117,091	$658,800	EPS037	30	$4,117,091	$164,700	CCF11	30	$4,117,091	$164,700		30	$4,117,091	$100,300	30	$0	$0	$1,088,500
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)											$7,733,817	$1,237,500			$7,733,817	$309,500			$7,651,017	$306,100			$7,733,817	$188,500		$0	$0	$2,041,600
30	CC	98587872	CASTRO CASTRO LEON ADRIAN		X				25-14	30	$3,982,800	$637,300	EPS010	30	$3,982,800	$159,400	CCF03	30	$3,900,000	$156,000		30	$3,982,800	$97,100	30	$0	$0	$1,049,800
31	CC	1037369806	ESPINOSA SUAREZ CARLOS ANDRES		X				230301	30	$3,751,017	$600,200	EPS040	30	$3,751,017	$150,100	CCF03	30	$3,751,017	$150,100		30	$3,751,017	$91,400	30	$0	$0	$991,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)											$3,494,728	$559,200			$3,494,728	$139,800			$3,494,728	$139,800			$3,494,728	$85,200		$0	$0	$924,000
32	CC	1003202761	BAQUERO BALLENA RAFAEL		X				25-14	30	$3,494,728	$559,200	EPS041	30	$3,494,728	$139,800	CCF15	30	$3,494,728	$139,800		30	$3,494,728	$85,200	30	$0	$0	$924,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (111 Afiliados)											$300,860,770	$48,208,300			$304,507,009	$12,180,900			$305,618,533	$12,103,700			$304,507,009	$20,644,000		$0	$0	$93,136,900
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)											$6,419,803	$1,027,200			$6,419,803	$256,900			$6,581,136	$263,300			$6,419,803	$447,000		$0	$0	$1,994,400
33	CC	1069764338	RIVERA BELTRAN LEIDY TATIANA	X					230201	28	$2,258,667	$361,400	EPS005	28	$2,258,667	$90,400	CCF22	28	$2,420,000	$96,800		28	$2,258,667	$157,300	28	$0	$0	$705,900
34	CC	80157933	TIBAQUIRA VARGAS WILBER DAVID		X				25-14	30	$4,161,136	$665,800	EPS008	30	$4,161,136	$166,500	CCF22	30	$4,161,136	$166,500		30	$4,161,136	$289,700	30	$0	$0	$1,288,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)											$4,553,864	$728,700			$4,553,864	$182,200			$4,553,864	$182,200			$4,553,864	$317,000		$0	$0	$1,410,100
35	CC	15909483	AGUIRRE MARCO ANTONIO		X				230201	30	$4,553,864	$728,700	EPS010	30	$4,553,864	$182,200	CCF39	30	$4,553,864	$182,200		30	$4,553,864	$317,000	30	$0	$0	$1,410,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (72 Afiliados)											$181,595,337	$29,059,700			$181,595,337	$7,268,100			$182,632,694	$7,229,900			$181,595,337	$12,285,000		$0	$0	$55,842,700
36	CC	1054554029	AHUMADA MARECHA JHONATHAN		X				230301	30	$3,535,040	$565,700	EPS037	30	$3,535,040	$141,500	CCF11	30	$3,535,040	$141,500		30	$3,535,040	$246,100	30	$0	$0	$1,094,800
37	CC	1001440186	ALARCON QUINTERO VIVIANA		X				230301	30	$2,197,042	$351,600	EPS040	30	$2,197,042	$87,900	CCF11	30	$2,197,042	$87,900		30	$2,197,042	$153,000	30	$0	$0	$680,400
38	CC	1002800584	ARANGO CALDERON EVER		X				25-14	28	$2,110,069	$337,700	EPS010	28	$2,110,069	$84,500	CCF11	28	$2,110,069	$84,500		28	$2,110,069	$146,900	28	$0	$0	$653,600
39	CC	1002800584	ARANGO CALDERON EVER				X		25-14	1	$70,378	$11,300	EPS010	1	$70,378	$2,900	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$70,378	$0	1	$0	$0	$16,100
40	CC	1002800584	ARANGO CALDERON EVER					X	25-14	1	$70,378	$11,300	EPS010	1	$70,378	$2,900	CCF11	1	$70,378	$0		1	$70,378	$0	1	$0	$0	$14,200
41	CC	1007415075	ARANGO TOBAR JAIDER DIOMEDES		X				230201	29	$1,882,041	$301,200	EPS037	29	$1,882,041	$75,300	CCF11	29	$1,882,041	$75,300		29	$1,882,041	$131,000	29	$0	$0	$582,800
42	CC	1007415075	ARANGO TOBAR JAIDER DIOMEDES				X		230201	1	$65,374	$10,500	EPS037	1	$65,374	$2,700	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$65,374	$0	1	$0	$0	$15,100
43	CC	21476507	ARCILA ARIAS REINA MARCELA		X				230301	30	$2,429,817	$388,800	EPS010	30	$2,429,817	$97,200	CCF11	30	$2,429,817	$97,200		30	$2,429,817	$169,200	30	$0	$0	$752,400
44	CC	1128626369	ARDILA GONZALEZ EVELIN NAYID						230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF11	30	$2,200,000	$88,000		30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0	$681,200
45	CC	1128627239	ARIAS SALDAÑA LUIS MARTIN		X				230201	9	$528,313	$84,600	EPS002	9	$528,313	$21,200	CCF11	9	$528,313	$21,200		9	$528,313	$36,800	9	$0	$0	$163,800
46	CC	1128627239	ARIAS SALDAÑA LUIS MARTIN			X			230201	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF11	6	$284,700	$0		6	$284,700	$0	6	$0	$0	$57,000
47	CC	1128627239	ARIAS SALDAÑA LUIS MARTIN			X			230201	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF11	15	$711,750	$0		15	$711,750	$0	15	$0	$0	$142,400
48	CC	1193461064	ARISTIZABAL ARIAS JAIME ALONSO		X				231001	30	$2,313,835	$370,300	EPS006	30	$2,313,835	$92,600	CCF11	30	$2,313,835	$92,600		30	$2,313,835	$161,100	30	$0	$0	$716,600
49	CC	1058842842	BERNAL GUZMAN ASMID		X				25-14	22	$2,319,363	$371,100	EPS037	22	$2,319,363	$92,800	CCF11	22	$2,319,363	$92,800		22	$2,319,363	$161,900	22	$0	$0	$718,200
50	CC	1058842842	BERNAL GUZMAN ASMID				X		25-14	8	$766,659	$122,700	EPS037	8	$766,659	$30,700	CCF11	8	$550,467	$22,100		8	$766,659	$0	8	$0	$0	$175,500
51	CC	1036840861	BETANCUR MOREÑA ALEIMAR		X				230301	30	$2,445,024	$391,300	EPS037	30	$2,445,024	$97,900	CCF11	30	$2,445,024	$97,900		30	$2,445,024	$170,200	30	$0	$0	$757,300
52	CC	1128624762	BETANCUR CRUZ ALEJANDRO		X				230301	30	$2,168,897	$347,100	EPS037	30	$2,168,897	$86,800	CCF11	30	$2,168,897	$86,800		30	$2,168,897	$151,000	30	$0	$0	$671,700
53	CC	1007703059	CAMACHO VEGA CESAR STIVEN		X				230201	30	$2,278,569	$364,600	EPS037	30	$2,278,569	$91,200	CCF11	30	$2,278,569	$91,200		30	$2,278,569	$158,600	30	$0	$0	$705,600
54	CC	1117808817	CAMACHO GUTIERREZ JHON FREILEN		X				230301	30	$2,319,009	$371,100	EPS037	30	$2,319,009	$92,800	CCF11	30	$2,319,009	$92,800		30	$2,319,009	$161,500	30	$0	$0	$718,200
55	CC	1036840194	CARDONA OSORIO ADRIANA MARYORY		X				230201	29	$2,227,238	$356,400	EPS040	29	$2,227,238	$89,100	CCF11	29	$2,227,238	$89,100		29	$2,227,238	$155,100	29	$0	$0	$689,700
56	CC	1036840194	CARDONA OSORIO ADRIANA MARYORY				X		230201	1	$67,036	$10,800	EPS040	1	$67,036	$2,700	CCF11	1	$47,450	$1,900		1	$67,036	$0	1	$0	$0	$15,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901740908	5	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 48 No 48 Sur - 75 BG163	NORCASIA-CALDAS	4483012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909136113	94944466B9	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$141,333,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Int	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (145 Afiliados)																							$404,126,056	$64,732,200			$407,772,792	$16,312,800			$404,532,423	$16,361,900			$407,772,792	$23,731,400			$121,038,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600			$1,707,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)																							$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$36,600			$1,707,000
1	CC	28549901	ALDANA NARVAEZ ELIZABETH																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF11	30	$3,200,000	$128,000		30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0	$784,800
2	CC	1036560766	CHAMORRO CIFUENTES VALENTINA																		25-14	30	$1,880,000	$300,800	EPS037	30	$1,880,000	$75,200	CCF11	30	$1,880,000	$75,200		30	$1,880,000	$9,900	30	$0	$0	$461,100
3	CC	24713013	HERRERA OSORIO HORALBA																		230201	30	$1,880,000	$300,800	EPS002	30	$1,880,000	$75,200	CCF11	30	$1,880,000	$75,200		30	$1,880,000	$9,900	30	$0	$0	$461,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$26,300			$710,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,700			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$26,300			$710,000
4	CC	66303452	PULGARIN VERA YULIETH																		231001	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF11	23	$1,091,350	$43,700		23	$1,091,350	$11,400	23	$0	$0	$273,500
5	CC	66303452	PULGARIN VERA YULIETH													X					231001	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF11	7	$332,150	$13,300		7	$332,150	$0	7	$0	$0	$79,800
6	CC	24873844	RESTREPO ORTIZ ALEXANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	$356,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (16 Afiliados)																							$44,592,344	$7,135,600			$44,592,344	$1,784,300			$45,323,744	$1,813,600			$44,592,344	$1,940,800			$12,674,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$3,692,564	$590,900			$3,692,564	$147,800			$3,692,564	$147,800			$3,692,564	$160,700			$1,047,200
7	CC	1054566545	HOSA NAVARRETE CAMILO ANDRES										X								230301	30	$3,692,564	$590,900	EPS037	30	$3,692,564	$147,800	CCF22	30	$3,692,564	$147,800		30	$3,692,564	$160,700	30	$0	$0	$1,047,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (9 Afiliados)																							$20,003,862	$3,201,000			$20,003,862	$800,400			$20,875,868	$835,300			$20,003,862	$870,500			$5,707,200
8	CC	1098845059	AGUIRRE ARCILA ANDRES FELIPE										X								230301	30	$3,044,780	$487,200	EPS002	30	$3,044,780	$121,800	CCF11	30	$3,044,780	$121,800		30	$3,044,780	$132,500	30	$0	$0	$863,300
9	CC	1005697685	ARDILA CARLOS ANDRES										X								230301	30	$3,314,710	$530,400	EPS002	30	$3,314,710	$132,600	CCF11	30	$3,314,710	$132,600		30	$3,314,710	$144,200	30	$0	$0	$939,600
10	CC	10182943	OILON LOZANO NELSON		X								X								230301	1	$394,704	$63,200	EPS040	1	$394,704	$15,800	CCF11	1	$1,574,392	$63,000		1	$396,704	$17,200	1	$0	$0	$159,200
11	CC	98503235	ESCOBAR PARRA JOSE LUIS										X								231001	30	$3,454,250	$552,700	EPS037	30	$3,454,250	$138,200	CCF11	30	$3,454,250	$138,200		30	$3,454,250	$150,300	30	$0	$0	$979,400
12	CC	9830214	GRACIANO FLOREZ YORLEDINSON										X								230301	30	$3,472,418	$555,600	EPS037	30	$3,472,418	$138,900	CCF11	30	$3,472,418	$138,900		30	$3,472,418	$151,100	30	$0	$0	$984,500
13	CC	1017238153	MARIN LOPEZ JHONATAN SMYH	X									X								230301	20	$1,942,327	$310,800	EPS040	20	$1,942,327	$77,700	CCF11	20	$1,942,327	$77,700		20	$1,942,327	$84,500	20	$0	$0	$550,700
14	CC	12263033	TORRES ACOSTA LUIS HERLEY	X									X								230201	6	$843,477	$135,000	EPS005	6	$843,477	$33,800	CCF11	6	$535,795	$21,500		6	$843,477	$36,700	6	$0	$0	$227,000
15	CC	9850660	VALENCIA MURILLO ANDRES										X								230301	30	$3,426,529	$548,300	EPS037	30	$3,426,529	$137,100	CCF11	30	$3,426,529	$137,100		30	$3,426,529	$149,100	30	$0	$0	$971,600
16	CC	1019082353	ZULUAGA RAMIREZ RICARDO	X																	25-14	2	$110,667	$17,800	EPS005	2	$110,667	$4,500	CCF11	2	$110,667	$4,500		2	$110,667	$4,900	2	$0	$0	$31,700
Ciudad: NARIÑO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$20,895,918	$3,343,700			$20,895,918	$836,100			$20,755,312	$830,900			$20,895,918	$909,400			$5,919,700
17	CC	10176783	BETANCUR TANGARIFE JHON JAIRO										X								25-14	30	$3,256,619	$521,100	EPS037	30	$3,256,619	$130,300	CCF03	30	$3,256,619	$130,300		30	$3,256,619	$141,700	30	$0	$0	$923,400
18	CC	10182943	OILON LOZANO NELSON	X									X								230301	29	$2,964,968	$474,400	EPS040	29	$2,964,968	$118,600	CCF01	29	$2,964,968	$118,600		29	$2,964,968	$129,000	29	$0	$0	$840,600
19	CC	71775806	GOMEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER										X								25-14	30	$3,250,649	$520,200	EPS037	30	$3,250,649	$130,100	CCF03	30	$3,250,649	$130,100		30	$3,250,649	$141,900	30	$0	$0	$921,900
20	CC	98503657	JIMENEZ CEBALLOS MIGUEL ANGEL										X								25-14	30	$3,355,477	$536,900	EPS010	30	$3,355,477	$134,200	CCF03	30	$3,355,477	$134,200		30	$3,355,477	$146,000	30	$0	$0	$951,500
21	CC	1192109987	MONTOYA OCAMPO YEFERSON JULIAN										X								230301	30	$3,647,137	$583,600	EPS037	30	$3,647,137	$145,900	CCF03	30	$3,647,137	$145,900		30	$3,647,137	$158,700	30	$0	$0	$1,034,100
22	CC	71310972	SEPULVEDA CANO OSCAR ALEXANDER										X								230301	30	$3,498,977	$559,900	EPS037	30	$3,498,977	$140,000	CCF03	30	$3,498,977	$140,000		30	$3,498,977	$152,300	30	$0	$0	$992,200
23	CC	1109844367	YOSSA NAVARRETE CARLOS ARMANDO	X									X								230301	8	$922,091	$147,600	EPS037	8	$922,091	$36,900	CCF03	8	$781,485	$31,300		8	$922,091	$40,200	8	$0	$0	$256,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (9 Afiliados)																							$33,249,285	$5,320,300			$33,249,285	$1,330,400			$33,166,485	$1,327,000			$33,249,285	$810,400			$8,788,100

CONSORCIO
SAN MIGUEL

Norcasia, 19 de noviembre de 2025

Señores
Gobernación de Caldas
Secretaría de Hacienda

REFERENCIA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 29092023-1455 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS".

ASUNTO CERTIFICACIÓN MUNICIPIOS EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo,

De acorde al contrato de la referencia, nos permitimos certificar que las obras ejecutadas por el Consocio San Miguel, enmarcadas en Acta parcial de Obra No. 22 se ejecutaron en los municipios de Samana, Victoria, Norcasia Caldas y el Municipio de Nariño en el departamento de Antioquia, de acuerdo a las inversiones que se relacionan en la siguiente tabla.

VALOR DISCRIMINADO POR MUNICIPIOS


	DEPARTAMENTO DE CALDAS			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE VICTORIA		$ 2,093,584,296.00
	MUNICIPIO 2	MUNICIPIO DE SAMANA		$ 2,443,033,112.00
	MUNICIPIO 3	MUNICIPIO DE NORCASIA		$ 688,464,553.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS			$ 5,225,081,960.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			VALOR
	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE NARIÑO		$ 956,716,895.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			$ 956,716,895.00

Atentamente,

ROGELIO GARCIA CAMPIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN MIGUEL

ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Y/O APODERADO
MAB INGENIERIA DE VALOR

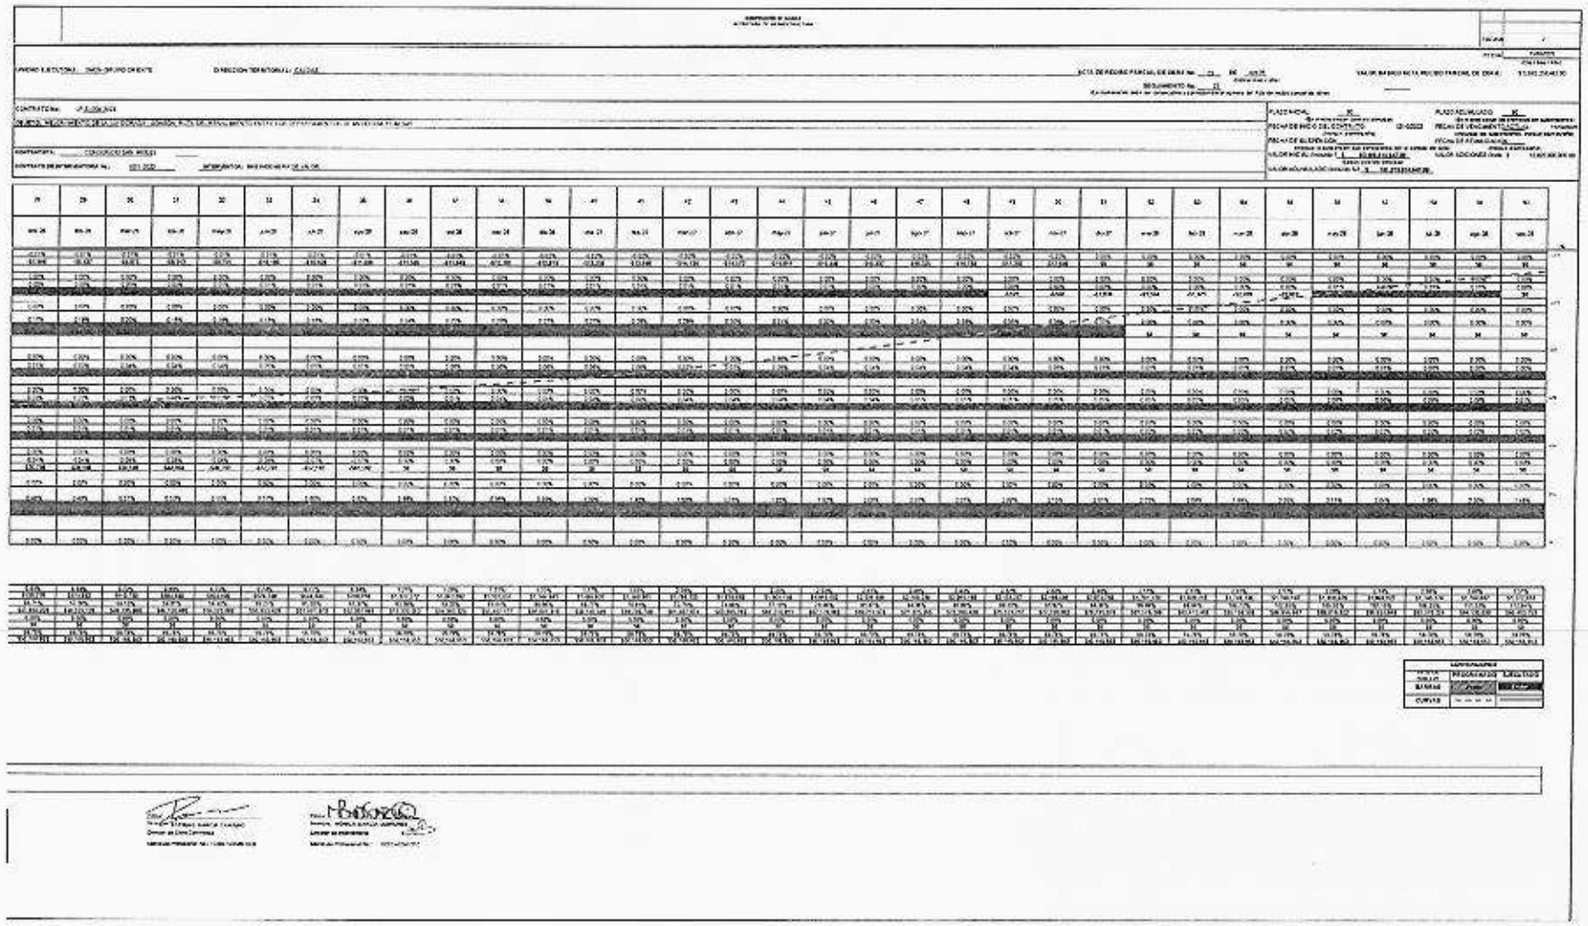

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. VEINTITRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29092023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29092023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta	19/11/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa		
No. Pedido en SAP	4500024051			
NIT o RUT	901.740.908-5			
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%) MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGEMERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)			
Representante Legal	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,493,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,826,000,000.00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0408 - C-0408	
Duración del contrato (Plazo)	Duración Contrato SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	12/10/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DJOUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VPARCIAL
C1		Capítulo 1. Actividades Preliminares				
630.2.3	11601	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	-	$ 43,112.00	$ -
210.2.1	11601	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	-	$ 54,576.00	$ -
221.7	11601	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	-	$ 213,374.00	$ -
220.1	11601	TERRAPLENES	M3	-	$ 18,887.00	$ -
200.2	11601	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	-	$ 1,004,409.00	$ -
C2		Capítulo 2. Estructura de Pavimento				
341.2 T1	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	247.50	$ 329,168.00	$ 81,972,780.00
341.2 T4	11603	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	-	$ 474,867.00	$ -
310.1	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1,743.00	$ -
320.3 T4	11602	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	-	$ 354,604.00	$ -
420.2	11603	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	M2	-	$ 3,945.00	$ -
450.2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,297,314.00	$ -
450.2P T3	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,443,147.00	$ -
450.2P T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,443,147.00	$ -
C3		Capítulo 3. Estructuras de Drenaje				
221.7	11604	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	187.00	$ 213,374.00	$ 39,900,938.00
221.15	11604	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	2.00	$ 104,053.00	$ 208,106.00
630.0.3	11604	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	797.00	$ 43,112.00	$ 34,366,131.00
610.1	11604	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 78,074.00	$ -
630.2.2	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,361,981.00	$ -
630.4.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,023,749.00	$ -
630.4.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.4.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.6 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	1.80	$ 585,185.00	$ 1,053,297.00
630.6 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	4.00	$ 756,855.00	$ 3,027,660.00
630.6 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	0.75	$ 756,855.00	$ 567,866.00
630.5	11604	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	-	$ 965,074.00	$ -
610.1	11604	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 600 mm	ML	0.00	$ 2,481,462.00	$ 10,851,696.00
640.1 T1	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	14,212.32	$ 8,763.00	$ 123,418,901.02
640.1 T3	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	3,156.00	$ 8,763.00	$ 27,647,265.02
640.1 T4	11604	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	945.00	$ 8,763.00	$ 8,280,509.00
642.2P	11604	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	-	$ 13,803.00	$ -
671.1 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 709,340.00	$ -
671.1 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827,172.00	$ -
671.1 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 827,172.00	$ -
673.2 T1	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	208.20	$ 157,554.00	$ 32,802,743.00
673.2 T3	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.2 T4	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 281,220.00	$ -
673.3.3 T1	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	275.40	$ 188,848.00	$ 52,008,739.00
673.3.3 T3	11604	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	-	$ 334,680.00	$ -
673.1.1	11604	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	1,516.92	$ 11,416.00	$ 17,316,930.00
661.1.1	11604	TUBERIA DE PVC 4"	ML	352.80	$ 47,301.00	$ 16,687,798.00
672.2	11609	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	-	$ 50,240.00	$ -
C4		Capítulo 4. Obras de Estabilización				
630.2.3	11626	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1,585.20	$ 43,112.00	$ 67,414,234.00
610.1	11625	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	-	$ 78,074.00	$ -
630.2.2	11625	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,361,981.00	$ -

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA Nro. VEINTITRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA Nro. 29032023-1456

RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29032023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA				
Fecha acta	19/11/2025				
Concepto	Descripción				
No. Radicado Contrato de Obra	29032023-1456	Acta Administrativa:			
No. Pedido en SAP	4100024051				
NIT o RUT	901.740.905-6				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal	CARLOS IGNACIO CADAVID NEIRA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,493,614,847.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,847.00		
Valor Adición	$ 13,826,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0406 - 2-0426		
Duración del contrato (Plazo)	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de Iniciación	12/12/2023		Fecha de terminación	11/12/2028	
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VLMTARIO	VRPARCIAL
630.4.2 T3	11626	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.4.2 T4	11626	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	-	$ 1,146,249.00	$ -
630.6 T3	11626	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	- 18.70	$ 756,665.00	-$ 14,149,636.00
630.6 T4	11626	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	- 3.40	$ 756,665.00	-$ 2,572,661.00
640.1 T3	11626	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	14,153.00	$ 8,763.00	$ 124,040,265.00
640.1 T4	11626	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	6,522.00	$ 8,763.00	$ 57,149,886.00
673.2 T3	11626	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	- 83.10	$ 261,220.00	-$ 21,709,182.00
673.2 T4	11626	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	-	$ 261,220.00	$ -
673.1.1	11626	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	279.70	$ 11,416.00	$ 3,193,055.00
663.1.1	11626	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	103.00	$ 47,301.00	$ 4,870,503.00
621.1.2	11626	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA BAJO AGUA	ML	-	$ 4,215,755.00	$ -
623.1.2	11626	ANCLAJE PARA REALCE	ML	-	$ 45,881.00	$ -
623.1	11626	ANCLAJE TIPO pasivo con acero 4S, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en materia comun	ML	-	$ 156,255.00	$ -
C6		Capitulo 5, Señalización y Demarcación Vial				
700.1	11627	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	-	$ 2,660.00	$ -
701.1.2	11627	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	UND	-	$ 10,626.00	$ -
710.1.1	11627	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O S, TAMAÑO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	-	$ 762,731.00	$ -
710.1.5	11627	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75 REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm)	UND	-	$ 668,068.00	$ -
C6		Capitulo 6, Transportes				
620.2.1	11626	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3KM	1,133.00	$ 1,536.00	1,740,360.00
C7		Capitulo 7 Obras estabilización nivel 1				
221.7	11626	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	-	$ 213,374.00	-
630.4.2 T1	11626	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	-	$ 1,023,749.00	-
630.6 T1	11626	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-	$ 585,165.00	-
640.1 T1	11626	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	-	$ 8,763.00	-
673.2 T1	11626	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	$ 157,554.00	-
C0		Capitulo 8 Obras no previstas				
NP 1 T1	11604	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	-	$ 97,743.00	-
NP2	11602	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO N TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	-	$ 24,174.00	-
NP 2.1.1	11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	17,625.00	$ 20,603.00	363,715,875.00
NP421 T1	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	4,725.00	$ 3,101.00	14,652,225.00
NP 461P	11603	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	3,610.40	$ 139,068.00	502,025,515.00
NP442P	11603	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	-	$ 575,202.00	-
NP450 2P T1	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	682.70	$ 1,685,013.00	1,150,224,479.00
NP 610.2	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	442.65	$ 24,830.00	10,990,758.00
NP 610.3 T1	11604	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SEG-50 TRAMO 1	m3	42.50	$ 212,901.00	8,822,491.00
NP 902.2.2	11626	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M) APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3KM	-	$ 1,536.00	-
NP 902.3.2	11626	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3KM	76,763.00	$ 2,001.00	153,602,763.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA No. VEINTITRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA No. 29092023-1456
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 29092023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA				
Fecha acta	19/11/2025				
Concepto	Descripción				
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa			
No. Pedido en SAP	4500024061				
NIT o RUT:	901.740.984-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%); ARNOICA INGENIERÍA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($)	$ 93,439,514,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,614,847.00		
Valor Adición	$ 13,880,000,000.00	Aporte otras entidades			
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0400 - 0-0426		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

OBRA EJECUTADA SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VU/MTARIO	VP/PARCIAL
NP3	11501	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	-	$ 509,166.00	-
NP 210.2.2	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3	1,406.70	$ 43,112.00	60,662,538.00
NP4	11601	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	442.60	$ 23,321.00	10,321,875.00
NP 600.2.1	11504	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	6.50	$ 166,554.00	1,082,301.00
NP630.3.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	7.90	$ 1,436,313.00	11,382,873.00
NP630.3.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	88.10	$ 1,549,243.00	136,227,448.00
NP630.3.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	10.50	$ 1,519,479.00	17,490,373.00
NP630.4.2 T1	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	14.60	$ 1,304,906.00	19,051,828.00
NP630.4.2 T3	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	428.40	$ 1,460,062.00	627,932,561.00
NP630.4.2 T4	11604	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1,497,353.00	-
NP630.1.7 T1	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	-	$ 997,704.00	-
NP630.1.7 T3	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	53.00	$ 1,129,320.00	60,570,348.00
NP630.1.7 T4	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-	$ 1,198,525.00	-
NP5	11605	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	2,146.10	$ 9,000.00	19,314,900.00
NP6 T1	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	374.90	$ 881,142.00	330,311,451.00
NP6 T3	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	-	$ 1,020,700.00	-
NP6 T4	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	-	$ 1,059,007.00	-
NP7	11603	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	5,360.00	$ 4,252.00	24,151,360.00
NP8	14104	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	-	$ 428,509,511.00	-
NP9	11602	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1,613.00	-
NP10	14104	Suministro e instalación de obra falsa para la demolición y construcción de losas de concreto de Puente Hierro (K33+742), incluye lavado y pintura estructura metálica e incluye obras de protección ambiental	Un	-	$ 207,180,400.00	-
NP630.3.2 PH	14104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO PLASTICO R AMC ASENT. 8"+1" 245 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	-	$ 2,209,377.00	-
NP11	11604	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN MAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	648.62	$ 38,043.00	24,564,800.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA No. VEINTITRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA No. 29002023-1456
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 29002023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA			
Fecha acta	19/11/2025			
Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29002023-1456	Acta Administrativa:		
No. Pedido en SAP	4500024031			
NIT o RUT	901.740.905-5			
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%); MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGEMERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Representante Legal	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,514,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otros entidades		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0408 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISTOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación*	11/10/2028	
Interventor Externo	MAS INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGUN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
NP12	11604	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	646.50	$ 86,073.00	55,646,195.00
NP13	11606	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m. NO INCLUYE	M	-	$ 4,792,993.00	-
NP14	11602	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	-	$ 10,707.00	-
NP15	11604	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linea ocalizado en el K126+000 vía Dorada - Sonsón, Municipios de Samana - Caldas y Norte - Antioquia, según notas en anexo.	Un	-	$ 668,545,189.00	-
NP16	11606	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	225.70	$ 1,618,675.00	371,809,648.00
NP17	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,265.60	$ 1,486,513.00	1,693,366,853.00
NP18	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	384.20	$ 1,157,832.00	444,839,054.00
NP19	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	-	$ 1,058,157.00	-
NP20	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (E) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	84.60	$ 897,144.00	76,795,526.00
NP21	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,030.00	$ 260,500.00	269,824,676.00
NP330.3.2 T3 Y T4	11602	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	-	$ 468,561.00	-
NP450.2P T3 Y T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	-	$ 1,897,220.00	-

TOTAL COSTOS DE OBRA	5,052,256,492.00
REAJUSTES DE OBRA	280,912,922.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	87,555,564.00
PAGA	-
AJUSTE A DISEÑOS	121,273,777.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	6,151,798,855.00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$6,151,798,855.00
Amortización Anticipo			$618,178,886.00
Valor Ocupación del Gasto:			$5,533,619,969.00

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		93,499,614,647.00
Valor adicional		13,820,000,000.00
Valor Acta No. 1:	436,314,891.00	
Valor Acta No. 2:	593,009,668.00	
Valor Acta No. 3:	443,810,818.00	
Valor Acta No. 4:	644,463,205.00	
Valor Acta No. 5:	567,926,924.00	
Valor Acta No. 6:	267,282,965.00	
Valor Acta No. 7:	1,546,514,976.00	

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA No. VEINTITRES (23) PARCIAL A - CONTRATO DE OBRA No. 29092023-1456
RADICADO SECRETARÍA JURÍDICA No. 29092023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA			
Fecha acta	19/11/2025			
Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT o RUT:	901.740.908-5			
Contratista	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERÍA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($)	$ 93,469,914,647.00	Aporte Departamento	$ 107,319,914,647.00	
Valor Adición	$ 13,850,000,000.00	Aporte obras embaladas		
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3500021703-3500021701	FONDO	2 - 0408 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo)	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Fecha de iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación: 11/10/2028		
Interventor Externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			
Supervisor Departamental	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO OBRA CIVIL

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VPARCIAL
Valor Acta No. 8:		4,116,661,935.00				
Valor Acta No. 9:		4,775,577,355.00				
Valor Acta No. 10:		5,074,186,859.00				
Valor Acta No. 11:		3,384,077,063.00				
Valor Acta No. 12:		2,725,328,241.00				
Valor Acta No. 13:		1,953,472,425.00				
Valor Acta No. 14:		2,004,225,600.00				
Valor Acta No. 15:		2,139,480,406.00				
Valor Acta No. 16:		1,500,605,595.00				
Valor Acta No. 17:		1,514,627,840.00				
Valor Acta No. 18:		1,271,556,334.00				
Valor Acta No. 19:		2,356,852,025.00				
Valor Acta No. 20:		2,319,737,593.00				
Valor Acta No. 21:		3,257,824,491.00				
Valor Acta No. 22:		3,376,270,391.00				
Valor Acta No. 23:		6,151,798,855.00				
Saldo del contrato		52,810,539,462.00				
Sumas Iguales		107,319,914,647.00		107,319,914,647.00		

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor de Anticipo		9,349,961,464.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	43,631,480.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	56,300,867.00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	44,381,002.00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	54,448,321.00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	58,782,692.00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	26,728,297.00	
Amortización del Anticipo Acta7:	134,851,468.00	
Amortización del Anticipo Acta 8:	411,686,194.00	
Amortización del Anticipo Acta 9:	477,357,735.00	
Amortización del Anticipo Acta 10:	537,416,689.00	
Amortización del Anticipo Acta 11:	394,497,700.00	
Amortización del Anticipo Acta 12:	272,532,624.00	
Amortización del Anticipo Acta 13:	199,347,243.00	
Amortización del Anticipo Acta 14:	226,422,566.00	
Amortización del Anticipo Acta 15:	213,048,941.00	
Amortización del Anticipo Acta 16:	155,066,560.00	
Amortización del Anticipo Acta 17:	151,402,784.00	
Amortización del Anticipo Acta 18:	197,155,933.00	
Amortización del Anticipo Acta 19:	233,585,203.00	
Amortización del Anticipo Acta 20:	231,973,753.00	
Amortización del Anticipo Acta 21:	383,782,449.00	
Amortización del Anticipo Acta 22:	397,627,039.00	
Amortización del Anticipo Acta 23:	618,179,880.00	
Saldo por amortizar:	3,571,053,042.00	
Sumas Iguales:	9,349,961,464.00	9,349,961,464.00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO SAN MIGUEL, representado legalmente por el ingeniero CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento a artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la ley 828 de 2003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2002, la suscrita Interventoría verifica el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes a esta del impuesto de las diferentes estampillas serán descontados de la presente acta conforme a [illegible] Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

SERGIO GARCIA CAMPUZ
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL
ACTA DE OBRA NRO VEINTI TRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 2909202 3-1456
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 2909202 3-1456

Secretaria : Fecha acta mayores cantidades	INFRAESTRUCTURA 19/11/2026				
Concepto	Descripción				
No. Radicado Contrato de Obra	2909202 3-1456	Acto Administrativo:			
No. Pedido en SAP:	4500024051				
NIT ó RUT:	901.740.908-5				
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)				
Contrato Cedido a:					
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,814,647.00	Aporte Departamento:			$ 93,499,814,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A		
Valor Adición 2	$ 0.00				
Valor Adición 3	$ 0.00				
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
Compromiso Presupuestal:	3500021703-3500021701	FONDO	2 - 0400 - 0-0405		
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA ((60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
Prorroga					
Fecha de Inicio acta	12-oct-23	Fecha de terminación	11-oct.-29		
Fecha de Reinicio acta 1					
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza				
Interventor externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/PARCIAL
C3	Capitulo 2. Estructura de Pavimento				
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	1,743.00	0.00
C3	Capitulo 3. Estructuras de Drenaje				
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	3,054.00	213,374.00	651,844,196.00
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	828.80	104,055.50	86,239,126.40
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 600 mm	ML	1,214.56	2,481,482.00	5,013,854,486.72
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	125,474.94	8,763.00	1,099,536,939.00
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3,654.70	157,564.00	627,323,403.80
673.3.5 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	2,341.50	188,848.00	442,167,780.60
C4	Capitulo 4 Obras de Estabilización				
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	ML	777.89	47,301.00	36,794,974.89
C7	Capitulo 7 Obras estabilizacion tramo 1				
673.2 T1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	40.30	213,374.00	8,598,972.20
201.7	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	1,023,749.00	0.00
630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	58.20	565,195.00	32,895,273.00
630.6 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	46,007.45	8,763.00	403,089,204.35
640.1 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	143.60	157,564.00	22,624,754.40
				TOTAL COSTOS DE OBRA	$ 5,422,410,192

OBRA NO PREVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/PARCIAL
NP 1 T1	LIMPEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 92" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPEZA	m	265.00	97,743.00	25,899,039.00
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	30,931.50	24,174.00	747,738,081.00
NP 201.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	156,992.50	20,853.00	3,275,510,447.50
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	63,187.50	3,121.00	199,944,437.50
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m2	12,338.10	139,035.00	1,715,834,890.60
NP462P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL, DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	152.60	575,232.00	87,785,563.20
NP650.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	5,664.20	1,985,213.00	11,482,282,494.60
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	8,558.80	24,830.00	212,515,604.00
NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	357.10	212,901.00	76,026,947.10
NP 900.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1020M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3KM	80,528.00	1,530.00	143,658,008.00
NP 900.3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (120 m)	M3KM	900,143.00	2,021.00	1,820,788,143.00
NP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K68+500 AL K69+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	730.00	509,165.00	371,690,450.00
NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	36,505.06	43,112.00	1,573,826,218.56
NP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	39,311.22	23,321.00	916,776,853.62
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	3,516.70	166,984.00	587,232,632.80
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	701.50	1,438,315.00	1,009,070,309.50
NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	272.10	1,560,243.00	424,622,280.30
NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	107.50	1,618,479.00	174,003,992.50
NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	1,021.30	1,304,993.00	1,333,002,377.90
NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	287.00	1,405,062.00	391,171,554.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA DE OBRA NRO VEINTI TRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456 RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO. 29092023-1455

Secretaría : Fecha acta mayores cantidades	INFRAESTRUCTURA 19/11/2026			
Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1456	Acta Administrativa:		
No. Pedido en SAP:	4500024061			
NIT ó RUT:	901.740.505-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL, CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINCICA INGENIERÍA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Celebrado:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0406 - 3-0426	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de iniciación	12-oct.-23	Fecha de terminación	11-oct.-28	
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventor externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VRUNITARIO	VRPARCIAL
NP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	1,497,369.00	0.00
NP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	51.10	997,704.00	50,982,074.40
NP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	30.20	1,129,325.00	34,105,464.00
NP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	1.60	1,156,525.00	1,850,840.00
NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	34,613.50	9,002.00	131,521,503.00
NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	2,831.10	861,142.00	2,518,372,716.20
NP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	1,020,706.00	0.00
NP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	1,093,057.00	0.00
NP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	65,739.30	4,252.00	279,523,503.60
NP8	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa	Un	0.00	426,503,511.00	383,858,559.90
NP9	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	200,385.00	1,813.00	336,126,255.40
NP10	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolición y construccion de losas de concreto en Puente Hierro K58+740 , incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de protección ambiental	Un	1.00	307,169,400.00	307,169,400.00
NP630.3.2 FH	SUMINISTRO E INSTALACION DRYO PLASTICS R, AMC, ASENT. 5"+/-1" 645 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS FUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	58.20	2,289,577.00	133,241,741.40
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL, PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	2,020.50	38,043.00	88,919,939.50
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	2,525.50	89,073.00	225,010,734.50
NP13	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m DIAMETRO	M	84.80	4,792,553.00	405,019,866.40
NP14	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	13,906.00	10,787.20	150,004,022.00
NP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Lenta localizado en el K106+000 vía Dorada - Sonsón, Municipios de Samaná - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un	0.00	669,545,150.00	0.00
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	229.70	1,610,675.20	371,809,647.50
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,265.60	1,496,513.00	1,893,980,852.80
NP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	384.20	1,157,632.00	444,839,054.40
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	1,008,157.00	0.00
NP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	65.60	897,144.20	76,795,526.40
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,033.00	269,566.00	285,524,678.00
P330.3.2 T3 Y T	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	468,551.00	0.00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA DE OBRA NRO VEINTI TRES (23) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29092023-1456 RADICADO SECRETARIA JURÍDICA NRO 29092023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA			
Fecha acta mayores cantidades	19/11/2025			
Concepto	**Descripción**			
No. Radicado Contrato de Obra	29092023-1455	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP:	4500024051			
NIT ó RUT:	901.740.908-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINCICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)			
Contrato Cedido a:				
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento		$ 93,499,614,647
Valor Adición 1	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición 2	$ 0.00			
Valor Adición 3	$ 0.00			
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Compromiso Presupuestal:	3500021700-3500021701	FONDO	2 - 0403 - 0-0408	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO			
Prorroga				
Fecha de Iniciación	12-oct-23	Fecha de Terminación		11-oct-28
Fecha de Reiniciación 1				
Supervisor Departamento	Ing. Juan David Duque Pedraza			
Interventor externo	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VRUNITARIO	VRPARCIAL
UP450.2P T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	1,097,220.00	0.00
				TOTAL COSTOS DE OBRA	$ 33,644,153,405

Justificación: Para el remplazo de las alcantarillas existentes se ha requerido la demolición de las estructuras existentes, adicional para la construcción de filro longitudinal se requiere la demolición de la cuneta existente lo cual a generado mayores cantidades de obra para el ítem 201.7 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Se han ejecutado los filros de acuerdo a las necesidades del proyecto lo cual a generado mayores cantidades de obra por mayor longitud de filro requerida ya la contemplada en los presupuestos iniciales, adicional por la adición del tramo K33+000 al K33+790

Debido a que entre el K27+020 al K33+790 se encuentran varios sitios puntuales que presentan perdidas de banca es necesario ejecutar mayores cantidades de obra en los ítems relacionados con la construcción de muros de contención y la inclusión de estos en un nuevo capitulo denominado Capitulo 7 Obras de estabilización tramo.

Se incluyen los APU NP construidos para la ejecución de las obras requeridas de acuerdo a las necesidades del proyecto los cuales se encuentran sustentados en las memorias técnicas presentadas con los APUs.


Se incluyen mayores cantidades de obra requeridas para ejecutar la adición numero 1 al contrato por valor de $13,820,000,000 y que se plantean ejecutar en el ítem


JORGE LEONARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO


RODRIGO GARCIA CAMPINO
CONSORCIO SAN MIGUEL
Contratista

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
EL DEPARTAMENTO

DANIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAB INGENIERIA DE VALOR

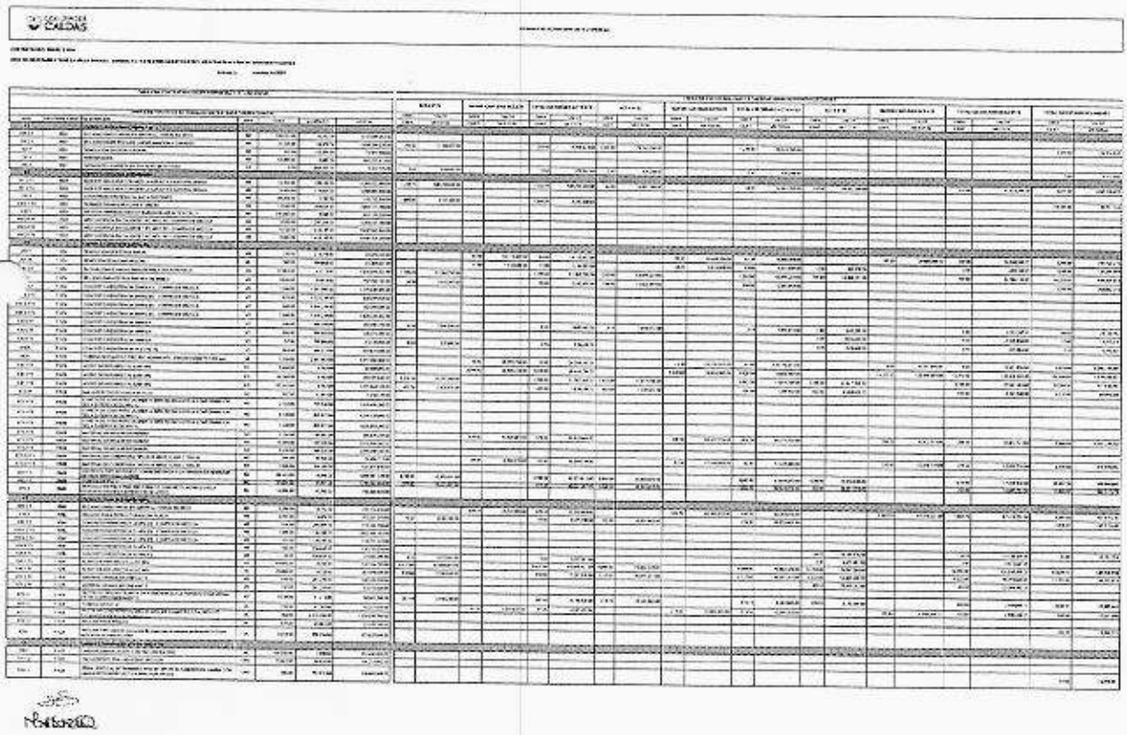

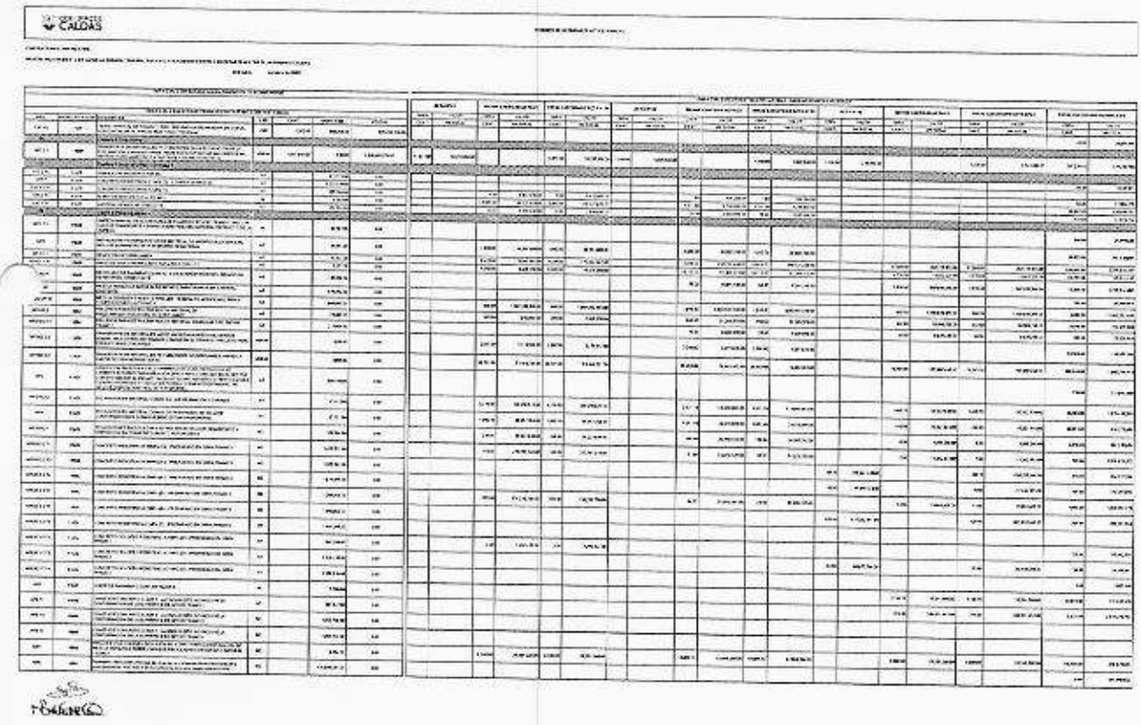

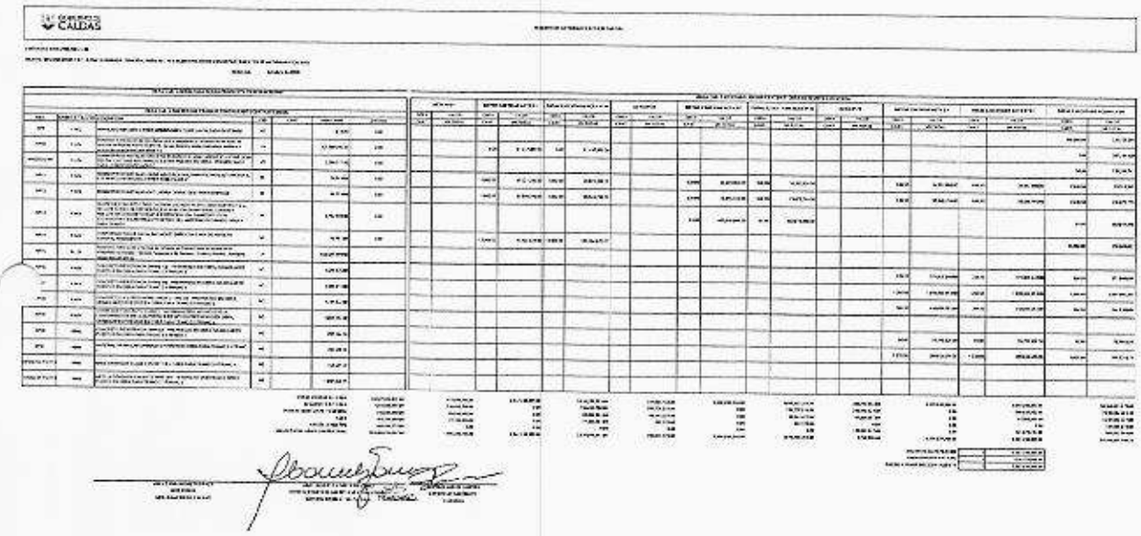

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA: [illegible] (Día/mes/Año)

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: [illegible]

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ______ (P)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. [illegible] (D)

ACTA DE AJUSTE F.A.A.C. [illegible]

CONTRATO DE OBRA No.: [illegible]

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - [illegible] DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible]

INTERVENTOR: [illegible] INGENIERÍA DE VALOR S.A.

PLAZO INICIAL: [illegible]

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible]

FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible]

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ [illegible]

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ [illegible]

PLAZO ACUMULADO: [illegible]

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: [illegible]

FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]

VR. DE ADICIONES (Incluido IVA): $ [illegible]

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Julio 2025	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR EJECUTADO DE OBRA AGOSTO 2025 ACTA [illegible]	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			TOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PORCENTAJE AMORTIZADO: [illegible]

VALOR AJUSTE: $ [illegible]

VALOR IVA: $ [illegible]

VALOR TOTAL: $ [illegible]

NOTA: [illegible]

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ [illegible]

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ [illegible]

NOTAS:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

Firma: [illegible]
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma: [illegible]
Representante Legal [illegible]
Interventoría

GOBERNACIÓN DE CALDAS

INFORMACIÓN DE OBRA

ACTA DE AJUSTE

Página 1

FECHA 19/11/2025

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI (F) NO ( )

ACTA DE INICIO PARCIAL DE OBRA No. 25 ATI

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 004 ATI (D)

CONTRATO DE OBRA No.: 2480/2025 1418

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1571/2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PRIMAVERA - BONANZA, POR LA MODALIDAD ENTRE PARTICULARES EN ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MATEO S.A.

INTERVENTOR: MAS INGENIERÍA Y VALOR S.A.

PLAZO INICIAL: 10 (En meses o días - escribir en letras)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/8/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año en que se suspendió por el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 93.485.514.247,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 107.508.914.767,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses o días - si prolongó en algún mes)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2026 (Indique día/mes/año en que vence)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ 10.809.600.000,00

DATOS ESPECÍFICOS

RUBRO DE AJUSTE	BASE K1 DEL ÍNDICE DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN Mes y Año utilizado (ANC 2017)	PORCENTAJE APLICADO EN LA PRESENTE ACTA (Mes y Año inicial - Mes y Año final)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA MODELO 2025 ACTA 23	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACUMULADO
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) / (b)	(e)	(f)	(g) = (e) - (f)	(h) = (g) x (d)	(i) = (h) - (f)	
101-1	127,79	127,79	1,000000	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
102-1	127,79	127,79	1,000000	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
104-1	134,19	127,79	1,050078	$1.388.887.134,00	$1.458.887.134,00	$1.458.887.134,00	$1.532.113.483,00	$73.226.349,00	$73.226.349,00
110-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
111-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
112-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
113-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
114-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
115-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
116-1	134,19	127,79	1,050078	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
TOTALES				$ 1.388.887.134,00	$ 1.458.887.134,00	$ 1.458.887.134,00	$ 1.532.113.483,00	$ 73.226.349,00	$ 73.226.349,00

PORCENTAJE MÁS ATRASADO: 30,79 (El mes más atrasado)

VALOR AJUSTE	$	142.319.100	$ 266.780.614,00
VALOR IVA	$	-	$ -
VALOR TOTAL	$	142.319.100	$ 266.780.614,00

NOTA: En el evento de requerir información adicional para la aprobación y/o firma de la presente acta, el plazo máximo será de 5 días hábiles.

PERCENTAJES DE AJUSTE Y REAJUSTE	
PORCENTAJE AIU	0
VALOR IVA	0
PORCENTAJE DE AJUSTE	0

(Diligenciar de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico y Financiero y/o Apéndice Económico del Contrato)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO		

VALOR EJECUCIONES SOBRE ACTA: $ 142.319.100

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 142.319.100 (Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE)

NOTAS:

1. Este formato (Acta de Obra) se debe entregar a la Interventoría dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de cierre del periodo de ejecución. En el evento en que el contratista no cumpla con el tiempo establecido para la entrega del Acta de Obra, se le aplicará una multa por cada día de retraso en la entrega, hasta por un monto máximo del 10% del valor del contrato. Si el contratista no cumple con el plazo de ejecución del contrato, se le aplicará una multa por cada día de retraso en la entrega, hasta por un monto máximo del 10% del valor del contrato.
2. El formato MGPS-FR-01 V.6 FT-01 aplica igualmente para contratos de consultoría.
3. El (1) "INDICE K1" A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes a tres (3) meses antes de la fecha de inicio de ejecución del contrato y el mes de ejecución de la obra, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y Financiero y/o Apéndice Económico del Contrato.
4. Los valores y las cifras consignadas en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Obra a cabalidad.
5. El Acta de Ajustes debe estar en concordancia con la ejecución en la Bitácora.
6. El Acta de Ajustes debe mencionar y detallar todo lo concerniente con la ejecución en la Bitácora. Si así se requiere (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007).
7. El Anexo de este Acta se realiza diligenciando el formato de Excel, no debe ser modificado en ninguna forma.
8. El interventor debe verificar la clasificación en los ítems de cada uno para los grupos de ajuste presentados por el Contratista y que sea coherente con los ítems ejecutados por el CONTRATISTA para el mes respectivo.
9. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe anexar el Acta con la constante y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, en caso que deba existir valor negativo en la correspondiente factura. El valor total del acta de ajuste final no puede, bajo ninguna circunstancia, ser negativo.

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Contratista

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Representante Legal o su delegado
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA 1

FECHA [illegible]

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. [illegible]

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ______ (P)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. [illegible] (D)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [illegible] NO [illegible]

CONTRATO DE OBRA No.: [illegible]

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA MERCED - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible]

INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO INICIAL: [illegible]

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible]

FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible]

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ [illegible]

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ [illegible]

PLAZO ACUMULADO: [illegible]

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: [illegible]

FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ [illegible]

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ÍNDICE PARA APLICAR EN LA PRESENTE ACTA	FACTOR DE AJUSTE	VALOR EJECUTADO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACUMULADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			TOTALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
							VALOR AJUSTE	$ [illegible]	$ [illegible]
							VALOR IVA	$ [illegible]	$ [illegible]
							VALOR TOTAL	$ [illegible]	$ [illegible]

PORCENTAJE AMORTIZADO: [illegible]

NOTA: [illegible]

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A PAGAR	
VALOR AJUSTE	$
VALOR IVA	$
VALOR TOTAL AJUSTE	$

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	
VALOR IVA	
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ [illegible]

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ [illegible]

NOTAS:

[illegible]

Firma: [illegible]
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma: [illegible]
Representante Legal
Interventoría

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA	1
FECHA	[illegible]

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23/33

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (P)

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. [illegible] (D)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☐

CONTRATO DE OBRA No.: [illegible]

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SORZAL RUTA [illegible] ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible]

INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO INICIAL: 60

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible]

FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible]

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ [illegible]

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ [illegible]

PLAZO ACTUALIZADO: 60

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: [illegible]

FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ [illegible]

DATOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Junio 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA AGOSTO 2025 ACTA 23	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	VB	VA	VN = VB - VA	VN x (I/Io)	VJ	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			TOTALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
							VALOR AJUSTE	$ [illegible]	$ [illegible]
							VALOR IVA	$ -	$ -
							VALOR TOTAL	$ [illegible]	$ [illegible]

PORCENTAJE AMORTIZADO: 13 (%) (sin decimales)

NOTA: [illegible]

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A DESCONTAR	
VALOR AJUSTE	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL AJUSTE	$ -

[illegible]

VALOR AJUSTE DEFINITIVO		
VALOR IVA		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 44,877,004

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ [illegible]

NOTAS:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]

Firma:
[illegible]
DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma:
[illegible]
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE AJUSTE

PÁGINA

SECRETARÍA: INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE AJUSTE PARCIAL No. _____ (P)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23 FF

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SEPTIEMBRE

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 2 A F F (D)

CONTRATO DE OBRA No. 2025/0023 1405

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA MARGARITA - SUPERMERCADO EL PALMAR MUNICIPIO DE SALGAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025-2023

INTERVENTOR: INGENIERÍA EN CONCRETO S.A.

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según corte de periodo)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/09/2025 (Indique DD/MM/AAAA)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la fecha de suspensión que se registró en el acta de suspensión del acta)

VALOR INICIAL (+ADICIONES): $ 91.439.814.047,00 (Indique con letra completa)

VALOR ACUMULADO (Incluye IVA): $ 147.319.814.047,00

PLAZO ACUMULADO: 60 (Si hubo suspensión, indique el nuevo plazo)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 10/11/2025 (Si hubo suspensión, indique el nuevo plazo)

FECHA DE TERMINACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ 55.880.000,00

DATOS SUPERCOR

CÁLCULO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CORTE DEL PERIODO DEL SALDO OBRA (Mes y Año de corte) Junio 2025	ÍNDICE MES APLICADO PARA EL PRESENTE ACTA (Mes y Año de corte) SEPTIEMBRE 2025	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA MARZO 2025 ACTA 21	VALOR EJECUTADO A AMORTIZAR	VALOR A FACTURA AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVO ACUMULADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 512.765.951,30	$ 512.765.951,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	127.78	131.03	1.0253	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 17.344.171,00	$ 17.344.171,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ITEM	128.19	131.03	1.0221	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES				$ 530.110.122,30	$ 530.110.122,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 12 (%) (Sin decimales)

VALOR AJUSTE EN EL MES	$	0,00	$ 0,00
VALOR IVA	$	0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL AJUSTE	$	0,00	$ 0,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar ACTA de ajuste provisional A.F.F de ajuste definitivo en CELDA B y mes de seguimiento en la celda C.

APROBACIÓN VALOR DE AJUSTE A CANCELAR	
VALOR AJUSTE	$
VALOR IVA	$
VALOR TOTAL AJUSTE	$

(Diligenciar únicamente cuando se trate de ajuste definitivo)

VALOR AJUSTE EN EL MES		
IVA DEL MES		
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 29.756.500

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 29.756.500 (Valor en letras)


NOTAS:

1. Este formato se usa en los casos en los que el valor de amortización que trae por parte del anticipo es mayor que el valor de la factura del mes, esto debido a que el anticipo se amortiza en un porcentaje fijo y no en valores variables como lo son las facturas mensuales, por lo anterior se genera un saldo a favor del contratista que se debe ajustar en el siguiente corte de obra.
2. El formato NEF-AVO-MG-FO-11 debe ir diligenciado para cualquier ajuste que se realice.
3. El "VALOR MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los ajustes definitivos por el mes en el cual se realiza el ajuste, es decir, si se realiza un ajuste en el mes de septiembre por un valor de $ 100.000 pero el valor total ajustado en el mes es igual a $ 150.000 debido a ajustes de meses anteriores, en el "VALOR MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" se debe registrar el valor de $ 150.000.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y de la Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y pasar de ser conforme con lo establecido en el numeral 1 de los numerales 9 y 10 del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
6. El valor a cancelar no debe ser mayor al valor total del saldo a favor del contratista. No incluye valor de primera línea de la IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para ser agrupados de acuerdo a los ítems de los APU y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes revisado.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el acta correspondiente y en el mes siguiente se debe ajustar en el respectivo Otro sí, valores que deben ser descontados en la siguiente factura. Si el valor total del ajuste final es negativo en el mes del vencimiento final, momento de facturar, se debe realizar un reintegro por dicho valor.

Firma
Nombre: [illegible]
Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Contratista

Firma
Nombre: ANGELA MARIA [illegible]
Cargo: Representante Legal o Apoderado
Interventoría

DANE



GOBIERNO DE CALDAS

PRIMERA ADICIONAL CONTRATO DE OBRA No. 2500202-1456
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 2500202-1456

Secretaria :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Proceso	19/11/2024

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	2500202-1456	Acta Adicional(es)	
No. Pedido en SAP:	4500024051		
NIT o RUT :	830175908-5		
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL		
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CADAVID PELAEZ		
Valor del Contrato ($):	$ 59,395,614,647.00	Aporte Departamento $ 107,319,624,647.00	
Valor Adición	$ 53,020,000,000.00	Aporte otras entidades: N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA SONSON - SUMICOL, RUTA DEL REASENTAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
Disponibilidad presupuestal	3020021700-3500021700	FUENTE	2 - 0000 - 0000
Duración del contrato (Plazo):	Diecisiete Contados SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION		
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de Terminación	11/10/2028
Interventor	MAY INGENIERIA DE VALOR SA CRADO DE INVIAS		
Supervisor Departamento	JUAN DAVID OSORIO PEDRAZA		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	MEDIDAS
C1	Capitulo 1. Actividades Preliminares			
600.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
210.2.;	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
220.1	TERRAPLENES	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
C2	Capitulo 2. Estructura de Pavimento			
341.2 T1	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL RENAV	m3	267.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
341.2 T4	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL RENAV	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
332.1	COMPENSACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
320.3.1 T4	SUBBASE GRANULAR CLASE C 300-20	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
400.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
450.2P T3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
450.2P T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
C3	Capitulo 3. Estructuras de Drenaje			
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	167.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	-2.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
600.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	707.60	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	1.80	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-4.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-0.70	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
663.3	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	m	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	1402.30	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	3155.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	749.50	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
812.2P	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	m2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
671.1 T1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUBSUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
671.1 T3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUBSUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
671.1 T4	CUNETA DE CONCRETO VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUBSUPERFICIE DE APOYO	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	208.20	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 300-20	m3	275.40	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.3.3 T3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 300-20	m3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAD MINIMA DE 900 N APROXIMADAMENTE	m2	1516.90	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	352.80	VER ANEXO MEMORIAS DE CALCULO

GOBIERNO DE CALDAS

PROYECTO MOD 23 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Rad. 2903202I-1456
PROYECTO SECRETARÍA JURÍDICA Rad.: 2903202I-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Proyecto	19/11/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	2903202I-1456	Acto Administrativo:		
No. Periodo en SAP:	4400524032			
NIT o CC:	901749966-5			
Contratista:	CONSORCIO VIAS NEIVA			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO CALAVIA MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 33,499,834,647.20	Aporte Departamento	$ 187,319,614,913.10	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	"MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - ZONRÓN, HUILA DEL KM4+000MEJORAMIENTO ENTRE LOS PROGRESIVOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	3720021700-3500321701	RUBRO	2 - 0400 - 0-1404	
Duración del contrato (Plazo):	Contrato Contratos SESENTA (60) MESES desde LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de Terminación	31/10/2028	
Interventor:	JOSE INGENIERIA DE VALOR - IA GRUPO DE INTERES			
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DIAZ HERRERA			

OBRA EXTRAFLEXA 2020M CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
672.2	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C4	Capitulo 4. Obras de Estabilización			
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	1563.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.1.3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-18.75	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	-3.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	14155.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	6322.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-63.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	219.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	123.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
621.1.2	PILOTE EN CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
627.1.2	ANCLAJE PARA REALCE	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
629.1	ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación Ø=7.5cm perforación en material común	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C5	Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial			
700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm)	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C6	Capitulo 6. Transportes			
905.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/Km	1135.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C7	Capitulo 7 Obras complementarias tramo 1			
203.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
C8	Capitulo 8 Obras no previstas			
NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIÁMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	u	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP2	INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA. NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	17000.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	4125.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	3616.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP442P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP450.20 T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	190.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	548.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3	40.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
NP 905.2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PRESENTA Mod 23 PARCIAL CONTRATO DE OBRA Vrs. 290320(3-456
RADICADO SECRETARÍA JURIDICA Rad. 29032023-1456

Secretaria :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Presenta	29/11/2023

Concepto	Descripcion			
No. Radicado Contrato de obra	29032023-1456	Acta Administrativa:		
No. Radicado en SAP:	4500124051			
NIT o CC:	5017+2000-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS EDUARDO CUCANCHO MEJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 50,499,614,841.00	Aporte Departamento	$ 387,319,631,447.00	
Valor Adición	$ 15,820,000,000.00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DORADA - PUERTO, PUTA DEL MUNICIPIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal	20/0021700-3100212775	10600	2 - 1060 - 2-0-0-5	
Duración del contrato (Plazo):	Duración Contrato: SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Fecha de Iniciación	12/10/2023	Fecha de terminación	11/10/2023	
Interventor	MAG INGENIERIA DE VALOR LA CRUZ DE INVIAS			
Operativo Importancia	DRA. DAVID DUQUE PEDRAZA			

OBRA EJECUTADA SIN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MEDIDAS
MP 900.5.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/KM	16745.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR COMPRENDIDO K88+500 AL K90+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	1405.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MPC	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRÉSTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	M3	402.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	6.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 25MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	7.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 25MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-68.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 25MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	-10.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	14.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-628.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	-53.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	2556.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	374.80	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA EN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	5400.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP8	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP9	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP10	Suministro e instalación de obra falsa para la demolicion y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K53+760, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de protección ambiental	Un	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP630.3.2 PH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOT. PLASTICO R. A/MO. ASENT. 6"+/-1" 845 (4000 PSI) TM 1" A 1 DIAS RECORRIDO 3-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	646.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	646.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP13	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO. APLICA PARA TRAMO 1	M	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)
MP14	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	0.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CÁLCULO)

GOBIERNO DE CALDAS

PRIMERA MOD 23 PARCIAL CONTRATO DE obra No. 2903/2023-1456
PASTORAL SECRETARÍA JURÍDICA No). 2903/2023-1456

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha Firmeza	19/11/2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	2903/2023-1456	Actas Administrativas:		
No. Radicado en SAP:	4600040032			
NIT o CC:	901740900-5			
Contratista:	CONSORCIO SAN MIGUEL			
Representante Legal:	CARLOS IGNACIO ORTAVIO MOJIA			
Valor del Contrato ($):	$ 93,499,614,647.00	Aporte Departamento:	$ 107,319,614,647.00	
Valor Adición	$ 13,820,000,000.00	Aporte otras entidades:	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL NOROCCIDENTE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS			
Disponibilidad presupuestal:	3990021709-3990021701	Fecha	2-Jun-2023	
Duración del contrato (Plazo):	24 meses contados desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución			
Fecha de Iniciación:	12/10/2023	Fecha de Finalización:	11/10/2025	
Interventor:	PAR INGENIERIA DE VALOR SA ENVIO DE INVIAS			
Supervisor Departamento:	Ing DAVID JAVIER TORRES			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
MP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el KL064+200 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Marinilla - Antioquia, según relación anexa.	Un	6.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	229.70	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1265.60	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	304.20	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA COMPENSACION DE LA SUPERFICIE DE ANCHO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M2	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	85.60	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1020.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
MP430.2P T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	0.00	VER ANEXO MEMORIAS DE CÁLCULO
	REAJUSTES DE OBRA	Global	$ 230,972,920.00	VER NOTAS DE AJUSTE
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Global	$ 37,505,666.00	VER ERE NOTA 30 PMT
	PAGA	Global	$ -	VER PRESUPUESTO OBRA
	AJUSTE A DISEÑOS	Global	$ 121,073,777.00	VER PRESUPUESTO AJUSTE DISEÑOS

[illegible]
PAR INGENIERIA DE VALOR SA
INTERVENTOR

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Codigo: FO-FT-02-035 Version: 07 Fecha de modificación: 13/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 23 PARCIAL

CONTRATO	2009/023-1456	RADICADO JURID. SRD	2009/023-1456		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%); MINDICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	WAR INGENIERIA DE VALOR JA CARGO DE INVIAS				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,943,783,293	AJUSTES	$ 8,080,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,170,254,360.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,197,184,830	PAGA	$ 642,124,217.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
Capitulo 1. Actividades Preliminares							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	2,957.46	161,412,251.88	0.17	-0.03	3,470.95	194,534,948.00	0.14
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRAPLENES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	7.50	7,933,617.50	0.01	0.00	3.80	4,344,982.00	0.00
Capitulo 2. Estructura de Pavimento							
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL DENAN	7,730.79	2,544,033,717.28	2.65	-0.72	5,617.09	1,849,078,623.00	1.93
BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL DENAN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	109,355.00	191,661,565.00	0.20	-0.17	10,187.60	31,731,336.00	0.03
SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	82,500.00	329,945,000.00	0.34	-0.34	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 3. Estructuras de Drenaje							
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	3,331.50	710,899,491.00	0.74	-0.01	3,284.00	700,720,216.00	0.73
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	1,275.00	132,667,575.00	0.14	-0.01	1,226.60	127,646,169.00	0.13
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	24,703.33	1,065,008,693.60	1.11	-0.38	16,229.00	699,458,973.00	0.73
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	3,859.20	268,794,062.80	0.28	-0.03	3,336.90	232,402,033.00	0.25
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	70.50	41,254,132.50	0.04	-0.01	56.97	33,139,694.00	0.03
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	21.60	16,343,964.00	0.02	0.00	17.60	13,317,306.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	7.40	5,001,987.00	0.01	0.00	7.10	5,072,325.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	2,680.00	6,072,551,318.00	6.25	-0.30	2,573.56	6,385,721,345.00	0.66
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	260,319.00	2,193,545,397.00	2.29	-1.09	131,158.94	1,140,245,831.00	1.20
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	46,280.00	356,758,640.00	0.41	-0.29	20,259.30	177,530,262.00	0.19
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	57,143.00	520,744,108.00	0.52	-0.46	5,732.00	68,992,616.00	0.06
MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	7,114.10	1,120,354,911.40	1.17	-0.02	7,006.70	1,104,245,720.00	1.15
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-30	2,562.11	403,349,349.28	0.50	0.03	2,735.50	516,583,692.00	0.54
MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-30	300.00	103,715,385.20	0.11	-0.11	0.00	0.00	0.00
GEOTEXTIL, TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	51,000.20	902,835,153.20	0.62	-0.15	33,497.33	450,902,090.00	0.47
TUBERÍA DE PVC 4"	14,356.50	679,675,805.50	0.71	-0.12	11,883.40	560,772,276.00	0.58
BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 4. Obras de Estabilización							
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	13,692.20	583,867,006.40	0.61	-0.19	9,351.10	403,575,743.00	0.42
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	2,814.29	187,899,376.72	0.19	-0.04	1,835.00	145,219,401.00	0.15
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	42.60	32,233,929.00	0.03	-0.01	23.92	18,084,294.00	0.02
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	3.40	2,572,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	77,784.05	661,621,830.15	0.71	-0.14	62,622.12	548,006,594.00	0.57

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-00.001 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2015

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 23 PARCIAL

CONTRATO	2021000343-1456	RADICADO JURID. NRO		2021000343-1456	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: PARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINORCA INGENIERIA S.A.S (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAR INGENIERIA DE VALOR LA GRANJA DE MARIA SAS				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 93,843,783,266	AJUSTES	$ 8,030,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,176,364,380.00
VALOR TOTAL	$ 107,310,814,647	DISEÑOS	$ 1,937,154,530	PAGA	$ 562,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	29,895.02	251,070,648.00	0.27	-0.17	11,271.00	98,767,773.00	0.10
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	83.10	23,350,382.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	6,968.50	51,263,964.00	0.05	-0.02	3,630.47	41,445,445.00	0.04
TUBERIA DE PVC 4"	2,944.30	139,258,334.30	0.15	-0.10	923.03	47,011,990.00	0.05
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACION EN ROCA BAJO AGUA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANCLAJE PARA REALCE	679.00	31,153,199.00	0.03	-0.02	334.30	15,334,019.00	0.02
ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material corrido	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitulo 5. Señalización y Demarcación Vial							
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	82,550.40	237,745,152.00	0.25	-0.25	0.00	0.00	0.00
TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	6,687.00	92,317,525.40	0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	488.00	967,333,728.00	0.33	-0.33	61.00	45,916,591.00	0.05
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm)	1,357.00	906,975,376.00	0.96	-0.92	42.00	28,071,456.00	0.03
Capitulo 6. Transportes							
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1K, METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	426,636.46	666,316,627.88	0.69	-0.29	247,259.42	379,759,756.00	0.40
Capitulo 7. Obras estabilización (tramo 1)							
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	85.00	19,136,700.00	0.02	-0.01	40.30	5,506,073.00	0.01
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	57.04	33,729,910.60	0.04	0.00	56.28	32,885,276.00	0.03
ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	50,007.20	438,730,873.60	0.46	-0.02	49,007.45	420,620,254.00	0.44
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	161.75	23,800,941.80	0.02	0.00	143.60	22,034,754.00	0.02
Calzada 8 Obras complementarias							
LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	733.30	71,674,941.90	0.07	-0.05	288.00	28,979,536.00	0.03
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	41,150.05	924,760,100.00	1.04	-0.28	30,831.50	747,739,031.00	0.78
REMOCIÓN DE DERRUMBES	162,580.82	3,249,931,879.46	3.42	-0.06	158,982.50	3,279,913,447.00	3.41
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	79,500.70	247,854,000.70	0.22	-0.05	63,187.50	196,944,438.00	0.20
RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICION DE MATERIAL CEMENTANTE	12,627.20	1,750,039,449.60	1.83	-0.04	12,338.15	1,710,034,690.00	1.78
MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS EN CARPETA EXISTENTE	162.60	87,759,559.20	0.02	0.00	162.60	87,735,559.00	0.09
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	8,675.14	14,444,223,575.82	15.05	-3.11	6,854.20	11,462,282,495.00	11.95
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	12,754.60	210,695,716.00	0.22	-0.11	8,038.80	212,515,004.00	0.22
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO CBR 80 TRAMO 1	476.00	101,340,875.00	0.11	-0.03	357.10	76,008,949.00	0.08
TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M), APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	94,195.75	144,634,672.00	0.15	0.00	83,528.00	143,559,096.00	0.15
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	549,473.61	1,000,496,701.61	1.15	-0.10	500,143.00	1,000,766,143.00	1.04
DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K55+500 AL K60+000 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	730.00	371,690,450.00	0.39	0.00	730.00	371,690,450.00	0.39
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	63,519.27	2,738,442,693.40	2.85	-1.21	36,565.60	1,576,426,219.00	1.64
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	48,073.00	1,121,110,433.00	1.17	-0.21	39,311.22	916,775,256.00	0.95
EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE TRASPORTE Y DISPOSICION EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	6,020.30	1,005,293,775.20	1.05	-0.44	3,519.70	587,232,634.00	0.61
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	772.17	1,110,022,149.21	1.15	-0.11	701.50	1,008,975,070.00	1.05
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	341.20	542,249,711.60	0.57	-0.11	273.10	434,022,264.00	0.45
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	110.30	191,584,365.70	0.20	-0.02	109.50	174,093,953.00	0.18
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	1,053.20	1,374,326,699.20	1.43	-0.07	1,001.50	1,306,903,275.00	1.36
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	699.40	1,018,534,114.80	1.05	-0.65	367.00	391,177,554.00	0.41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	110.00	109,747,440.00	0.11	-0.06	51.10	50,992,675.00	0.05

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO

Código: FOLET-00-005
Versión: 07
Fecha de modificación: 10/07/2015

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 23 PARCIAL

CONTRATO	2020000023-1456	RADICADO JURID. NRO	2020000023-1456
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACION 10%), MINGICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACION 45%)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAT INGENIERIA DE VALOR LA SOCIEDAD DE MAAS		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		

VALOR DEL CONTRATO	$ 55,543,783,299	AJUSTES	$ 8,030,167,454	MANEJO TRANSITO	$ 1,176,964,360.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,237,164,530	PAGA	$ 382,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.		OBRA EJECUTADA	
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	84.10	84,975,912.00	0.10	-0.06	30.20	34,105,454.00	0.04
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	1.65	1,853,640.00	0.00	0.00	1.65	1,853,640.00	0.00
CORTE DE PAVIMENTO CON CONCRETERA	48,625.40	437,637,600.00	0.49	-0.32	14,613.50	131,521,200.00	0.14
CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	4,337.10	3,812,760,548.20	3.97	-1.56	2,681.10	2,318,373,717.00	2.42
CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 3	81,491.70	346,332,628.40	0.36	-0.07	65,739.30	279,623,903.00	0.29
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa	1.00	426,589,511.00	0.44	-0.04	0.90	383,932,960.00	0.40
PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	226,439.00	385,346,167.00	0.35	-0.09	206,385.80	336,126,293.00	0.35
Suministro e instalacion de core ba sa para la demoración y construcción de base de concreto de Puente Hierro K93+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	1.00	307,169,400.00	0.32	0.00	1.00	307,169,400.00	0.32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. AMC. ASENT. 6"-A1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 24 HRS PUESTO EN OBRA , PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	58.20	133,241,741.40	0.14	0.00	58.20	133,241,741.00	0.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0,71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	14,000.00	532,882,000.00	0.55	-0.45	2,626.50	99,971,940.00	0.10
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	14,000.00	1,205,022,000.00	1.25	-1.02	2,626.50	226,070,739.00	0.24
PILOTE DE CONCRETO TIPO EXCAVACION VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m DIAMETRO TOTAL EXCAVACION 1.4m NO INCLUYE	84.00	403,019,686.40	0.42	0.00	84.50	403,019,686.00	0.42
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	13,006.00	150,084,022.00	0.16	0.00	13,006.00	150,084,022.00	0.16
Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K100+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Narino - Antioquia, según relación anexa	1.00	568,545,189.00	0.73	-0.73	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	1,692.90	2,730,507,437.50	2.85	-2.47	229.70	371,005,648.00	0.39
CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	1,467.60	2,106,262,478.60	2.20	-0.32	1,355.60	1,083,610,353.00	1.97
CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	514.00	585,472,997.60	0.62	-0.16	384.20	444,803,054.00	0.45
CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	4,330.00	4,571,239,240.00	4.78	-4.78	0.00	0.00	0.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	170.60	159,062,766.40	0.16	-0.08	65.60	76,725,025.00	0.08
MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	6,933.00	1,946,566,958.00	2.03	-1.73	1,033.00	282,824,675.00	0.30
BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	17,360.40	8,137,217,760.40	8.45	-8.45	0.00	0.00	0.00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAVO 3 Y TRAMO 4	9,777.93	10,962,020,049.92	11.42	-11.42	0.00	0.00	0.00
Ajuste al peso		13.27					
TOTAL COSTOS DE OBRA		95,403,783,299.00				$ 47,091,387,920.00	
REAJUSTES DE OBRA		8,030,167,454.00				$ 2,035,484,761.10	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		1,176,964,377.00				$ 1,037,582,737.00	
PAGA		382,124,917.00				$ 338,940,223.00	
AJUSTE A DISEÑOS		1,237,164,530.00				$ 934,943,785.00	
VALOR TOTAL		107,319,614,647.00				$ 51,731,815,426.10	

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO	Código: FO-FT-00-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO

INFORME DE INTERVENTORIA 23 PARCIAL

CONTRATO	2955/2023-1456	RADICADO JURID. NRO	20250023-1456		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MAS INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 95,943,793,258	AJUSTES	$ 0.00	MANEJO TRANSITO	$ 1,176,354,389.00
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,647	DISEÑOS	$ 1,507,184,830	PAGA	$ 882,124,917.00

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %

INFORMACIÓN DE CONTRATO		INTERVENTORIA/SUPERVISION
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), MINOCA INGENIERIA S.A.S (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)	LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR MAS INGENIERIA DE VALOR A CARGO DEL INVIAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 93,423,614,547	
VALOR ADICIONAL	$ 13,920,000,000	
VALOR TOTAL	$ 107,319,614,547	
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
FECHA INICIACION	12/10/2023	
FECHA TERMINACION	11/10/2028	
FECHA DEL ACTA	19/11/2023	

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas de tubería de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, recalce del pavimento existente e instalación de mezcla asfáltica y construcción de cunetas laterales y revales de obras existentes.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construcción de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, filtros, conformación de calzada, instalación BEMAN, instalación mezcla asfáltica y se realiza la construcción de cunetas.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construcción de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalación mezcla asfaltica.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, recuperación de anchos de vía y mantenimiento del tramo comprendido entre el K76+650 al K90+000, excavación de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, construcción de filtros y salida de derrumbes.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de a presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas y recuperación de anchos de vía, y se realizo el mantenimiento de vía entre el K100+000 al K120+000.

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO
MAS INGENIERIA DE VALOR

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA

Código: FO-FT-02-005
Versión: 07
Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
18/11/2025

ACTA NRO. 23 PARCIAL — INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO	2909202314456	CONSULTORIA		OBRA:	X
Nro. CONTRATO RADICADO	2909202314456				

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
INTERVENTOR (EXTERNO)	MAB INGENIERÍA DE VALOR LTA CARGO DE INVIAS)

PREGUNTAS	SI	NC	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			Se realizan jornadas de recolección y posterior disposición en los sitios autorizados
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por mas de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección semanal de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la roca asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente aislados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil	X			
Las baterías de las maquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	El cambio de las baterías se realizan en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
El cambio de aceites se realiza en la obra	X			El cambio del aceite de los equipos se realiza en el área de mantenimiento estipulada en el proyecto.
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra	X			
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra	X			Se han divulgado los lineamientos ambientales de manera constante en los canales de información establecidos
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)	X			Se toman medidas estipuladas
Se hace control de desechos líquidos que puedan generar contaminación del aire	X			Se realizó disposición de
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descompos ción			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra	X			El abastecimiento del recurso se hace a través de un proveedor o tercero
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

Firma

ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA

Código: FO-FT-02-005
Versión: 07
Fecha de modificación: 19/01/2015

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	19/11/2025

TRAMO 1: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construcción de muros de contención, reciclaco del pavimento existente e instalación de mezcla asfaltica y construccion de cunetas laterales y realces de obras existentes.

SUBTRAMO 1 TRAMO 1: Reemplazo de alcantarillas existentes, construccion de filtros longitudinales y obras de entrada y salida de alcantarillas, muros, conformacion de calzada, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica y se adelanta la construccion de cunetas.

SUBTRAMO 3 TRAMO 1: Se realizo limpieza de alcantarillas, reemplazo de las existentes que lo requieren, construccion de filtros, estructuras de entrada y salida de las obras reemplazadas, instalación BEMAN, instalacion mezcla asfaltica.

TRAMO 3: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillas, construccion de muros de contención, recuperación de anchos de vía y mantenimiento del tramo comprendido entre el K78+650 al K90+000, excavacion de la subrasante y aporte de material primera capa estructura de pavimento, construcción de filtros y retiro de derrumbes.

TRAMO 4: Las actividades realizadas a la fecha de la presente acta corresponden a: Ejecución de reemplazo de alcantarillas existentes de 24" a 36", instalación aceros y vaciado concretos estructuras de encole y descole alcantarillasy recuperación de anchos de vía, y se realizo el mantenimiento vía entre el K106+000 al K120+000.

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA		OBRA	X

Nº CONTRATO RADICADO:	2SC92023-1456

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%), VINOICA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%) Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 45%)
INTERVENTOR EXTERNO	MAB INGENIERIA DE VALOR (A CARGO DE INVIAS)

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 400050798 Y 400050802	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 5,366,990,732.35	12/10/2023 A 12/10/2028	NACIONAL DE SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 32,195,884,394.10	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 9,349,961,464.70	12/10/2023 A 11/04/2029	NACIONAL DE SEGUROS
PAGO DE SALARIOS	$ 21,463,922,929.40	12/10/2023 A 12/10/2031	NACIONAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 205,192,102.00	12/10/2028 A 12/10/2033	NACIONAL DE SEGUROS

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	DESCONTADAS ACTAS	PLANILLAS SALUD	SI
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	NO	PAZ Y SALVO MINTRAB.	NO
RECIBO PAGO SENA (FIC)	NO	INF. SUPERVISION	SI

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, ICBF, CAJA COMPENSACION FAMILIAR SE ANEXARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL COSTO DEL IMPUESTO DE LAS DIFERENTES ESTAMPILLAS SERAN DESCONTADAS DE LA PRESENTE ACTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO.

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
12 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	ENERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 al 29	FEBRERO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 31	MARZO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	JULIO	SECO	LLUVIAS POCO FRECUENTES
01 AL 30	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	DICIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	ENERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 28	FEBRERO	HUMEDO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MARZO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	ABRIL	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 31	MAYO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JUNIO	LLUVIOSO	LLUVIAS CON FRECUENCIA ALTA
01 AL 30	JULIO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 31	AGOSTO	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 30	SEPTIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES DURANTE LA NOCHE
01 AL 31	OCTUBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES
01 AL 19	NOVIEMBRE	HUMEDO	LLUVIAS FRECUENTES

OBSERVACIONES	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR EXTERNO MAB INGENIERIA DE VALOR

	GOBERNACIÓN DE CALDAS	CODIGO	
		VERSION	
	ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	PÁGINA	1

FECHA 7/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS ACTA No: 7

CONTRATO No. 29052023-1456 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: Ruta del Renacimiento

CONTRATISTA: Consorcio San Miguel

INTERVENTOR: MAB Ingenieria de Valor CONTRATO No. 1071-2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 23 (Año)

FECHA DE INICIO: 12 (Día) 10 (Mes) 23 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) VALOR INICIAL: $ 93,499,614,647

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) VALOR ACUMULADO: $ 107,319,614,647

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 (Día) 10 (Mes) 28 (Año)

A.I.U : 31 % A 26 % I 0 % U 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP15	14104	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K105+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un	1.00	$ 669,545,189.00	$ 669,545,189.00
NP16	11604	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,692.50	$ 1,618,675.00	$ 2,739,607,437.50
NP17	11606	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	1,467.60	$ 1,496,513.00	$ 2,196,282,478.80
NP18	11604	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	514.30	$ 1,157,832.00	$ 595,472,997.60
NP19	11604	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	4,320.00	$ 1,058,157.00	$ 4,571,238,240.00
NP20	11606	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	170.60	$ 897,144.00	$ 153,052,766.40
NP21	11604	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	6,938.00	$ 280,566.00	$ 1,946,568,908.00
NP330.3.2 T3 Y T4	11602	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	17,366.40	$ 468,561.00	$ 8,137,217,750.40
NP450.2P T3 Y T4	11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	5,777.92	$ 1,897,226.00	$ 10,962,020,049.92

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos están referidos al origen del contrato (to) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202128601ANT

Firma
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 12/11/2024 (Día / Mes / Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☒

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. 20000023-1458 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM		GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K109+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samaná - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	14104	Un	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 0.00
			SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNT.	Vr. UNITARIO
Limpieza y recubrimiento acero expuesto , con mortero de reparación estructural tipo MapeGrout T60 o equivalente	gl	1.00	$ 375,843.00	$ 375,843.00
Suministro, transporte, y colocación de lámina de carbono tipo Carboplate E 170 o quivalente (incluye preparación de superficie y epoxicos)	ml	226.00	$ 799,156.00	$ 180,809,256.00
Cambio de ángulos de 3" x 3/8" de arriostrado	ml	17.00	$ 431,200.00	$ 7,330,400.00
Colocación de láminas en las vigas transversales de los apoyos, para reemplazado de sección por corrosión	kg	786.57	$ 40,248.00	$ 31,656,288.00
Suministro, fabricación, transporte, montaje, limpieza y pintura de laminas para refuerzo de puente metalico	kg	4373.00	$ 33,600.00	$ 146,270,933.00
Limpieza con chorro de arena grado comercial y aplicación de pintura anticorrosiva alquidica en 3 mils de espesor y pintura de acabado alquidica en 2 mils de espesor	m2	535.00	$ 236,153.00	$ 142,893,495.00
			SUBTOTAL	$ 511,105,198.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 511,105,198.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		132,696,631.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		25,555,190.00
		SUBTOTAL	$ 158,441,691
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 669,545,189.00

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CACAMO MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202126601ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: MAB Ingeniería de Valor S.A. RA. ANGEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2023 (Día / Mes / Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 10/1-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11604	m3	1,692.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Aspersor manual de 20 litros		$ 3,959.00	0.5000	$ 1,979.50
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		$ 7,645.00	0.5000	$ 3,822.50
Formaleta metálica para concreto (m2)		$ 877.00	314.0000	$ 275,378.00
Auto hormigonera 3.5m3		$ 218,400.00	0.4762	$ 103,949.68
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 9,872.41
			SUBTOTAL	$ 393,902.09

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.635	$ 197,000.00	$ 125,095.00
Agregado fino para concreto (tamaño maximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.596	$ 231,798.00	$ 138,132.54
Agua	L	245	$ 111.00	$ 27,195.00
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la perdida prematura de humedad de concretos y morteros	kg	1	$ 8,207.00	$ 8,207.00
Concreto hidráulico MTO 121 spo MS	kg	340	$ 999.00	$ 340,650.00
			SUBTOTAL	$ 649,279.54

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 116,000.00	1.85	$ 214,600.00	1.82	$ 118,041.80
Oficial	$ 85,733.33	1.85	$ 121,606.67	1.82	$ 66,890.38
Obrero (2) Hormigonera	$ 77,333.33	1.85	$ 143,066.67	16.80	$ 8,516.04
				SUBTOTAL	$ 193,448.20
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,235,629.83

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	26%		321,264.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		61,781.00
		SUBTOTAL	$ 383,045
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 1,918,675.00

Firma:
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 052022126901ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma:
Nombre: MAB Ingeniería de Valor S.A. BIC ARIEL ALBERTO CISNEROS GAMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2025 (Día / Mes / Año) 6

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11604	m3	1,467.80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Aspersor manual de 20 litros		$ 3,959.00	0.6140	$ 2,430.83
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		$ 7,645.00	0.6140	$ 4,694.03
Auto Hormigonera 3,5m3		$ 215,454.00	0.4702	$ 102,599.19
Formaleta metálica para concreto (m2)		$ 877.00	314.0000	$ 275,378.00
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 6,818.84
			SUBTOTAL	$ 391,920.89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.878	$ 197,000.00	$ 133,566.00
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,76mm - arena natural o trituracion de roca, gravas, y/o escorias) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.637	$ 231,766.00	$ 147,634.94
Agua	L	225	$ 111.00	$ 24,975.00
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de conc	kg	1	$ 8,207.00	$ 8,207.00
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	450	$ 666.00	$ 299,700.00
			SUBTOTAL	$ 814,082.94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (6)	$ 232,000.00	1.85	$ 429,200.00	4.31	$ 99,628.60
Oficial	$ 65,733.33	1.85	$ 121,606.67	4.31	$ 28,228.10
Obrero (2) Hormigonera	$ 77,333.33	1.85	$ 143,066.67	16.80	$ 8,516.04
				SUBTOTAL	$ 136,372.74
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,142,376.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		297,018.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		57,119.00
		SUBTOTAL	$ 354,137
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 1,496,513.00

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 052021 28901ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: MAB Ingeniería de valor S.A. RAFAEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MOP-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2025 (Día/Mes/Año) de 6

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP15	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11604	m3	614.30

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Auto hormigonera 3.5m3		$ 216,400.00	0.5048	$ 109,238.72
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 5,704.60
			SUBTOTAL	$ 114,943.32

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.407	$ 197,900.00	$ 80,139.50
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,76mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.382	$ 231,766.00	$ 88,580.97
Agua	L	135	$ 111.00	$ 14,985.00
Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.4	$ 228,000.00	$ 91,520.00
Cemento hidráulico NTC 121 tipo U,G	kg	270	$ 666.00	$ 179,820.00
Formaleta de madera para concreto	M2	4.71	$ 42,412.00	$ 199,760.52
			SUBTOTAL	$ 654,806.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 119,000.00	1.55	$ 214,600.00	3.20	$ 67,062.50
Oficial	$ 65,733.33	1.85	$ 121,606.67	3.20	$ 38,002.08
Obrero (2) Hormigonera	$ 77,333.33	1.85	$ 143,066.67	15.85	$ 9,027.51
				SUBTOTAL	$ 114,092.09
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 883,841.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		229,799.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		44,192.00
		SUBTOTAL	$ 273,991
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 1,157,832.00

Firma:
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No 052021250001ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma:
Nombre: MAB Ingeniería de valor S.A./RA ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25200-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2023 (Día/Mes/Año) de 6

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2023 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 2 Y TRAMO 4	11604	m3	4,320.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Aspersor manual de 20 litros		$ 3,959.00	0.5000	$ 1,979.50
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros		$ 7,645.00	0.5000	$ 3,822.50
Auto hormigonera 3.5m3		$ 218,400.00	0.4286	$ 92,749.04
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 4,340.18
			SUBTOTAL	$ 102,891.22

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.578	$ 197,000.00	$ 113,866.00
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.837	$ 231,766.00	$ 147,634.94
Agua	L	225	$ 111.00	$ 24,975.00
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la perdida prematura de humedad de concretos y morteros	kg	1	$ 8,207.00	$ 8,207.00
Revestimiento para curado y/o bonding de concreto	m2	0.2	$ 13,552.00	$ 2,675.60
Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG	kg	450	$ 666.00	$ 299,700.00
			SUBTOTAL	$ 615,058.54

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 328,666.67	1.65	$ 715,333.33	15.19	$ 47,106.48
Oficial	$ 262,933.33	1.65	$ 486,426.67	15.19	$ 32,032.41
Obrero (2) Hormigonera	$ 77,333.33	1.85	$ 143,066.67	18.67	$ 7,664.80
				SUBTOTAL	$ 86,803.69
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 807,753.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		210,016.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		40,388.00
		SUBTOTAL	$ 250,404
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 1,058,157.00

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202125601ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, cuadrillas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: MAB Ingeniería de valor SA, R/L ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/08/2025 (DD / Mes / Año)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ITEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 26 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
[illegible]	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11001	m3	170.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Mezcladora de concreto tipo trompo		$ 6,192.00	1.0000	$ 6,192.00
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 4,336.71
			SUBTOTAL	$ 10,528.71

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	1.023	$ 197,000.00	$ 201,531.00
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	0.556	$ 231,798.00	$ 128,861.90
Agua	L	217	$ 111.00	$ 24,087.00
Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG	kg	350	$ 666.00	$ 233,100.00
			SUBTOTAL	$ 587,579.90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (B)	$ 309,333.33	1.85	$ 572,266.67	8.00	$ 71,533.33
Oficial	$ 65,733.33	1.85	$ 121,606.67	8.00	$ 15,200.83
				SUBTOTAL	$ 86,734.17
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 684,843.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		178,059.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		34,242.00
		SUBTOTAL	$ 212,301
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 897,144.00

Firma:
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 052021 29601ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma:
Nombre: MAB Ingeniería de Valor S.A. RAFAEL ALBERTO CORREA CHAVEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2025 (Día/Mes/Año) — de 6

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAS INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 0074-2023 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11804	m3	8,938.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 298.06
			SUBTOTAL	$ 298.06

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Material drenante (3") PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	1.06	$ 196,144.00	$ 207,912.64
			SUBTOTAL	$ 207,912.64

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (3)	$ 119,000.00	1.85	$ 214,500.00	36.00	$ 5,961.11
				SUBTOTAL	$ 5,961.11
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 214,172.00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Percentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		55,685.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		10,709.00
		SUBTOTAL	$ 66,394
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 280,566.00

Firma:
Nombre: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 05202125601ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma:
Nombre: MAS Ingeniería de valor S.A. RL ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-62473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2025 (Día / Mes / Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑ 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA: SMOV GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCION	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11603	m3	17,366.40

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 85,057.00	0.0360	$ 3,062.05
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m. peso 16 ton		$ 186,947.00	0.0360	$ 6,730.09
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton		$ 173,594.00	0.0360	$ 6,249.38
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)			5%	$ 32.19
			SUBTOTAL	$ 16,073.72

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua	Lt	22	$ 111.00	$ 2,442.00
Material de base clase C PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	m3	1.3	$ 269,492.00	$ 338,020.00
			SUBTOTAL	$ 340,462.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (2)	$ 77,033.33	186	$ 143,068.67	222.22	$ 643.80
				SUBTOTAL	$ 643.80
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 357,679.52

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		92,997.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		17,884.00
		SUBTOTAL	$ 110,881
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 468,561.00

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO SALAMO MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 0520212860 1ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: MAB Ingeniería de valor S.A.S. R/L ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	MEPI-VIN1-IN-10-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27/10/2025 (Día/Mes/Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ☐ ÍTEMS NO PREVISTOS ☑ 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUROCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No. LP-SI-004-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR Contrato No.: 1071-2022 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 28 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
NP450.2P T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	11603	m3	5,777.92

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton		$ 173,594.00	0.1280	$ 22,220.03
Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas		$ 173,594.00	0.1280	$ 22,220.03
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=200M3/H, velocidad de		$ 200,300.00	0.1280	$ 25,638.40
HERRAMIENTA MENOR (10% M.O)			10%	$ 1,403.20
			SUBTOTAL	$ 71,481.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Mezcla densa caliente MDC19 asfalto modificado tipo III PUESTO EN OBRA (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE	M3	1.25	$ 1,090,200.00	$ 1,362,750.00
			SUBTOTAL	$ 1,362,750.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Obrero (6)	$ 309,333.33	185	$ 572,266.67	62.50	$ 9,156.27
Oficial	$ 65,733.33	185	$ 121,606.67	62.50	$ 1,945.71
Rastrilleros (2)	$ 96,966.67	185	$ 183,126.35	62.50	$ 2,930.01
				SUBTOTAL	$ 14,031.98
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,448,263.64

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	26%		376,548.00
IMPREVISTOS	0%		-
UTILIDAD	5%		72,413.00
		SUBTOTAL	$ 448,962
		Precio Unitario Total Aproximado al peso	$ 1,897,226.00

Firma
Nombre: CARLOS IGNACIO GABAVID MEJIA
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202126601ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: MAB Ingeniería de valor S.A. R/L ABEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-52473

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIACN GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS — ACTA No: 15 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA ☐ 1 de 1 — POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No (Indicar No. y Fecha)

CONTRATO No: 2908/2023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON. RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 — INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 69 (En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,499,813,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,814,847.00 — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 14 FECHA 06/10/2025 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 de fecha 21 de octubre de 2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
C1				Capítulo 1. Actividades Preliminares													
1	500.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	109521.00	$ 43,112.00	$ 4,721,880,552.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	31135.00	$ 54,676.00	$ 1,699,286,030.00	2957.46	$ 161,412,251.58			$ -	2,470.50	$ 134,834,949.00	2957.46	$ 161,412,251.58
3	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	342.00	$ 213,374.00	$ 72,973,908.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	220.1			TERRAPLENES	M3	53498.00	$ 16,687.00	$ 892,737,813.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5	200.3			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	5.00	$ 1,064,469.00	$ 5,322,345.00	7.50	$ 7,983,517.50			$ -	3.85	$ 4,044,602.00	7.50	$ 7,983,517.50
C2				Capítulo 2. Estructura de Pavimento													
6	341.2 T1			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	13260.00	$ 329,168.00	$ 4,365,032,880.00	7230.79	$ 2,380,269,717.28	+	500.00	$ 164,584,000.00	5,389.29	$ 1,767,505,837.00	7730.79	$ 2,544,853,717.28
7	341.2 T4			BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	M3	8400.00	$ 474,867.00	$ 3,988,882,800.00	12894.00	$ 6,027,991,698.00	-	-12894.00	$ (6,027,991,698.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
8	310.1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	88200.00	$ 1,743.00	$ 153,732,600.00	109956.00	$ 191,651,585.00			$ -	18,187.80	$ 31,701,335.00	109956.00	$ 191,651,585.00
9	320.3.1 T4			SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	13545.00	$ 354,604.00	$ 4,803,111,180.00	1459.60	$ 517,579,998.40	-	-1459.60	$ (517,579,998.40)	0.00	$ -	0.00	$ -
10	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	216000.00	$ 3,945.00	$ 852,120,000.00	97800.00	$ 385,821,000.00	-	-16000.00	$ (59,176,000.00)	0.00	$ -	82800.00	$ 326,645,000.00
11	450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	2520.00	$ 1,297,314.00	$ 3,269,231,280.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	450.2P T3			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	8720.00	$ 1,443,147.00	$ 9,897,947,640.00	4553.63	$ 6,571,413,156.61	-	-4553.63	$ (6,571,413,156.61)	0.00	$ -	0.00	$ -
13	450.2P T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	5800.00	$ 1,443,147.00	$ 8,405,704,350.00	4143.87	$ 5,980,213,568.89	-	-4143.87	$ (5,980,213,568.89)	0.00	$ -	0.00	$ -
C3				Capítulo 3. Estructuras de Drenaje													
14	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	230.00	$ 213,374.00	$ 49,076,020.00	3131.50	$ 668,180,661.00	+	200.00	$ 42,674,800.00	3,097.00	$ 660,819,279.00	3331.50	$ 710,855,461.00
15	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	397.00	$ 104,053.00	$ 41,309,041.00	1275.00	$ 132,667,575.00			$ -	1,227.80	$ 127,756,275.00	1275.00	$ 132,667,575.00
16	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	37852.00	$ 43,112.00	$ 1,631,875,424.00	24703.30	$ 1,065,008,669.60			$ -	15,425.40	$ 665,019,842.00	24703.30	$ 1,065,008,669.60
17	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	9585.00	$ 79,074.00	$ 757,765,142.00	3652.20	$ 288,794,062.80			$ -	3,338.90	$ 263,852,033.00	3652.20	$ 288,794,062.80
18	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1265.00	$ 1,381,261.00	$ 1,775,845,565.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	621.00	$ 1,023,749.00	$ 640,497,929.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	683.00	$ 1,146,249.00	$ 782,255,585.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1588.00	$ 1,146,249.00	$ 1,820,243,412.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
22	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	456.00	$ 585,165.00	$ 266,880,190.00	70.50	$ 41,264,132.50			$ -	54.67	$ 32,105,787.00	70.50	$ 41,264,132.50
23	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	666.00	$ 795,885.00	$ 439,772,280.00	68.00	$ 49,039,560.00	-	-44.40	$ (33,595,930.00)	21.60	$ 16,343,954.00	21.60	$ 16,343,954.00
24	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	67.00	$ 798,995.00	$ 43,122,925.00	67.00	$ 43,122,925.00	-	-49.20	$ (37,237,918.00)	7.80	$ 5,901,987.00	7.80	$ 5,901,987.00
25	630.5			CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	M3	664.00	$ 965,074.00	$ 833,823,936.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26	663.1			TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ML	1350.00	$ 2,481,482.00	$ 3,373,306,656.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00			$ -	2,585.59	$ 6,399,399,649.00	2689.00	$ 6,672,651,318.00
27	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	5684.00	$ 6,783.00	$ 49,808,892.00	250319.00	$ 2,193,546,397.00			$ -	110,249.02	$ 1,073,909,900.00	250319.00	$ 2,193,546,397.00
28	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	56760.00	$ 6,783.00	$ 483,181,640.00	45260.00	$ 396,788,640.00			$ -	17,104.30	$ 149,884,897.00	45260.00	$ 396,788,640.00
29	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	157143.00	$ 6,783.00	$ 1,377,044,109.00	57143.00	$ 500,744,109.00			$ -	5,789.00	$ 50,729,007.00	57143.00	$ 500,744,109.00
30	812.2P			MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	M2	557.00	$ 13,853.00	$ 7,716,121.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
31	671.1 T1			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2142.00	$ 709,340.00	$ 1,519,466,280.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32	671.1 T3			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	5120.00	$ 827,172.00	$ 4,235,120,640.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33	671.1 T4			CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1240.00	$ 827,172.00	$ 1,025,693,280.00	0.00	$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
34	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	3154.00	$ 167,554.00	$ 498,925,316.00	7414.10	$ 1,168,121,111.40	-	-300.00	$ (47,288,200.00)	6,890.50	$ 1,071,445,977.00	7114.10	$ 1,120,594,911.40
35	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	10368.00	$ 261,220.00	$ 2,618,686,080.00	2821.88	$ 793,583,469.20	-	-2821.88	$ (793,583,469.20)	0.00	$ -	0.00	$ -
36	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	9228.00	$ 261,220.00	$ 2,595,098,160.00	3961.88	$ 1,119,775,689.20	-	-3961.88	$ (1,119,775,689.20)	0.00	$ -	0.00	$ -
37	673.3.3 T1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	304.00	$ 168,848.00	$ 74,405,112.00	2982.11	$ 483,842,349.28			$ -	2,490.10	$ 404,595,193.00	2982.11	$ 483,849,349.28
38	673.3.3 T3			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20	M3	1358.00	$ 334,660.00	$ 631,873,640.00	1185.00	$ 397,699,840.00	-	-878.11	$ (293,585,354.60)	0.00	$ -	306.89	$ 103,715,985.20
39	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	88433.00	$ 11,418.00	$ 1,009,551,128.00	55900.20	$ 815,667,183.20	-	-2000.00	$ (22,852,000.00)	37,950.48	$ 453,585,160.00	51050.20	$ 592,835,183.20

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA: SMGN GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 15 (Numerar de manera consecutiva)

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒ 2 de 5

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 20092023-1458 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2023 INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,485,814,647.00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,614,647.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 69 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,833,800,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 de fecha 21 de octubre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 14 FECHA 06/10/2025		PRESENTES						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
									CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR						
40	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	37694.00	$ 47,301.00	$ 1,782,663,894.00	21356.60	$ 1,010,183,806.60	-	-7000.00	$ (331,107,000.00)			11,502.60	$ 544,004,483.00	14356.60	$ 679,076,806.60
41	672.2			BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	14506.00	$ 50,240.00	$ 728,905,040.00	4506.00	$ 292,003,040.00	-	-4506.00	$ (292,003,040.00)			0.00	$ -	0.00	$ -
C4				Capítulo 4. Obras de Estabilización															
42	600.2.3			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	5268.00	$ 43,112.00	$ 227,114,016.00	8662.20	$ 374,307,008.40	+	5000.00	$ 215,560,000.00			7,797.40	$ 336,181,509.00	13662.20	$ 589,867,008.40
43	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	4707.00	$ 79,074.00	$ 372,201,318.00	2314.28	$ 182,999,376.72			$ -			1,839.50	$ 145,219,401.00	2314.28	$ 182,999,376.72
44	630.3.2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	M3	516.00	$ 1,381,681.00	$ 713,102,196.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
45	630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	1388.00	$ 1,148,249.00	$ 1,602,456,102.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
46	630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	M3	101.00	$ 1,148,249.00	$ 115,771,149.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
47	630.6 T3			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	182.00	$ 756,665.00	$ 137,713,030.00	94.00	$ 71,126,510.00	-	-51.40	$ (38,892,681.00)			42.60	$ 32,233,929.00	42.60	$ 32,233,929.00
48	630.6 T4			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	29.00	$ 756,665.00	$ 21,943,285.00	29.00	$ 21,943,265.00	-	-25.60	$ (19,372,624.00)			3.40	$ 2,572,661.00	3.40	$ 2,572,661.00
49	640.1 T3			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	84693.00	$ 5,753.00	$ 742,164,758.00	58763.10	$ 578,457,306.20	+	12000.95	$ 105,164,321.85			48,484.12	$ 424,886,329.00	77764.05	$ 681,621,630.15
50	640.1 T4			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	KG	29896.00	$ 6,753.00	$ 261,978,648.00	29896.00	$ 261,978,648.00			$ -			4,949.00	$ 43,368,087.00	29896.00	$ 261,978,648.00
51	673.2 T3			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	516.00	$ 281,220.00	$ 145,109,520.00	516.00	$ 145,109,520.00	-	-432.90	$ (121,740,138.00)			83.10	$ 23,369,382.00	83.10	$ 23,369,382.00
52	673.2 T4			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	191.00	$ 281,220.00	$ 53,713,020.00	191.00	$ 53,713,020.00	-	-191.00	$ (53,713,020.00)			0.00	$ -	0.00	$ -
53	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	5123.00	$ 11,416.00	$ 58,541,248.00	5356.50	$ 61,283,964.00			$ -			3,350.77	$ 38,252,280.00	5966.50	$ 61,283,964.00
54	663.1.1			TUBERÍA DE PVC 4"	ML	215.00	$ 47,301.00	$ 10,217,015.00	944.30	$ 44,668,334.30	+	2000.00	$ 94,602,000.00			890.29	$ 42,131,806.00	2944.30	$ 139,268,334.30
55	621.1.2			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	ML	364.00	$ 4,215,785.00	$ 1,534,645,740.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
56	629.1.2			ANCLAJE PARA REALCE	ML	579.00	$ 45,681.00	$ 31,153,199.00	579.00	$ 31,153,199.00			$ -			334.00	$ 15,338,019.00	579.00	$ 31,153,199.00
57	623.1			ANCLAJE TIPO pasivos con acero #6, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	ML	4313.00	$ 109,255.00	$ 673,827,815.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
C5				Capítulo 5. Señalización y Demolicion Vial															
58	700.1			LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	130000.00	$ 2,880.00	$ 374,400,000.00	142550.40	$ 410,545,152.00	-	-60000.00	$ (172,800,000.00)			0.00	$ -	82550.40	$ 237,745,152.00
59	701.1.2			TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	UND	15642.00	$ 10,635.00	$ 166,311,662.00	19557.60	$ 177,325,625.40	-	-8000.00	$ (85,008,000.00)			0.00	$ -	8867.60	$ 92,317,625.40
60	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND	305.00	$ 762,731.00	$ 228,582,955.00	388.00	$ 292,059,028.00	+	100.00	$ 75,273,100.00			61.00	$ 45,916,691.00	488.00	$ 367,332,728.00
61	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X90cm)	UND	1357.00	$ 668,868.00	$ 870,210,196.00	1357.00	$ 906,975,376.00			$ -			42.00	$ 29,071,458.00	1357.00	$ 906,975,376.00
C6				Capítulo 6. Transportes															
62	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	1047841.00	$ 1,556.00	$ 1,630,483,376.00	426938.46	$ 655,310,697.80		0.00	$ -			245,104.42	$ 378,018,998.00	426938.46	$ 655,318,697.85
C7				Capítulo 7 Obras estabilizacion tramo 1															
63	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0.00	$ 213,374.00	$ 0.00	85.00	$ 18,136,790.00			$ -			40.30	$ 8,598,973.00	85.00	$ 18,136,790.00
64	630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	$ 1,023,749.00	$ 0.00	0.00	$ -			$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
65	630.6 T1			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	$ 560,165.00	$ 0.00	57.64	$ 32,728,910.60			$ -			59.20	$ 32,585,276.00	57.64	$ 33,728,910.60
66	640.1 T1			ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	0.00	$ 6,753.00	$ 0.00	58067.20	$ 438,738,873.60			$ -			48,007.45	$ 420,869,284.00	58067.20	$ 438,738,873.60
67	673.2 T1			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	$ 157,564.00	$ 0.00	161.70	$ 23,900,941.80			$ -			143.90	$ 27,674,754.00	161.70	$ 23,900,941.80
C8				Capítulo 8 Obras no previstas															
68	NP 1 T1			LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 30" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA	m	0.00	$ 97,743.00	$ 0.00	733.30	$ 71,674,941.90			$ -			299.00	$ 29,999,634.00	733.30	$ 71,674,941.90
69	NP2			INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	0.00	$ 24,174.00	$ 0.00	41150.00	$ 994,760,100.00			$ -			30,931.50	$ 747,738,081.00	41150.00	$ 994,760,100.00
70	NP 211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0.00	$ 20,623.00	$ 0.00	161231.00	$ 3,322,872,443.00	+	1314.62	$ 27,069,236.44			141,377.50	$ 3,012,600,032.00	152525.62	$ 3,349,941,679.45
71	NP421.1 T5			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	0.00	$ 3,101.00	$ 0.00	79920.70	$ 247,834,090.70			$ -			58,462.50	$ 161,292,213.00	79920.70	$ 247,834,090.70
72	NP 461P			RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	0.00	$ 139,068.00	$ 0.00	13227.20	$ 1,839,480,249.60	-	-600.00	$ (83,440,800.00)			8,721.70	$ 1,212,909,375.00	12627.20	$ 1,756,039,449.60

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA: SIACH GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

ACTA No: 15 (Numerar de manera consecutiva)

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐ 3 de 5

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y Fecha)

CONTRATO No: 3909/2023-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2023

INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Bdique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,469,814,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,814,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,850,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 14 FECHA 05/10/2025		MODIFICACIONES PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 de fecha 21 de octubre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
73	NP442P			MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL DE ALTORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	0.00	$ 575,292.00	$ 0.00	152.60	$ 87,789,559.20			$ -	152.60	$ 87,789,559.20	152.60	$ 87,789,559.20
74	NP450.2P T1			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	0.00	$ 1,666,013.00	$ 0.00	8975.14	$ 14,949,724,779.82	-	300.00	$ (499,503,600.00)	8 193.50	$ 13,512,208,016.00	8675.14	$ 14,444,220,879.82
75	NP 610.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO EXCLUYENDO Y/O DEL RIO MAGDALENA	m3	0.00	$ 24,630.00	$ 0.00	12754.60	$ 316,896,718.00			$ -	8 116.20	$ 201,625,246.00	12754.60	$ 316,896,718.00
76	NP 610.3 T1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 666 60 TRAMO 1	m3	0.00	$ 212,901.00	$ 0.00	328.00	$ 69,405,726.00	+	150.00	$ 31,935,150.00	316.60	$ 67,404,456.00	478.00	$ 101,340,876.00
77	NP 900.2.2			TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M). APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ÍTEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3/KM	0.00	$ 1,538.00	$ 0.00	94185.75	$ 144,884,872.00			$ -	93,328.00	$ 143,599,008.00	94185.75	$ 144,884,872.00
78	NP 900.3.2			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3/KM	0.00	$ 2,001.00	$ 0.00	512778.62	$ 1,026,099,828.62	+	36665.000	$ 73,426,675.00	423 380.00	$ 847,183,380.00	549473.61	$ 1,099,496,701.01
79	NP3			DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPASIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO Km8+500 AL Km9+00 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO. NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI TRANSPORTE)	m3	0.00	$ 509,188.00	$ 0.00	730.00	$ 371,690,450.00			$ -	730.00	$ 371,690,450.00	730.00	$ 371,690,450.00
80	NP 210.2.2			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	$ 43,112.00	$ 0.00	56251.27	$ 2,425,535,712.40	+	7258.00	$ 312,905,593.60	55,169.18	$ 1,515,625,651.00	63519.27	$ 2,738,442,608.40
81	NP4			EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPÓSITO NI TRANSPORTE	m3	0.00	$ 23,321.00	$ 0.00	48073.00	$ 1,121,110,433.00			$ -	38 988.62	$ 908,454,981.00	48073.00	$ 1,121,110,433.00
82	NP 600.2.1			EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	0.00	$ 168,084.00	$ 0.00	6020.30	$ 1,056,203,775.20			$ -	3 510.20	$ 589,147,238.00	6020.30	$ 1,005,293,775.20
83	NP630.3.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,438,313.00	$ 0.00	772.17	$ 1,110,622,149.21			$ -	393.60	$ 567,613,897.00	772.17	$ 1,110,622,149.21
84	NP630.3.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,588,243.00	$ 0.00	1096.00	$ 1,741,810,328.00	-	-754.80	$ (1,199,580,616.40)	341.20	$ 542,249,712.00	341.20	$ 542,249,711.60
85	NP630.3.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,619,479.00	$ 0.00	1026.00	$ 1,710,169,824.00	-	-937.70	$ (1,518,585,458.30)	118.30	$ 191,584,365.70	118.30	$ 191,584,365.70
86	NP630.4.2 T1			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 1,304,906.00	$ 0.00	1053.20	$ 1,374,326,699.20			$ -	666.70	$ 1,287,550,760.00	1053.20	$ 1,374,326,699.20
87	NP630.4.2 T3			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,495,092.00	$ 0.00	1409.00	$ 2,084,272,368.00	-	-713.60	$ (1,045,468,243.20)	695.40	$ 1,018,804,115.00	695.40	$ 1,018,804,124.80
88	NP630.4.2 T4			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,497,363.00	$ 0.00	754.00	$ 1,129,011,702.00	-	-754.00	$ (1,129,011,702.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
89	NP530.1.7 T1			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	0.00	$ 997,704.00	$ 0.00	110.00	$ 109,747,440.00			$ -	51.10	$ 50,962,676.00	110.00	$ 109,747,440.00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | ACTA No: 15 (Número de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA ☐ 4 de 5 | POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indique No. y Fecha)

CONTRATO No: 2909/2022-1456 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 071-2022 | INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 93,499,814,847.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 107,319,814,847.00

PLAZO ACUMULADO: 66 (En meses según las prorrogas sin suspensión es)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/10/2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 de fecha 31 de octubre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 14 FECHA 06/10/2025		PRESENTES							
									CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
90	NP600.1.7 T3			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,129,320.00	$ 0.00	400.00	$ 451,728,000.00	-	-315.90	$ (356,752,188.00)	84.10	$ 94,975,812.00	84.10	$ 94,975,812.00
91	NP600.1.7 T4			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,158,525.00	$ 0.00	200.00	$ 231,705,000.00	-	-198.40	$ (229,851,360.00)	1.60	$ 1,853,640.00	1.60	$ 1,853,640.00
92	NP5			CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	0.00	$ 9,000.00	$ 0.00	53626.40	$ 482,637,600.00	-	-5000.00	$ (45,000,000.00)	12,467.40	$ 112,206,600.00	48626.40	$ 437,637,600.00
93	NP6 T1			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	0.00	$ 881,142.00	$ 0.00	4327.10	$ 3,812,788,548.20			$ -	2,256.80	$ 1,988,661,306.00	4327.10	$ 3,812,788,548.20
94	NP6 T3			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	0.00	$ 1,026,706.00	$ 0.00	2160.00	$ 2,217,884,960.00	-	-2160.00	$ (2,217,884,960.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
95	NP6 T4			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	0.00	$ 1,069,007.00	$ 0.00	2160.00	$ 2,287,495,120.00	-	-2160.00	$ (2,287,495,120.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
96	NP7			RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	0.00	$ 4,262.00	$ 0.00	81451.70	$ 348,332,628.40			$ -	90,359.30	$ 385,372,143.00	81451.70	$ 348,332,628.40
97	NP8			Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Manizales, Carretera Dorada-Manizales, según relación anexa.	Un	0.00	$ 426,509,511.00	$ 0.00	1.00	$ 426,509,511.00			$ -	0.90	$ 383,858,560.00	1.00	$ 426,509,511.00
98	NP9			PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	0.00	$ 1,013.00	$ 0.00	228439.00	$ 385,248,107.00			$ -	208,385.60	$ 338,125,295.00	228439.00	$ 385,248,107.00
99	NP10			Suministro e instalacion de obra falsa para la demolicion y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K33+740 incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	0.00	$ 307,189,400.00	$ 0.00	1.00	$ 307,189,400.00			$ -	1.00	$ 307,189,400.00	1.00	$ 307,189,400.00
100	NP630.3.2 PH			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. AMC. ASENT. 6"+/- 1" 345 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	0.00	$ 2,389,377.00	$ 0.00	58.20	$ 133,241,741.40			$ -	58.20	$ 133,241,741.00	58.20	$ 133,241,741.40
101	NP11			SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	0.00	$ 38,043.00	$ 0.00	8000.00	$ 304,344,000.00	+	6000.00	$ 228,258,000.00	1,360.00	$ 76,325,140.00	14000.00	$ 532,602,000.00
102	NP12			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	0.00	$ 86,073.00	$ 0.00	16000.00	$ 1,377,168,000.00	-	-2000.00	$ (172,146,000.00)	1,480.00	$ 170,424,640.00	14000.00	$ 1,205,022,000.00
103	NP13			PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m , INCLUYE ACERO DE REFUERZO. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m. DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO. APLICA PARA TRAMO 1	M	0.00	$ 4,752,993.00	$ 0.00	84.60	$ 403,019,888.40			$ -	84.60	$ 403,019,888.00	84.60	$ 403,019,888.40
104	NP14			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	0.00	$ 10,757.00	$ 0.00	13006.00	$ 150,004,022.00			$ -	13,306.00	$ 150,004,022.00	13006.00	$ 150,004,022.00
105	NP15			Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Linda localizado en el K106+000 via Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	Un		$ 659,545,189.00		0.00	$ -	+	1.00	$ 659,545,189.00	0.00	$ -	1.00	$ 659,545,189.00
106	NP16			CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 1,616,076.00		0.00	$ -	+	1692.50	$ 2,735,607,437.50	0.00	$ -	1692.50	$ 2,735,607,437.50

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA

FECHA: 07/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SIMON GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS — ACTA No.: 15 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: ☒ 5 de 5

POR CONTRATO ADICIONAL: ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2902/2023-1458 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 8071-2022 — INTERVENTOR: MAB INGENIERIA DE VALOR

PLAZO INICIAL: 60 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo definido)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 83,490,814,647.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 107,310,814,647.00

PLAZO ACUMULADO: 60 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 13,820,000,000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 de fecha 21 de octubre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		OR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 14 FECHA 05/10/2025		+/-	PRESENTES					CANTIDAD	VALOR
									CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR				
107	NP17			CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 1,408,513.00		0.00	$ -	+	1467.60	$ 2,106,282,478.80				1467.60	$ 2,106,282,478.80
108	NP18			CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 1,157,632.00		0.00	$ -	+	514.30	$ 595,472,997.60				514.30	$ 595,472,997.60
109	NP19			CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 1,058,157.00		0.00	$ -	+	4320.00	$ 4,571,338,240.00				4320.00	$ 4,571,338,240.00
110	NP20			CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 897,144.00		0.00	$ -	+	170.60	$ 153,052,766.40				170.60	$ 153,052,766.40
111	NP23			MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 280,566.00		0.00	$ -	+	6936.00	$ 1,945,566,908.00				6936.00	$ 1,945,566,908.00
112	NP330.3.2 T3 Y T4			BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 468,561.00		0.00	$ -	+	17366.40	$ 8,137,217,750.40				17366.40	$ 8,137,217,750.40
113	NP450.2P T3 Y T4			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3		$ 1,897,226.00		0.00	$ -	+	5777.92	$ 10,962,020,049.92				5777.92	$ 10,962,020,049.92
				Ajuste al peso						$ 10.09			$ 2.25				$ 13.27
*				TOTAL COSTOS DE OBRA				$ 84,547,074,037.00		$ 95,403,783,269.00			$ 0.00			$ 44,475,397,197.00		$ 95,403,783,269.00
*				REMUNERACIÓN OBRA				$ 7,672,940,907.00		$ 8,080,187,454.00			$ 0.00		$	1,766,571,230.10		$ 8,080,187,454.00
*				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 235,092,250.00		$ 1,716,354,377.00			$ 0.00		$	1,249,697,093.00		$ 1,716,354,377.00
*				PMA				$ 455,318,280.00		$ 582,124,917.00			$ 0.00		$	336,840,233.00		$ 582,124,917.00
*				AJUSTE A DISEÑOS				$ 686,449,173.00		$ 1,537,184,630.00			$ 0.00		$	783,470,000.00		$ 1,537,184,630.00
*				VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA				$ 93,409,814,647.00		$ 107,310,814,647.00			$ 0.00		$	48,607,976,330.10		$ 107,310,814,647.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: La presente acta de modificación se realiza por la incorporacion de APUs no previstos aprobados por la interventoria, adicional se requiere la inclusión de cantidades para la remoción de escombros, ajustar las cantidades necesarias para las excavaciones requeridas para obras de estabilización y se ajustan otros ítems de acuerdo a las proyecciones realizadas del presupuesto, incluyendo la inyección de presupuesto para el PMT restando del basico de obra.


Firma
Nombre: RODRIGO CORTES CAMPINO
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No. 17202-134590 CLO

Firma
Nombre: MONICA GARCIA GUTIERREZ
Director de Interventoria
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 15202-46296 CAU

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29092023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	unidad	Costo	Duración	Comienzo
1		**RUTA DEL RENACIMIENTO**		$ 107,319,614.67	**1818 días**	**jue 12/10/23**
2	**C1**	**Capítulo 1. Actividades Preliminares**		$ 169,365.77	**1493 días**	**jue 12/10/23**
3	603.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
4	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 161,412.25	1300 días	mié 1/05/24
5	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
6	220.1	TERRAPLENES	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
7	200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	ha	$ 7,953.52	1300 días	mié 1/05/24
8	**C2**	**Capítulo 2. Estructura de Pavimento**		$ 3,063,181.28	**1779 días**	**jue 12/10/23**
9	341.2 T1	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL BEMAN	m3	$ 2,944,483.72	183.63 días	dom 1/09/24
10	341.2 T4	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL BEMAN	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
11	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	$ 181,651.57	1120 días	jue 1/08/24
12	320.3.1 T4	SUBBASE GRANULAR CLASE C 680-50	m3	$ 0.00	900 días	lun 25/06/07
13	420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	$ 326,646.60	1510 días	mar 16/07/24
14	450.2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
15	450.2P T3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
16	450.2P T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
17	**C3**	**Capítulo 3. Estructuras de Drenaje**		$ 10,004,565.56	**1520 días**	**jue 12/10/23**
18	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	$ 710,656.48	1460 días	lun 11/12/23
19	201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m1	$ 132,667.53	1460 días	lun 11/12/23
20	603.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	$ 1,066,008.67	1460 días	lun 11/12/23
21	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	$ 288,794.06	1460 días	jue 12/10/23
22	630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
23	630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	kg	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
24	630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	kg	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23

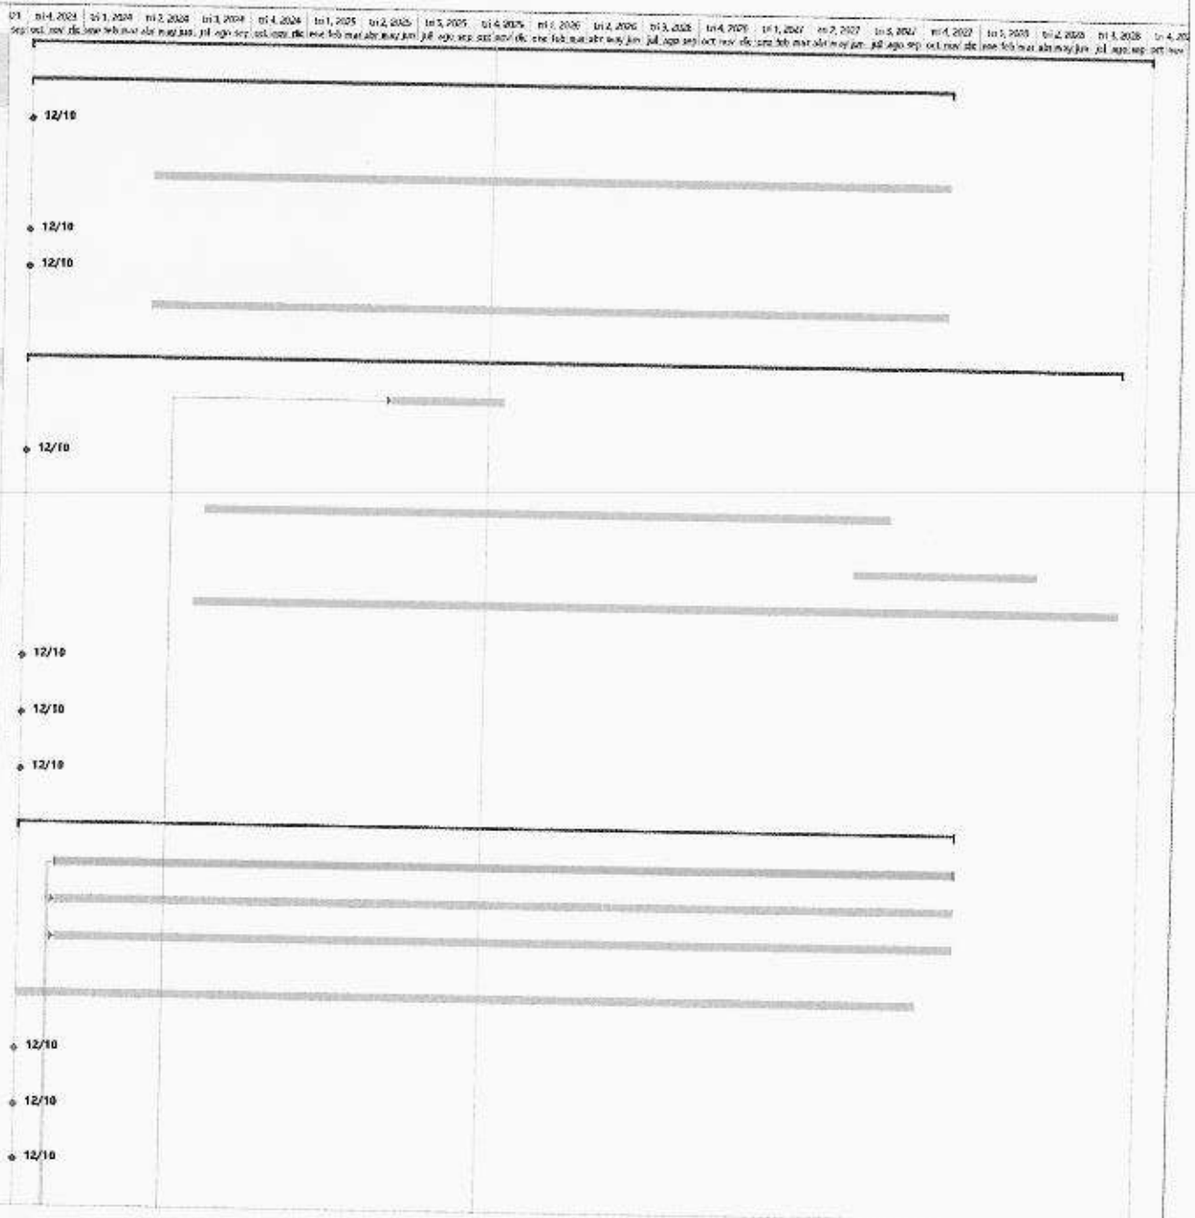


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea externa · Progreso manual
Duración · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo hito · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Hito externo

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29092023-1456

Id	EDM	Nombre de tarea	unidad	Costo	Duración	Comienzo
25	630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	kg	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
26	630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	$ 41,264.13	682.63 días	dom 18/02/24
27	630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	$ 16,348.96	561.63 días	jue 18/04/24
28	630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	$ 5,901.99	0 días	jue 12/10/23
29	630.5	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
30	660.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	m3	$ 6,672,851.32	1460 días	lun 11/12/23
31	640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	m3	$ 2,183,545.40	675.63 días	dom 25/02/24
32	640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	m3	$ 336,788.64	680 días	jue 25/04/24
33	640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	m3	$ 500,746.11	600 días	jue 19/10/23
34	612.2P	MALLA ELECTROSOLDADA e= 15cm	m2	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
35	671.1 T1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m2	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
36	671.1 T3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
37	671.1 T4	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
38	673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE		$ 1,120,654.91	520 días	vie 19/01/24
39	673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE		$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
40	673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE		$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
41	673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-20		$ 483,648.30	520 días	vie 19/01/24
42	673.3.3 T3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-20		$ 103,713.99	400 días	mar 22/07/25
43	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE		$ 592,835.16	960 días	vie 19/01/24
44	660.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"		$ 579,076.81	940 días	vie 19/01/24
45	672.2	BORDILLO DE PIEZA PREFABRICADA DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO		$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
46	C4	**Capítulo 4. Obras de Estabilización**		$ 2,008,328.13	**1818 días**	**jue 12/10/23**
47	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	$ 589,887.01	1300 días	mié 1/05/24

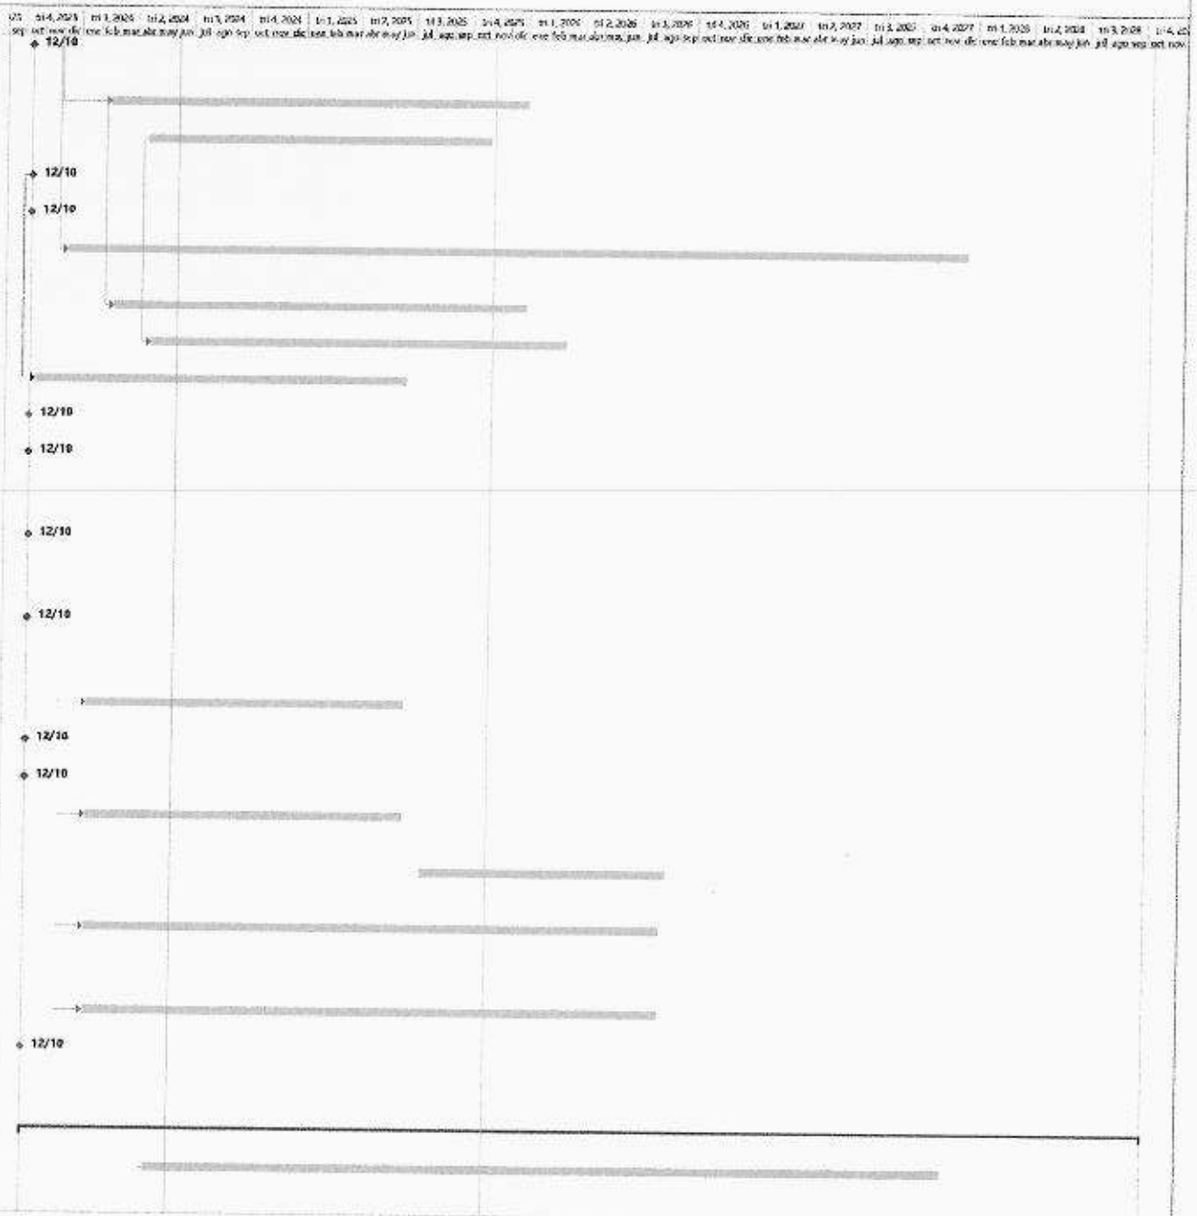


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29092023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	Unidad	Costo	Duración	Comienzo
48	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	$ 182,099.38	1300 días	jue 26/10/23
49	630.3.3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
50	630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
51	630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
52	630.6 T3	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	$ 32,233.03	400 días	vie 29/03/24
53	630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	$ 2,572.58	350 días	lun 2/06/25
54	640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	$ 681,621.63	400 días	vie 5/04/24
55	640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	$ 261,978.65	700 días	lun 8/06/26
56	673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	$ 23,380.36	400 días	jue 26/12/24
57	673.2 T4	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	$ 0.00	350 días	mié 26/02/25
58	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	$ 61,263.86	750 días	lun 23/05/26
59	663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m	$ 189,268.33	750 días	lun 25/05/26
60	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	m	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
61	623.1.2	ANCLAJE PARA REALCE	m	$ 31,153.20	1399 días	vie 13/12/24
62	623.1	ANCLAJE TIPO pasivos con acero 88, inyección de mortero perforación D=7.5cm perforación en material común	m	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
63	C5	**Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial**		$ 1,604,370.88	**1412 días**	**mié 13/11/24**
64	C5 T1	**Tramo 1**		$ 759,001.76	**472 días**	**mié 13/11/24**
65	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	$ 112,387.65	323.63 días	mié 26/02/25
66	721.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	u	$ 43,640.58	360 días	mié 5/03/25
67	710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, o SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	$ 173,860.80	428.63 días	mié 13/11/24
68	710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-72, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	u	$ 428,092.26	63.63 días	mié 13/11/24
69	C5 T3	**Tramo 3**		$ 629,111.21	**330 días**	**lun 15/03/27**

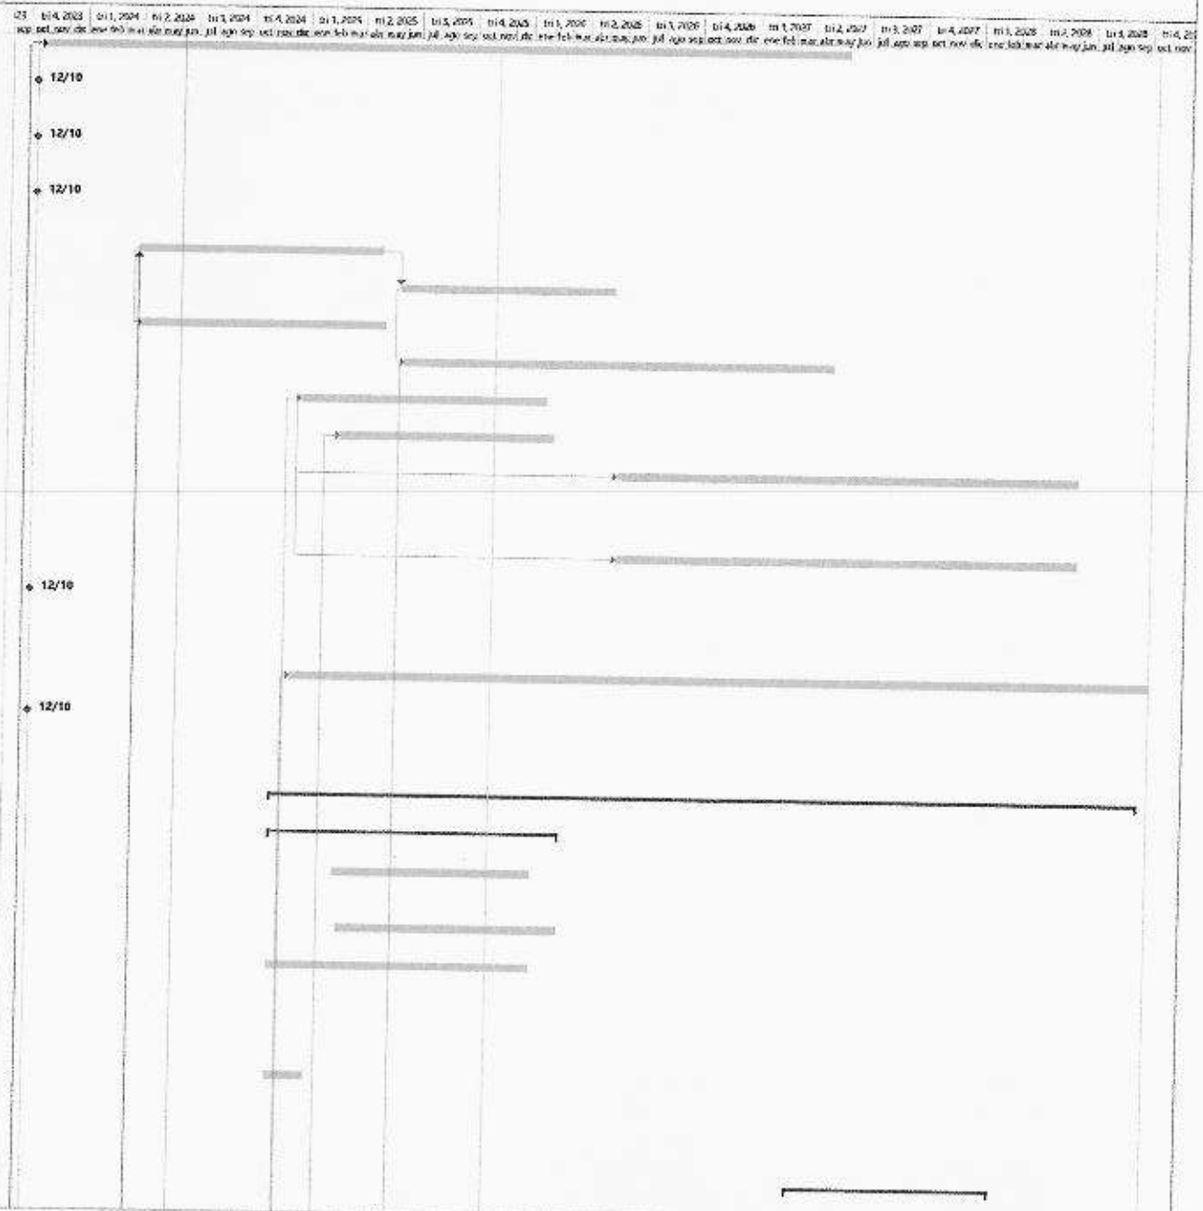


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Página 3

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29092023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	unidad	Costo	Duración	Comienzo
70	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	$ 77,143.10	90 días	mar 26/10/27
71	701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXIC	u	$ 29,854.69	90 días	mié 10/11/27
72	710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	$ 118,931.60	180 días	lun 15/03/27
73	710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	u	$ 294,081.02	180 días	lun 15/03/27
74	C5 T4	**Tramo 4**		$ 925,257.88	**200 días**	**jue 9/03/28**
75	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	$ 48,214.37	120 días	dom 28/05/28
76	701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXIC	u	$ 18,721.95	105 días	lun 12/06/28
77	710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	u	$ 74,520.37	180 días	jue 9/03/28
78	710.1.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75, REFLECTIVO TIPO IV (75X60cm).	u	$ 183,601.20	180 días	jue 9/03/28
79	C6	**Capitulo 6. Transportes**		$ 655,316.70	**1732 días**	**lun 11/12/23**
80	900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	$ 655,316.70	1732 días	lun 11/12/23
81	C7	**Capitulo 7 Obras estabilización tramo 1**		$ 514,605.51	**802.63 días**	**jue 12/10/23**
82	201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	$ 18,136.79	578.63 días	sáb 1/06/24
83	630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23
84	630.6 T1	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (P)	m3	$ 33,728.61	578.63 días	sáb 1/06/24
85	640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	Kg	$ 438,738.87	577.63 días	dom 2/06/24
86	673.2 T1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	$ 23,900.04	558.63 días	vie 21/06/24
87	C8	**Capitulo 8 Obras no previstas**		**$ 72,385,789.45**	**1817 días**	**jue 12/10/23**

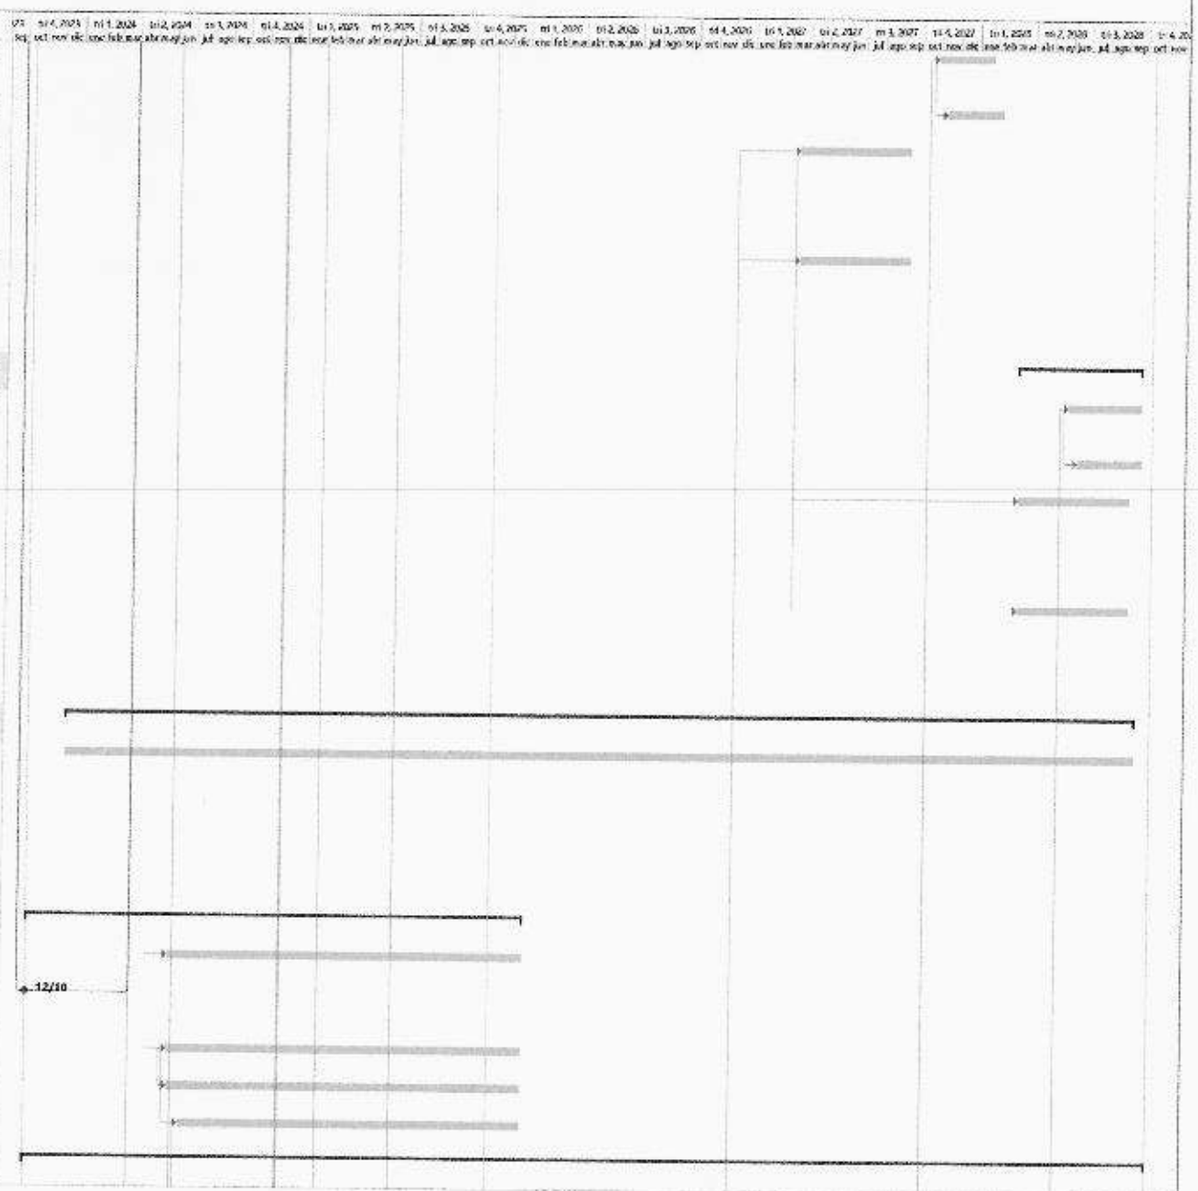


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea
Duración
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29052023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	unidad	Costo	Duración	Comienzo
88	NP 1 T1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DIAMETRO 35" A 36" TRAMO 1, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOCICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	m	$ 71,674.84	564.88 días	sáb 15/06/24
89	NP2	INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL	m3	$ 884,760.10	560 días	jue 15/08/24
90	NP 211.1	REMOCION DE DERRUMBES	m3	$ 3,349,961.88	1579 días	sáb 15/06/24
91	NP421.1 T1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1 T1	m3	$ 247,834.09	510 días	dom 30/06/24
92	NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICION DE MATERIAL CEMENTANTE	m3	$ 1,706,039.45	510 días	sáb 15/06/24
93	NP442P	MEZCLA ASFALTICA NATURAL DE APORTE PARA TRAMOS SIN CARPETA EXISTENTE	m3	$ 87,789.96	510 días	sáb 15/06/24
94	NP450,2P T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC019 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - CONFRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3	$ 14,444,220.88	510 días	dom 30/06/24
95	NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES	m3	$ 316,696.72	1460 días	sáb 15/06/24
96	NP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO GW-GC TRAMO 1	m3	$ 101,340.88	420 días	lun 15/07/24
97	NP 600,2,2	TRANSPORTE DE MATERIALES A DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000M); APLICA PARA MATERIALES USADOS EN EL ITEM 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3Km	$ 144,684.67	1260 días	sáb 15/06/24
98	NP 600,3,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3Km	$ 1,099,496.70	1579 días	sáb 15/06/24
99	NP3	DEMOLICIÓN EN ROCA A CIELO ABIERTO CON CUÑA HIDRAULICA Y/O CEMENTO EXPANSIVO PARA ATENCIÓN SITIO CRITICO UBICADO EN EL SECTOR CORINTO K68+500 AL K68+200 (INCLUYE EQUIPO NEUMATICO, PERFORADORA, CILINDRO HIDRAULICO, UNIDAD DE FUERZA Y CEMENTO EXPANSIVO, M3	m3	$ 371,693.45	45 días	vie 2/08/24

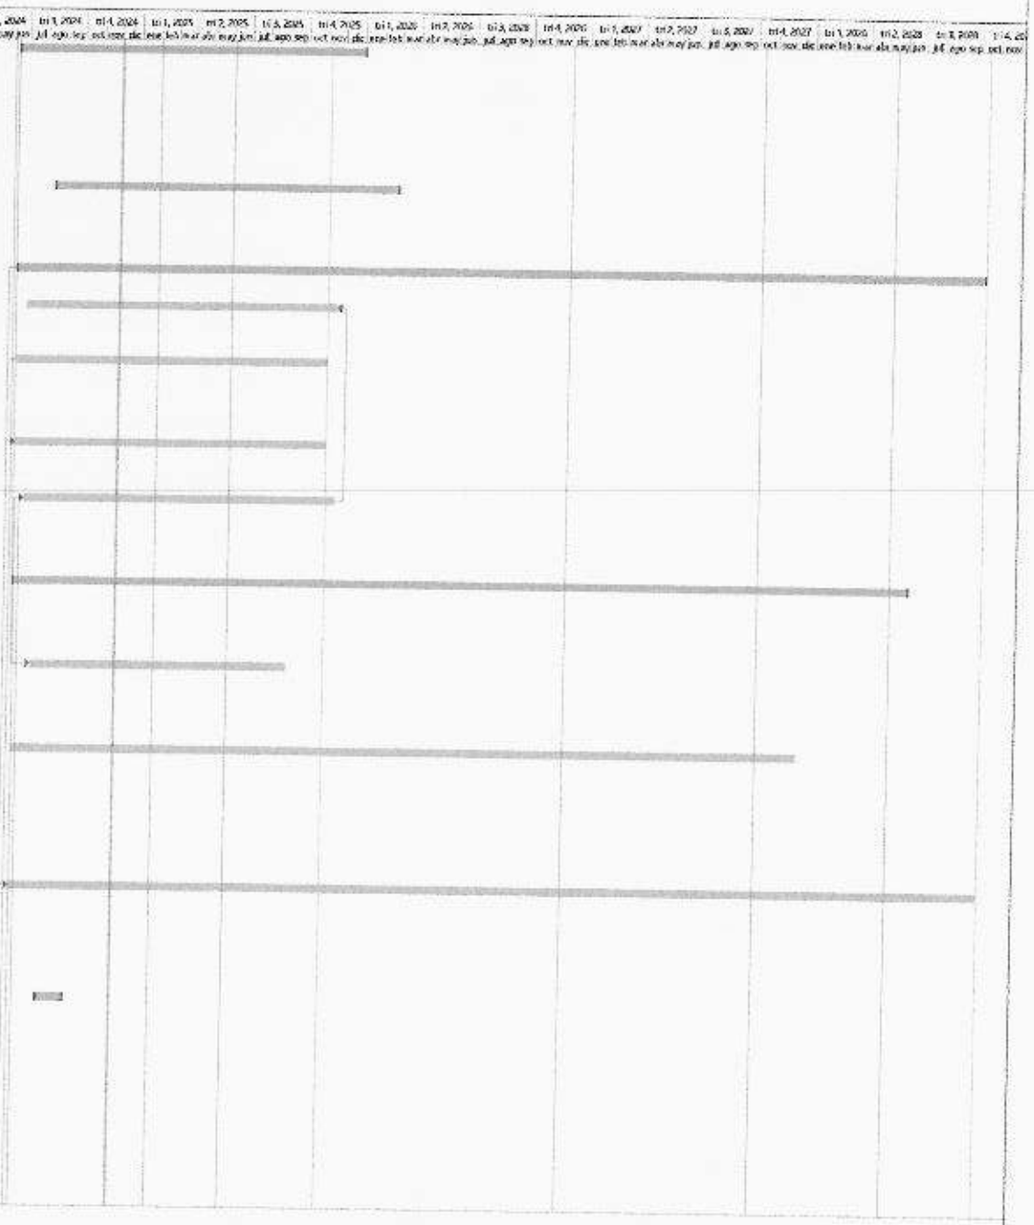


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Solo comienzo
Solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

SAN MIGUEL

PROGRAMACION RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29092023-1456


Id	EDM	Nombre de tarea	Unidad	Costo	Duración	Comienzo
100	NP 210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	$ 2,738,442.61	1207 días	vie 2/08/24
101	NP4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE PRESTAMOS; NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE	m3	$ 1,121,110.43	1207 días	vie 2/08/24
102	NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	M3	$ 1,005,203.78	1112 días	jue 12/12/24
103	NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	$ 1,110,622.15	384.88 días	jue 12/12/24
104	NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	$ 542,269.71	323.88 días	jue 12/12/24
105	NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	$ 181,684.37	261.88 días	mié 12/02/25
106	NP630.4.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	$ 1,374,327.00	384.88 días	jue 12/12/24
107	NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	$ 1,018,804.11	400 días	jue 26/09/24
108	NP630.4.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	$ 0.00	700 días	lun 16/06/25
109	NP630.1.7 T1	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1	M3	$ 109,747.44	410 días	jue 12/12/24
110	NP630.1.7 T3	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3	M3	$ 94,875.61	323.88 días	jue 12/12/24
111	NP630.1.7 T4	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	M3	$ 1,853.84	261.88 días	mié 12/02/25
112	NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	M	$ 437,637.60	1500 días	mar 30/07/24
113	NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3	$ 3,812,799.55	430.88 días	jue 12/12/24
114	NP6 T3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 3	M3	$ 0.00	0 días	jue 12/10/23

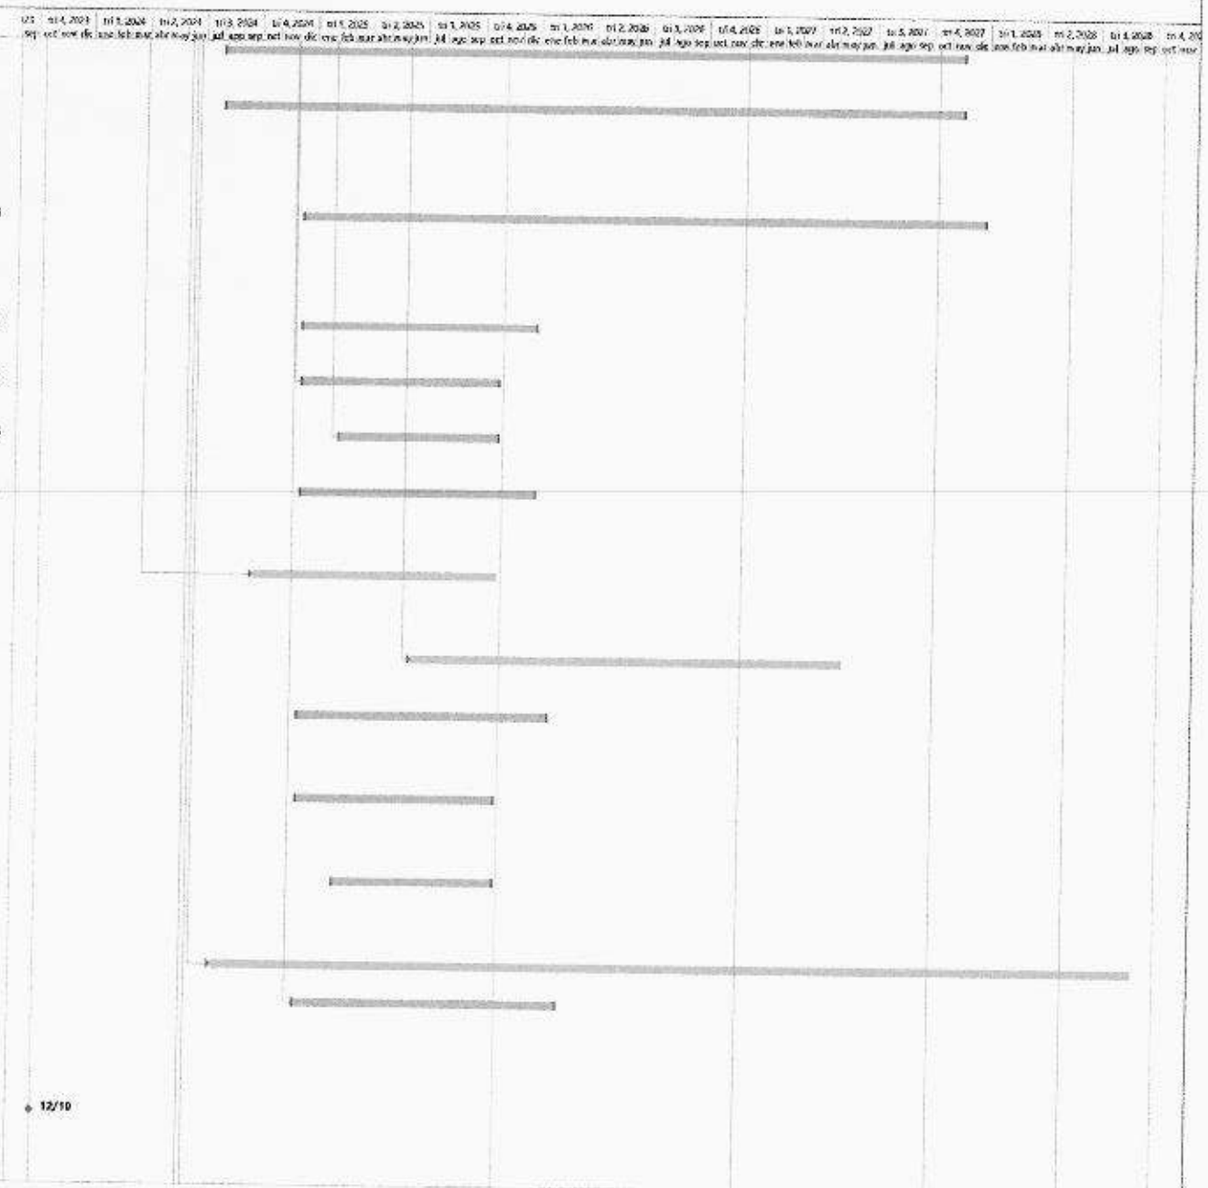

Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Unidad	Costo	Duración	Comienzo
115	NP6 T4	CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 4	M3	$ 0,00	0 días	jue 12/10/23
116	NP7	RIEGO DE LICA CON EMULSION ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFÁLTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	M2	$ 346.232,63	510 días	dom 30/06/24
117	NP8	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en el el puente Hierro localizado en la municipalidad de Norcasia, Carretera Dorada-Norcasia, según relación anexa.	Un	$ 426.508,51	60 días	jue 12/12/24
118	NP9	PERFILADO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 365.246,11	90 días	mié 16/07/25
119	NP10	Suministro e instalacion de obra falsa para la demolicion y construccion de losas de concreto de Puente Hierro K23+740, incluye lavado y pintura estructura metalica e incluye obras de proteccion ambiental	Un	$ 307.169,40	60 días	mié 16/07/25
120	NP630.3.2 PH	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CRTO. PLASTICO R. A/MC. ASENT. 6"+A1" 045 (4000 PSI) TM 1" A 7 DIAS RECORRIDO 2-4 HRS PUESTO EN OBRA - PREMEZCLADO PARA LOSAS PUENTE HIERRO	M3	$ 193.241,74	45 días	mié 16/07/25
121	NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN M VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"	M	$ 533.892,00	725 días	lun 15/09/25
122	NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	M	$ 1.205.022,00	725 días	lun 15/09/25
123	NP13	PILOTE DE CONCRETO TIPO CAISSON, VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.2 m, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y ANILLOS DE CONCRETO SIMPLE ESPESOR 0.10m, DIAMETRO TOTAL EXCAVACIÓN 1.4m, NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO, APLICA PARA	M	$ 403.019,80	60 días	mié 15/10/25

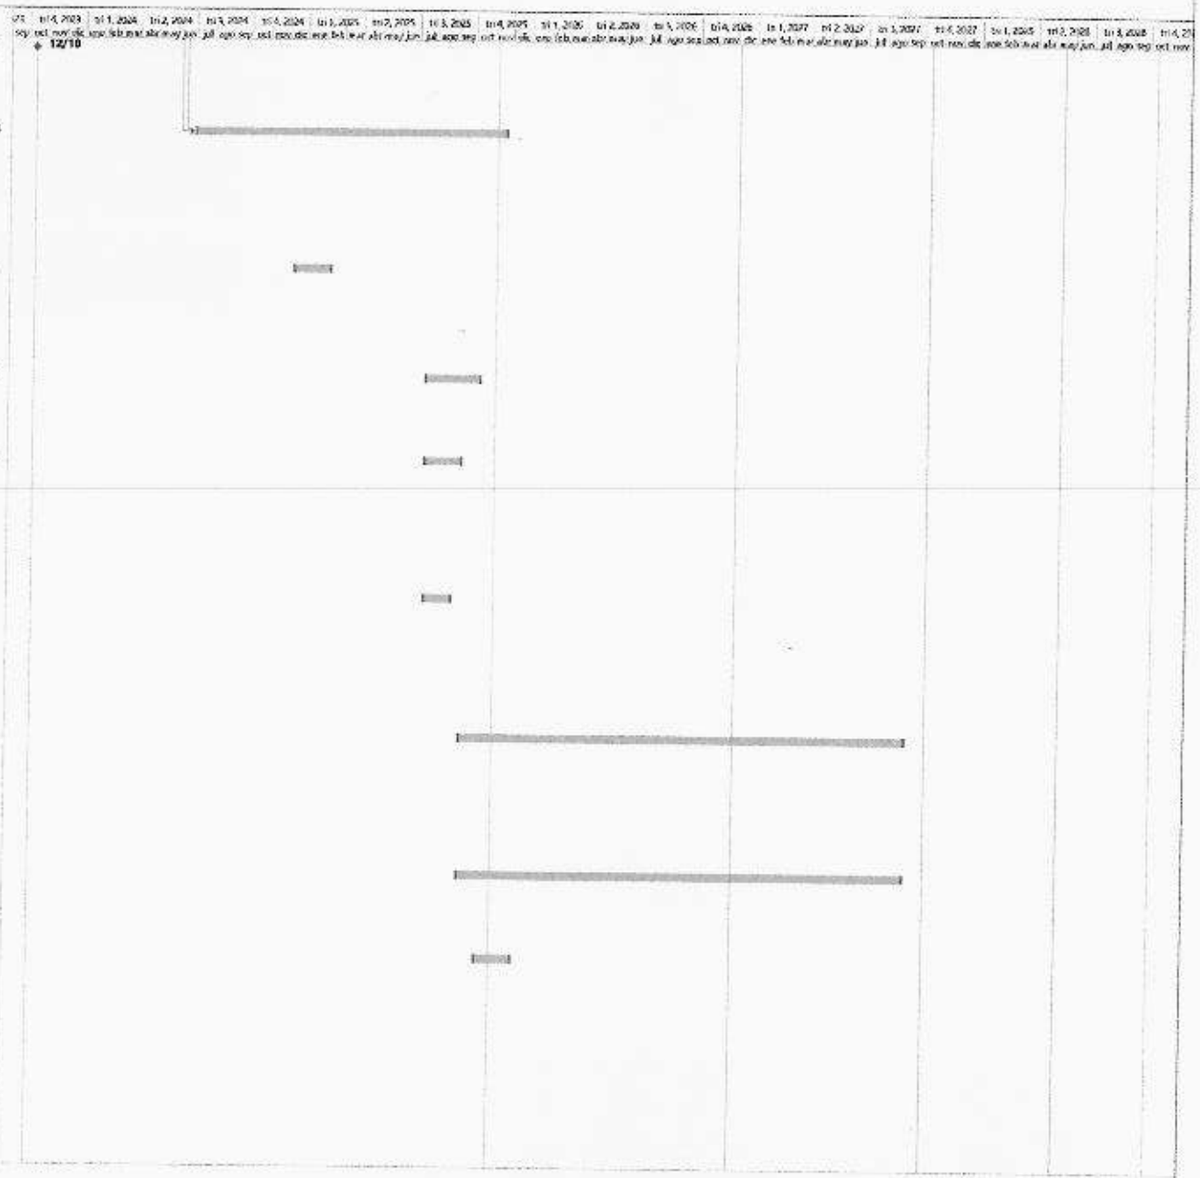

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 29052023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	unidad	Costo	Duración	Comienzo
124	NP14	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE CON CAPA DE ASFALTO NATURAL REMANENTE	M2	$ 100,004.02	30 días	lun 15/09/25
125	NP15	Suministro, fabricación y montaje de refuerzo en Puente Unda localizado en el K105+000 vía Dorada - Sonson, Municipios de Samana - Caldas y Nariño - Antioquia, según relación anexa.	M3	$ 669,845.19	75 días	dom 1/12/24
126	NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 2,739,607.44	833.88 días	sáb 1/11/25
127	NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 2,196,262.48	827.88 días	sáb 1/11/25
128	NP18	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 696,473.00	1003.88 días	sáb 1/11/25
129	NP19	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 4,571,238.24	680 días	sáb 13/02/27
130	NP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 153,052.77	1003.88 días	sáb 1/11/25
131	NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 1,046,566.91	950.88 días	sáb 1/11/25
132	NP330.3.2 T3 Y T4	BASE GRANULAR CLASE C PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	M3	$ 8,137,217.76	719.88 días	mar 1/09/26

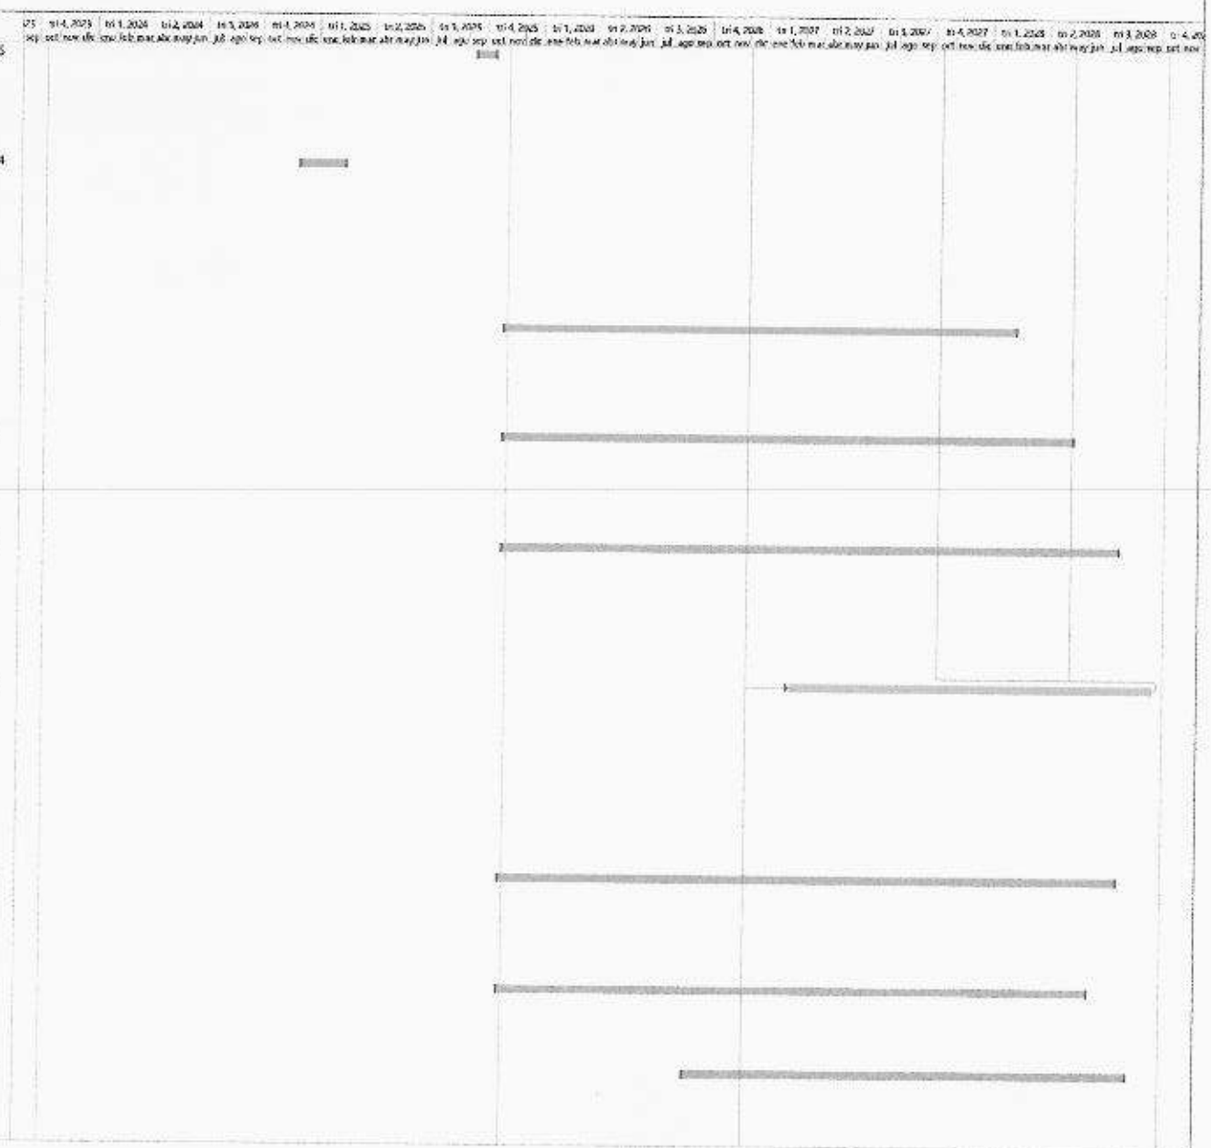


Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

SAN MIGUEL

PROGRAMACIÓN RUTA DEL RENACIMIENTO V11
CONTRATO 25092023-1456

Id	ITEM	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo
133	MF400.2P T3 Y T4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC019 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	$ 10.962.020,05	629,88 días	mar 15/12/26
134		REAJUSTES DE OBRA (NMODIFICABLE)	$ 8.080.167,46	1758 días	lun 11/12/23
135		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (NMODIFICABLE)	$ 1.716.354,38	1758 días	lun 11/12/23
136		PAGA (NMODIFICABLE)	$ 582.134,92	1758 días	lun 11/12/23
137		AJUSTE A DISEÑOS (NMODIFICABLE)	$ 1.537.184,63	1200 días	jue 12/10/23

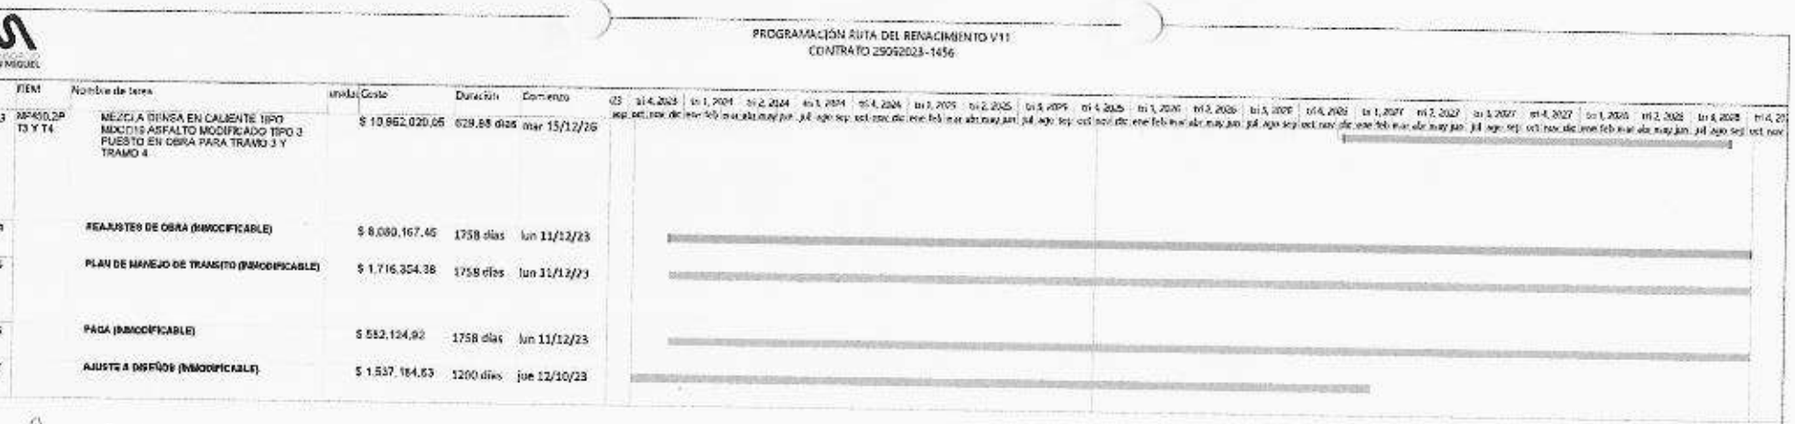

Proyecto: RUTA DEL RENACIMI
Fecha: 07/11/2025

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · solo duración · Informe de resumen manual · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso general

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. [illegible]

Página	1
FECHA	[illegible] (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: [illegible] DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO No: [illegible]

OBJETO: [illegible]

CONTRATISTA: [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible] INTERVENTOR: [illegible]

PLAZO INICIAL: 30 PLAZO ACUMULADO: [illegible]

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: [illegible] FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: [illegible]

FECHA DE SUSPENSIÓN: [illegible] FECHA DE REANUDACIÓN: [illegible]

VALOR INICIAL (incluido): $ 97.488.834.847,00 VALOR ADICIONES (incl): $ [illegible]

VALOR ACTUAL ACUMULADO (incluye %): $ 107.219.834.847,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos)	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA (Miles de pesos)
Capítulo 1. Actividades Preliminares. [illegible]	$7.761.000	8.74%	0.18%
	$189.309	0.20%	$135.000
Capítulo 2. Estructura de Pavimento. [illegible]	$36.618.303	42.12%	2.13%
	$7.093.361	[illegible]	$1.730.307
Capítulo 3. Estructuras de Drenaje. [illegible]	$31.500.570	27.20%	14.06%
	$14.024.885	11.15%	$11.659.381
Capítulo 4. Obras de Estabilización. [illegible]	$6.721.867	1.80%	1.49%
	$3.308.705	3.37%	$1.322.586
Capítulo 5. Señalización y Demarcación Vial. [illegible]	$1.548.412	1.84%	0.09%
	$1.594.071	1.90%	$73.505
Capítulo 6. Transportes. [illegible]	$1.598.494	1.90%	0.42%
	$502.261	0.76%	$370.019
Capítulo 7. [illegible]	$0	0.00%	[illegible]
	$514.208	0.41%	$39.004
Capítulo 8. [illegible]	$0	0.00%	31.85%
	$72.798.389	85.42%	$28.431.473
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 86.987.874	100%	50%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 95.483.792	111%	$44.430.397

[Monthly program columns 1–27 (oct-23 … dic-25) with % programado, $ valor programado, $ valor ejecutado and % ejecutado for each GPP: illegible]

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA BÁSICA	% / VALOR (Miles de Pesos)	[illegible]
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACTUALIZADA	% / VALOR (Miles de Pesos)	[illegible]
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	% / VALOR (Miles de Pesos)	[illegible]
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% / VALOR (Miles de Pesos)	[illegible]

CONVENCIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS	- - - -	——

* Las provisiones y otros conceptos que se liquidan en el presente cuadro deben corresponder con las establecidas en la propuesta [illegible]

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
IMPREVISTOS DE OBRA	$ [illegible] / $ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$ [illegible] / $ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
PAGA	$ [illegible] / $ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
AJUSTES ADICIONALES	$ [illegible] / $ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B')	$ [illegible] / $ [illegible]	$ [illegible]	[illegible]
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B) / VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'+B')	$ [illegible] / $ 107.219.834.847	$ [illegible]	41.48%

NOTAS:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. El Programa de inversiones debe ser concordante con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

OBSERVACIONES:

[illegible]

Aprueba: Firma [signature]

Nombre: [illegible]


[illegible]

Firma [signature]

Nombre: [illegible]

[illegible]

[illegible]

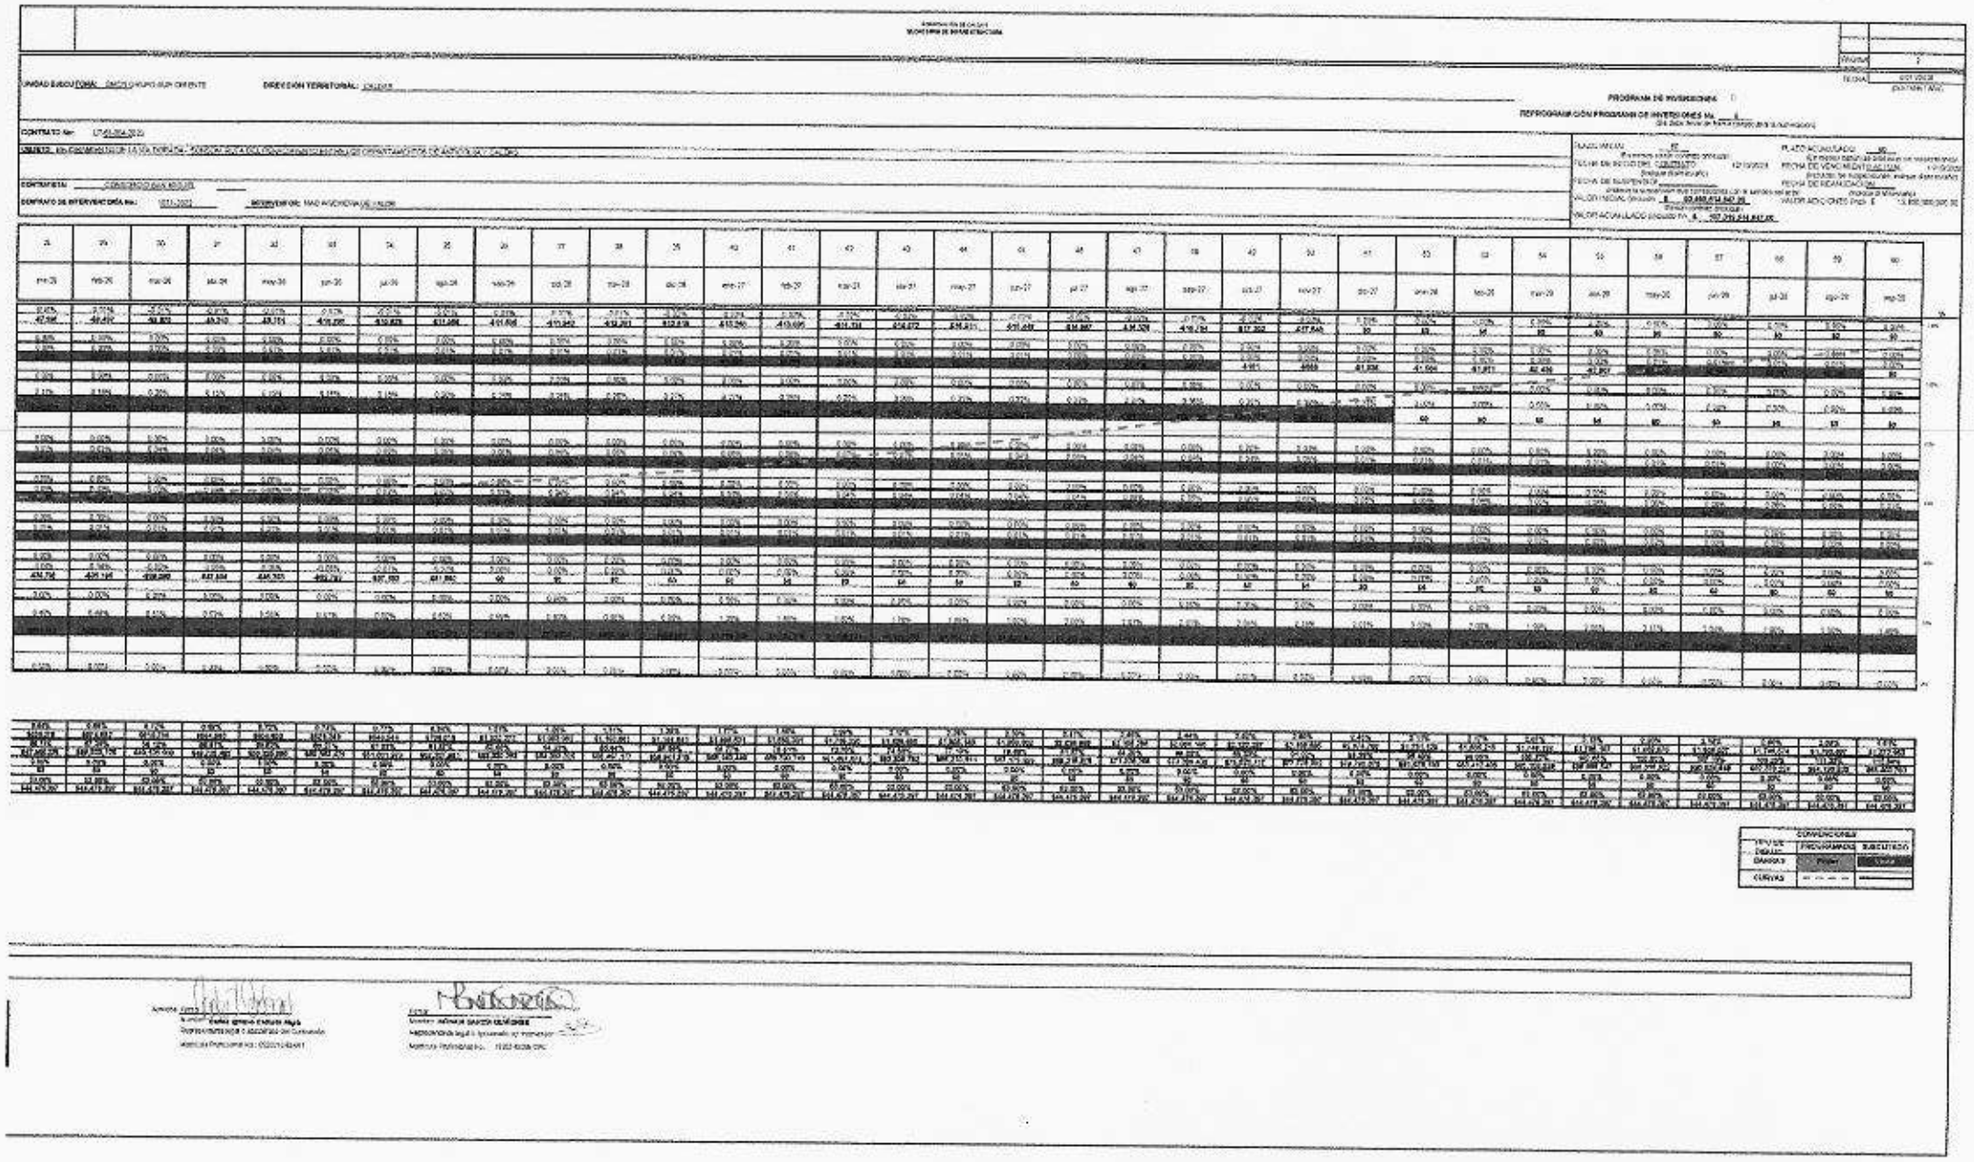

PMT

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 CONSOLIDADO TRAMOS 1, 3 Y 4	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	
1	PMT	UNIDAD
		GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio Mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores viales)	Persona	21.00	$ 2,496,726.92	$ 52,431,257.00	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	2.00	$ 28,019.00	$ 56,038.00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	19.00	$ 25,336.00	$ 481,384.00	
Señal Adoptamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	8.00	$ 25,115.00	$ 200,920.00	
Señal Adoptamiento a la izquierda x 80 cm	Unidad	7.00	$ 24,960.00	$ 174,720.00	
Señal Auxiliar de Tranaito x 60 cm	Unidad	23.00	$ 25,711.00	$ 591,353.00	
Señal Maquinaria en la via x 60 cm	Unidad	19.00	$ 25,336.00	$ 481,384.00	
Señal Barricada	Unidad	5.00	$ 35,700.00	$ 178,500.00	
Señal Bordenes (Bolizas)	Unidad	999.00	$ 11,321.00	$ 11,083,255.00	
Señal Velocidad permitida	Unidad	19.00	$ 25,336.00	$ 481,384.00	
Desvio a 100 m	Unidad	2.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	16.00	$ 12,717.00	$ 203,472.00	
Flashes Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Baston Luminoso con Cargador (Controlador Vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	98.00	$ 5,396.00	$ 528,808.00	
Barreras Plastinas (Paletines)medianas	Unidad	35.00	$ 57,517.00	$ 2,013,095.00	
Entrada y Salida de Volquetas	Unidad	1.00	$ 28,019.00	$ 28,019.00	
Caida de Rocas	Unidad	15.00	$ 28,020.00	$ 420,300.00	
Uno a Uno	Unidad	2.00	$ 25,336.00	$ 50,672.00	
Paso Peatonal	Unidad	3.00	$ 28,019.00	$ 84,057.00	
		SUB TOTAL		$ 17,057,363.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTORA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalización con cinta de demarcación por rollo	Unidad	0.00	$ 21,950.00	$ 0.00	
Malla Plastica x 50 m.	Unidad	0.00	$ 85,000.00	$ 0.00	
		SUB TOTAL		$ 0.00	

SUB TOTAL	$ 69,488,622.00
ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 18,067,042.00
SUB TOTAL	$ 87,555,664.00

TOTAL	$ 87,555,664.00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 Tramo 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202S-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
1	MAT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores viales)	Persona	0.00	$1,212,761	$ 0.00	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0.00	$ 28,619.00	$ 0.00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	0.00	$ 23,336.00	$ 0.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	0.00	$ 25,113.00	$ 0.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	0.00	$ 24,966.00	$ 0.00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	0.00	$ 23,711.00	$ 0.00	
Señal Maquinaria en la Via x 60 cm	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Señal Barricada	Unidad	3.00	$ 35,700.00	$ 107,100.00	
Señal Bombonas (Balitas)	Unidad	5.00	$ 11,321.00	$ 56,605.00	
Señal velocidad permitida	Unidad	0.00	$ 23,336.00	$ 0.00	
Desvio a 100 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	0.00	$ 12,711.00	$ 0.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Baston Sandinazo con cargador (Controlador vial)	Unidad	0.00	$ 20,232.50	$ 0.00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	0.00	$ 5,396.00	$ 0.00	
Barreras Plasticas (Maletines)medianas	Unidad	9.00	$ 57,517.00	$ 517,653.00	
Entrada y Salida de Volquetas	Unidad	0.00	$ 28,619.00	$ 0.00	
Caida de Rocas	Unidad	0.00	$ 28,620.00	$ 0.00	
Uno a Uno	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Paso Peatonal	Unidad	0.00	$ 23,019.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 681,358.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalización con cinta de demarcación	Unidad	0.00	$ 21,980.50	$ 0.00	
Malla Plastica x 50 m	Unidad	0.00	$ 85,600.50	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	

SUB TOTAL	$ 681,358.00
ADMINISTRACION (25%)	$ 177,153.00
SUB TOTAL	$ 858,511.00

TOTAL	$ 858,511.00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 SUB-Tramo 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 15 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202?-1426	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores Viales)	Persona	2.00	$ 2,596,827.41	$ 5,193,654.85	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
Señal Trabajos en la vía x 60 cm	Unidad	1.00	$ 25,336.00	$ 25,336.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	1.00	$ 25,115.00	$ 25,115.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	1.00	$ 24,960.00	$ 24,960.00	
Señal Auxiliar de tránsito X 60 cm	Unidad	3.00	$ 25,711.00	$ 77,133.00	
Señal Maquinaria en la Vía x 60 cm	Unidad	2.00	$ 25,336.00	$ 50,672.00	
Señal Barricada	Unidad	0.00	$ 35,700.00	$ 0.00	
Señal Bermanes (Balizas)	Unidad	66.00	$ 11,321.00	$ 747,186.00	
Señal Velocidad permitida	Unidad	2.00	$ 25,336.00	$ 50,672.00	
Desvio a 100 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 42 cm	Unidad	1.00	$ 12,717.00	$ 38,151.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Banton Luminoso con cargador (Controlador Vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos viales X 70 cm	Unidad	14.00	$ 5,396.00	$ 75,544.00	
Barreras Plasticas (Malefines)medianas	Unidad	4.00	$ 57,517.00	$ 230,068.00	
Entrada y Salida de Volquetas	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
Caida de Rocas	Unidad	0.00	$ 28,020.00	$ 0.00	
Ubo a Dos	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Paso Peatonal	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 1,344,837.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalizacion con cinta de separación	Unidad	0.00	$ 21,930.00	$ 0.00	
Malla Plastica X 50 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 6,538,492.00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 1,700,008.00	
			SUB TOTAL	$ 8,238,500.00	

TOTAL	$ 8,238,500.00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	25 Sub-Tramo 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202J-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	Cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores Viales)	Personas	0.00	#¡DIV/0!	$ 0.00	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	0.00	$ 25,113.00	$ 0.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	0.00	$ 26,560.00	$ 0.00	
Señal Auxiliar de transito x 60 cm	Unidad	0.00	$ 29,711.00	$ 0.00	
Señal Maquinaria en la via x 60 cm	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Señal Barricada	Unidad	0.00	$ 35,780.00	$ 0.00	
Señal Bermones (Bailtes)	Unidad	0.00	$ 11,321.00	$ 0.00	
Señal velocidad permitida	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Desvio a 100 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	0.00	$ 12,717.00	$ 0.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador Vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos viales x 70 cm	Unidad	0.00	$ 5,386.00	$ 0.00	
Barreras Plasticas (Valetinas)medianas	Unidad	0.00	$ 57,817.00	$ 0.00	
Entrada y Salida de Valquetas	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
Caida de Rocas	Unidad	0.00	$ 28,020.00	$ 0.00	
Uno a Uno	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Paso Peatonal	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalizacion con cinta de demarcacion	Metros	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Valla Plastica X 50 m	Metros	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	

SUB TOTAL	$ 0.00
ADMINISTRACION (26%)	$ 0.00
SUB TOTAL	$ 0.00

TOTAL	$ 0.00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 Sub-Tramo 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2990202S-1656	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores Viales)	Persona	6.00	$ 2,267,855.18	$ 13,607,131.10	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	0.00	$ 28,613.30	$ 0.00	
Señal Trabajos en la Vía x 60 cm	Unidad	4.00	$ 25,336.00	$ 101,344.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	1.00	$ 25,135.00	$ 25,135.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	1.00	$ 24,980.00	$ 24,980.00	
Señal Auxiliar de tránsito x 60 cm	Unidad	6.00	$ 25,711.00	$ 154,266.00	
Señal Maquinaria en la Vía x 60 cm	Unidad	2.00	$ 25,336.00	$ 50,672.00	
Señal Barricada	Unidad	0.00	$ 35,700.00	$ 0.00	
Señal Bombonas (Balizas)	Unidad	12.00	$ 11,321.60	$ 135,859.20	
Señal Velocidad permitida	Unidad	4.00	$ 25,336.00	$ 101,344.00	
Desvío a 100 M	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 40 cm	Unidad	3.00	$ 12,717.00	$ 38,151.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Bastón Luminoso con cargador (Controlador Vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos Viales x 70 cm	Unidad	54.00	$ 5,396.00	$ 291,384.00	
Barreras Plásticas Unitelinas/medianas	Unidad	3.00	$ 57,517.30	$ 172,551.90	
Entrada y Salida de Valquetas	Unidad	0.00	$ 28,613.30	$ 0.00	
Caida de Mocas	Unidad	0.00	$ 28,020.00	$ 0.00	
Uno a Uno	Unidad	0.00	$ 25,336.00	$ 0.00	
Paso Peatonal	Unidad	0.00	$ 28,019.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 1,095,639.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalizacion con cinta de demarcación	Unidad	0.00	$ 21,950.00	$ 0.00	
Malla Plastica x 50 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 14,702,770.00	
			ADMINISTRACIÓN (25%)	$ 3,822,720.00	
			SUB TOTAL	$ 18,525,490.00	

TOTAL	$ 18,525,490.00

MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 (PAGO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2803220231456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	PMT	UNIDAD
1	PMT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores viales)	Persona	7.00	$ 2,633,718.94	$ 18,436,032.55	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	1.00	$ 28,019.00	$ 28,019.00	
Señal Trabajos en la vía x 60 cm	Unidad	7.00	$ 25,336.00	$ 177,352.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	3.00	$ 25,115.00	$ 75,345.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	3.00	$ 24,960.00	$ 74,880.00	
Señal Auxiliar de tránsito x 60 cm	Unidad	7.00	$ 25,711.00	$ 179,977.00	
Señal Maquinaria en la Vía x 60 cm	Unidad	9.00	$ 25,336.00	$ 228,024.00	
Señal Bazicada	Unidad		$ 35,700.00	$ 0.00	
Señal Bombanes (Rallas)	Unidad	527.00	$ 11,321.00	$ 5,966,167.00	
Señal Velocidad permitida	Unidad	10.00	$ 29,336.00	$ 293,360.00	
Desvio a 100 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	5.00	$ 12,717.00	$ 63,585.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Boston Luminoso con cargador (Controladr vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos Viales X 70 cm	Unidad	17.00	$ 5,396.00	$ 91,732.00	
Barreras Plasticas (Paletines)Medianos	Unidad	11.00	$ 53,517.00	$ 632,697.00	
Entrada y Salida de Volquetas	Unidad	0.00	$ 23,029.00	$ 0.00	
Caida de Aguas	Unidad	9.00	$ 28,029.00	$ 252,180.00	
Uno a Uno	Unidad	1.00	$ 29,336.00	$ 29,336.00	
Paso Peatonal	Unidad	0.00	$ 28,029.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 8,040,644.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacallos	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalización con cinta de demarcación	Unidad	0.00	$ 21,900.00	$ 0.00	
Malla Plastica x 50 m	Unidad	0.00	$ 85,000.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 25,484,577.00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 6,886,016.00	
			SUB TOTAL	$ 33,370,693.00	

TOTAL	$ 33,370,693.00

MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESTACIÓN DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRESTACIÓN DE OBRA No:	23 INANCO 4	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1436	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	INFRAESTRUCTURA	UNIDAD
1	PDT	GLOBAL

CONTROLADORES VIALES

Elemento	unidad	cantidad	Valor Promedio mensual	Valor Total	Observaciones
Paleteros (Controladores viales)	Persona	6.00	$ 2,532,402.42	$ 15,194,438.50	Septiembre

SEÑALIZACIÓN INSTALADA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Señal Inicio de obra	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señal Fin de Obra	Unidad	1.00	$ 28,019.00	$ 28,019.00	
Señal Trabajos en la via x 60 cm	Unidad	7.00	$ 25,336.00	$ 177,352.00	
Señal Angostamiento a la derecha x 60 cm	Unidad	3.00	$ 25,115.00	$ 75,345.00	
Señal Angostamiento a la izquierda x 60 cm	Unidad	2.00	$ 24,960.00	$ 49,920.00	
Señal Auxiliar de transito X 60 cm	Unidad	7.00	$ 25,711.00	$ 179,977.00	
Señal Maquinaria en la vía X 60 cm	Unidad	6.00	$ 25,334.00	$ 152,016.00	
Señal Barricada	Unidad	2.00	$ 35,700.00	$ 71,400.00	
Señal Bombonas (Ratiras)	Unidad	569.00	$ 11,321.00	$ 6,441,649.00	
Señal velocidad permitida	Unidad	3.00	$ 25,336.00	$ 76,008.00	
Desvio a 100 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Paleta Pare y Siga x 45 cm	Unidad	5.00	$ 12,717.00	$ 63,585.00	
Flasher Luminoso	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Baston Luminoso con cargador (Controlador vial)	Unidad	0.00	$ 20,230.00	$ 0.00	
Conos viales X 70 cm	Unidad	13.00	$ 5,396.00	$ 70,148.00	
Barreras Plasticas (valerinas/medianos	Unidad	8.00	$ 57,517.00	$ 460,136.00	
Entrada y Salida de Volquetas	Unidad	1.00	$ 28,019.00	$ 28,019.00	
Caida de Rocas	Unidad	6.00	$ 28,020.00	$ 168,120.00	
Uno a Uno	Unidad	1.00	$ 25,336.00	$ 25,336.00	
Paso Peatonal	Unidad	3.00	$ 28,019.00	$ 84,057.00	
			SUB TOTAL	$ 5,886,987.00	

ELEMENTOS CONTRAFACTURA

Elemento	Unidad	Cantidad	Valor Unidad/Mes	Valor Total	Observaciones
Pasacalles	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
Señalización con cinta de demarcación	Unidad	0.00	$ 21,950.00	$ 0.00	
Malla Plastica x 50 m	Unidad	0.00	$ 0.00	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 0.00	
			SUB TOTAL	$ 21,081,326.00	
			ADMINISTRACIÓN (26%)	$ 5,481,145.00	
			SUB TOTAL	$ 26,562,471.00	

TOTAL	$ 26,562,471.00

MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

BASE DE DATOS PERSONAL
CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS

N°	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	CONCEPTO	1-15 SEPTIEMBRE	16-30 SEPTIEMBRE	TRAMO	CIUDAD
1	GLORIA BEATRIZ DUQUE MUNOZ	30388919	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	SUB- 3	NORCASIA
				HORAS EXTRAS	$ -	$ 121,321		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRA DIURNA FESTIVA	$ -	$ 6,632		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 57,691	$ 43,785		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 57,691	$ 43,785		
				TOTAL	$ 596,368	$ 752,133		
2	YURITH ANDREA MONTOYA	1128627598	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 664,300	$ 664,300	SUB- 3	NORCASIA
				HORAS EXTRAS	$ 121,321	$ 48,528		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRA DIURNA FESTIVA	$ -	$ 13,264		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 49,338	$ 48,500		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 49,338	$ 48,500		
				TOTAL	$ 686,945	$ 629,888		
3	CAMILO VALENCIA HERRERA	1016190663	CONTROLADOR VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	4	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 129,409	$ 64,705		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRA DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 38,849	$ 45,953		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 38,849	$ 45,953		
				TOTAL	$ 763,461	$ 684,549		
4	GUSTAVO ADOLFO GIRALDO BARRAGAN	1019694577	CONTROLADOR VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 523,950	SUB- 1	NORCASIA
				HORAS EXTRAS	$ 97,057	$ 121,321		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRA DIURNA FESTIVA	$ 13,264	$ 13,264		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 39,522	$ 41,161		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 39,522	$ 41,161		
				TOTAL	$ 743,027	$ 574,209		
5	GLADYS HENAO OSPINA	21896198	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	3	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 121,321	$ 64,705		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 41,437	$ 44,982		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 41,437	$ 44,980		
				TOTAL	$ 750,197	$ 686,491		
6	VIVIANA ALARCON QUINTERO	1001448186	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	3	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 145,585	$ 129,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 38,020	$ 39,115		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 38,020	$ 39,115		
				TOTAL	$ 781,295	$ 762,529		
7	CATALINA GARCÍA	1002579296	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	SUB- 1	ISAZA
				HORAS EXTRAS	$ 97,057	$ 113,233		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ 39,793	$ 13,264		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 51,227	$ 47,124		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 51,227	$ 47,124		
				TOTAL	$ 746,146	$ 743,998		
8	MARIBEL RODRIGUEZ AIZATE	24175913	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 498,500	$ 427,450	SUB- 1	ISAZA
				HORAS EXTRAS	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 28,470	$ 28,470		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 28,470	$ 28,470		
				TOTAL	$ 441,560	$ 9,490		
9	JUAN DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ	1002580399	CONTROLADOR VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 339,600	SUB- 3	NORCASIA
				HORAS EXTRAS	$ 186,026	$ 194,114		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 38,176	$ 41,455		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 38,176	$ 41,455		
				TOTAL	$ 821,424	$ 490,804		
10	MARTA GRANADA HURTADO	1036840827	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 664,300	$ 711,750	3	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 77,793	$ 64,705		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 45,761	$ 46,924		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 45,761	$ 46,924		
				TOTAL	$ 649,571	$ 682,607		
11	REINA MARCELA ARCILA ARIAS	21476507	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	3	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 129,409	$ 129,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 42,731	$ 43,197		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 42,731	$ 43,197		
				TOTAL	$ 755,697	$ 754,765		
12	ANDREA CIFUENTES OSPINA	1036190553	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 516,850	4	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 64,705	$ 129,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ 13,264	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 45,047	$ 33,647		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 45,047	$ 33,647		
				TOTAL	$ 699,625	$ 578,965		
13	JUAN PABLO TRIANA HINESTROZA	1014859467	CONTROLADOR VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	SUB- 3	NORCASIA
				HORAS EXTRAS	$ 121,321	$ 129,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 44,458	$ 42,874		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 44,458	$ 42,874		
				TOTAL	$ 744,155	$ 755,411		
14	LEIDY YORANA INIESSO OROZCO	1214741295	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 376,600	$ 711,750	4	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 129,409	$ 56,616		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ 26,529		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 40,486	$ 46,872		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 40,486	$ 46,872		
				TOTAL	$ 428,037	$ 701,151		
15	MARYORY VASQUEZ CALDERON	1058884744	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 664,300	$ 711,750	3	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 129,409	$ 64,705		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 42,399	$ 43,222		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 42,399	$ 43,222		
				TOTAL	$ 708,911	$ 690,011		
16	MARIA ALEJANDRA HOYOS	1152707884	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	1	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 64,705	$ 97,057		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 41,992	$ 35,613		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 41,992	$ 35,613		
				TOTAL	$ 694,471	$ 737,581		
17	MONICA JOHANA MELO	1047966046	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 664,300	1	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 56,616	$ 64,705		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ 13,264	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 39,665	$ 46,004		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 39,665	$ 46,004		
				TOTAL	$ 681,300	$ 636,997		
18	LUIS MARTIN ARIAS SALDAÑA	1128627239	CONTROLADOR VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 711,750	SUB- 3	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 121,321	$ 40,440		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ 13,264	$ 39,793		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 37,580	$ 46,575		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 37,580	$ 46,575		
				TOTAL	$ 771,175	$ 698,833		
19	ADRIANA MARYORI CARDONA OSORIO	1036840394	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 711,750	$ 498,500	4	NARIÑO
				HORAS EXTRAS	$ 129,409	$ 129,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 42,084	$ 38,359		

CONSORCIO SAN MIGUEL

BASE DE DATOS PERSONAL
CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS

N°	NOMBRE	N° CEDULA	CARGO	CONCEPTO	1-15 SEPTIEMBRE	16-30 SEPTIEMBRE	TRAMO	CIUDAD
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 42,084	$ 28,359		
				TOTAL	$ 756,993	$ 527,191		
20	DIANA MARCELA SUAREZ OSPINA	1035190074	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 731,750	$ 731,750	4	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 329,409	$ 329,409		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 42,731	$ 42,245		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 42,731	$ 42,245		
				TOTAL	$ 755,697	$ 756,669		
21	BEATRIZ ELENA DUQUE BERNAL	24827315	CONTROLADORA VIAL	SALARIO	$ 731,750	$ 731,750	4	PUEBLO NUEVO
				HORAS EXTRAS	$ 329,409	$ 80,885		
				HORAS EXTRAS FESTIVA	$ -	$ -		
				HORAS EXTRAS DIURNA FESTIVA	$ -	$ -		
				DEDUCCIÓN SALUD	$ 42,084	$ 44,374		
				DEDUCCIÓN PENSIÓN	$ 42,084	$ 44,374		
				TOTAL	$ 758,991	$ 703,885		
				SUBTOTAL	$ 14,702,044.00	$ 13,609,126.00		

SUBTOTAL SIN PRESTACIONES	$ 28,341,237.00
TOTAL	$ 57,431,257.00

Prenómina

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS NIT: 901740908 - 5
nomina@intrameq.co - 10/31/2025 10:05:40
Documento generado por Intrameq.co

Nómina	(Todas)
Sede	(Todas)
Área	(Todas)
Código	(Todas)
Identificación	(Todas)
Estado del contrato	(Todas)
Tipo de periodo	(Todas)

Prenómina	Periodos 30/09/2025 Suma de Días	Suma de Horas	Total	Total Suma de Días	Total Suma de Horas	Total Total
PUENTE LINDA	**577**	**151**	**9.003.389**	**577**	**151**	**9.003.389**
1001440186 - VIVIANA ALARCON QUINTERO Codigo: 43115						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-39.315	15		-39.315
SEG2 - Pensión	15		-39.315	15		-39.315
1036190074 - DIANA MARCELA SUAREZ OSPINA Codigo: 53296						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.345	15		-42.345
SEG2 - Pensión	15		-42.345	15		-42.345
1036190553 - ANDREA CIFUENTES OSPINA Codigo: 48835						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.408
SAL1 - Salario Básico	13		616.850	13		616.850
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-33.647	15		-33.647
SEG2 - Pensión	15		-33.647	15		-33.647
1036190663 - CAMILO VALENCIA HERRERA Codigo: 55568						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-45.953	15		-45.953
SEG2 - Pensión	15		-45.953	15		-45.953
1036840027 - MARTA GRANADA HURTADO Codigo: 46692						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-46.924	15		-46.924
SEG2 - Pensión	15		-46.924	15		-46.924
1036840194 - ADRIANA MARYORI CARDONA OSORIO Codigo: 53294						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	10		474.500	10		474.500
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-38.359	15		-38.359
SEG2 - Pensión	15		-38.359	15		-38.359
1047966046 - MONICA JOHANNA MELO SALAZAR Codigo: 52693						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	14		664.300	14		664.300
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-46.004	15		-46.004
SEG2 - Pensión	15		-46.004	15		-46.004
1058847446 - MARYORY VASQUEZ CALDERON Codigo: 52909						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-43.222	15		-43.222
SEG2 - Pensión	15		-43.222	15		-43.222
1152707084 - MARIA ALEJANDRA HOYOS DUQUE Codigo: 52690						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		12	97.057		12	97.057
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-35.613	15		-35.613
SEG2 - Pensión	15		-35.613	15		-35.613
1214741295 - LEIDY YOHANA PANESO OROZCO Codigo: 49165						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		7	56.616		7	56.616
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 200%		2	26.529		2	26.529
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-46.872	15		-46.872
SEG2 - Pensión	15		-46.872	15		-46.872

21476507 - REINA MARCELA ARCILA ARIAS Codigo: 48651						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-43.197	15		-43.197
SEG2 - Pensión	15		-43.197	15		-43.197
21896330 - GLADYS HENAO OSPINA Codigo: 52687						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-44.982	15		-44.982
SEG2 - Pensión	15		-44.982	15		-44.982
24973313 - BEATRIZ ELENA DUQUE BERNAL Codigo: 57464						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		10	80.881		10	80.881
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-44.374	15		-44.374
SEG2 - Pensión	15		-44.374	15		-44.374
NORCASIA	334	101,5	4.635.787	334	101,5	4.635.787
1002579296 - YEIMY CATALINA GARCIA TORO Codigo: 53766						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		14	113.233		14	113.233
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-47.124	15		-47.124
SEG2 - Pensión	15		-47.124	15		-47.124
1002580399 - JUAN DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ Codigo: 51495						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		24	194.114		24	194.114
SAL1 - Salario Básico	8		379.600	8		379.600
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-41.455	15		-41.455
SEG2 - Pensión	15		-41.455	15		-41.455
1014859467 - JUAN PABLO TIBANA HINESTROZA Codigo: 55282						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.874	15		-42.874
SEG2 - Pensión	15		-42.874	15		-42.874
1039694577 - GUSTAVO ADOLFO GIRALDO BARRAGAN Codigo: 56550						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	11		521.950	11		521.950
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-41.163	15		-41.163
SEG2 - Pensión	15		-41.163	15		-41.163
1128627239 - LUIS MARTIN ARIAS SALDAÑA Codigo: 40734						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		5	40.440		5	40.440
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		3	39.793		3	39.793
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-46.575	15		-46.575
SEG2 - Pensión	15		-46.575	15		-46.575
1128627598 - YULIET ANDREA MONTOYA ECHEVERRY Codigo: 51486						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		6	48.528		6	48.528
SAL1 - Salario Básico	14		664.300	14		664.300
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-48.102	15		-48.102
SEG2 - Pensión	15		-48.102	15		-48.102
24715913 - MARIBEL RODRIGUEZ ALZATE Codigo: 46045						
Pagado						
SAL1 - Salario Básico	1		47.450	1		47.450
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-28.470	15		-28.470
SEG2 - Pensión	15		-28.470	15		-28.470
30388919 - GLORIA BEATRIZ DUQUE MUÑOZ Codigo: 53757						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		0,5	6.632		0,5	6.632
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-43.785	15		-43.785
SEG2 - Pensión	15		-43.785	15		-43.785
Total general	911	252,5	13.639.176	911	252,5	13.639.176

Prenómina

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS NIT: 901740908 - 5
nomina@intramaq.co - 10/31/2025 10:05:40
Documento generado por Intramaq.co


Nómina	(Todas)
Sede	(Todas)
Área	(Todas)
Código	(Todas)
Identificación	(Todas)
Estado del contrato	(Todas)
Tipo de periodo	(Todas)

Prenómina	Periodos 15/09/2025 Suma de Días	Suma de Horas	Total	Total Suma de Días	Total Suma de Horas	Total Total
PUENTE LINDA	**576**	**179**	**9.175.244**	**576**	**179**	**9.175.244**
1001440186 - VIVIANA ALARCON QUINTERO Codigo: 43115						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		18	145.585		18	145.585
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-38.020	15		-38.020
SEG2 - Pensión	15		-38.020	15		-38.020
1036190074 - DIANA MARCELA SUAREZ OSPINA Codigo: 53296						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.731	15		-42.731
SEG2 - Pensión	15		-42.731	15		-42.731
1036190553 - ANDREA CIFUENTES OSPINA Codigo: 48805						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	13		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-45.047	15		-45.047
SEG2 - Pensión	15		-45.047	15		-45.047
1036190663 - CAMILO VALENCIA HERRERA Codigo: 55568						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-38.849	15		-38.849
SEG2 - Pensión	15		-38.849	15		-38.849
1036840027 - MARTA GRANADA HURTADO Codigo: 46692						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		9	72.793		9	72.793
SAL1 - Salario Básico	14		664.300	14		664.300
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-43.761	15		-43.761
SEG2 - Pensión	15		-43.761	15		-43.761
1036840194 - ADRIANA MARYORI CARDONA OSORIO Codigo: 53294						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.084	15		-42.084
SEG2 - Pensión	15		-42.084	15		-42.084
1047966046 - MONICA JOHANNA MELO SALAZAR Codigo: 52693						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		7	56.616		7	56.616
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-46.665	15		-46.665
SEG2 - Pensión	15		-46.665	15		-46.665
1058867446 - MARYORY VASQUEZ CALDERON Codigo: 52909						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	14		664.300	14		664.300
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.399	15		-42.399
SEG2 - Pensión	15		-42.399	15		-42.399
1152707084 - MARIA ALEJANDRA HOYOS DUQUE Codigo: 52690						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		8	64.705		8	64.705
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-45.992	15		-45.992
SEG2 - Pensión	15		-45.992	15		-45.992
1214741295 - LEIDY YOHANA PANESO OROZCO Codigo: 49165						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	8		379.600	8		379.600
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-40.486	15		-40.486
SEG2 - Pensión	15		-40.486	15		-40.486
21476507 - REINA MARCELA ARCILA ARIAS Codigo: 48651						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409


SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.731	15		-42.731
SEG2 - Pensión	15		-42.731	15		-42.731
21896330 - GLADYS HENAO OSPINA Codigo: 52687						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-41.437	15		-41.437
SEG2 - Pensión	15		-41.437	15		-41.437
24873313 - BEATRIZ ELENA DUQUE BERNAL Codigo: 57464						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		16	129.409		16	129.409
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-42.084	15		-42.084
SEG2 - Pensión	15		-42.084	15		-42.084
NORCASIA	354	97	5.526.800	354	97	5.526.800
1002579296 - YEIMY CATALINA GARCIA TORO Codigo: 53766						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		12	97.057		12	97.057
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		3	39.793		3	39.793
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-51.227	15		-51.227
SEG2 - Pensión	15		-51.227	15		-51.227
1002580399 - JUAN DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ Codigo: 51495						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		23	186.026		23	186.026
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-38.176	15		-38.176
SEG2 - Pensión	15		-38.176	15		-38.176
1014859467 - JUAN PABLO TIBANA HINESTROZA Codigo: 55282						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-44.458	15		-44.458
SEG2 - Pensión	15		-44.458	15		-44.458
1039694577 - GUSTAVO ADOLFO GIRALDO BARRAGAN Codigo: 56550						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		12	97.057		12	97.057
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-39.522	15		-39.522
SEG2 - Pensión	15		-39.522	15		-39.522
1128627239 - LUIS MARTIN ARIAS SALDAÑA Codigo: 40734						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
HR251 - Hora Extra Diurna Dominical o Festiva 205%		1	13.264		1	13.264
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-37.580	15		-37.580
SEG2 - Pensión	15		-37.580	15		-37.580
1128627598 - YULIET ANDREA MONTOYA ECHEVERRY Codigo: 51486						
Pagado						
HEX2 - Hora extra diurna 125%		15	121.321		15	121.321
SAL1 - Salario Básico	14		664.300	14		664.300
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-49.338	15		-49.338
SEG2 - Pensión	15		-49.338	15		-49.338
24715913 - MARIBEL RODRIGUEZ ALZATE Codigo: 46045						
Pagado						
SAL1 - Salario Básico	10		474.500	10		474.500
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-28.470	15		-28.470
SEG2 - Pensión	15		-28.470	15		-28.470
50388919 - GLORIA BEATRIZ DUQUE MUÑOZ Codigo: 53757						
Pagado						
SAL1 - Salario Básico	15		711.750	15		711.750
Deducido						
SEG1 - Salud	15		-57.691	15		-57.691
SEG2 - Pensión	15		-57.691	15		-57.691
Total general	930	276	14.702.044	930	276	14.702.044


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO

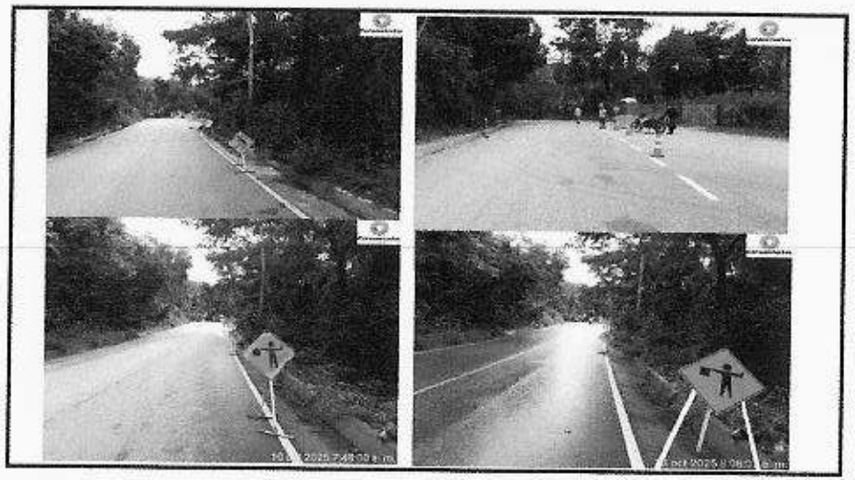



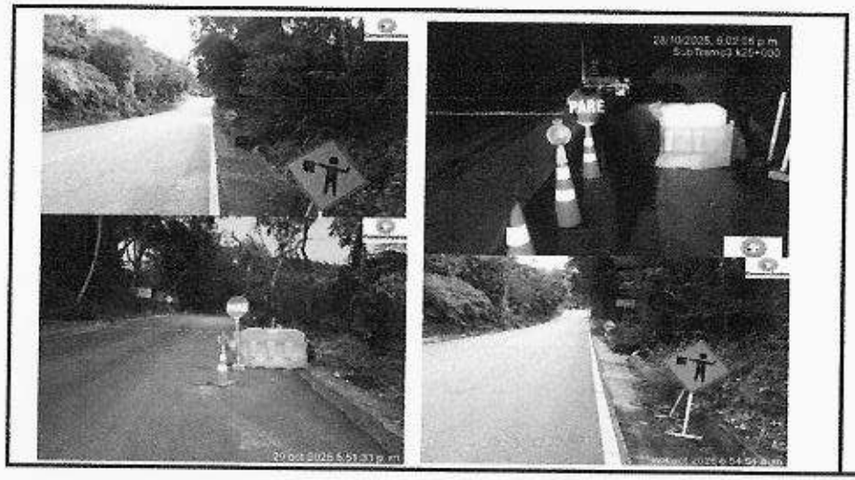


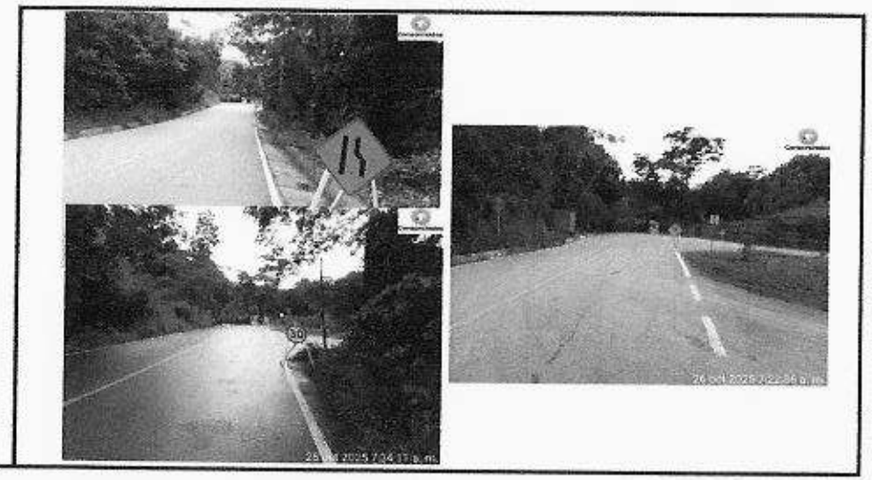



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



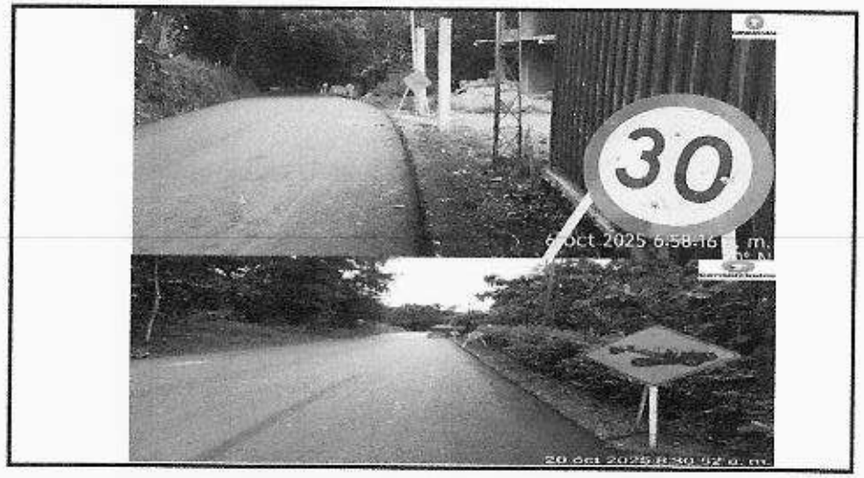


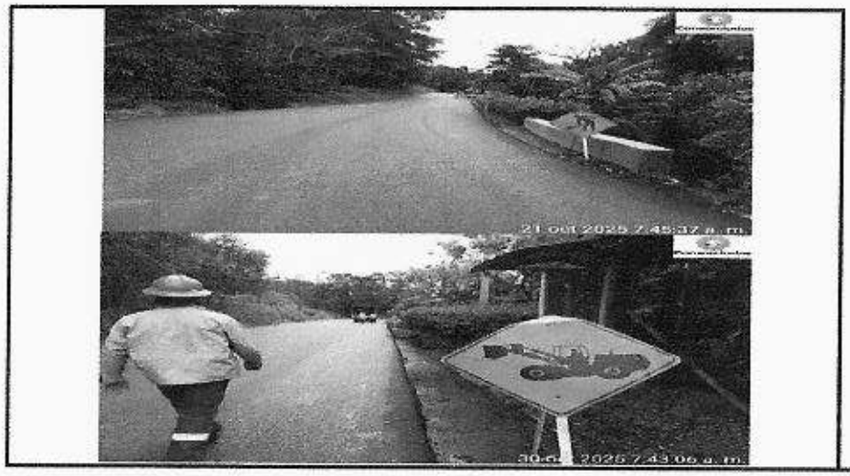


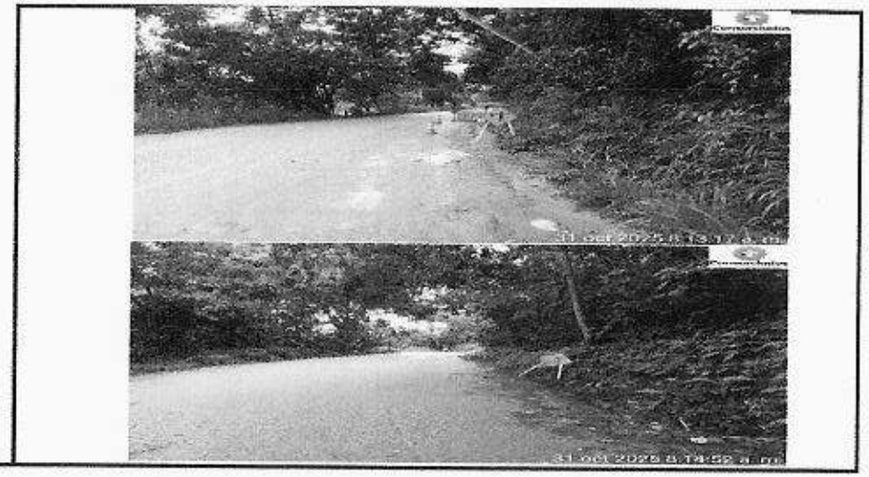



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO

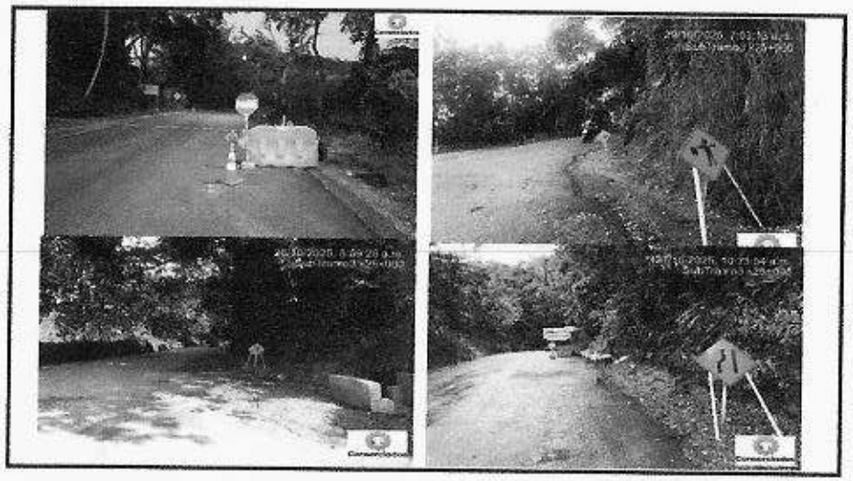

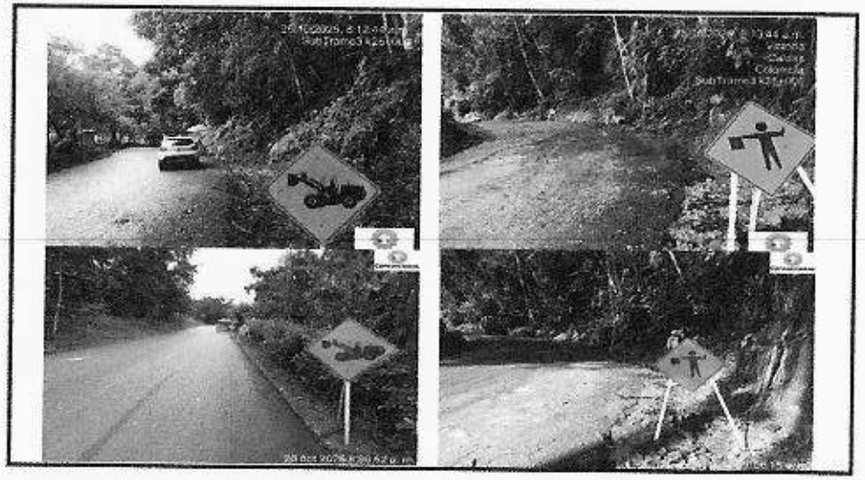


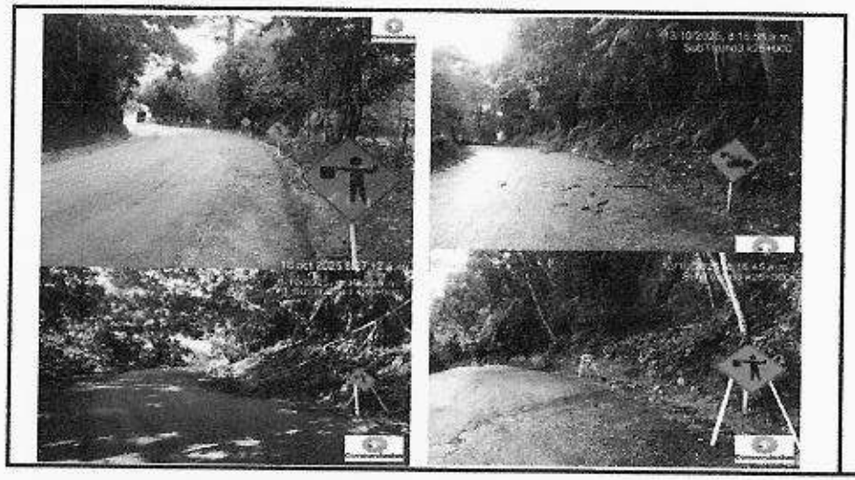


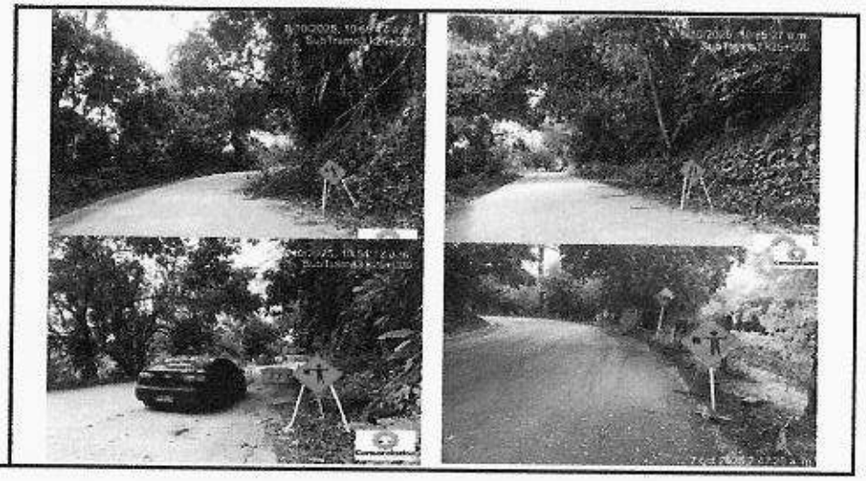



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO

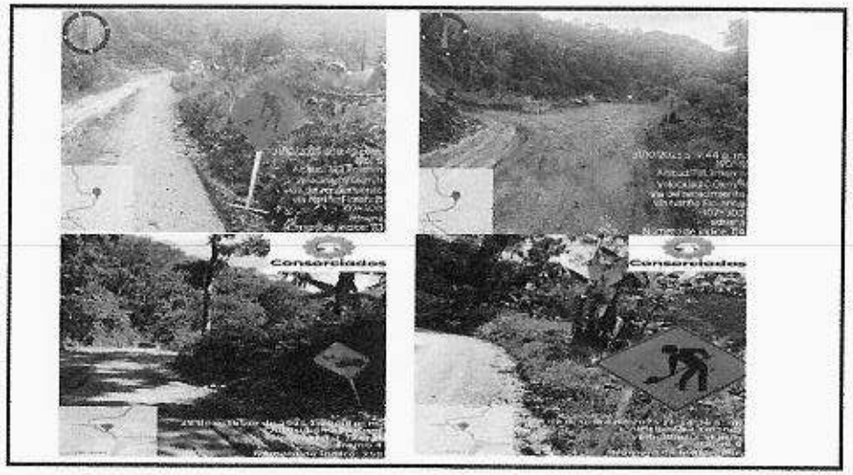

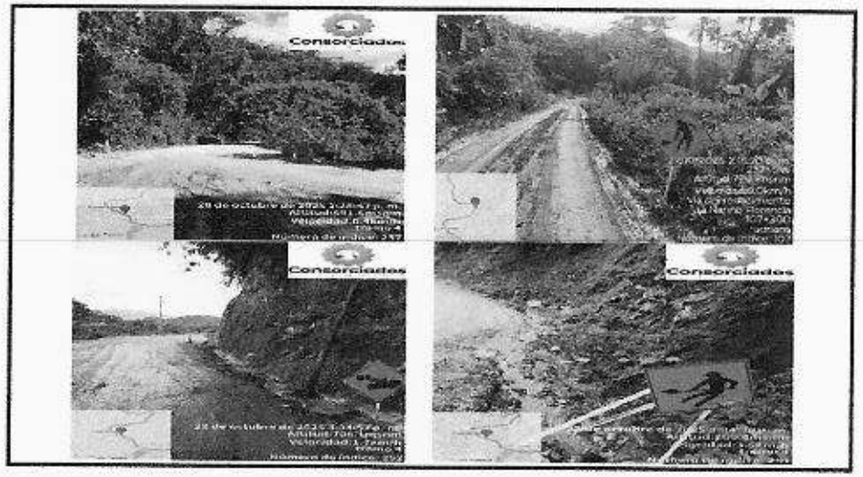


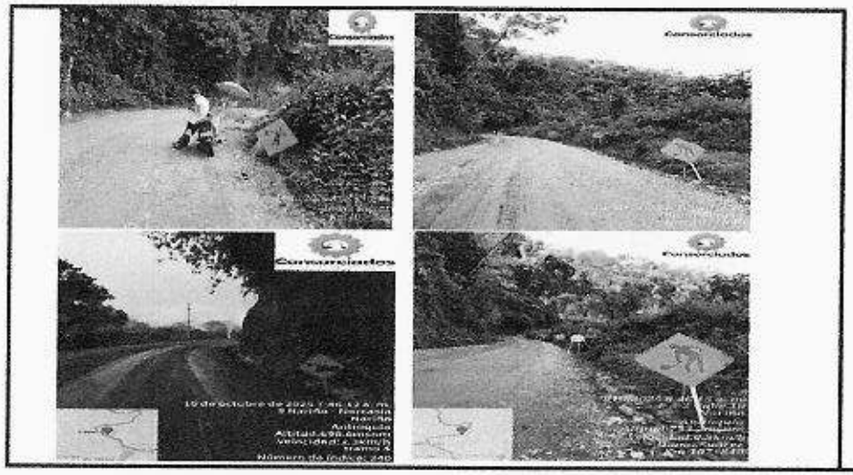

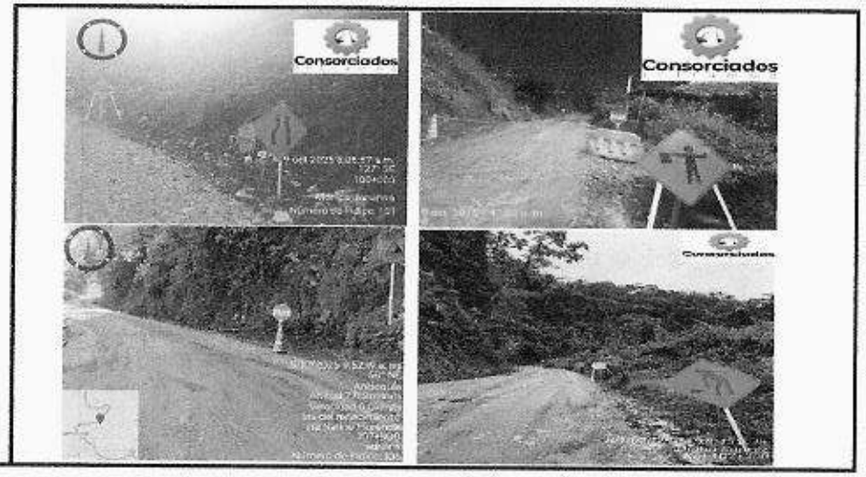



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO

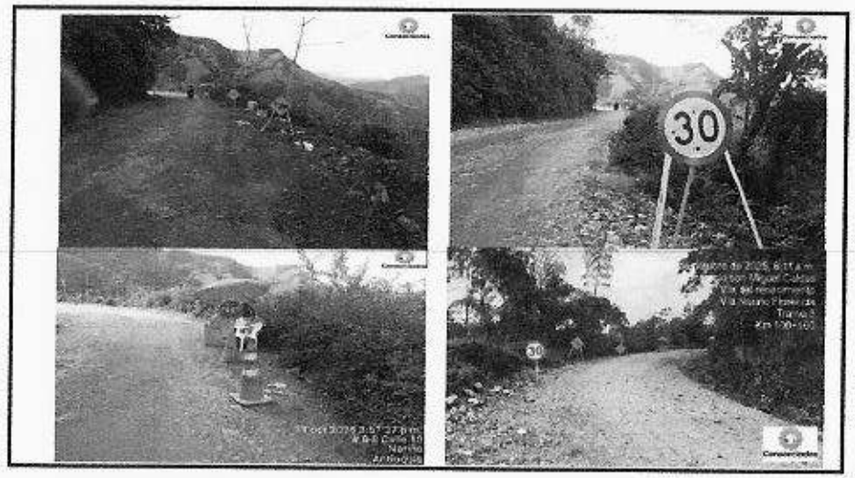



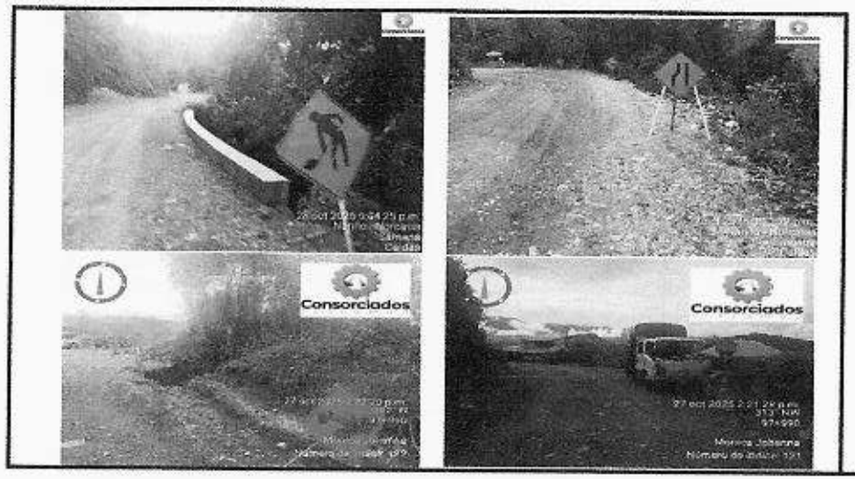

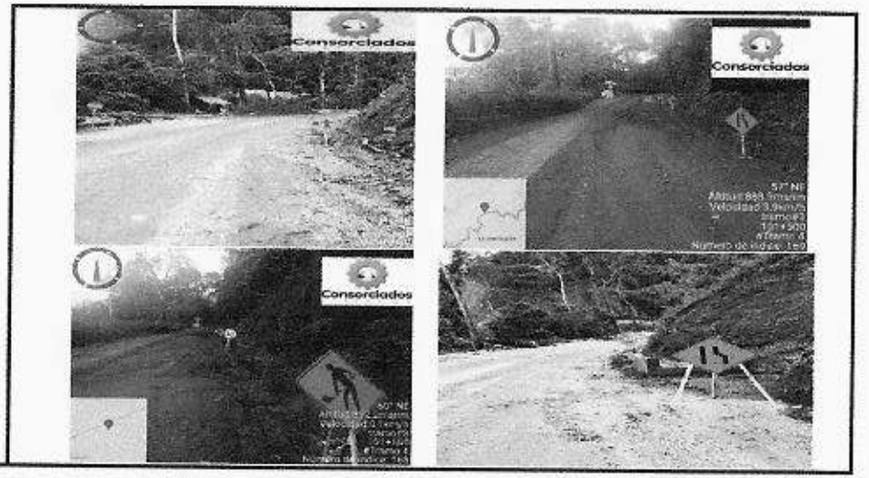

AJUSTE A DISEÑOS

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PREACTA DE OBRA No:	23.00
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA:	31/10/2025
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-5456
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022
INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
	AJUSTE A DISEÑOS	

COMPONENTE	VALOR APROBADO IVA INCLUIDO	VALOR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES	SALDO	VALOR INCLUIR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INCLUIDO EN ACTA	ESTADO ACTUAL
TRANSITO Y PAVIMENTO TRAMOS 1	$ 25,657,976.00	$ 25,657,976.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 25,657,976.00	TRAMO 1: Entregado y con concepto de aprobación por parte de interventoría.
TRANSITO Y PAVIMENTO TRAMOS 3	$ 50,085,189.00	$ 50,085,189.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50,085,189.00	TRAMO 3: Entregado y con concepto de aprobación por parte de interventoría.
TRANSITO Y PAVIMENTO TRAMOS 4	$ 75,890,351.00	$ 75,890,351.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 75,890,351.00	TRAMO 4: Entregado y con concepto de aprobación por parte de interventoría.
Complemento estudio de tránsito para el estudio y diseño de pavimentos del tramo 4 Pte. Linda-Naranjo.	$ 15,705,460.00	$ 15,705,460.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,705,460.00	Entregado y con concepto de aprobación por parte de interventoría.
TOPOGRAFIA Y OPTIMIZACIÓN GEOMETRICA TRAMO 1	$ 24,340,260.00	$ 24,340,260.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 24,340,260.00	Entregado y aprobado por interventoría.
TOPOGRAFIA Y OPTIMIZACIÓN GEOMETRICA TRAMO 3	$ 95,700,600.00	$ 95,700,600.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 95,700,600.00	TRAMO 3 Entregada y con aprobación por parte de interventoría
TOPOGRAFIA Y OPTIMIZACIÓN GEOMETRICA TRAMO 4	$ 83,384,700.00	$ 83,384,700.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 83,384,700.00	TRAMO 4 Entregado y con aprobación por parte de interventoría, observacion última atendida y en revisión por parte de la interventoría.
AJUSTES DISEÑOS HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN EN DOS TRAVOS DEL PROYECTO (30km), TRAMO 3 Y TRAMO 4	$ 43,197,000.00	$ 43,197,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 43,197,000.00	Tramo 3 y 4 Entregado y con aprobación por parte de interventoría.
Recorrido a tramos 3 y 4 por parte del consultor de hidrología e hidráulica.	$ 4,165,000.00	$ 4,165,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,165,000.00	Recorrido realizado el pasado 11 y 12 de abril, informe remitido a interventoría
ESTUDIO GEOTECNICO DEL K29+610,	$ 26,500,000.00	$ 26,500,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,500,000.00	Diseños presentados y aprobados por parte de la interventoría.
ESTUDIO GEOTECNICO DEL K29+850	$ 27,700,000.00	$ 27,700,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 27,700,000.00	Diseños presentados y aprobados por parte de la interventoría.
VISITA AL TALUD UBICADO EN EL PR 102+000 TRAMO 3, CON GEOTECNISTA Y GEOLOGO	$ 5,200,000.00	$ 5,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,200,000.00	Visita realizada el 18 de marzo, informe entregado.
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PUENTE HIERRO	$ 61,867,883.00	$ 61,867,883.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 61,867,883.00	Informe con aprobación interventoría
EVALUACIÓN DIAGNOSTICO PUENTE LINDA	$ 50,925,918.00	$ 50,925,918.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50,925,918.00	Informe con aprobación interventoría
PUENTE HIERRO 1- DISEÑO DE REFUERZO PUENTE METALICO 2- DISEÑO DE LOSA DE CONCRETO PUENTE METALICO 3- DISEÑO DE LOSA DE CONCRETO PUENTE CONCRETO	$ 17,255,000.00	$ 17,255,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,255,000.00	Diseños aprobados por interventoría
PUENTE HIERRO 1- DISEÑO DE REFUERZO PUENTE METALICO 2- DISEÑO REFUERZO PUENTE CONCRETO 3- DISEÑO DE LOSA DE CONCRETO PUENTE METALICO 4- DISEÑO DE LOSA DE CONCRETO PUENTE CONCRETO	$ 22,015,000.00	$ 22,015,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 22,015,000.00	Diseños aprobados por interventoría
Estudio de talud en roca en el PR 102 en corredor vial Florencia – Puente Linda, municipio de Norcasia, departamento de Caldas	$ 45,794,200.00	$ 45,794,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 45,794,200.00	Diseños aprobados por interventoría
Estudio geotécnico para la estabilización del sitio crítico en el km113+740 al km113+780 de la vía Nariño - La Dorada.	$ 51,622,200.00	$ 51,622,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 51,622,200.00	Diseños presentados y aprobados por parte de la interventoría.
Estudio y Rediseño de las vías ubicadas en los tramos 1 y 3 adicionales, de la vía, La Dorada-Isaza, Norcasia, Florencia, Pte. Linda-Nariño, departamentos de Caldas y Antioquia. Ajuste de propuesta, se saca del alcance el tramo 2 vía principal Isaza	$ 58,383,271.00	$ 58,383,271.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 58,383,271.00	Diseños presentados y aprobados por parte de la interventoría.
Estudio y Rediseño de las vías ubicadas en el tramo 2 adicional, del corregimiento de Isaza, Departamentos de Caldas	$ 29,443,813.00	$ 0.00	$ 29,443,813.00	$ 29,433,813.00	$ 29,433,813.00	Diseños presentados y aprobados por parte de la interventoría.
TOPOGRAFIA Y OPTIMIZACIÓN GEOMETRICA SUBTRAMO 1 Y 3 ADICIONAL A TRAMO 1	$ 46,639,964.00	$ 0.00	$ 46,639,964.00	$ 46,639,964.00	$ 46,639,964.00	Diseños presentados y en Atencion de observaciones por parte del contratista
TOPOGRAFIA Y OPTIMIZACIÓN GEOMETRICA SUBTRAMO 2 ADICIONAL A TRAMO 1	$ 9,522,531.72	$ 0.00	$ 9,522,531.72	$ 0.00	$ 0.00	Levantamientos topograficos realizados y mojonas instalados, en procesamiento de informacion y diseño.

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL REPACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL REPACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23.00	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM		UNIDAD
	AJUSTE A DISEÑOS	

COMPONENTE	VALOR APROBADO IVA INCLUIDO	VALOR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES	SALDO	VALOR INCLUIR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INCLUIDO EN ACTA	ESTADO ACTUAL
Diseño estructural muros sitio crítico en el km113+740 al km113+780 de la vía Nariño - La Dorada.	$ 12,495,000.00	$ 0.00	$ 12,495,000.00	$ 0.00	$ 0.00	Atención de observaciones por parte del consultor
GEOTECNIA K 105+580 - concepto de mejoramiento del nivel de desplante para el apoyo de muro de cimentación superficial.	$ 15,000,000.00	$ 0.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	APROBADO
GEOTECNIA K 102+792 - K 102+850 - Perfilado, obras de bioingeniería,malla con anclajes de sujetación, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales						APROBADO PARCIAL- FALTA ENSAYOS DE LABORATORIO
GEOTECNIA Tramo 3 y 4 - Justificacion tecnica para la implementación de muros de cimentación superficial con dentellón de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS	$ 15,000,000.00	$ 0.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	APROBADO
GEOTECNIA K 102+060 - K 102+140 - Perfilado, obras de bioingeniería,malla con anclajes de sujetación, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales						APROBADO PARCIAL- FALTA ENSAYOS DE LABORATORIO
GEOTECNIA K 99+240 - analisis de muro de contención tipo de la cartilla de obras menores del INVIAS para la protección del inmueble y el acceso al predio.	$ 15,000,000.00	$ 0.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00	APROBADO
GEOTECNIA Tramo 4 - Justificacion tecnica para la construcción de bateral de drenes sub-horizontales para el abatimento del nivel freático y evacuar las aguas sub superficiales						APROBADO
Totales	$ 926,571,316.72	$ 783,470,008.00	$ 143,101,308.72	$ 121,073,777.00	$ 904,543,785.00	

TOTAL	$ 121,073,777.00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. RODRIGO GARCIA CAMPIÑO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

INTEINSA PAVIMENTOS

Agente de retención de IVA al RST

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

IPFE 1639

INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S
Nit: 900588771-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 45 A 73 A 59 ITAGÜÍ ANTIOQUIA Tel. 3221953

Adquiriente	CONSORCIO SAN MIGUEL CALDAS	Fecha	Informacion de pago
Identific.	NIT 901740908-5 Tels: 6044483012	Jun-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CR 48 48 SUR 75 163 ENVIGADO - ANTIOQUIA		Medio
		Vencimiento Jul-06-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	PRECIO	%IVA	%DTO	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	DIS	Diseño y/o actualización a los diseños Observaciones: ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAV TRAMO 2 VIA PRINC URB IZASA	24,742,700.00	19		1.00	24,742,700.00	24,742,700.00

OBSERVACIONES: *ACTA DE OBRA No. 4*
Contrato 1000302

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	24,742,700.00
		IVA 19.00%	24,742,700.00	4,701,113.00	Iva/Inc	4,701,113.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764077539560 de Ago-21-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-21-2025 Rango: IPFE 1255-3000

Son: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 29,443,813.00

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.28093509811 A NOMBRE DE INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S Y ENVIAR CORREO A facturacion@inteinsapavimentos.com.co.

CUFE: 30bd74e71ceac8b13ff8a6fff2e672660742bba84d481d2c3281eab71b43044bebb2e4428da2ba1c413cbd42b06654bd
Fecha generación: 2025-06-06T14:38:00 Fecha expedición: 2025-06-06T14:41:24 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

VTR TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.222.876-6
CLL 29 A 50-85 APTO 707
Tel: (034) 5974898
Bello - Colombia
VTRTOPOGRAFIA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 456

Señores	CONSORCIO SAN MIGUEL		
NIT	901.740.908-5	**Teléfono**	(604) 4483012 - Ext. 000
Dirección	CR 48 48 SUR 75 163	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2025, 11:00
Expedición	28/10/2025, 11:00
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	004	Construcción de estacas para topografía y trabajos topográficos PTE HIERRO 2.37 km e ISAZA - DORADA 3.5 km	1.00	39,542,148.00	19 %	39,542,148.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones seiscientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 46,639,963.57

Total Bruto	39,542,148.00
Administración 10.00%	3,954,214.80
Imprevistos 2.00%	790,842.96
Utilidad 5.00%	1,977,107.40
IVA 19%	375,650.41
Total a Pagar	**46,639,963.57**

Observaciones:
ACTA DE OBRA No. 2 Contrato 1000310
Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 37900011882 y Enviar comprobante al correo vtrtopografia@gmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099744081 aprobado en 20251005 prefijo FE desde el número 444 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: ca460a8195ecbcbbbbdc37cc15e7e1851ae1612d6cbc1c107fd4547bf5cef87e669a75e649abc418bb9c8c2698b409c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUENTA DE COBRO No. 01
Pueblo Nuevo, 5-11-2025

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT *901.740.908-5*

DEBE A:

JUAN PABLO GÓMEZ GÓMEZ

C.C: 1.055.753.270

No Responsable de IVA
Declarante: Sí ■ No ☐

La suma de quince millones de pesos **($15.000.000 PESOS M/CTE),** correspondiente a la **consultoría técnica especializada en geotecnia** desarrollada durante el periodo comprendido entre el **23 de julio y el 23 de agosto de 2025**, en el marco del **Contrato No. SMCA-CPS-013-2025**, cuyo objeto consiste en desarrollar, de manera presencial y continua, las actividades técnicas requeridas como especialista en geotecnia, orientadas a la identificación, diagnóstico y formulación de alternativas de obras de mitigación del riesgo frente a las afectaciones geotécnicas presentes en los sectores intervenidos.

Para el presente periodo se cuenta con aprobación por parte de la interventoría de las siguientes actividades:

- GEOTECNIA K 105+590 - concepto de mejoramiento del nivel de desplante para el apoyo de muro de cimentación superficial.

- GEOTECNIA K 102+792 - K 102+850 - Perfilado, obras de bioingeniería, malla con anclajes de sujeción y, manejo de agua superficiales y subsuperficiales

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 07085186579 de Entidad Bancaria BANCOLOMBIA.**

Juan Pablo Gómez Gómez
C.c 1.055.753.270
Correo: jpgomez270@gmail.com
Cel:3166281848

CUENTA DE COBRO No. 02
Pueblo Nuevo, 5-11-2025

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT *901.740.908-5*

DEBE A:

JUAN PABLO GÓMEZ GÓMEZ

C.C: 1.055.753.270

No Responsable de IVA
Declarante: Sí ■ No ☐

La suma de quince millones de pesos **($15.000.000 PESOS M/CTE),** correspondiente a la **consultoría técnica especializada en geotecnia** desarrollada durante el periodo comprendido entre el **24 de agosto y el 23 de Septiembre de 2025,** en el marco del **Contrato No. SMCA-CPS-013-2025**, cuyo objeto consiste en desarrollar, de manera presencial y continua, las actividades técnicas requeridas como especialista en geotecnia, orientadas a la identificación, diagnóstico y formulación de alternativas de obras de mitigación del riesgo frente a las afectaciones geotécnicas presentes en los sectores intervenidos.

Para el presente periodo se cuenta con aprobación por parte de la interventoría de las siguientes actividades:

- GEOTECNIA Tramo 3 y 4 - Justificación técnica para la implementación de muros de cimentación superficial con dentellón de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del INVIAS

- GEOTECNIA K 102+060 - K 102+140 - Perfilado, obras de bioingeniería, malla con anclajes de sujeción y, manejo de agua superficiales y subsuperficiales

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 07085186579 de Entidad Bancaria BANCOLOMBIA.**

Juan Pablo Gómez Gómez
C.c 1.055.753.270
Correo: jpgomez270@gmail.com
Cel:3166281848

CUENTA DE COBRO No. 03
Pueblo Nuevo, 5-11-2025

CONSORCIO SAN MIGUEL - CALDAS

NIT *901.740.908-5*

DEBE A:

JUAN PABLO GÓMEZ GÓMEZ

C.C: 1.055.753.270

No Responsable de IVA
Declarante: Sí ■ No ☐

La suma de quince millones de pesos **($15.000.000 PESOS M/CTE),** correspondiente a la **consultoría técnica especializada en geotecnia** desarrollada durante el periodo comprendido entre el **24 de Septiembre y el 23 de Octubre de 2025**, en el marco del **Contrato No. SMCA-CPS-013-2025**, cuyo objeto consiste en desarrollar, de manera presencial y continua, las actividades técnicas requeridas como especialista en geotecnia, orientadas a la identificación, diagnóstico y formulación de alternativas de obras de mitigación del riesgo frente a las afectaciones geotécnicas presentes en los sectores intervenidos.

Para el presente periodo se cuenta con aprobación por parte de la interventoría de las siguientes actividades:

- GEOTECNIA K 99+240 - análisis de muro de contención tipo de la cartilla de obras menores del INVIAS para la protección del inmueble y el acceso al predio

- GEOTECNIA Tramo 4 - Justificación técnica para la construcción de batería de drenes sub-horizontales para el abatimiento del nivel freático y evacuar las aguas sub superficiales

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 07085186579 de Entidad Bancaria BANCOLOMBIA.**

Juan Pablo Gómez Gómez
C.c 1.055.753.270
Correo: jpgomez270@gmail.com
Cel:3166281848

PRE-ACTA TRAMO 1

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - TRAMO 1	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	27						UNIDAD
640.1 Gl	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa						Kg
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO.23							
DISIPADORES							
K29+600,00	K29+600,00	1,00	327,71	1/2"	0,99	323,25	Acero Mex Jersey (Ver anexo planilla acero)
K29+650,00	K29+650,00	1,00	545,35	1/2"	0,99	542,00	Acero Mex Jersey (Ver anexo planilla acero)
TOTAL ACTA 23					867,32		

ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**867,32**
TOTAL ACUMULADO	867,3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA


ING. JOAQUIN ANTONIO ZIRATA CRIVIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: New Jersey muro K29+600 Y K29+650
Fecha: 30-oct

CONSORCIO SAN MIGUEL

	Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
				6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
MODULO 1		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
MODULO 2		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
MODULO 3		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales							0	327,21						
Peso en kilos							0	325,24674						
Peso total (kg)				325,25										




INGENIERO	JOAQUIN ANTONIO TIBATÁ	RESIDENTE DE OBRA	

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: New Jersey muro K29+600 Y K29+650
Fecha: 30-oct

	Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
				6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
MODULO 1		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
MODULO 2		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
MODULO 3		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						

MODULO 4		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
MODULO 5		24	1,31					31,44						
		24	1,82					43,68						
		7	4,85					33,95						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales							0	545,35						
Peso en kilos							0	542,0779						
Peso total (kg)				542,08										

INGENIERO	JOAQUIN ANTONIO TIBATÁ	RESIDENTE DE OBRA	


Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - TRAMO 1	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE		
CONTRATO DE OBRA No:	29C92023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	83						UNIDAD
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	AREA (m2)	Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
MUROS							
K29+600,00	K29+600,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 1
K29+600,00	K29+600,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 2
K29+600,00	K29+600,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 3
K29+650,00	K29+650,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 1
K29+650,00	K29+650,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 2
K29+650,00	K29+650,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 3
K29+650,00	K29+650,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 4
K29+650,00	K29+650,00	5,00	0,1977		0,99		CONCRETO NEW JERSEY MODULO 5
TOTAL ACTA 23					7,9		

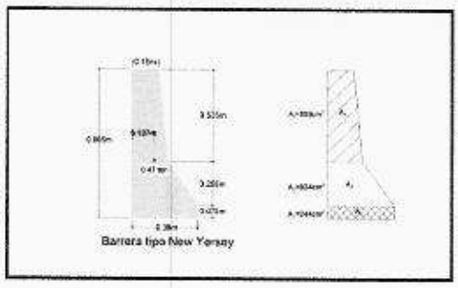

Barrera tipo New Yersey

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**7,91**
TOTAL ACUMULADO	7,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERSARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

PRE-ACTA SUB TRAMO 1

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1471 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto(m)	Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K39+305,00	K39+359,00	54,00	1,16	0,10	6,26		
K39+382,00	K39+447,00	64,30	1,16	0,05	3,73		
K39+453,00	K39+535,00	82,00	1,16	0,10	9,51		
K39+548,00	K39+598,00	57,70	1,16	0,10	6,69		
K39+614,00	K39+647,00	33,00	1,16	0,05	1,91		
K39+665,00	K39+687,00	22,40	1,16	0,05	1,30		
K39+696,00	K39+731,00	35,30	1,16	0,10	4,09		
K39+742,00	K39+757,00	15,60	1,16	0,10	1,81		
K39+773,00	K39+789,00	15,80	1,16	0,10	1,83		
K39+801,00	K39+855,00	54,10	1,16	0,10	6,28		
K39+863,00	K39+920,00	54,80	1,16	0,05	3,18		
K39+925,00	K39+973,00	48,50	1,16	0,05	2,81		
K39+981,00	K40+061,00	80,00	1,16	0,10	9,28		
K40+086,00	K40+095,00	8,80	1,16	0,10	1,02		
K40+099,00	K40+149,00	49,80	1,16	0,05	2,89		
K40+183,00	K40+214,00	31,10	1,16	0,10	3,61		
K40+262,00	K40+284,00	22,30	1,16	0,10	2,59		
K40+289,00	K40+396,00	97,10	1,16	0,10	11,26		
K40+464,00	K40+470,00	6,70	1,16	0,10	0,78		
K39+305,00	K40+410,00	253,22	1,16	0,10	30,53		
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					111,4		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**111,4**
TOTAL ACUMULADO	111,4

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAZA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	23						UNIDAD
630.6 23	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K40+153	K40+153	1,10	0,90	0,05	0,05		Solado placa 1
K40+153	K40+153	1,30	0,90	0,05	0,06		Solado placa 2
K40+250	K40+250	1,25	0,90	0,05	0,06		Solado placa 1
K40+250	K40+250	1,42	0,90	0,05	0,06		Solado placa 2
K40+530	K40+530	1,90	0,92	0,05	0,09		Solado placa 1
K40+530	K40+530	2,00	1,54	0,05	0,15		Solado placa 2
K40+530	K40+530	2,00	1,57	0,05	0,16		Solado placa 3
K40+530	K40+530	2,00	1,60	0,05	0,16		Solado placa 4
K40+530	K40+530	2,00	1,57	0,05	0,16		Solado placa 5
K40+530	K40+530	2,28	2,47	0,05	0,28		Solado placa 6
K40+650	K40+650	1,70	1,44	0,05	0,12		Solado placa 1
K40+650	K40+650	1,60	1,70	0,05	0,14		Solado placa 2
K40+650	K40+650	1,80	1,70	0,05	0,15		Solado placa 3
K40+660	K40+660	2,89	0,90	0,05	0,13		solado canal disipador
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					1,8		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PASCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	1,80
TOTAL ACUMULADO	1,8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIA CRITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 4
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	25 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2985202S-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	27						UNIDAD
640.1 T1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa						kg
Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA PARCIAL DE COBRO N° 23							
CUNETAS TIPICAS COSTADO DERECHO							
K39+298,00	K40+410,00		9732,450	3/8"	0,56	5450,17	Acero de cunetas típicas costado derecho (ver cartilla)
K39+298,00	K40+410,00		1477,485	3/8"	0,56	827,39	Acero de cunetas irregulares costado derecho (ver cartilla)
K39+298,00	K40+410,00		9007,950	3/8"	0,56	5044,45	Acero de cunetas típicas costado izquierdo (ver cartilla)
K39+298,00	K40+410,00		2673,796	3/8"	0,56	1497,32	Acero de cunetas irregulares costado izquierdo (ver cartilla)
K40+153,03	K40+153,08		64,300	1/2"	0,99	63,91	Acero disipador (ver cartilla)
K40+250,03	K40+250,08		57,640	1/2"	0,99	57,29	Acero disipador (ver cartilla)
K40+530,00	K40+530,05		337,900	1/2"	0,99	335,87	Acero disipador (ver cartilla)
K40+660,00	K40+660,05		169,200	1/2"	0,99	168,13	Acero disipador (ver cartilla)
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					13445		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**13445,00**
TOTAL ACUMULADO	13445,0

JIGI
SGS

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA





ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: Canal disipador K40+153 Costado izquierdo
Fecha: 11-oct

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	5	1,45					7,25						
	4	4					16						
	4	3,7					14,8						
	2	2,7					5,4						
	4	1,9					7,6						
	3	3,6					10,8						
	1	2,45					2,45						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						0	64,3						
Peso en kilos						0	63,9142						
Peso total (kg)			63,914										





	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: Canal disipador K40+250 Costado izquierdo
Fecha: 20-oct

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	6	2,7					16,2						
	6	1,4					8,4						
	2	2,4					4,8						
	3	3,6					10,8						
	4	4,36					17,44						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						0	57,64						
Peso en kilos						0	57,29416						
Peso total (kg)			57,294										





	Nombre	
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA	

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

CONSORCIO SAN MIGUEL





Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: Disipador K40+530 Costado izquierdo
Fecha: 24-sep

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	10	4,2					42						
	16	3,3					52,8						
	12	4,5					54						
	3	2,3					6,9						
	40	2,8					112						
	2	1,5					3						

CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: Disipador K40+660 Costado izquierdo
Fecha: 14-oct

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	12	3					36						
	9	4,2					37,8						
	6	2,6					15,6						
	8	5,7					45,6						
	12	2,1					25,2						
	6	1,5					9						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales						0	169,2						
Peso en kilos						0	168,1848						
Peso total (kg)			168,18										

	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto:	INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato	LP-SI-004-2023
Localización:	ACERO CUNETAS MARGEN DERECHA SUB TRAMO 1
Fecha:	OCTUBRE, 2025

		Figura	Nº de placas	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
						6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
K39+296,00	K39+305,00		3,00	9	1,35				36,45							
				6	2				36							
K39+305,00	K39+370,00		32,00	9	1,35				388,8							
				6	2				384							
K39+379,60	K39+392,80		6,00	9	1,35				72,9							
				6	2				72							
K39+399,30	K39+457,10		26,00	9	1,35				315,9							
				6	2				312							
K39+466,10	K39+528,30		28,00	9	1,35				340,2							
				6	2				336							
K39+534,60	K39+599,00		29,00	9	1,35				352,35							
				6	2				348							
K39+665,00	K39+684,80		9,00	9	1,35				109,35							
				6	2				108							
K. 92,30	K39+850,10		70,00	9	1,35				850,5							
				6	2				840							
K39+853,80	K39+916,30		28,00	9	1,35				340,2							
				6	2				336							
K39+938,20	K39+974,50		17,00	9	1,35				206,55							
				6	2				204							
K39+980,70	K40+146,80		73,00	9	1,35				886,95							
				6	2				876							
K40+152,90	K40+169,20		5,00	9	1,35				60,75							
				6	2				60							
K40+193,30	K40+215,10		10,00	9	1,35				121,5							
				6	2				120							
K40+254,50	K40+319,50		29,00	9	1,35				352,35							
				6	2				348							
K40+326,20	K40+410,60		38,00	9	1,35				461,7							
				6	2				456							
		Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
		Metros lineales							9732,45	0						
		Peso en kilos							5450,172	0						
		Peso total (kg)				5450,2										

	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto:	INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato	LP-SI-004-2023
Localización:	ACERO CUNETAS MARGEN IZQUIERDA SUB TRAMO 1
Fecha:	OCTUBRE, 2025

		Figura	N° de placas	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
K39+335,00	K39+359,00		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+382,70	K39+447,00		39,00	9	1,35				352,35							
				6	2				348							
K39+453,60	K39+535,60		37,00	9	1,35				449,55							
				6	2				444							
K39+540,50	K39+598,20		26,00	9	1,35				315,9							
				6	2				312							
K39+614,70	K39+647,70		15,00	9	1,35				182,25							
				6	2				180							
K39+665,80	K39+697,40		10,00	9	1,35				121,5							
				6	2				120							
K39+696,20	K39+731,50		16,00	9	1,35				194,4							
				6	2				192							
K39+742,30	K39+757,90		7,00	9	1,35				85,05							
				6	2				84							
K39+773,30	K39+789,10		7,00	9	1,35				85,05							
				6	2				84							
K39+801,60	K39+885,50		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+865,50	K39+920,30		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+925,20	K39+973,70		21,00	9	1,35				255,15							
				6	2				252							
K39+981,70	K40+061,70		36,00	9	1,35				437,4							
				6	2				432							
K40+036,60	K40+095,60		4,00	9	1,35				48,6							
				6	2				48							
K40+099,40	K40+149,20		22,00	9	1,35				267,3							
				6	2				264							
K40+183,50	K40+214,60		14,00	9	1,35				170,1							
				6	2				168							
K40+262,50	K40+284,80		10,00	9	1,35				121,5							
				6	2				120							
K40+399,30	K40+396,40		44,00	9	1,35				534,6							
				6	2				528							
K40+434,10	K40+410,80		3,00	9	1,35				36,45							
				6	2				36							
		Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
		Metros lineales							9007,95	0						
		Peso en kilos							5044,452	0						
		Peso total (kg)				5044,5										

	Nombre	
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto:	INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato	LP-SI-004-2023
Localización:	ACERO CUNETAS MARGEN IZQUIERDA SUB TRAMO 1
Fecha:	OCTUBRE, 2025

		Figura	Nº de piezas	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
K39+305,00	K39+359,00		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+382,70	K39+447,00		29,00	9	1,35				352,35							
				6	2				348							
K39+453,60	K39+535,60		37,00	9	1,35				449,55							
				6	2				444							
K39+560,50	K39+598,20		26,00	9	1,35				315,9							
				6	2				312							
K39+614,70	K39+647,70		15,00	9	1,35				182,25							
				6	2				180							
K39+665,00	K39+687,40		10,00	9	1,35				121,5							
				6	2				120							
K39+696,20	K39+731,50		16,00	9	1,35				194,4							
				6	2				192							
K39+742,30	K39+757,90		7,00	9	1,35				85,05							
				6	2				84							
K39+773,30	K39+789,10		7,00	9	1,35				85,05							
				6	2				84							
K39+831,40	K39+885,50		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+865,50	K39+920,30		24,00	9	1,35				291,6							
				6	2				288							
K39+925,20	K39+973,70		21,00	9	1,35				255,15							
				6	2				252							
K39+991,70	K40+061,70		36,00	9	1,35				437,4							
				6	2				432							
K40+086,80	K40+095,60		4,00	9	1,35				48,6							
				6	2				48							
K40+099,40	K40+149,20		22,00	9	1,35				267,3							
				6	2				264							
K40+183,50	K40+214,60		14,00	9	1,35				170,1							
				6	2				168							
K40+262,50	K40+284,80		10,00	9	1,35				121,5							
				6	2				120							
K40+299,30	K40+396,40		44,00	9	1,35				534,6							
				6	2				528							
K40+404,10	K40+410,80		3,00	9	1,35				36,45							
				6	2				36							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)						0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales									9007,05	0						
Peso en kilos									5044,452	0						
Peso total (kg)						5044,5										




	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		











CARTILLA DE FIGURACIÓN







FR-INT-38
Versión: 30/09/2022














CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: IRREGULARES K39+298 A 40+411 CD
Fecha: 01/09/2025 AL 25/10/25

	Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
39+305		4	1,35				5,4							
		6	0,7				4,2							
		7	0,35				2,45							
		6	2,15				12,9							
		10	1,3				13							
		6	2				12							
		9	1,35				12,15							
		4	0,85				3,4							
		4	0,7				2,8							
		12	1,95				23,4							
39+370		9	2,86				25,74							
		13	2,71				35,23							
		13	2,95				38,35							
		5	0,85				4,25							
		4	1,25				5							
		6	2				12							
		9	1,35				12,15							
		6	2				12							
		9	1,35				12,15							
		9	1,3				11,7							
		6	2				12							

39+792		9	1,25				11,25							
		5	2				10							
		9	1,25				**11,25**							
		6	2				**12**							
39+457		9	1,35				12,15							
		6	2				12							
		9	1,25				11,25							
		5	2				10							
		9	1,05				9,45							
		5	2,1				10,5							
		9	1,35				**12,15**							
		6	2				**12**							
39+528		9	1,25				11,25							
		6	2				12							
		8	0,6				4,8							
		3	1,7				5,1							
		10	1,8				**18**							
		8	2,1				**16,8**							
39+599		8	1,25				10							
		6	1,9				11,4							
39+685		4	1,35				5,4							
		6	1,15				6,9							
		9	1,35				12,15							
		6	2				12							
		9	1,1				9,9							

40+215 7 SECCIONES PROMEDIO		4	2				56							
		9	0,7				44,1							
		9	1,15				**10,35**							
		5	2,1				**10,5**							
		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		9	1,15				10,35							
40+184		5	2				10							
		9	1,25				11,25							
		6	2				12							
		9	1,25				**11,25**							
		6	2				**12**							
		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		3	2				54							
		9	0,7				56,7							
		9	1,15				10,35							

40+215		6	2				12							
9 SECCIONES PROMEDIO		9	1,35				36,45							
3 SECCIONES PROMEDIO		6	2				36							
		9	1,25				11,25							
		6	2,15				12,9							
		6	0,5				3							
		3	1,7				5,1							
		11	1,85				20,35							
		9	2,3				20,7							
40+319		9	1,25				11,25							
		6	2				12							
		9	1,05				9,45							
		5	2				10							
		9	1,2				**10,8**							
		5	2				**10**							
40+411		5	1,35				6,75							
		6	1				6							
		9	1,55				13,95							
		7	2,15				15,05							
		6	1				6							
		5	1,5				7,5							
		9	1,9				17,1							
		9	2,15				19,35							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales							**1477,48**							
Peso en kilos							**827,389**							
Peso total (kg)				**827,39**										







	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		












CARTILLA DE FIGURACIÓN

FR-INT-38
Versión: 30/09/2022

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: IRREG K39+305 A 40+410 CI
Fecha: 01/09/2025 AL 25/10/25

	Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
39+305 8 SECCIONES PROMEDIO		11	1,45				15,95							
		6	2,55				15,3							
		5	2,1				84							
		10	0,9				72							
39+382		6	1,45				8,7							
		4	2				8							
		2	1				2							
39+447		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		9	1,2				10,8							
		5	2				10							
		5	1,9				9,5							
		9	0,9				8,1							
		9	1,9				17,1							
		8	2,2				17,6							
39+589 6 SECCIONES PROMEDIO		9	1,65				14,85							
		7	2,2				15,4							
		6	2				72							
		9	1,2				64,8							



		5	1,35				6,75							
		6	1				6							
39+687		9	1,25				11,25							
		6	2				12							
		8	1,05				8,4							
		5	1,75				8,75							
		8	1				8							
		5	2				10							
		8	1,15				9,2							
		5	2,15				10,75							
39+731 3 SECCIONES PROMEDIO		4	1,35				5,4							
		6	0,75				4,5							
		14	2				84							
		14	2				84							
		9	1,8				16,2							
		9	2				18							
		9	1,8				16,2							
		9	2				18							




CARTILLA DE FIGURACIÓN

























FR-INT-38
Versión: 30/09/2022















CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato 1071-2022
Localización: IRREG K39+305 A 40+410 CI
Fecha: 01/09/2025 AL 25/10/25

	Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
39+305 8 SECCIONES PROMEDIO		11	1,45				15,95							
		6	2,55				15,3							
		5	2,1				84							
		10	0,9				72							
39+382		6	1,45				8,7							
		4	2				8							
		2	1				2							
39+447		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		9	1,15				10,35							
		5	2				10							
		9	1,2				**10,8**							
		5	2				**10**							
		5	1,9				9,5							
		9	0,9				8,1							
		9	1,9				17,1							
		8	2,2				17,6							
39+589 6 SECCIONES PROMEDIO		9	1,65				14,85							
		7	2,2				15,4							
		6	2				72							
		9	1,2				64,8							

		5	1,35				**6,75**							
		6	1				**6**							
39+687		9	1,25				11,25							
		6	2				12							
		8	1,05				8,4							
		5	1,75				8,75							
		8	1				8							
		5	2				10							
		8	1,15				**9,2**							
		5	2,15				**10,75**							
39+731 3 SECCIONES PROMEDIO		4	1,35				5,4							
		6	0,75				4,5							
		14	2				84							
		14	2				84							
		9	1,8				**16,2**							
		9	2				**18**							
		9	1,8				**16,2**							
		9	2				**18**							

		8	2,2				**17,6**							
40+050 3 SECCIONES PROMEDIO 3 SECCIONES PROMEDIO		3	1,35				4,05							
		6	0,6				3,6							
		14	2				84							
		14	2				84							
		9	1,35				12,15							
		6	2				12							
		5	2,2				33							
		9	1,1				29,7							
		10	1,75				17,5							
		8	2				16							
		8	1,5				12							
		7	1,85				12,95							
40+095		4	1,35				5,4							
		6	0,8				4,8							
		5	1,3				6,5							
		6	1,15				6,9							
		5	1,3				**6,5**							
		6	1,25				**7,5**							
		2	1,35				2,7							
		6	0,45				2,7							
		5	2				30							
		9	1,1				29,7							
		9	1,45				13,05							
		6	2,1				12,6							

40+396		7	2,1				14,7							
		6	1,53				9,18							
		7	1,22				8,54							
		6	1,53				9,18							
		7	1,22				8,54							
		9	1,6				**14,4**							
		7	2,1				**14,7**							
40+410		7	1,45				10,15							
		6	1,45				8,7							
		9	2,05				18,45							
		9	2				18							
		8	2,3				18,4							
		11	1,7				18,7							
		9	2,35				**21,15**							
		10	2,1				**21**							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)				0,222	0,394	0,250	0,560	0,994	1,552	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404
Metros lineales							2673,79							
Peso en kilos							1497,32							
Peso total (kg)				1497,3										

	Nombre		
INGENIERO	JOAQUIN TIBATA		

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	0/01/1900
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909202023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1072 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM	37		UNIDAD
673.3.3 X1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C 3%-20		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor	Area(m2)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23								
K39+296,00	K39+305,00	6,40			0,126	0,81	derecha	Material de cobertura
K39+305,00	K39+370,00	70,70			0,126	8,91	derecha	Material de cobertura
K39+379,00	K39+392,00	13,20			0,126	1,66	derecha	Material de cobertura
K39+393,00	K39+457,00	57,60			0,126	7,26	derecha	Material de cobertura
K39+466,00	K39+528,00	62,20			0,126	7,84	derecha	Material de cobertura
K39+534,00	K39+599,00	64,40			0,126	8,11	derecha	Material de cobertura
K39+665,00	K39+685,00	19,80			0,126	2,49	derecha	Material de cobertura
K39+692,00	K39+850,00	157,80			0,126	19,88	derecha	Material de cobertura
K39+853,00	K39+916,00	62,50			0,126	7,88	derecha	Material de cobertura
K39+936,00	K39+974,00	38,30			0,126	4,82	derecha	Material de cobertura
K39+980,00	K40+146,00	166,10			0,126	20,93	derecha	Material de cobertura
K40+152,00	K40+164,00	11,30			0,126	1,42	derecha	Material de cobertura
K40+193,00	K40+215,00	22,10			0,126	2,78	derecha	Material de cobertura
K40+254,00	K40+319,00	65,00			0,126	8,19	derecha	Material de cobertura
K40+326,00	K40+411,00	85,40			0,126	10,76	derecha	Material de cobertura
K39+298,00	K40+411,00	146,78			0,126	18,43	derecha	Material de cobertura cunetas irregulares
K39+305,00	K39+359,00	54,00	1,16	0,10		6,26	izquierda	Material de cobertura
K39+382,00	K39+447,00	64,30	1,16	0,05		3,73	izquierda	Material de cobertura
K39+453,00	K39+535,00	82,00	1,16	0,10		9,51	izquierda	Material de cobertura
K39+548,00	K39+598,00	57,70	1,16	0,10		6,69	izquierda	Material de cobertura
K39+614,00	K39+647,00	33,00	1,16	0,05		1,91	izquierda	Material de cobertura
K39+665,00	K39+687,00	22,40	1,16	0,05		1,30	izquierda	Material de cobertura
K39+696,00	K39+731,00	35,30	1,16	0,10		4,09	izquierda	Material de cobertura
K39+742,00	K39+757,00	15,60	1,16	0,10		1,81	izquierda	Material de cobertura
K39+771,00	K39+789,00	15,80	1,16	0,10		1,83	izquierda	Material de cobertura
K39+801,00	K39+855,00	54,10	1,16	0,10		6,28	izquierda	Material de cobertura
K39+865,00	K39+920,00	54,80	1,16	0,05		3,18	izquierda	Material de cobertura
K39+925,00	K39+973,00	48,50	1,16	0,05		2,81	izquierda	Material de cobertura
K39+981,00	K40+061,00	80,00	1,16	0,10		9,28	izquierda	Material de cobertura
K40+086,00	K40+095,00	8,80	1,16	0,10		1,02	izquierda	Material de cobertura
K40+099,00	K40+149,00	49,80	1,16	0,05		2,89	izquierda	Material de cobertura
K40+183,00	K40+214,00	31,50	1,16	0,10		3,61	izquierda	Material de cobertura
K40+262,00	K40+284,00	22,30	1,16	0,10		2,59	izquierda	Material de cobertura
K40+296,00	K40+396,00	91,10	1,16	0,10		10,26	izquierda	Material de cobertura
K40+404,00	K40+410,00	6,70	1,16	0,10		0,78	izquierda	Material de cobertura
K39+305,00	K40+410,00	261,22	1,16	0,10		30,53	izquierda	Material de cobertura cunetas irregulares
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23						243,6		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**243,60**
TOTAL ACUMULADO	243,6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHIZIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	86					UNIDAD
NP630.3.2 T1	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 1					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO N° 23							
DISIPADORES							
K40+660,00	K40+660,00	1,60	1,34	0,20	0,43		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,67	0,60	0,20	0,08		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,72	0,80	0,20	0,09		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,66	1,20	0,20	0,16		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,69	1,20	0,20	0,17		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,60	0,40	0,20	0,13		ESCALA 1 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,50	1,60	0,2	0,48		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,80	0,80	0,20	0,16		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,60	0,90	0,20	0,11		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,64	1,21	0,20	0,15		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,62	1,22	0,20	0,15		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,60	0,40	0,20	0,13		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,70	1,60	0,20	0,54		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,89	0,60	0,2	0,11		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	0,95	0,60	0,20	0,11		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,19	1,12	0,20	0,27		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,06	0,60	0,20	0,13		ESCALA 2 DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	2,79	0,80	0,20	0,45		CANAL LOSA DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	1,90	0,60	0,20	0,23		CANAL LOSA DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	2,41	0,85	0,20	0,41		CANAL LOSA DISIPADOR
K40+660,00	K40+660,00	2,62	0,61	0,2	0,26		CANAL LOSA DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,82	0,20	0,31		ESCALÓN 1 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	0,84	0,66	0,20	0,11		ESCALÓN 1 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	0,82	0,86	0,20	0,11		ESCALÓN 1 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,42	0,20	0,16		ESCALÓN 2 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	1,44	0,20	0,55		ESCALÓN 2 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,33	0,64	0,2	0,30		ESCALÓN 2 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,33	0,61	0,20	0,28		ESCALÓN 2 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,49	0,20	0,19		ESCALÓN 2 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	1,50	0,20	0,57		ESCALÓN 3 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,10	0,63	0,20	0,25		ESCALÓN 3 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,10	0,61	0,20	0,26		ESCALÓN 3 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,40	0,2	0,15		ESCALÓN 3 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	1,47	0,20	0,56		ESCALÓN 4 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,10	0,63	0,20	0,26		ESCALÓN 4 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,10	0,62	0,20	0,26		ESCALÓN 4 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,40	0,20	0,15		ESCALÓN 4 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	1,50	0,20	0,57		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,13	0,62	0,20	0,26		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,14	0,61	0,20	0,26		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	1,90	0,40	0,2	0,15		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,18	2,37	0,20	1,03		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,73	0,80	0,20	0,44		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+530,00	K40+530,00	2,67	0,93	0,20	0,48		ESCALÓN 5 DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	0,80	1,15	0,20	0,18		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	0,50	1,15	0,20	0,12		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	0,80	0,94	0,20	0,15		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	0,50	1,36	0,2	0,11		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	1,32	0,80	0,20	0,21		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	1,07	0,70	0,20	0,15		DISIPADOR
K40+250,00	K40+250,00	0,80	0,72	0,20	0,12		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	1,00	0,80	0,20	0,16		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	1,62	0,57	0,20	0,18		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	1,20	0,80	0,20	0,19		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	0,53	0,48	0,20	0,05		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	1,14	1,90	0,20	0,43		DISIPADOR
K40+153,00	K40+153,00	1,73	0,80	0,20	0,21		DISIPADOR
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				14,6			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	6,40
ACTA PARCIAL NO. 18	95,70
ACTA PARCIAL NO. 19	52,80
ACTA PARCIAL NO. 20	43,90
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**14,6**
TOTAL ACUMULADO	213,5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2999203-1486	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1371 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM:	92		UNIDAD
NP5	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA		ML

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
K39+295,00	K40+411,00	1069,58			Derecha	1069,58	Corte de borde Derecho para construcción de cunetas
K39+305,00	K40+410,00	1096,52			Izquierda	1096,52	Corte de borde Izquierdo para Construcción de cunetas
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					2166,1		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL No. 23	**2166,10**
TOTAL ACUMULADO	2166,1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIRADO CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2402023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	107 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NGS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	93	UNIDAD
NP6 T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO Nº 23							
CUNETAS TIPICAS COSTADO DERECHO							
K39+298,00	K39+305,00	6,40	0,930	0,11	Derecha	0,65	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,49	Espaldar de cuneta
K39+305,00	K39+370,00	70,70	0,930	0,11	Derecha	7,23	Placa de cuneta
			0,170	0,45		5,41	Espaldar de cuneta
K39+370,00	K39+392,80	13,20	0,930	0,11	Derecha	1,35	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,01	Espaldar de cuneta
K39+392,80	K39+457,10	57,60	0,930	0,11	Derecha	5,89	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,42	Espaldar de cuneta
K39+486,10	K39+528,30	52,20	0,930	0,11	Derecha	6,36	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,76	Espaldar de cuneta
K39+534,60	K39+598,00	64,40	0,930	0,11	Derecha	6,59	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,93	Espaldar de cuneta
K39+665,00	K39+684,80	19,80	0,930	0,11	Derecha	2,03	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,51	Espaldar de cuneta
K39+692,30	K39+850,10	157,80	0,930	0,11	Derecha	16,14	Placa de cuneta
			0,170	0,45		12,07	Espaldar de cuneta
K39+853,60	K39+916,30	62,50	0,930	0,11	Derecha	6,39	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,78	Espaldar de cuneta
K39+936,20	K39+974,50	38,30	0,930	0,11	Derecha	3,92	Placa de cuneta
			0,170	0,45		2,93	Espaldar de cuneta
K39+980,70	K40+146,80	166,10	0,930	0,11	Derecha	16,98	Placa de cuneta
			0,170	0,45		12,71	Espaldar de cuneta
K40+152,90	K40+169,20	11,30	0,930	0,11	Derecha	1,16	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,86	Espaldar de cuneta
K40+193,00	K40+215,10	22,10	0,930	0,11	Derecha	2,26	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,69	Espaldar de cuneta
K40+254,50	K40+319,50	65,00	0,930	0,11	Derecha	6,65	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,97	Espaldar de cuneta
K40+326,20	K40+410,80	85,40	0,930	0,11	Derecha	8,74	Placa de cuneta
			0,170	0,45		6,53	Espaldar de cuneta
CUNETAS TIPICAS COSTADO IZQUIERDO							
K39+305,00	K39+359,00	54,00	0,930	0,11	Izquierda	5,52	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,13	Espaldar de cuneta
K39+382,70	K39+447,00	64,30	0,930	0,11	Izquierda	6,58	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,92	Espaldar de cuneta
K39+453,60	K39+535,60	82,00	0,930	0,11	Izquierda	8,39	Placa de cuneta
			0,170	0,45		6,27	Espaldar de cuneta
K39+540,50	K39+598,20	57,70	0,930	0,11	Izquierda	5,90	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,41	Espaldar de cuneta
K39+634,70	K39+647,70	13,00	0,930	0,11	Izquierda	3,33	Placa de cuneta
			0,170	0,45		2,52	Espaldar de cuneta
K39+665,00	K39+687,40	22,40	0,930	0,11	Izquierda	2,29	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,71	Espaldar de cuneta
K39+694,20	K39+731,80	36,30	0,930	0,11	Izquierda	3,61	Placa de cuneta
			0,170	0,45		2,70	Espaldar de cuneta
K39+742,30	K39+757,90	15,60	0,930	0,11	Izquierda	1,59	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,19	Espaldar de cuneta
K39+773,30	K39+789,10	15,80	0,930	0,11	Izquierda	1,62	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,21	Espaldar de cuneta
K39+801,40	K39+885,50	84,10	0,930	0,11	Izquierda	5,53	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,14	Espaldar de cuneta
K39+865,50	K39+920,30	54,80	0,930	0,11	Izquierda	5,61	Placa de cuneta
			0,170	0,45		4,19	Espaldar de cuneta
K39+925,20	K39+973,70	48,50	0,930	0,11	Izquierda	4,96	Placa de cuneta
			0,170	0,45		3,71	Espaldar de cuneta
K39+981,70	K40+061,70	80,00	0,930	0,11	Izquierda	8,18	Placa de cuneta
			0,170	0,45		6,12	Espaldar de cuneta
K40+086,80	K40+095,60	8,80	0,930	0,11	Izquierda	0,90	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,67	Espaldar de cuneta
K40+099,40	K40+149,20	49,80	0,930	0,11	Izquierda	5,09	Placa de cuneta
			0,170	0,45		3,81	Espaldar de cuneta
K40+183,50	K40+214,60	31,10	0,930	0,11	Izquierda	3,18	Placa de cuneta
			0,170	0,45		2,38	Espaldar de cuneta
K40+262,50	K40+284,80	22,30	0,930	0,11	Izquierda	2,28	Placa de cuneta
			0,170	0,45		1,71	Espaldar de cuneta
K40+299,30	K40+396,40	97,10	0,930	0,11	Izquierda	9,93	Placa de cuneta
			0,170	0,45		7,43	Espaldar de cuneta
K40+404,10	K40+410,80	6,70	0,930	0,11	Izquierda	0,69	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,51	Espaldar de cuneta
CUNETAS IRREGULARES COSTADO IZQUIERDO							
K39+359,00	K39+361,86	2,86	1,050	0,11	Izquierda	0,33	Placa de cuneta
		2,50	0,370	0,17		0,17	Espaldar de cuneta
K39+361,86	K39+364,12	2,26	1,210	0,11	Izquierda	0,30	Placa sin espaldar
K39+364,12	K39+366,37	2,25	1,260	0,11	Izquierda	0,31	Placa sin espaldar
K39+366,37	K39+368,67	2,30	1,200	0,11	Izquierda	0,30	Placa sin espaldar
K39+368,67	K39+370,98	2,29	1,160	0,11	Izquierda	0,29	Placa sin espaldar
K39+370,98	K39+373,22	2,26	1,030	0,11	Izquierda	0,26	Placa sin espaldar
K39+373,22	K39+375,52	2,30	0,760	0,11	Izquierda	0,19	Placa sin espaldar
K39+375,52	K39+377,52	2,00	0,800	0,11	Izquierda	0,18	Placa sin espaldar
K39+377,52	K39+379,52	2,00	0,740	0,11	Izquierda	0,16	Placa sin espaldar
K39+382,00	K39+384,18	2,18	1,080	0,11	Izquierda	0,26	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,12	Espaldar de cuneta
K39+447,00	K39+449,21	2,21	0,690	0,11	Izquierda	0,17	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+449,21	K39+451,37	2,16	0,680	0,11	Izquierda	0,15	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+451,37	K39+453,63	2,26	0,780	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+536,00	K39+538,04	2,04	1,020	0,11	Izquierda	0,23	Placa sin espaldar
K39+538,04	K39+540,54	2,50	1,500	0,11	Izquierda	0,41	Placa de cuneta
		2,21	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+598,00	K39+600,26	2,26	1,240	0,11	Izquierda	0,31	Placa de cuneta
		2,43	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K39+600,26	K39+602,46	2,20	1,53	0,11	Izquierda	0,37	Placa sin espaldar
K39+602,46	K39+604,69	2,23	1,53	0,11	Izquierda	0,38	Placa sin espaldar
K39+604,69	K39+606,86	2,17	1,30	0,11	Izquierda	0,31	Placa sin espaldar
K39+606,86	K39+608,66	1,80	1,12	0,11	Izquierda	0,22	Placa sin espaldar
K39+608,66	K39+610,39	1,73	0,98	0,11	Izquierda	0,19	Placa sin espaldar
K39+610,39	K39+612,19	1,80	0,73	0,11	Izquierda	0,14	Placa sin espaldar
K39+612,19	K39+613,69	1,50	1,17	0,11	Izquierda	0,19	Placa sin espaldar

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2309202J-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM	93		UNIDAD
NPG 72	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1		M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO Nº 23							
K39+687,30	K39+689,13	2,13	0,800	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+689,13	K39+691,05	1,92	0,620	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
		1,86	0,170	0,45		0,14	Espaldar de cuneta
K39+691,05	K39+693,25	2,20	0,570	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+693,25	K39+695,61	2,36	0,730	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K39+731,50	K39+732,40	0,90	0,800	0,11	Izquierda	0,99	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,97	Espaldar de cuneta
K39+732,40	K39+734,40	2,00	1,430	0,11	Izquierda	0,31	Placa de cuneta
		2,16	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K39+734,40	K39+736,35	1,95	1,360	0,15	Izquierda	0,45	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K39+736,35	K39+738,40	2,05	2,08	0,20	Izquierda	0,85	Placa de cuneta
K39+738,40	K39+740,50	2,10	2,04	0,20	Izquierda	0,86	Placa de cuneta
K39+740,50	K39+742,56	2,06	2,04	0,20	Izquierda	0,84	Placa de cuneta
K39+789,00	K39+790,73	1,73	1,480	0,15	Izquierda	0,38	Placa de cuneta
		1,83	0,170	0,45		0,14	Espaldar de cuneta
K39+790,73	K39+792,78	2,05	2,07	0,20	Izquierda	0,85	placa sin espaldar
K39+792,78	K39+794,95	2,17	2,08	0,20	Izquierda	0,90	placa sin espaldar
K39+794,95	K39+797,04	2,09	2,07	0,20	Izquierda	0,87	placa sin espaldar
K39+797,04	K39+799,20	2,16	2,06	0,20	Izquierda	0,89	placa sin espaldar
K39+799,20	K39+801,22	2,02	1,050	0,15	Izquierda	0,31	Placa de cuneta
		1,83	0,170	0,45		0,12	Espaldar de cuneta
K39+855,00	K39+857,46	2,46	1,220	0,11	Izquierda	0,33	Placa de cuneta
		2,34	0,170	0,45		0,28	Espaldar de cuneta
K39+857,46	K39+859,56	2,10	1,62	0,11	Izquierda	0,37	placa sin espaldar
K39+859,56	K39+862,11	2,55	1,900	0,11	Izquierda	0,53	Placa de cuneta
		2,43	0,170	0,45		0,19	Espaldar de cuneta
K39+862,11	K39+864,60	2,49	1,030	0,11	Izquierda	0,28	Placa de cuneta
		2,26	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+810,00	K39+812,00	2,00	1,080	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
K39+812,00	K39+814,49	2,49	1,450	0,11	Izquierda	0,40	Placa de cuneta
		2,22	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+993,00	K39+993,78	0,78	0,930	0,11	Izquierda	0,08	Placa de cuneta
		0,78	0,170	0,45		0,06	Espaldar de cuneta
K39+993,78	K39+996,08	2,30	0,910	0,11	Izquierda	0,23	Placa de cuneta
		2,36	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K39+996,08	K39+998,11	2,03	0,760	0,11	Izquierda	0,17	Placa de cuneta
K39+998,11	K40+000,91	2,80	1,320	0,11	Izquierda	0,35	Placa de cuneta
		2,10	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+050,00	K40+050,76	0,76	0,960	0,11	Izquierda	0,08	Placa de cuneta
		0,76	0,170	0,45		0,06	Espaldar de cuneta
K40+050,76	K40+052,88	2,12	0,940	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
		2,15	0,170	0,45		0,16	Espaldar de cuneta
K40+052,88	K40+054,87	1,99	1,410	0,15	Izquierda	0,42	Placa de cuneta
		2,26	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K40+054,87	K40+056,93	2,06	2,100	0,20	Izquierda	0,87	Placa de cuneta
K40+056,93	K40+059,13	2,20	2,100	0,20	Izquierda	0,92	Placa de cuneta
K40+059,13	K40+061,03	1,90	2,050	0,20	Izquierda	0,78	Placa de cuneta
K40+061,03	K40+063,03	2,00	1,660	0,15	Izquierda	0,50	Placa de cuneta
K40+063,03	K40+065,31	2,28	1,230	0,10	Izquierda	0,28	Placa de cuneta
K40+065,31	K40+067,71	2,40	1,230	0,10	Izquierda	0,30	Placa de cuneta
K40+067,71	K40+070,05	2,34	1,230	0,10	Izquierda	0,29	Placa de cuneta
K40+095,00	K40+095,96	0,96	0,940	0,11	Izquierda	0,10	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,07	Espaldar de cuneta
K40+095,96	K40+097,23	1,27	0,850	0,11	Izquierda	0,12	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,10	Espaldar de cuneta
K40+097,23	K40+098,63	1,40	0,840	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,11	Espaldar de cuneta
K40+149,20	K40+149,83	0,63	0,940	0,11	Izquierda	0,07	Placa de cuneta
		0,56	0,170	0,45		0,04	Espaldar de cuneta
K40+149,83	K40+152,12	2,29	1,070	0,11	Izquierda	0,27	Placa de cuneta
		2,26	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K40+152,12	K40+154,09	1,97	1,310	0,11	Izquierda	0,28	Placa de cuneta
K40+154,09	K40+156,28	2,19	1,260	0,11	Izquierda	0,30	Placa de cuneta
K40+156,28	K40+158,28	2,00	1,220	0,11	Izquierda	0,27	Placa de cuneta
K40+158,28	K40+160,48	2,20	0,870	0,11	Izquierda	0,23	Placa de cuneta
		2,25	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K40+160,48	K40+162,49	2,01	0,910	0,11	Izquierda	0,20	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,15	Espaldar de cuneta
K40+162,49	K40+164,66	2,17	0,920	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+164,66	K40+167,21	2,55	2,230	0,11	Izquierda	0,63	Placa de cuneta
		1,80	0,170	0,37		0,10	Espaldar de cuneta
K40+167,21	K40+169,14	1,93	0,970	0,11	Izquierda	0,21	Placa de cuneta
K40+169,14	K40+171,10	1,96	0,900	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
K40+171,10	K40+173,29	2,19	0,820	0,11	Izquierda	0,20	Placa de cuneta
K40+173,29	K40+175,40	2,11	0,780	0,11	Izquierda	0,18	Placa de cuneta
K40+175,40	K40+176,45	1,05	0,770	0,11	Izquierda	0,09	Placa de cuneta
K40+175,45	K40+178,52	2,07	0,780	0,11	Izquierda	0,18	Placa de cuneta
K40+178,52	K40+180,37	1,85	0,790	0,11	Izquierda	0,16	Placa de cuneta
K40+183,00	K40+185,18	2,18	0,840	0,11	Izquierda	0,20	Placa de cuneta
		2,27	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+214,00	K40+214,81	0,81	0,766	0,11	Izquierda	0,07	Placa de cuneta
		0,88	0,170	0,45		0,07	Espaldar de cuneta
K40+214,81	K40+216,57	1,76	0,690	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
K40+216,57	K40+218,31	1,74	0,700	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
K40+218,31	K40+220,51	2,20	0,710	0,11	Izquierda	0,17	Placa de cuneta
K40+220,51	K40+222,71	2,20	0,680	0,11	Izquierda	0,16	Placa de cuneta
K40+222,71	K40+224,91	2,20	0,640	0,11	Izquierda	0,15	Placa de cuneta
K40+224,91	K40+227,13	2,22	0,500	0,11	Izquierda	0,12	Placa de cuneta

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	28032023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	23	UNIDAD
NPS T1	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1	M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO Nº 23							
K40+227,11	K40+229,35	2,22	0,470	0,11	Izquierda	0,11	Placa de cuneta
K40+229,35	K40+231,57	2,22	0,560	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
K40+231,57	K40+233,83	2,26	0,550	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
K40+233,83	K40+236,05	2,22	0,580	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
K40+236,05	K40+238,27	2,22	0,550	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
K40+238,27	K40+240,53	2,26	0,470	0,11	Izquierda	0,12	Placa de cuneta
K40+240,53	K40+242,77	2,24	0,460	0,11	Izquierda	0,11	Placa de cuneta
K40+242,77	K40+244,99	2,22	0,410	0,11	Izquierda	0,10	Placa de cuneta
K40+244,99	K40+247,20	2,21	0,360	0,11	Izquierda	0,09	Placa de cuneta
K40+247,20	K40+249,39	2,19	0,260	0,11	Izquierda	0,06	Placa de cuneta
K40+249,39	K40+251,53	2,14	0,470	0,11	Izquierda	0,11	Placa de cuneta
K40+251,53	K40+253,69	2,14	0,516	0,11	Izquierda	0,12	Placa de cuneta
K40+253,67	K40+255,88	2,21	0,700	0,11	Izquierda	0,17	Placa de cuneta
K40+255,88	K40+258,01	2,13	0,800	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
K40+258,01	K40+260,08	2,07	0,590	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
K40+260,08	K40+262,10	2,02	0,510	0,11	Izquierda	0,11	Placa de cuneta
K40+262,10	K40+264,12	2,02	0,590	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
K40+264,12	K40+266,30	2,18	0,730	0,11	Izquierda	0,18	Placa de cuneta
K40+266,30	K40+268,45	2,15	0,840	0,11	Izquierda	0,20	Placa de cuneta
K40+268,45	K40+270,65	2,20	0,940	0,11	Izquierda	0,23	Placa de cuneta
K40+270,65	K40+272,75	2,10	1,040	0,11	Izquierda	0,24	Placa de cuneta
K40+216,37	K40+218,79	2,22	0,960	0,11	Izquierda	0,23	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+206,00	K40+208,52	2,52	0,820	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
		1,40	0,170	0,45		0,11	Espaldar de cuneta
K40+205,52	K40+207,42	1,90	0,79	0,11	Izquierda	0,17	Placa de cuneta
K40+207,42	K40+209,42	2,00	0,99	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
K40+209,42	K40+211,48	2,06	0,99	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
K40+211,48	K40+213,75	2,27	1,00	0,11	Izquierda	0,25	Placa de cuneta
K40+213,75	K40+215,84	2,09	1,04	0,11	Izquierda	0,24	Placa de cuneta
K40+215,84	K40+217,98	2,14	0,95	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
K40+396,00	K40+398,25	2,25	1,130	0,11	Izquierda	0,28	Placa de cuneta
		2,27	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+398,25	K40+399,93	1,68	1,37	0,11	Izquierda	0,22	Placa de cuneta
K40+399,93	K40+401,59	1,66	1,46	0,11	Izquierda	0,27	Placa de cuneta
K40+401,59	K40+403,77	2,18	1,180	0,11	Izquierda	0,24	Placa de cuneta
		2,45	0,170	0,45		0,19	Espaldar de cuneta
K40+410,30	K40+412,45	2,65	1,040	0,11	Izquierda	0,13	Placa de cuneta
		1,66	0,170	0,45		0,11	Espaldar de cuneta
K40+412,45	K40+414,58	2,13	1,870	0,11	Izquierda	0,39	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+414,38	K40+416,40	1,82	2,47	0,11	Izquierda	0,49	
K40+416,40	K40+418,65	2,25	2,930	0,11	Izquierda	0,71	Placa de cuneta
		2,23	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
CUNETAS IRREGULARES COSTADO DERECHO							
K39+305,00	K39+305,83	0,83	0,960	0,11	Derecha	0,09	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,06	Espaldar de cuneta
K39+370,00	K39+372,30	2,30	1,400	0,11	Derecha	0,35	Placa de cuneta
		1,72	0,170	0,45		0,13	Espaldar de cuneta
K39+372,30	K39+374,50	2,20	0,920	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
		2,25	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+374,50	K39+375,20	0,70	0,550	0,11	Derecha	0,04	Placa de cuneta
		1,20	0,170	0,45		0,09	Espaldar de cuneta
K39+375,20	K39+377,30	2,10	3,81	0,11	Derecha	0,70	Placa de cuneta
K39+377,30	K39+380,40	3,10	2,86	0,11	Derecha	0,88	Placa de cuneta
K39+380,40	K39+381,33	0,93	0,820	0,11	Derecha	0,68	Placa de cuneta
		1,00	0,170	0,45		0,08	Espaldar de cuneta
K39+381,33	K39+383,50	2,17	0,820	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+383,50	K39+384,43	0,93	0,820	0,11	Derecha	0,08	Placa de cuneta
		1,00	0,170	0,45		0,08	Espaldar de cuneta
K39+384,43	K39+386,60	2,17	0,930	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
		2,17	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+386,60	K39+388,98	2,38	0,880	0,11	Derecha	0,23	Placa de cuneta
		2,25	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+792,00	K39+794,27	2,27	0,800	0,11	Derecha	0,20	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+794,27	K39+796,51	2,24	0,720	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+796,51	K39+798,65	2,14	0,900	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,16	Espaldar de cuneta
K39+457,00	K39+459,10	2,10	0,900	0,11	Derecha	0,21	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+459,10	K39+461,33	2,23	0,750	0,11	Derecha	0,21	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+461,33	K39+463,63	2,30	0,810	0,11	Derecha	0,15	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,13	Espaldar de cuneta
K39+463,63	K39+465,80	2,17	0,800	0,11	Derecha	0,13	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+528,00	K39+530,85	2,85	0,830	0,11	Derecha	0,24	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,22	Espaldar de cuneta
K39+530,85	K39+532,66	1,81	0,720	0,11	Derecha	0,14	Placa de cuneta
K39+532,66	K39+535,06	2,40	1,450	0,11	Derecha	0,38	Placa de cuneta
		2,26	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+599,00	K39+600,72	1,72	0,800	0,11	Derecha	0,15	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K39+685,00	K39+686,31	1,31	0,960	0,11	Derecha	0,14	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,16	Espaldar de cuneta
K39+686,31	K39+688,41	2,10	0,800	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
		2,19	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K39+688,41	K39+690,37	1,96	1,260	0,11	Derecha	0,27	Placa de cuneta
K39+690,37	K39+692,47	2,10	1,000	0,11	Derecha	0,23	Placa de cuneta
			0,170	0,37		0,13	Espaldar de cuneta
K39+850,00	K39+851,80	1,80	0,940	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
K39+851,80	K39+853,90	2,10	1,660	0,11	Derecha	0,38	Placa de cuneta
		2,38	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K39+916,00	K39+917,37	1,37	0,640	0,11	Derecha	0,10	Placa de cuneta
		1,92	0,170	0,45		0,15	Espaldar de cuneta

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29992623-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1991 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM:	93		UNIDAD
NP6 71	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO TRAMO 1		M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO Nº 23							
K39+980,00	K39+982,30	2,30	1,500	0,11	Derecha	0,39	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K39+982,30	K39+984,20	1,82	0,560	0,11	Derecha	0,11	Placa de cuneta
K39+984,20	K39+986,50	2,30	0,710	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+146,00	K40+148,30	2,30	0,680	0,11	Derecha	0,17	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+148,30	K40+150,10	1,80	0,420	0,11	Derecha	0,08	Placa de cuneta
K40+150,10	K40+152,30	2,20	1,360	0,11	Derecha	0,33	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,45		0,19	Espaldar de cuneta
K40+164,80	K40+166,26	2,26	0,800	0,11	Derecha	0,20	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K40+166,26	K40+168,46	2,20	0,950	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
K40+168,46	K40+170,62	2,16	0,960	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
K40+170,62	K40+172,81	2,19	1,040	0,11	Derecha	0,25	Placa de cuneta
K40+172,81	K40+174,96	2,15	0,860	0,11	Derecha	0,20	Placa de cuneta
K40+174,96	K40+177,11	2,15	0,800	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
K40+177,11	K40+179,29	2,18	0,910	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
K40+179,29	K40+181,41	2,12	0,860	0,11	Derecha	0,20	Placa de cuneta
K40+181,41	K40+183,64	2,23	0,730	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
		2,30	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+183,64	K40+185,81	2,17	0,770	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
		2,10	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+185,81	K40+187,98	2,17	0,780	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
		2,10	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+187,98	K40+190,16	2,18	0,800	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+190,16	K40+192,26	2,10	0,840	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
		2,12	0,170	0,45		0,16	Espaldar de cuneta
K40+215,80	K40+217,14	2,14	0,760	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
		2,28	0,170	0,37		0,13	Espaldar de cuneta
K40+217,14	K40+219,26	2,12	0,710	0,11	Derecha	0,17	Placa de cuneta
K40+219,26	K40+221,38	2,12	0,700	0,11	Derecha	0,16	Placa de cuneta
K40+221,38	K40+223,52	2,14	0,820	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
K40+223,52	K40+225,66	2,14	0,940	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
K40+225,66	K40+227,80	2,14	0,810	0,11	Derecha	0,19	Placa de cuneta
K40+227,80	K40+229,94	2,14	0,900	0,11	Derecha	0,21	Placa de cuneta
K40+229,94	K40+232,04	2,10	0,770	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
K40+232,04	K40+234,20	2,16	0,830	0,11	Derecha	0,20	Placa de cuneta
K40+234,20	K40+235,67	1,47	0,790	0,11	Derecha	0,13	Placa de cuneta
K40+235,67	K40+237,82	2,15	0,740	0,11	Derecha	0,18	Placa de cuneta
			0,170	0,37		0,14	Espaldar de cuneta
K40+237,82	K40+240,07	2,25	0,880	0,11	Derecha	0,22	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+240,07	K40+242,32	2,25	0,920	0,11	Derecha	0,23	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+242,32	K40+244,63	2,31	0,910	0,11	Derecha	0,23	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+244,63	K40+246,91	2,28	0,830	0,11	Derecha	0,21	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+246,91	K40+248,71	1,80	0,630	0,11	Derecha	0,12	Placa de cuneta
K40+254,00	K40+256,56	2,56	1,500	0,11	Derecha	0,44	Placa de cuneta
		2,28	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+319,00	K40+321,16	2,16	0,800	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+321,16	K40+323,26	2,10	0,590	0,11	Izquierda	0,14	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,16	Espaldar de cuneta
K40+323,26	K40+325,49	2,23	0,766	0,11	Izquierda	0,19	Placa de cuneta
			0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
K40+411,00	K40+412,12	1,12	0,966	0,11	Derecha	0,12	Placa de cuneta
			0,170	0,65		0,09	Espaldar de cuneta
K40+412,12	K40+414,40	2,28	1,120	0,11	Izquierda	0,28	Placa de cuneta
		2,34	0,170	0,45		0,18	Espaldar de cuneta
K40+414,40	K40+415,55	1,15	1,670	0,11	Derecha	0,21	Placa de cuneta
K40+415,55	K40+417,85	2,30	1,850	0,11	Izquierda	0,47	Placa de cuneta
		2,20	0,170	0,45		0,17	Espaldar de cuneta
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					374,3		


ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**374,30**
TOTAL ACUMULADO	374,3


ING. SEBASTIAN GOMEZ VERNARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIRADO CHIRIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23	




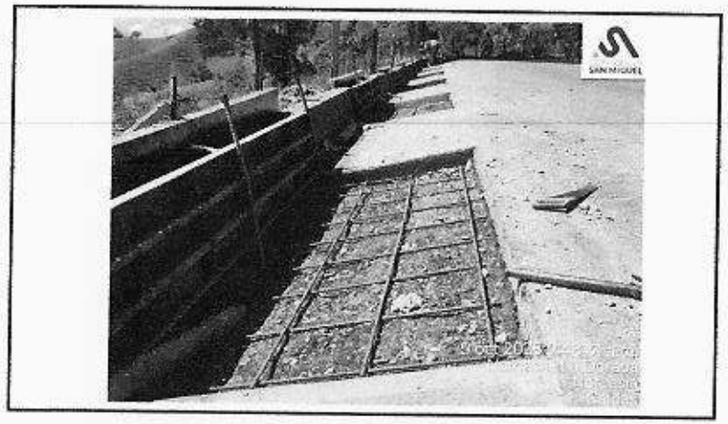


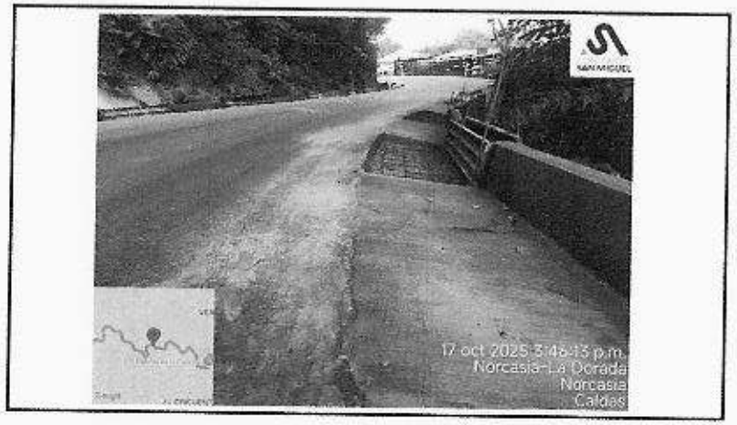



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23		

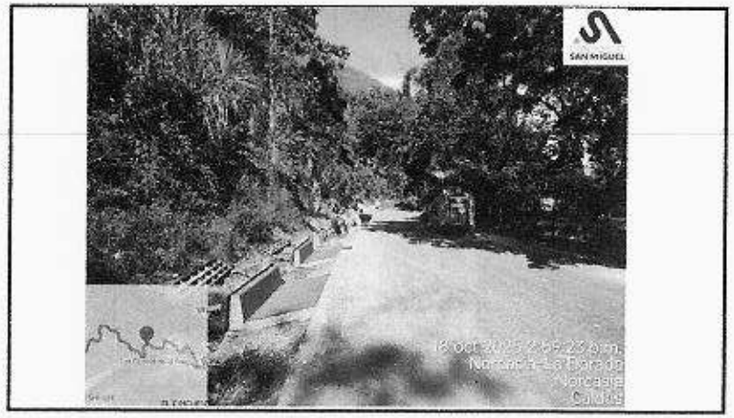

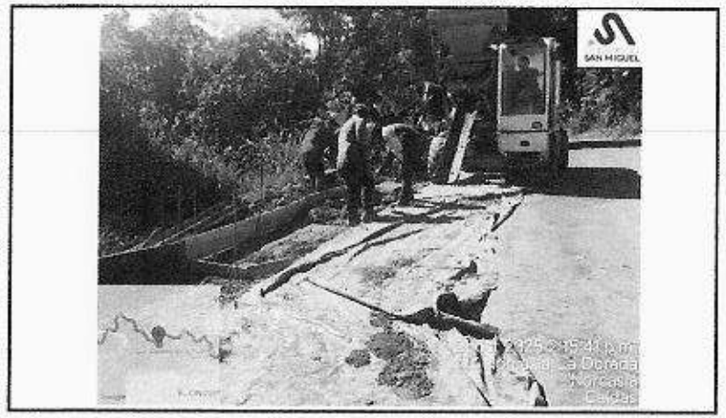







GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23		



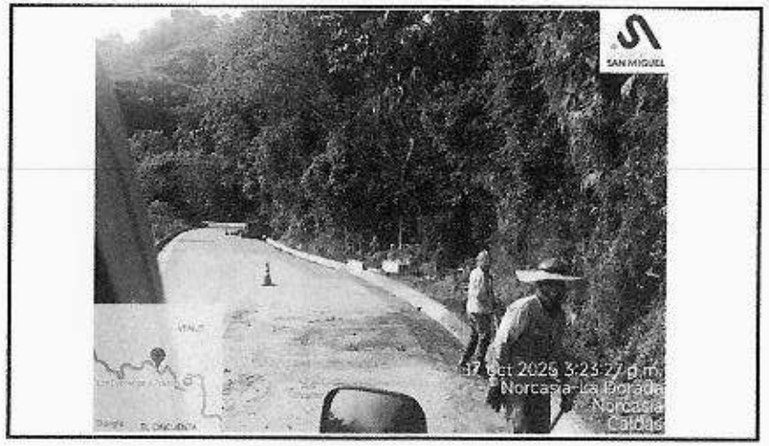

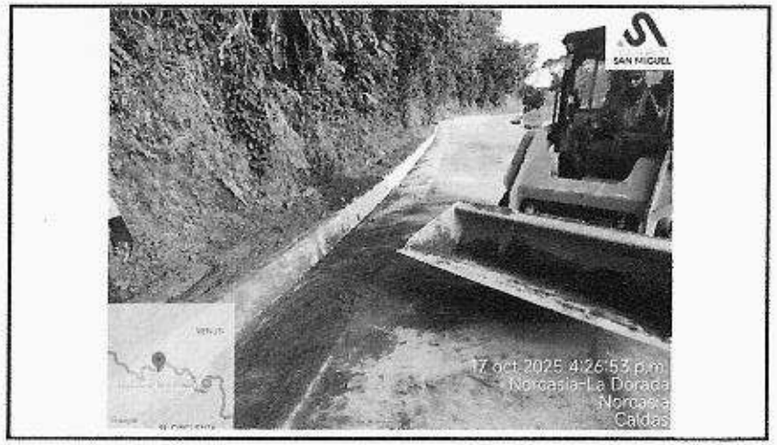





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23		

Obras de estabilización

EXCAVACION DE CUNETAS

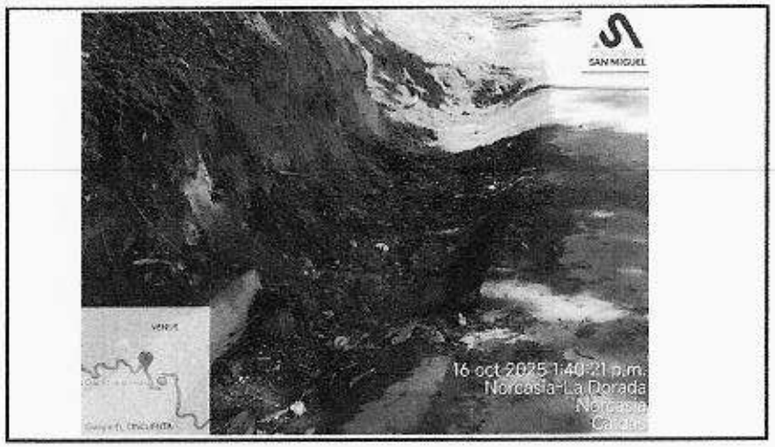



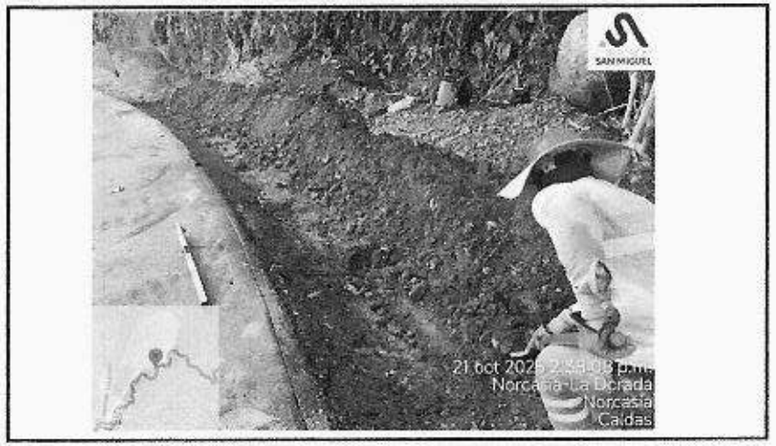



PRE-ACTA SUB TRAMO 3

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909020-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	5	UNIDAD
341,2 T1	BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFALTICA NATURAL BEMAN	m3


Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longo (m)	Area de sección		Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K25+600,00	K26+500,00	900,00			98,94	Ancho total de via	BEMAN instalada para renivelación geométrica. (Ver cartera topográfica"volúmen de BEMAN Subtramo 3 septiembre")
K25+600,00	K26+500,00	900,00			193,33	Ancho total de via	BEMAN instalada para renivelación geométrica. (Ver cartera topográfica"volúmen de BEMAN Subtramo 3 Octubre")
K26+881,00	K26+881,00	8,00	2,40	0,20	4,03	IZQUIERDO	Estructura de pavimentoo en llano de xuro
K26+215,00	K26+234,00	19,00	1,00	0,60	5,94	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+260,00	K26+276,00	16,00	1,00	0,60	4,80	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+292,00	K26+299,23	7,23	1,00	0,60	2,17	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+685,00	K26+700,00	15,00	0,80	0,30	1,80	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+696,00	K26+699,55	3,55	0,80	0,30	0,43	IZQUIERDO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+717,00	K26+723,43	6,43	0,80	0,30	0,77	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+725,00	K26+737,27	12,27	0,90	0,60	3,31	DERECHO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+800,00	K26+812,20	12,20	1,10	0,92	6,17	IZQUIERDO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+826,00	K26+860,60	34,60	1,00	0,50	8,65	IZQUIERDO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
K26+966,00	K26+991,70	25,70	1,00	0,50	6,43	IZQUIERDO	material para reemplazo en fallos (50%sub base granular, 50% BEMAN)
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				247,86			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**247,8**
TOTAL ACUMULADO	247,86


ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA


K26+500




K26+510




K26+520




K26+530




K26+540




K26+550




K26+560




K26+570




K26+580



K26+590




K26+600




K26+610




K26+620



K26+630



K26+640



UBICACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INGENIERIA DE VALOR

DIBUJÓ: A.P.C.

REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3


ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE 4

FECHA: SEP 2025

ARCHIVO:


K26+650




K26+660




K26+670




K26+680



K26+690




K26+700



K26+710




K26+720



K26+730




K26+740




K26+750



K26+760



K26+770



K26+780



K26+790





INGENIERÍA DE VALOR

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 — PK27+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 2 DE 4


FECHA: SEP 2025

ARCHIVO:


K26+800




K26+810




K26+820




K26+830




K26+840




K26+850




K26+860




K26+870




K26+880




K26+890




K26+900



K26+910




K26+920



K26+930



K26+940



UBICACIÓN

Número de calzadas	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	5.00 m
Bombeo carretera	=	2.0 m
Peralte máximo	=	6 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

USO DEL SUELO

UNIDADES

Adoquín roca	Arena
Arena fina	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso


NOTAS

1. Las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra cosa.
2. Las cotas de diseño están expresadas en metros sobre el nivel del mar.
3. Las medidas de las partes expresadas en los planos en diferentes escalas no podrán ser tomadas directamente a escala de los mismos.
4. Antes de iniciar la obra el contratista deberá revisar las cotas de terreno dadas en topografía y en estos indicadas en los planos de construcción.
5. Para ampliar el detalle la ubicación de las obras por favor remitirse en el presente plano, en conjunto conforme a cada una de las láminas y planos localizar correspondientes.


REFERENCIAS

DISEÑÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BIEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 3 DE 4		
					FECHA: SEP 2025	ARCHIVO:	


K26+950




K26+960




K26+970




K26+980



K26+990



K27+000



UBICACIÓN

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA


GEOLOGÍA

NOTAS

REFERENCIAS

	INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 4 DE 4
							FECHA: SEP 2025	ARCHIVO:


K25+600




K25+610



K25+620




K25+630



K25+640




K25+650




K25+660



K25+670




K25+680




K25+690




K25+700




K25+710



K25+720



K25+730



K25+740



UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA VÍA

Número de calzadas	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	3.05 m
Bombeo calzada	=	3.0 %
Pendiente transversal	=	4 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

OBSTÁCULOS

PROCESOS EXISTENTES

PROCESOS DE RECIENTE OCURRENCIA

TIPOLOGÍA

Altimetría roca	Arena
Arena fina	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso


NOTAS

1. Las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra cosa.
2. Las cotas de diseño están expresadas en metros sobre el nivel del mar (msnm).
3. Las longitudes en los perfiles corresponden a las medidas en planta.
4. El diseño estructural definitivo o ingeniería de detalle es responsabilidad del contratista.
5. Antes de iniciar la obra el contratista deberá revisar las cotas de terreno dadas en campo y la existencia de cotas intermedias en los planos de construcción.
6. Para conocer la ubicación y longitud de las obras por kilómetros ver el presente diseño, la numeración a cada una de las obras y planos finales correspondientes.


REFERENCIAS

			DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE 10
							FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:

K25+750




K25+760



K25+770




K25+780




K25+790




K25+800




K25+810




K25+820




K25+830




K25+840




K25+850



K25+860




K25+870



K25+880



K25+890




CONVENCIONES

NOTAS


REFERENCIAS

	INGENIERÍA DE VALOR	DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 2 DE 10
					FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:


K25+900




K25+910



K25+920



K25+930



K25+940



K25+950



K25+960




K25+970




K25+980



K25+990




K26+000



K26+010




K26+020



K26+030



K26+040





UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA VÍA

Número de carriles	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Bermas cuneta	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	6 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

SECCIONES


NOTAS

1. Las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra unidad.
2. Las cotas de diseño están expresadas en metros sobre el nivel del mar.
3. Las longitudes de las curvas corresponden a las medidas en planta, medidas desde el principio hasta el final de la curva.
4. El contratista deberá verificar todas las medidas en campo antes de iniciar cualquier trabajo.
5. Antes de iniciar la obra el contratista deberá realizar las cotas de terreno desde un benchmark y las cotas definidas en los planos de construcción.
6. Para cualquier duda o inquietud de los items que aparezcan en el presente plano, se deberán consultar o dar aviso a los diseñadores y planos topográficos correspondientes.


REFERENCIAS

CONTRATANTE:	INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIÓN:	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISIONES	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000	PLANOS 3 DE 10
	INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL					FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:


K26+050



K26+060




K26+070




K26+080




K26+090




K26+100




K26+110



K26+120




K26+130



K26+140



K26+150



K26+160



K26+170



K26+180




K26+190






DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000
			PLANOS 4 DE 10
			FECHA: OCT 2025
			ARCHIVO:


K26+350




K26+360




K26+370




K26+380




K26+390




K26+400




K26+410




K26+420




K26+430



K26+440




K26+450




K26+460



K26+470



K26+480



K26+490



LOCALIZACIÓN



CONVENCIONES



NOTAS


REFERENCIAS

DISEÑÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H:1000	PLANOS 6 DE 10	
			FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:	


K26+500



K26+510




K26+520



K26+530



K26+540




K26+550




K26+560




K26+570




K26+580




K26+590




K26+600




K26+610




K26+620



K26+630



K26+640







INTERVENTORÍA: M2B INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: CONCESIÓN SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000
					FECHA: OCT 2025

PLANOS 7 DE 10

ARCHIVO:

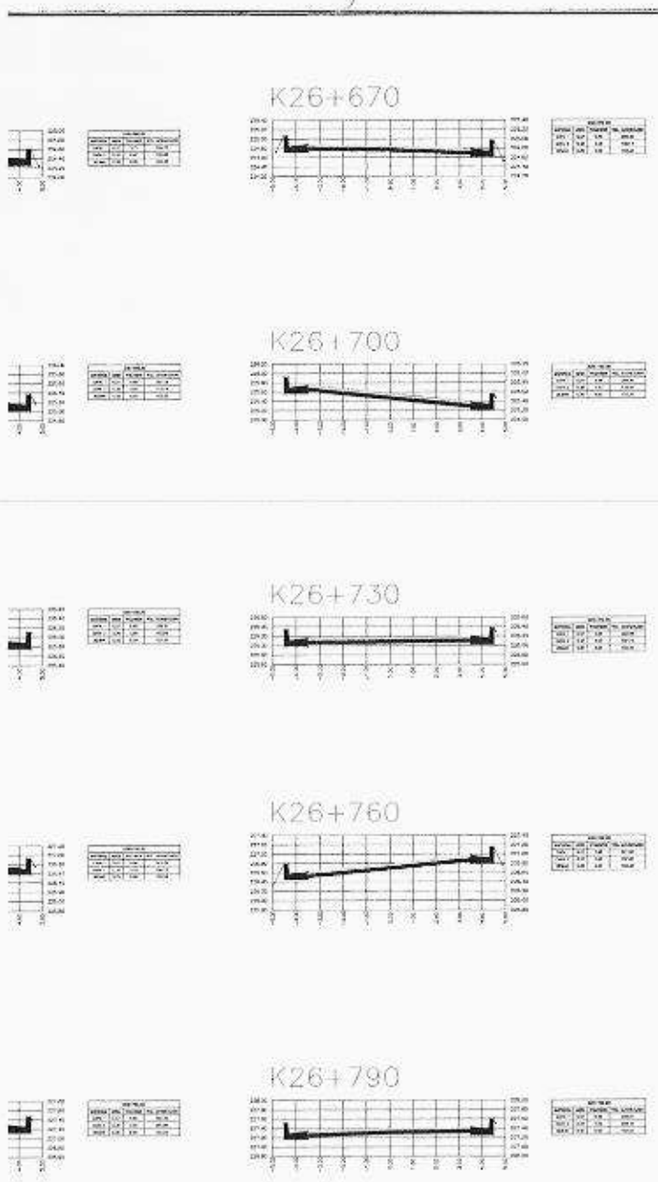
K26+670
K26+700
K26+730
K26+760
K26+790
LOCALIZACION
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA
CONVENCIONES
PLANTA
PERFIL
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION
LITOLOGIA
NOTAS
REFERENCIAS
PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK23+320 - PK27+000
CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
BEMAN
SUBTRAMO 3
ESCALA:
V: 100
H: 1000
PLANOS 8 DE 10
FECHA:
OCT 2025
ARCHIVO:


K26+800




K26+810



K26+820



K26+830




K26+840




K26+850




K26+860




K26+870




K26+880




K26+890



K26+900



K26+910



UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA VÍA

Número de calzadas	=	2
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	3.65 m
Berma cuneta	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	8 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

GEOLOGÍA

Afloración roca	Arena
Arena fina	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso


NOTAS

1. Las medidas están dadas en metros y cotas que se indican sobre cada una.
2. Las cotas de diseño están referenciadas al nivel sobre el que son dadas.
3. Las pendientes de los perfiles longitudinales y las cuentas de planta, están definidas mediante el trazado y replanteo en el eje de diseño.
4. Antes de iniciar la obra el contratista deberá revisar la cota de terreno dada en localidad de referencia y las cotas de los planos de sección.
5. Para cualquier duda o falta de claridad en los datos que intervienen en el proceso diseño, se consultará inmediato a cada uno de los diseños y planos técnicos correspondientes.

REFERENCIAS

CONCESIÓN	INTERVENTORÍA	CONSTRUCTORA	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 9 DE 10	
	m2B INGENIERÍA DE VALOR	CONSORCIO SAN MIGUEL						FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:	


K26+920




K26+930



K26+940



K26+950




K26+960



K26+970




K26+980



K26+990



K27+000



CONVENCIONES

NOTAS

1. Las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra unidad.
2. Las cotas de diseño están referenciadas al centro sobre el eje del eje.
3. Los taludes en los perfiles corresponden a los medidos en planta.
4. El talud direccional derecho e izquierdo corresponde al talud del diseñador.
5. Antes de iniciar la obra el contratista deberá validar las cotas de terreno dadas en localidad de referencia y las cotas indicadas en los planos de construcción.
6. Para cualquier modificación de la localidad de los ítems que identifican en el presente diseño, se recomienda consultar a cada uno de los diseñadores y planos localizados correspondientes.

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: CONSORCIO SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.G.	REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK23+320 – PK27+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES BEMAN SUBTRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 10 DE 10	
						FECHA: OCT 2025	ARCHIVO:	

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	25 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1691 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	14					UNIDAD
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
ón cuneta costado izquierdo							
K26+681,00	K26+580,00	98,00	1,00	0,08	7,84		
K26+580,00	K26+490,00	89,30	1,00	0,08	7,14		Demolición cuneta costado izquierdo
K26+470,00	K26+448,00	14,50	1,00	0,08	1,16		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+448,00	K26+365,00	81,00	1,00	0,08	6,48		Demolición cuneta costado izquierdo
K26+365,00	K26+242,00	120,00	1,00	0,08	9,60		Demolición cuneta costado izquierdo
K26+242,00	K26+076,00	162,00	1,00	0,08	12,96		Demolición cuneta costado izquierdo
K26+076,00	K25+981,00	92,00	1,00	0,08	7,36		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+981,00	K25+921,00	56,00	1,00	0,08	4,48		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+921,00	K25+821,00	98,50	1,00	0,08	7,88		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+821,00	K25+739,00	69,00	1,00	0,08	5,52		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+739,00	K26+641,00	98,50	1,00	0,08	6,80		Demolición cuneta costado izquierdo
K5+641,00	K25+521,00	86,60	1,00	0,08	7,73		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+521,00	K25+429,00	72,00	1,00	0,08	5,76		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+429,00	K25+357,00	67,50	1,00	0,08	5,40		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+357,00	K25+301,00	53,50	1,00	0,08	4,28		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+301,00	K25+098,00	202,30	1,00	0,08	16,18		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+098,00	K25+066,00	29,30	1,00	0,08	2,34		Demolición cuneta costado izquierdo
K25+066,00	K24+982,00	82,00	1,00	0,08	6,56		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+963,00	K24+896,00	60,00	1,00	0,08	4,80		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+896,00	K24+860,00	23,60	1,00	0,08	1,89		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+860,00	K24+738,00	128,00	1,00	0,08	10,24		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+738,00	K24+706,00	32,00	1,00	0,08	2,56		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+706,00	K24+664,00	39,00	1,00	0,08	2,40		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+664,00	K24+634,00	19,00	1,00	0,08	1,52		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+634,00	K24+584,00	33,00	1,00	0,08	2,64		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+584,00	K24+550,00	24,00	1,00	0,08	1,92		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+550,00	K24+540,00	13,50	1,00	0,08	1,08		Demolición cuneta costado izquierdo
K24+540,00	K24+491,00	46,30	1,00	0,08	3,70		Demolición cuneta costado izquierdo
ión cuneta costado derecho							
K24+870,00	K24+738,00	128,20	1,00	0,08	10,26		Demolición cuneta costado derecho
K24+738,00	K24+700,00	31,50	1,00	0,08	2,52		Demolición cuneta costado derecho
K24+700,00	K24+664,00	35,70	1,00	0,08	2,86		Demolición cuneta costado derecho
K24+664,00	K24+634,00	20,00	1,00	0,08	1,60		Demolición cuneta costado derecho
K24+634,00	K24+584,00	56,40	1,00	0,08	4,51		Demolición cuneta costado derecho
K24+584,00	K24+556,00	22,50	1,00	0,08	1,80		Demolición cuneta costado derecho
K24+556,00	K24+540,00	21,10	1,00	0,08	1,69		Demolición cuneta costado derecho
K24+540,00	K24+491,00	37,40	1,00	0,08	2,99		Demolición cuneta costado derecho
K26+760,00	K26+760,00	1,80	1,85	0,4	1,33		Demolición de Alcantarilla
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				287			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**187,0**
TOTAL ACUMULADO	187,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHIVIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909267S-1436	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM	15		UNIDAD
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS		m

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
826+760,00	K26+760,00	-1,85			-1,85		Descuento ya que la longitud real de remoción de alcantarilla de 30" es de 9,3 m y la longitud que se reportó en el acta anterior es de 11,15m
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-2,0			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	92,60
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	0,60
ACTA PARCIAL NO. 19	0,60
ACTA PARCIAL NO. 20	35,60
ACTA PARCIAL NO. 21	0,60
ACTA PARCIAL NO. 22	35,60
ACTA PARCIAL NO. 23	**-2,00**
TOTAL ACUMULADO	160,60

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAZA CRITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2809CO23-1486	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16	UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Alto(m)	Ancho (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
FILTROS SUBTRAMO 3							
K24+870,00	K24+738,80	128,20	1,24	0,60	95,38	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+738,80	K24+700,00	31,50	1,24	0,60	23,44	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+700,00	K24+664,00	35,70	1,24	0,60	26,56	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+664,00	K24+634,00	29,80	1,24	0,60	14,88	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+634,00	K24+584,00	50,40	1,24	0,60	4,96	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+584,00	K24+556,00	22,50	1,24	0,60	16,74	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+556,00	K24+540,00	21,10	1,24	0,60	15,70	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+540,00	K24+491,00	37,40	1,24	0,60	27,83	DERECHO	EXCAVACION DE FILTRO
K24+760,00	K24+760,00	9,30	1,55	2,30	33,15	DERECHO	ALCANTARILLA SUSPENDIDA
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				295,6			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	739,43
ACTA PARCIAL NO. 22	913,29
ACTA PARCIAL NO. 23	**295,6**
TOTAL ACUMULADO	1968

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIRADO CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	34					UNIDAD
673.2 21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
FILTROS							
K24+870	K24+738	128,00	0,60	1,00	76,80	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		128,00	-3,14	0,06	-1,22	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+738	K24+700	31,50	0,60	1,00	18,90	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		31,50	-3,14	0,06	-0,30	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+700	K24+654	38,70	0,60	1,00	23,42	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		38,70	-3,14	0,06	-0,34	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+864	K24+634	20,00	0,66	1,00	12,80	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		20,00	-3,14	0,06	-0,19	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+634	K24+584	56,40	0,60	1,00	33,84	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		56,40	-3,14	0,06	-0,54	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+584	K24+556	22,50	0,60	1,00	13,50	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		22,50	-3,14	0,06	-0,21	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+556	K24+540	21,10	0,60	1,00	12,66	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		21,10	-3,14	0,06	-0,20	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
K24+540	K24+491	37,40	0,60	1,00	22,44	DERECHO	MATERIAL GRANULAR EN FILTRO LONGITUDINAL
		37,40	-3,14	0,06	-0,36	DERECHO	DESCUENTO DE TUBERIA PERFORADA DE 4"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				208,2			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	576,99
ACTA PARCIAL NO. 22	606,03
ACTA PARCIAL NO. 23	**208,2**
TOTAL ACUMULADO	1391

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 1	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	37						UNIDAD
673.3.3 T1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-20						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K24+879,00	K24+938,60	128,20	0,60	0,15	11,54	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+938,80	K24+980,00	31,50	0,60	0,15	2,84	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+780,00	K24+664,00	35,70	0,60	0,15	3,21	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+664,00	K24+634,00	20,00	0,60	0,15	1,80	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+634,00	K24+584,00	56,40	0,60	0,15	5,08	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+584,00	K24+556,00	22,50	0,60	0,15	2,03	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+556,00	K24+540,00	21,10	0,60	0,15	1,90	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
K24+540,00	K24+491,00	37,40	0,60	0,15	3,37	DERECHO	MATERIAL DE COBERTURA
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				31,8			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	67,90
ACTA PARCIAL NO. 22	92,40
ACTA PARCIAL NO. 23	**31,80**
TOTAL ACUMULADO	212,1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	23092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	39	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K24+878,00	K24+738,00	128,20	3,20		410,24	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+738,00	K24+700,00	31,50	3,20		100,80	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+700,00	K24+664,00	35,70	3,20		114,24	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+664,00	K24+634,00	20,00	3,20		64,00	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+634,00	K24+584,00	56,40	3,20		180,48	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+584,00	K24+556,00	22,50	3,20		72,00	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+556,00	K24+540,00	21,10	3,20		67,52	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+540,00	K24+491,00	37,40	3,20		119,68	DERECHO	FILTRO DRENANTE
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				1129			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	3127,00
ACTA PARCIAL NO. 22	3284,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**1129,00**
TOTAL ACUMULADO	7540,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORÍA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	HAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	40	UNIDAD
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K24+870,00	K24+738,00	128,20			128,20	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+738,00	K24+700,00	31,50			31,50	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+700,00	K24+664,00	35,70			35,70	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+664,00	K24+634,00	20,00			20,00	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+634,00	K24+584,00	56,40			56,40	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+584,00	K24+556,00	22,50			22,50	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+556,00	K24+540,00	21,10			21,10	DERECHO	FILTRO DRENANTE
K24+540,00	K24+491,00	37,40			37,40	DERECHO	FILTRO DRENANTE
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				352,8			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	977,30
ACTA PARCIAL NO. 22	1026,30
ACTA PARCIAL NO. 23	**352,80**
TOTAL ACUMULADO	2356,4

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
HAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1496	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	71						UNIDAD
NP421.1 T1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR -1 T1						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho	Espesor	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K26+200	K27+000	800,00	3,50		2800	IZQUIERDO	riego de liga segunda capa
K26+200	K27+000	550,00	3,50		1925	DERECHO	Segunda capa costado derecho, total 2Okm. Se dejan pendientes 250 m debido a que tienen observaciones en cuanto a espesores y ensayos de calidad
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				4725,0			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**4725**
TOTAL ACUMULADO	4725,00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SOBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2392023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	72	UNIDAD
NP 461P	RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EXISTENTES IN SITU SIN ADICIÓN DE MATERIAL CEMENTANTE	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho	Espesor	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K24+500	K27+000	2500,00	7,30	0,20	3650,0		Reciclado de capas existentes
K26+215,00	K26+234,00	19,00	1,00	-0,20	-4,0		descuento por retiro de fallo
K26+260,00	K26+276,00	16,00	1,00	-0,20	-3,2		descuento por retiro de fallo
K26+292,00	K26+299,23	7,23	1,00	-0,20	-1,4		descuento por retiro de fallo
K26+685,00	K26+700,00	15,00	0,80	-0,20	-2,4		descuento por retiro de fallo
K26+696,00	K26+699,55	3,55	0,80	-0,20	-0,6		descuento por retiro de fallo
K26+717,00	K26+723,43	6,43	0,80	-0,20	-1,0		descuento por retiro de fallo
K26+725,00	K26+737,27	12,27	0,80	-0,20	-2,2		descuento por retiro de fallo
K26+800,00	K26+812,20	12,20	1,10	-0,20	-2,7		descuento por retiro de fallo
K26+826,00	K26+860,60	34,60	1,00	-0,20	-6,9		descuento por retiro de fallo
K26+866,00	K26+991,70	25,70	1,00	-0,20	-5,1		descuento por retiro de fallo
K2+688,00	K26+800,00	8,40	2,40	-0,20	-4,0		Descuento por lleno de muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				3616,4			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**3616,4**
TOTAL ACUMULADO	3616,40

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBSANO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29052023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1097 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	11	UNIDAD
N°450.22 T1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ASFALTO MODIFICADO TIPO 3 - COMPRA DE MEZCLA TRAMO 1	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho	Espesor	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K26+200	K27+000	800,00	3,55	0,08	227	IZQUIERDO	Mezcla primera capa
K26+200	K27+000	800,00	3,55	0,08	227	DERECHA	Mezcla primera capa
K26+200	K27+000	800,00	3,50	0,05	140	IZQUIERDO	Mezcla segunda capa
K25+200	K27+000	560,00	3,50	0,05	96	DERECHO	Segunda capa costado derecho, total 900m. Se dejan pendientes 250 m debido a que tienen observaciones en cuanto a espesores y ensayos de calidad
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				690,7			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**691**
TOTAL ACUMULADO	690,70

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	76	UNIDAD
HP 610.3 T1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 TRAMO 1	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
EXCAVACIÓN DE FALLOS EN VÍA							
K26+213,00	K26+234,80	19,80	1,00	0,60	5,94	IZQUIERDO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+260,00	K26+276,00	16,00	1,00	0,60	4,80	IZQUIERDO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+292,00	K26+299,23	7,23	1,00	0,60	2,17	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+685,00	K26+700,00	15,00	0,80	0,30	1,80	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+696,00	K26+699,55	3,55	0,80	0,30	0,43	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+717,00	K26+723,43	6,43	0,80	0,30	0,77	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+725,00	K26+737,27	12,27	0,90	0,60	3,31	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+800,00	K26+812,20	12,20	1,10	0,62	8,17	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+826,00	K26+860,60	34,60	1,00	0,50	8,65	IZQUIERDO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
K26+966,00	K26+991,70	25,70	1,00	0,50	6,43	DERECHO	Material para reemplazo en fallas (50%sub base granular, 50% BEMAX)
SUBTOTAL ACTA PARCIAL 23				40,5			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	40,50
TOTAL ACUMULADO	40,5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOHN [illegible] ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBZRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2930202J-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	80	UNIDAD
NS-210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Total	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23							
EXCAVACION DE FALLOS EN VÍA							
K26+215,00	K26+234,80	19,80	1,00	0,60	11,88	IZQUIERDO	Cajeo para retiro de fallos
K26+260,00	K26+276,00	16,00	1,00	0,60	9,60	IZQUIERDO	Cajeo para retiro de fallos
K26+292,00	K26+299,23	7,23	1,00	0,60	4,34	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+685,00	K26+700,00	15,00	0,80	0,30	3,60	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+696,00	K26+699,55	3,55	0,80	0,30	0,85	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+717,00	K26+723,43	6,43	0,80	0,30	1,54	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+725,00	K26+731,27	12,27	0,90	0,60	6,63	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+800,00	K26+812,20	12,20	1,10	0,92	12,11	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
K26+826,00	K26+860,60	34,60	1,00	0,50	17,30	IZQUIERDO	Cajeo para retiro de fallos
K26+866,00	K26+881,70	15,70	1,00	0,50	12,81	DERECHO	Cajeo para retiro de fallos
SUB TOTAL ACTA PARCIAL No. 23					90,9		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**80,90**
TOTAL ACUMULADO	80,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO PIRAZA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No. 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REANACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS.

PREACTA DE OBRA No:	23 - SUBTRAMO 3	FECHA:	31/10/2025
PERIODO:	; AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29032023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	96	UNIDAD
NP 7	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA LA INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA SOBRE CAPAS DE RECICLADAS CON ASFALTO NATURAL TRAMO 1	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho	Espesor	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K26+200,00	K27+000,00	800,00	7,10		5680	Calzada completa	riego de liga primera capa
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				5680			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**5680**
TOTAL ACUMULADO	5680,00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO IIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23

FRESADO












GOBERNACIÓN DE CALDAS		
GOBIERNO DE CALDAS	Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23		

FRESADO

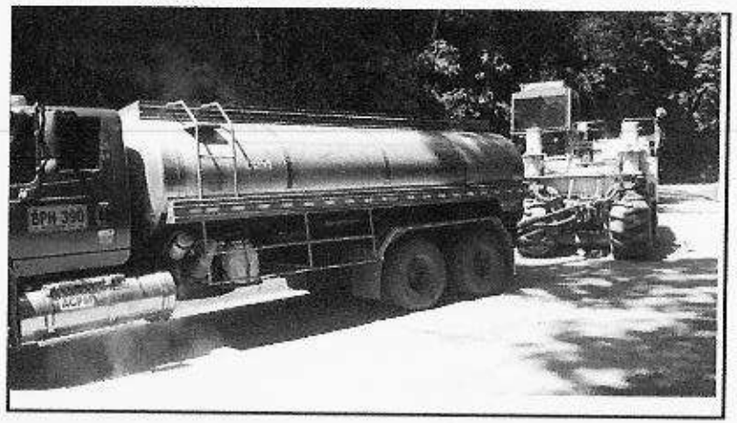




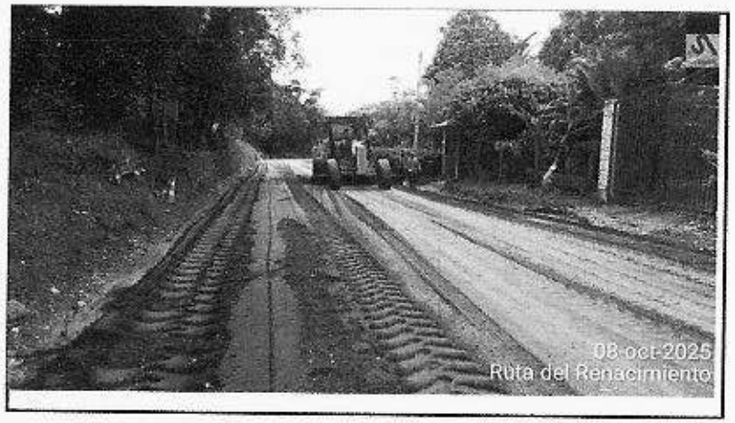

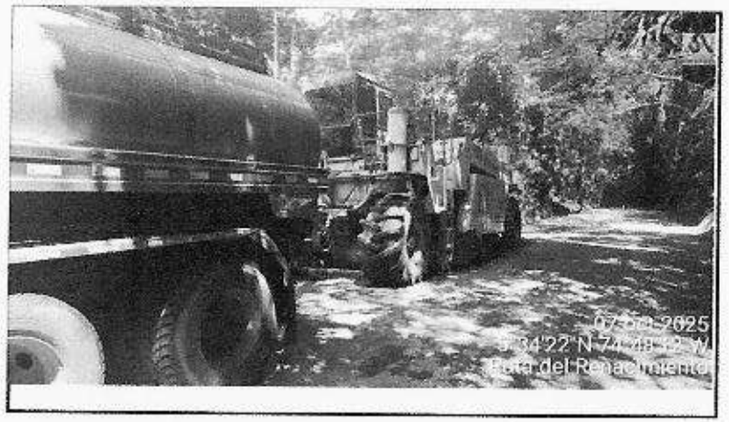

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO – 2500203-1456	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23

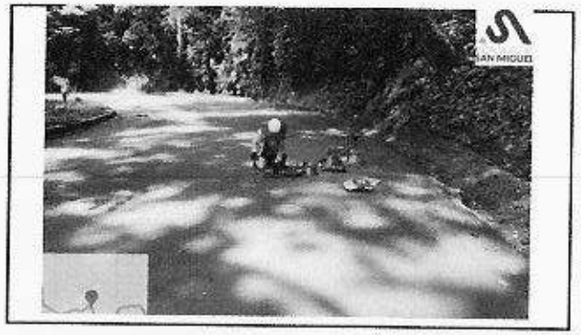









GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23		


Capitulo 8 Obras no previstas

INTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

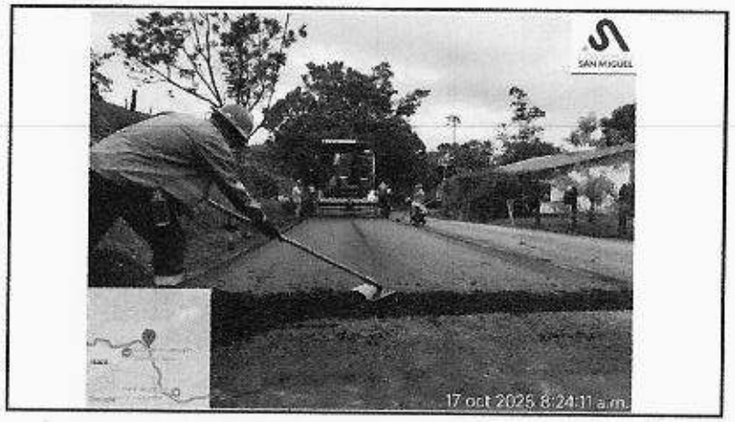



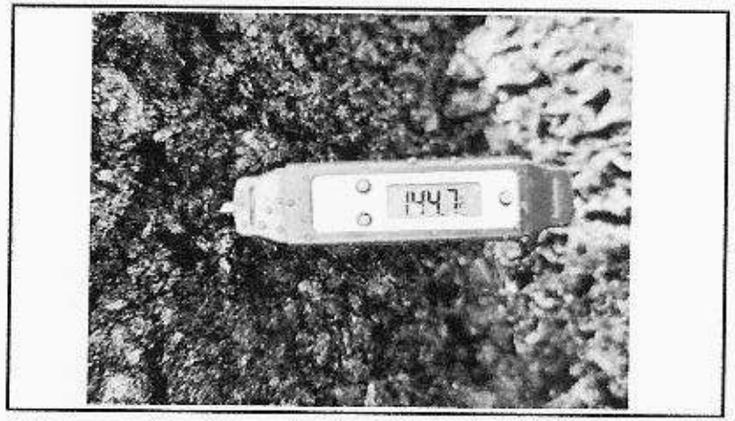


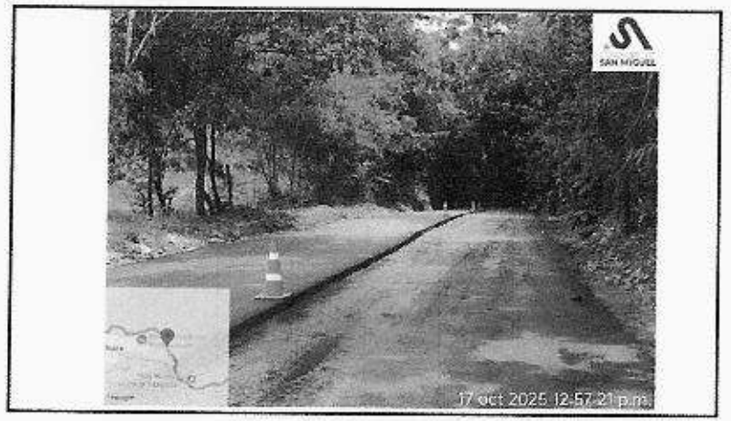



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA N°23	

Capitulo 8 Obras no previstas

INTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

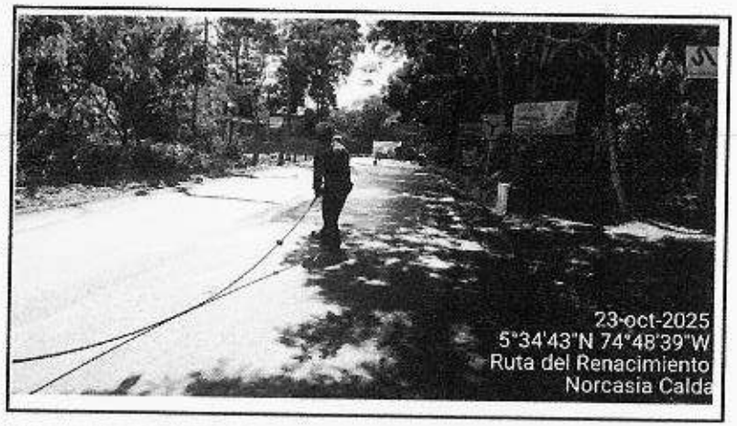

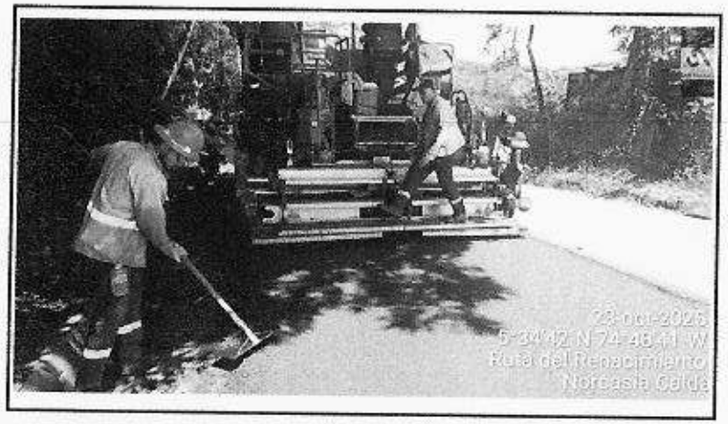

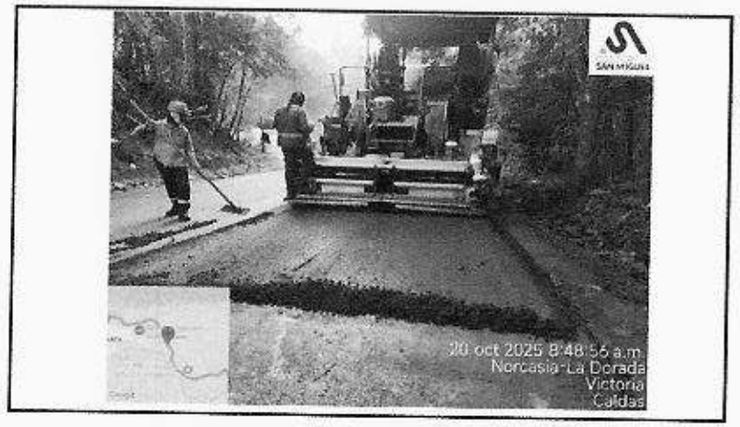



PRE-ACTA TRAMO 3

	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29052023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	16	UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23		

ALCANTARILLAS							
K98+085	K98+085	3,00	2,00	1,95	I	11,70	Excavación caja encole
K98+095	K98+095	4,00	1,50	2,55	D	15,30	Excavacion de estructura descole aletas
		6,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+160	K98+160	3,00	2,05	2,80	I	17,22	Excavación caja encole
K98+160	K98+160	4,60	2,47	1,30	D	14,77	Excavacion de estructura descole aletas
		6,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+400	K98+400	1,46	1,70	1,30	D	7,65	Excavacion de estructura descole aletas
		3,46	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+500	K98+500	4,70	1,70	1,30	D	10,39	Excavacion de estructura descole aletas
		6,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+610	K98+610	3,80	1,30	2,13	I	16,34	Excavacion de estructura descole aletas
		4,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+670	K98+670	3,70	2,52	1,30	D	12,12	Excavacion de estructura descole aletas
		4,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon
K98+920	K98+920	4,70	2,40	1,30	D	14,66	Excavacion de estructura descole aletas
		6,34	0,25	0,35	D	0,38	Excavacion de dentellon

FILTROS							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Maryan	Cantidad	Descripción
K97+294	K98+085	92,00	0,50	0,80	I	36,40	Excavación filtros
K98+092	K98+160	68,00	0,50	0,80	I	27,20	Excavación filtros
K98+161	K98+238	77,35	0,50	0,80	I	30,24	Excavación filtros
K98+254	K98+269	15,30	0,50	0,80	I	6,12	Excavación filtros
K98+272	K98+362	89,50	0,50	0,80	I	35,80	Excavación filtros
K98+503	K98+603	100,00	0,50	0,80	I	40,00	Excavación filtros
K98+613	K98+668	55,00	0,50	0,80	I	22,00	Excavación filtros
K99+065	K99+126	61,00	0,50	0,80	I	24,40	Excavación filtros
K99+140	K99+213	73,00	0,50	0,80	I	29,20	Excavación filtros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				374,80			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	155,53
ACTA PARCIAL NO. 7	201,23
ACTA PARCIAL NO. 8	356,93
ACTA PARCIAL NO. 9	438,30
ACTA PARCIAL NO. 10	627,70
ACTA PARCIAL NO. 11	419,86
ACTA PARCIAL NO. 12	418,12
ACTA PARCIAL NO. 13	370,31
ACTA PARCIAL NO. 14	55,67
ACTA PARCIAL NO. 15	8,00
ACTA PARCIAL NO. 16	9,60
ACTA PARCIAL NO. 17	141,20
ACTA PARCIAL NO. 18	181,90
ACTA PARCIAL NO. 19	182,40
ACTA PARCIAL NO. 20	80,60
ACTA PARCIAL NO. 21	362,80
ACTA PARCIAL NO. 22	338,80
ACTA PARCIAL NO. 23	**374,80**
TOTAL ACUMULADO	4851,13

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29992023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	23						UNIDAD	
630.6 TS	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)						m3	
	AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS								
K104+662,00	K104+662,00	-1,80	3,70	0,05	-0,06	DERECHA	concreto para descole	
K104+662,00	K104+662,00	-1,80	3,70	0,05	-0,06	DERECHA	concreto para descole	
K104+662,00	K104+662,00	-1,80	0,90	0,05	-0,08	DERECHA	concreto para descole	
K104+662,00	K104+662,00	-3,75	2,17	0,05	-0,41	DERECHA	concreto para descole	
K104+662,00	K104+662,00	-3,10	0,25	0,05	-0,04	DERECHA	concreto para descole	
K104+662,00	K104+662,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	IZQUIERDA	encole	
K103+910,00	K103+910,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	IZQUIERDA	encole	
K101+450,00	K101+450,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	IZQUIERDA	encole	
K105+950,00	K105+950,00	-1,80	3,70	0,05	-0,06	IZQUIERDA	alatas encole	
K105+950,00	K105+950,00	-1,80	3,70	0,05	-0,06	IZQUIERDA	alatas encole	
K105+950,00	K105+950,00	-1,80	0,90	0,05	-0,08	IZQUIERDA	alatas encole	
K105+950,00	K105+950,00	-3,75	2,17	0,05	-0,41	IZQUIERDA	alatas encole	
K101+740,00	K101+740,00	-1,80	0,70	0,05	-0,06	DERECHA	concreto para descole	
K101+740,00	K101+740,00	-1,80	0,70	0,05	-0,06	DERECHA	concreto para descole	
K101+740,00	K101+740,00	-1,80	0,90	0,05	-0,08	DERECHA	concreto para descole	
K101+740,00	K101+740,00	-3,75	2,17	0,05	-0,41	DERECHA	concreto para descole	
K101+740,00	K101+740,00	-3,30	0,25	0,05	-0,04	DERECHA	concreto para descole	
K104+260,00	K104+260,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	IZQUIERDA	alatas encole	
	AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
ALCANTARILLAS								
K103+510,00	K103+510,00	-1,80	0,70	0,05	-0,06	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole	
K103+510,00	K103+510,00	-1,80	0,70	0,05	-0,06	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole	
K103+510,00	K103+510,00	-1,80	0,90	0,05	-0,08	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole	
K103+510,00	K103+510,00	-3,75	2,17	0,05	-0,41	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole	
K102+623,00	K102+623,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	DERECHA	concreto para encole	
K102+745,00	K102+745,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	DERECHA	concreto para encole	
K103+660,00	K103+660,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	DERECHA	concreto para encole	
K100+445,00	K100+445,00	-1,90	1,90	0,05	-0,18	DERECHA	concreto para encole	
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-4,00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	3,90
ACTA PARCIAL NO. 12	1,70
ACTA PARCIAL NO. 13	1,58
ACTA PARCIAL NO. 14	1,40
ACTA PARCIAL NO. 15	3,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,40
ACTA PARCIAL NO. 17	3,90
ACTA PARCIAL NO. 18	4,80
ACTA PARCIAL NO. 19	2,60
ACTA PARCIAL NO. 20	1,30
ACTA PARCIAL NO. 21	0,30
ACTA PARCIAL NO. 22	3,08
ACTA PARCIAL NO. 23	**-4,00**
TOTAL ACUMULADO	17,6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022
FECHA:	30/10/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	28
640.1 T3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa
UNIDAD	kg

Abscisa Inicial ALCANTARILLAS	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
ALCANTARILLAS							
K98+085,00	K98+085,00	1	89,60	3/8"	0,560	50,29	Acero de refuerzo para caja encole en- Ver cartilla de despiece
			109,26	1/2"	0,994	107,60	
K98+085,00	K98+085,00	1	150,50	3/8"	0,560	84,28	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			224,93	1/2"	0,994	223,58	
K98+160,00	K98+160,00	1	72,50	3/8"	0,560	40,60	Acero de refuerzo para caja encole en- Ver cartilla de despiece
			111,60	1/2"	0,994	110,93	
K98+160,00	K98+160,00	1	166,00	3/8"	0,560	92,96	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			240,89	1/2"	0,994	239,44	
K98+400,00	K98+400,00	1	148,60	3/8"	0,560	83,22	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			241,10	1/2"	0,994	239,65	
K98+500,00	K98+500,00	1	170,45	3/8"	0,560	95,45	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			241,30	1/2"	0,994	239,84	
K98+610,00	K98+610,00	1	159,45	3/8"	0,560	89,29	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			242,30	1/2"	0,994	240,85	
K98+670,00	K98+670,00	1	160,45	3/8"	0,560	89,85	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			245,93	1/2"	0,994	244,42	
K98+920,00	K98+920,00	1	118,00	3/8"	0,560	66,08	Acero de refuerzo para cabezal de descole en- Ver cartilla de despiece
			264,30	1/2"	0,994	262,80	
K104+786,00	K104+786,00	1	55,60	3/8"	0,560	31,14	Acero de refuerzo para disipador de descole en- Ver cartilla de despiece
			119,20	1/2"	0,994	118,48	
K104+840,00	K104+840,00	1	90,60	3/8"	0,560	50,74	Acero de refuerzo para disipador de descole en- Ver cartilla de despiece
			192,60	1/2"	0,994	191,35	
K105+460,00	K105+460,00	1	60,20	3/8"	0,560	33,71	Acero de refuerzo para disipador de descole en- Ver cartilla de despiece
			128,70	1/2"	0,994	127,93	
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				3155,00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	193,00
ACTA PARCIAL NO. 7	2039,00
ACTA PARCIAL NO. 8	49256,00
ACTA PARCIAL NO. 9	12919,00
ACTA PARCIAL NO. 10	48236,50
ACTA PARCIAL NO. 11	168,00
ACTA PARCIAL NO. 12	1379,00
ACTA PARCIAL NO. 13	740,00
ACTA PARCIAL NO. 14	1508,00
ACTA PARCIAL NO. 15	1346,00
ACTA PARCIAL NO. 16	293,54
ACTA PARCIAL NO. 17	2180,00
ACTA PARCIAL NO. 18	2498,26
ACTA PARCIAL NO. 19	2166,00
ACTA PARCIAL NO. 20	1876,00
ACTA PARCIAL NO. 21	1336,40
ACTA PARCIAL NO. 22	1942,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**3155,00**
TOTAL ACUMULADO	127506,1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CAJA DE ENTRADA EN ODT K98+085 CI
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL





Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	4	6.00				24							
	4	5.20				20.8							
	4	5.00				20							
	5	2.20				11							
	5	2.00					10						
	5	4.80					24						
	7	2.00				14							
	4	8.00					32						
	5	6.85					34.25						
	4	1.00					4						
							0						
	2	2.00					4						
						0							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						89.80	108.25						
Peso en kilos						50.29	107.60						
Peso total (kg)			157.89										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+086 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	10	2					20						
	3	1.51					4.53						
	7	3.1					21.7						
	10	2.1					21						
	4	2.2				8.8							
	4	7.6					30.4						
	8	6.50					52						
	10	6.73					67.3						
	8	1.00					8						
	4	2.40				9.6							
	4	1.75				7							
	4	2.40				9.6							
	2	2.50				5							
	4	1.75				7							
	2	5.50				11							
	7	5.50				38.5							
	9	6.00				54							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						150.50	224.93						
Peso en kilos						84.28	223.58						
Peso total (kg)			307.86										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CAJA DE ENTRADA EN ODT K98+160 CI
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL






Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	1	7.00				7							
	3	7.00				21							
	4	5.60				22.4							
	2	5.55				11.1							
	5	2.20				11							
							0						
	4	4.85					19.4						
	5	2.00					10						
	2	2.00					4						
	4	8.05					32.2						
	7	6.00					42						
	4	1.00					4						
							0						
							0						
						0							
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						72.50	111.60						
Peso en kilos						40.60	110.93						
Peso total (kg)			151.53										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+160 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL


Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	7	4.27					29.89						
	10	2.1					21						
	6	2.2				13.2							
	10	5.7					57						
	10	5.60					56						
	4	7.20					28.8						
	8	1.00					8						
	2	3.30					6.6						
	4	2.60				10.4							
	4	3.00				12							
	4	3.50				14							
	4	3.10				12.4							
	6	5.90				35.4							
	2	5.90				11.8							
	6	7.10				42.6							
	2	7.10				14.2							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						165.00	240.89						
Peso en kilos						92.96	239.44						
Peso total (kg)			332.40										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+400 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	7	3.4					23.8						
	10	2.2					22						
	6	2					12						
	6	2.2				13.2							
	4	7.6					30.4						
	10	5.63					56.3						
	10	5.70					57						
	8	1.00					8						
						0							
	4	2.70				10.8							
	4	2.50				10							
	4	2.60				10.4							
	4	2.55				10.2							
	6	5.75				34.5							
	6	6.00				36							
	2	5.75				11.5							
	2	6.00				12							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						146.60	241.10						
Peso en kilos						83.22	239.65						
Peso total (kg):	322.87												

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL


Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	7	4.23					29.61						
	6	2.2				13.2							
	10	6					60						
	10	5.55					55.5						
	4	6.98					27.92						
	8	1.00					8						
	2	3.38					6.76						
	10	2.2					22						
	5	2.50				12.5							
	5	2.55				12.75							
	8	3.00				24							
						0							
	4	6.00				24							
	14	6.00				84							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						170.45	241.39						
Peso en kilos						95.45	239.94						
Peso total (kg)			335.39										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+610 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL


Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	10	2					20						
	7	4.3					30.1						
	8	2				16							
	4	7.5					30						
	10	5.71					57.1						
	10	5.89					58.9						
	8	1.00					8						
	2	3.30					6.6						
	4	2.80				11.2							
	8	3.00				24							
	5	2.50				12.5							
	5	2.55				12.75							
	7	6.00				42							
	7	6.00				42							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						180.45	242.30						
Peso en kilos						89.85	240.85						
Peso total (kg)			330.70										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+670 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL



Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	10	2.2					22						
	7	4.3					30.1						
	8	2				16							
	4	7.8					31.2						
	10	5.80					58						
	10	5.84					58.4						
	8	1.00					8						
	4	2.80				11.2							
	2	3.30					6.6						
	8	3.00				24							
	5	2.50				12.5							
	5	2.55				12.75							
	7	6.00				42							
	7	6.00				42							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						160.46	245.50						
Peso en kilos						89.86	244.42						
Peso total (kg):			334.28										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: CABEZAL DE SALIDA EN ODT K98+920 CD.
Fecha: Octubre, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	10	2					20						
	8	1.45					11.6						
	7	4.27					29.89						
	10	2.1					21						
	6	2.2				13.2							
						0							
	4	8.3					33.2						
	10	6.80					68						
	10	6.63					66.3						
	8	1.00					8						
	2	3.20					6.4						
	2	2.70				5.4							
	4	2.70				10.8							
	4	2.60				10.4							
	4	2.75				11							
	4	2.60				10.4							
	2	6.80				13.6							
	6	7.20				43.2							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						118.00	264.39						
Peso en kilos						66.08	262.80						
Peso total (kg)			328.88										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: DISIPADOR EN EL K104+786
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL




Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	7	4.90					34.3						
	4	3.10					12.4						
	4	4.00					16						
	4	2.80					11.2						
	5	5.20					26						
	6	3.10				18.6							
	3	7.40				22.2							
	2	3.10				6.2							
	3	2.40					7.2						
	3	1.60				4.8							
	11	1.10					12.1						
	19	0.20				3.8							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						55.60	119.20						
Peso en kilos						31.14	118.48						
Peso total (kg)			149.62										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: DISIPADOR EN EL K104+840
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL


Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	7	9.10					63.7						
	4	4.00					16						
	17	2.80					47.6						
	8	4.60					36.8						
	4	5.00					20						
	3	3.90				11.7							
	3	5.60				16.8							
	5	2.70				13.5							
	3	5.10				15.3							
	2	6.70				13.4							
	6	1.50				9							
	6	1.40					8.4						
	2	2.60				5.2							
	6	0.95				5.7							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						90.60	192.50						
Peso en kilos						50.74	191.35						
Peso total (kg)			242.08										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: DISIPADOR EN EL K105+460
Fecha: Octubre, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	7	7.00					49						
	3	3.90					11.7						
	3	4.80					14.4						
	6	2.80					16.8						
	4	5.00					20						
	4	4.20					16.8						
	3	5.10				15.3							
	9	2.70				24.3							
	4	1.40				5.6							
	3	5.00				15							
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						60.20	128.70						
Peso en kilos						33.71	127.93						
Peso total (kg)			161.64										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2908202B-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	39	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
Abscisa Inicial	**Abscisa Final**	**Largo (m)**	**Ancho (m)**	**Alto (m)**	**Margen**	**Cantidad**	**Descripción**
FILTROS							
K97+994,00	K98+085,00	91,00	0,60		I	54,60	Proteccion de filtros
K98+052,00	K98+160,00	68,00	0,60		I	40,80	Proteccion de filtros
K98+161,00	K98+252,00	91,00	0,60		I	54,60	Proteccion de filtros
K98+254,00	K98+272,00	18,00	0,60		I	10,80	Proteccion de filtros
K98+272,00	K98+361,00	89,50	0,60		I	53,70	Proteccion de filtros
K98+503,00	K98+603,00	100,00	0,60		I	60,00	Proteccion de filtros
K98+613,00	K98+668,00	55,00	0,60		I	33,00	Proteccion de filtros
K99+065,00	K99+140,00	61,00	0,60		I	36,60	Proteccion de filtros
K99+140,00	K99+213,00	73,00	0,60		I	43,80	Proteccion de filtros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				387,90			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	0,00
ACTA PARCIAL NO. 20	0,00
ACTA PARCIAL NO. 21	631,20
ACTA PARCIAL NO. 22	556,80
ACTA PARCIAL NO. 23	**387,90**
TOTAL ACUMULADO	1575,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS


PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3		
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA:	30/10/2025
CONTRATO DE OBRA No:	2969/2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	42						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
MUROS							
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23							
K98+430,00	VER CARTERA				71,46	D	Excavacion Muro K98+430,00
K101+500,00	VER CARTERA				874,59	D	Excavacion Muro K101+500,00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				946,40			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	0,00
ACTA PARCIAL NO. 10	0,00
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	545,20
ACTA PARCIAL NO. 17	373,00
ACTA PARCIAL NO. 18	387,50
ACTA PARCIAL NO. 19	528,40
ACTA PARCIAL NO. 20	933,30
ACTA PARCIAL NO. 21	637,40
ACTA PARCIAL NO. 22	267,80
ACTA PARCIAL NO. 23	**946,40**
TOTAL ACUMULADO	4569,50

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA


ING. JOAQUIN ANTONIO TIRADO CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

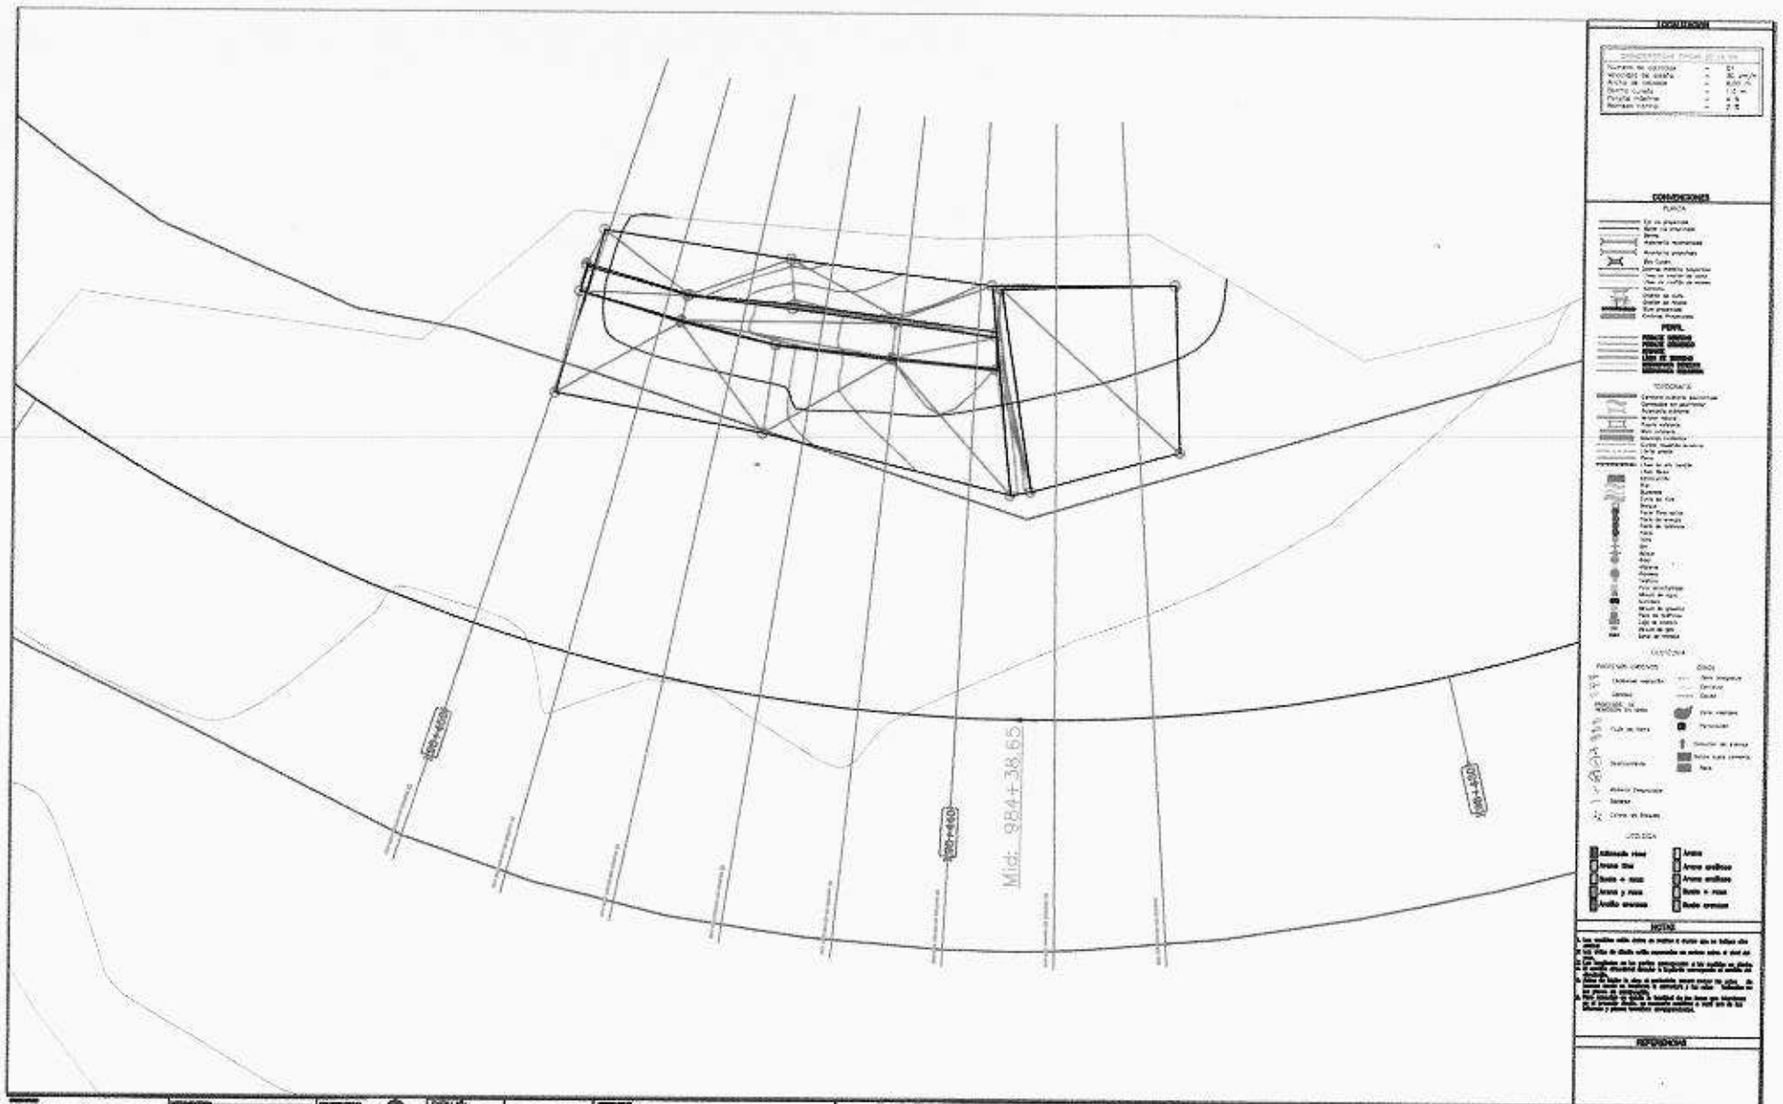


			DIBUJÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K98+435–450 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2023

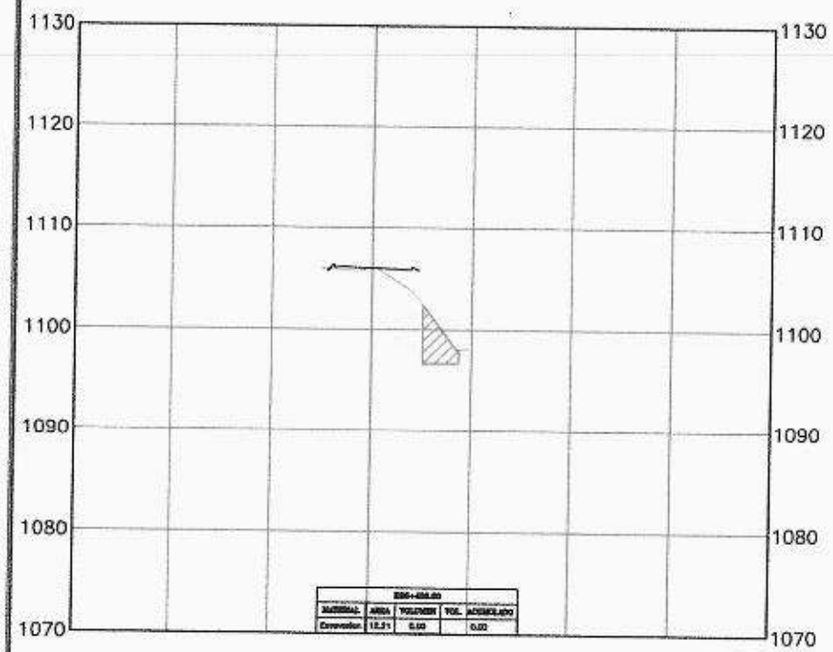

98+436

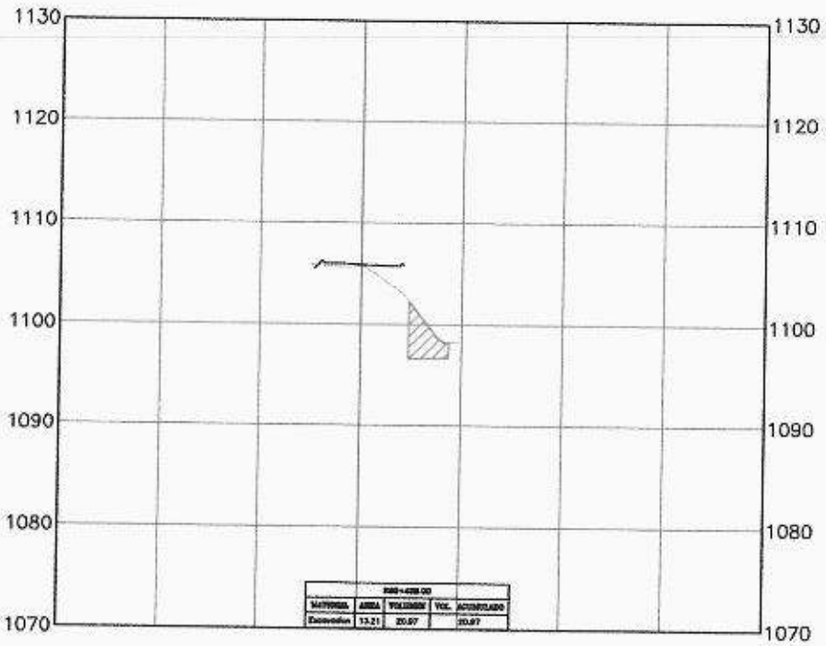

98+438

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


INTERVENTORÍA: mab INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K98+435–450 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000
					FECHA: Octubre 2025

PLANOS 1 DE X

ARCHIVO:

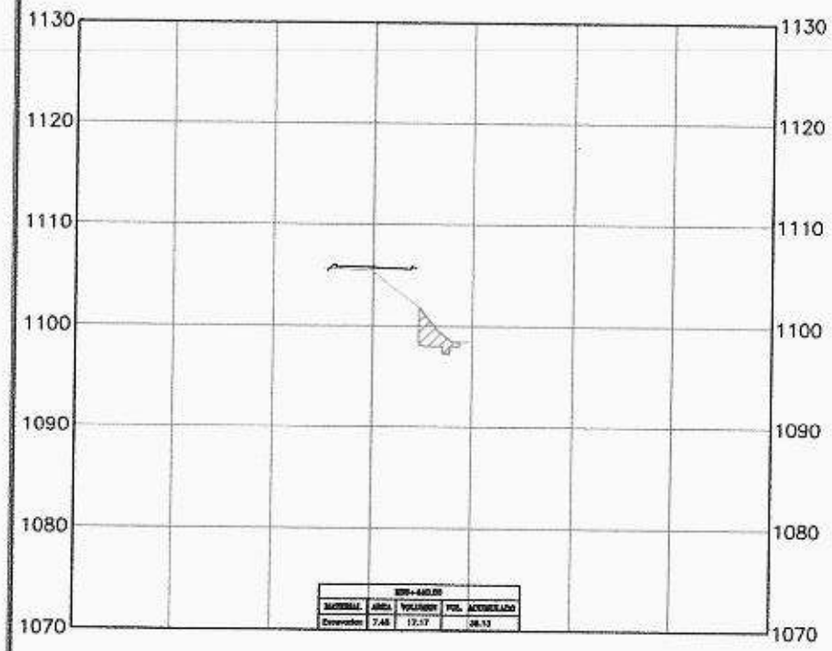

98+440

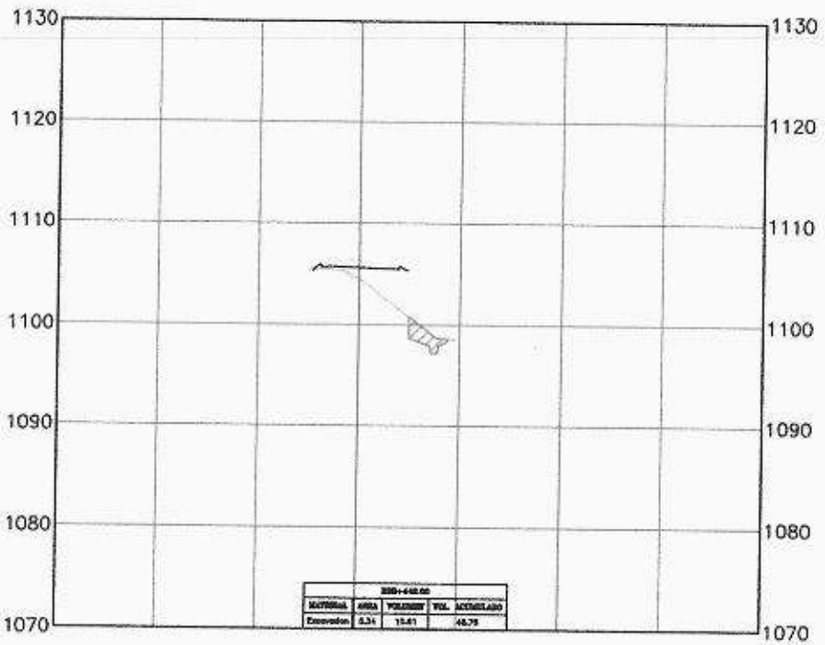

98+442

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA VÍA

Número de carriles	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Berma cuneta	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	8 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

GEOTECNIA

PROCESOS GEOLÓGICOS

OTROS

LITOLOGÍA


Afloramiento rocoso	Arena
Arena fina	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso

NOTAS


1. Las medidas están dadas en metros a menos que se indique otra unidad.
2. Las cotas de diseño están referenciadas en metros sobre el nivel del mar.
3. Las topografías de las partes corresponden a las medidas en planta.
4. El sentido direccional derecho e izquierdo corresponde al sentido de abscisado.
5. Todas las medidas en obra en particular deberán verificarse antes de iniciar cualquier actividad y en caso de diferencias deberán ser informadas al interventor y/o autor de los planos de construcción.
6. Para consultas o dudas en la ejecución de las obras que interfieran en el presente diseño, se recomienda contactar al autor de los estudios y planos topográficos correspondientes.

REFERENCIAS

	INTERVENTORÍA: mab INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K98+435–450 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

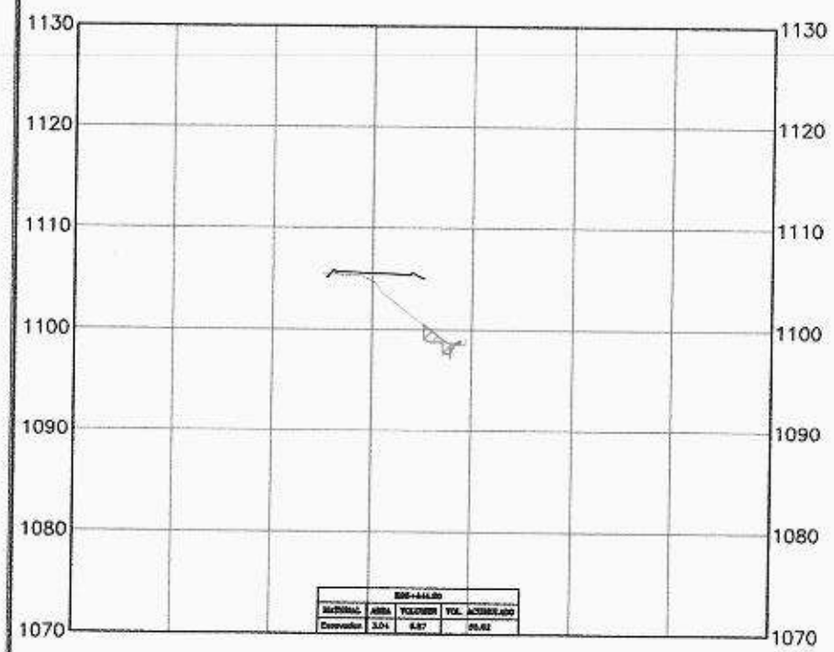

98+444

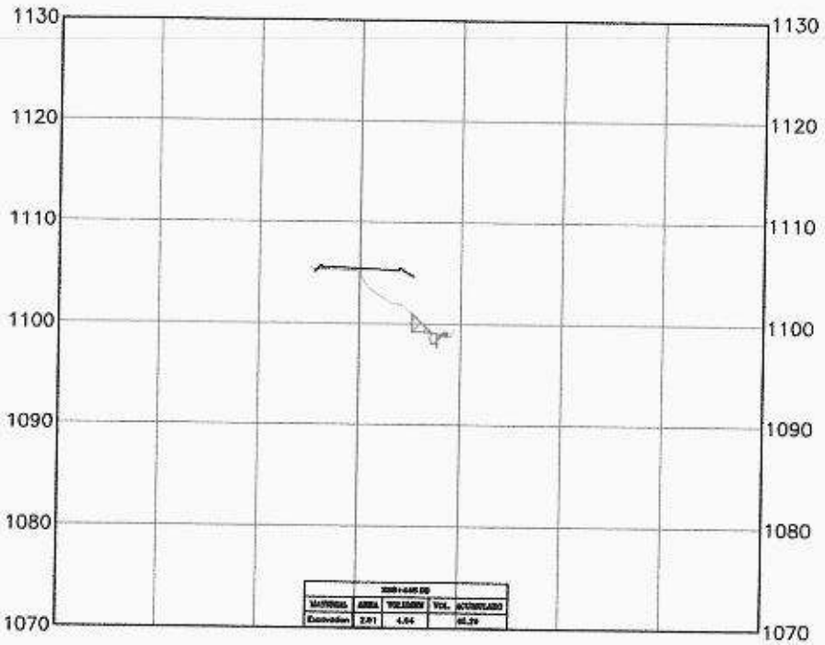

98+446

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K98+435–450 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

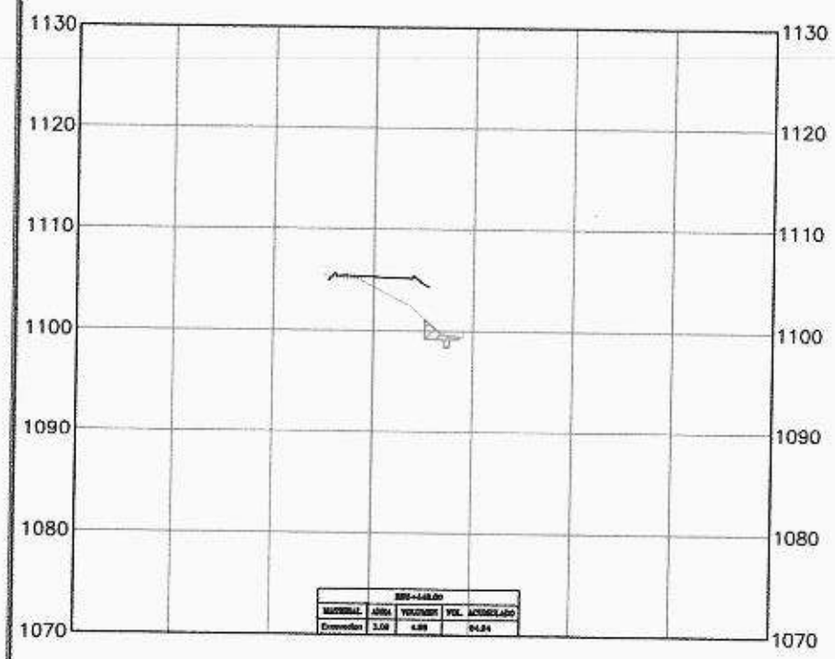

98+448

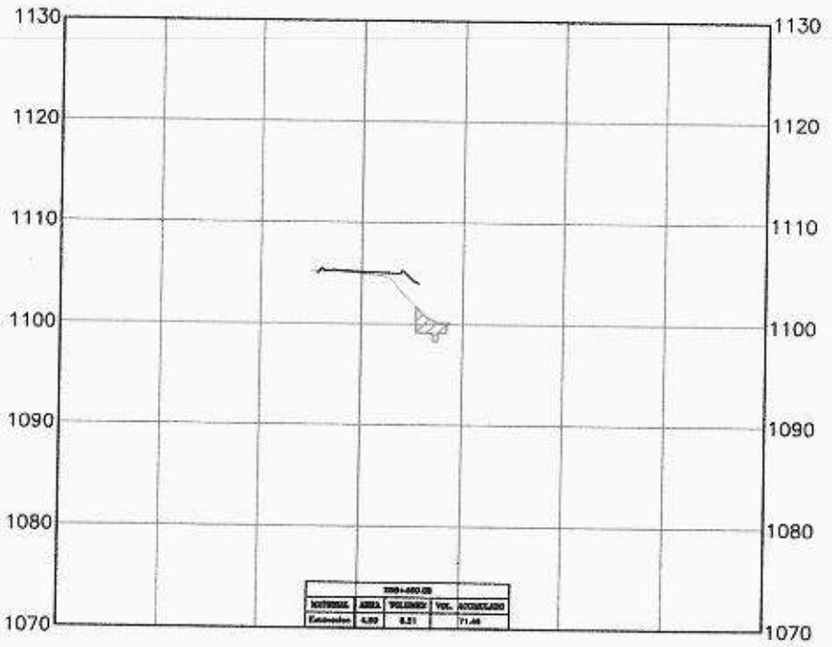

98+450

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K98+435–450
TRAMO 3


ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X


FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

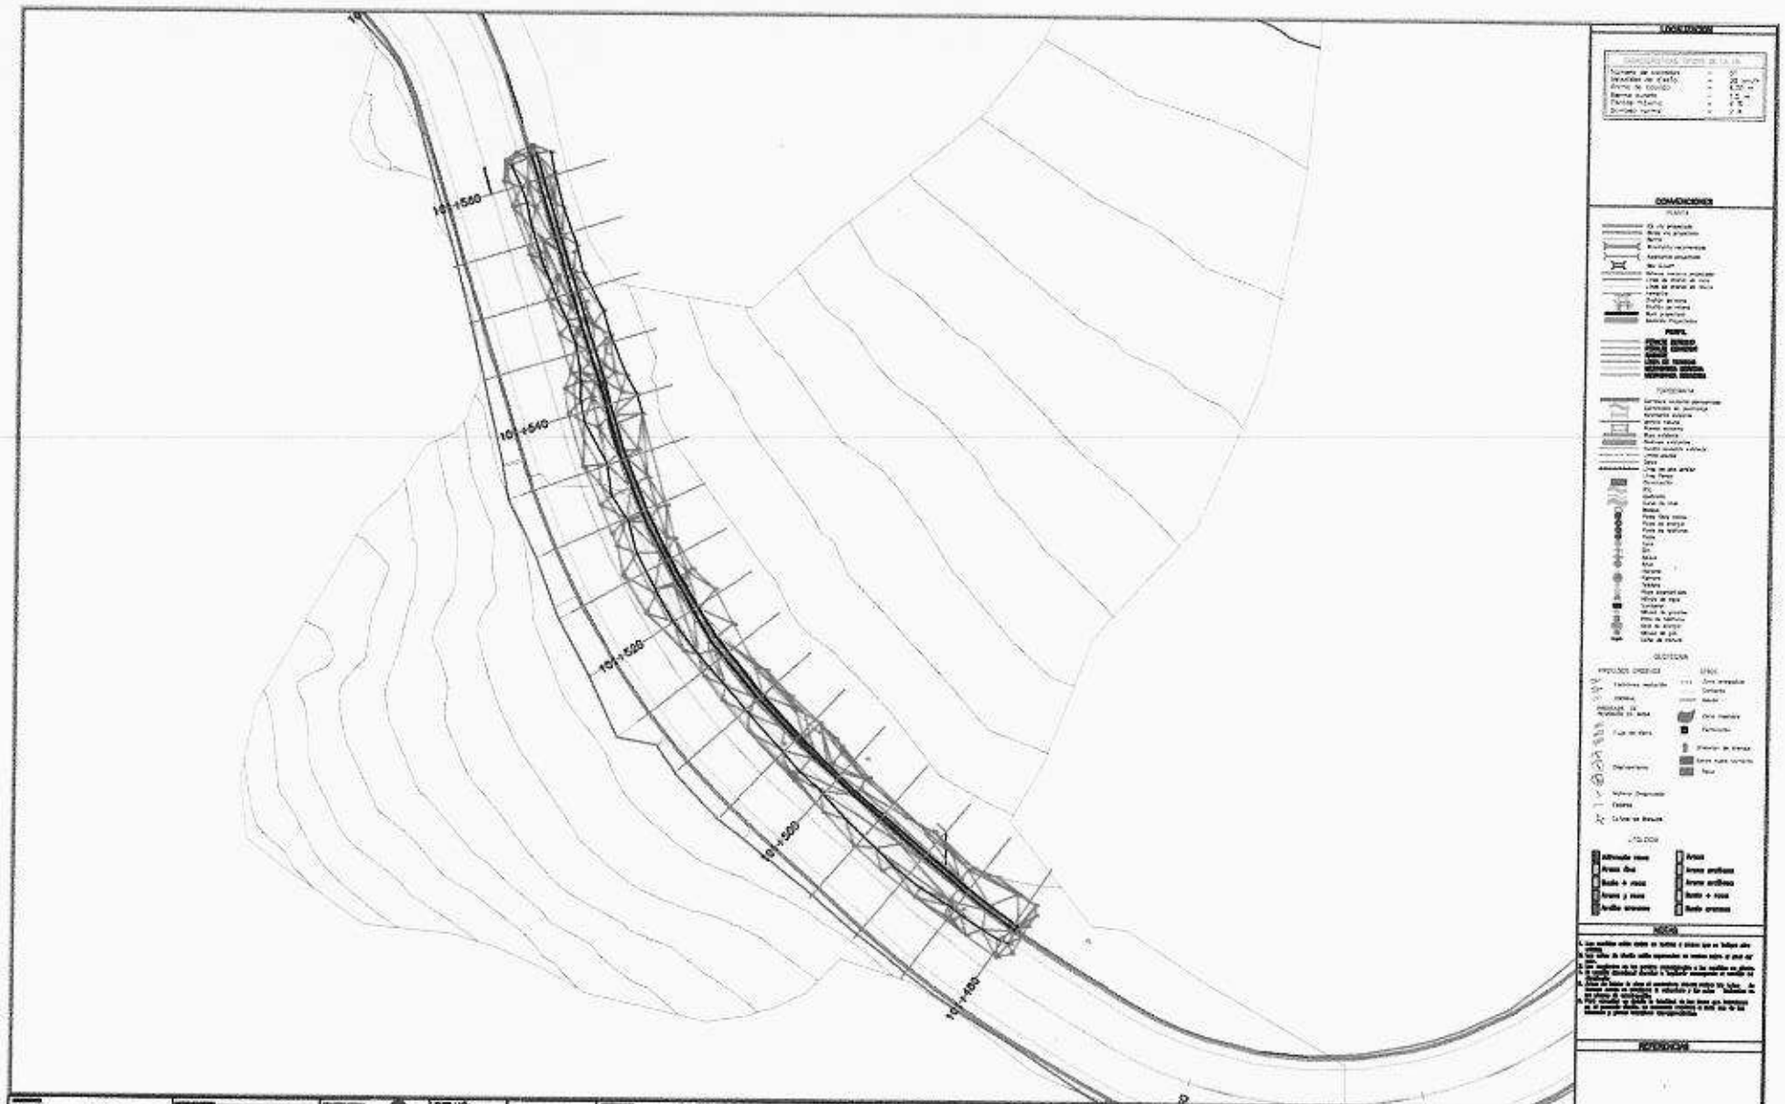
101+560
101+540
101+520
101+500
101+480
CONVENCIONES
NOTAS
REFERENCIAS
DIBUJO: A.P.C.
PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000
CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3
ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000
PLANOS 1 DE X
FECHA: Octubre 2025

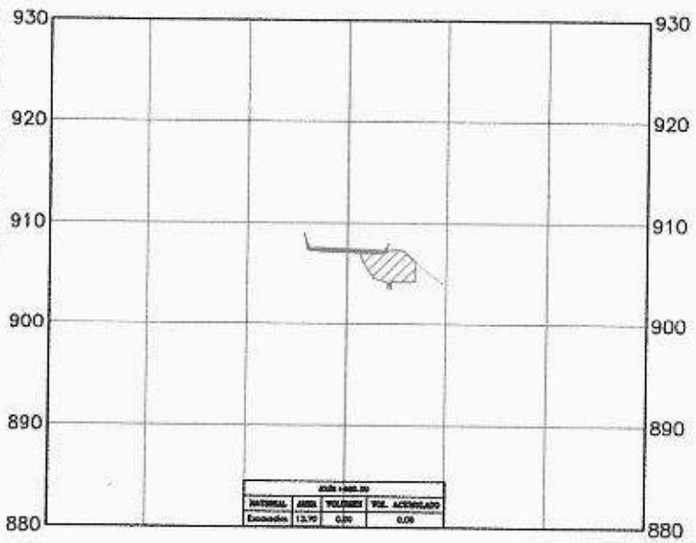

101+480

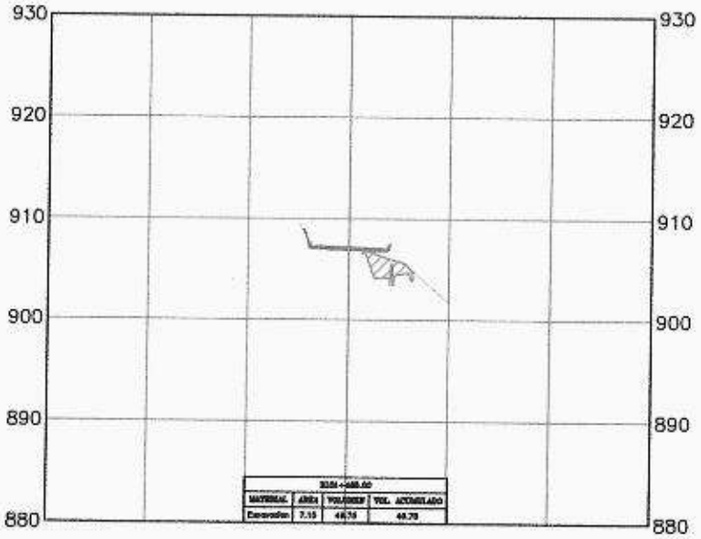

101+485

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK108+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

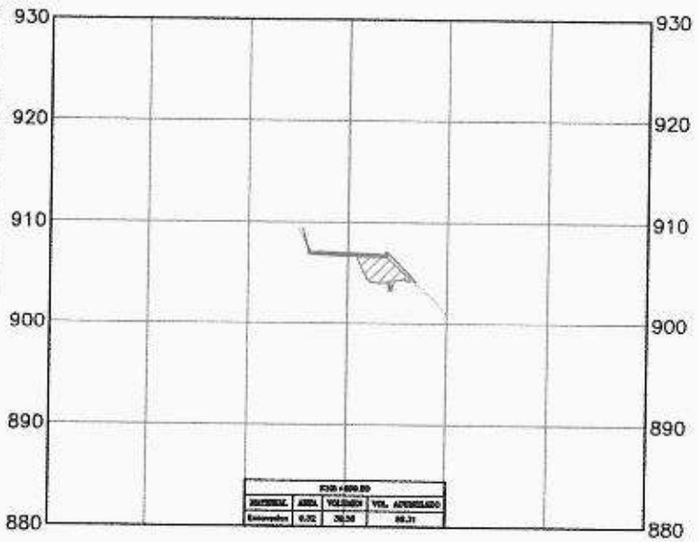

101+490

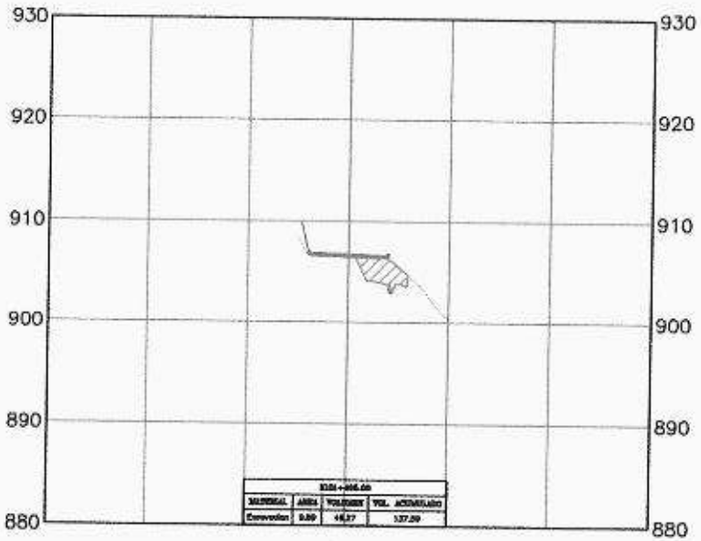

101+495

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: MAB INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTOR: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK108+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

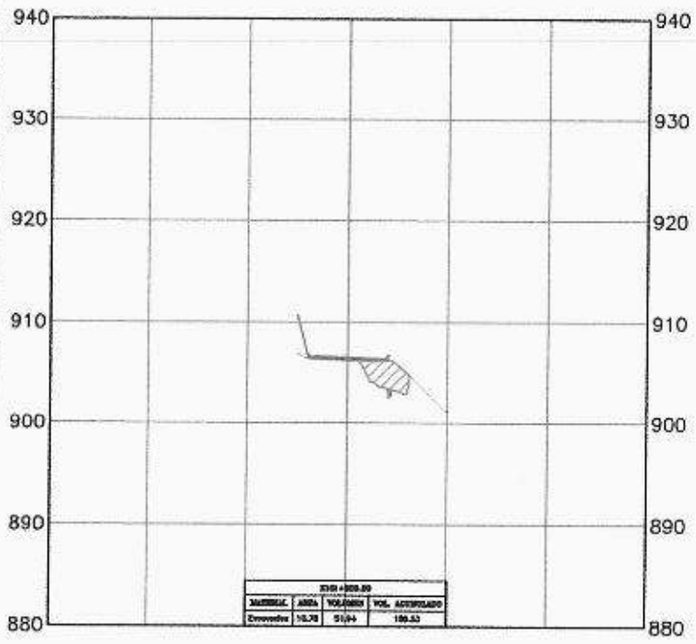

101+500

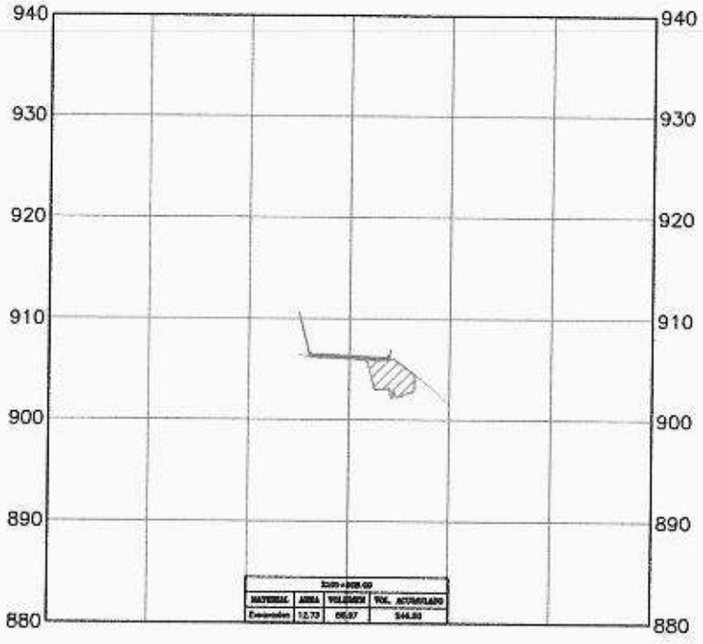

101+505

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA	DISEÑADORA	DIBUJÓ: A.P.C.
INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

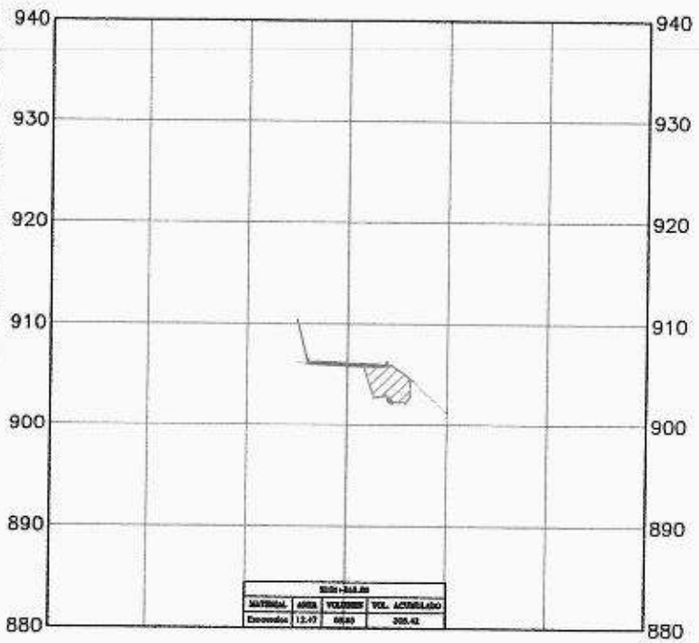

101+510

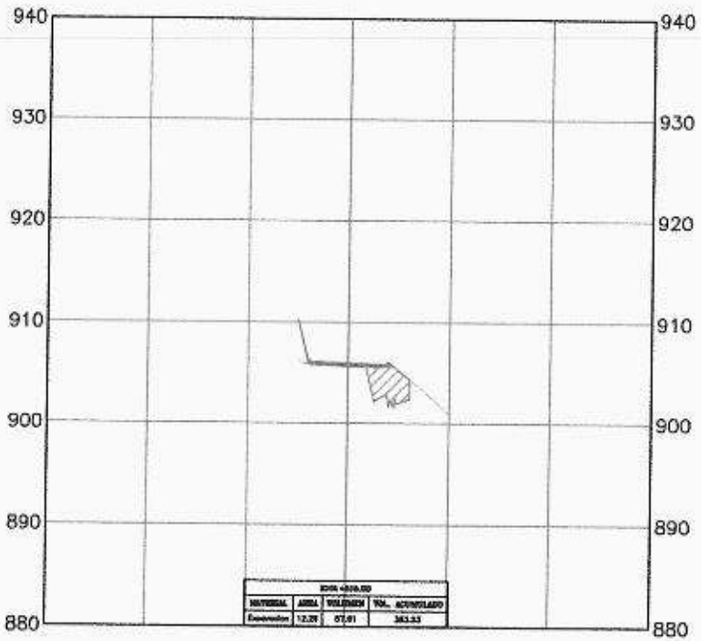

101+515

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.P.C.		

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

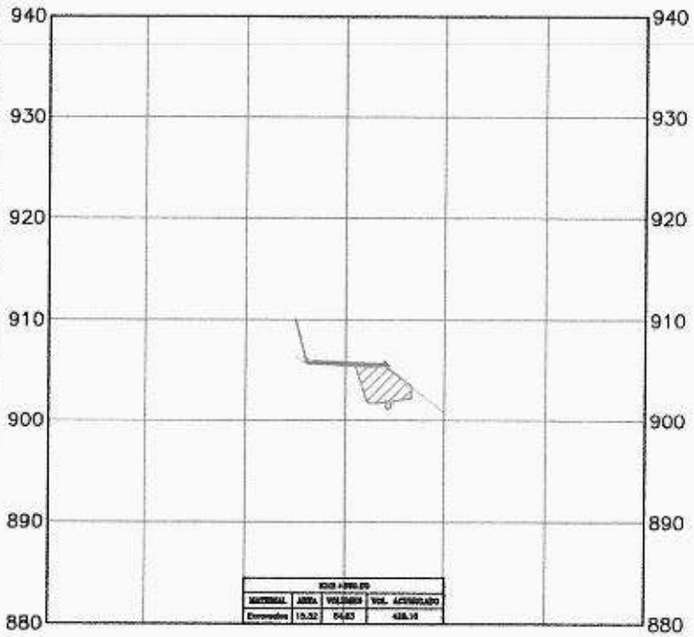

101+520

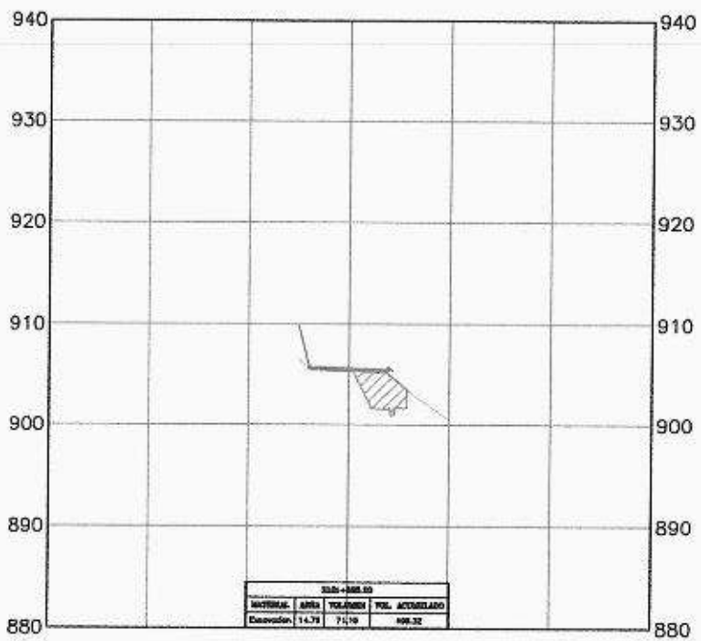

101+525

UBICACIÓN

DIMENSIONES

NOTAS

REFERENCIAS

CONCESIONARIO	INTERVENTORÍA	CONSTRUCTOR	DIBUJÓ: A.P.C.
	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK108+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

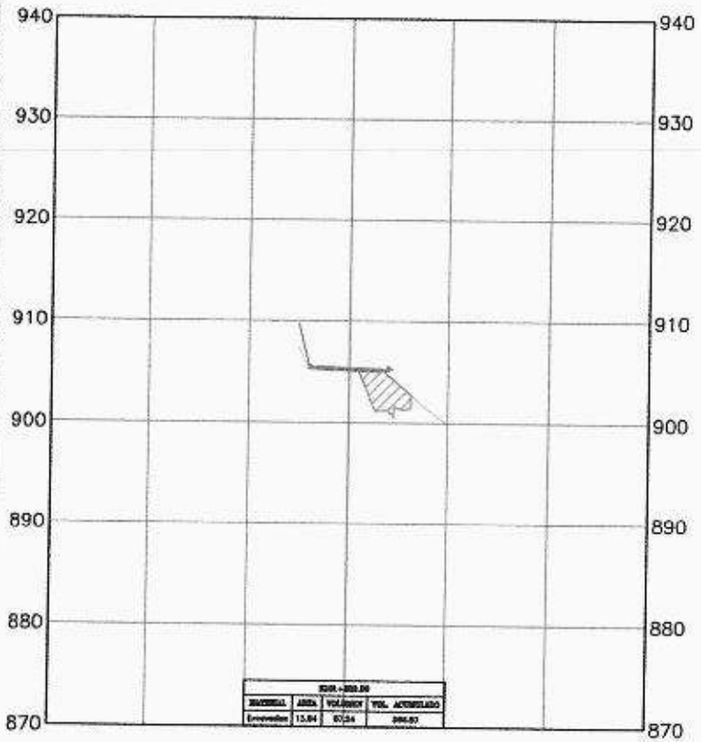

101+530

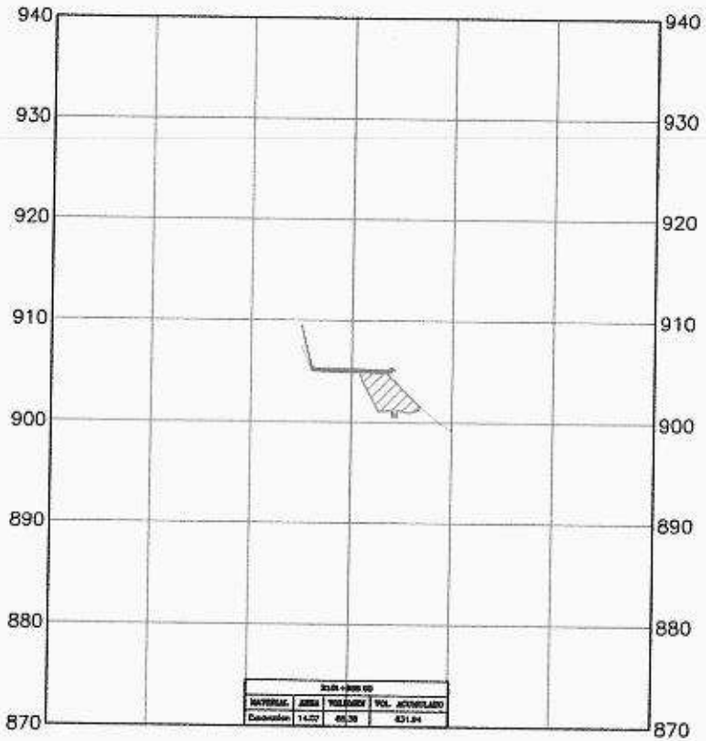

101+535


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3
CONSTRUCTORA SAN MIGUEL	REVISÓ:		ESCALA: V: 100 H: 1000
			FECHA: Octubre 2025
			PLANOS 1 DE X
			ARCHIVO:

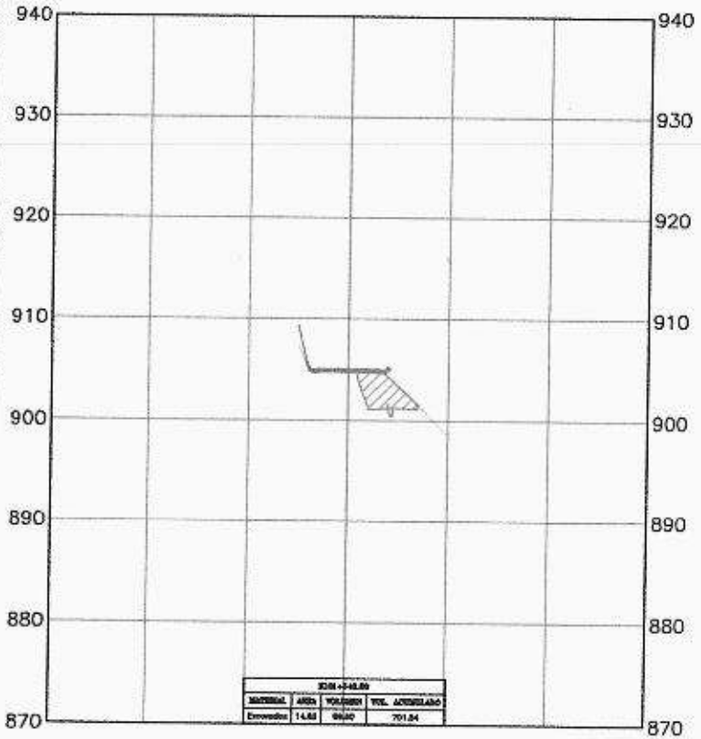

101+540

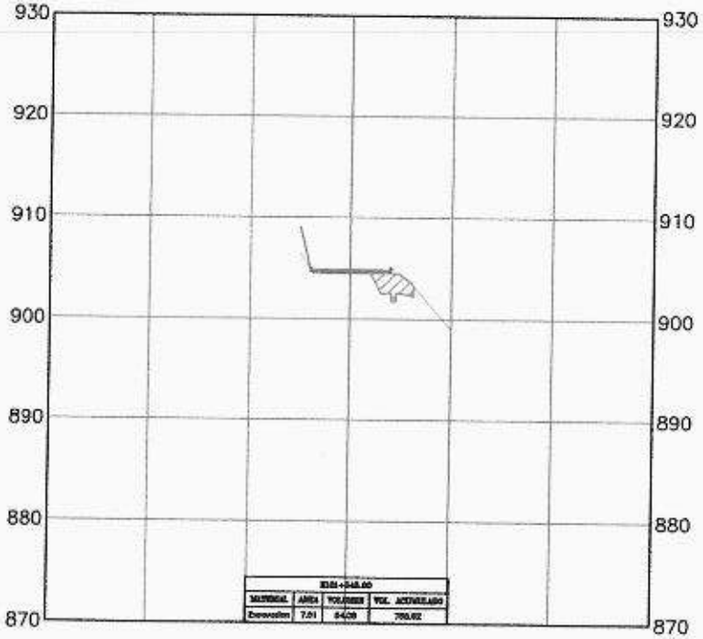

101+545

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: MAB INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: CONSORCIO SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

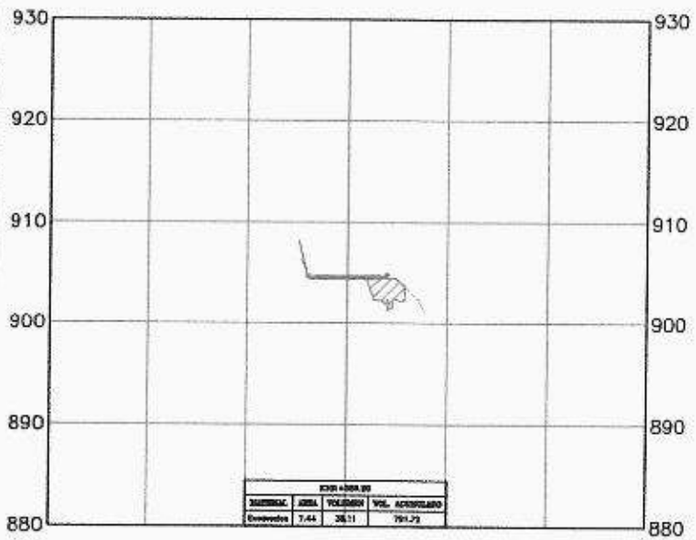

101+550

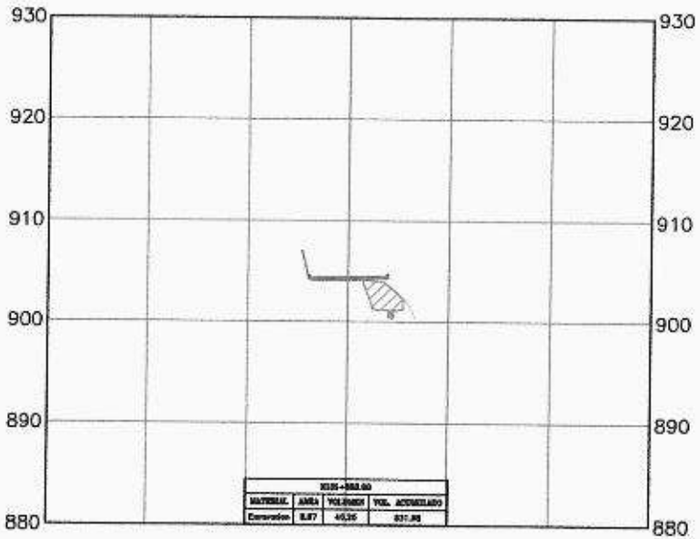

101+555


LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000
REVISÓ:			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2025

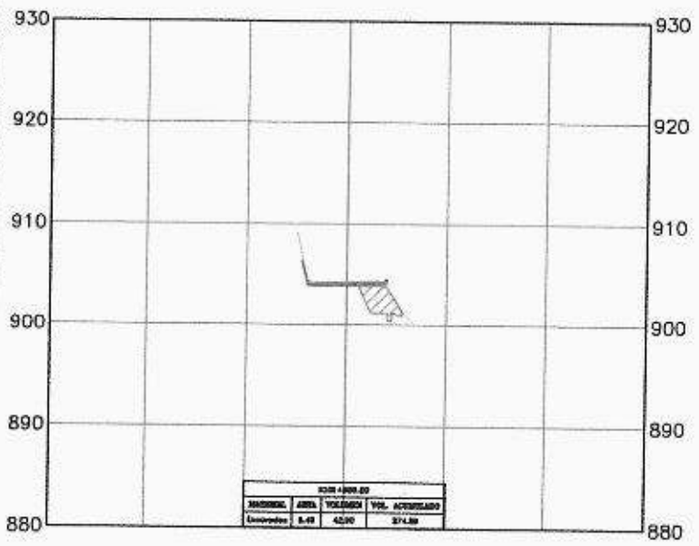

101+560

LOCALIZACIÓN


CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS


INTERVENTORÍA: MAB INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTOR: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:	

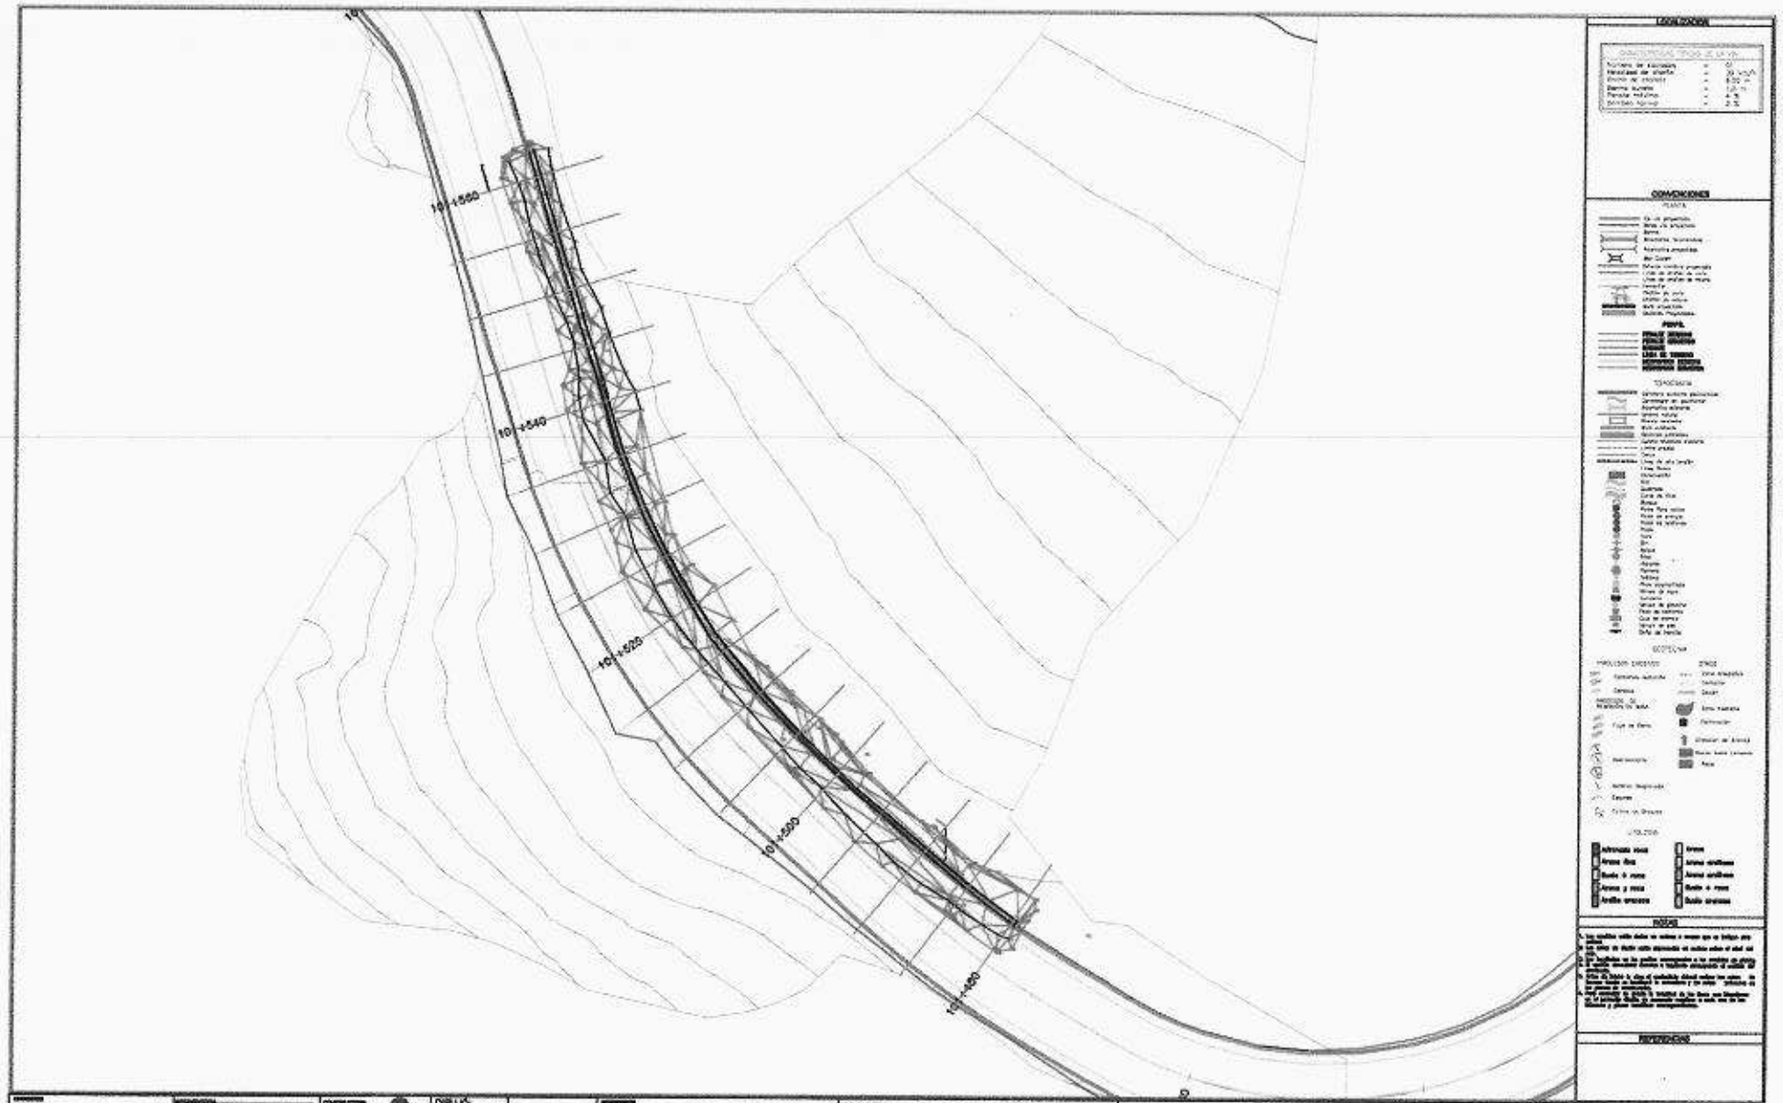
101+560
101+540
101+520
101+500
101+480
LOCALIZACIÓN
CONVENCIONES
NOTAS
REFERENCIAS
DIBUJÓ: A.P.C.
PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000
CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3
ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000
PLANOS 1 DE X
FECHA: Octubre 2025

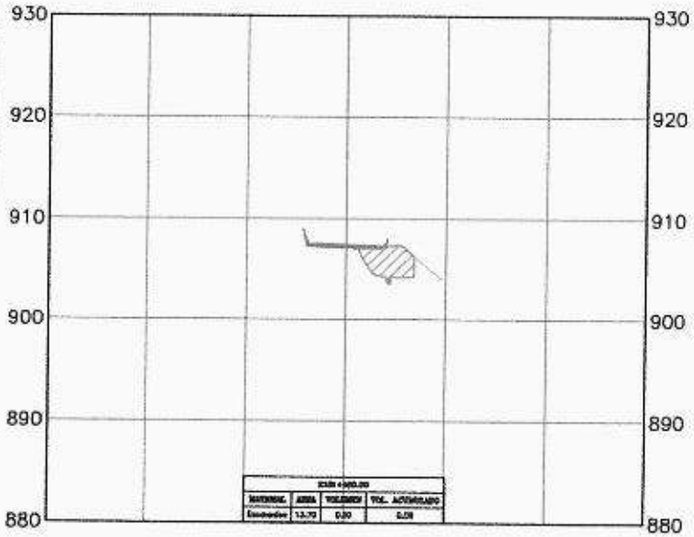

101+480

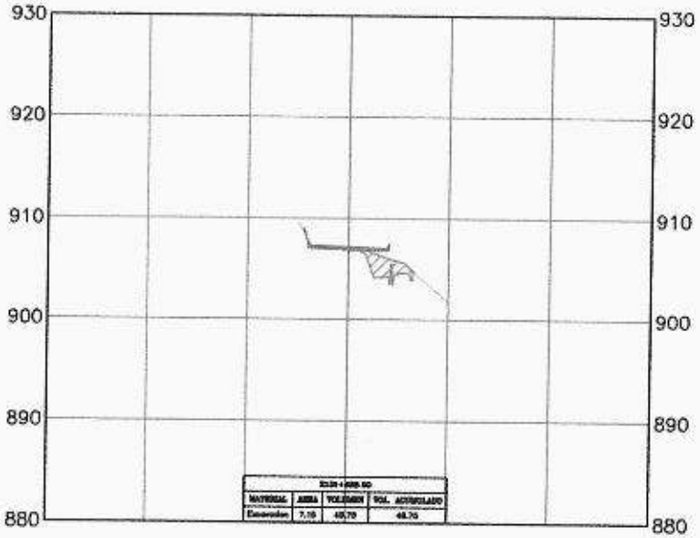

101+485


UBICACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000
REVISÓ:			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2025
			ARCHIVO:

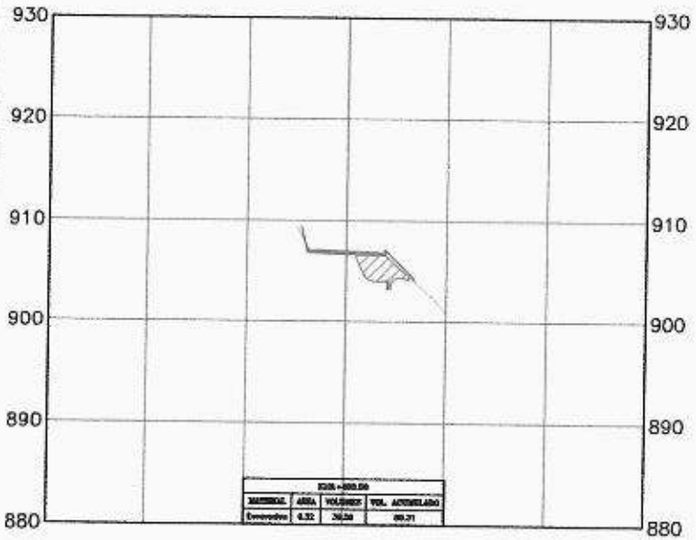

101+490

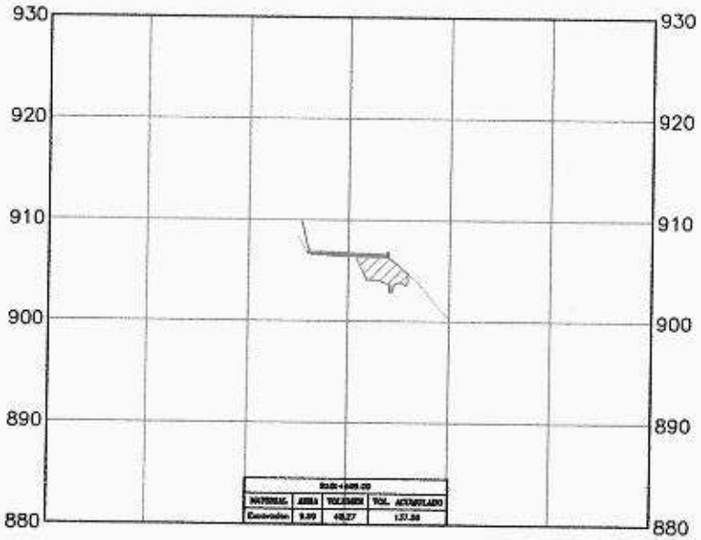

101+495

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORÍA	CONSTRUCTORA	DIBUJÓ: A.P.C.	
INGENIERÍA DE VALOR	SAN MIGUEL	REVISÓ:	

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK108+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

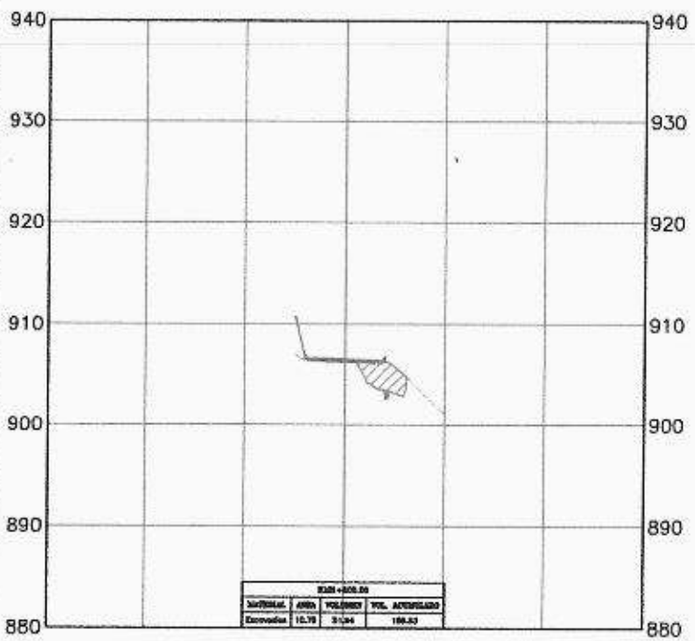

101+500

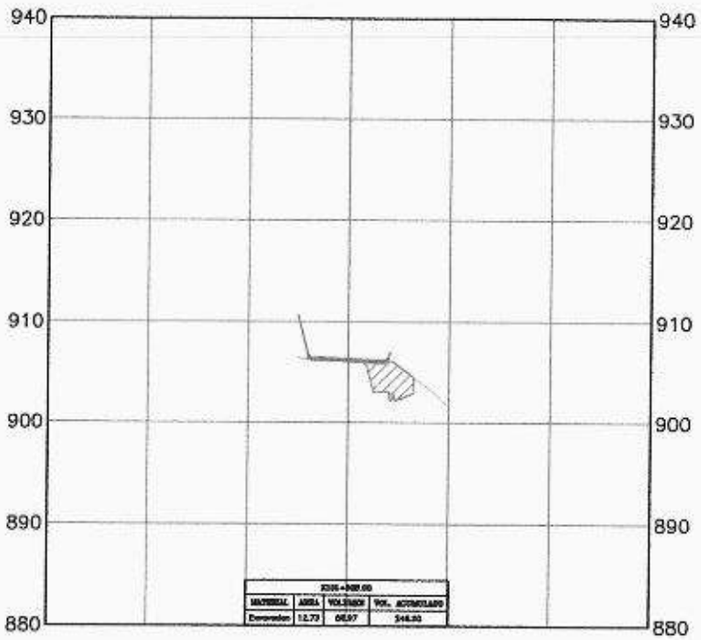

101+505

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LA VÍA

Número de calzadas	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.50 m
Berma cuneta	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	6 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

GEOTECNIA

PROCESOS EROSIVOS

OTROS

LITOLOGÍA

- Arcillosa roca
- Arena
- Arena fina
- Arena arcillosa
- Suelo + roca
- Arena arcillosa
- Arena y roca
- Suelo + roca
- Arcilla arenosa
- Suelo arenoso

NOTAS

REFERENCIAS

CALDAS

INTERVENTORÍA: MAB INGENIERIA DE VALOR

CONSTRUCTORA: CONSORCIO SAN MIGUEL

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479-562
TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

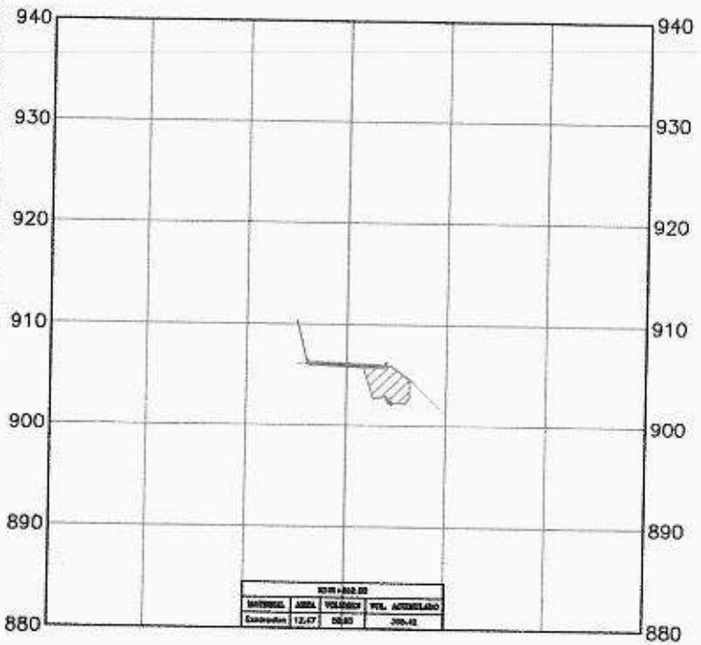

101+510

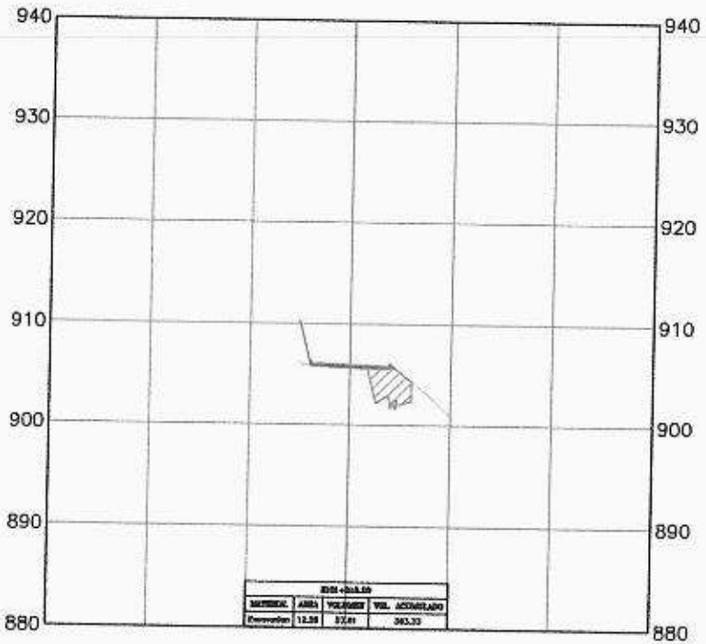

101+515

LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO:	INTERVENTORÍA: MAB INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCCIÓN: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K101+479–562
TRAMO 3


ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

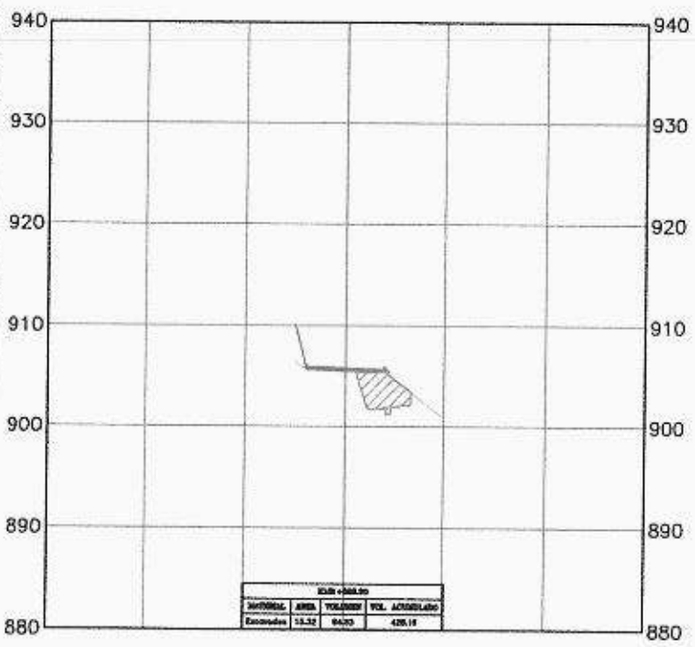

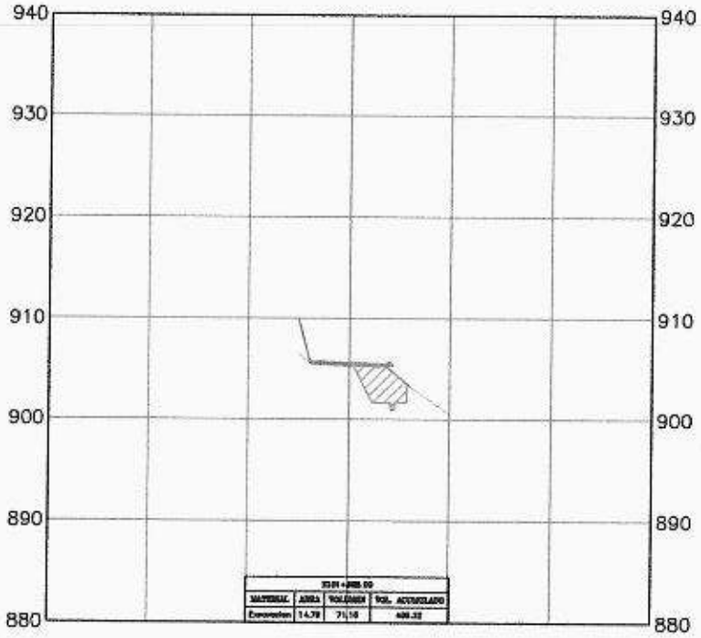


EXCAVACIÓN

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑADOR:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000
INTERVENTORIA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:		PLANOS 1 DE X
				FECHA: Octubre 2025 ARCHIVO:

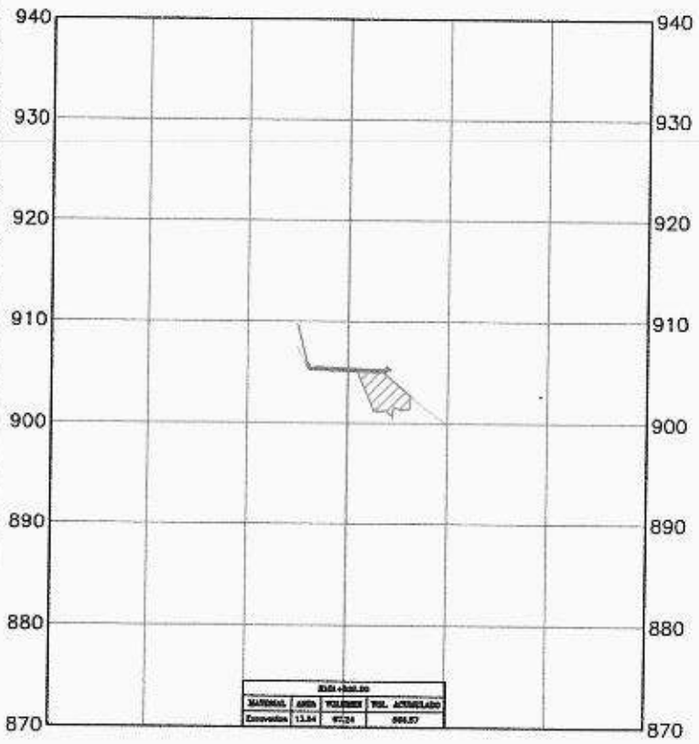

101+530

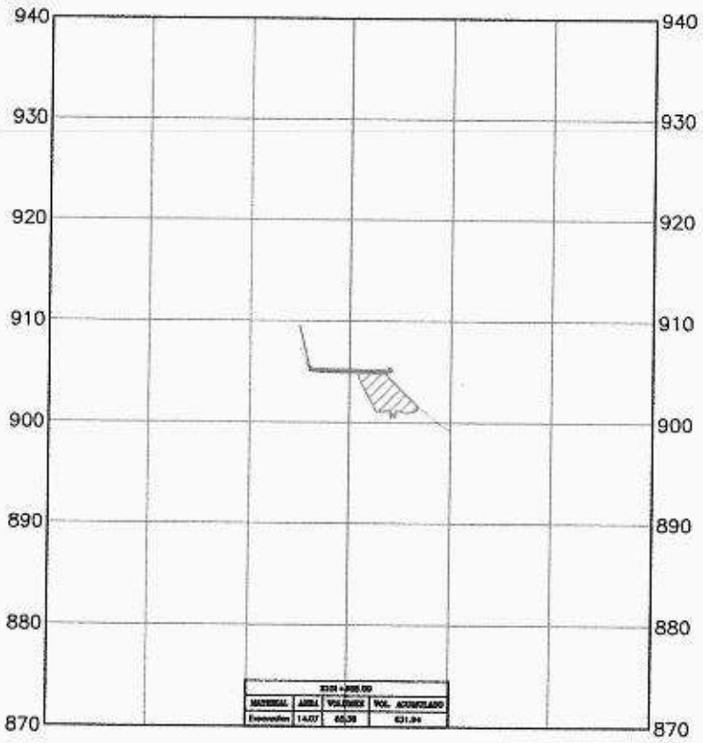

101+535

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS TRAZO DE LA VÍA

Número de carriles	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Berma cuneta	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	4 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

GEOTECNIA

LITOLOGÍA

Afirmado roca	Arena
Arena limosa	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla orgánica	Suelo orgánico

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO:	INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

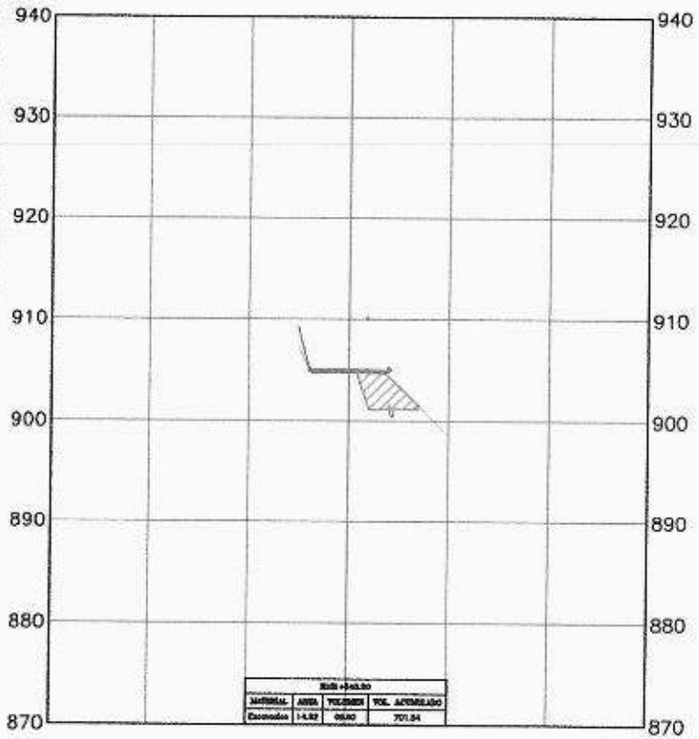

101+540

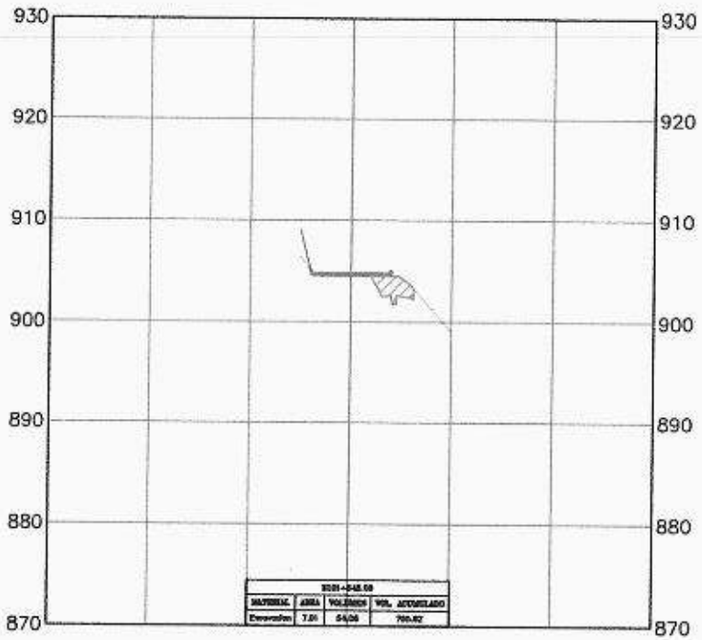

101+545

LOCALIZACIÓN


CONVENCIONES

NOTAS


REFERENCIAS

INTERVENTORÍA: INGENIERÍA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3

ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:	

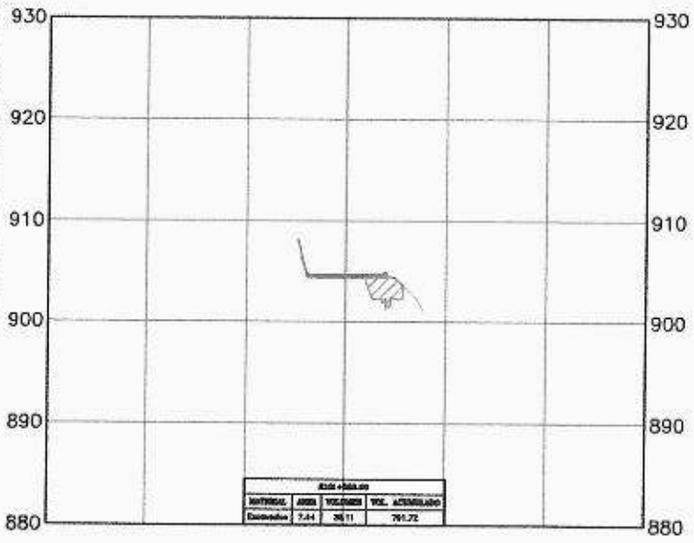


101+550

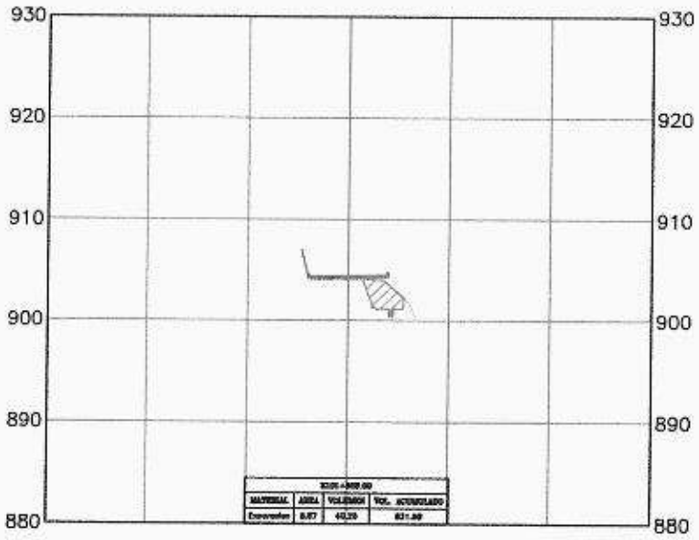

101+555

INTERVENTORIA: INGENIERIA DE VALOR	CONSTRUCTORA: SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK108+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3
				ESCALA: V: 100 H: 1000
				PLANOS 1 DE X
				FECHA: Octubre 2025

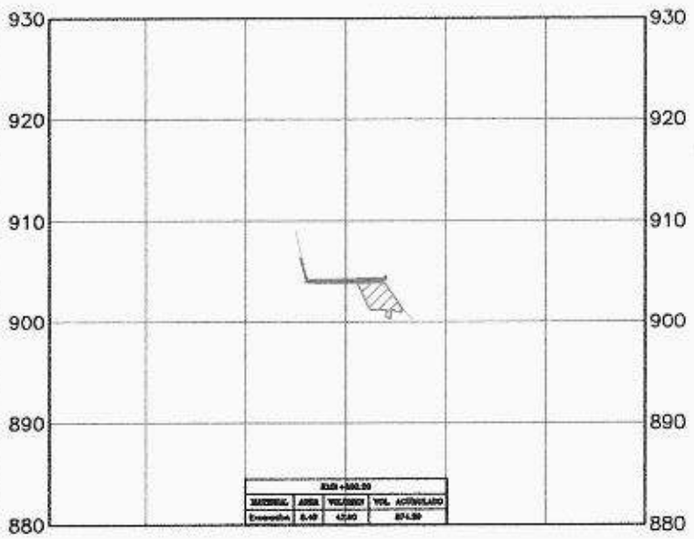

101+560

UBICACIÓN

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFÍA

GEOTECNIA

LITOLOGÍA

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK90+000 – PK106+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K101+479–562 TRAMO 3	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X			
A.P.C.					FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:		
REVISÓ:								

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2905-2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1891 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	47						UNIDAD
630.6 73	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (S)						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
MUROS							
K100+665,00	K100+665,00	-5,97	2,75	0,05	-0,82	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+665,00	K100+665,00	-6,45	3,50	0,05	-0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K100+720,00	K100+720,00	-7,40	2,50	0,05	-0,93	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+720,00	K100+720,00	-5,73	2,50	0,05	-0,72	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K104+480,00	K104+480,00	-8,45	3,25	0,05	-1,54	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+170,00	K105+170,00	-7,00	3,00	0,05	-1,05	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K100+550,00	K100+550,00	-6,64	3,50	0,05	-1,08	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+550,00	K100+550,00	-6,05	2,75	0,05	-0,83	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K100+550,00	K100+550,00	-7,55	2,50	0,05	-0,94	DERECHA	Zarpa muro modulo #3
K100+550,00	K100+550,00	-7,45	3,25	0,05	-1,21	DERECHA	Zarpa muro modulo #4
K100+550,00	K100+550,00	-6,78	3,00	0,05	-1,02	DERECHA	Zarpa muro modulo #5
K100+310,00	K100+320,00	-9,20	2,75	0,05	-1,27	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+470,00	K105+470,00	-5,35	2,50	0,05	-0,67	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+470,00	K105+470,00	-6,30	3,25	0,05	-1,02	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K105+470,00	K105+470,00	-5,95	3,25	0,05	-0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #3
K105+470,00	K105+470,00	-6,45	3,00	0,05	-0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #4
K100+630,00	K100+630,00	-7,73	2,50	0,05	-0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+630,00	K100+630,00	-7,04	2,50	0,05	-0,88	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K104+780,00	K104+780,00	-7,20	2,50	0,05	-0,90	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-18,70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	6,90
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	9,90
ACTA PARCIAL NO. 17	8,80
ACTA PARCIAL NO. 18	6,90
ACTA PARCIAL NO. 19	6,00
ACTA PARCIAL NO. 20	12,60
ACTA PARCIAL NO. 21	0,00
ACTA PARCIAL NO. 22	0,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-18,70**
TOTAL ACUMULADO	23,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAR INGENIERIA DE VALOR
ITEM:	49		UNIDAD
640.1 Z3	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa		kg

Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
MUROS							
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
K101+500,00	K101+500,00	1	669,32	5/8"	1,552	1038,63	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 1- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	790,64	1/2"	0,994	785,90	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 2- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	1036,80	1/2"	0,994	1030,38	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 3- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	661,69	5/8"	1,552	1026,94	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 4- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	658,43	5/8"	1,552	1021,88	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 5- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	648,38	5/8"	1,552	1006,29	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 6- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	798,28	5/8"	1,552	1240,48	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 7- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	810,57	5/8"	1,552	1258,00	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 8- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	868,75	5/8"	1,552	1348,30	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 9- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	931,99	5/8"	1,552	1446,31	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 10- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	472,40	5/8"	1,552	733,16	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 11- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	477,20	5/8"	1,552	740,61	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 12- Ver cartilla de despiece
K101+500,00	K101+500,00	1	952,25	5/8"	1,552	1477,89	Acero de refuerzo muro en K101+500 modulo 13- Ver cartilla de despiece
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				14155,00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	399,00
ACTA PARCIAL NO. 7	2039,00
ACTA PARCIAL NO. 8	49256,00
ACTA PARCIAL NO. 9	12919,00
ACTA PARCIAL NO. 10	48136,00
ACTA PARCIAL NO. 11	168,00
ACTA PARCIAL NO. 12	1379,00
ACTA PARCIAL NO. 13	740,00
ACTA PARCIAL NO. 14	1508,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	5527,00
ACTA PARCIAL NO. 17	6176,00
ACTA PARCIAL NO. 18	4280,80
ACTA PARCIAL NO. 19	5231,00
ACTA PARCIAL NO. 20	8759,00
ACTA PARCIAL NO. 21	9427,00
ACTA PARCIAL NO. 22	9083,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**14155,00**
TOTAL ACUMULADO	179262,8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JUAQUIN ANTONIO TIRADO CHIRIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#1 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1. Zarpa	41	2.26						92.66					
Ref 2. Zarpa	40	2.30						92					
Ref. 3 Trasdos	26	2.26						58.76					
Ref 3 Intrados	29	2.60						75.4					
Ref. 4 Vertical	16	6.00						96					
Ref. Longitudinal	6	6.00						36					
Ref. 4 Vertical	38	2.60						98.8					
Ref. Longitudinal	16	6.00						96					
Traslapos	16	1.10						17.6					
Ref. Vertical adicional	2	3.00						6					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	669.22					
Peso en kilos						0.00	0.00	1038.63					
Peso total (kg)			1038.63										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#2 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1. Zarpa	74	2.00					148						
Ref 2. Zarpa	82	2.12					173.84						
Ref. 3	82	2.00					164						
Ref. Longitudinal Zarpa	20	6.00					120						
Ref. Longitudinal	8	6.00					48						
Ref. longitudinal	24	5.70					136.8						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	790.64						
Peso en kilos						0.00	785.90						
Peso total (kg)			785.90										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#3 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1. Zarpa	71	2.55					181.05						
Ref 2. Zarpa	52	2.15					111.8						
Ref. 3 Trasdos	71	2.15					152.65						
Ref 3 Intrados	52	2.30					119.6						
Ref. 4 Vertical	24	6.00					144						
Ref. Longitudinal	8	6.00					48						
Ref. 4 Vertical	52	2.55					132.6						
Ref. Longitudinal	26	5.65					146.9						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	1036.60						
Peso en kilos						0.00	1030.38						
Peso total (kg)			1030.38										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#4 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref longitudinal	40	2.30						92					
Ref 1 y 2. Zarpa	67	2.52						168.84					
Ref. 3 Trasdos	38	2.35						89.3					
Ref. Longitudinal	16	6.00						96					
Ref. Longitudinal	8	6.00						48					
Ref 3 Intrados	29	2.35						68.15					
Ref. longitudinal	16	5.70						91.2					
Ref. longitudinal	2	4.10						8.2					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	661.69					
Peso en kilos						0.00	0.00	1026.94					
Peso total (kg)			1026.94										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#5 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref longitudinal	40	2.60						104					
Ref 1 y 2. Zarpa	38	2.89						109.82					
Ref. 3 Trasdos	29	2.89						83.81					
Ref. Longitudinal	38	2.60						98.8					
Ref 3 Intrados	29	2.60						75.4					
Ref. Longitudinal	8	6.00						48					
Ref. longitudinal	6	6.00						36					
Ref. longitudinal	18	5.70						102.6					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.080	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	658.43					
Peso en kilos						0.00	0.00	1021.88					
Peso total (kg)			1021.88										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#6 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 y 2. Zarpa	40	2.60						104					
Ref. 3 Trasdos	29	2.60						75.4					
Ref 3 Intrados	38	2.60						98.8					
Ref. 4 Vertical	38	2.74						104.12					
Ref. 4 Vertical	29	2.74						79.46					
Ref. longitudinal	8	6.00						48					
Ref. Longitudinal	6	6.00						36					
Ref longitudinal	18	5.70						102.6					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	648.35					
Peso en kilos						0.00	0.00	1006.29					
Peso total (kg)			1006.29										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#7 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 y 2. Zarpa	38	2.80						106.4					
Ref. 3 Trasdos	29	2.35						68.15					
Ref 3 Intrados	38	2.35						89.3					
Ref. 4 Vertical	29	3.29						95.41					
Ref. 4 Vertical	38	3.29						125.02					
Ref. longitudinal	20	2.80						56					
Ref. longitudinal	18	6.00						108					
Ref. Longitudinal	6	6.00						36					
Ref longitudinal	20	5.75						115					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	799.28					
Peso en kilos						0.00	0.00	1240.46					
Peso total (kg)			1240.46										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#8 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 . Zarpa	30	2.80						84					
Ref 2. Zarpa	30	2.80						84					
Ref. 3 Trasdos	29	2.35						68.15					
Ref 3 Intrados	38	2.35						89.3					
Ref. 4 Vertical	29	3.36						97.44					
Ref. 4 Vertical	38	3.36						127.68					
Ref. longitudinal	18	6.00						108					
Ref. Longitudinal	6	6.00						36					
Ref longitudinal	20	5.80						116					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	810.57					
Peso en kilos						0.00	0.00	1258.00					
Peso total (kg)			1258.00										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#9 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 . Zarpa	30	2.80						84					
Ref 2. Zarpa	30	2.80						84					
Ref. 3 Trasdos	38	2.70						102.6					
Ref 3 Intrados	29	2.70						78.3					
Ref. 4 Vertical	38	3.55						134.9					
Ref. 4 Vertical	29	3.55						102.95					
Ref. longitudinal	18	6.00						108					
Ref. Longitudinal	6	6.00						36					
Ref longitudinal	24	5.75						138					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	868.75					
Peso en kilos						0.00	0.00	1348.30					
Peso total (kg)			1348.30										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#10 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
Ref 1 . Zarpa	34	2.80						95.2					
Ref 2. Zarpa	34	2.80						95.2					
Ref. 3 Trasdos	70	2.75						192.5					
Ref 3 Intrados	70	3.42						239.4					
Ref. 4 Vertical	18	6.00						108					
Ref. 4 Vertical	6	6.00						36					
Ref. longitudinal	18	2.40						43.2					
Ref. Longitudinal	6	2.40						14.4					
Ref longitudinal	18	6.00						108					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	931.90					
Peso en kilos						0.00	0.00	1446.31					
Peso total (kg)			1446.31										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#11 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 y 2 . Zarpa	40	2.00						80					
Ref. 3	48	2.35						112.8					
Ref 4. vertical	48	1.90						91.2					
Ref. longitudinal	20	6.00						120					
Ref longitudinal	12	5.70						68.4					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	472.40					
Peso en kilos						0.00	0.00	733.16					
Peso total (kg)			733.16										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#12 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 y 2 . Zarpa	40	2.00						90					
Ref. 3	48	2.00						96					
Ref 4. vertical	48	2.35						112.8					
Ref. longitudinal	20	6.00						120					
Ref longitudinal	12	5.70						68.4					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	477.20					
Peso en kilos						0.00	0.00	740.61					
Peso total (kg)			740.61										

	Nombre	
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: Muro modulo#13 K101+500 CD.
Fecha: Octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
Ref 1 y 2 . Zarpa	56	2.60						145.6					
Ref. 3	99	2.35						232.65					
Ref 4. vertical	19	3.40						64.6					
Ref 4. vertical	99	2.90						287.1					
Ref longitudinal	12	6.00						72					
Ref. longitudinal	22	6.00						132					
Ref. longitudinal	6	3.05						18.3					
								0					
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	0.00	952.25					
Peso en kilos						0.00	0.00	1477.89					
Peso total (kg)			1477.89										

	Nombre		
INGENIERO	ING. JOAQUIN TIBATÁ		

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2892023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	51					UNIDAD
673.2 T3	MATERIAL GRANULAR DRENANTE					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
MUROS							
K105+790,00	K105+790,00	-25,40	0,20	1,03	-5,30	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+790,00	K105+790,00	-25,40	3,14	-0,01	0,24	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+920,00	K104+920,00	-22,20	0,20	1,57	-6,97	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+920,00	K104+920,00	-22,20	3,14	-0,01	0,21	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+840,00	K104+840,00	-12,10	0,20	1,45	-3,51	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+840,00	K104+840,00	-12,10	3,14	-0,01	0,11	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+500,00	K103+500,00	-7,07	0,20	1,80	-2,55	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+500,00	K103+500,00	-7,07	3,14	-0,01	0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+210,00	K103+210,00	-6,34	0,20	1,53	-1,94	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+210,00	K103+210,00	-6,34	3,14	-0,01	0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+260,00	K105+260,00	-9,55	0,20	2,52	-4,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+260,00	K105+260,00	-9,55	3,14	-0,01	0,09	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+170,00	K105+170,00	-3,74	0,20	2,75	-2,06	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+170,00	K105+170,00	-3,74	3,14	-0,01	0,04	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+560,00	K104+560,00	-9,15	0,20	1,70	-3,11	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+560,00	K104+560,00	-9,15	3,14	-0,01	0,09	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+064,00	K104+064,00	-12,20	0,20	1,45	-3,54	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+064,00	K104+064,00	-12,20	3,14	-0,01	0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+910,00	K103+910,00	-10,10	0,20	1,40	-2,83	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+910,00	K103+910,00	-10,10	3,14	-0,01	0,10	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+720,00	K100+720,00	-13,03	0,20	1,04	-2,71	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+720,00	K100+720,00	-13,03	3,14	-0,01	0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+740,00	K103+740,00	-6,16	0,20	1,20	-1,48	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+740,00	K103+740,00	-6,16	3,14	-0,01	0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+670,00	K104+670,00	-11,80	2,00	0,15	-3,54	DERECHA	Filtro tubería de 36"
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K100+690,00	K100+690,00	-12,60	0,20	2,21	-5,57	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+690,00	K100+690,00	-12,60	3,14	-0,01	0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+650,00	K101+650,00	-11,70	0,20	1,20	-2,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+650,00	K101+650,00	-11,70	3,14	-0,01	0,11	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+130,00	K102+130,00	-5,75	0,20	1,30	-1,50	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+130,00	K102+130,00	-5,75	3,14	-0,01	0,05	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+310,00	K102+310,00	-15,60	0,20	0,90	-2,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+310,00	K102+310,00	-15,60	3,14	-0,01	0,15	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+170,00	K105+170,00	-6,90	0,20	2,30	-3,17	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+170,00	K105+170,00	-6,90	3,14	-0,01	0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+480,00	K104+480,00	-18,10	0,20	2,30	-4,65	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+480,00	K104+480,00	-18,10	3,14	-0,01	0,10	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+210,00	K101+210,00	-13,50	0,20	1,55	-4,19	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+210,00	K101+210,00	-13,50	3,14	-0,01	0,13	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+320,00	K101+320,00	-8,15	0,20	0,92	-1,13	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+320,00	K101+320,00	-8,15	3,14	-0,01	0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+780,00	K104+780,00	-7,80	0,20	1,10	-1,72	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+780,00	K104+780,00	-7,80	3,14	-0,01	0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+480,00	K105+480,00	-23,55	0,20	2,03	-9,66	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+480,00	K105+480,00	-23,55	3,14	-0,01	0,22	DERECHA	Descuento tubería de 4"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-83,10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	47,00
ACTA PARCIAL NO. 20	36,10
ACTA PARCIAL NO. 21	0,00
ACTA PARCIAL NO. 22	0,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-83,10**
TOTAL ACUMULADO	0,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	53	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
MUROS							
K102+470,00	K102+470,00	11,55	0,20	1,52	39,73	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+700,00	K103+780,00	25,50	0,20	1,04	63,24	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+060,00	K104+060,00	21,20	0,20	0,70	38,16	DERECHA	Filtro longitudinal muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				141,10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	525,20
ACTA PARCIAL NO. 20	417,30
ACTA PARCIAL NO. 21	224,40
ACTA PARCIAL NO. 22	428,50
ACTA PARCIAL NO. 23	**141,10**
TOTAL ACUMULADO	1736,5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAZA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	54	UNIDAD
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"	m

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
MUROS							
K102+470,00	K102+470,00	11,55			11,55	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+700,00	K103+700,00	25,50			25,50	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+060,00	K104+060,00	21,20			21,20	DERECHA	Filtro longitudinal muro
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				58,30			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	137,90
ACTA PARCIAL NO. 20	113,70
ACTA PARCIAL NO. 21	55,70
ACTA PARCIAL NO. 22	134,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**58,30**
TOTAL ACUMULADO	499,7

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobernación de Caldas

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRIMERA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRIMACTA DE OBRA No:	23 (ACTA 1	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2400222-1854	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	107 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERÍA DE VALOR

ITEM		UNIDAD:
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 23

ABSCISA DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	K107+220,00							
ABSCISA ESC	ABSCISA FIN	LONG/LONG/ KM	CENTRO DE GRAV.	VOLUMEN BANCO (M3)	MARGEN	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
LLENOS DE AFIRDS								
K107+220,00	K102+470,00	4750,00	K102+470,00	67,27	D/I	4,75	319,16	Transporte material de prestamo para el K102+470,00
K107+220,00	K102+470,00	4750,00	K102+470,00	-3,91	D/I	4,75	-18,57	Transporte material de prestamo para el K102+470,00
K107+220,00	K103+700,00	3520,00	K103+700,00	102,82	D/I	3,49	358,84	Transporte material de prestamo para el K103+700,00
K107+220,00	K103+700,00	3520,00	K103+700,00	-5,03	D/I	3,49	-18,03	Transporte material de prestamo para el K103+700,00
K107+220,00	K104+660,00	2560,00	K104+660,00	61,90	D/I	2,59	187,16	Transporte material de prestamo para el K104+660,00
K107+220,00	K104+660,00	2560,00	K104+660,00	-2,97	D/I	2,59	-9,20	Transporte material de prestamo para el K104+660,00
FILLINGS								
K107+220,00	K98+039,50	9180,50	K98+039,50	1,50	D/I	9,18	41,41	Transporte material de prestamo para el K98+039,50
K107+220,00	K98+125,00	9094,00	K98+126,00	3,15	D/I	9,09	85,60	Transporte material de prestamo para el K98+126,00
K107+220,00	K98+206,50	9013,50	K98+206,50	1,35	D/I	9,00	40,50	Transporte material de prestamo para el K98+206,50
K107+220,00	K98+283,00	8937,00	K98+283,00	0,92	D/I	8,90	8,01	Transporte material de prestamo para el K98+286,00
K107+220,00	K98+319,50	8900,50	K98+316,50	1,13	D/I	8,86	39,98	Transporte material de prestamo para el K98+316,50
K107+220,00	K98+553,50	8667,50	K98+553,50	2,60	D/I	8,63	43,00	Transporte material de prestamo para el K98+553,00
K107+220,00	K98+640,50	8579,50	K98+640,50	2,75	D/I	8,55	23,30	Transporte material de prestamo para el K98+640,00
K107+220,00	K99+102,50	8117,50	K99+102,50	3,05	D/I	8,09	24,40	Transporte material de prestamo para el K99+100,00
K107+220,00	K99+176,50	8043,50	K99+176,50	2,63	D/I	7,99	28,84	Transporte material de prestamo para el K99+176,50
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				1690,35				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	369,22
ACTA PARCIAL NO. 7	8738,06
ACTA PARCIAL NO. 8	49258,20
ACTA PARCIAL NO. 9	12519,10
ACTA PARCIAL NO. 10	49390,00
ACTA PARCIAL NO. 11	168,00
ACTA PARCIAL NO. 12	1370,00
ACTA PARCIAL NO. 13	-378,50
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	4414,20
ACTA PARCIAL NO. 20	13235,95
ACTA PARCIAL NO. 21	11411,40
ACTA PARCIAL NO. 22	-606,10
ACTA PARCIAL NO. 23	**1690,35**
TOTAL ACUMULADO	343535,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERÍA DE VALOR
INTERVENTORÍA

ING. ERNESTO ANTONIO VIRATA CRIVIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SUPÍA, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SUPÍA, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	23-00000-3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2602023-1156	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MSM INGENIERIA DE VALOR
ITEM: NP 213.1	70 MOVILIZACION DE EQUIPOS	UNIDAD:	GL

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 23

ABS INICIAL	ABS FINAL		VECES	VOLUMEN		TOTAL	MARGEN	DESCRIPCION	
DERRUMBE EN VIA									
K104+000	K104+000		43,00	17,00		731,00	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K104+000	K104+000		7,00	14,00		98,00	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K103+500	K103+500		1,00	14,00		14,00	DVI	Derrumbe en via	K103+500,00
K104+000	K104+000		26,00	13,16		342,16	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K104+000	K104+000		53,00	12,55		665,15	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K104+760	K104+760		9,00	11,67		105,03	DVI	Derrumbe en via	K104+760,00
K098+160	K098+160		7,00	14,00		98,00	DVI	Derrumbe en via	K098+160,00
K100+000	K100+000		8,00	14,02		112,02	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+180	K098+180		13,00	11,31		147,03	DVI	Derrumbe en via	K098+180,00
K104+000	K104+000		12,00	14,05		168,60	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K103+450	K103+450		2,00	14,02		28,03	DVI	Derrumbe en via	K103+450,00
K105+200	K105+200		4,00	14,02		56,07	DVI	Derrumbe en via	K105+200,00
K104+000	K104+000		4,00	14,00		56,00	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K100+000	K100+000		20,00	13,60		272,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+150	K098+150		5,00	14,00		14,00	DVI	Derrumbe en via	K098+150,00
K101+900	K101+900		8,00	14,00		112,00	DVI	Derrumbe en via	K101+900,00
K099+530	K099+530		8,00	14,00		112,00	DVI	Derrumbe en via	K099+530,00
K099+180	K099+180		9,00	12,44		111,96	DVI	Derrumbe en via	K099+180,00
K100+000	K100+000		3,00	7,02		21,07	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K100+000	K100+000		1,00	14,00		14,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+080	K098+080		3,00	14,00		42,00	DVI	Derrumbe en via	K098+080,00
K098+120	K098+120		17,00	13,59		231,00	DVI	Derrumbe en via	K098+120,00
K098+120	K098+120		8,00	14,00		84,00	DVI	Derrumbe en via	K098+120,00
K098+530	K098+530		11,00	14,00		154,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+530	K098+530		1,00	14,00		14,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K096+100	K098+100		3,00	7,03		21,09	DVI	Derrumbe en via	K098+100,00
K098+530	K098+530		10,00	12,40		124,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K100+000	K100+000		22,00	14,00		308,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+530	K098+530		18,00	14,00		252,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+530	K098+530		21,00	13,33		279,93	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+530	K098+530		5,00	14,00		70,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+170	K098+170		2,00	14,00		28,00	DVI	Derrumbe en via	K098+170,00
K098+450	K098+450		9,00	14,00		126,00	DVI	Derrumbe en via	K098+450,00
K098+680	K098+680		6,00	14,00		84,00	DVI	Derrumbe en via	K098+680,00
K100+000	K100+000		13,00	14,00		182,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+800	K098+800		9,00	14,00		126,00	DVI	Derrumbe en via	K098+800,00
K098+250	K098+250		4,00	10,00		40,00	DVI	Derrumbe en via	K098+250,00
K098+530	K098+530		2,00	14,00		28,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+680	K098+680		8,00	13,13		105,04	DVI	Derrumbe en via	K098+680,00
K098+800	K098+800		5,00	14,00		70,00	DVI	Derrumbe en via	K098+800,00
K100+000	K100+000		7,00	14,00		98,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K098+800	K098+800		6,00	14,00		84,00	DVI	Derrumbe en via	K098+800,00
K098+500	K098+500		15,00	14,00		210,00	DVI	Derrumbe en via	K098+500,00
K099+500	K099+500		53,00	14,00		742,00	DVI	Derrumbe en via	K099+500,00
K098+650	K098+650		4,00	14,00		56,00	DVI	Derrumbe en via	K098+650,00
K098+270	K098+270		6,00	8,40		48,00	DVI	Derrumbe en via	K098+270,00
K100+000	K100+000		9,00	14,00		126,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
K099+500	K099+500		15,00	14,00		210,00	DVI	Derrumbe en via	K099+500,00
K100+150	K100+150		4,00	14,02		56,10	DVI	Derrumbe en via	K100+150,00
K100+150	K100+150		6,00	14,00		84,00	DVI	Derrumbe en via	K100+150,00
K099+500	K099+500		4,00	14,02		56,10	DVI	Derrumbe en via	K099+500,00
K101+170	K101+170		11,00	14,02		154,03	DVI	Derrumbe en via	K101+170,00
K101+250	K101+250		7,00	14,02		98,10	DVI	Derrumbe en via	K101+250,00
K101+950	K101+950		1,00	14,02		14,00	DVI	Derrumbe en via	K101+950,00
K101+500	K101+500		11,00	14,02		154,03	DVI	Derrumbe en via	K101+500,00
K101+560	K101+560		13,00	14,02		182,07	DVI	Derrumbe en via	K101+560,00
K101+960	K101+960		19,00	14,02		266,30	DVI	Derrumbe en via	K101+960,00
K104+000	K104+000		33,00	14,02		462,60	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K101+560	K101+560		5,00	14,02		70,10	DVI	Derrumbe en via	K101+560,00
K104+000	K104+000		39,00	14,02		546,80	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K097+950	K097+950		14,00	13,02		182,30	DVI	Derrumbe en via	K097+950,00
K097+700	K097+700		2,00	14,01		28,02	DVI	Derrumbe en via	K097+700,00
K097+500	K097+500		3,00	14,02		42,10	DVI	Derrumbe en via	K097+500,00
K097+500	K097+500		4,00	12,25		49,00	DVI	Derrumbe en via	K097+500,00
K104+000	K104+000		11,00	14,05		154,60	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K102+830	K102+830		7,00	14,02		98,20	DVI	Derrumbe en via	K102+830,00
K097+500	K097+500		5,00	14,05		70,20	DVI	Derrumbe en via	K097+500,00
K098+820	K098+820		11,00	14,05		154,60	DVI	Derrumbe en via	K098+820,00
K098+330	K098+330		5,00	14,05		70,20	DVI	Derrumbe en via	K098+330,00
K104+600	K104+600		21,00	14,05		295,07	DVI	Derrumbe en via	K104+600,00
K104+600	K104+600		3,00	14,05		42,20	DVI	Derrumbe en via	K104+600,00
K098+540	K098+540		3,00	7,00		21,00	DVI	Derrumbe en via	K098+540,00
K104+600	K104+600		7,00	14,02		98,20	DVI	Derrumbe en via	K104+600,00
K104+000	K104+000		5,00	12,02		60,10	DVI	Derrumbe en via	K104+000,00
K098+530	K098+530		2,00	14,02		28,10	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+530	K098+530		1,00	7,00		7,00	DVI	Derrumbe en via	K098+530,00
K098+250	K098+250		3,00	14,02		42,10	DVI	Derrumbe en via	K098+250,00
K100+000	K100+000		1,00	7,00		7,00	DVI	Derrumbe en via	K100+000,00
MES TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				10507,00					

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	2814,00
ACTA PARCIAL NO. 8	3826,00
ACTA PARCIAL NO. 9	2130,00
ACTA PARCIAL NO. 10	2838,00
ACTA PARCIAL NO. 11	140,00
ACTA PARCIAL NO. 12	5170,00
ACTA PARCIAL NO. 13	4336,40
ACTA PARCIAL NO. 14	13760,00
ACTA PARCIAL NO. 15	8210,50
ACTA PARCIAL NO. 16	5950,00
ACTA PARCIAL NO. 17	1024,00
ACTA PARCIAL NO. 18	4271,40
ACTA PARCIAL NO. 19	6941,00
ACTA PARCIAL NO. 20	4774,00
ACTA PARCIAL NO. 21	5012,00
ACTA PARCIAL NO. 22	9234,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**10507,00**
TOTAL ACUMULADO	130028,8

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MSM INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ARCHILA ZABATA CASTIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM:	75		UNIDAD
NP 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 23							
MUROS							
K102+470,00	K102+470,00	11,55	3,20	1,82	67,27	DERECHA	Relleno de MURO
K102+470,00	K102+470,00	11,55	0,20	1,52	-3,51	DERECHA	Descuento filtro muro
K103+700,00	K103+700,00	25,50	3,00	1,34	102,51	DERECHA	Relleno de MURO
K103+700,00	K103+700,00	25,50	0,20	1,04	-5,30	DERECHA	Descuento filtro muro
K104+060,00	K104+060,00	21,20	3,00	1,00	63,60	DERECHA	Relleno de MURO
K104+060,00	K104+060,00	21,20	0,20	0,70	-2,97	DERECHA	Descuento filtro muro
FILTROS							
K97+994,00	K98+085,00	91,00	0,10	0,50	4,55	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+082,00	K98+160,00	68,00	0,10	0,50	3,49	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+181,00	K98+252,00	91,00	0,10	0,50	4,55	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+254,00	K98+272,00	18,00	0,10	0,50	0,90	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+272,00	K98+361,00	89,50	0,10	0,50	4,48	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+503,00	K98+603,00	100,00	0,10	0,50	5,00	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K98+613,00	K98+668,00	55,00	0,10	0,50	2,75	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K99+065,00	K99+140,00	61,00	0,10	0,50	3,05	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
K99+140,00	K99+213,00	73,00	0,10	0,50	3,65	IZQUIERDA	LLENO DE COBERTURA SOBRE FILTRO
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				253,9			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	628,30
ACTA PARCIAL NO. 8	758,30
ACTA PARCIAL NO. 9	705,30
ACTA PARCIAL NO. 10	714,00
ACTA PARCIAL NO. 11	231,30
ACTA PARCIAL NO. 12	427,00
ACTA PARCIAL NO. 13	223,30
ACTA PARCIAL NO. 14	27,90
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	99,20
ACTA PARCIAL NO. 19	695,00
ACTA PARCIAL NO. 20	628,30
ACTA PARCIAL NO. 21	283,60
ACTA PARCIAL NO. 22	745,50
ACTA PARCIAL NO. 23	**253,90**
TOTAL ACUMULADO	6421,3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIZA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE

GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Infraestructura
Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DOBLE - DOBLÓN, RUTA DEL REMACHEMENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DOBLE - DOBLÓN, RUTA DEL REMACHEMENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PLANILLA DE OBRA No:	23 (VEINTE Y TRES)	FECHA:	30/10/2023
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023		
CONTRATO DE OBRA No:	2909023-1434	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ÍTEM	32	UNIDAD	
PP 932.5.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE DIEZ METROS (100 m)		m3/Km

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 23

DERRUMBE EN VIA

ABSCISA INICIO TRO	K107+660,00							
ABSCISA INI	ABSCISA FIN	UNID/LONG/KG	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN SUELTO (M3)	MASAS	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
K104+000,00	K107+560,00		K104+097,25	559,66	D-1	3,50	1.959,31	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+000,00	K107+560,00		K104+065,75	542,06	D-1	3,50	1.897,21	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+000,00	K107+560,00		K104+040,75	480,19	D-2	5,00	2.400,95	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+000,00	K107+560,00		K104+017,50	185,08	D-2	2,70	499,72	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K98+192,00	K107+560,00		K098+191,50	96,00	D-1	5,00	480,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K107+560,00	K107+560,00		K107+560,00	112,00	D-2	1,00	112,00	Traslado mat. derrumbe K98+192,00
K98+192,00	K107+560,00		K098+380,10	159,05	D-1	5,00	795,25	Traslado mat. derrumbe K107+560,00
K104+000,00	K107+560,00		K104+001,50	168,00	D-1	5,00	840,00	Traslado mat. derrumbe K98+192,00
K103+470,00	K107+560,00		K103+490,50	28,00	D-1	4,00	112,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K103+210,00	K107+560,00		K103+201,50	56,00	D-1	4,20	235,20	Traslado mat. derrumbe K103+470,00
K102+255,00	K107+560,00		K102+256,50	98,00	D-1	3,50	136,00	Traslado mat. derrumbe K103+210,00
K100+277,00	K107+560,00		K100+300,00	272,00	D-1	3,50	952,00	Traslado mat. derrumbe K102+255,00
K99+150,00	K107+560,00		K099+150,00	14,00	D-1	3,50	49,00	Traslado mat. derrumbe K100+277,00
K98+931,00	K107+560,00		K098+950,00	56,00	D-1	3,50	196,00	Traslado mat. derrumbe K99+150,00
K98+590,00	K104+560,00		K098+630,00	112,00	D-1	3,50	392,00	Traslado mat. derrumbe K98+931,00
K98+260,00	K104+560,00		K098+240,00	111,36	D-1	3,50	389,76	Traslado mat. derrumbe K98+590,00
K100+210,00	K104+560,00		K100+205,00	21,00	D-1	3,50	73,50	Traslado mat. derrumbe K98+260,00
K100+210,00	K104+560,00		K100+200,00	14,00	D-1	3,50	49,00	Traslado mat. derrumbe K100+210,00
K98+440,00	K104+560,00		K098+460,00	42,00	D-1	3,50	147,00	Traslado mat. derrumbe K100+210,00
K98+260,00	K104+560,00		K098+120,00	791,03	D-1	3,50	2769,61	Traslado mat. derrumbe K98+440,00
K98+326,00	K104+560,00		K098+325,00	84,00	D-1	3,50	294,00	Traslado mat. derrumbe K98+260,00
K98+326,00	K104+560,00		K098+330,00	264,00	D-1	3,50	924,00	Traslado mat. derrumbe K98+326,00
K98+531,00	K104+560,00		K098+535,00	14,00	D-1	3,50	49,00	Traslado mat. derrumbe K98+531,00
K98+531,00	K104+560,00		K098+535,00	14,00	D-1	3,50	49,00	Traslado mat. derrumbe K98+531,00
K98+590,00	K104+560,00		K098+570,00	126,00	D-1	3,50	441,00	Traslado mat. derrumbe K98+531,00
K98+590,00	K104+560,00		K098+535,00	378,00	D-1	3,50	1323,00	Traslado mat. derrumbe K98+590,00
K104+603,00	K104+560,00		K104+600,00	196,00	D-1	3,50	686,00	Traslado mat. derrumbe K98+590,00
K98+590,00	K104+560,00		K098+630,00	224,00	D-1	3,50	784,00	Traslado mat. derrumbe K104+603,00
K98+531,00	K104+560,00		K098+530,00	210,00	D-1	3,50	735,00	Traslado mat. derrumbe K98+590,00
K98+531,00	K104+560,00		K098+530,00	70,00	D-1	3,50	245,00	Traslado mat. derrumbe K98+531,00
K98+170,00	K104+560,00		K098+170,00	28,00	D-1	3,50	98,00	Traslado mat. derrumbe K98+531,00
K98+170,00	K104+560,00		K098+190,00	126,00	D-1	3,50	441,00	Traslado mat. derrumbe K98+170,00
K98+490,00	K104+560,00		K098+485,00	70,00	D-1	3,50	245,00	Traslado mat. derrumbe K98+170,00
K98+490,00	K104+560,00		K098+485,00	182,00	D-1	3,50	637,00	Traslado mat. derrumbe K98+490,00
K98+800,00	K104+560,00		K098+795,00	42,00	D-1	3,50	147,00	Traslado mat. derrumbe K98+490,00
K98+800,00	K104+560,00		K098+795,00	42,00	D-1	3,50	147,00	Traslado mat. derrumbe K98+800,00
K99+500,00	K104+560,00		K099+500,00	210,00	D-1	3,50	735,00	Traslado mat. derrumbe K98+800,00
K99+500,00	K104+560,00		K099+500,00	182,00	D-1	3,50	637,00	Traslado mat. derrumbe K99+500,00
K99+650,00	K104+560,00		K099+650,00	28,00	D-1	3,50	98,00	Traslado mat. derrumbe K99+500,00
K99+650,00	K104+560,00		K099+650,00	84,00	D-1	3,50	294,00	Traslado mat. derrumbe K99+650,00
K100+210,00	K104+560,00		K100+200,00	105,00	D-1	3,50	367,50	Traslado mat. derrumbe K99+650,00
K100+500,00	K104+560,00		K100+500,00	700,00	D-1	3,50	2450,00	Traslado mat. derrumbe K100+210,00
K100+150,00	K104+560,00		K100+150,00	56,00	D-1	3,50	196,00	Traslado mat. derrumbe K100+500,00
K100+150,00	K104+560,00		K100+150,00	84,00	D-1	3,50	294,00	Traslado mat. derrumbe K100+150,00
K99+500,00	K104+560,00		K099+520,00	56,00	D-1	3,50	196,00	Traslado mat. derrumbe K100+150,00
K103+170,00	K104+560,00		K103+165,00	154,00	D-1	3,50	539,00	Traslado mat. derrumbe K99+500,00
K103+255,00	K104+560,00		K103+260,00	98,00	D-1	3,50	343,00	Traslado mat. derrumbe K103+170,00
K103+470,00	K104+560,00		K103+470,00	14,00	D-1	3,50	49,00	Traslado mat. derrumbe K103+255,00
K103+520,00	K104+560,00		K103+515,00	154,00	D-1	4,00	616,00	Traslado mat. derrumbe K103+470,00
K103+560,00	K104+560,00		K103+545,00	182,00	D-1	5,00	910,00	Traslado mat. derrumbe K103+520,00
K103+560,00	K104+560,00		K103+560,00	266,00	D-1	5,00	1330,00	Traslado mat. derrumbe K103+560,00
K104+000,00	K104+560,00		K104+000,00	462,00	D-1	5,00	2310,00	Traslado mat. derrumbe K103+560,00
K104+560,00	K104+560,00		K104+545,00	70,00	D-1	5,00	350,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+000,00	K104+560,00		K104+011,00	546,00	D-1	5,00	2731,00	Traslado mat. derrumbe K104+560,00
K97+650,00	K104+560,00		K097+650,00	49,00	D-1	5,00	245,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+000,00	K104+560,00		K104+000,00	196,00	D-1	5,00	980,00	Traslado mat. derrumbe K97+650,00
K104+832,00	K104+560,00		K104+830,00	98,00	D-1	5,00	490,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K104+832,00	K104+560,00		K104+832,00	28,00	D-1	5,00	140,00	Traslado mat. derrumbe K104+832,00
K96+920,00	K104+560,00		K096+920,00	154,00	D-1	5,00	770,00	Traslado mat. derrumbe K104+832,00
K96+931,00	K104+560,00		K096+931,00	70,00	D-1	5,00	350,00	Traslado mat. derrumbe K96+920,00
K104+600,00	K104+560,00		K104+595,00	364,00	D-1	5,00	1820,00	Traslado mat. derrumbe K96+931,00
K104+600,00	K104+560,00		K104+602,00	42,00	D-1	5,00	210,00	Traslado mat. derrumbe K104+600,00
K99+931,00	K104+560,00		K099+900,00	21,00	D-1	5,00	105,00	Traslado mat. derrumbe K104+600,00
K104+600,00	K104+560,00		K104+602,00	98,00	D-1	5,00	490,00	Traslado mat. derrumbe K104+600,00
K104+600,00	K104+560,00		K104+602,00	63,00	D-1	5,00	315,00	Traslado mat. derrumbe K104+600,00
K99+931,00	K104+560,00		K099+932,00	28,00	D-1	5,00	140,00	Traslado mat. derrumbe K104+600,00
K99+931,00	K104+560,00		K099+930,00	7,00	D-1	5,00	35,00	Traslado mat. derrumbe K99+931,00
K96+931,00	K104+560,00		K096+931,00	42,00	D-1	5,00	210,00	Traslado mat. derrumbe K99+931,00
K107+260,00	K104+560,00		K107+260,00	7,00	D-1	5,00	35,00	Traslado mat. derrumbe K104+000,00

ABSCISA ZONAS CORTAS	K98+900,00							
ABSCISA INI	ABSCISA FIN	UNID/LONG/KG	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN SUELTO (M3)	MASAS	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripción
K104+000,00	K98+900,00		K104+000,00	98,00	D-1	2,75	1.372,50	Traslado mat. derrumbe K104+000,00
K103+560,00	K98+900,00		K103+560,00	28,00	D-1	13,25	386,75	Traslado mat. derrumbe K103+560,00
K97+650,00	K98+900,00		K097+650,00	189,00	D-1	5,80	1.174,20	Traslado mat. derrumbe K97+650,00
K97+650,00	K98+900,00		K097+650,00	28,00	D-1	5,80	203,00	Traslado mat. derrumbe K97+650,00
K97+650,00	K98+900,00		K097+650,00	42,00	D-1	5,80	304,50	Traslado mat. derrumbe K97+650,00
K97+650,00	K98+900,00		K097+650,00	70,00	D-1	5,80	507,50	Traslado mat. derrumbe K97+650,00

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	4243,00
ACTA PARCIAL NO. 8	4994,00
ACTA PARCIAL NO. 9	1350,00
ACTA PARCIAL NO. 10	6909,00
ACTA PARCIAL NO. 11	3672,00
ACTA PARCIAL NO. 12	6978,00
ACTA PARCIAL NO. 13	13580,00
ACTA PARCIAL NO. 14	36277,00
ACTA PARCIAL NO. 15	30573,00
ACTA PARCIAL NO. 16	47222,00
ACTA PARCIAL NO. 17	62184,00
ACTA PARCIAL NO. 18	35892,00
ACTA PARCIAL NO. 19	31832,00
ACTA PARCIAL NO. 20	14021,00
ACTA PARCIAL NO. 21	25144,00
ACTA PARCIAL NO. 22	39182,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**42184,00**
TOTAL ACUMULADO	417600,00

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO VIRATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	0. AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2202023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1671 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	BZ	UNIDAD
NP 600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA PARA ESTRUCTURAS INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO AUTORIZADAS	m3

ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23

FILTROS

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Margen	Cantidad	Descripción
#¡REF!	K98+085	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K98+160	K98+160	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K98+238	K98+252	13,65	0,50	0,80	I	5,46	Excavación filtros
K98+269	K98+272	2,40	0,50	0,80	I	1,08	Excavación filtros
K98+361	K98+361	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K98+403	K98+403	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K98+668	K98+668	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K99+140	K99+140	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
K99+213	K99+213	0,00	0,50	0,80	I	0,00	Excavación filtros
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23					6,50		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	532,10
ACTA PARCIAL NO. 14	74,12
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	57,10
ACTA PARCIAL NO. 18	38,50
ACTA PARCIAL NO. 19	0,00
ACTA PARCIAL NO. 20	0,00
ACTA PARCIAL NO. 21	136,80
ACTA PARCIAL NO. 22	147,20
ACTA PARCIAL NO. 23	**6,50**
TOTAL ACUMULADO	974,3

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	33 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2809202З-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	84						UNIDAD
NP630.3.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 280Kpa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS							
K101+450,00	K101+450,00	-3,07	0,20	1,27	-0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+450,00	K101+450,00	-2,30	0,45	1,80	-1,86	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+450,00	K101+450,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+450,00	K101+450,00	-2,30	0,45	1,80	-1,86	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+450,00	K101+450,00	-1,80	0,50	2,86	-2,57	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+450,00	K101+450,00	-4,34	0,25	0,30	-0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+450,00	K101+450,00	-3,14	-0,50	0,49	0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K101+450,00	K101+450,00	-1,80	0,25	1,80	-0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+450,00	K101+450,00	-2,98	0,20	1,90	-0,69	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+450,00	K101+450,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+450,00	K101+450,00	-2,95	0,20	1,40	-0,57	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+450,00	K101+450,00	-1,80	0,20	2,75	-0,99	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+450,00	K101+450,00	-1,80	0,20	2,50	-0,90	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+450,00	K101+450,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+740,00	K101+740,00	-3,07	0,20	1,27	-0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,00	-1,80	0,45	2,80	-2,27	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,00	-2,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+740,00	K101+740,00	-1,80	0,45	2,70	-2,19	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,00	-3,40	0,50	1,80	-3,06	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,00	-4,34	0,25	0,30	-0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,00	-3,14	-0,50	0,49	0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K101+662,00	K101+662,00	-1,80	0,25	1,80	-0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+662,00	K101+662,00	-1,74	0,20	1,40	-0,49	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+662,00	K101+662,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+662,00	K101+662,00	-1,72	0,20	1,40	-0,48	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+662,00	K101+662,00	-1,80	0,20	2,50	-0,90	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+662,00	K101+662,00	-1,80	2,35	0,20	-0,85	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+662,00	K101+662,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K103+910,00	K103+910,00	-1,80	0,25	1,80	-0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K103+910,00	K103+910,00	-1,62	0,20	1,40	-0,45	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K103+910,00	K103+910,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K103+910,00	K103+910,00	-1,65	0,20	1,40	-0,46	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K103+910,00	K103+910,00	-1,80	0,20	2,26	-0,81	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K103+910,00	K103+910,00	-1,80	0,20	2,20	-0,79	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K103+910,00	K103+910,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K104+260,00	K104+260,00	-1,80	0,25	1,80	-0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K104+260,00	K104+260,00	-2,10	0,20	1,40	-0,59	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K104+260,00	K104+260,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K104+260,00	K104+260,00	-2,08	0,20	1,40	-0,58	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K104+260,00	K104+260,00	-1,80	0,20	2,40	-0,86	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K104+260,00	K104+260,00	-2,80	0,20	2,54	-0,91	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K104+266,00	K104+260,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K104+662,00	K104+662,00	-2,45	0,20	1,27	-0,62	DERECHA	Losa cabezal de salida
K104+662,00	K104+662,00	-1,80	0,45	1,92	-1,56	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K104+662,00	K104+662,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K104+662,00	K104+662,00	-1,60	0,45	2,02	-1,45	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K104+662,00	K104+662,00	-2,90	0,50	1,80	-2,61	DERECHA	Muro cabezal de salida
K104+662,00	K104+662,00	-3,10	0,25	0,30	-0,23	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K104+662,00	K104+662,00	-3,14	-0,50	0,49	0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K105+950,00	K105+950,00	-1,80	0,25	1,80	-0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K105+950,00	K105+950,00	-2,40	0,45	2,80	-3,02	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K105+950,00	K105+950,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K105+950,00	K105+950,00	-2,40	0,45	2,80	-3,02	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K105+950,00	K105+950,00	-3,47	0,50	1,80	-3,12	DERECHA	Muro cabezal de salida
K105+950,00	K105+950,00	-3,14	-0,50	0,49	0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"

AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
ALCANTARILLAS							
K103+510,00	K103+518,00	-2,90	0,25	1,64	-1,19	DERECHA	Losa cabezal de salida
K103+510,00	K103+518,00	-2,08	0,45	2,05	-1,92	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K103+510,00	K103+518,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K103+510,00	K103+518,00	-3,20	0,45	2,25	-3,24	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K103+510,00	K103+518,00	-1,84	0,50	2,40	-2,21	DERECHA	Muro cabezal de salida
K103+510,00	K103+518,00	-4,10	0,20	1,66	-1,36	DERECHA	pantalla
K103+510,00	K103+518,00	-3,14	-0,20	0,49	0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+623,00	K102+623,00	-1,80	1,80	0,25	-0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	-1,40	0,20	2,17	-0,61	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+623,00	K102+623,00	-1,40	0,20	2,17	-0,61	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	-1,80	0,20	2,61	-0,94	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	-1,80	0,20	2,72	-0,98	DERECHA	Muro espaldar
K102+623,00	K102+623,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+745,00	K102+745,00	-1,80	1,80	0,25	-0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	-1,40	0,20	2,52	-0,71	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+745,00	K102+745,00	-1,40	0,20	2,16	-0,60	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	-1,80	0,20	2,58	-0,93	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	-1,80	0,20	2,52	-0,91	DERECHA	Muro espaldar
K102+745,00	K102+745,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K103+600,00	K103+600,00	-1,80	1,80	0,25	-0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	-1,40	0,20	2,10	-0,59	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K103+600,00	K103+600,00	-1,40	0,20	2,10	-0,59	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	-1,80	0,20	2,50	-0,90	DERECHA	Muro cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	-1,80	0,20	2,65	-0,96	DERECHA	Muro espaldar
K103+600,00	K103+600,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+445,00	K100+445,00	-1,80	1,80	0,25	-0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	-1,40	0,20	1,95	-0,55	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	-1,00	-0,20	0,40	0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+445,00	K100+445,00	-1,40	0,20	1,80	-0,50	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	-1,80	0,20	2,43	-0,87	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	-1,80	0,20	2,55	-0,92	DERECHA	Muro espaldar
K102+445,00	K100+445,00	-3,14	-0,20	0,49	0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-68,10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	46,10
ACTA PARCIAL NO. 12	27,50
ACTA PARCIAL NO. 13	82,40
ACTA PARCIAL NO. 14	31,70
ACTA PARCIAL NO. 15	36,70
ACTA PARCIAL NO. 16	28,30
ACTA PARCIAL NO. 17	41,40
ACTA PARCIAL NO. 18	72,60
ACTA PARCIAL NO. 19	44,20
ACTA PARCIAL NO. 20	23,90
ACTA PARCIAL NO. 21	3,90
ACTA PARCIAL NO. 22	3,90
ACTA PARCIAL NO. 23	**-68,10**
TOTAL ACUMULADO	346,7

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	23092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	87						UNIDAD
NP630.4.2 T3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
MUROS							
K101+210,00	K101+210,00	-7,64	0,35	2,98	-7,97	DERECHA	Vastago modulo 1
K101+210,00	K101+210,00	-6,40	2,65	0,45	-7,63	DERECHA	Zarpa modulo 1
K101+210,00	K101+210,00	-6,20	0,35	2,90	-6,29	DERECHA	Vastago modulo 2
K101+210,00	K101+210,00	-7,25	2,90	0,50	-10,51	DERECHA	Zarpa modulo 2
K102+320,00	K102+320,00	-9,50	3,14	-0,21	9,32	DERECHA	Zarpa modulo 1
K102+320,00	K102+320,00	-7,80	0,30	2,32	-5,43	DERECHA	Vastago modulo 2
K102+320,00	K102+320,00	-7,74	0,45	2,40	-8,36	DERECHA	Zarpa modulo 2
K102+320,00	K102+320,00	-7,80	0,30	2,07	-4,84	DERECHA	Vastago modulo 1
K102+320,00	K102+320,00	-7,50	2,40	0,45	-8,10	DERECHA	Zarpa modulo 1
K102+130,00	K102+130,00	-5,80	0,30	2,66	-4,63	DERECHA	Vastago modulo 1
K102+130,00	K102+130,00	-5,80	0,45	2,40	-6,26	DERECHA	Zarpa modulo 1
K101+310,00	K101+310,00	-6,15	0,30	2,33	-4,30	DERECHA	Vastago modulo 1
K101+310,00	K101+310,00	-6,40	2,40	0,45	-6,91	DERECHA	Zarpa modulo 1
K101+650,00	K101+650,00	-7,20	0,30	2,64	-5,62	DERECHA	Vastago modulo 1
K101+650,00	K101+650,00	-7,20	2,40	0,45	-7,78	DERECHA	Zarpa modulo 1
K100+665,00	K100+665,00	-6,20	0,40	3,40	-8,43	DERECHA	Vastago modulo 1
K100+665,00	K100+665,00	-6,87	0,30	2,65	-7,78	DERECHA	Zarpa modulo 1
K100+665,00	K100+665,00	-6,35	0,35	3,15	-7,00	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+665,00	K100+665,00	-6,35	0,45	2,90	-8,29	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+720,00	K100+720,00	-5,63	0,30	2,98	-4,92	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+720,00	K100+723,00	-5,63	0,45	2,40	-6,08	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+720,00	K100+720,00	-7,30	0,45	2,40	-7,88	DERECHA	Zarpa modulo 1
K100+720,00	K100+720,00	-7,30	0,30	2,07	-4,53	DERECHA	Vastago modulo 2
K104+480,00	K104+480,00	-10,80	0,45	3,65	-15,77	DERECHA	Vastago modulo 1
K104+480,00	K104+480,00	-9,35	0,50	3,15	-14,73	DERECHA	Zarpa modulo 1
K105+170,00	K105+170,00	-6,90	0,40	3,53	-9,74	DERECHA	Vastago modulo 2
K105+170,00	K105+170,00	-6,90	0,50	2,90	-10,01	DERECHA	Zarpa modulo 2
K101+650,00	K101+650,00	-5,50	0,40	2,40	-5,28	DERECHA	Vastago modulo 2
K101+650,00	K101+650,00	-5,40	0,30	2,14	-3,47	DERECHA	Zarpa modulo 2
K105+170,00	K105+170,00	-3,73	0,40	3,65	-5,45	DERECHA	Vastago modulo 1
K105+170,00	K105+170,00	-3,68	0,45	3,10	-5,13	DERECHA	Zarpa modulo 1
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K104+780,00	K104+780,00	-7,93	0,30	2,45	-5,83	DERECHA	Vastago modulo 1
K104+780,00	K104+780,00	-7,10	0,45	2,40	-7,67	DERECHA	Zarpa modulo 1
K100+630,00	K100+630,00	-6,94	0,30	2,47	-5,14	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+630,00	K100+630,00	-6,94	0,45	2,40	-7,50	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+630,00	K100+630,00	-7,63	0,30	2,87	-6,57	DERECHA	Vastago modulo 1
K100+630,00	K100+630,00	-7,63	0,45	2,40	-8,24	DERECHA	Zarpa modulo 1

K105+480,00	K105+480,00	-5,15	0,30	2,62	-4,05	DERECHA	Vastago modulo 1
K105+480,00	K105+480,00	-5,25	0,45	2,49	-5,67	DERECHA	Zarpa modulo 1
K105+480,00	K105+480,00	-6,20	0,40	3,90	-9,67	DERECHA	Vastago modulo 2
K105+480,00	K105+480,00	-6,20	0,50	3,15	-9,77	DERECHA	Zarpa modulo 2
K105+480,00	K105+480,00	-5,85	0,40	3,63	-8,48	DERECHA	Vastago modulo 3
K105+480,00	K105+480,00	-5,85	0,50	3,15	-9,21	DERECHA	Zarpa modulo 3
K105+480,00	K105+480,00	-6,35	0,40	3,25	-8,26	DERECHA	Vastago modulo 4
K105+480,00	K105+480,00	-6,35	0,50	2,60	-8,21	DERECHA	Zarpa modulo 4
K100+310,00	K100+310,00	-8,06	0,30	2,62	-8,31	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+310,00	K100+310,00	-8,10	0,45	2,65	-10,85	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+550,00	K100+550,00	-6,68	0,40	3,30	-8,92	DERECHA	Vastago modulo 5
K100+550,00	K100+550,00	-6,68	0,50	2,90	-8,69	DERECHA	Zarpa modulo 5
K100+550,00	K100+550,00	-7,35	0,40	3,75	-11,03	DERECHA	Vastago modulo 4
K100+550,00	K100+550,00	-7,83	0,50	3,15	-12,02	DERECHA	Zarpa modulo 4
K100+550,00	K100+550,00	-7,45	0,30	2,30	-5,14	DERECHA	Vastago modulo 3
K100+550,00	K100+550,00	-7,45	0,45	2,48	-8,85	DERECHA	Zarpa modulo 3
K100+550,00	K100+550,00	-5,95	0,40	2,84	-6,76	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+550,00	K100+550,00	-5,95	0,45	2,65	-7,10	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+550,00	K100+550,00	-6,54	0,40	3,07	-8,03	DERECHA	Vastago modulo 1
K100+550,00	K100+550,00	-6,54	0,50	2,90	-8,48	DERECHA	Zarpa modulo 1
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-428,40			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	46,10
ACTA PARCIAL NO. 12	27,30
ACTA PARCIAL NO. 13	62,40
ACTA PARCIAL NO. 14	31,90
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	127,30
ACTA PARCIAL NO. 17	139,70
ACTA PARCIAL NO. 18	94,30
ACTA PARCIAL NO. 19	123,60
ACTA PARCIAL NO. 20	219,50
ACTA PARCIAL NO. 21	0,00
ACTA PARCIAL NO. 22	0,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-428,40**
TOTAL ACUMULADO	434,7

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO ZIRATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR
ITEM	90		UNIDAD
NP630.1.7 TJ	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 3		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No.19							
MUROS							
K100+720,00	K100+720,00	-5,00	2,60	0,60	-7,80	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+720,00	K100+720,00	-7,20	3,20	0,25	-5,58	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K100+665,00	K100+665,00	-5,84	1,60	0,96	-8,97	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+665,00	K100+665,00	-5,10	2,10	0,60	-6,43	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K101+665,00	K101+665,00	-4,66	1,10	0,96	-4,92	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K100+550,00	K100+550,00	-1,50	1,60	0,20	-0,48	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #5
K100+550,00	K100+550,00	-5,36	1,10	1,30	-8,01	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+550,00	K100+550,00	-2,90	1,20	1,30	-4,62	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K105+480,00	K105+480,00	-2,50	1,60	1,80	-7,20	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-53,90			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	1,20
ACTA PARCIAL NO. 14	7,40
ACTA PARCIAL NO. 15	0,90
ACTA PARCIAL NO. 16	13,30
ACTA PARCIAL NO. 17	5,90
ACTA PARCIAL NO. 18	3,36
ACTA PARCIAL NO. 19	33,70
ACTA PARCIAL NO. 20	29,20
ACTA PARCIAL NO. 21	0,00
ACTA PARCIAL NO. 22	0,00
ACTA PARCIAL NO. 23	-53,90
TOTAL ACUMULADO	30,2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2909023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	101		UNIDAD
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M, INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"		ML

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
FILTROS							
K97+894,00	K98+085,00	91,00			91,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+092,00	K98+160,00	68,00			68,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+161,00	K98+252,00	91,00			91,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+254,00	K98+272,00	18,00			18,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+272,00	K98+361,00	89,50			89,50	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+503,00	K98+603,00	100,00			100,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K98+613,00	K98+668,00	55,00			55,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K99+065,00	K99+140,00	61,00			61,00	I	INSTALACION DE FILTROS
K99+140,00	K99+213,00	73,00			73,00	I	INSTALACION DE FILTROS
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				646,50			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	0,00
ACTA PARCIAL NO. 20	0,00
ACTA PARCIAL NO. 21	1952,00
ACTA PARCIAL NO. 22	928,00
ACTA PARCIAL NO. 22	**646,50**
TOTAL ACUMULADO	2626,5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ANTONIO TIBAIA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2982023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1871 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	102		UNIDAD
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" PARA DRENAJE		ML

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
MUROS							
K97+994,00	K98+085,00	91,00			91,00	I	Instalación de tubería
K98+092,00	K98+160,00	68,00			68,00	I	Instalación de tubería
K98+161,00	K98+252,00	91,00			91,00	I	Instalación de tubería
K98+254,00	K98+272,00	18,00			18,00	I	Instalación de tubería
K98+272,00	K98+361,00	89,50			89,50	I	Instalación de tubería
K98+503,00	K98+603,00	100,00			100,00	I	Instalación de tubería
K98+613,00	K98+668,00	55,00			55,00	I	Instalación de tubería
K99+065,00	K99+140,00	61,00			61,00	I	Instalación de tubería
K99+140,00	K99+213,00	73,00			73,00	I	Instalación de tubería
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				646,50			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	0,00
ACTA PARCIAL NO. 12	0,00
ACTA PARCIAL NO. 13	0,00
ACTA PARCIAL NO. 14	0,00
ACTA PARCIAL NO. 15	0,00
ACTA PARCIAL NO. 16	0,00
ACTA PARCIAL NO. 17	0,00
ACTA PARCIAL NO. 18	0,00
ACTA PARCIAL NO. 19	0,00
ACTA PARCIAL NO. 20	0,00
ACTA PARCIAL NO. 21	1352,00
ACTA PARCIAL NO. 22	923,00
ACTA PARCIAL NO. 23	**646,50**
TOTAL ACUMULADO	2626,5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

INGE. JOAQUIN ANTONIO TIBATA CHITIVO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	106	UNIDAD
NP16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS							
K101+450,03	K101+450,00	3,07	0,20	1,27	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+450,03	K101+450,00	2,30	0,45	1,80	1,86	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+450,03	K101+450,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+450,03	K101+450,00	2,30	0,45	1,80	1,86	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+450,03	K101+450,00	1,80	0,59	2,86	2,67	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+450,03	K101+450,00	4,34	0,25	0,30	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+450,03	K101+450,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K101+450,00	K101+450,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+450,00	K101+450,00	2,08	0,20	1,40	0,58	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+450,00	K101+450,00	1,90	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+450,00	K101+450,00	2,05	0,20	1,40	0,57	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+450,00	K101+450,03	1,80	0,20	2,75	0,99	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+450,00	K101+450,03	1,80	0,20	2,50	0,90	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+450,00	K101+450,03	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+740,00	K101+740,03	3,07	0,20	1,27	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,03	1,80	0,45	2,80	2,27	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,03	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+740,00	K101+740,03	1,80	0,45	2,70	2,19	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,03	3,48	0,50	1,80	3,06	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,80	4,34	0,25	0,30	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+740,00	K101+740,80	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K101+662,00	K101+662,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+662,03	K101+662,00	1,76	0,28	1,40	0,49	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+662,03	K101+662,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+662,03	K101+662,00	1,72	0,20	1,40	0,48	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+662,03	K101+662,00	1,80	0,20	2,50	0,90	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+662,03	K101+662,00	1,80	2,35	0,20	0,85	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+662,03	K101+662,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K103+910,03	K103+910,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K103+910,03	K103+910,00	1,62	0,23	1,40	0,45	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K103+910,00	K103+910,00	1,80	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K103+910,00	K103+910,00	1,65	0,20	1,40	0,46	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K103+910,00	K103+910,00	1,80	0,20	2,26	0,81	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K103+910,00	K103+910,00	1,80	0,20	2,20	0,79	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K103+910,00	K103+910,03	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K104+260,00	K104+260,03	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K104+260,00	K104+260,03	2,10	0,20	1,40	0,59	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K104+260,00	K104+260,03	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K104+260,00	K104+260,03	2,00	0,20	1,40	0,56	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K104+260,00	K104+260,00	1,80	0,20	2,40	0,86	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K104+260,00	K104+260,00	1,80	0,20	2,56	0,91	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K104+260,00	K104+260,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K104+662,00	K104+662,00	2,45	0,20	1,27	0,62	DERECHA	Losa cabezal de salida
K104+662,03	K104+662,00	1,80	0,45	1,92	1,56	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K104+662,03	K104+662,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K104+662,03	K104+662,00	1,60	0,45	2,02	1,45	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K104+662,03	K104+662,00	2,90	0,50	1,80	2,61	DERECHA	Muro cabezal de salida
K104+662,03	K104+662,00	3,10	0,25	0,30	0,23	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K104+662,03	K104+662,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K105+950,03	K105+950,00	1,80	0,25	1,80	0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K105+950,03	K105+950,00	2,40	0,45	2,80	3,02	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K105+950,03	K105+950,00	1,80	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K105+950,03	K105+950,00	2,40	0,45	2,80	3,02	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K105+950,03	K105+950,00	3,49	0,50	1,80	3,12	DERECHA	Muro cabezal de salida
K105+950,03	K105+950,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"

AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
ALCANTARILLAS							
K103+510,00	K103+510,00	2,90	0,25	1,64	1,19	DERECHA	Losa cabezal de salida
K103+510,00	K103+510,00	2,08	0,45	2,05	1,92	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K103+510,00	K103+510,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K103+510,00	K103+510,00	3,20	0,45	2,25	3,24	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K103+510,00	K103+510,00	1,84	0,50	2,40	2,21	DERECHA	Muro cabezal de salida
K103+510,00	K103+510,00	4,10	0,20	1,66	1,36	DERECHA	pantalla
K103+510,00	K103+510,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+623,00	K102+623,00	1,80	1,80	0,25	0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	1,40	0,20	2,17	0,61	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+623,00	K102+623,00	1,40	0,20	2,17	0,81	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	1,80	0,20	2,61	0,94	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+623,00	K102+623,00	1,80	0,20	2,72	0,98	DERECHA	Muro espaldar
K102+623,00	K102+623,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+745,00	K102+745,00	1,80	1,80	0,25	0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	1,40	0,20	2,52	0,71	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+745,00	K102+745,00	1,40	0,20	2,16	0,69	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	1,80	0,20	2,58	0,93	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+745,00	K102+745,00	1,80	0,20	2,52	0,91	DERECHA	Muro espaldar
K102+745,00	K102+745,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K103+600,00	K103+600,00	1,80	1,80	0,25	0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	1,40	0,20	2,10	0,59	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K103+600,00	K103+600,00	1,40	0,20	2,10	0,59	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	1,80	0,20	2,50	0,90	DERECHA	Muro cabezal de salida
K103+600,00	K103+600,00	1,80	0,20	2,65	0,95	DERECHA	Muro espaldar
K103+600,00	K103+600,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K102+445,00	K100+445,00	1,80	1,80	0,25	0,81	DERECHA	Losa cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	1,40	0,20	1,95	0,55	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K102+445,00	K100+445,00	1,40	0,20	1,80	0,50	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	1,80	0,20	2,43	0,87	DERECHA	Muro cabezal de salida
K102+445,00	K100+445,00	1,80	0,20	2,55	0,92	DERECHA	Muro espaldar
K102+445,00	K100+445,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
	ACTA N°23						
ALCANTARILLAS							
K102+070,00	K102+070,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K102+070,00	K102+070,00	2,15	0,20	1,40	0,60	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K102+070,00	K102+070,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K102+070,00	K102+070,00	2,10	0,20	1,40	0,59	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K102+070,00	K102+070,00	1,80	0,20	2,70	0,97	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K102+070,00	K102+070,00	1,80	0,20	2,55	0,92	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K102+070,00	K102+070,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+670,00	K101+670,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+670,00	K101+670,00	1,80	0,20	1,40	0,58	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+670,00	K101+670,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+670,00	K101+670,00	1,70	0,20	1,40	0,48	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+670,00	K101+670,00	1,80	0,20	2,40	0,86	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+670,00	K101+670,00	1,80	0,20	2,40	0,86	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+670,00	K101+670,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+810,00	K101+810,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+810,00	K101+810,00	2,20	0,20	1,80	0,79	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+810,00	K101+810,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+810,00	K101+810,00	2,20	0,20	1,80	0,79	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+810,00	K101+810,00	1,40	0,20	2,80	0,78	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+810,00	K101+810,00	1,40	0,20	2,50	0,70	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+810,00	K101+810,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+740,00	K101+740,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+740,00	K101+740,00	2,20	0,20	1,40	0,62	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+740,00	K101+740,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K101+740,00	K101+740,00	1,90	0,20	1,40	0,53	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+740,00	K101+740,00	2,80	0,20	2,80	1,01	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+740,00	K101+740,00	1,80	0,20	2,60	0,84	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+740,00	K101+740,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+810,00	K101+810,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+810,00	K101+810,00	2,45	0,45	1,95	2,15	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+810,00	K101+810,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+810,00	K101+810,00	2,50	0,45	1,95	2,29	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+810,00	K101+810,00	2,10	0,50	3,15	3,31	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+810,00	K101+810,00	4,34	0,33	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+810,00	K101+810,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"

K101+033,00	K101+030,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+033,00	K101+030,00	1,90	0,20	1,00	0,38	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+033,00	K101+030,00	1,74	0,20	1,00	0,35	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+033,00	K101+030,00	2,62	0,20	1,80	0,94	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+033,00	K101+030,00	2,40	0,20	1,80	0,86	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+033,00	K101+030,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+033,00	K101+030,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+213,00	K101+210,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K101+213,00	K101+210,00	1,95	0,20	1,00	0,39	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K101+213,00	K101+210,00	1,70	0,20	1,00	0,34	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K101+213,00	K101+210,00	1,80	0,20	2,40	0,86	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K101+213,00	K101+210,00	1,80	0,20	2,44	0,88	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K101+213,00	K101+210,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+213,00	K101+210,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K100+853,00	K100+850,00	2,10	0,25	1,80	0,95	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K100+853,00	K100+850,00	2,35	0,20	1,40	0,66	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K100+853,00	K100+850,00	3,04	0,20	2,10	1,28	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K100+853,00	K100+850,00	1,40	0,20	2,35	0,66	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K100+853,00	K100+850,00	2,86	0,20	2,10	1,20	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K100+853,00	K100+850,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K100+853,00	K100+850,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K100+360,00	K100+360,00	1,80	0,25	1,80	0,81	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K100+360,00	K100+360,00	2,17	0,20	1,40	0,61	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K100+360,00	K100+360,00	2,25	0,20	1,40	0,63	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K100+360,00	K100+360,00	1,80	0,20	2,82	1,02	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K100+360,00	K100+360,00	1,80	0,20	2,70	0,97	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K100+360,00	K100+360,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K100+360,00	K100+360,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K101+033,00	K101+030,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K101+033,00	K101+030,00	2,70	0,45	1,96	2,38	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K101+033,00	K101+030,00	2,53	0,45	1,96	2,23	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K101+033,00	K101+030,00	2,18	0,50	3,10	3,38	DERECHA	Muro cabezal de salida
K101+033,00	K101+030,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K101+033,00	K101+030,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K101+033,00	K101+030,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K100+853,00	K100+850,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K100+853,00	K100+850,00	2,50	0,45	1,96	2,21	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K100+853,00	K100+850,00	2,55	0,45	1,96	2,25	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K100+853,00	K100+850,00	2,18	0,50	3,10	3,38	DERECHA	Muro cabezal de salida
K100+853,00	K100+850,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K100+853,00	K100+850,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K100+520,00	K100+520,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K100+520,00	K100+520,00	2,52	0,45	1,96	2,22	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K100+520,00	K100+520,00	2,57	0,45	1,96	2,27	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K100+520,00	K100+520,00	2,18	0,50	3,20	3,49	DERECHA	Muro cabezal de salida
K100+520,00	K100+520,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K100+520,00	K100+520,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K100+520,00	K100+520,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K100+360,00	K100+360,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	2,65	0,45	1,96	2,34	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	2,75	0,45	1,96	2,43	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	2,18	0,50	3,22	3,51	DERECHA	Muro cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K100+360,00	K100+360,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K100+360,00	K100+360,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+085,00	K98+085,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K98+085,00	K98+085,00	2,00	0,20	1,00	0,40	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K98+085,00	K98+085,00	1,66	0,20	1,00	0,33	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K98+085,00	K98+085,00	1,80	0,20	3,00	1,09	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K98+085,00	K98+085,00	1,80	0,20	2,49	0,99	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K98+085,00	K98+085,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+085,00	K98+085,00	3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K98+085,00	K98+085,00	2,90	0,30	0,25	0,22	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+085,00	K98+085,00	2,50	1,27	0,20	0,64	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+085,00	K98+085,00	2,77	0,45	1,50	1,87	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+085,00	K98+085,00	2,10	0,45	2,67	2,52	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+085,00	K98+085,00	1,90	0,50	3,22	3,06	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+085,00	K98+085,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+085,00	K98+085,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+160,00	K98+160,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+160,00	K98+160,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+160,00	K98+160,00	2,47	0,45	1,96	2,18	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+160,00	K98+160,00	2,45	0,45	1,96	2,16	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+160,00	K98+160,00	2,18	0,50	3,02	3,29	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+160,00	K98+160,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+160,00	K98+160,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K98+160,00	K98+160,00	2,10	0,20	1,40	0,59	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,75	0,20	1,40	0,49	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,20	2,53	0,91	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,20	2,59	0,93	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole

K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,25	1,40	0,63	IZQUIERDA	Losa inferior de caja en encole
K98+160,00	K98+160,00	2,10	0,20	1,40	0,59	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,75	0,20	1,46	0,69	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,26	2,53	0,91	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,80	0,20	2,59	0,93	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K98+160,00	K98+160,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
		3,14	-0,20	0,49	-0,15	IZQUIERDA	Descuento de tuberia de 36"
K98+400,00	K98+400,00	3,48	0,30	0,25	0,26	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+400,00	K98+400,00	2,65	1,45	0,20	0,77	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+400,00	K98+400,00	2,25	0,45	2,46	2,49	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+400,00	K98+400,00	2,20	0,45	2,32	2,30	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+400,00	K98+400,00	2,85	0,50	2,10	2,99	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+400,00	K98+400,00	1,00	-0,20	0,40	-0,09	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+400,00	K98+400,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+500,00	K98+500,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+500,00	K98+500,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+500,00	K98+500,00	2,50	0,45	1,96	2,21	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+500,00	K98+500,00	2,51	0,45	1,96	2,21	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+500,00	K98+500,00	3,05	0,50	2,18	3,32	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+500,00	K98+500,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+500,00	K98+500,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+610,00	K98+610,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+610,00	K98+610,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+610,00	K98+610,00	2,50	0,45	1,96	2,21	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+610,00	K98+610,00	2,70	0,45	1,96	2,38	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+610,00	K98+610,00	3,28	0,50	2,18	3,47	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+610,00	K98+610,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+610,00	K98+610,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+670,00	K98+670,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+670,00	K98+670,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+670,00	K98+670,00	2,52	0,45	1,96	2,22	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+670,00	K98+670,00	2,68	0,45	1,96	2,36	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+670,00	K98+670,00	3,26	0,50	2,18	3,56	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+670,00	K98+670,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+670,00	K98+670,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
K98+920,00	K98+920,00	4,34	0,30	0,25	0,33	DERECHA	Dentellon cabezal de salida
K98+920,00	K98+920,00	3,07	1,27	0,20	0,78	DERECHA	Losa cabezal de salida
K98+920,00	K98+920,00	2,55	0,45	1,96	2,25	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K98+920,00	K98+920,00	2,52	0,45	1,96	2,22	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K98+920,00	K98+920,00	3,18	0,50	3,15	3,63	DERECHA	Muro cabezal de salida
K98+920,00	K98+920,00	1,00	-0,20	0,40	-0,08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K98+920,00	K98+920,00	3,14	-0,50	0,49	-0,38	DERECHA	Descuento de tuberia de 36"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				204,60			

ACTA PARCIAL No. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**204,60**
TOTAL ACUMULADO	204,6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAU INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

K100+550,00	K100+550,00	5,95	0,40	2,84	6,76	DERECHA	Vastago modulo 2
K100+550,00	K100+550,00	5,95	0,65	2,65	7,13	DERECHA	Zarpa modulo 2
K100+550,00	K100+550,00	6,54	0,40	3,07	8,03	DERECHA	Vastago modulo 1
K100+550,00	K100+550,00	6,54	0,50	2,90	8,48	DERECHA	Zarpa modulo 1
ACTA N° 23							
K102+300,00	K102+300,00	3,80	0,30	2,16	5,05	DERECHA	Vastago modulo 1
K102+300,00	K102+300,00	7,80	0,45	2,40	8,42	DERECHA	Zarpa modulo 1
K102+300,00	K102+300,00	7,75	0,35	2,55	8,92	DERECHA	Vastago modulo 2
K102+300,00	K102+300,00	7,75	0,45	2,65	9,24	DERECHA	Zarpa modulo 2
K102+300,00	K102+300,00	6,00	0,30	1,70	3,06	DERECHA	Vastago modulo 3
K102+300,00	K102+300,00	6,00	0,30	1,75	3,15	DERECHA	Zarpa modulo 3
K102+300,00	K102+300,00	5,90	0,30	1,92	3,40	DERECHA	Vastago modulo 4
K102+300,00	K102+300,00	5,90	0,30	1,75	3,10	DERECHA	Zarpa modulo 4
K102+300,00	K102+300,00	5,95	0,30	1,85	3,30	DERECHA	Vastago modulo 5
K102+300,00	K102+300,00	5,95	0,30	1,75	3,12	DERECHA	Zarpa modulo 5
K102+300,00	K102+300,00	6,00	0,30	2,15	3,87	DERECHA	Vastago modulo 6
K102+300,00	K102+300,00	6,00	0,45	2,40	6,48	DERECHA	Zarpa modulo 6
K102+300,00	K102+300,00	8,20	0,35	2,65	7,61	DERECHA	Vastago modulo 7
K102+300,00	K102+300,00	8,20	0,45	2,65	9,78	DERECHA	Zarpa modulo 7
K102+300,00	K102+300,00	5,80	0,30	1,65	2,87	DERECHA	Vastago modulo 8
K102+300,00	K102+300,00	5,80	0,30	1,75	3,05	DERECHA	Zarpa modulo 8
K102+300,00	K102+300,00	4,80	0,30	1,80	2,59	DERECHA	Vastago modulo 9
K102+300,00	K102+300,00	4,80	0,30	1,75	2,52	DERECHA	Zarpa modulo 9
K105+200,00	K105+200,00	6,85	0,30	2,15	4,42	DERECHA	Vastago modulo 1
K105+200,00	K105+200,00	6,80	0,45	2,40	7,34	DERECHA	Zarpa modulo 1
K105+200,00	K105+200,00	6,27	0,30	1,20	2,26	DERECHA	Vastago modulo 2
K105+200,00	K105+200,00	6,24	0,30	1,75	3,26	DERECHA	Zarpa modulo 2
K105+200,00	K105+200,00	7,20	0,30	2,30	4,97	DERECHA	Vastago modulo 3
K105+200,00	K105+200,00	7,20	0,45	2,40	7,78	DERECHA	Zarpa modulo 3
K105+200,00	K105+200,00	5,80	0,30	2,75	4,79	DERECHA	Vastago modulo 4
K105+200,00	K105+200,00	5,80	0,45	2,40	6,26	DERECHA	Zarpa modulo 4
K105+200,00	K105+200,00	3,70	0,30	2,50	2,78	DERECHA	Vastago modulo 5
K105+200,00	K105+200,00	3,60	0,45	2,40	3,89	DERECHA	Zarpa modulo 5
K104+800,00	K104+800,00	7,22	0,30	2,67	5,78	DERECHA	Vastago modulo 1
K104+800,00	K104+800,00	7,10	0,45	2,40	7,67	DERECHA	Zarpa modulo 1
K104+800,00	K104+800,00	7,10	0,30	2,42	5,15	DERECHA	Vastago modulo 2
K104+800,00	K104+800,00	7,10	0,45	2,40	7,67	DERECHA	Zarpa modulo 2
K104+800,00	K104+800,00	8,75	0,30	2,56	6,72	DERECHA	Vastago modulo 3
K104+800,00	K104+800,00	8,75	0,45	2,40	9,45	DERECHA	Zarpa modulo 3
K105+150,00	K105+150,00	6,90	0,35	3,62	8,77	DERECHA	Vastago modulo 1
K105+150,00	K105+150,00	6,50	0,45	2,65	7,75	DERECHA	Zarpa modulo 1
K105+180,00	K105+180,00	1,80	0,15	0,93	0,25	DERECHA	Muros CD disipador
K105+180,00	K105+180,00	0,90	0,15	0,93	0,13	DERECHA	Muros CD disipador
K105+180,00	K105+180,00	1,50	0,15	0,93	0,21	DERECHA	Muros CD disipador
K105+180,00	K105+180,00	3,90	0,15	0,93	0,54	DERECHA	Muros CD disipador
K105+180,00	K105+180,00	0,65	0,15	0,93	0,09	DERECHA	Muros CD disipador
K105+180,00	K105+180,00	1,80	0,15	0,93	0,25	DERECHA	Muros CI disipador
K105+180,00	K105+180,00	0,90	0,15	0,93	0,13	DERECHA	Muros CI disipador
K105+180,00	K105+180,00	1,50	0,15	0,93	0,21	DERECHA	Muros CI disipador
K105+180,00	K105+180,00	3,90	0,15	0,93	0,54	DERECHA	Muros CI disipador
K105+180,00	K105+180,00	0,65	0,15	0,93	0,09	DERECHA	Muros CI disipador
K105+180,00	K105+180,00	2,30	0,15	1,40	0,48	DERECHA	Placa disipador
K105+180,00	K105+180,00	1,60	0,15	1,40	0,34	DERECHA	Placa disipador
K105+180,00	K105+180,00	2,15	0,15	1,40	0,45	DERECHA	Placa disipador
K105+180,00	K105+180,00	5,00	0,15	1,40	1,05	DERECHA	Placa disipador
K105+180,00	K105+180,00	1,20	0,15	1,40	0,25	DERECHA	Placa disipador
K104+070,00	K104+070,00	2,90	0,15	1,10	0,32	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	0,65	0,15	1,10	0,11	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,45	0,15	1,10	0,24	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,50	0,15	1,10	0,25	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,50	0,15	1,10	0,25	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	0,45	0,15	1,10	0,07	DERECHA	Muros CD disipador
K104+070,00	K104+070,00	2,90	0,15	1,10	0,33	DERECHA	Muros CI disipador
K104+070,00	K104+070,00	0,65	0,15	1,10	0,11	DERECHA	Muros CI disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,45	0,15	1,10	0,24	DERECHA	Muros CI disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,50	0,15	1,10	0,25	DERECHA	Muros CI disipador
K104+070,00	K104+070,00	1,50	0,15	1,10	0,25	DERECHA	Muros CI disipador
K104+070,00	K104+070,00	0,45	0,15	1,10	0,07	DERECHA	Muros CI disipador

K104+070,30	K104+070,00	2,35	0,15	1,40	0,49	IZQUIERDA	Placa disipador
K104+070,30	K104+070,00	1,45	0,15	1,40	0,30	IZQUIERDA	Placa disipador
K104+070,30	K104+070,00	3,18	0,15	1,40	0,67	IZQUIERDA	Placa disipador
K104+070,30	K104+070,00	2,50	0,15	1,40	0,53	IZQUIERDA	Placa disipador
K104+070,30	K104+070,00	2,60	0,15	1,40	0,55	IZQUIERDA	Placa disipador
K104+070,30	K104+070,00	0,90	0,15	1,40	0,19	IZQUIERDA	Placa disipador
K102+470,30	K102+470,00	6,50	0,40	0,30	0,78	DERECHA	Dentellón Módulo 1 de muro de contención
K102+470,30	K102+470,00	6,50	2,40	0,45	7,02	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K102+470,30	K102+470,00	7,30	2,70	0,30	5,91	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K102+470,30	K102+470,00	7,27	0,40	0,30	0,87	DERECHA	Dentellón Módulo 2 de muro de contención
K102+470,30	K102+470,00	7,27	2,40	0,45	7,85	DERECHA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K102+470,30	K102+470,00	7,27	2,36	0,30	5,15	DERECHA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	6,60	2,05	0,40	5,41	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	6,60	1,70	0,30	3,37	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	6,20	1,75	0,30	3,26	DERECHA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	6,20	1,41	0,30	2,62	DERECHA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	8,65	2,65	0,45	10,32	DERECHA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	8,65	3,03	0,35	8,17	DERECHA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	3,85	1,75	0,30	2,02	DERECHA	Zarpa Módulo 4 de muro de contención
K103+690,00	K103+690,00	3,85	1,58	0,30	1,82	DERECHA	Vástago Módulo 4 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	8,20	1,75	0,30	4,31	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	9,00	2,00	0,30	5,40	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	5,90	1,75	0,30	3,10	DERECHA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	5,90	1,77	0,30	3,13	DERECHA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	6,36	1,75	0,30	3,34	DERECHA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	6,35	1,76	0,30	3,35	DERECHA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,10	2,05	0,40	5,82	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,10	2,15	0,30	4,58	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,00	1,75	0,30	3,68	DERECHA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,00	1,65	0,30	3,47	DERECHA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	5,95	2,65	0,45	7,18	DERECHA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	5,95	3,13	0,35	6,52	DERECHA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,35	2,40	0,45	7,94	DERECHA	Zarpa Módulo 4 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	7,35	2,70	0,30	5,95	DERECHA	Vástago Módulo 4 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	5,90	1,75	0,30	3,10	DERECHA	Zarpa Módulo 5 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	5,90	1,90	0,30	3,36	DERECHA	Vástago Módulo 5 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	6,20	1,75	0,30	3,26	DERECHA	Zarpa Módulo 6 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	6,20	1,50	0,30	2,79	DERECHA	Vástago Módulo 6 de muro de contención
K104+630,00	K104+630,00	8,70	2,40	0,45	9,40	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K104+630,00	K104+630,00	8,70	2,51	0,30	6,55	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K105+580,00	K105+580,00	6,40	6,40	0,50	-,28	DERECHA	Dentellón Módulo 1 de muro de contención
K105+580,00	K105+580,00	6,40	3,15	0,50	10,08	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K105+580,00	K105+580,00	5,40	3,80	0,40	8,21	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K105+580,00	K105+580,00	1,18	1,00	0,50	0,59	DERECHA	Ajuste de muro
K101+500,00	K101+500,00	6,45	0,45	0,80	2,32	DERECHA	Dentellón Módulo 1 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,45	2,05	0,45	5,95	DERECHA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,00	2,56	0,35	6,39	DERECHA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,45	0,80	2,09	DERECHA	Dentellón Módulo 2 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	1,75	0,45	4,59	DERECHA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,95	2,05	4,16	DERECHA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,45	0,80	2,09	DERECHA	Dentellón Módulo 3 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,05	0,45	5,35	DERECHA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,32	0,35	4,72	DERECHA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,45	0,80	2,09	DERECHA	Dentellón Módulo 4 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,05	0,45	5,35	DERECHA	Zarpa Módulo 4 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,62	0,35	5,32	DERECHA	Vástago Módulo 4 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,45	0,80	2,09	DERECHA	Dentellón Módulo 5 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,35	0,45	6,13	DERECHA	Zarpa Módulo 5 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,94	0,35	5,97	DERECHA	Vástago Módulo 5 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,45	0,80	2,09	DERECHA	Dentellón Módulo 6 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,45	0,45	6,39	DERECHA	Zarpa Módulo 6 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,80	0,35	5,68	DERECHA	Vástago Módulo 6 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	0,45	0,80	2,12	DERECHA	Dentellón Módulo 7 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	2,45	0,45	6,30	DERECHA	Zarpa Módulo 7 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	3,40	0,35	7,02	DERECHA	Vástago Módulo 7 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,00	0,45	0,80	2,16	DERECHA	Dentellón Módulo 8 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,00	2,55	0,45	6,89	DERECHA	Zarpa Módulo 8 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,00	3,62	0,35	7,18	DERECHA	Vástago Módulo 8 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	0,45	0,80	2,12	DERECHA	Dentellón Módulo 9 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	2,65	0,45	6,77	DERECHA	Zarpa Módulo 9 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	3,73	0,35	7,70	DERECHA	Vástago Módulo 9 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,65	0,45	0,80	2,39	DERECHA	Dentellón Módulo 10 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,65	2,55	0,45	7,63	DERECHA	Zarpa Módulo 10 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	6,65	3,70	0,35	8,61	DERECHA	Vástago Módulo 10 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,75	0,45	0,80	2,07	DERECHA	Dentellón Módulo 11 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,75	1,75	0,45	4,83	DERECHA	Zarpa Módulo 11 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,75	2,00	0,35	4,03	DERECHA	Vástago Módulo 11 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	0,45	0,80	2,12	DERECHA	Dentellón Módulo 12 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	1,75	0,45	4,65	DERECHA	Zarpa Módulo 12 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,90	2,10	0,35	4,34	DERECHA	Vástago Módulo 12 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	8,50	0,45	0,80	3,06	DERECHA	Dentellón Módulo 13 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	8,50	2,40	0,45	8,28	DERECHA	Zarpa Módulo 13 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	8,50	3,80	0,35	8,93	DERECHA	Vástago Módulo 13 de muro de contención

K104+786,00	K104+786,00	2,70	1,30	0,15	0,53	DERECHA	Huella de disipador en descole
K104+786,00	K104+786,00	2,25	1,30	0,15	0,44	DERECHA	Contrahuella de disipador en descole
K104+786,00	K104+786,00	1,50	0,88	0,15	0,20	DERECHA	Muro 1 lateral de disipador en descole
K104+786,00	K104+786,00	1,50	0,88	0,15	0,20	DERECHA	Muro 2 lateral de disipador en descole
K104+840,00	K104+840,00	5,80	1,30	0,15	1,13	DERECHA	Huella de disipador en descole
K104+840,00	K104+840,00	3,30	1,30	0,15	0,64	DERECHA	Contrahuella de disipador en descole
K104+840,00	K104+840,00	7,40	0,88	0,15	0,98	DERECHA	Muro 1 lateral de disipador en descole
K104+840,00	K104+840,00	7,40	0,88	0,15	0,98	DERECHA	Muro 2 lateral de disipador en descole
K105+460,00	K105+460,00	3,90	1,40	0,15	0,82	DERECHA	Huella de disipador en descole
K105+460,00	K105+460,00	3,10	1,40	0,15	0,65	DERECHA	Contrahuella de disipador en descole
K105+460,00	K105+460,00	6,25	0,60	0,15	0,56	DERECHA	Muro 1 lateral de disipador en descole
K105+460,00	K105+460,00	6,25	0,60	0,15	0,56	DERECHA	Muro 2 lateral de disipador en descole
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				1010,90			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**1010,90**
TOTAL ACUMULADO	1010,9

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRECIA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRECIA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAD INGENIERIA DE VALOR

ITEM	108						UNIDAD
NP19	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No.19							
MUROS							
K100+720,00	K100+720,00	6,00	2,60	0,60	7,80	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+720,00	K100+720,00	7,20	3,10	0,25	5,58	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K100+665,00	K100+665,00	5,84	1,60	0,96	8,97	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+665,00	K100+665,00	5,10	2,10	0,60	5,43	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K101+665,00	K101+665,00	4,66	1,10	0,96	4,92	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K100+550,00	K100+550,00	1,50	1,60	0,20	0,48	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #5
K100+550,00	K100+550,00	5,36	1,15	1,30	8,01	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K100+550,00	K100+550,00	2,90	1,20	1,30	4,52	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K105+480,00	K105+480,00	2,50	1,60	1,80	7,20	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
ACTA N° 23							
MUROS							
K102+300,00	K102+300,00	1,75	1,10	0,80	1,54	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #3
K102+300,00	K102+300,00	2,86	1,20	1,10	3,78	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #7
K105+200,00	K105+200,00	1,75	1,30	0,80	1,82	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K105+200,00	K105+200,00	2,40	1,20	0,60	1,73	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #3
K105+200,00	K105+200,00	6,00	1,20	0,60	4,32	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #4
K104+800,00	K104+800,00	2,40	1,20	0,40	1,15	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #2
K105+200,00	K105+200,00	3,60	0,20	0,90	0,65	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #5
K105+600,00	K105+600,00	4,50	4,60	1,25	25,31	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K105+600,00	K105+600,00	5,50	4,60	1,20	30,36	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K105+600,00	K105+600,00	4,60	0,50	-1,00	-2,30	DERECHA	Enrocado para soporte de muro modulo #1
K102+470,00	K102+470,00	6,20	3,70	1,10	25,23	DERECHA	Soporte Módulo 1 de muro de contención
K102+470,00	K102+470,00	6,20	0,60	0,30	-0,74	DERECHA	Descuento de dentellón
K102+470,00	K102+470,00	7,47	3,70	1,10	30,40	DERECHA	Soporte Módulo 2 de muro de contención
K102+470,00	K102+470,00	7,27	0,40	0,30	-0,87	DERECHA	Descuento de dentellón
K103+690,00	K103+690,00	2,00	1,65	1,10	3,63	DERECHA	Soporte Módulo 2 de muro de contención
K104+060,00	K104+060,00	8,50	1,80	0,45	6,89	DERECHA	Soporte Módulo 2 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	2,80	1,65	0,70	2,31	DERECHA	Soporte Módulo 2 de muro de contención
K104+200,00	K104+200,00	5,60	1,30	1,40	10,19	DERECHA	Soporte Módulo 4 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,40	0,80	1,86	DERECHA	Soporte Módulo 2 de muro de contención
K101+500,00	K101+500,00	5,80	0,40	0,80	1,86	DERECHA	Soporte Módulo 3 de muro de contención
K98+430,00	K98+430,00	3,00	2,60	0,80	6,24	DERECHA	Soporte de zarpa para módulo 1
K98+430,00	K98+430,00	0,80	0,80	0,45	-0,29	DERECHA	Descuento de dentellón módulo 1
K98+430,00	K98+430,00	3,00	2,40	0,90	6,48	DERECHA	Soporte de zarpa para módulo 2
K98+430,00	K98+430,00	0,90	0,80	0,70	-0,50	DERECHA	Descuento de dentellón módulo 2
K98+430,00	K98+430,00	5,10	3,90	0,80	15,91	DERECHA	Soporte de box culvert mod 3
K98+430,00	K98+430,00	4,50	4,40	2,11	41,78	DERECHA	Soporte de zarpa para módulo 4
K98+430,00	K98+430,00	4,50	0,80	0,70	-2,52	DERECHA	Descuento de dentellón módulo 4
K98+430,00	K98+430,00	4,40	3,60	1,86	23,13	DERECHA	Soporte de zarpa para módulo 5
K98+430,00	K98+430,00	4,40	0,80	0,70	-2,46	DERECHA	Descuento de dentellón módulo 5
K105+480,00	K105+480,00	1,10	1,50	0,20	0,33	DERECHA	Soporte de escalon 1 en disipador descole
K105+480,00	K105+480,00	1,10	1,50	0,20	0,33	DERECHA	Soporte de escalon 4 en disipador descole

K105+603,30	K105+606,03	1,30	2,90	1,50	3,90	DERECHA	Soporte de escalon 1 en disipador descole
K105+603,30	K105+606,03	0,80	1,20	1,80	1,73	DERECHA	Soporte de escalon 2 en disipador descole
K105+603,30	K105+606,03	0,90	1,80	1,20	1,94	DERECHA	Soporte de escalon 3 en disipador descole
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				299,00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**299,00**
TOTAL ACUMULADO	299,0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIRATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1671 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	110	UNIDAD
MP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS							
K104+662,00	K104+662,00	1,80	0,70	0,05	0,06	DERECHA	concreto para descole
K104+662,00	K104+662,00	1,80	0,70	0,05	0,06	DERECHA	concreto para descole
K104+662,00	K104+662,00	1,80	0,90	0,05	0,08	DERECHA	concreto para descole
K104+662,00	K104+662,00	3,75	2,17	0,05	0,41	DERECHA	concreto para descole
K104+662,00	K104+662,00	3,10	0,25	0,05	0,04	DERECHA	concreto para descole
K104+662,00	K104+662,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	encole
K103+910,00	K103+910,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	encole
K101+450,00	K101+450,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	encole
K105+950,00	K105+950,00	1,80	0,70	0,05	0,06	IZQUIERDA	alatas encole
K105+950,00	K105+950,00	1,80	0,70	0,05	0,06	IZQUIERDA	alatas encole
K105+950,00	K105+950,00	1,80	0,90	0,05	0,08	IZQUIERDA	alatas encole
K105+950,00	K105+950,00	3,75	2,17	0,05	0,41	IZQUIERDA	alatas encole
K101+740,00	K101+740,00	1,80	0,70	0,05	0,06	DERECHA	concreto para descole
K101+740,00	K101+740,00	1,80	0,70	0,05	0,06	DERECHA	concreto para descole
K101+740,00	K101+740,00	1,80	0,90	0,05	0,08	DERECHA	concreto para descole
K101+740,00	K101+740,00	3,75	2,17	0,05	0,41	DERECHA	concreto para descole
K101+749,00	K101+740,00	3,10	0,25	0,05	0,04	DERECHA	concreto para descole
K104+260,00	K104+260,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	alatas encole
MUROS							
K100+665,00	K100+665,00	5,97	2,75	0,05	0,82	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+665,00	K100+665,00	6,45	3,00	0,05	0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K100+720,00	K100+720,00	7,40	2,50	0,05	0,93	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+720,00	K100+720,00	5,73	2,50	0,05	0,72	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K104+480,00	K104+480,00	9,45	3,25	0,05	1,54	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+170,00	K105+170,00	7,00	3,00	0,05	1,05	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
ALCANTARILLAS							
K103+510,00	K103+510,00	1,80	0,70	0,05	0,06	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole
K103+510,00	K103+510,00	1,80	0,70	0,05	0,06	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole
K103+510,00	K103+510,00	1,80	0,90	0,05	0,08	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole
K103+510,00	K103+510,00	3,75	2,17	0,05	0,41	IZQUIERDA	concreto para encole tipo descole
K102+623,00	K102+623,00	1,90	1,90	0,05	0,18	DERECHA	concreto para encole
K102+745,00	K102+745,00	1,90	1,90	0,05	0,18	DERECHA	concreto para encole
K103+600,00	K103+600,00	1,90	1,90	0,05	0,18	DERECHA	concreto para encole
K100+445,00	K100+445,00	1,90	1,90	0,05	0,18	DERECHA	concreto para encole
MUROS							
K100+550,00	K100+550,00	6,64	3,00	0,05	1,00	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+550,00	K100+550,00	6,05	2,75	0,05	0,83	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K100+550,00	K100+550,00	7,65	2,50	0,05	0,96	DERECHA	Zarpa muro modulo #3
K100+550,00	K100+550,00	7,65	3,25	0,05	1,21	DERECHA	Zarpa muro modulo #4
K100+550,00	K100+550,00	6,78	3,00	0,05	1,02	DERECHA	Zarpa muro modulo #5
K100+310,00	K100+310,00	9,20	2,75	0,05	1,27	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+470,00	K105+470,00	5,35	2,50	0,05	0,67	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K105+470,00	K105+470,00	6,30	3,25	0,05	1,02	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K105+470,00	K105+470,00	5,95	3,25	0,05	0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #3
K105+470,00	K105+470,00	6,45	3,00	0,05	0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #4
K100+630,00	K100+630,00	7,73	2,50	0,05	0,97	DERECHA	Zarpa muro modulo #1
K100+630,00	K100+630,00	7,04	2,50	0,05	0,88	DERECHA	Zarpa muro modulo #2
K104+780,00	K104+780,00	7,20	2,50	0,05	0,90	DERECHA	Zarpa muro modulo #2

ACTA N° 23							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ALCANTARILLAS							
K101+740,00	K101+740,00	1,90	1,80	0,05	0,18	IZQUIERDA	concreto para encole
K101+810,00	K101+810,00	1,90	1,80	0,05	0,18	IZQUIERDA	concreto para descole
K101+810,00	K101+810,00	1,95	0,70	0,05	0,07	IZQUIERDA	concreto para descole
K101+810,00	K101+810,00	1,95	0,70	0,05	0,07	IZQUIERDA	concreto para descole
K101+810,00	K101+810,00	2,10	0,90	0,05	0,09	IZQUIERDA	concreto para descole
K101+810,00	K101+810,00	3,07	1,27	0,05	0,19	IZQUIERDA	concreto para descole
K101+810,00	K101+810,00	4,34	0,25	0,05	0,05	IZQUIERDA	concreto para descole
K105+170,00	K105+170,00	12,35	1,50	0,05	0,93	DERECHA	concreto disipador
K101+670,00	K101+670,00	1,90	1,50	0,05	0,14	IZQUIERDA	concreto para encole
K104+074,00	K104+074,00	13,08	1,50	0,05	0,98	DERECHA	concreto disipador
K102+060,00	K102+060,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	concreto para encole
K101+030,00	K101+030,00	1,90	1,50	0,05	0,14	IZQUIERDA	concreto para encole
K101+210,00	K101+210,00	1,90	1,50	0,05	0,14	IZQUIERDA	concreto para encole
K100+850,00	K100+850,00	2,31	1,90	0,05	0,22	IZQUIERDA	concreto para encole
K100+360,00	K100+360,00	1,90	1,90	0,05	0,18	IZQUIERDA	concreto para encole
K101+030,00	K101+030,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K101+030,00	K101+030,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K101+030,00	K101+030,00	2,18	0,90	0,05	0,10	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K101+030,00	K101+030,00	3,07	1,27	0,05	0,19	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K101+030,00	K101+030,00	4,34	0,25	0,05	0,05	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+850,00	K100+850,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+850,00	K100+850,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+850,00	K100+850,00	2,18	0,90	0,05	0,10	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+850,00	K100+850,00	3,07	1,27	0,05	0,19	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+850,00	K100+850,00	4,34	0,25	0,05	0,05	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+520,00	K100+520,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+520,00	K100+520,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+520,00	K100+520,00	2,18	0,90	0,05	0,10	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+520,00	K100+520,00	3,07	1,27	0,05	0,19	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+520,00	K100+520,00	4,34	0,25	0,05	0,05	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+360,00	K100+360,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+360,00	K100+360,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+360,00	K100+360,00	2,18	0,90	0,05	0,10	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+360,00	K100+360,00	3,07	1,27	0,05	0,19	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K100+360,00	K100+360,00	4,34	0,25	0,05	0,05	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+085,00	K98+085,00	1,50	1,90	0,05	0,14	IZQUIERDA	concreto para encole
K98+085,00	K98+085,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+085,00	K98+085,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+085,00	K98+085,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+085,00	K98+085,00	2,50	1,27	0,05	0,16	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+085,00	K98+085,00	2,90	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+160,00	K98+160,00	1,50	1,90	0,05	0,14	IZQUIERDA	concreto para encole
K98+160,00	K98+160,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+160,00	K98+160,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+160,00	K98+160,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+160,00	K98+160,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+160,00	K98+160,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+400,00	K98+400,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+400,00	K98+400,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+400,00	K98+400,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+400,00	K98+400,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+400,00	K98+400,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+500,00	K98+500,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+500,00	K98+500,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+500,00	K98+500,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+500,00	K98+500,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+500,00	K98+500,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+610,00	K98+610,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+610,00	K98+610,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+610,00	K98+610,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+610,00	K98+610,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+610,00	K98+610,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+670,00	K98+670,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+670,00	K98+670,00	1,96	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+670,00	K98+670,00	2,00	0,90	0,05	0,09	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+670,00	K98+670,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+670,00	K98+670,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla

K98+920,00	K98+920,00	1,95	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+920,00	K98+920,00	1,95	0,70	0,05	0,07	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+920,00	K98+920,00	2,00	0,50	0,05	0,05	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+920,00	K98+920,00	3,10	1,27	0,05	0,20	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K98+920,00	K98+920,00	3,40	0,25	0,05	0,04	DERECHA	Solado en descole de alcantarilla
K104+786,00	K104+786,00	4,95	1,30	0,05	0,32	DERECHA	Solado en disipador descole de alcantarilla
K104+840,00	K104+840,00	8,10	1,40	0,05	0,57	DERECHA	Solado en disipador descole de alcantarilla
K105+460,00	K105+460,00	4,80	1,40	0,05	0,34	DERECHA	Solado en disipador descole de alcantarilla
MUROS							
K102+300,00	K102+300,00	7,90	2,50	0,05	0,99	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K102+300,00	K102+300,00	7,85	2,75	0,05	1,08	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K102+300,00	K102+300,00	6,10	1,85	0,05	0,56	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K102+300,00	K102+300,00	6,00	1,85	0,05	0,56	DERECHA	Solado de muro en modulo 4
K102+300,00	K102+300,00	6,05	1,85	0,05	0,56	DERECHA	Solado de muro en modulo 5
K102+300,00	K102+300,00	6,10	2,50	0,05	0,76	DERECHA	Solado de muro en modulo 6
K102+300,00	K102+300,00	8,20	2,75	0,05	1,13	DERECHA	Solado de muro en modulo 7
K102+300,00	K102+300,00	5,80	1,85	0,05	0,54	DERECHA	Solado de muro en modulo 8
K102+300,00	K102+300,00	4,80	1,85	0,05	0,44	DERECHA	Solado de muro en modulo 9
K105+200,00	K105+200,00	6,90	2,50	0,05	0,86	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K105+200,00	K105+200,00	6,35	1,85	0,05	0,59	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K105+200,00	K105+200,00	7,30	2,50	0,05	0,91	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K105+200,00	K105+200,00	5,90	2,50	0,05	0,74	DERECHA	Solado de muro en modulo 4
K105+200,00	K105+200,00	3,70	2,50	0,05	0,46	DERECHA	Solado de muro en modulo 5
K104+800,00	K104+800,00	7,20	2,50	0,05	0,90	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K104+800,00	K104+800,00	7,20	2,50	0,05	0,90	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K104+800,00	K104+800,00	8,85	2,50	0,05	1,11	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K105+150,00	K105+150,00	5,70	2,75	0,05	0,78	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K103+690,00	K103+690,00	6,70	2,15	0,05	0,72	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K103+690,00	K103+690,00	6,30	1,85	0,05	0,58	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K103+690,00	K103+690,00	8,75	2,75	0,05	1,20	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K103+690,00	K103+690,00	3,95	1,85	0,05	0,37	DERECHA	Solado de muro en modulo 4
K104+060,00	K104+060,00	8,30	1,85	0,05	0,77	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K104+060,00	K104+060,00	6,00	1,85	0,05	0,56	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K104+060,00	K104+060,00	6,46	1,85	0,05	0,60	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K104+200,00	K104+200,00	7,20	2,15	0,05	0,77	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K104+200,00	K104+200,00	7,10	1,85	0,05	0,66	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K104+200,00	K104+200,00	6,05	2,75	0,05	0,83	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K104+200,00	K104+200,00	7,45	2,50	0,05	0,93	DERECHA	Solado de muro en modulo 4
K104+200,00	K104+200,00	6,00	1,85	0,05	0,56	DERECHA	Solado de muro en modulo 5
K104+200,00	K104+200,00	6,30	1,85	0,05	0,58	DERECHA	Solado de muro en modulo 6
K104+630,00	K104+630,00	8,80	2,50	0,05	1,10	DERECHA	Solado de muro en modulo 1

K101+500,00	K101+503,30	6,45	2,15	0,05	0,69	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K101+500,00	K101+505,60	5,80	1,85	0,05	0,54	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,10	0,05	0,62	DERECHA	Solado de muro en modulo 3
K101+503,30	K101+500,00	5,80	2,15	0,05	0,62	DERECHA	Solado de muro en modulo 4
K101+503,30	K101+505,60	5,80	2,45	0,05	0,71	DERECHA	Solado de muro en modulo 5
K101+500,00	K101+500,00	5,80	2,55	0,05	0,74	DERECHA	Solado de muro en modulo 6
K101+500,00	K101+503,30	5,90	2,55	0,05	0,75	DERECHA	Solado de muro en modulo 7
K101+500,00	K101+503,30	6,00	2,65	0,05	0,80	DERECHA	Solado de muro en modulo 8
K101+500,00	K101+503,30	5,90	2,65	0,05	0,78	DERECHA	Solado de muro en modulo 9
K101+500,00	K101+505,60	6,65	1,80	0,05	0,62	DERECHA	Solado de muro en modulo 10
K101+500,00	K101+500,00	5,75	1,85	0,05	3,53	DERECHA	Solado de muro en modulo 11
K101+503,30	K101+500,00	5,90	1,85	0,05	3,55	DERECHA	Solado de muro en modulo 12
K101+503,30	K101+500,00	8,50	2,50	0,05	1,06	DERECHA	Solado de muro en modulo 13
K98+430,00	K98+430,00	2,60	3,30	0,05	0,66	DERECHA	Solado de muro en modulo 1
K98+430,00	K98+430,00	3,10	3,00	0,05	0,47	DERECHA	Solado de muro en modulo 2
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				67,10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**67,10**
TOTAL ACUMULADO	67,1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
HAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 3	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2S092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1671 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	111		UNIDAD
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
MUROS							
K105+790,00	K105+790,00	25,40	0,20	1,83	9,30	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+790,00	K105+790,00	25,40	3,14	-0,01	-0,24	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+920,00	K104+920,00	22,20	0,20	1,57	6,97	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+920,00	K104+920,00	22,20	3,14	-0,01	-0,21	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+840,00	K104+840,00	12,10	0,20	1,45	3,51	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+840,00	K104+840,00	12,10	3,14	-0,01	-0,11	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+500,00	K103+500,00	7,07	0,20	1,80	2,55	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+500,00	K103+500,00	7,07	3,14	-0,01	-0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+210,00	K103+210,00	6,34	0,20	1,53	1,94	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+210,00	K103+210,00	6,34	3,14	-0,01	-0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+260,00	K105+260,00	9,55	0,20	2,52	4,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+260,00	K105+260,00	9,55	3,14	-0,01	-0,09	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+170,00	K105+170,00	3,74	0,20	2,75	2,06	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+170,00	K105+170,00	3,74	3,14	-0,01	-0,04	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+560,00	K104+560,00		0,20	1,70	3,00	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+560,00	K104+560,00	9,15	3,14	-0,01	-0,09	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+064,00	K104+064,00	12,20	0,20	1,45	3,54	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+064,00	K104+064,00	12,20	3,14	-0,01	-0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+910,00	K103+910,00	10,10	0,20	1,40	2,83	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+910,00	K103+910,00	10,10	3,14	-0,01	-0,10	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+720,00	K100+720,00	13,03	0,20	1,04	2,71	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+720,00	K100+720,00	13,03	3,14	-0,01	-0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+740,00	K103+740,00	6,16	0,20	1,20	1,48	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+740,00	K103+740,00	6,16	3,14	-0,01	-0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+670,00	K104+670,00	11,80	2,00	0,15	3,54	DERECHA	Filtro tubería de 36"
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 20							
MUROS							
K100+690,00	K100+690,00	12,60	0,20	2,21	5,57	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+690,00	K100+690,00	12,60	3,14	-0,01	-0,12	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+650,00	K101+650,00	11,70	0,20	1,20	2,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+650,00	K101+650,00	11,70	3,14	-0,01	-0,11	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+130,00	K102+130,00	5,75	0,20	1,30	1,50	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+130,00	K102+130,00	5,75	3,14	-0,01	-0,05	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+310,00	K102+310,00	15,60	0,20	0,90	2,81	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+310,00	K102+310,00	15,60	3,14	-0,01	-0,15	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+170,00	K105+170,00	6,90	0,20	2,30	3,17	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+170,00	K105+170,00	6,90	3,14	-0,01	-0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+480,00	K104+480,00	10,10	0,20	2,30	4,65	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+480,00	K104+480,00	10,10	3,14	-0,01	-0,10	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+210,00	K101+210,00	13,50	0,20	1,55	4,19	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+210,00	K101+210,00	13,50	3,14	-0,01	-0,13	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K101+320,00	K101+320,00	6,15	0,20	0,92	1,13	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K101+320,00	K101+320,00	6,15	3,14	-0,01	-0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+780,00	K104+780,00	7,80	0,20	1,10	1,72	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+780,00	K104+780,00	7,80	3,14	-0,01	-0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+480,00	K105+480,00	23,55	0,20	2,05	9,66	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+480,00	K105+480,00	23,55	3,14	-0,01	-0,22	DERECHA	Descuento tubería de 4"
ACTA 23							
FILTRO EN MUROS							
K100+550,00	K100+550,00	34,00	0,20	1,95	13,26	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+550,00	K100+550,00	34,00	3,14	-0,01	-0,32	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+630,00	K100+630,00	14,90	0,20	1,30	3,87	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+630,00	K100+630,00	14,90	3,14	-0,01	-0,14	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K103+600,00	K103+600,00	7,78	0,20	1,95	3,03	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+600,00	K103+600,00	7,78	3,14	-0,01	-0,07	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K100+310,00	K100+310,00	9,00	0,20	1,55	2,79	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K100+310,00	K100+310,00	9,00	3,14	-0,01	-0,09	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K102+300,00	K102+300,00	58,20	0,20	1,11	12,92	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+300,00	K102+300,00	58,20	3,14	-0,01	-0,55	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K104+800,00	K104+800,00	23,10	0,20	1,60	7,39	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+800,00	K104+800,00	23,10	3,14	-0,01	-0,22	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+150,00	K105+150,00	6,30	0,20	1,80	2,27	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+150,00	K105+150,00	6,30	3,14	-0,01	-0,06	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K105+200,00	K105+200,00	30,00	0,20	1,33	7,98	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+200,00	K105+200,00	30,00	3,14	-0,01	-0,29	DERECHA	Descuento tubería de 4"

K105+600,00	K105+608,00	7,40	0,20	2,88	4,14	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K105+600,00	K105+608,00	7,40	-3,14	-0,01	-0,07	DERECHA	Descuento tuberia de 4"
K102+470,00	K102+478,00	12,55	0,20	1,52	3,51	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K102+470,00	K102+478,00	11,55	-3,14	-0,01	-0,11	DERECHA	Descuento tuberia de 4"
K103+700,00	K103+708,00	25,50	0,20	1,06	5,30	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K103+700,00	K103+708,00	25,50	-3,14	-0,01	-0,24	DERECHA	Descuento tuberia de 4"
K104+060,00	K104+068,00	21,20	0,20	0,70	2,97	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K104+060,00	K104+068,00	21,20	-3,14	-0,01	-0,20	DERECHA	Descuento tuberia de 4"
FILTRO LATERAL EN VIA							
K106+000,00	K105+920,00	80,00	0,50	0,70	28,00	DERECHA	Excavación filtros
K106+000,00	K105+920,00	80,00	-3,14	0,08	-1,61	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+920,00	K105+895,00	25,00	0,50	0,70	8,75	DERECHA	Excavación filtros
K105+920,00	K105+895,00	25,00	-3,14	0,08	-0,50	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+895,00	K105+830,00	65,00	0,50	0,70	22,75	DERECHA	Excavación filtros
K105+895,00	K105+830,00	65,00	-3,14	0,08	-1,31	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+830,00	K105+740,00	90,00	0,50	0,70	31,50	DERECHA	Excavación filtros
K105+830,00	K105+740,00	90,00	-3,14	0,08	-1,81	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+738,00	K105+680,00	58,00	0,50	0,70	20,30	DERECHA	Excavación filtros
K105+738,00	K105+680,00	58,00	-3,14	0,08	-1,17	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+680,00	K105+630,00	50,00	0,50	0,70	17,50	DERECHA	Excavación filtros
K105+680,00	K105+630,00	50,00	-3,14	0,08	-1,01	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+630,00	K105+570,00	60,00	0,50	0,70	21,00	DERECHA	Excavación filtros
K105+630,00	K105+570,00	60,00	-3,14	0,08	-1,21	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+565,00	K105+542,00	26,00	0,50	0,70	9,10	DERECHA	Excavación filtros
K105+565,00	K105+542,00	26,00	-3,14	0,08	-0,52	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+540,00	K105+500,00	40,00	0,50	0,70	14,00	DERECHA	Excavación filtros
K105+540,00	K105+500,00	40,00	-3,14	0,08	-0,80	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+500,00	K105+462,00	38,00	0,50	0,70	13,30	DERECHA	Excavación filtros
K105+500,00	K105+462,00	38,00	-3,14	0,08	-0,76	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+460,00	K105+400,00	60,00	0,50	0,70	21,00	DERECHA	Excavación filtros
K105+460,00	K105+400,00	60,00	-3,14	0,08	-1,21	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+400,00	K105+330,00	70,00	0,50	0,70	24,50	DERECHA	Excavación filtros
K105+400,00	K105+330,00	70,00	-3,14	0,08	-1,41	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+328,00	K105+262,00	66,00	0,50	0,70	23,10	DERECHA	Excavación filtros
K105+328,00	K105+262,00	66,00	-3,14	0,08	-1,33	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+168,00	K105+100,00	68,00	0,50	0,70	23,80	DERECHA	Excavación filtros
K105+168,00	K105+100,00	68,00	-3,14	0,08	-1,37	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+100,00	K105+032,00	68,00	0,50	0,70	23,80	DERECHA	Excavación filtros
K105+100,00	K105+032,00	68,00	-3,14	0,08	-1,37	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+030,00	K105+000,00	30,00	0,50	0,70	10,50	DERECHA	Excavación filtros
K105+030,00	K105+000,00	30,00	-3,14	0,08	-0,60	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+000,00	K104+925,00	75,00	0,50	0,70	26,25	DERECHA	Excavación filtros
K105+000,00	K104+925,00	75,00	-3,14	0,08	-1,51	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+925,00	K104+858,00	67,00	0,50	0,70	23,45	DERECHA	Excavación filtros
K104+925,00	K104+858,00	67,00	-3,14	0,08	-1,35	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+856,00	K104+840,00	16,00	0,50	0,70	5,60	DERECHA	Excavación filtros
K104+856,00	K104+840,00	16,00	-3,14	0,08	-0,32	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K102+623,00	K102+747,00	107,50	0,50	0,70	37,63	DERECHA	Excavación filtros
K102+623,00	K102+747,00	107,50	-3,14	0,08	-2,16	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K102+747,00	K102+790,00	63,00	0,50	0,70	22,05	DERECHA	Excavación filtros
K102+747,00	K102+790,00	63,00	-3,14	0,08	-1,27	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K103+110,00	K103+186,00	70,50	0,50	0,70	24,68	DERECHA	Excavación filtros
K103+110,00	K103+186,00	70,50	-3,14	0,08	-1,42	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K103+510,00	K103+600,00	86,50	0,50	0,70	30,28	DERECHA	Excavación filtros
K103+510,00	K103+600,00	86,50	-3,14	0,08	-1,74	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K103+838,00	K103+886,00	48,00	0,50	0,70	16,80	DERECHA	Excavación filtros
K103+838,00	K103+886,00	48,00	-3,14	0,08	-0,97	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K103+890,00	K103+910,00	49,00	0,50	0,70	17,15	DERECHA	Excavación filtros
K103+890,00	K103+910,00	49,00	-3,14	0,08	-0,99	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+430,00	K104+482,00	50,00	0,50	0,70	17,50	DERECHA	Excavación filtros
K104+430,00	K104+482,00	50,00	-3,14	0,08	-1,01	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+482,00	K104+548,00	60,00	0,50	0,70	21,00	DERECHA	Excavación filtros
K104+482,00	K104+548,00	60,00	-3,14	0,08	-1,21	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+562,00	K104+563,00	25,00	0,50	0,70	8,75	DERECHA	Excavación filtros
K104+562,00	K104+563,00	25,00	-3,14	0,08	-0,50	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+565,00	K104+662,00	97,00	0,50	0,70	33,95	DERECHA	Excavación filtros
K104+565,00	K104+662,00	97,00	-3,14	0,08	-1,95	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+664,00	K104+776,00	115,00	0,50	0,70	40,25	DERECHA	Excavación filtros
K104+664,00	K104+776,00	115,00	-3,14	0,08	-2,31	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K104+778,00	K104+840,00	64,00	0,50	0,70	22,40	DERECHA	Excavación filtros
K104+778,00	K104+840,00	64,00	-3,14	0,08	-1,29	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K105+176,00	K105+268,00	92,50	0,50	0,70	32,38	DERECHA	Excavación filtros
K105+176,00	K105+268,00	92,50	-3,14	0,08	-1,86	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K97+894,00	K98+085,00	91,00	0,50	0,70	31,85	DERECHA	Excavación filtros
K97+994,00	K98+085,00	91,00	-3,14	0,08	-1,83	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K98+092,00	K98+160,00	68,00	0,50	0,70	23,80	DERECHA	Excavación filtros
K98+092,00	K98+160,00	68,00	-3,14	0,08	-1,37	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K98+161,00	K98+252,00	91,00	0,50	0,70	31,85	DERECHA	Excavación filtros
K98+161,00	K98+252,00	91,00	-3,14	0,08	-1,83	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K98+254,00	K98+272,00	18,00	0,50	0,70	6,30	DERECHA	Excavación filtros
K98+254,00	K98+272,00	18,00	-3,14	0,08	-0,36	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K98+272,00	K98+361,00	89,50	0,50	0,70	31,33	DERECHA	Excavación filtros
K98+272,00	K98+361,00	89,50	-3,14	0,08	-1,80	DERECHA	Descuento tuberia de 6"
K98+503,00	K98+603,00	100,00	0,50	0,70	35,00	DERECHA	Excavación filtros
K98+503,00	K98+603,00	100,00	-3,14	0,08	-2,01	DERECHA	Descuento tuberia de 6"


ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS, CONTRATO - 29092023-1455	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

Estructuras de drenaje

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO



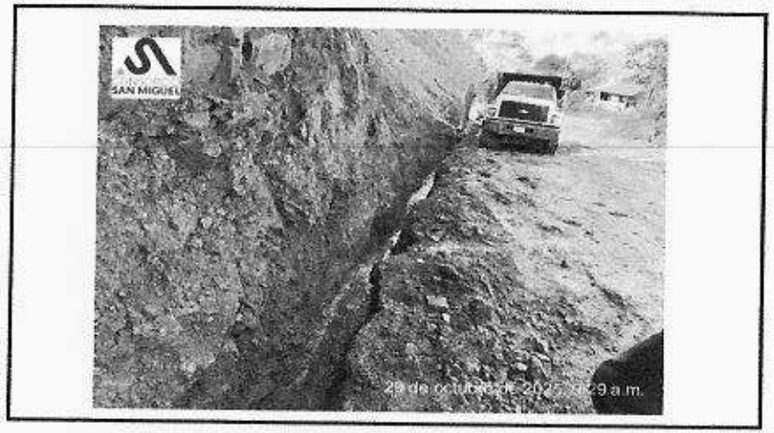

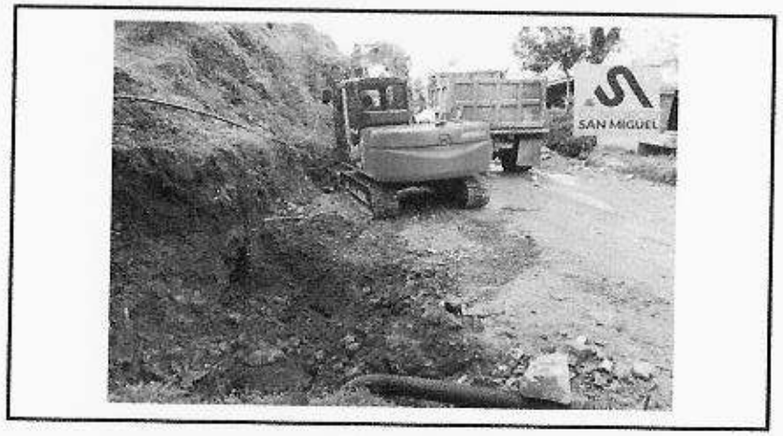





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	


Estructuras de drenaje

630.6 T3 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa (F)



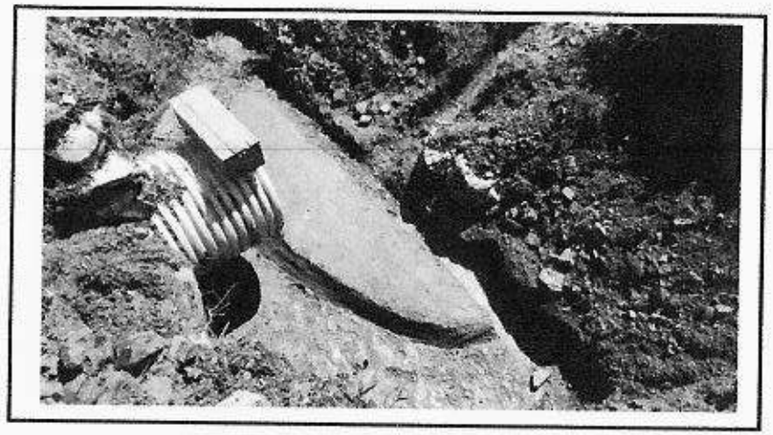

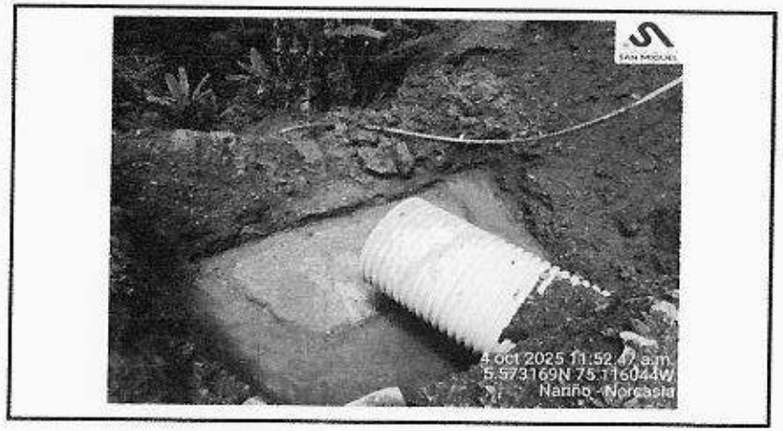

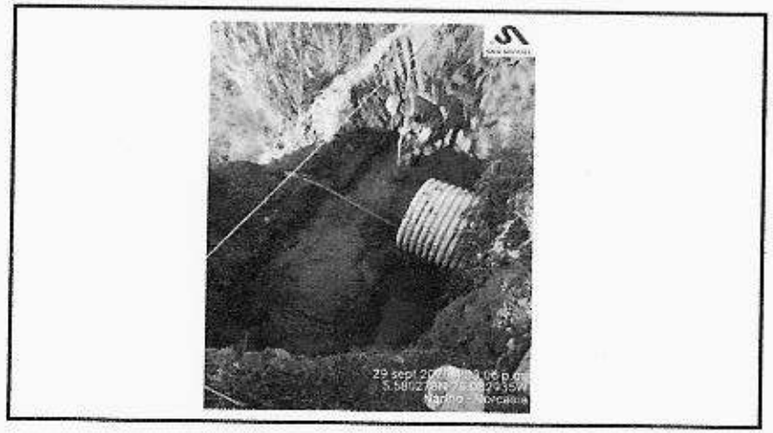


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	

Estructuras de drenaje

640.1 T3 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa





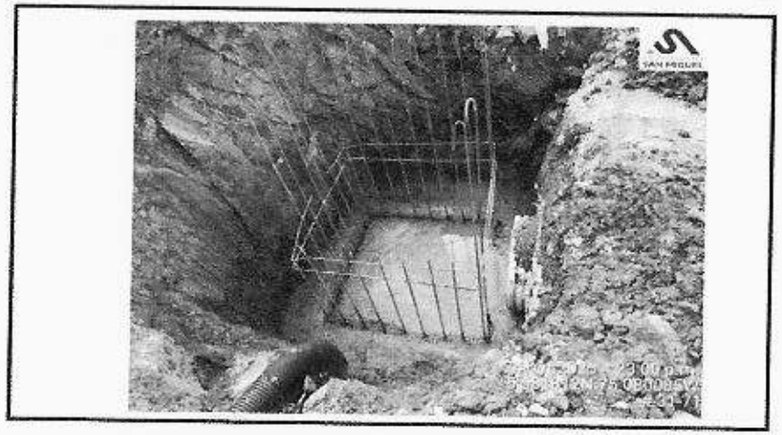





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

Estructuras de drenaje

673.2 T3 MATERIAL GRANULAR DRENANTE

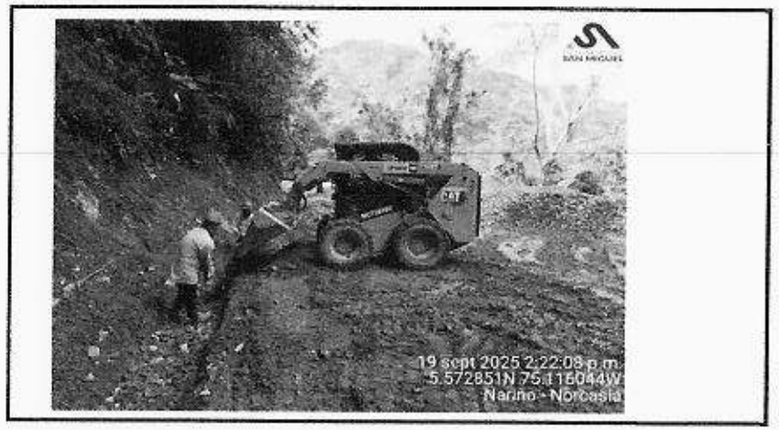

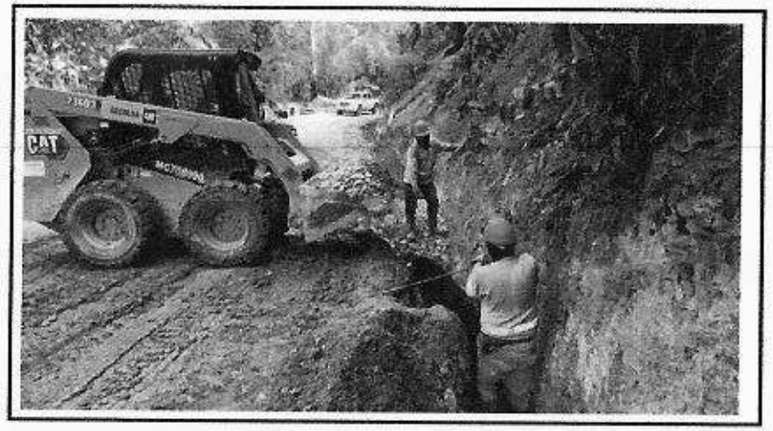






GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

Obras de estabilización

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

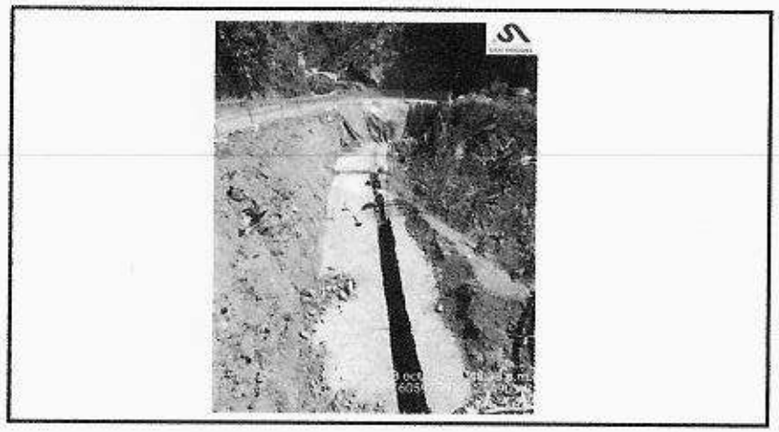







GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	


Obras de estabilización

630.6 T3 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa (F)







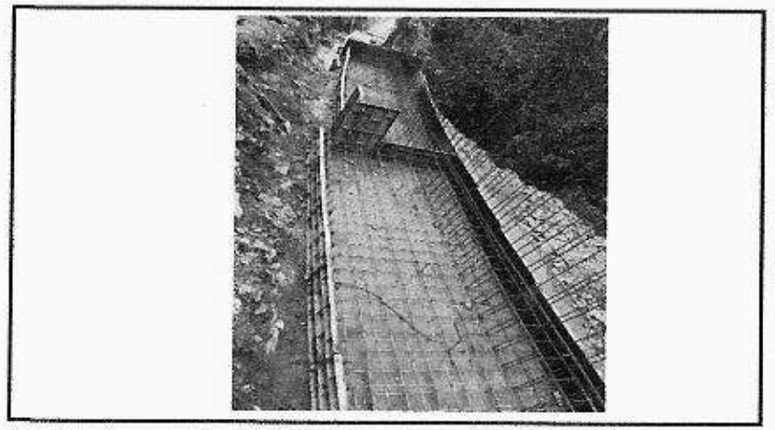


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3


Obras de estabilización

640.1 T3 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa

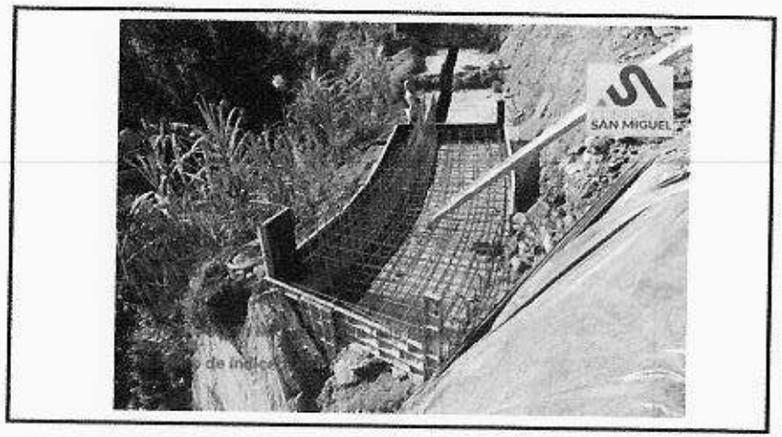



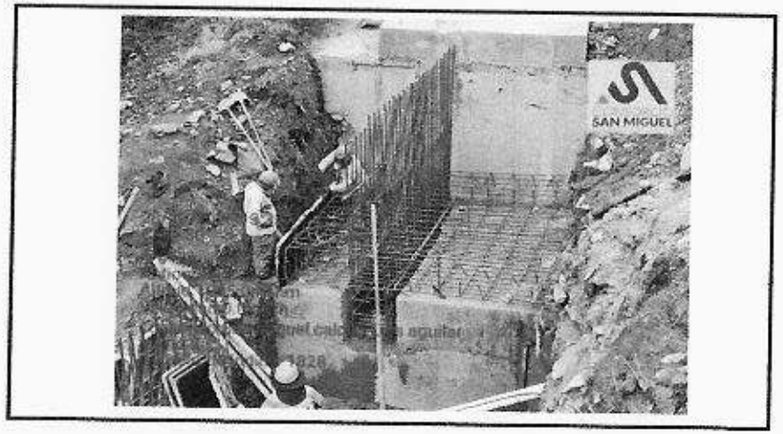


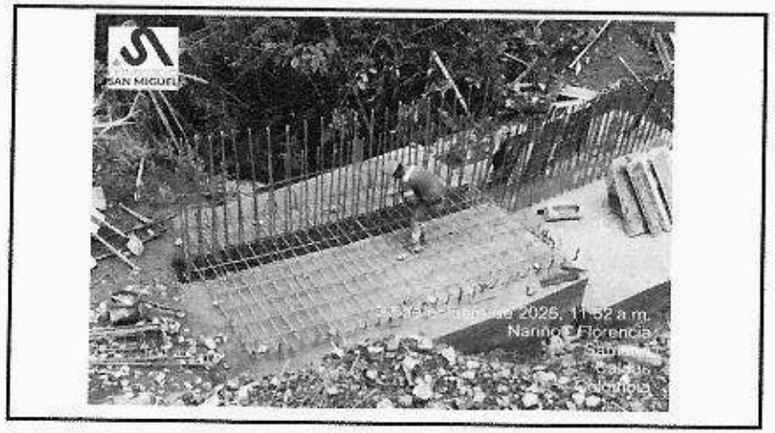



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		


Obras de estabilización

673.2 T3 MATERIAL GRANULAR DRENANTE

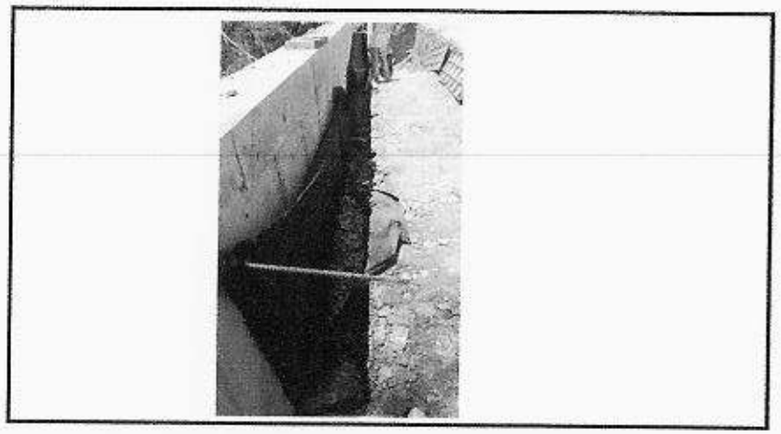

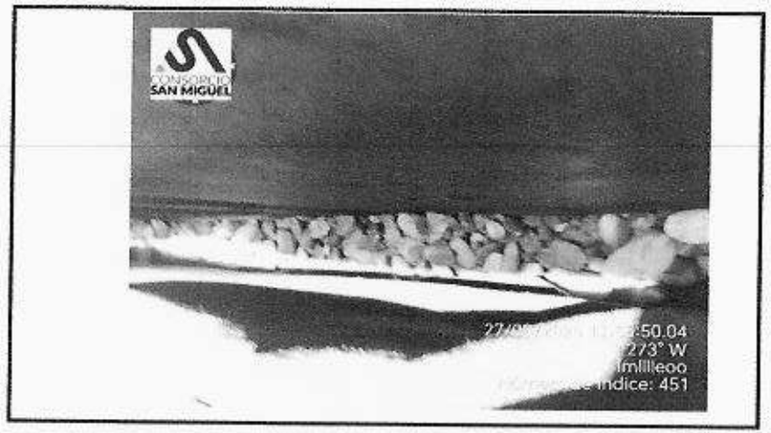

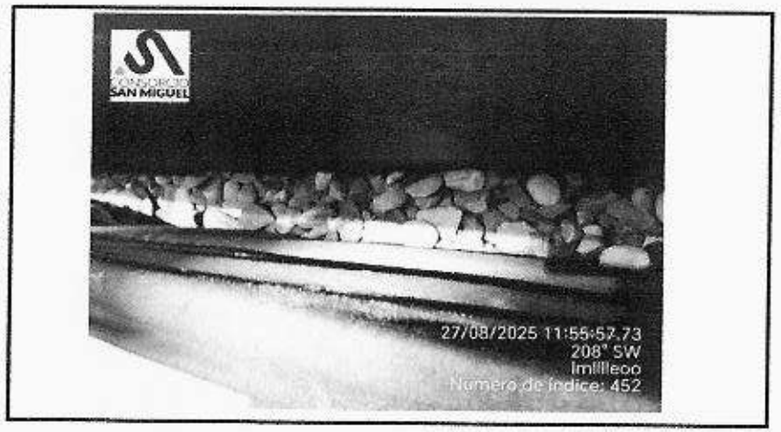


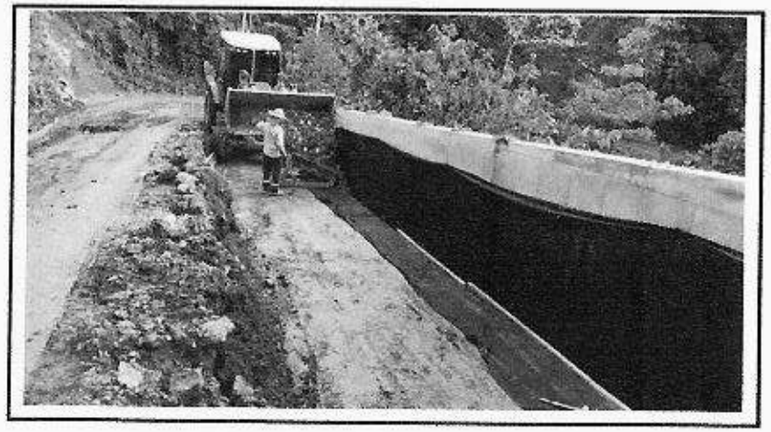



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		


Obras de estabilización

673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE

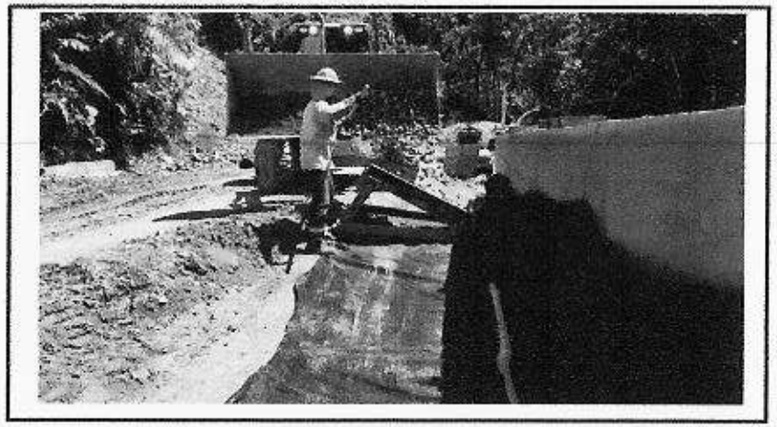

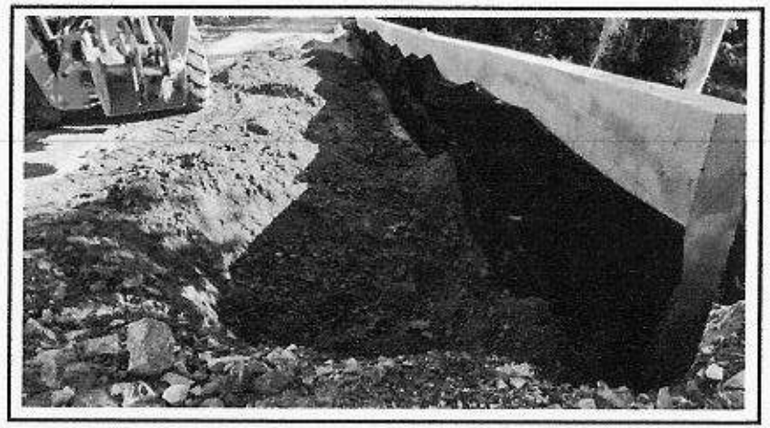

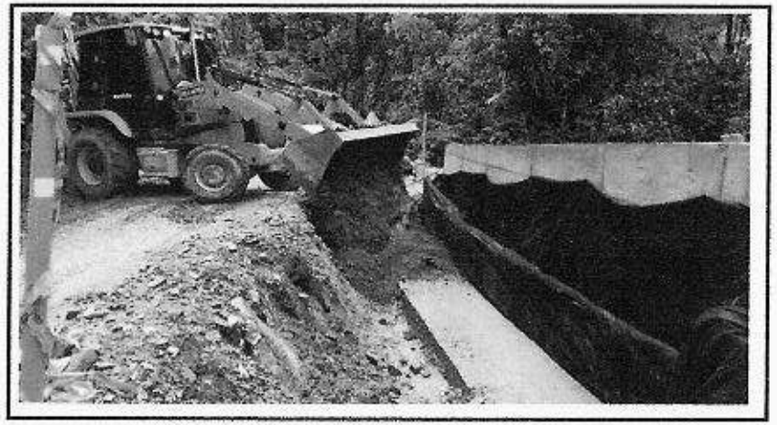


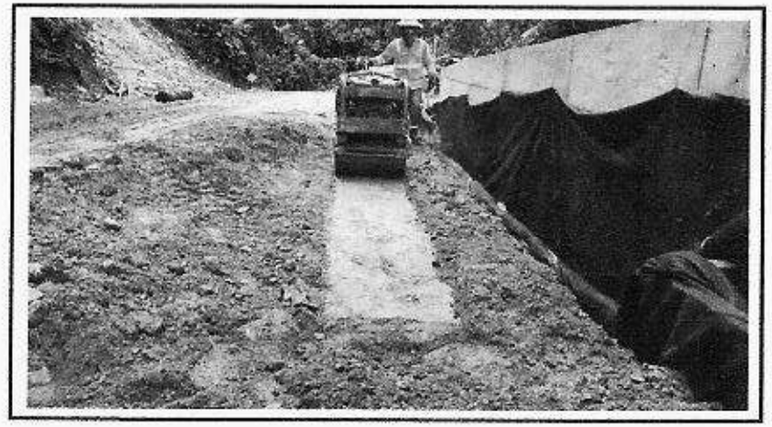


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

Obras de estabilización

663.1.1 TUBERÍA DE PVC 4"

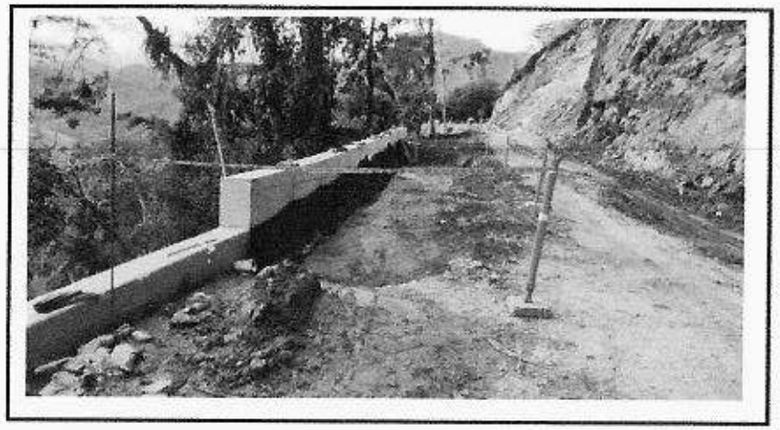

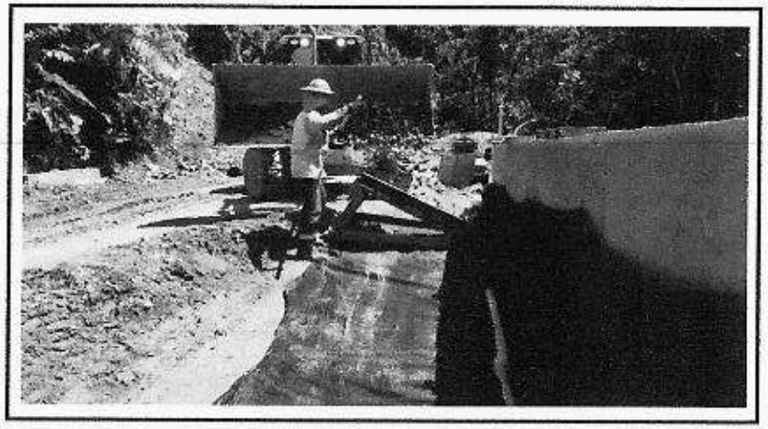








GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	


Transporte

900.2.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

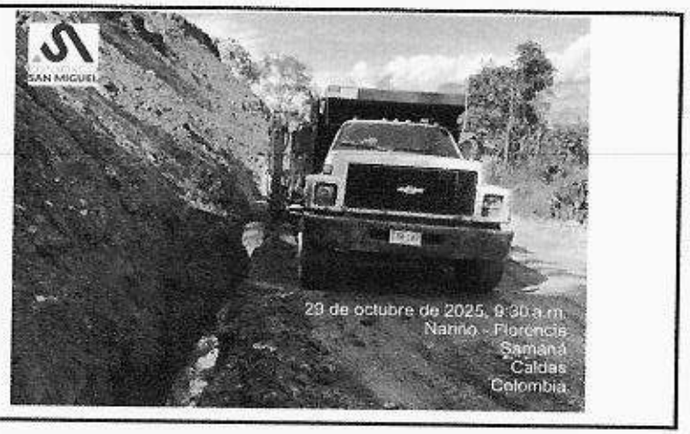

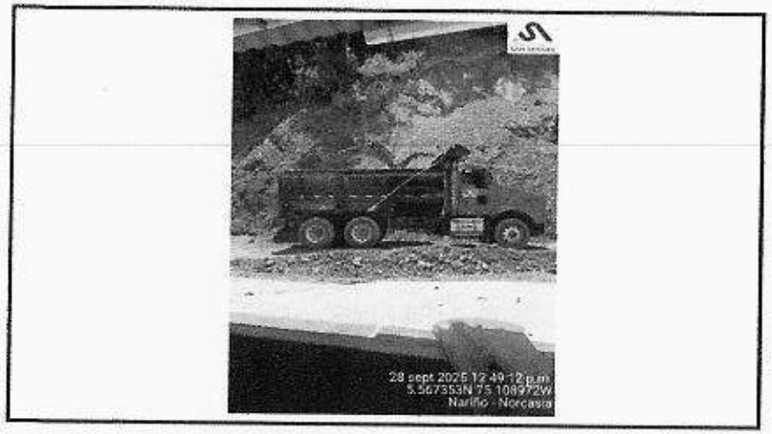

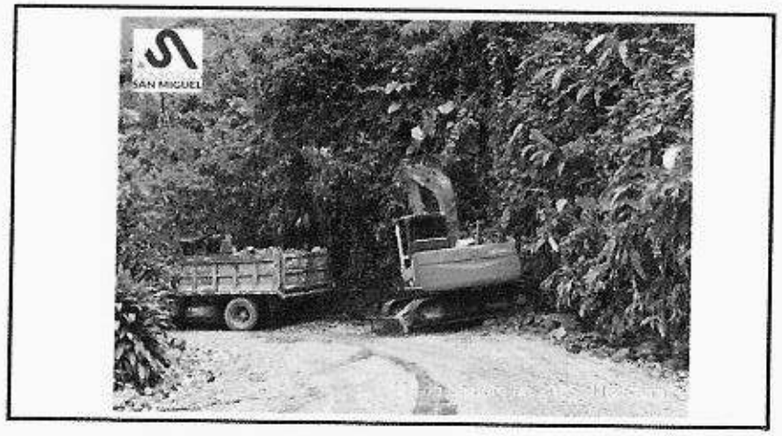

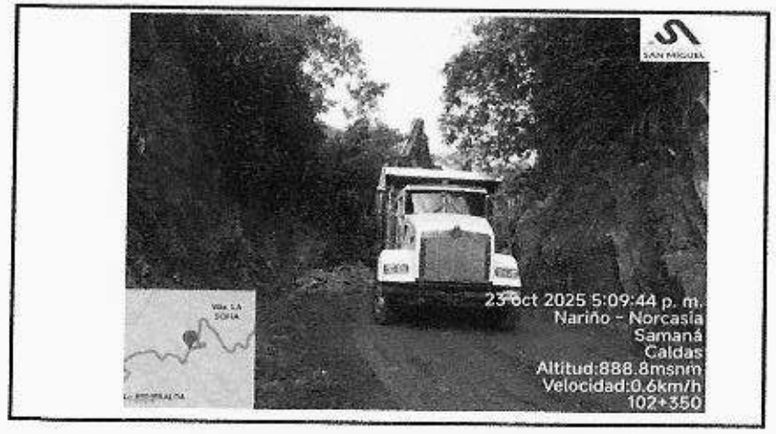



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		


No previstos

NP2 INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE APORTE DE LA ZONA, NO INCLUYE SUMINISTRO NI TRANSPORTE DE MATERIAL



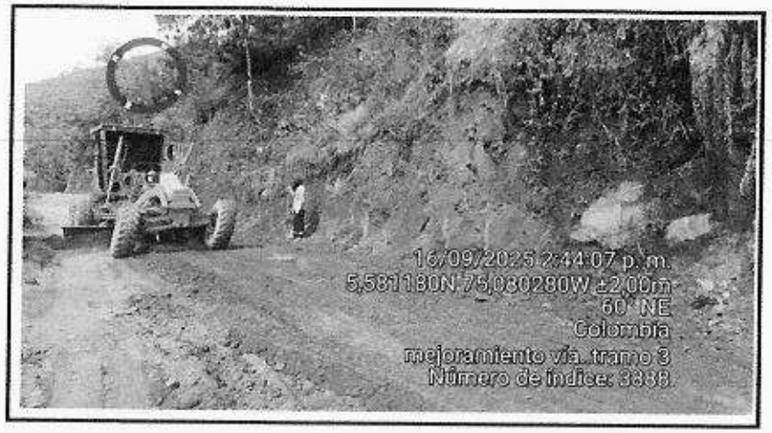

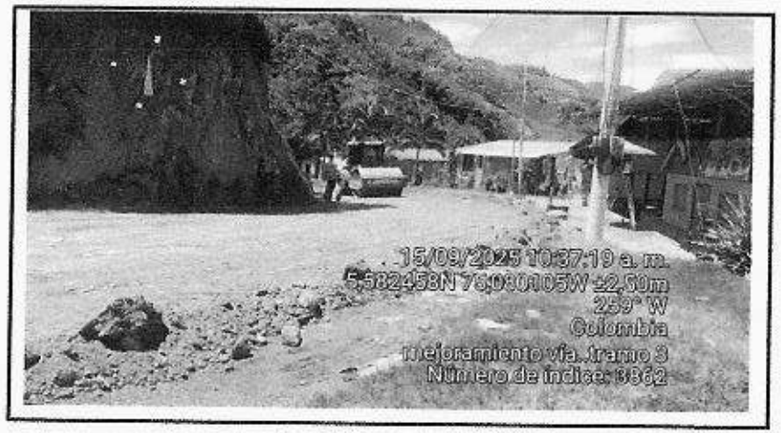


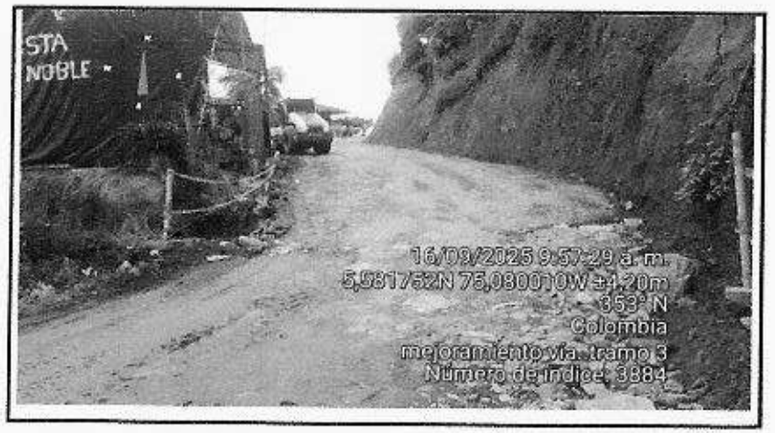

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

No previstos

NP 211.1 Remoción de derrumbes

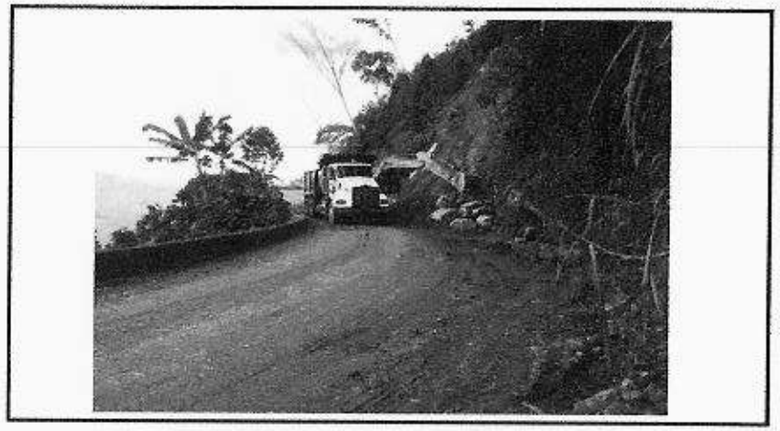








GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

No previstos

NP 610.2 **Rellenos para estructuras con material de préstamo, excavaciones y/o derrumbes**

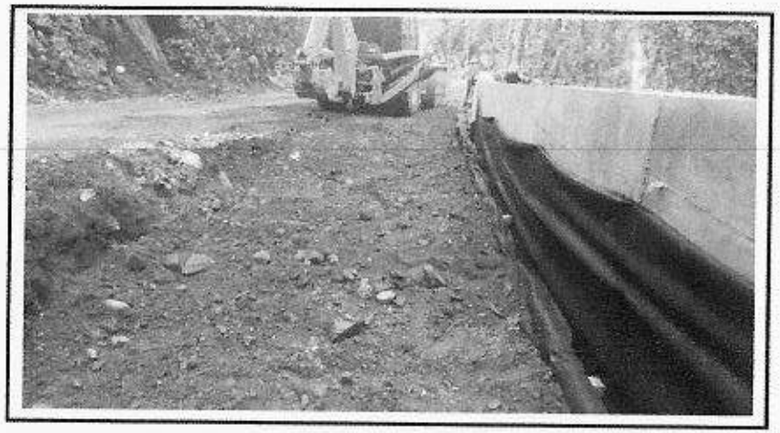









GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	


No previstos

NP 900.3.2 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)

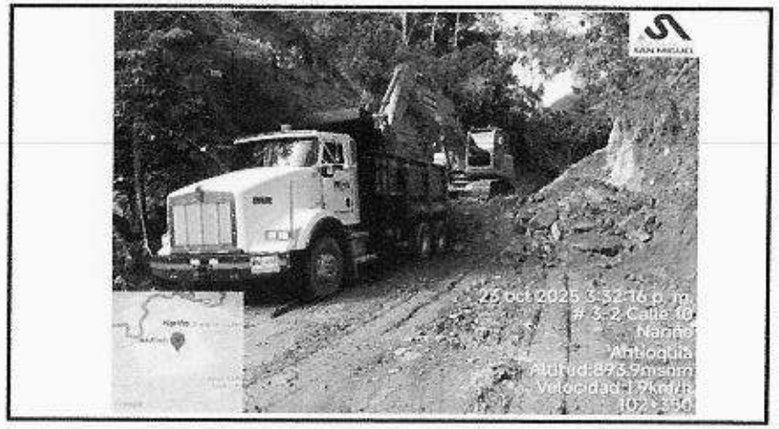



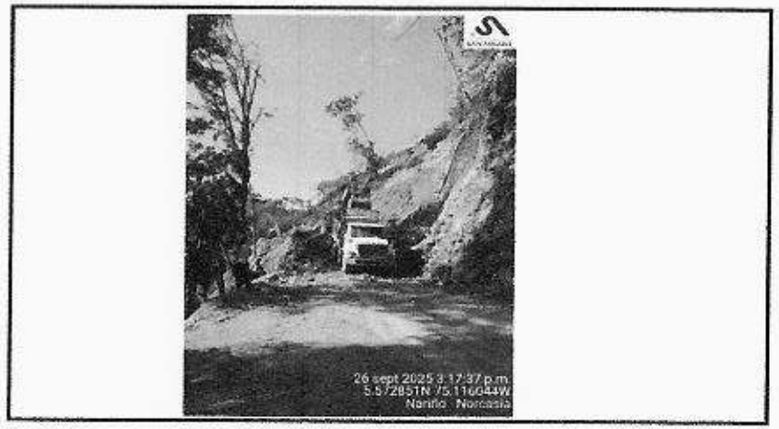

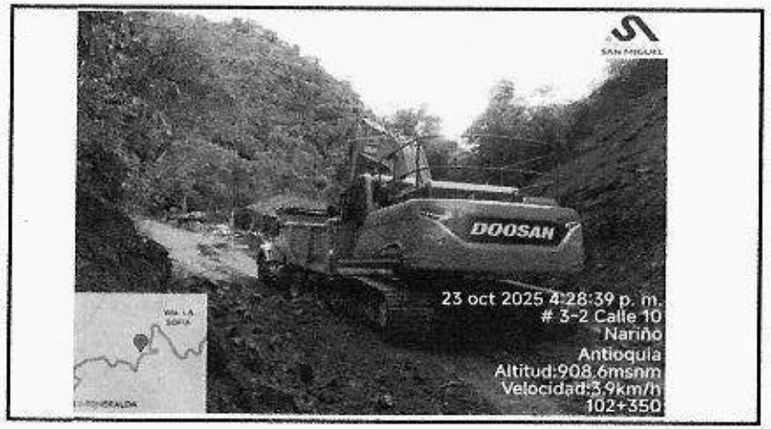

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	

No previstos

NP 210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES










GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3	

No previstos

NP4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN y PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE, APLICA

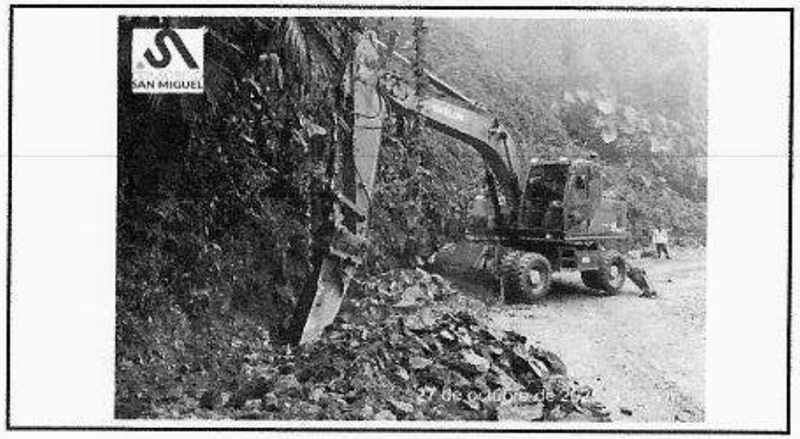










GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

No previstos

NP630.3.2 T4 CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4

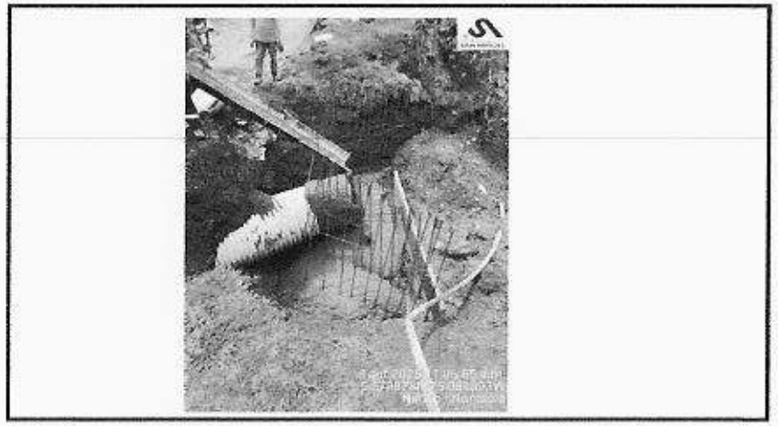

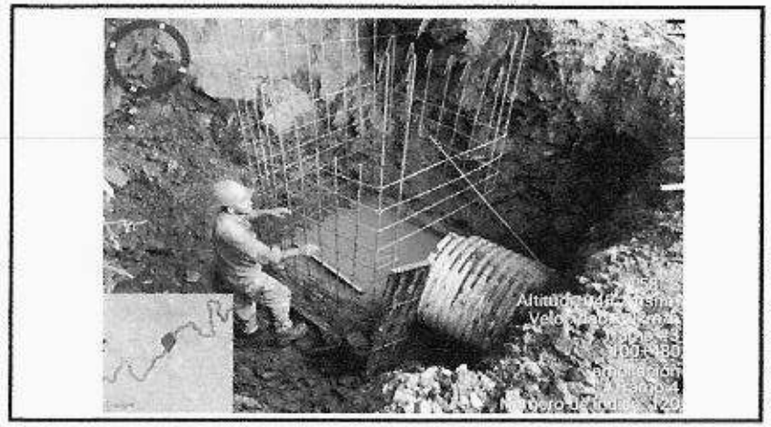

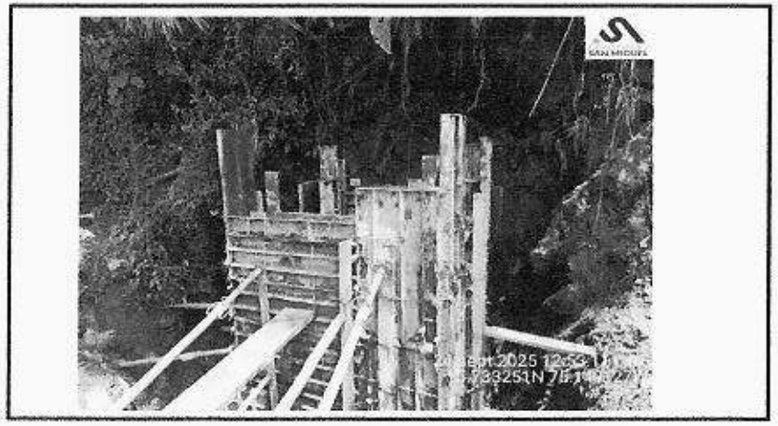



GOBERNACIÓN DE CALDAS		
GOBIERNO DE CALDAS	Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		


No previstos

NP630.4.2 T4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4








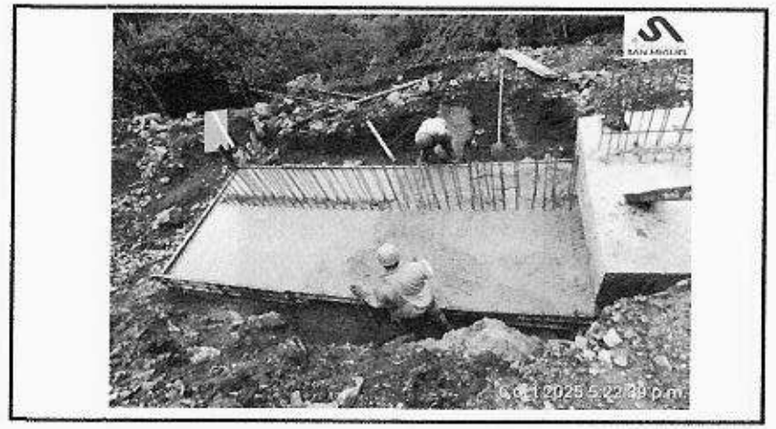


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		

No previstos

NP11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL PARA FILTROS ALTURA TOTAL 0.71 M, INCLUYE BOLSILLO PARA TUBERIA DE 6"

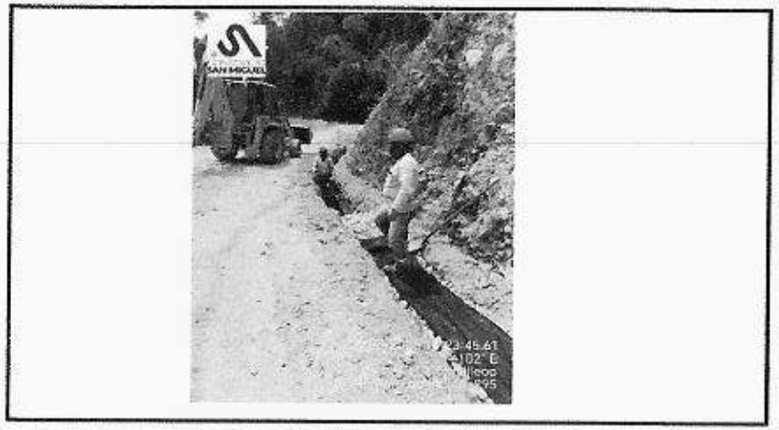

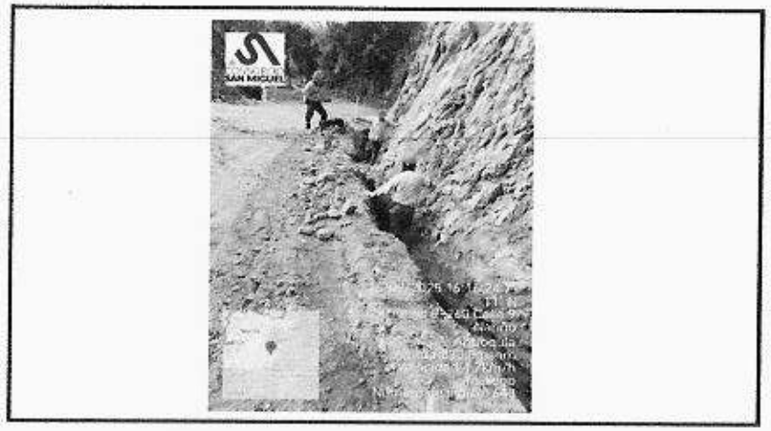







GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 3		


No previstos

NP12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" PARA DRENAJE

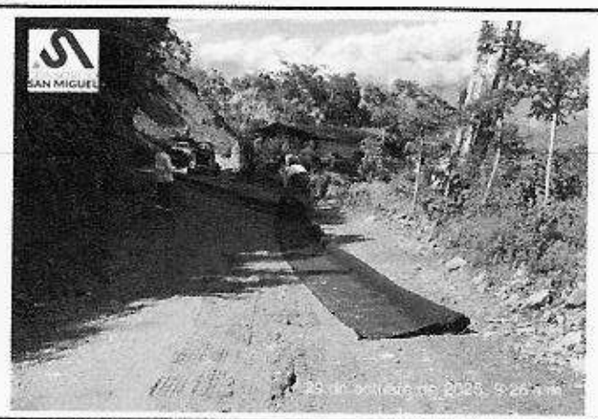

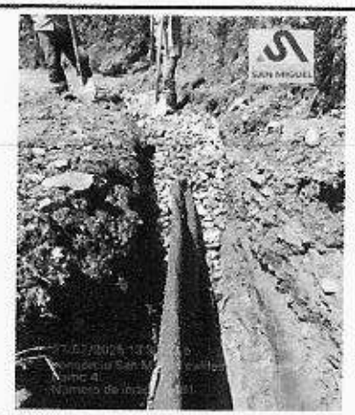



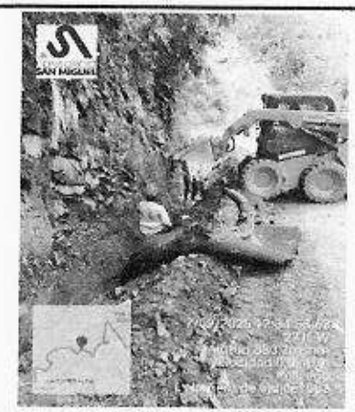

PRE-ACTA TRAMO 4

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	16						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripcion
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23							
K107+610.00	K107+610.30	5.50	1.80	1.60	15.84	D/I	Excavación ODT K107+610.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				15.80			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	119.00
ACTA PARCIAL NO. 10	293.50
ACTA PARCIAL NO. 11	456.00
ACTA PARCIAL NO. 12	220.70
ACTA PARCIAL NO. 13	218.00
ACTA PARCIAL NO. 14	282.50
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	123.30
ACTA PARCIAL NO. 17	53.10
ACTA PARCIAL NO. 18	53.30
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	37.40
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**15.80**
TOTAL ACUMULADO	1868.40

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	25092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	24	UNIDAD
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 21							
ALCANTARILLAS							
K107+256.00	K107+256.00	-1.90	1.90	0.05	-0.181	DERECHA	Solado para encole
K1084080.00	K1084080.00	-1.90	1.90	0.05	-0.181	DERECHA	Solado para encole
K107+208.00	K107+208.00	-2.00	0.70	0.05	-0.070	IZQUIERDA	Aleta 1 descole
K107+208.00	K107+208.00	-2.00	0.70	0.05	-0.070	IZQUIERDA	Aleta 2 descole
K107+208.00	K107+208.00	-2.18	0.80	0.05	-0.087	IZQUIERDA	Cabezal en descole
K107+208.00	K107+208.00	-3.87	1.27	0.05	-0.195	IZQUIERDA	Losa solera en descole
K107+208.00	K107+208.00	-4.34	6.25	0.05	-0.854	IZQUIERDA	Dentellon en descole
K107+208.00	K107+208.00	0.10	6.00	0.00	0.100	D/I	Descuento de acta N°20
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-0.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	2.20
ACTA PARCIAL NO. 17	2.60
ACTA PARCIAL NO. 18	1.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.10
ACTA PARCIAL NO. 20	0.10
ACTA PARCIAL NO. 21	0.80
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-0.70**
TOTAL ACUMULADO	6.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	290920.3-1436	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAR INGENIERIA DE VALOR

ITEM	26					UNIDAD
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm					m
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO.23							
K107+610.00	K107+618.00	8.00			8.00	D/I	Tubería de 36" en GUT K107+610.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				8.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	62.40
ACTA PARCIAL NO. 10	166.20
ACTA PARCIAL NO. 11	189.89
ACTA PARCIAL NO. 12	127.40
ACTA PARCIAL NO. 13	82.40
ACTA PARCIAL NO. 14	6.16
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	18.40
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	1.70
ACTA PARCIAL NO. 23	**8.00**
TOTAL ACUMULADO	665.5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAR INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2905232-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	29						UNIDAD
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa						Kg
Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
ALCANTARILLAS							
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
K106+810.00	K106+810.00	1	825.60	1/2"	0.994	820.6	Acero de refuerzo en disipador descole del K106+810- Ver cartilla de despiece
K107+258.00	K107+258.00	1	123.39	1/2"	0.994	122.6	Acero de refuerzo en disipador encole del K107+258- Ver cartilla de despiece
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23						943.00	

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	790.00
ACTA PARCIAL NO. 15	161.00
ACTA PARCIAL NO. 16	1474.00
ACTA PARCIAL NO. 17	2265.00
ACTA PARCIAL NO. 18	510.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	637.06
ACTA PARCIAL NO. 22	151.60
ACTA PARCIAL NO. 23	**943.00**
TOTAL ACUMULADO	6731.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIRADO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: CAJA DE ENTRDA EN ODT K107+208 CD
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL
















Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	4	6.10				24.40							
	2	1.90				3.80							
	4	6.10				24.4							
	2	6.00				12							
	2	2.00					4						
	5	4.45					22.25						
	4	1.30				5.2							
	8	1.60					12.8						
	7	6.85					47.95						
	4	6.05					24.2						
	4	1.00					4						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						69.80	115.20						
Peso en kilos						39.09	114.51						
Peso total (kg)			153.60										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: DISIPADOR EN EL K106+810
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL







Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	12	6.00					72						
	12	6.94					83.28						
	12	6.64					79.68						
	12	6.00					72						
	44	4.32					190.08						
	9	6.10					54.9						
	4	5.52					22.08						
	4	8.62					34.48						
	4	8.32					33.28						
	4	6.27					25.08						
	4	8.47					33.88						
	4	8.72					34.88						
	4	8.42					33.68						
	4	9.45					37.8						
	2	1.25					2.5						
	5	1.65					8.25						
	5	1.55					7.75						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	825.60						
Peso en kilos						0.00	820.65						
Peso total (kg)			820.65										

	Nombre	
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: DISIPADOR EN EL K107+258 CD
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	9	3.77					33.93						
	3	5.22					15.66						
	3	3.16					9.48						
	6	2.02					12.12						
	6	2.80					16.8						
	6	2.60					15.6						
	6	1.70					10.2						
	6	1.60					9.6						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0.00	123.39						
Peso en kilos						0.00	122.65						
Peso total (kg)			122.65										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS


PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	20092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	42						UNIDAD
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23							
K107+280.00	K107+280.00				67.29	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
K107+700.00	K107+700.00				23.39	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
K107+720.00	K107+720.00				64.42	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
K107+720.00	K107+760.00				-14.08	IZQUIERDA	Descuento por sobre excavación
		2.82	2.20	2.07	148.26	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
K107+820.00	K107+820.00				-13.47	IZQUIERDA	Descuento excavación de ODT
		3.02	3.36	2.01	128.96	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
K107+930.00	K107+930.00				-9.54	IZQUIERDA	Descuento excavación de ODT
		2.67	2.22	2.28	255.92	IZQUIERDA	Excavacion muro Ver anexo cartera topo.
					-19.61	IZQUIERDA	Descuento excavación de ODT
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				617.30			


ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	210.10
ACTA PARCIAL NO. 22	579.68
ACTA PARCIAL NO. 23	**617.30**
TOTAL ACUMULADO	1407.36

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA


ING. JOAQUIN TIBATA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

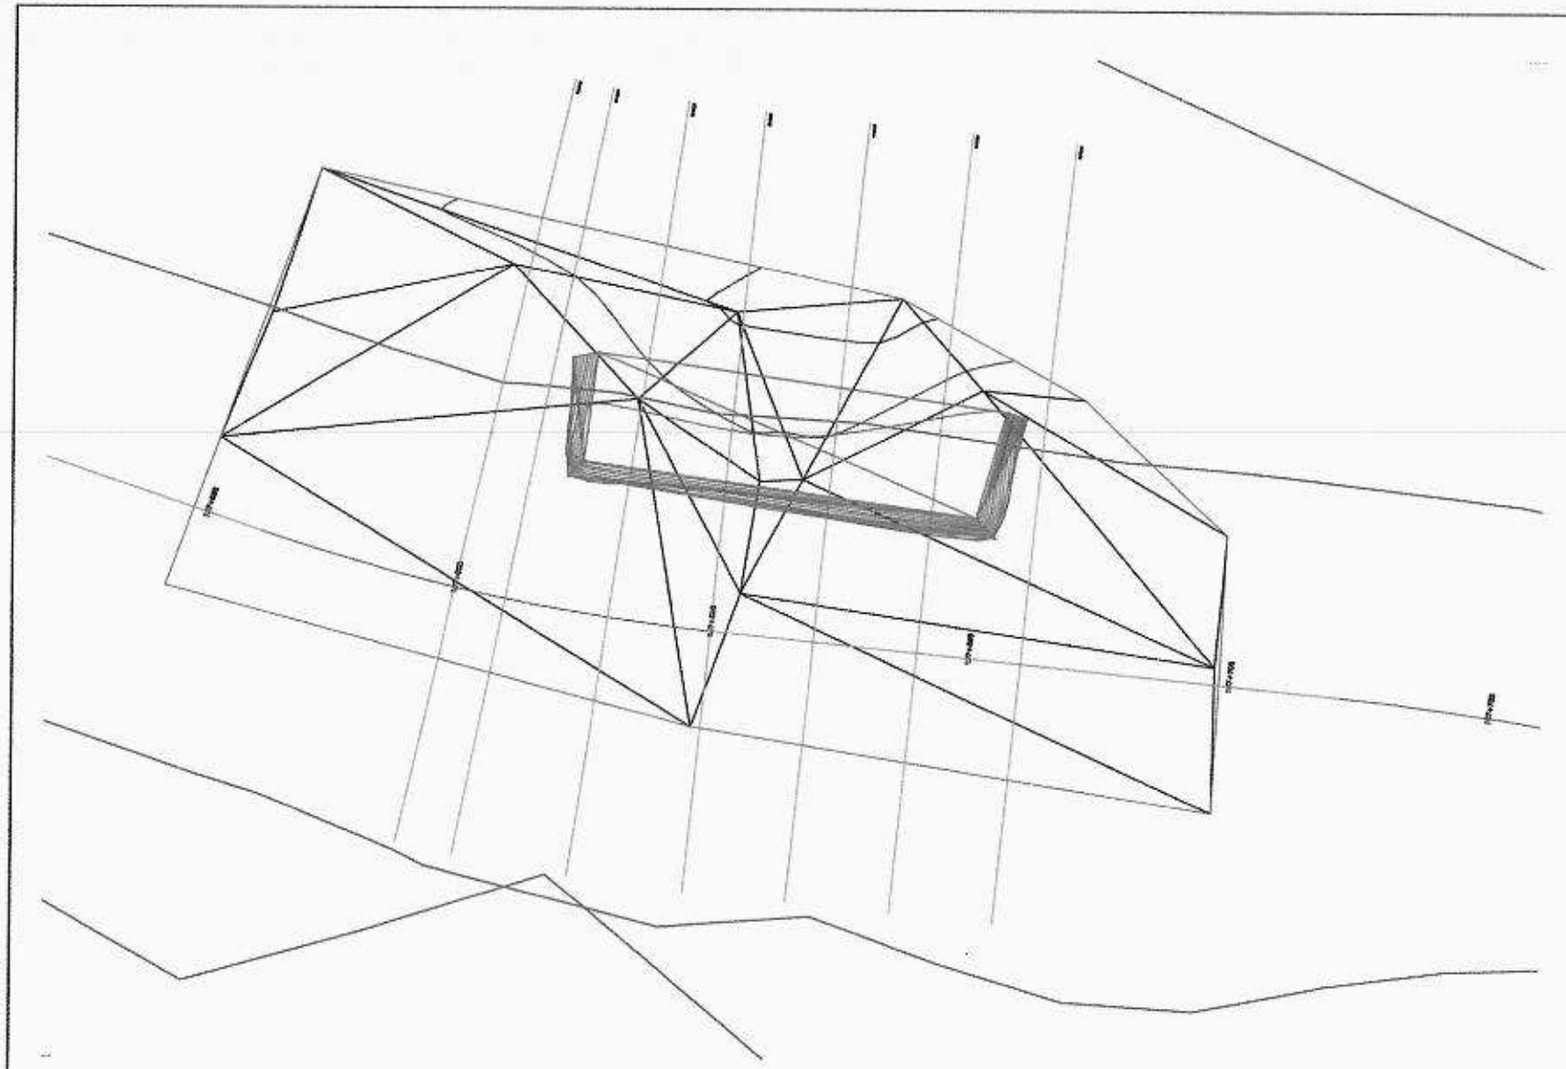


INGENIERÍA DE VALOR	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+020 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCV MURO K107+685–696 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H:1000	PLANOS 1 DE 2
SAN MIGUEL				FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:



107+696

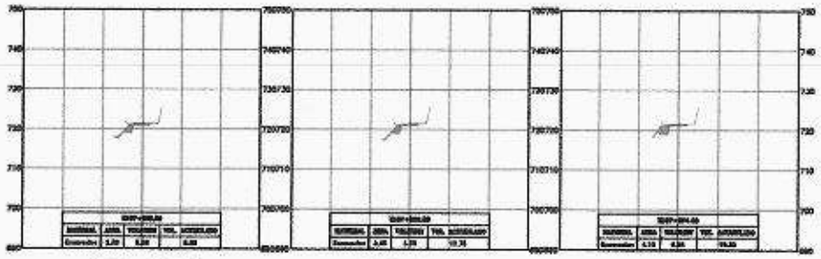

107+690 107+692 107+694

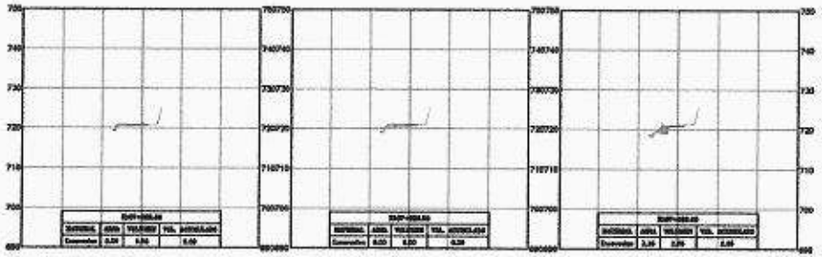


107+685 107+686 107+688

CONVENCIONES


NOTAS

REVISIONES


DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK105+000 PK107+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K107+685–696 TRAMO 4	ESCALA: H: 1:100 V: 1:1000	PLANOS 1 DE X			
				FECHA: Octubre 2023	ARCHIVO:		

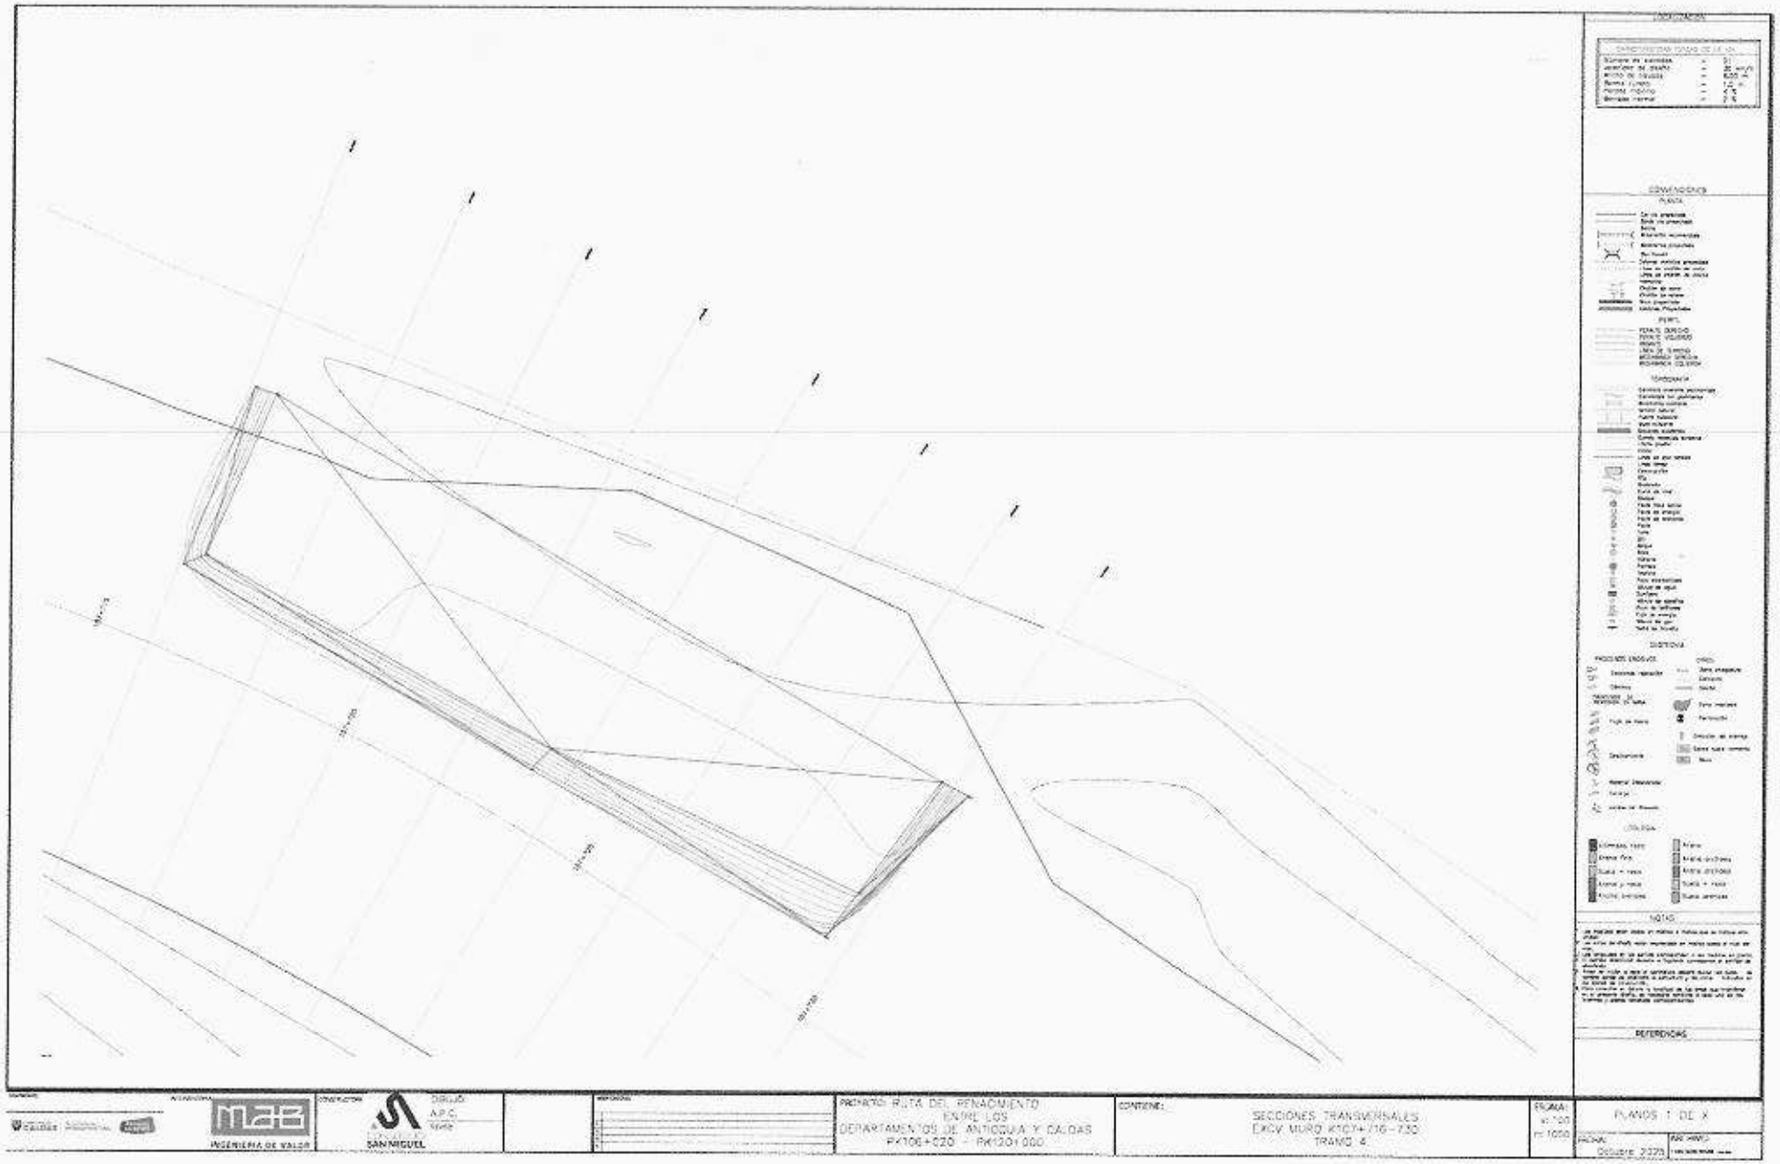


		DIBUJO: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL PENACMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+020 - PK130+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCV. MURO K107+716-730 TRAMO 4	ESCALA: H: 1:100 V: 1:100	PLANOS 1 DE X
							FECHA: OCTUBRE 2225	




107+728




107+730




107+722




107+724




107+726



107+716



107+718




107+720



		DIBUJÓ: A.P.G.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 PK107+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K107+716-730 TRAMO 4	ESCALAS: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

3

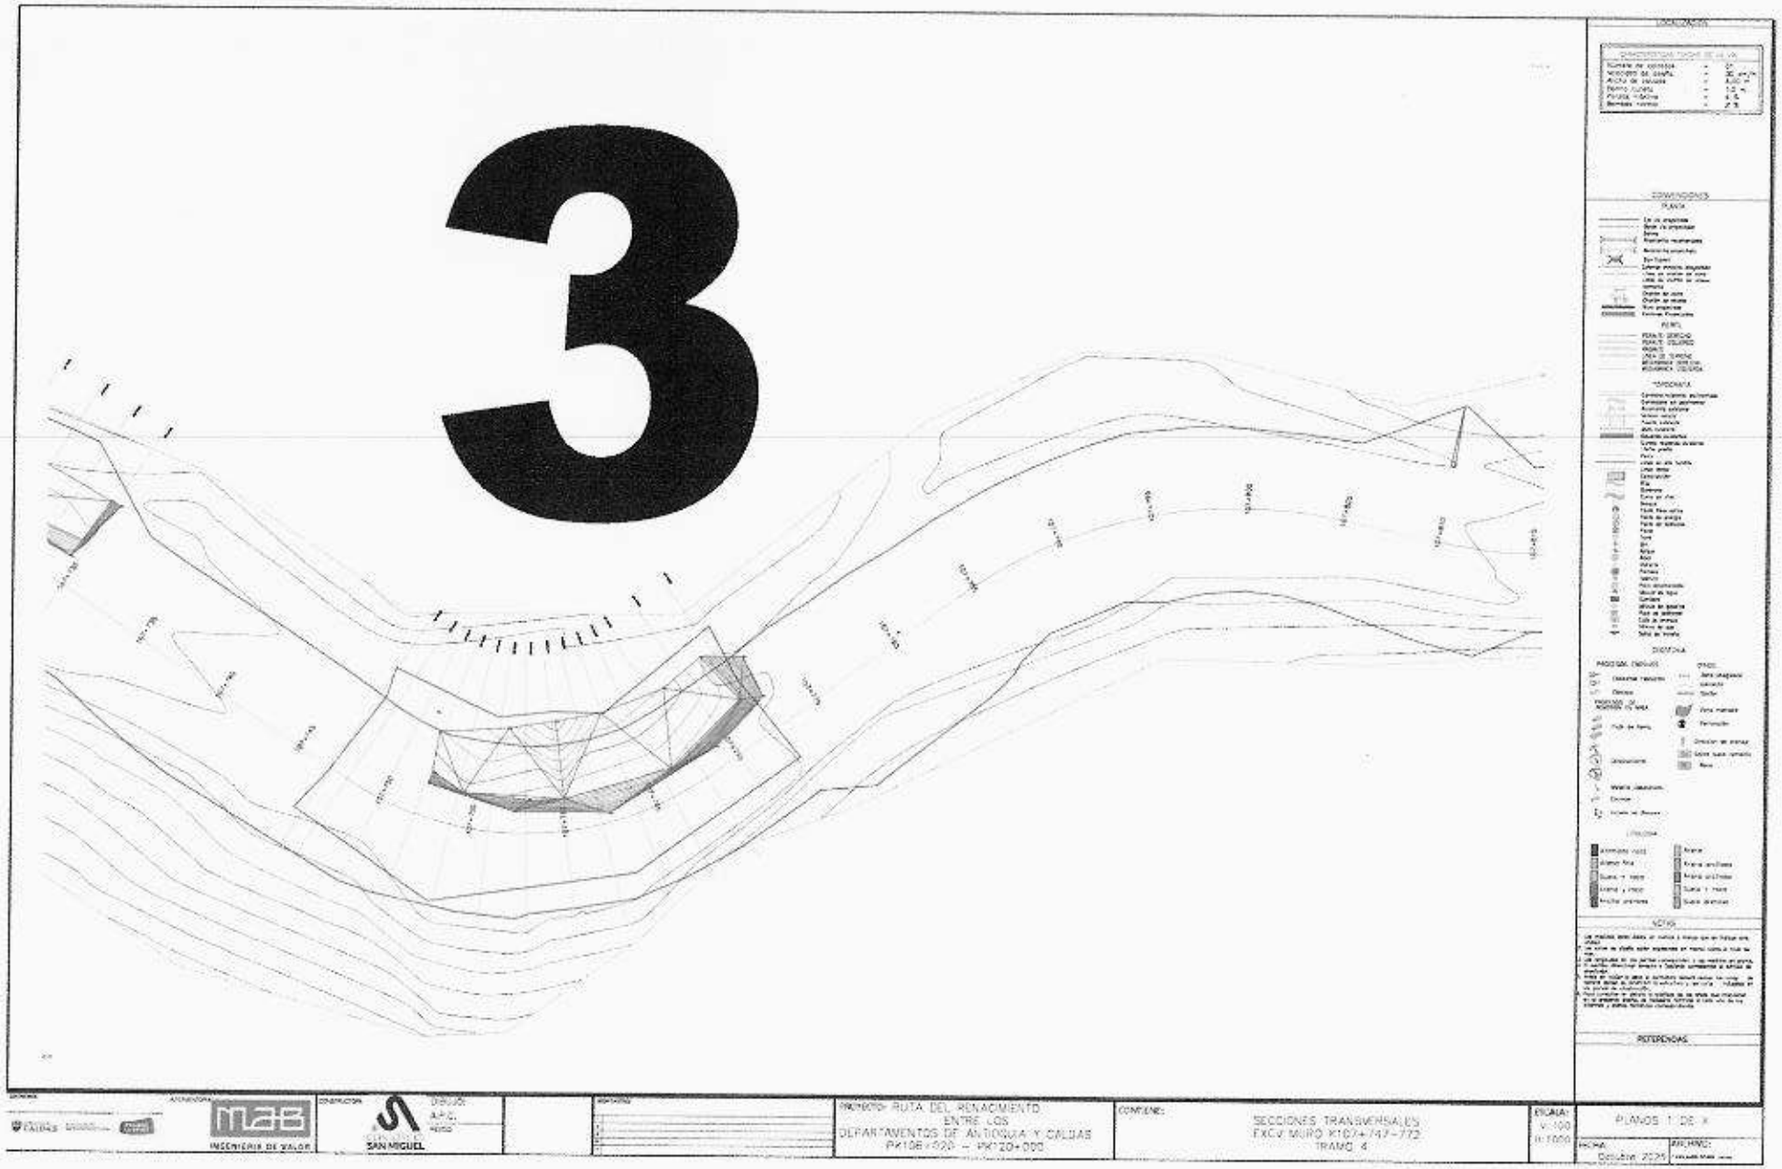


		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAV. MURO K107+747–772 TRAMO 4

ESCALA: V: 1:100 H: 1:100


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

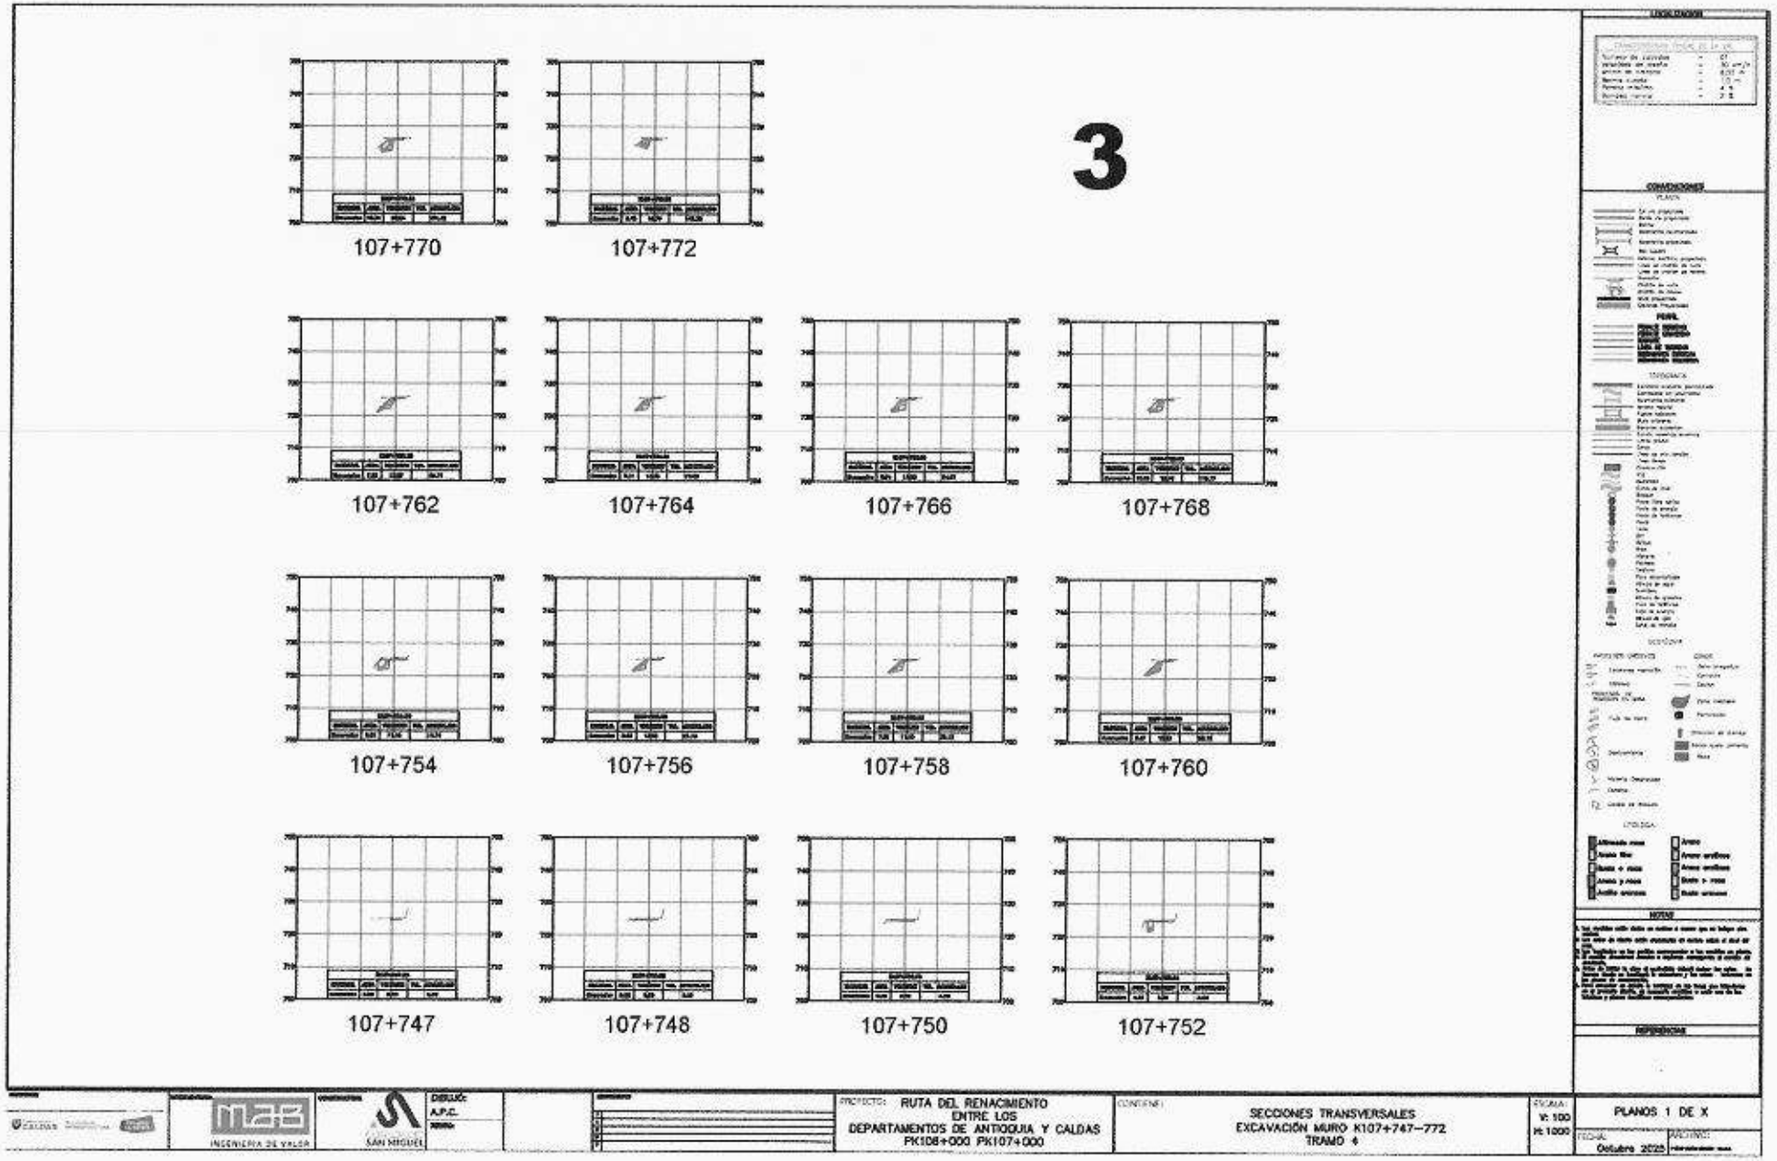
3
107+770
107+772
107+762
107+764
107+766
107+768
107+754
107+756
107+758
107+760
107+747
107+748
107+750
107+752
INGENIERIA DE VALOR
SAN MIGUEL
DIBUJO: A.P.C.
PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 PK107+000
CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K107+747-772 TRAMO 4
ESCALA: V: 1:100 H: 1:200
PLANOS 1 DE X
FECHA: Octubre 2025

4

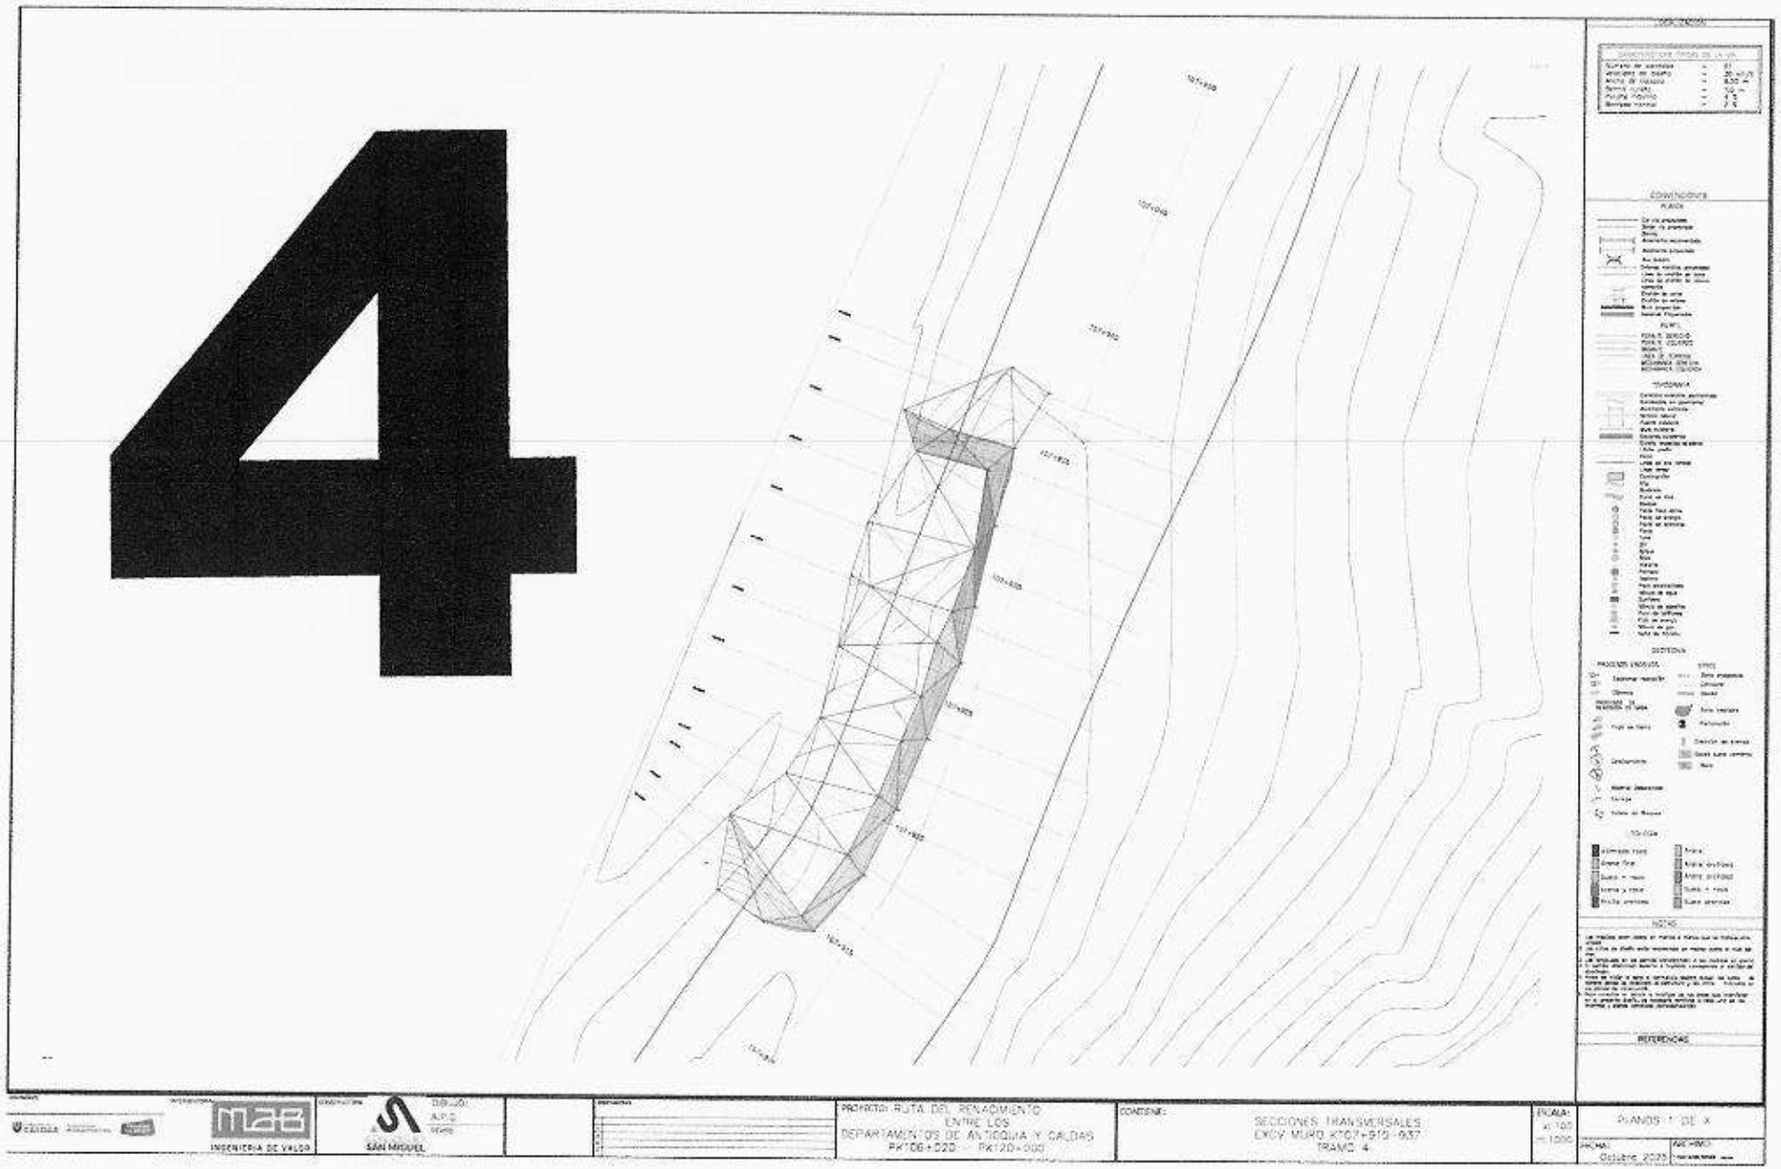

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+220 — PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCV. MURO K107+919 - 937
TRAMO 4


ESCALA: H 1:100 — V 1:100


PLANO 1 DE X


FECHA: Octubre 2025


4



107+937



107+930



107+932



107+934



107+936



107+922



107+924



107+926


107+928


107+915


107+916


107+918


107+920



DIBUJÓ: A.P.G.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 PK107+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K107+915-937 TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000


PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2023


ARCHIVO:

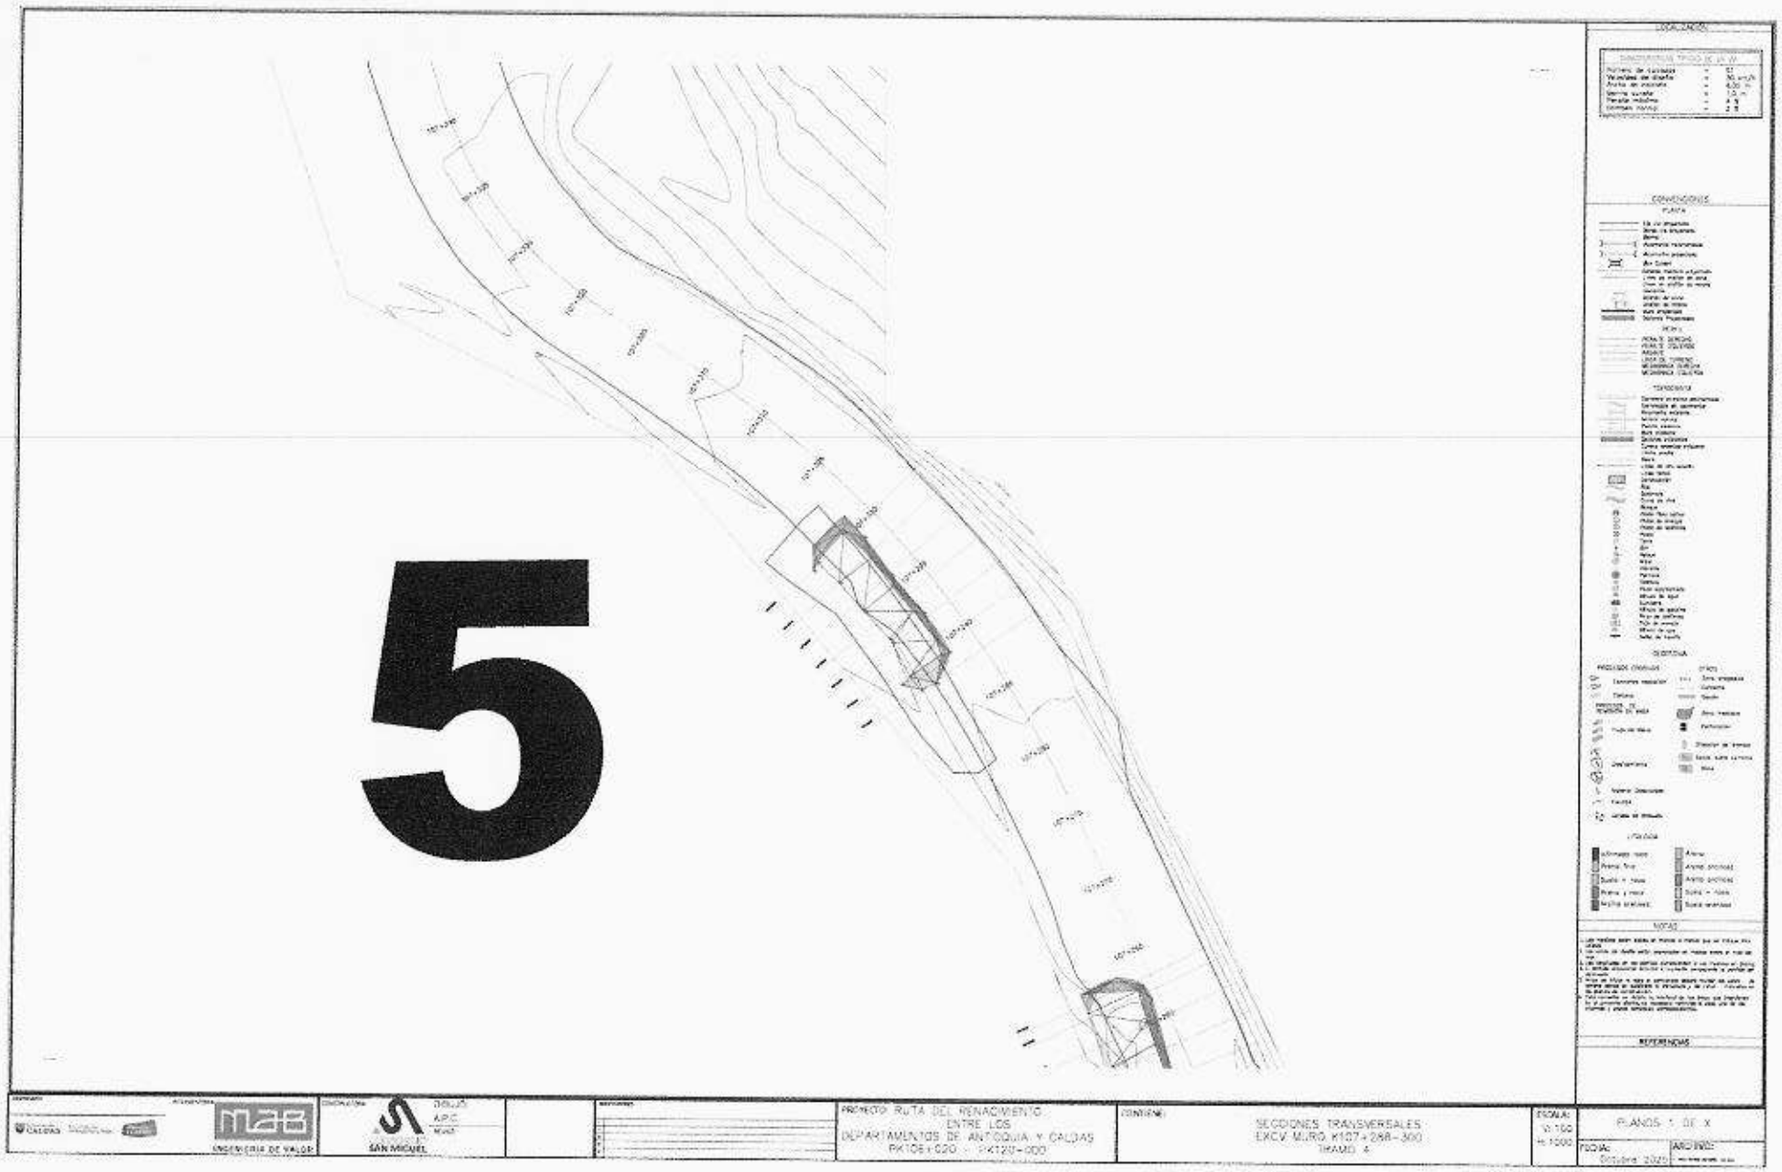
5
PROYECTO RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+020 - PK120+000
CONTIENE:
SECCIONES TRANSVERSALES
EXCV. MURO K107+268-300
TRAMO 4
ESCALA:
H:1:100
V:1:1000
PLANOS 1 DE X
FECHA:
Octubre 2025
ARCHIVO:
DIBUJO
A.P.C
MAB
INGENIERIA DE VALOR
SAN MIGUEL


5

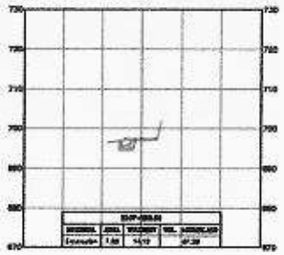


107+300




107+294

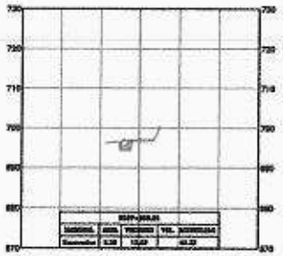


107+296

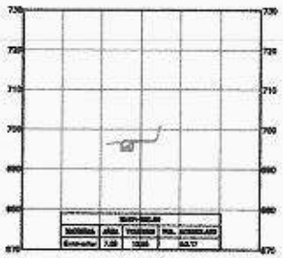


107+298



107+288



107+290




107+292



			DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 PK107+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN MURO K107+288-300 TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000
							FECHA: Octubre 2023

PLANOS 1 DE X

6

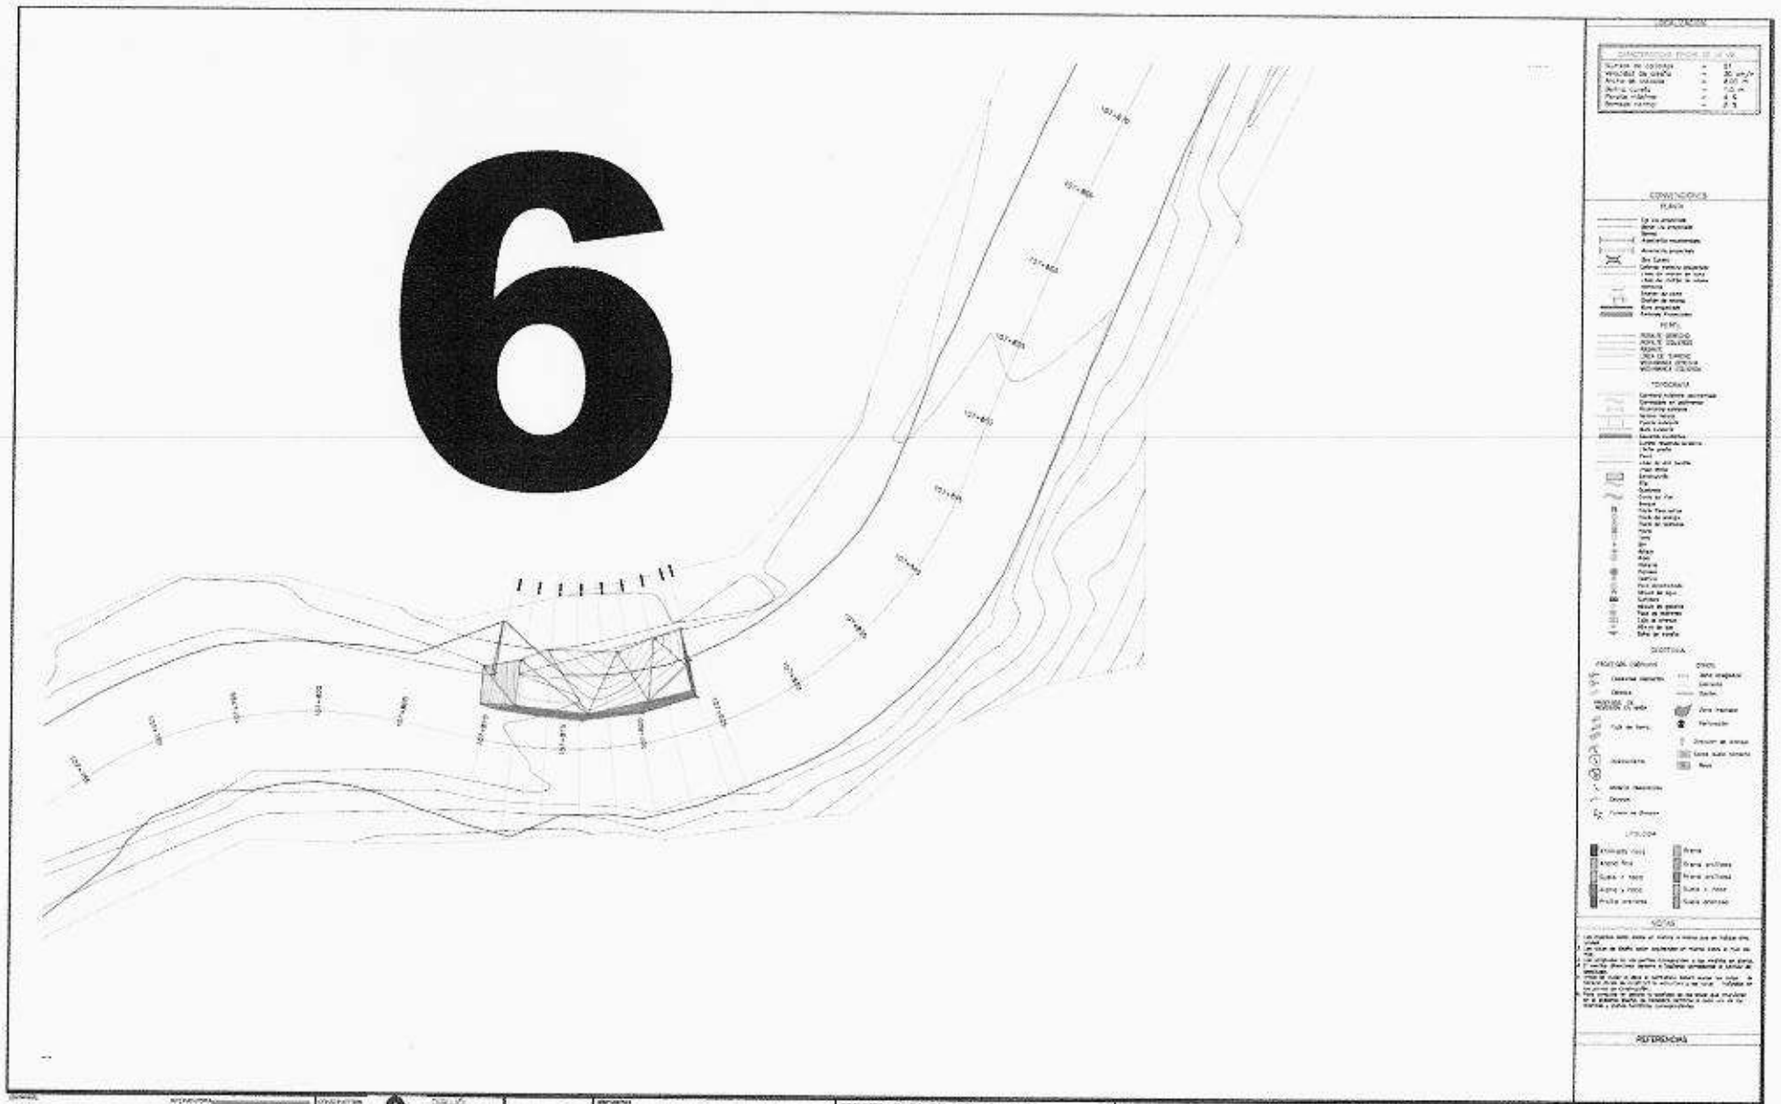

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+020 - PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EJEV MURO K107+870-875
TRAMO 4


ESCALA: V: 1/50 H: 1/1000

PLANOS T DE X


FECHA: Octubre 2021

ARCHIVO:


6

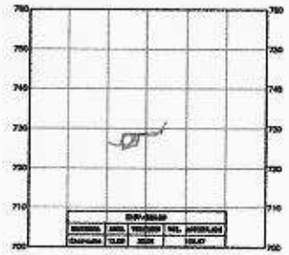


107+822

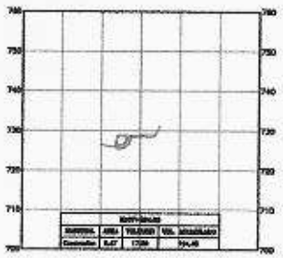


107+824

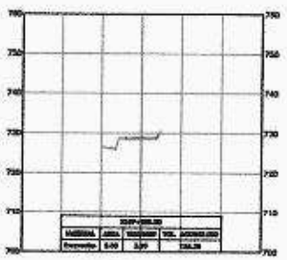


107+825

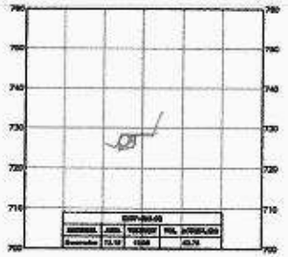


107+816

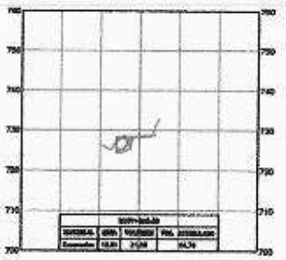


107+818

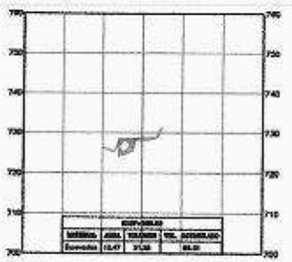


107+820

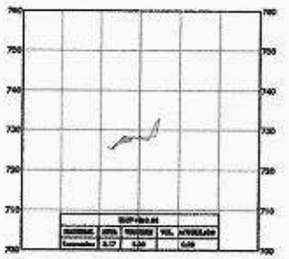

107+810

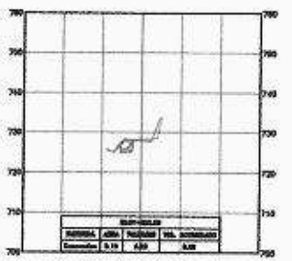

107+812

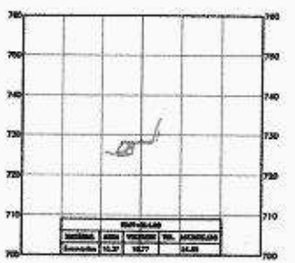

107+814



DISEÑO:
A.P.C.
APROB.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK108+000 PK107+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACIÓN MURO K107+810-825
TRAMO 4

ESCALA:
V: 1:100
H: 1:1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 PRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2839/2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	NAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	48					UNIDAD
630.6 T4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)					m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 21							
MUROS DE CONTENCIÓN							
K107+560.00	K107+560.00	-5.80	2.85	0.05	-0.827	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	-6.33	2.85	0.05	-0.902	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	-7.00	1.05	0.05	-0.368	DERECHA	Solado de zarpa 3 en muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	-4.30	2.25	0.05	-0.462	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	-4.70	2.25	0.05	-0.505	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-3.40			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	3.40
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-3.40**
TOTAL ACUMULADO	0.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
NAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. [illegible] TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaría de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2960/2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	187. DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	50	UNIDAD
640.1 T4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	Kg

Abscisa Inicial	ESTRUCTURA	CANTIDAD	LONGITUD	CALIBRE	PESO (KG-M)	PESO TOTAL	Descripción
MUROS DE CONTENCIÓN							
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
K107+140.00	K107+140.00	1.00	471.20	1/2"	0.994	468.37	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+170.00	K107+170.00	1.00	350.40	1/2"	0.994	348.30	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+170.00	K107+170.00	1.00	465.30	1/2"	0.994	462.51	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
K107+170.00	K107+170.00	1.00	502.50	1/2"	0.994	499.49	Acero de refuerzo en módulo 3 muro - Ver cartilla de despiece
K107+200.00	K107+200.00	1.00	407.16	1/2"	0.994	404.72	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+200.00	K107+200.00	1.00	349.64	1/2"	0.994	347.54	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
K107+700.00	K107+700.00	1.00	554.10	1/2"	0.994	550.78	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+720.00	K107+720.00	1.00	503.60	1/2"	0.994	500.58	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+720.00	K107+720.00	1.00	451.40	1/2"	0.994	448.69	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
K107+760.00	K107+760.00	1.00	557.00	1/2"	0.994	553.66	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+760.00	K107+760.00	1.00	730.80	1/2"	0.994	726.42	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
K107+820.00	K107+820.00	1.00	521.70	1/2"	0.994	518.57	Acero de refuerzo en módulo 1 muro - Ver cartilla de despiece
K107+820.00	K107+820.00	1.00	494.90	1/2"	0.994	491.93	Acero de refuerzo en módulo 2 muro - Ver cartilla de despiece
SUB TOTAL ACTA PARCIAL No. 23					6322.00		

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	832.66
ACTA PARCIAL NO. 22	4117.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**6322.00**
TOTAL ACUMULADO	11271.6

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIRADO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+140
Fecha: octubre, 2025

MODULO 1

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	40	2.3					92						
	20	5.2					104						
	27	2.8					75.6						
	7	1.8					12.6						
	6	1					6						
							0						
	16	6					96						
	10	8.5					85						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							471.2						
Peso en kilos							468.3728						
Peso total (kg)			468.37										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+170 MÓDULO 1

Fecha: octubre, 2025

MODULO 3

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	38	2.3					87.4						
	14	5.2					72.8						
	27	2.8					75.6						
	7	1.8					12.6						
	6	1					6						
	16	6					96						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	350.4						
Peso en kilos						0	348.2976						
Peso total (kg)			348.3										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+170 MÓDULO 3
Fecha: octubre, 2025

MODULO 3

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	62	2					124						
	14	8.4					117.6						
	42	2.4					100.8						
	10	1.5					15						
	10	0.8					8						
	12	7.5					90						
	2	3.9					7.8						
	1	1.1					1.1						
	1	1					1						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	465.3						
Peso en kilos						0	462.5082						
Peso total (kg)			462.51										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON


No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+170 MÓDULO 3

Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO 3

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	68	2					136						
	14	9.15					128.1						
	45	2.38					107.1						
	11	1.5					16.5						
	10	1					10						
	10	8.5					85						
	2	6.4					12.8						
	1	3.2					3.2						
	1	3.8					3.8						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales						0	502.5						
Peso en kilos						0	499.485						
Peso total (kg)			499.49										

	Nombre	
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON




No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: z

Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	46	2.3					105.8						
	18	6					108						
	31	2.66					82.46						
	8	1.8					14.4						
	7	1					7						
							0						
	14	6.05					84.7						
	2	2.4					4.8						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							407.16						
Peso en kilos							404.71704						
Peso total (kg)			404.72										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+280
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	36	2.65					95.4						
	20	4.7					94						
	24	2.78					66.72						
	6	2.16					12.96						
	6	1.16					6.96						
							0						
	14	4.7					65.8						
	2	3.9					7.8						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							349.64						
Peso en kilos							347.54216						
Peso total (kg)			347.54										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+700

Fecha: octubre, 2025

MODULO

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	60	2.3					138						
	16	8.2					131.2						
	44	2.6					114.4						
	11	1.8					19.8						
	10	1					10						
							0						
	14	8.65					121.1						
	2	6					12						
	2	3.8					7.6						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							554.1						
Peso en kilos							550.7754						
Peso total (kg)			550.78										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON

No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+720 M1

Fecha: octubre, 2025

MODULO

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	60	2.3					138						
	16	8.15					130.4						
	40	2.54					101.6						
	10	1.8					18						
	10	1					10						
							0						
	12	7.8					93.6						
	2	6					12						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							503.6						
Peso en kilos							500.5784						
Peso total (kg)			500.58										

	Nombre	
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ	

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON


No. del Contrato LP-SI-004-2023

Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+720 M2

Fecha: octubre, 2025

MODULO

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	50	2.3					115						
	16	6.9					110.4						
	34	2.8					95.2						
	8	1.8					14.4						
	8	1					8						
							0						
	14	7					98						
	2	5.2					10.4						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							451.4						
Peso en kilos							448.6916						
Peso total (kg)			448.69										








	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato: LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+760 M1
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO 1

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	8	6.25					50						
	14	6.8					95.2						
	55	2.9					159.5						
	28	3.4					95.2						
	9	2.05					18.45						
	9	2.55					22.95						
	8	1.3					10.4						
	8	1					8						
	10	6					60						
	2	5					10						
	6	3.1					18.6						
	6	1.45					8.7						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.050	6.404
Metros lineales							557						
Peso en kilos							553.658						
Peso total (kg)			553.658										


	Nombre		
INGENIERO	ING JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+760 M2
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO 1

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm	8 mm	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"
			6M	8M	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10
	64	2.9					185.6						
	22	8.05					177.1						
							0						
	40	3.7					148						
	12	2.5					30						
	12	1.5					18						
							0						
	22	7.55					166.1						
	2	3					6						
							0						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							730.8						
Peso en kilos							726.4152						
Peso total (kg)			726.42										


	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

CONSORCIO SAN MIGUEL

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+820 M1
Fecha: octubre, 2025

MODULO 1

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	30	3.45					103.5						
	9	2.5					22.5						
	9	1.5					13.5						
	22	5.6					123.2						
	48	2.9					139.2						
							0						
							0						
	18	6.1					109.8						
	2	5					10						
							0						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							521.7						
Peso en kilos							518.5698						
Peso total (kg)			518.57										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

CANTIDADES ACERO FIGURADO

Proyecto: INVIAS 1071-2022 LA DORADA-SONSON
No. del Contrato LP-SI-004-2023
Localización: MURO DE CONTENCIÓN EN EL K107+820 M2
Fecha: octubre, 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

MODULO 2

Figura	Cantidad	Longitud de corte	6 mm 6M	8 mm 8M	1/4" No. 2	3/8" No. 3	1/2" No. 4	5/8" No. 5	3/4" No. 6	7/8" No. 7	1" No. 8	1 1/8" No. 9	1 1/4" No. 10
	50	2.9					145						
	22	5.6					123.2						
							0						
	27	3.3					89.1						
	7	2.5					17.5						
	7	1.5					10.5						
	8	1.75					14						
	8	1					8						
	12	5.2					62.4						
	6	2.5					15						
	6	1.7					10.2						
							0						
							0						
Peso nominal varilla de acero (kg/m)			0.222	0.394	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	3.042	3.973	5.060	6.404
Metros lineales							494.9						
Peso en kilos							491.9306						
Peso total (kg)			491.93										

	Nombre		
INGENIERO	ING.JOAQUIN TIBATÁ		

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2023		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	53	UNIDAD
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
MUROS							
K1064810.00	K1064810.00	16.80	0.20	1.95	72.24	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K1074140.00	K1074140.00	6.50	0.20	1.18	17.94	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K1074170.00	K1074170.00	22.00	0.20	0.90	48.48	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K00+000				138.60			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	94.40
ACTA PARCIAL NO. 23	**138.60**
TOTAL ACUMULADO	233.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	54		UNIDAD
663.1.1	TUBERÍA DE PVC 4"		m

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
MUROS							
K106+810.60	K106+810.60	16.80			16.80	IZQUIERDA	Filtro longitudinal muro
K107+140.80	K107+140.80	6.50			6.50	IZQUIERDA	Filtro longitudinal muro
K107+170.80	K107+170.80	22.00			22.00	IZQUIERDA	Filtro longitudinal muro
K00+000				45.30			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	27.90
ACTA PARCIAL NO. 23	**45.30**
TOTAL ACUMULADO	73.2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. [illegible] TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – PUNTAL, PUTA DEL RESACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

OBRA DE ARTE

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – PUNTAL, PUTA DEL RESACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS		
PROYECTO DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	28/11/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2500202-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERÍA DE VALOR

ITEM:	52	UNIDAD:
900.P.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/Km

ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23

ABSCISA DE CARTERA	K107+220.00							
ABSCISA INI	ABSCISA FIN	UNID/LONG/AN	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN BANCO (M3)	MARGEN	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripcion
K107+220.00	K106+810.00		K106+815.00	136.05		0.3E	40.8	Transporte de material de llant en su K107+220.00
K107+220.00	K106+810.00		K106+815.00	-6.35		0.3E	-1.9	Transporte de material de llant en su K107+220.00
K107+220.00	K106+810.00		K106+815.00	-6.40		0.3E	-1.9	Transporte de material de llant en su K107+220.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				37.00				

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	1510.3E
ACTA PARCIAL NO. 10	4301.3E
ACTA PARCIAL NO. 11	359.3E
ACTA PARCIAL NO. 12	352.00
ACTA PARCIAL NO. 13	981.00
ACTA PARCIAL NO. 14	6747.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	104.00
ACTA PARCIAL NO. 17	6183.32
ACTA PARCIAL NO. 18	416.00
ACTA PARCIAL NO. 19	5180.80
ACTA PARCIAL NO. 20	7817.30
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	1680.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**37.00**
TOTAL ACUMULADO	165716.1

ING. HERNÁN GÓMEZ PEÑARANDA
MAS INGENIERÍA DE VALOR
INTERVENTORÍA

ING. JOAQUÍN PIÑERES
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL REMACHEMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRACTA DE OBRA No:	23 TRAM 3	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2902023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1011 CM 2021	INTERVENTORIA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	TO							UNIDAD
SP 211.1	REMOCION DE DERRUMBES							M3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Volumen suelto	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23								
ABS INICIAL	ABS FINAL		VIAJES	VOLUMEN		TOTAL	MARGEN	DESCRIPCION
DERRUMBE EN VIA								
K109+180.00	K109+205.00		12.00	14.00		182.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K109+205.00
K109+270.00	K109+295.00		30.00	14.00		420.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K109+295.00
K109+270.00	K109+295.00		13.00	14.00		182.00	D/I	Derrumbe en Via en el K109+295.00
K108+720.00	K108+745.00		27.00	13.22		357.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+745.00
K108+720.00	K108+745.00		14.00	14.00		196.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+745.00
K108+720.00	K108+745.00		17.00	14.00		238.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+745.00
K108+520.00	K108+545.00		17.00	14.00		238.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+545.00
K108+720.00	K108+745.00		6.00	14.00		84.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+745.00
K108+720.00	K108+745.00		25.00	14.00		322.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+745.00
K108+720.00	K108+745.00		9.00	14.00		126.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+745.00
K108+865.00	K108+885.00		18.00	14.00		252.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+885.00
K108+920.00	K108+945.00		7.00	14.00		98.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+945.00
K107+680.00	K107+705.00		48.00	14.00		672.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+705.00
K107+680.00	K107+705.00		40.00	13.65		546.00	D/I	Derrumbe en Via en el K107+705.00
K107+680.00	K107+705.00		48.00	14.00		672.00	D/I	Derrumbe en Via en el K107+705.00
K106+260.00	K106+285.00		14.00	14.20		198.80	D/I	Derrumbe en Via en el K106+285.00
K107+610.00	K107+635.00		4.00	14.00		56.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+635.00
K107+820.00	K107+845.00		8.00	14.00		112.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+845.00
K107+930.00	K107+955.00		1.00	14.00		14.00	D/I	Derrumbe en Via en el K107+955.00
K107+820.00	K107+845.00		5.40	14.00		70.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+845.00
K107+560.00	K107+585.00		7.80	14.00		98.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+585.00
K108+500.00	K108+525.00		5.00	14.00		70.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+525.00
K108+650.00	K108+675.00		11.00	14.00		154.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+675.00
K108+650.00	K108+675.00		9.00	14.00		126.00	D/I	Derrumbe en Via en el K108+675.00
K109+410.00	K109+435.00		14.00	14.00		196.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K109+435.00
K108+850.00	K108+875.00		7.00	14.00		98.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K108+875.00
K107+560.00	K107+585.00		22.00	14.00		308.00	D/I	Derrumbe en Via en el K107+585.00
K106+270.00	K106+295.00		9.00	13.22		119.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K106+295.00
K107+680.00	K107+705.00		4.00	14.00		56.00	D/I	Derrumbe en zona de prestamo K107+705.00
K106+570.00	K106+595.00		11.00	14.00		308.00	D/I	Derrumbe en Via en el K106+595.00
K106+260.00	K106+285.00		45.00	14.00		630.00	D/I	Derrumbe en Via en el K106+285.00
K106+630.00	K106+655.00		35.00	14.00		490.00	D/I	Derrumbe en Via en el K106+655.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL No. 23				7602.00				

ACTA PARCIAL No. 1	
ACTA PARCIAL No. 2	
ACTA PARCIAL No. 3	
ACTA PARCIAL No. 4	
ACTA PARCIAL No. 5	
ACTA PARCIAL No. 6	
ACTA PARCIAL No. 7	
ACTA PARCIAL No. 8	
ACTA PARCIAL No. 9	143.20
ACTA PARCIAL No. 10	329.00
ACTA PARCIAL No. 11	449.00
ACTA PARCIAL No. 12	151.00
ACTA PARCIAL No. 13	314.00
ACTA PARCIAL No. 14	1831.00
ACTA PARCIAL No. 15	22204.00
ACTA PARCIAL No. 16	4998.00
ACTA PARCIAL No. 17	3452.00
ACTA PARCIAL No. 18	17684.00
ACTA PARCIAL No. 19	1775.00
ACTA PARCIAL No. 20	399.00
ACTA PARCIAL No. 21	2716.00
ACTA PARCIAL No. 22	1554.00
ACTA PARCIAL No. 23	**7602.00**
TOTAL ACUMULADO	67491.0

ING. GUSTAVO GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. [illegible]
REPRESENTANTE
CONTRATISTA

	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
Gobierno de CALDAS	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	25092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2071 DE 2023	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	75						UNIDAD
NF 610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO,EXCAVACIONES Y/O DERRUMBES						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23							
K106+810.00	K106+810.00	16.80	0.60	2.29	136.08	IZQUIERDA	Relleno de muro K106+810.00
K106+810.00	K106+810.00	16.80	0.20	-1.95	-6.55	IZQUIERDA	Descuento de filtro K106+810.00
K106+810.00	K106+810.00	3.60	3.14	0.49	-5.43	IZQUIERDA	Descuento de Tubería 36"
K107+140.00	K107+140.00	6.50	1.66	1.48	15.97	IZQUIERDA	Relleno de muro K107+140.00
K107+140.00	K107+140.00	6.50	0.20	-1.18	-1.53	IZQUIERDA	Descuento de filtro
K107+170.00	K107+170.00	22.00	2.05	1.20	54.12	IZQUIERDA	Relleno de muro K107+170.00
K107+170.00	K107+170.00	22.00	0.20	-0.90	-3.96	IZQUIERDA	Descuento de filtro K107+170.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				188.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	343.80
ACTA PARCIAL NO. 10	571.80
ACTA PARCIAL NO. 11	196.30
ACTA PARCIAL NO. 12	112.10
ACTA PARCIAL NO. 13	0.00
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	111.10
ACTA PARCIAL NO. 23	**188.70**
TOTAL ACUMULADO	1923.2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIRADO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REENCUENTRO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRENATA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL REENCUENTRO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PRENATA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2909/2021-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORIA:	SAD INGENIERIA DE VALOR

ITEM	70	UNIDAD
NP 930.9.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/Km

ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23

ABSCISA DONDE TEO: K106+850.00

ABSCISA INI	ABSCISA FIN	UNID/LON O/KG	CENTRO DE GRAV	VOLUMEN SUELTO (M3)	MARGEN	DISTANCIA (KM)	TRANSPORTE (M3/KM)	Descripcion	
K103+180.00	K106+650.00		K104+185.00	192.00	D/I	3.00	576.00	Material de derrumbe en la via	K104+161.00
K103+270.00	K106+650.00		K104+675.00	420.00	D/I	3.10	1302.00	Material de derrumbe en la via	K103+270.00
K103+370.00	K106+650.00		K104+670.00	182.00	D/I	3.10	564.20	Material de derrumbe en la via	K103+370.00
K103+720.00	K106+650.00		K104+700.00	357.00	D/I	2.60	928.20	Material de derrumbe en la via	K106+720.00
K103+720.00	K106+650.00		K104+700.00	196.00	D/I	2.60	509.60	Material de derrumbe en la via	K104+720.00
K103+720.00	K106+650.00		K104+700.00	154.00	D/I	2.60	400.40	Material de derrumbe en la via	K104+720.00
K103+920.00	K106+650.00		K104+700.00	238.00	D/I	2.60	618.80	Material de derrumbe en la via	K104+720.00
K104+720.00	K106+650.00		K104+720.00	54.00	D/I	2.40	129.60	Material de derrumbe en la via	K104+520.00
K104+720.00	K106+650.00		K104+720.00	132.00	D/I	2.60	343.20	Material de derrumbe en la via	K104+520.00
K104+720.00	K106+650.00		K104+720.00	126.00	D/I	2.60	327.60	Material de derrumbe en la via	K104+720.00
K104+820.00	K106+650.00		K104+820.00	252.00	D/I	2.70	680.40	Material de derrumbe en la via	K104+820.00
K104+820.00	K106+650.00		K104+820.00	96.00	D/I	2.80	268.80	Material de derrumbe en la via	K104+820.00
K105+650.00	K106+650.00		K107+650.00	672.00	D/I	1.50	1008.00	Material de derrumbe en la via	K107+650.00
K104+650.00	K106+650.00		K107+650.00	546.00	D/I	1.50	819.00	Material de derrumbe en la via	K107+650.00
K104+680.00	K106+650.00		K107+650.00	672.00	D/I	1.50	1008.00	Material de derrumbe en la via	K107+650.00
K104+260.00	K106+650.00		K104+260.00	196.00	D/I	0.10	29.40	Material de derrumbe en la via	K106+260.00
K104+210.00	K106+650.00		K107+810.00	56.00	D/I	1.50	84.00	Material de derrumbe en la via	K107+810.00
K107+823.00	K106+650.00		K107+820.00	112.00	D/I	1.70	190.40	Material de derrumbe en la via	K107+820.00
K107+953.00	K106+650.00		K107+930.00	24.00	D/I	1.60	38.40	Material de derrumbe en la via	K107+930.00
K107+939.00	K106+650.00		K107+920.00	70.00	D/I	1.70	119.00	Material de derrumbe en la via	K107+920.00
K107+500.00	K106+650.00		K107+500.00	84.00	D/I	1.40	117.60	Material de derrumbe en la via	K107+500.00
K106+310.00	K106+650.00		K106+310.00	70.00	D/I	0.40	28.00	Material de derrumbe en la via	K106+310.00
K106+650.00	K106+650.00		K104+650.00	168.00	D/I	2.50	420.00	Material de derrumbe en la via	K104+650.00
K106+650.00	K106+650.00		K104+650.00	126.00	D/I	2.70	340.20	Material de derrumbe en la via	K104+650.00
K106+410.00	K106+650.00		K104+410.00	196.00	D/I	3.30	646.80	Material de derrumbe en la via	K104+410.00
K106+550.00	K106+650.00		K104+550.00	36.00	D/I	2.70	97.20	Material de derrumbe en la via	K104+550.00
K106+600.00	K106+650.00		K107+560.00	308.00	D/I	1.40	431.20	Material de derrumbe en la via	K107+560.00
K106+270.00	K106+650.00		K106+270.00	119.00	D/I	0.10	11.90	Material de derrumbe en la via	K106+270.00
K107+680.00	K106+650.00		K107+680.00	56.00	D/I	1.50	84.00	Material de derrumbe en la via	K107+680.00
K106+570.00	K106+650.00		K106+570.00	168.00	D/I	0.20	33.60	Material de derrumbe en la via	K106+570.00
K106+260.00	K106+650.00		K106+260.00	686.00	D/I	0.10	68.60	Material de derrumbe en la via	K106+260.00
K106+650.00	K106+650.00		K106+650.00	490.00	D/I	2.70	1323.00	Material de derrumbe en la via	K106+650.00
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				14579.00					

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	147.00
ACTA PARCIAL NO. 10	595.00
ACTA PARCIAL NO. 11	1441.00
ACTA PARCIAL NO. 12	595.00
ACTA PARCIAL NO. 13	1190.00
ACTA PARCIAL NO. 14	571.200
ACTA PARCIAL NO. 15	37269.00
ACTA PARCIAL NO. 16	23136.00
ACTA PARCIAL NO. 17	2304.00
ACTA PARCIAL NO. 18	32012.00
ACTA PARCIAL NO. 19	4057.00
ACTA PARCIAL NO. 20	435.00
ACTA PARCIAL NO. 21	2577.00
ACTA PARCIAL NO. 22	2319.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**14579.00**
TOTAL ACUMULADO:	125519.2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
SAD INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JORGE CIRETA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS


PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	2905-2021-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAB INGENIERIA DE VALOR
ITEM	60	UNIDAD	
MP 210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES		m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Area corte (m2)	Volumen corte	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23						
K1084+710.00	K1084+870.00	160.00		1189.40	D/I	Corte para ampliación de via- Ver anexo de topografia
K1084+941.00	K1084+963.00	23.00		134.60	D/I	Corte para ampliación de via- Ver anexo de topografia
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23			1324.00			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	1652.30
ACTA PARCIAL NO. 13	748.30
ACTA PARCIAL NO. 14	0.00
ACTA PARCIAL NO. 15	0.00
ACTA PARCIAL NO. 16	0.00
ACTA PARCIAL NO. 17	0.00
ACTA PARCIAL NO. 18	0.00
ACTA PARCIAL NO. 19	0.00
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	208.10
ACTA PARCIAL NO. 23	**1324.00**
TOTAL ACUMULADO	3933.5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN ZABATA
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

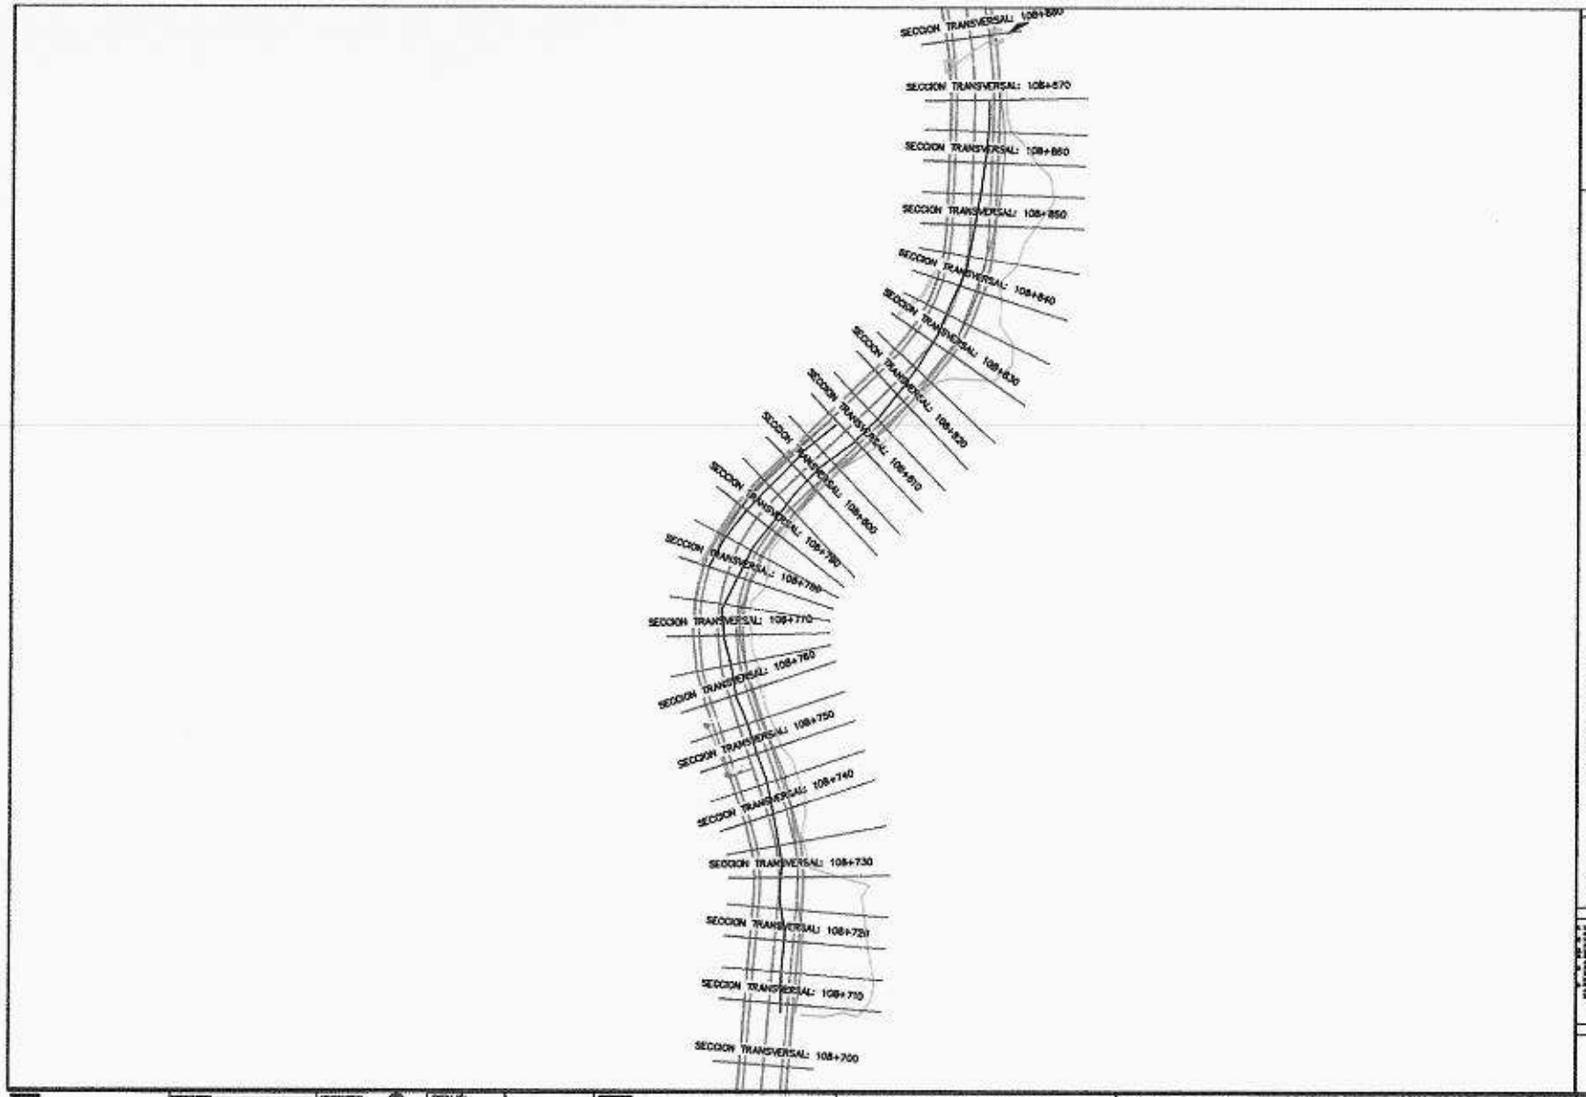

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

DIBUJO: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK105+000 — PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 1:100 H: 1:1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+710.00

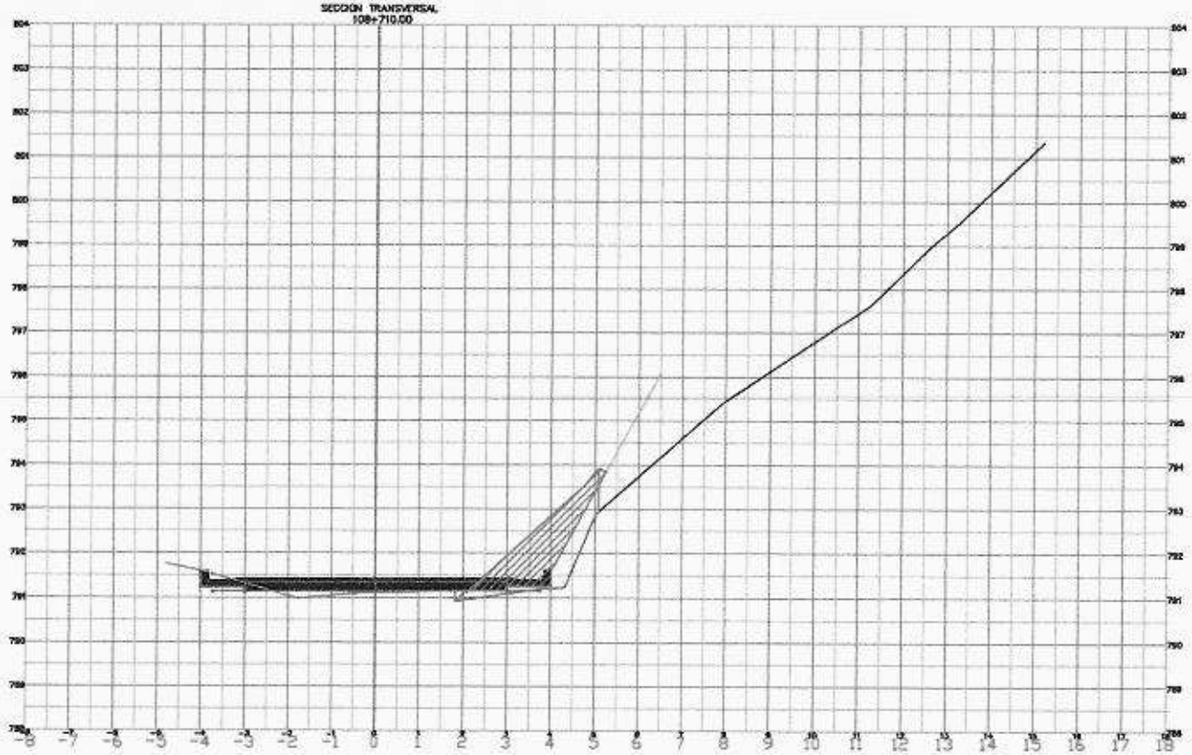

TRANSPORTE DE MATERIALES EXCAVADOS			
Relleno	Área	Volumen	Volumen Acumulado
VOLUMEN PARCIAL	0.00	0.00	0.00

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA		
Número de carriles	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de carriles	=	6.00 m
Bermas internas	=	1.0 m
Pendiente máxima	=	8 %
Bermas laterales	=	1.5


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	LOCALIZACIÓN: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACIÓN AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
								FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+715.00

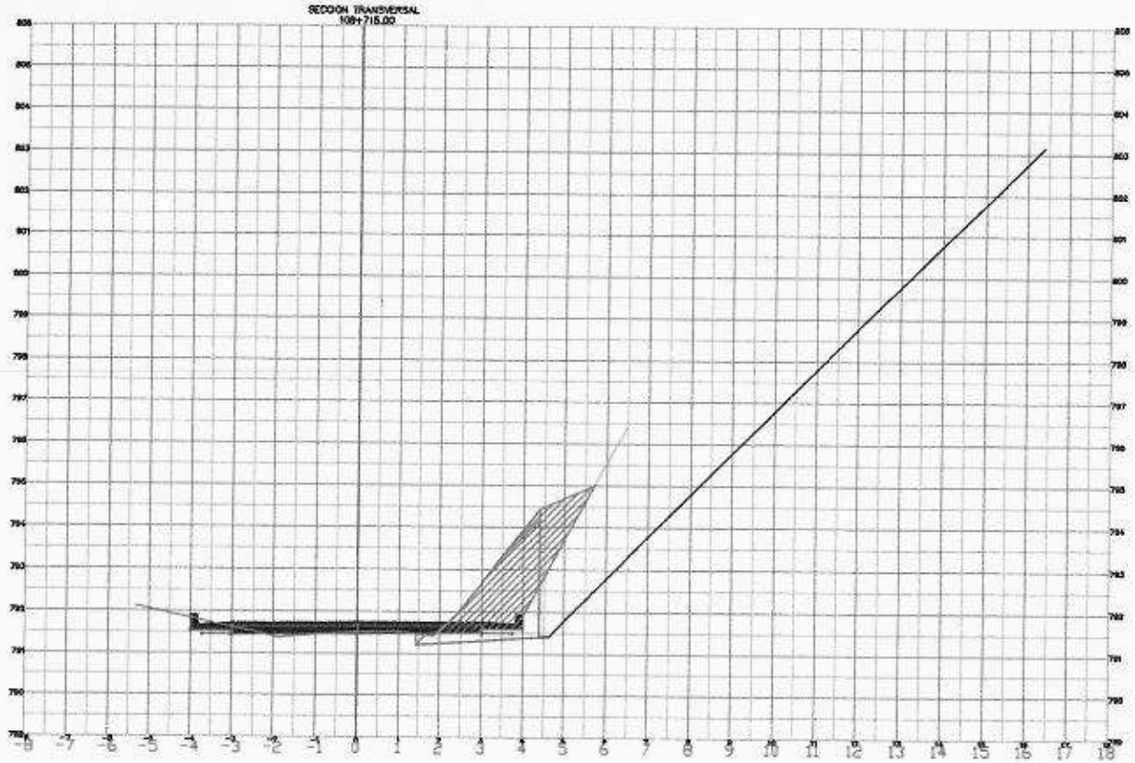

Volumenes en obras principales			
Actividad	Area	Volumen	Volumen Acumulado
Corte Proyectado	4.71	47.09	47.09

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TRAMO DE VIA		
Tipo de calzada	=	2
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Bombeo cuneta	=	2.0 %
Pendiente máxima	=	4.5
Pendiente mínima	=	2.0

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TERRACERIA


CUNETAS

UTILIDAD

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000
REVISO:			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2023
			ARCHIVO:

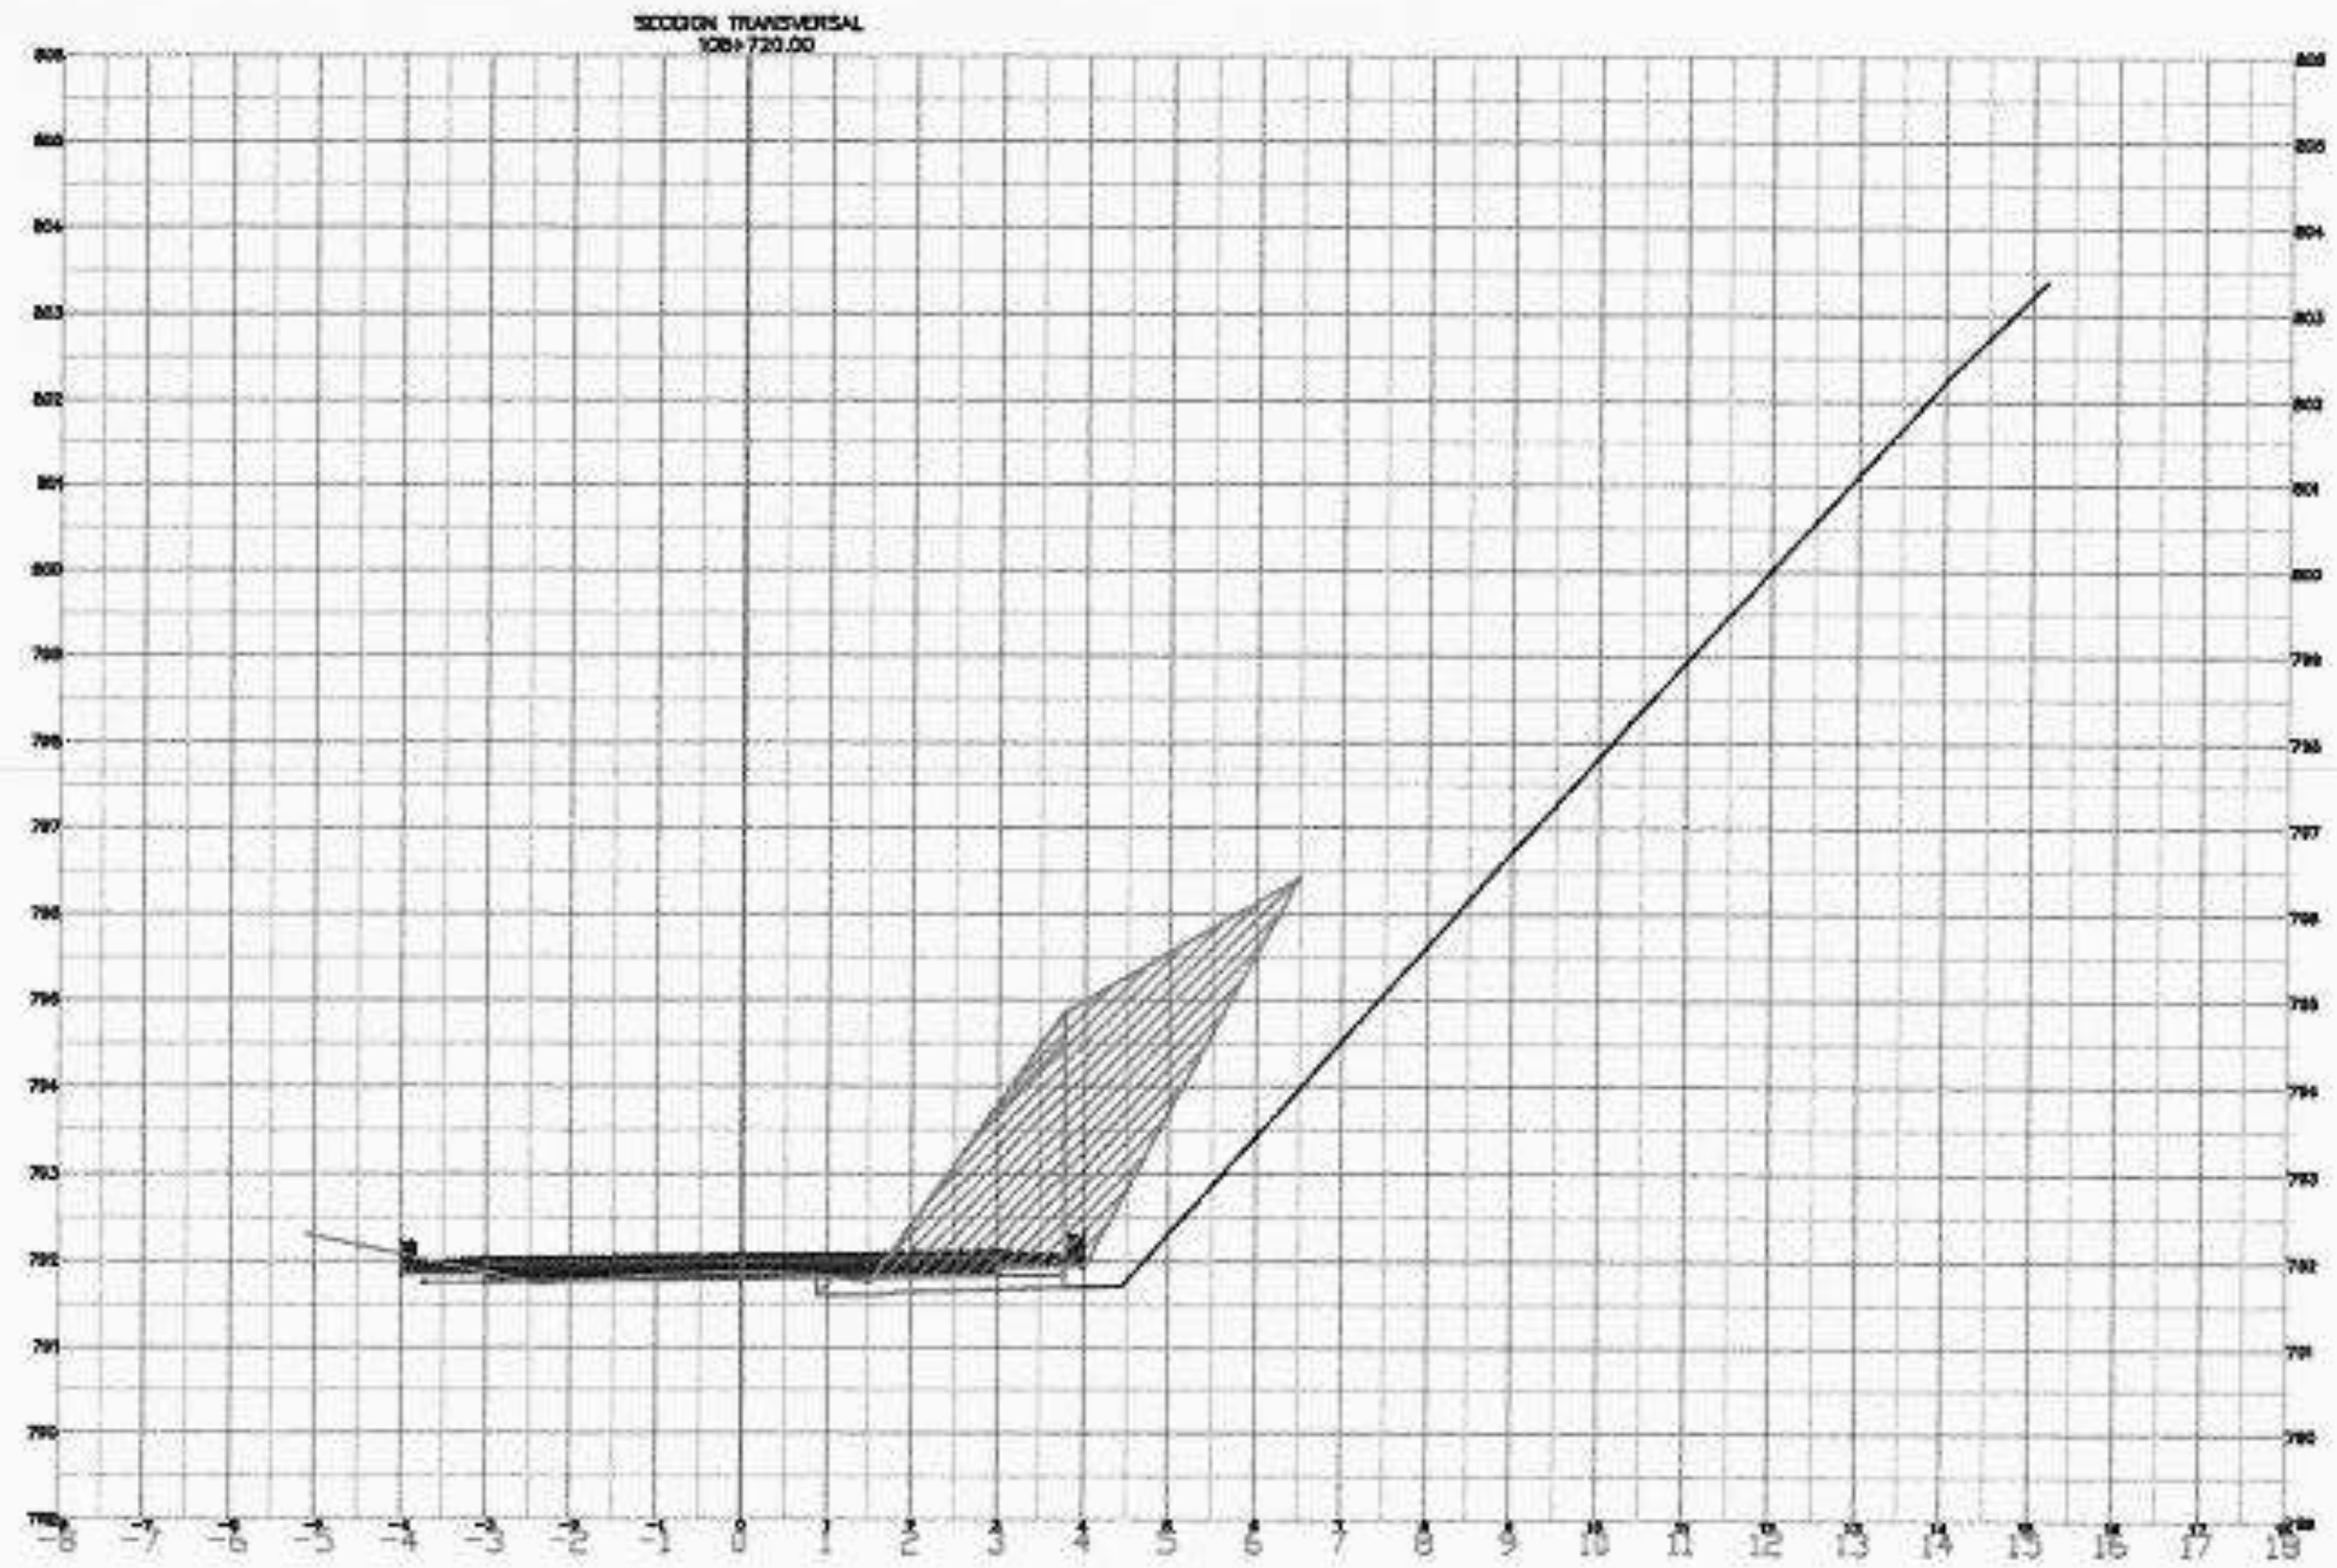

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA: V:100 H:1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025


DIBUJO: A.P.C.

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

CALDAS

SECCION TRANSVERSAL
108+725.00

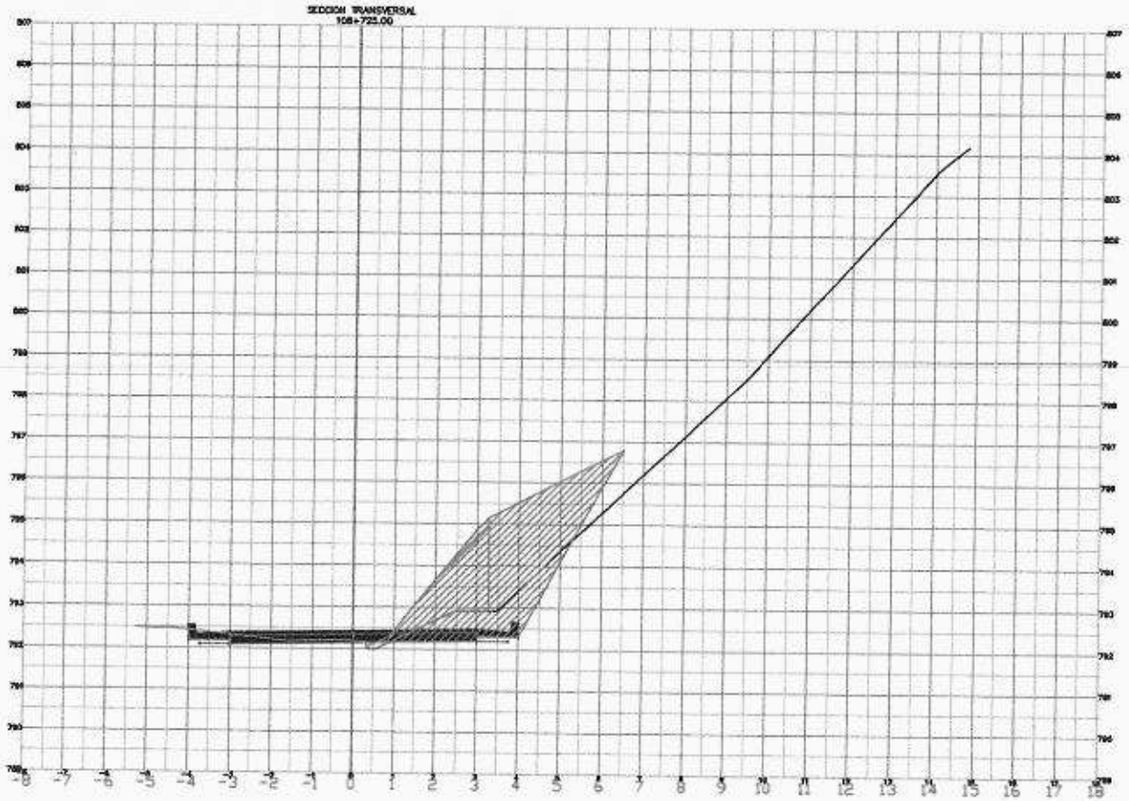

DISEÑO:
A.P.C.
REVISÓ:

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 1:100
H: 1:000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+730.00

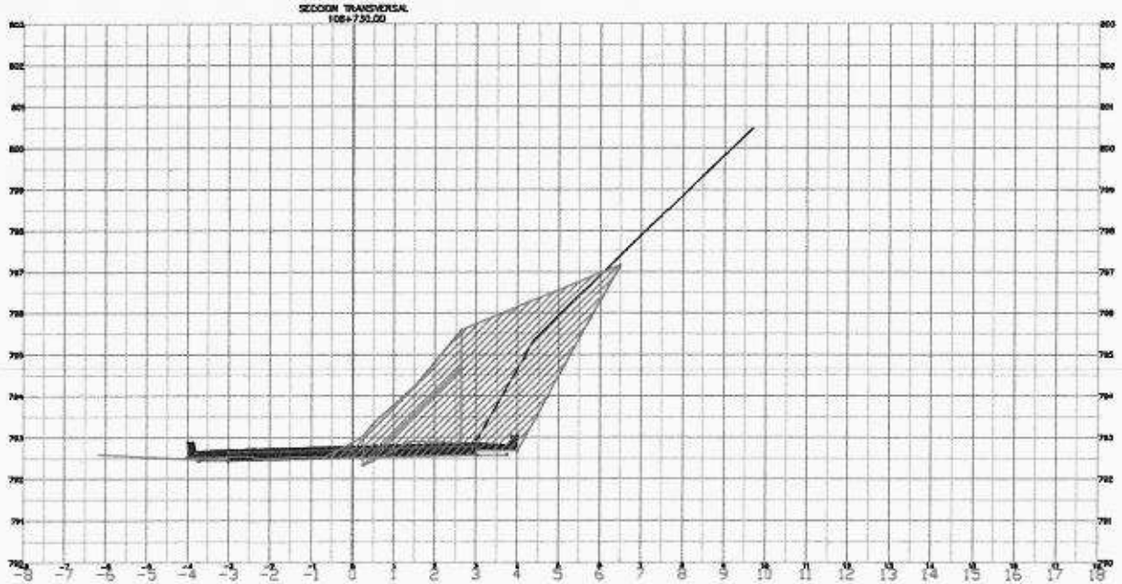

LOCALIZACION

CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

DIBUJO: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+000 – PK120+000


CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+735.00

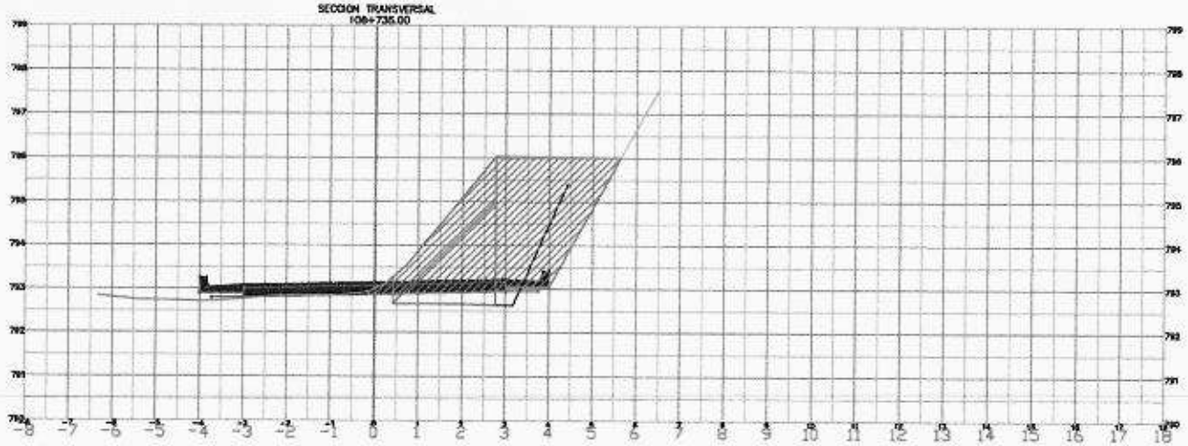

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TRAMO DE VIA

Número de carriles	=	2
Velocidad de diseño	=	80 km/h
Ancho de calzada	=	8,00 m
Bombeo tramos	=	7,0 %
Pendiente máxima	=	6 %
Bombeo normal	=	2,5 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA

GEOTECNIA

PROCESOS LITOLOGICOS

EROSION

LITOLOGIA


Afirmado roca	Arena
Arena limo	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJO: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+740.00

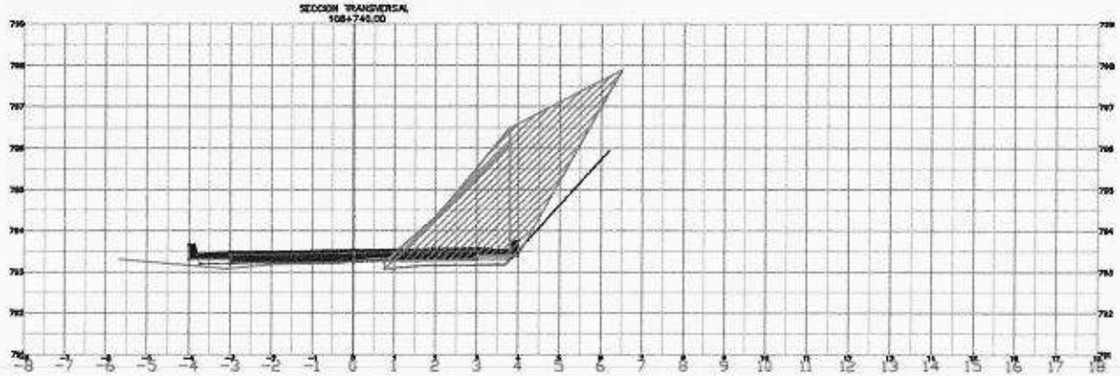

Influencia en abscisa: 108+740.00			
Relleno	Área	Volumen	Volumen Acumulado
Promedio Acumulado	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
1084+745.00

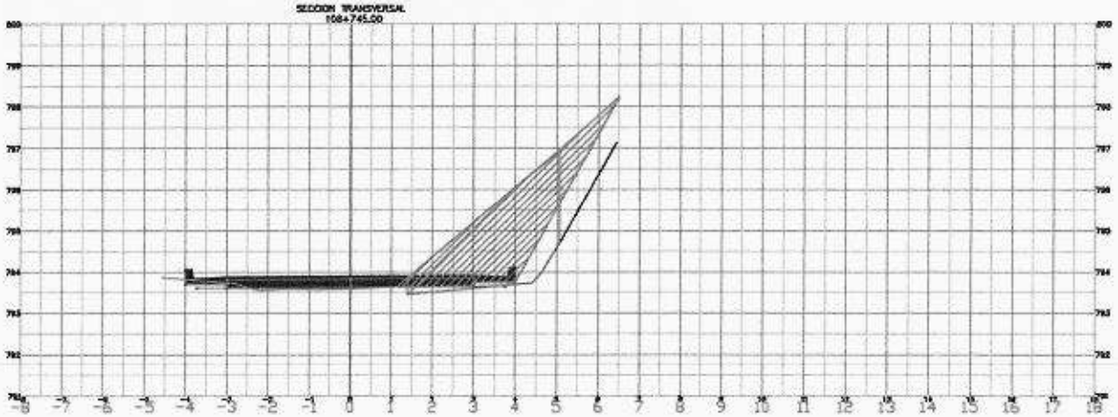

LOCALIZACION

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJÓ: A.P.C.

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+000 – PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4


ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+750.00

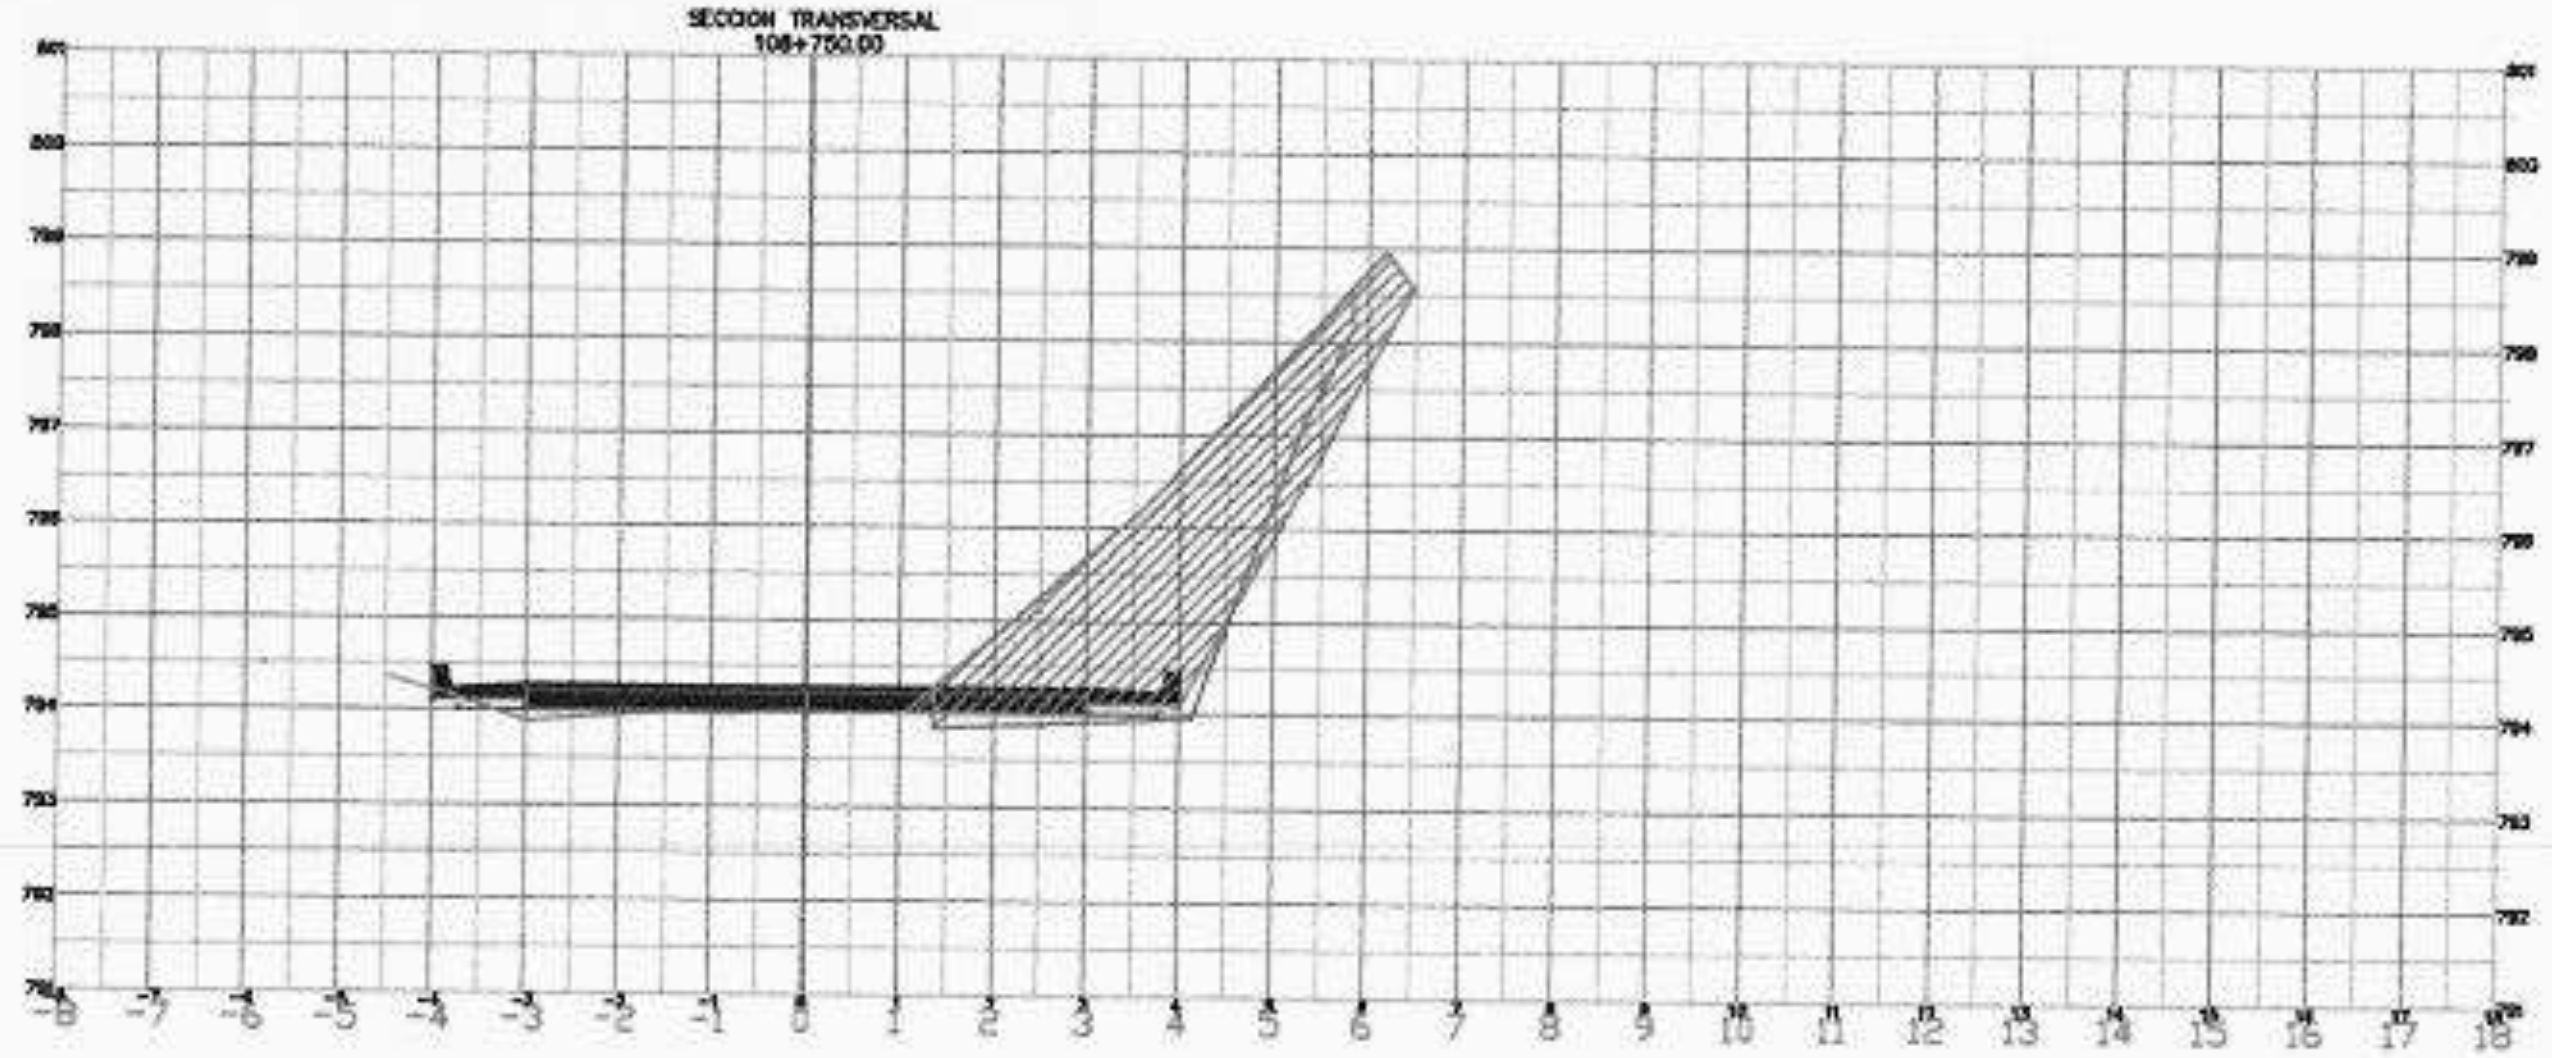

[illegible]			
[illegible]	Area	Volumen	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LOCALIZACION

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJO: A.P.C.

REVISÓ:

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 — PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4


ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+755.00

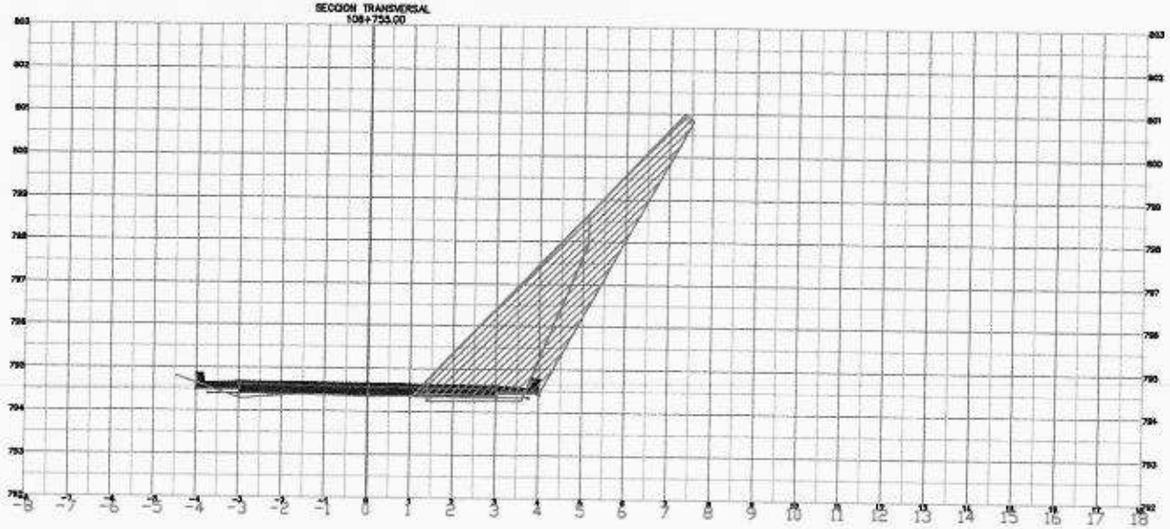

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

Numero de calzadas	=	2
Velocidad de diseño	=	70 km/h
Ancho de calzada	=	3.65 m
Berma lateral	=	1.50 m
Pendiente máxima	=	4 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOTECNIA

Arenisca roca	Arena
Arena Fina	Arena arcillosa
Suelo + roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Grafia arenosa	Suelo arenoso

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJO: A.P.C. REVISO:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025	

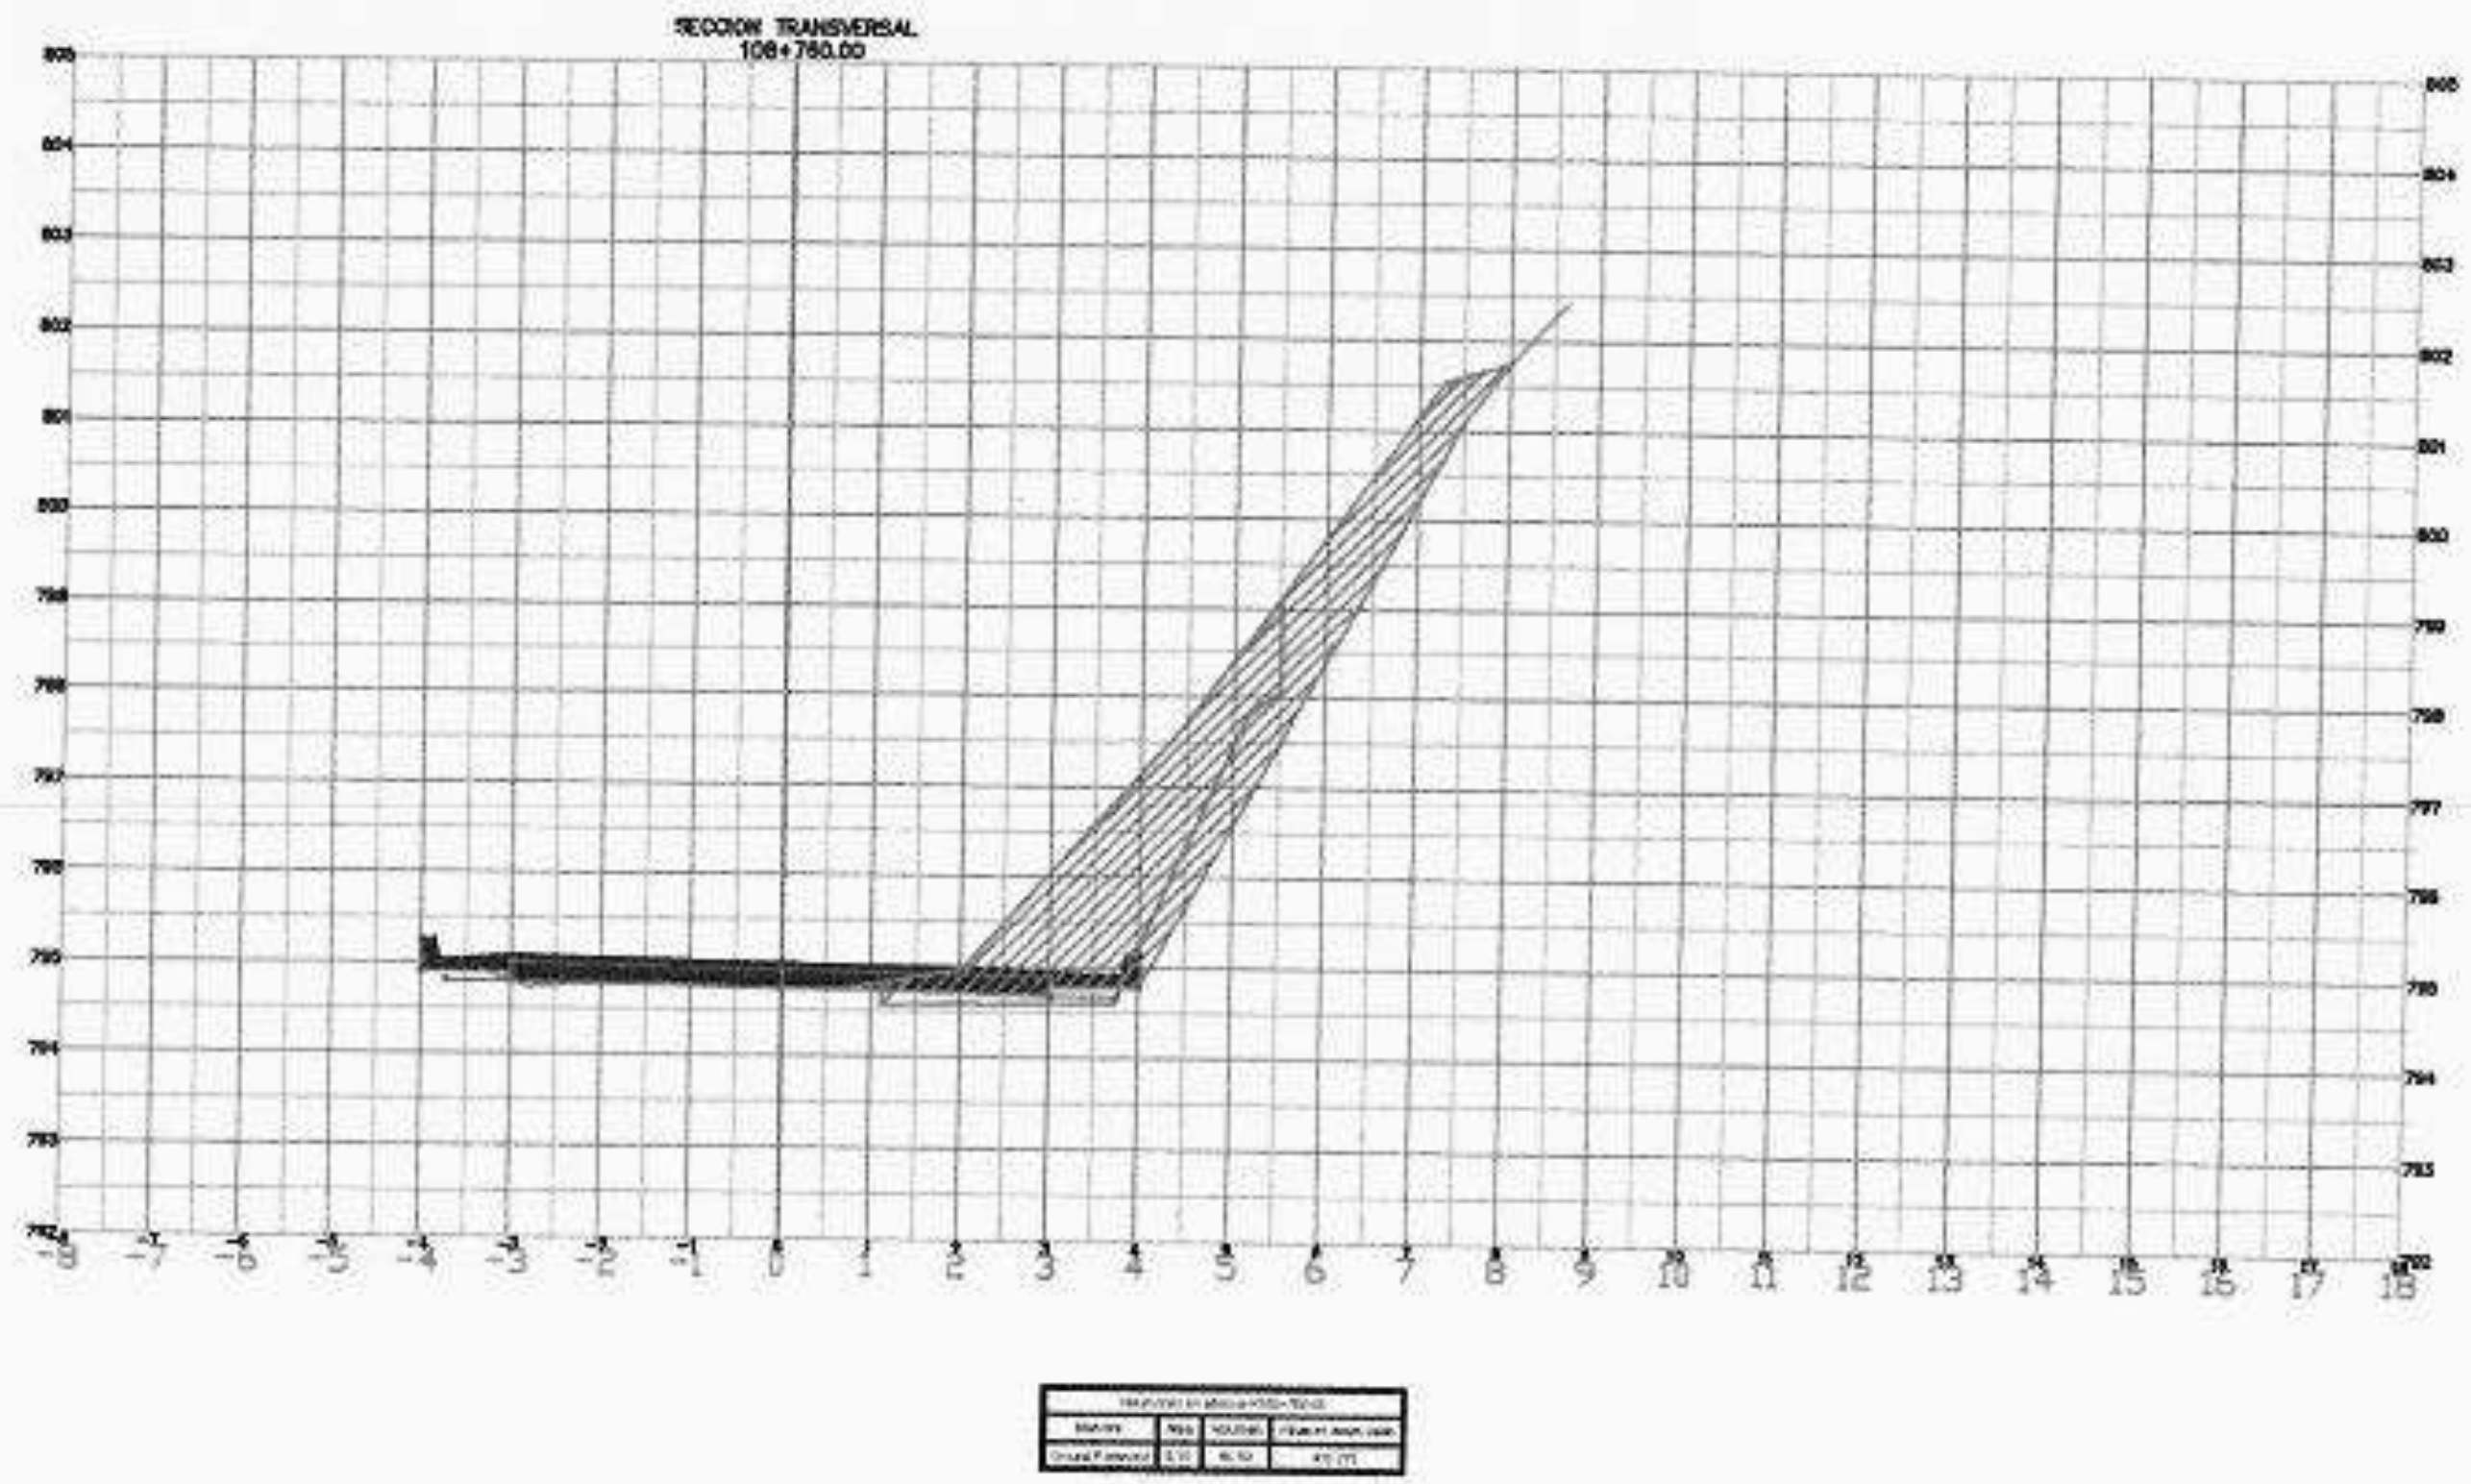


PROYECTO:	CONTIENE:	ESCALA:	
RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK108+000 – PK120+000	SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
		FECHA: Octubre 2025	

DIBUJÓ: A.P.C.

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

SECCION TRANSVERSAL
108+765.00

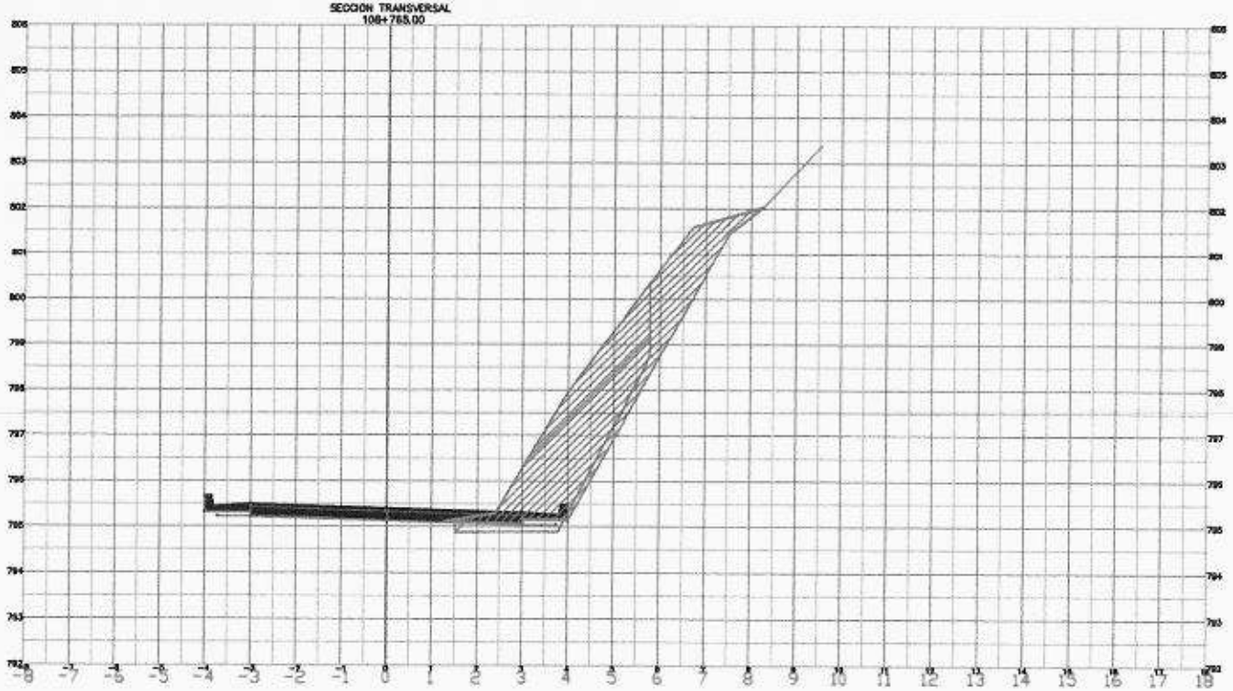


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

INTERVENTORIA: MAB INGENIERIA DE VALOR	CONSTRUCCION: SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C.	REVISO:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
1061+770.00

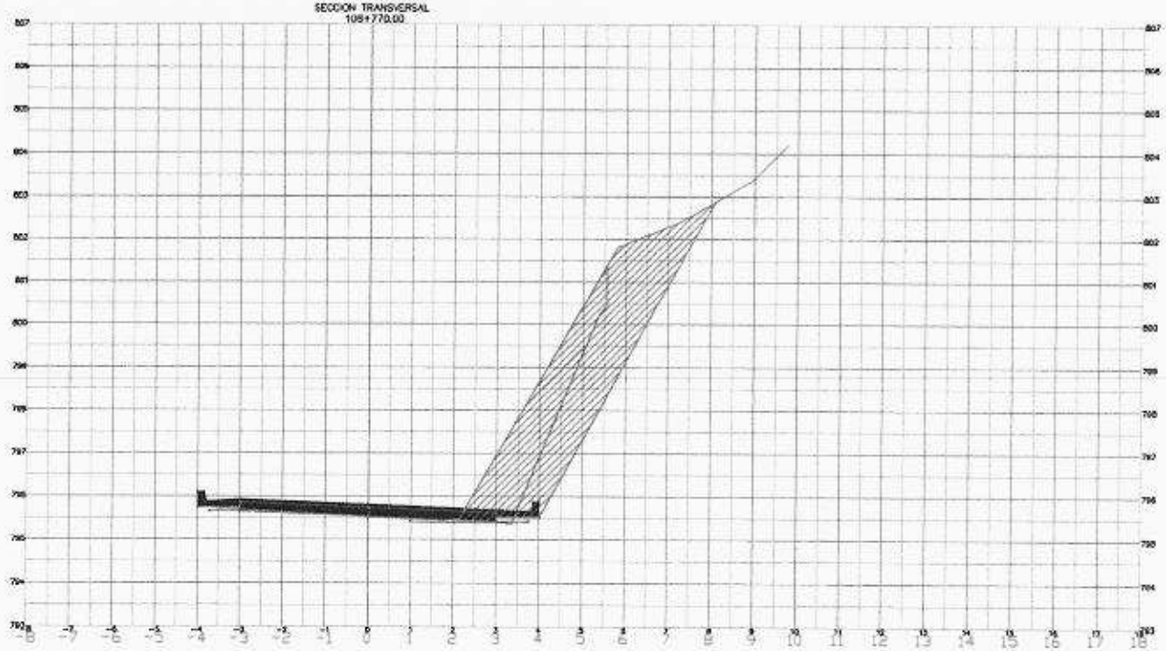

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA		
Numero de calzadas	=	01
Velocidad de diseño	=	70 km/h
Ancho de calzada	=	6.30 m
Bombeo normal	=	2.5 %
Pendiente máxima	=	6 %
Bombeo normal	=	2.5 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA

SECCION

PROYECTO VIAL

PROYECTO DE EXCAVACION EN TALUD

GEOLOGIA


Afloramiento roca	Arena
Arena fina	Arena arcillosa
Suelo y roca	Arena arcillosa
Arena y roca	Suelo + roca
Arcilla arenosa	Suelo arenoso

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANO 1 DE X	
		REVISO:					FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+775.00

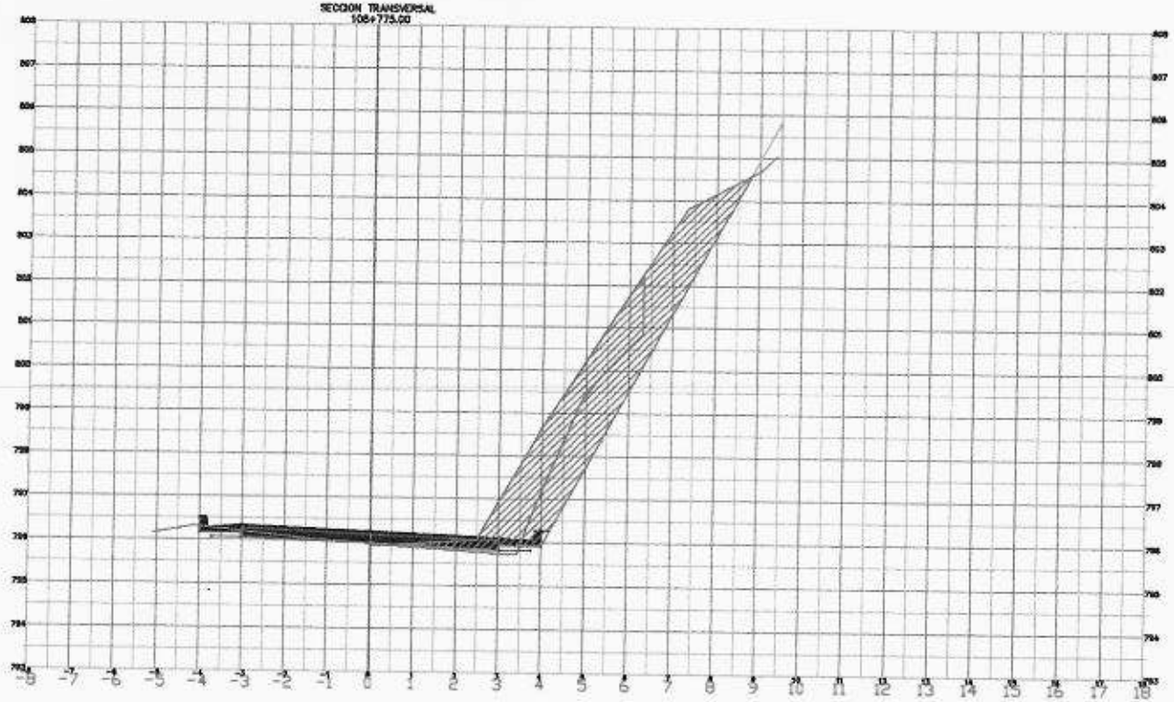

CONVENCIONES


NOTAS

REFERENCIAS

CALDAS	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA:	V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
FECHA:	Octubre 2020	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
TOBY 750.00

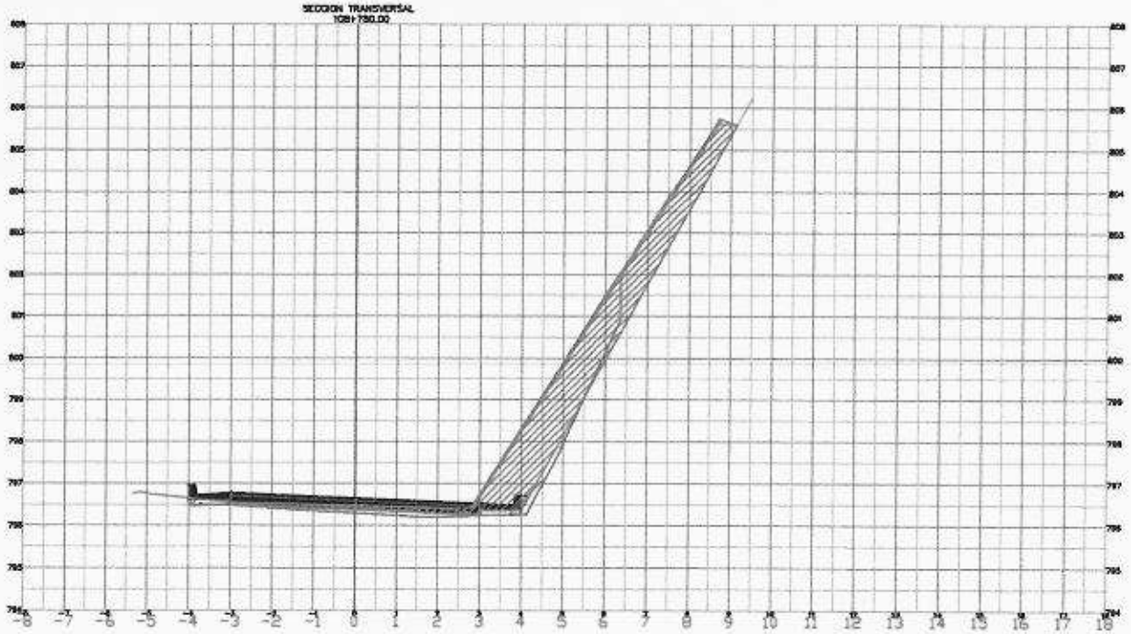

LOCALIZACION


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJO: A.F.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
				FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+785.00

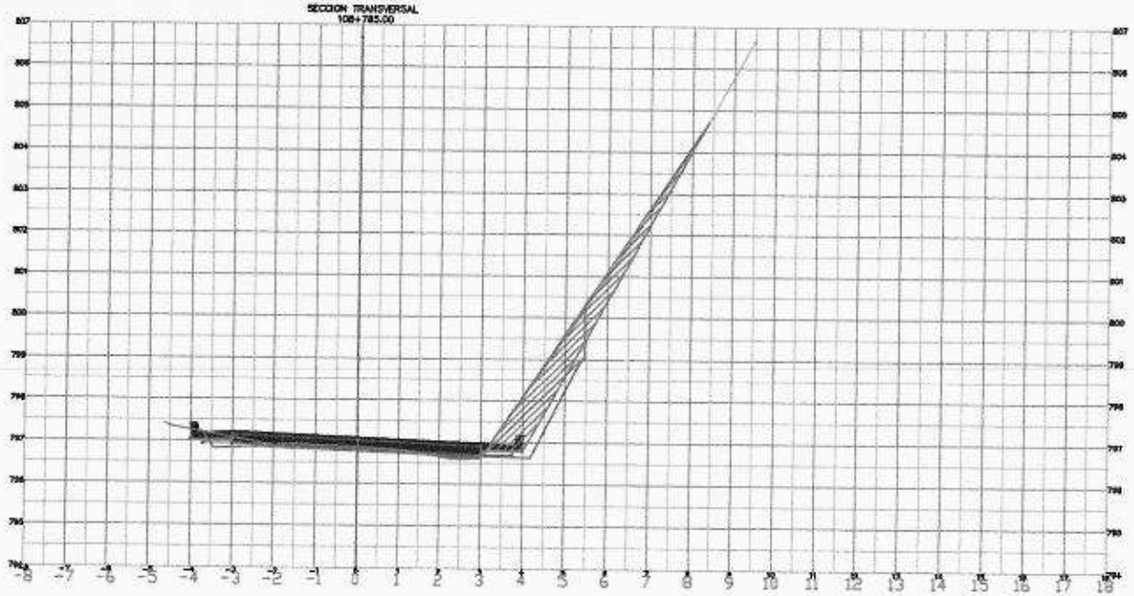


CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

	INGENIERIA DE VALOR		DIBUJO: A.P.C. Revisó:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
FECHA: Octubre 2023	ARCHIVO:

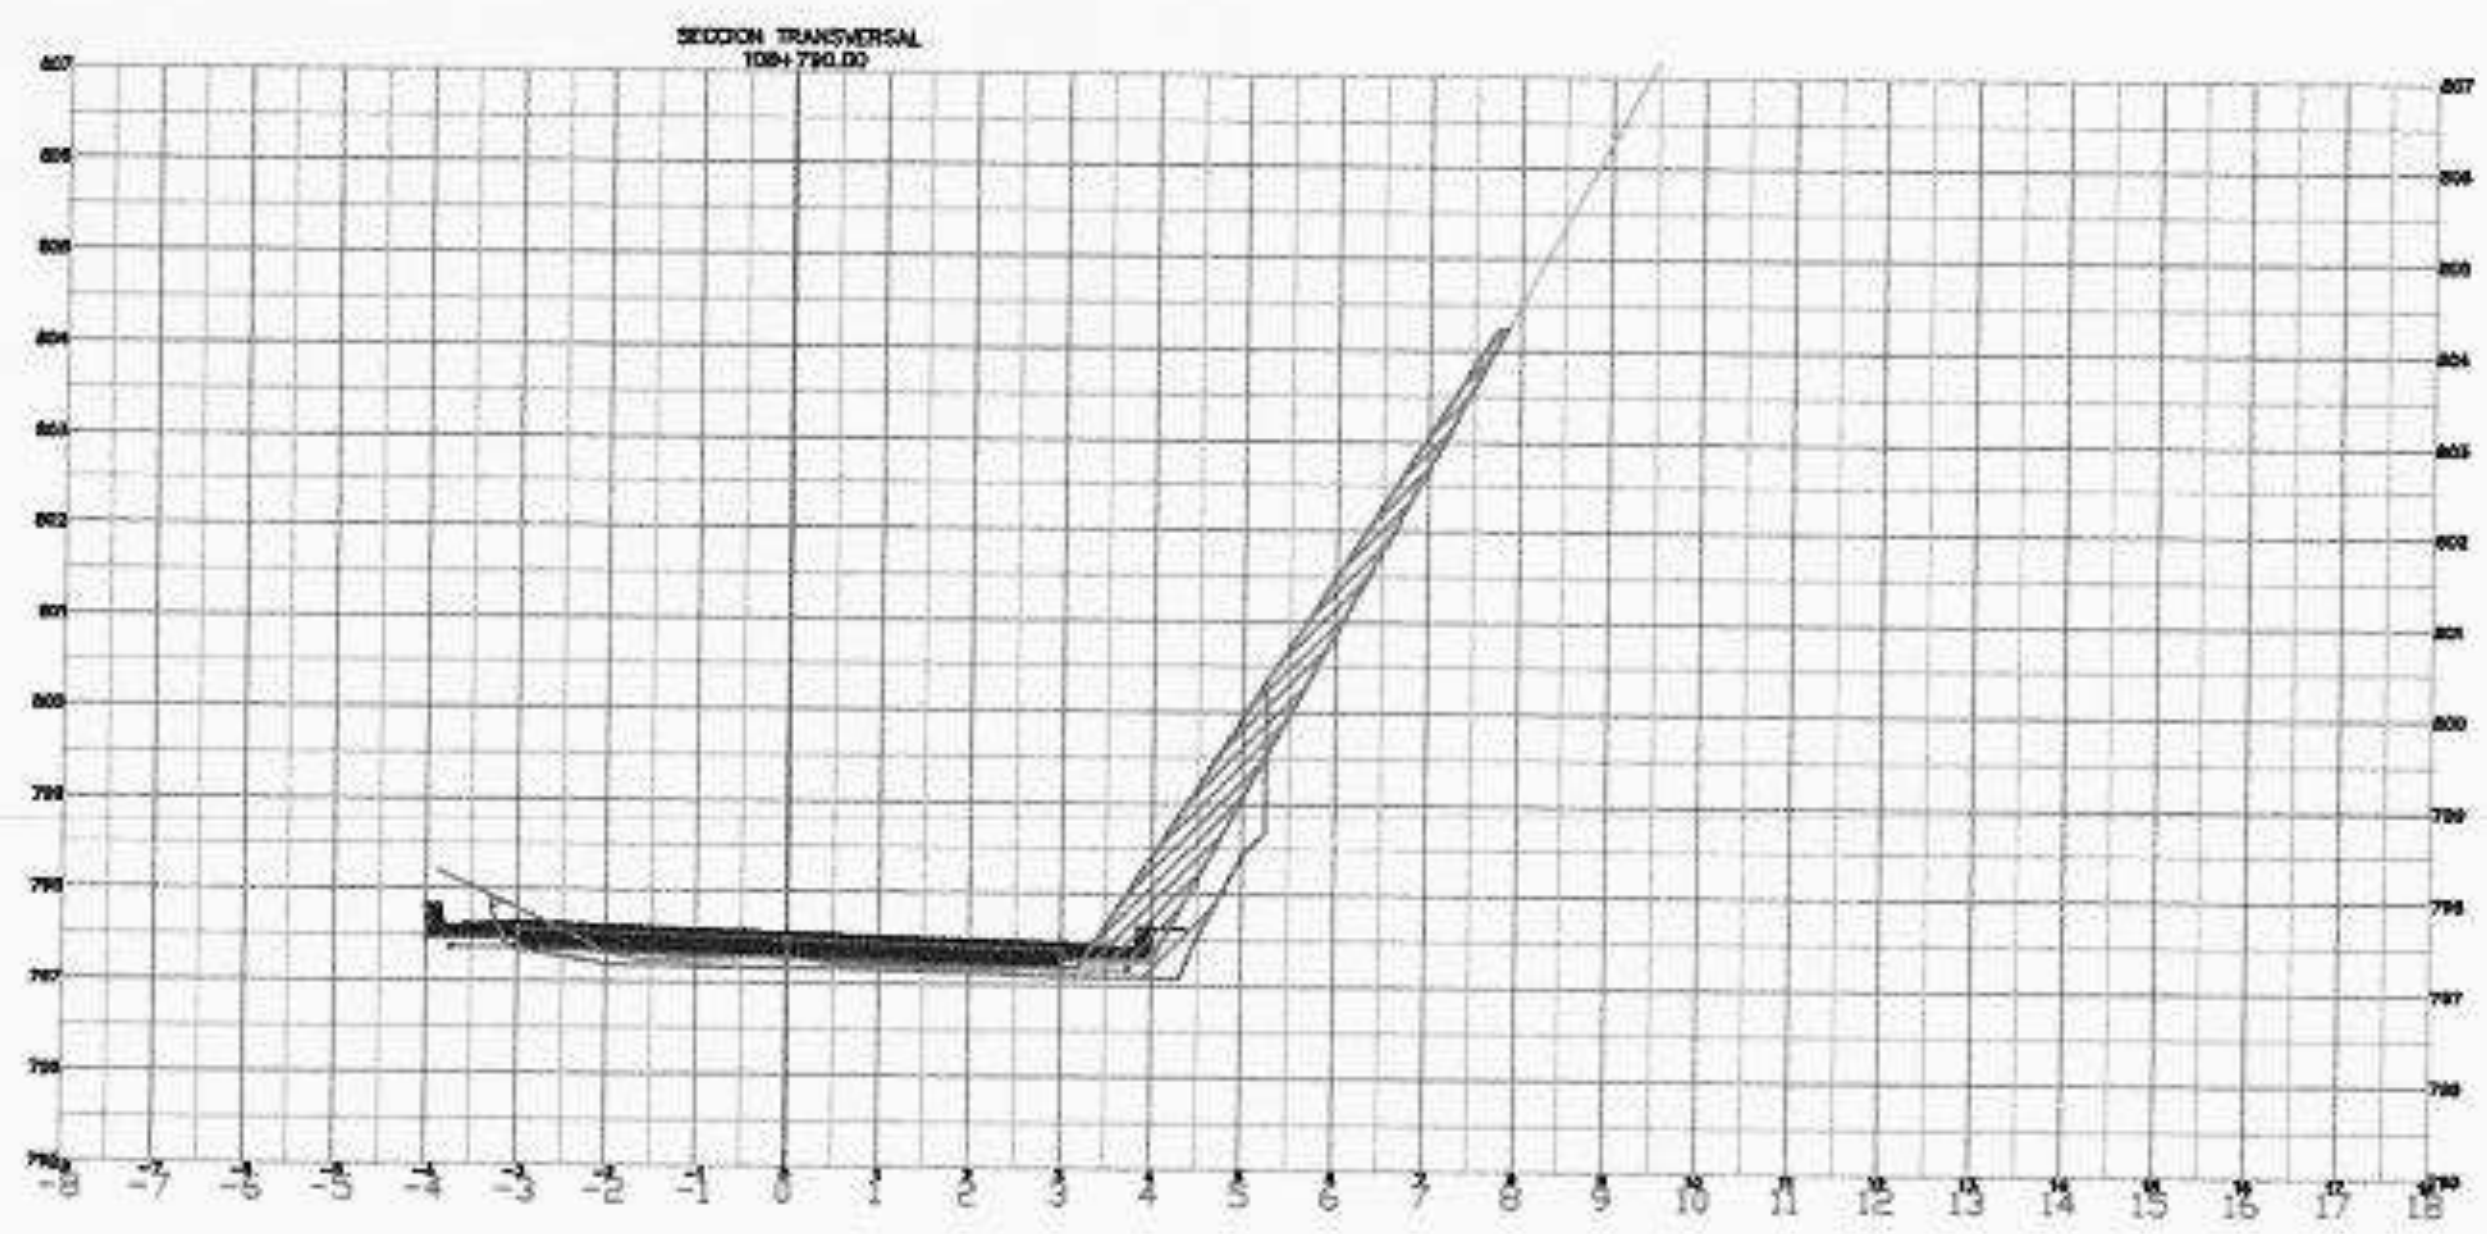

DIBUJO: A.P.C.

MAB INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
109+795.00

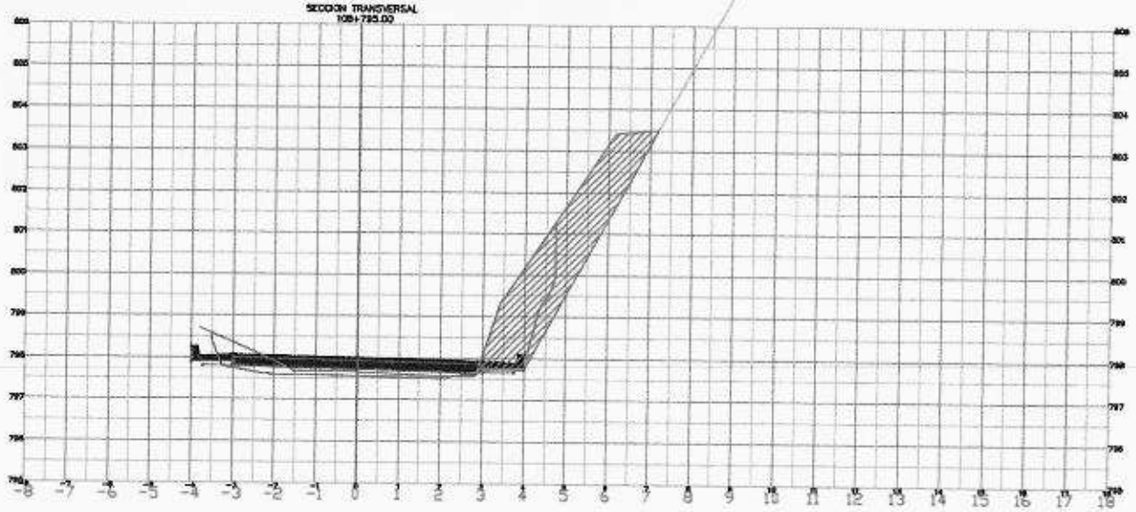

LOCALIZACION

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOLOGIA

NOTAS

REFERENCIAS

DISEÑO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALAS: H: 1:100 V: 1:1000
			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+800.00

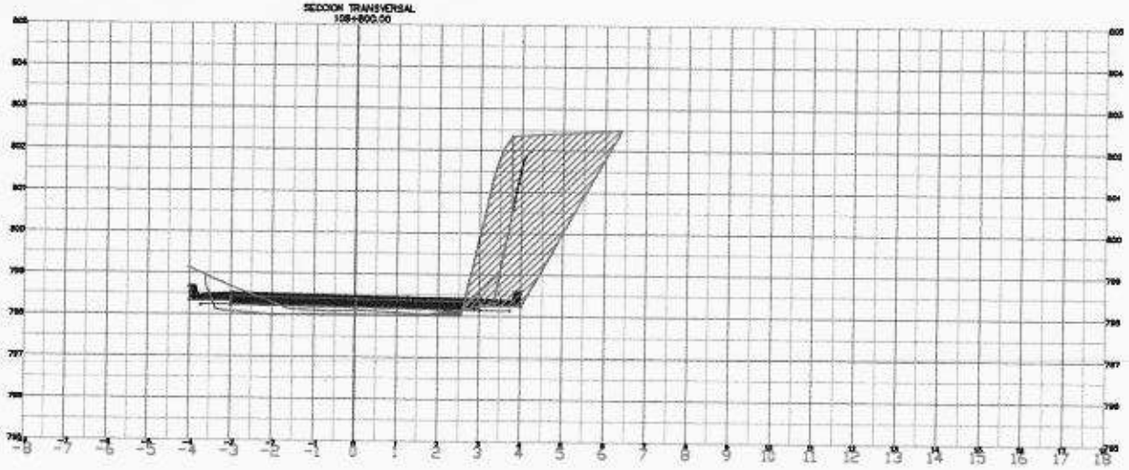


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000
CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	
	FECHA: Octubre 2025		

SECCION TRANSVERSAL
100+805.09

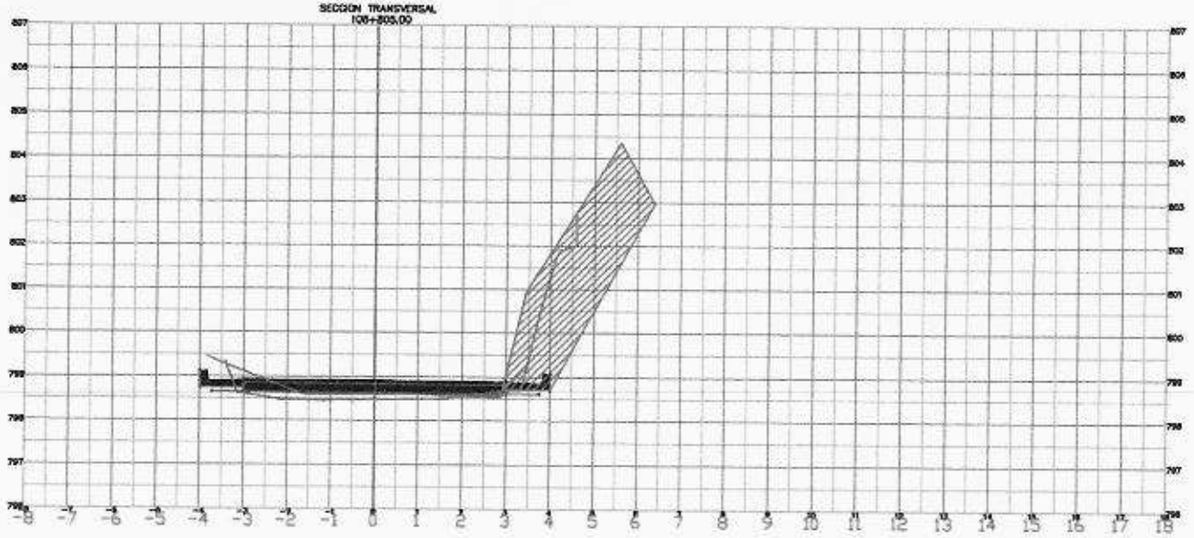


LOCALIZACION

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJO: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

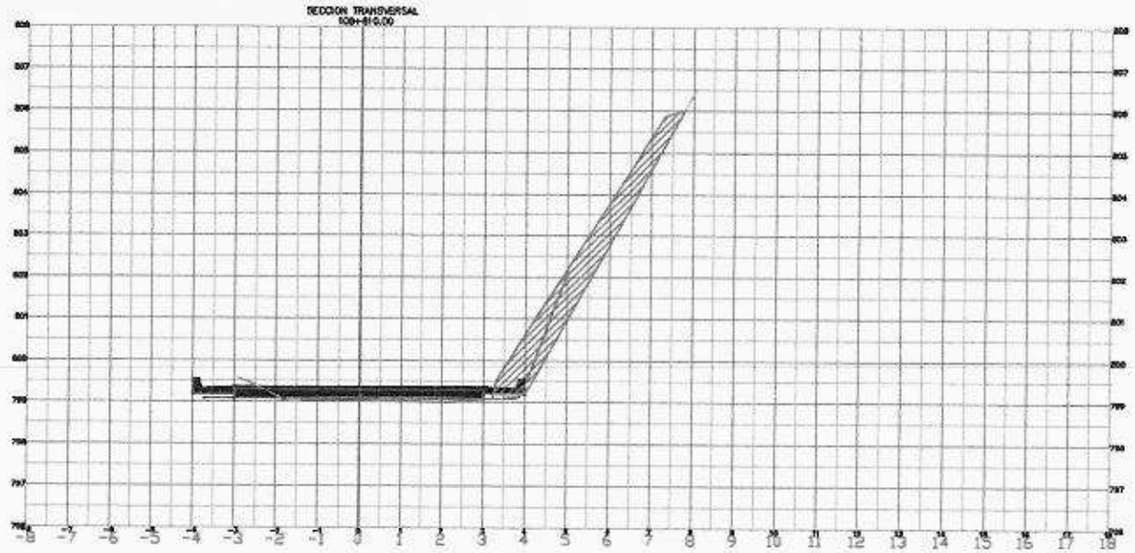

Número de carriles	=	2(4)	
Velocidad de diseño	=	30	km/h
Ancho de carriles	=	6.00	m
Bombeo cuneta	=	12	%
Pendiente máxima	=	4	%
Pendiente mínima	=	2	%

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOTECNIA

NOTAS

REFERENCIAS

	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 1:00 H: 1:000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+813.00

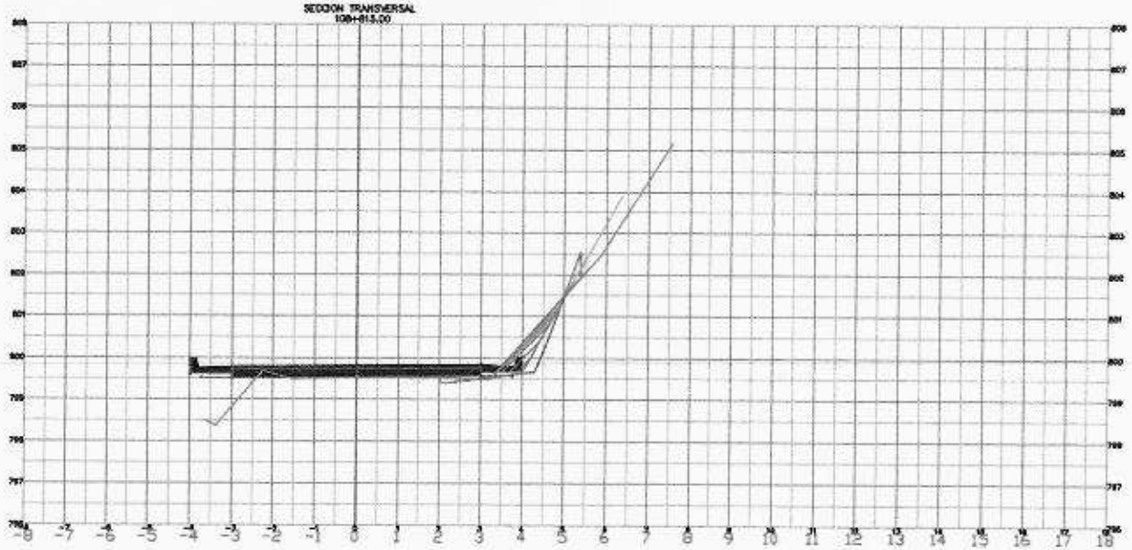

CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

DIBUJO: A.P.C.


PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK105+000 – PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1:000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

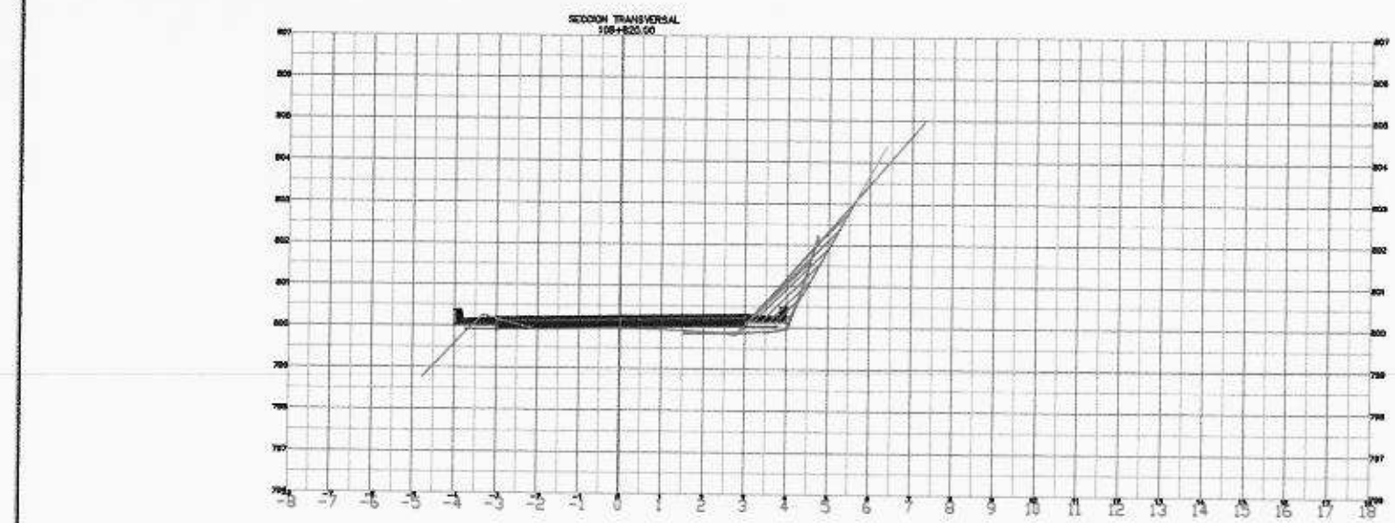

DIBUJÓ:	A.P.C.
REVISÓ:	

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK108+000 – PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4


ESCALA:
V: 1:100
H: 1:100

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
10B+825.00

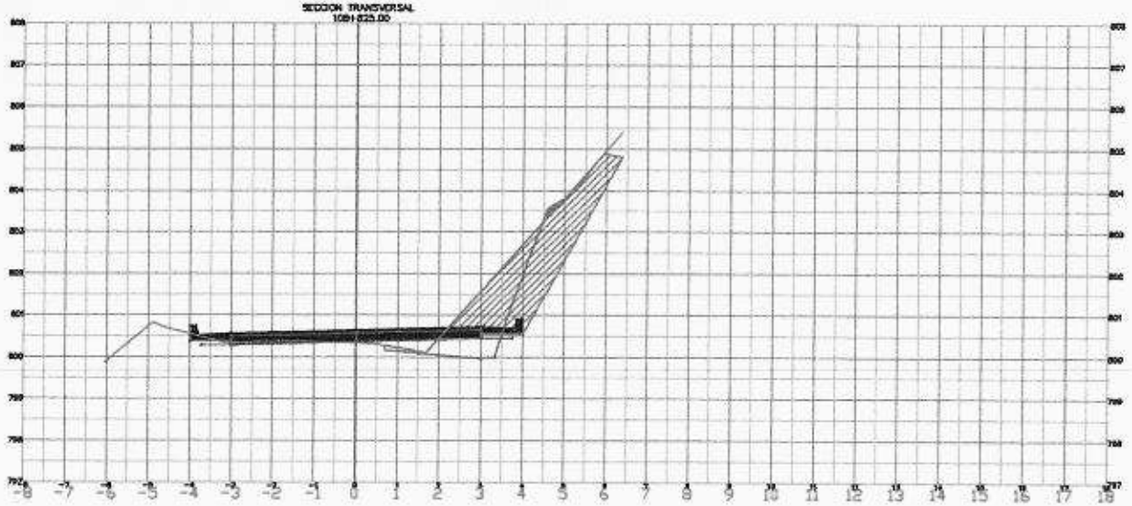

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

Numero de carriles	=	2
Ancho de carril	=	3.65 m
Ancho de calzada	=	8.00 m
Radio curva	=	1.5 m
Pendiente máxima	=	6 %
Berma normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOTECNIA

NOTAS

PREVENCIONES

		DIBUJO: A.P.C.			PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
								FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+830.00

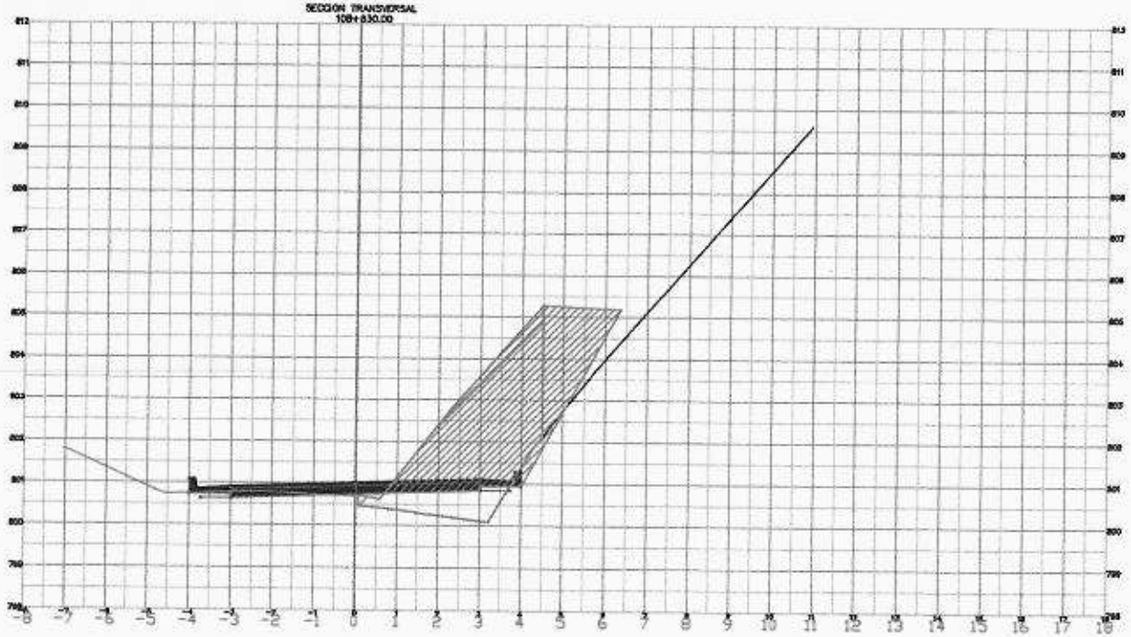


DIMENSIONES

NOTAS

REFERENCIAS

	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
							FECHA: Octubre 2023	

SECCION TRANSVERSAL
108+830.00

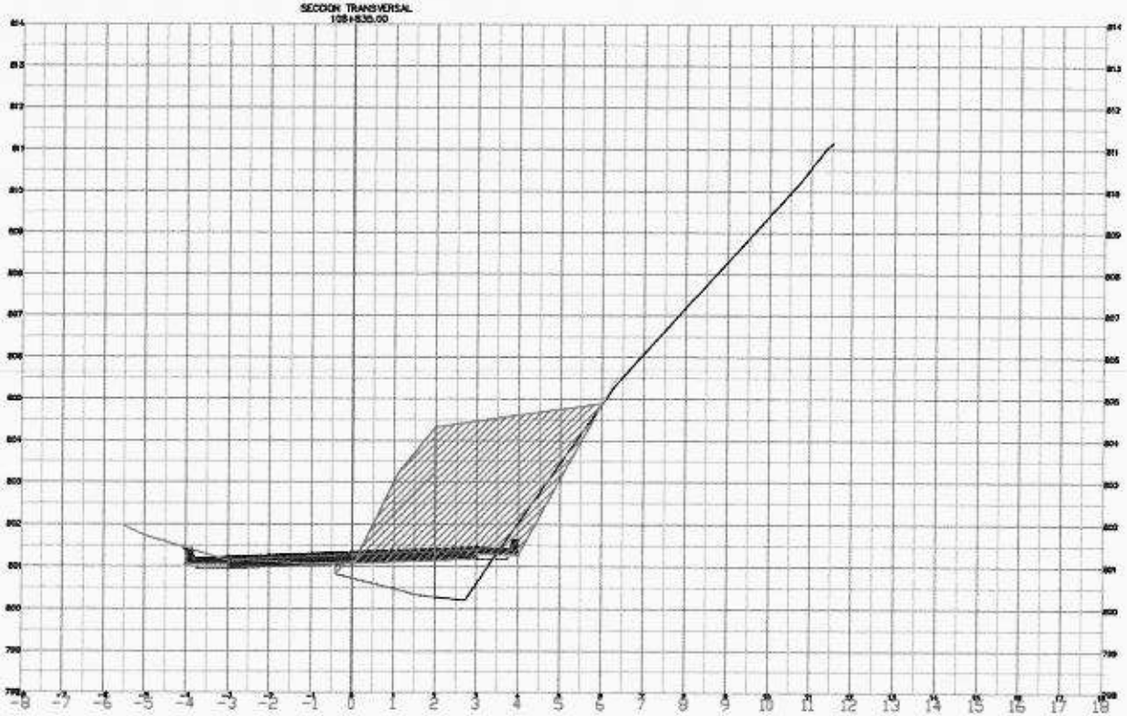

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA		
Numero de calzadas	=	2
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Berma cuneta	=	1.6 m
Pendiente máxima	=	4 %
Bombeo típico	=	2 %


CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	FICHA: V: 1:00 H: 1:000	PLANOS 1 DE X	
				FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+840.00

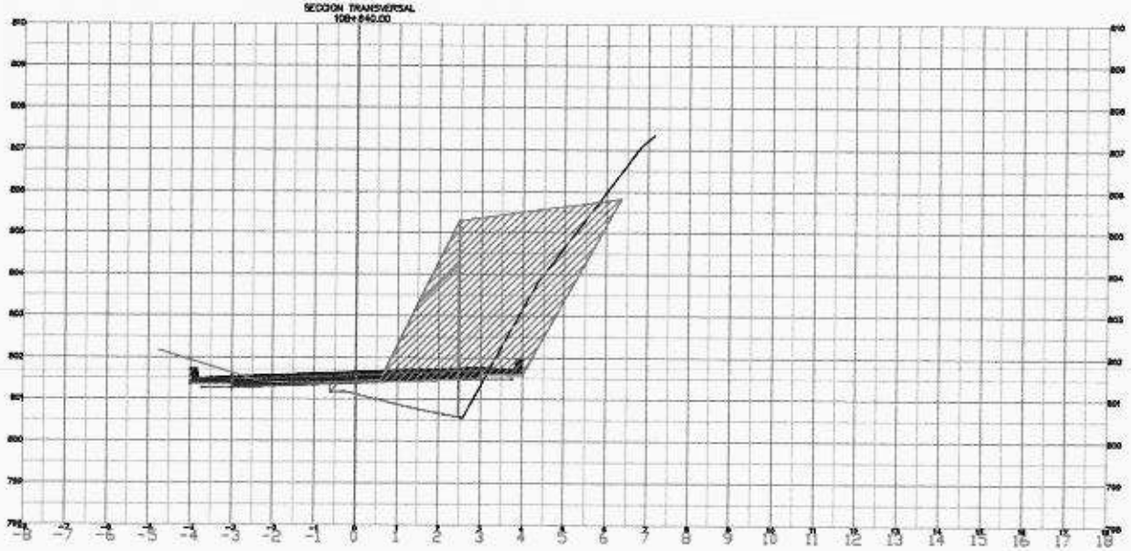

CONSTRUCCION

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOTECNIA

NOTAS

REFERENCIAS

	DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4
			ESCALA: V: 1:00 H: 1:000
			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2023

SECCION TRANSVERSAL
108+845.00

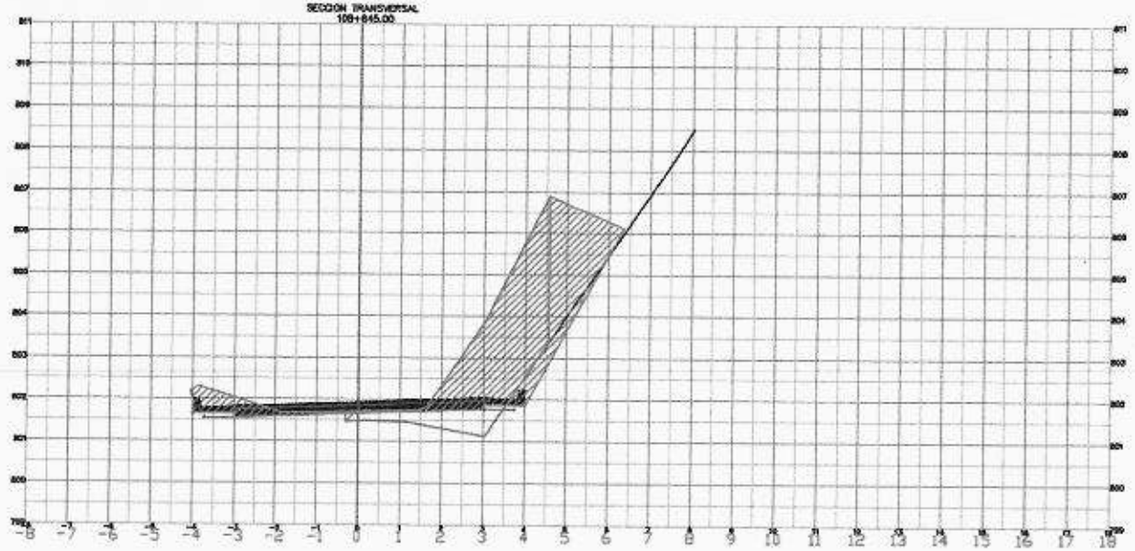

DISEÑÓ
A.P.C.
Revisó

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK105+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+850.00

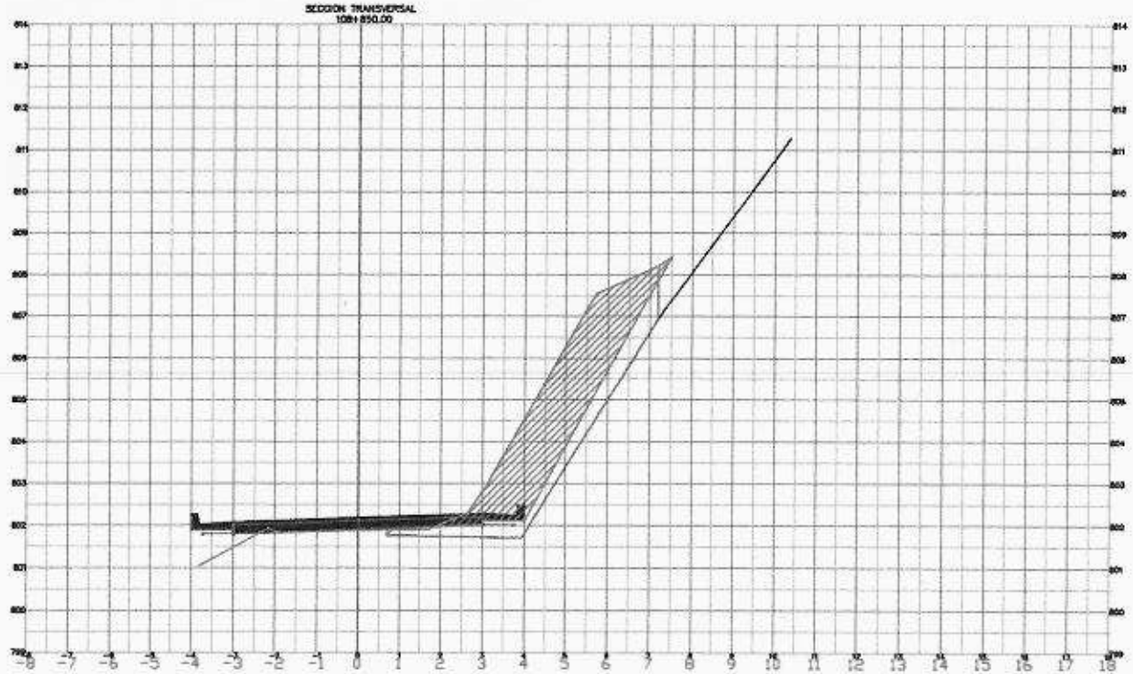

LOCALIZACION

Numero de calzadas	=	01
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Ancho de calzada	=	6.00 m
Bombeo (calzada)	=	3.0 %
Pendiente máxima	=	4 %
Bermas laterales	=	2 @

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL


TOPOGRAFIA

GEOTECNIA

NOTAS

REFERENCIAS

	DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4
			ESCALA: V: 100 H:1000
			PLANOS 1 DE X
			FECHA: Octubre 2025

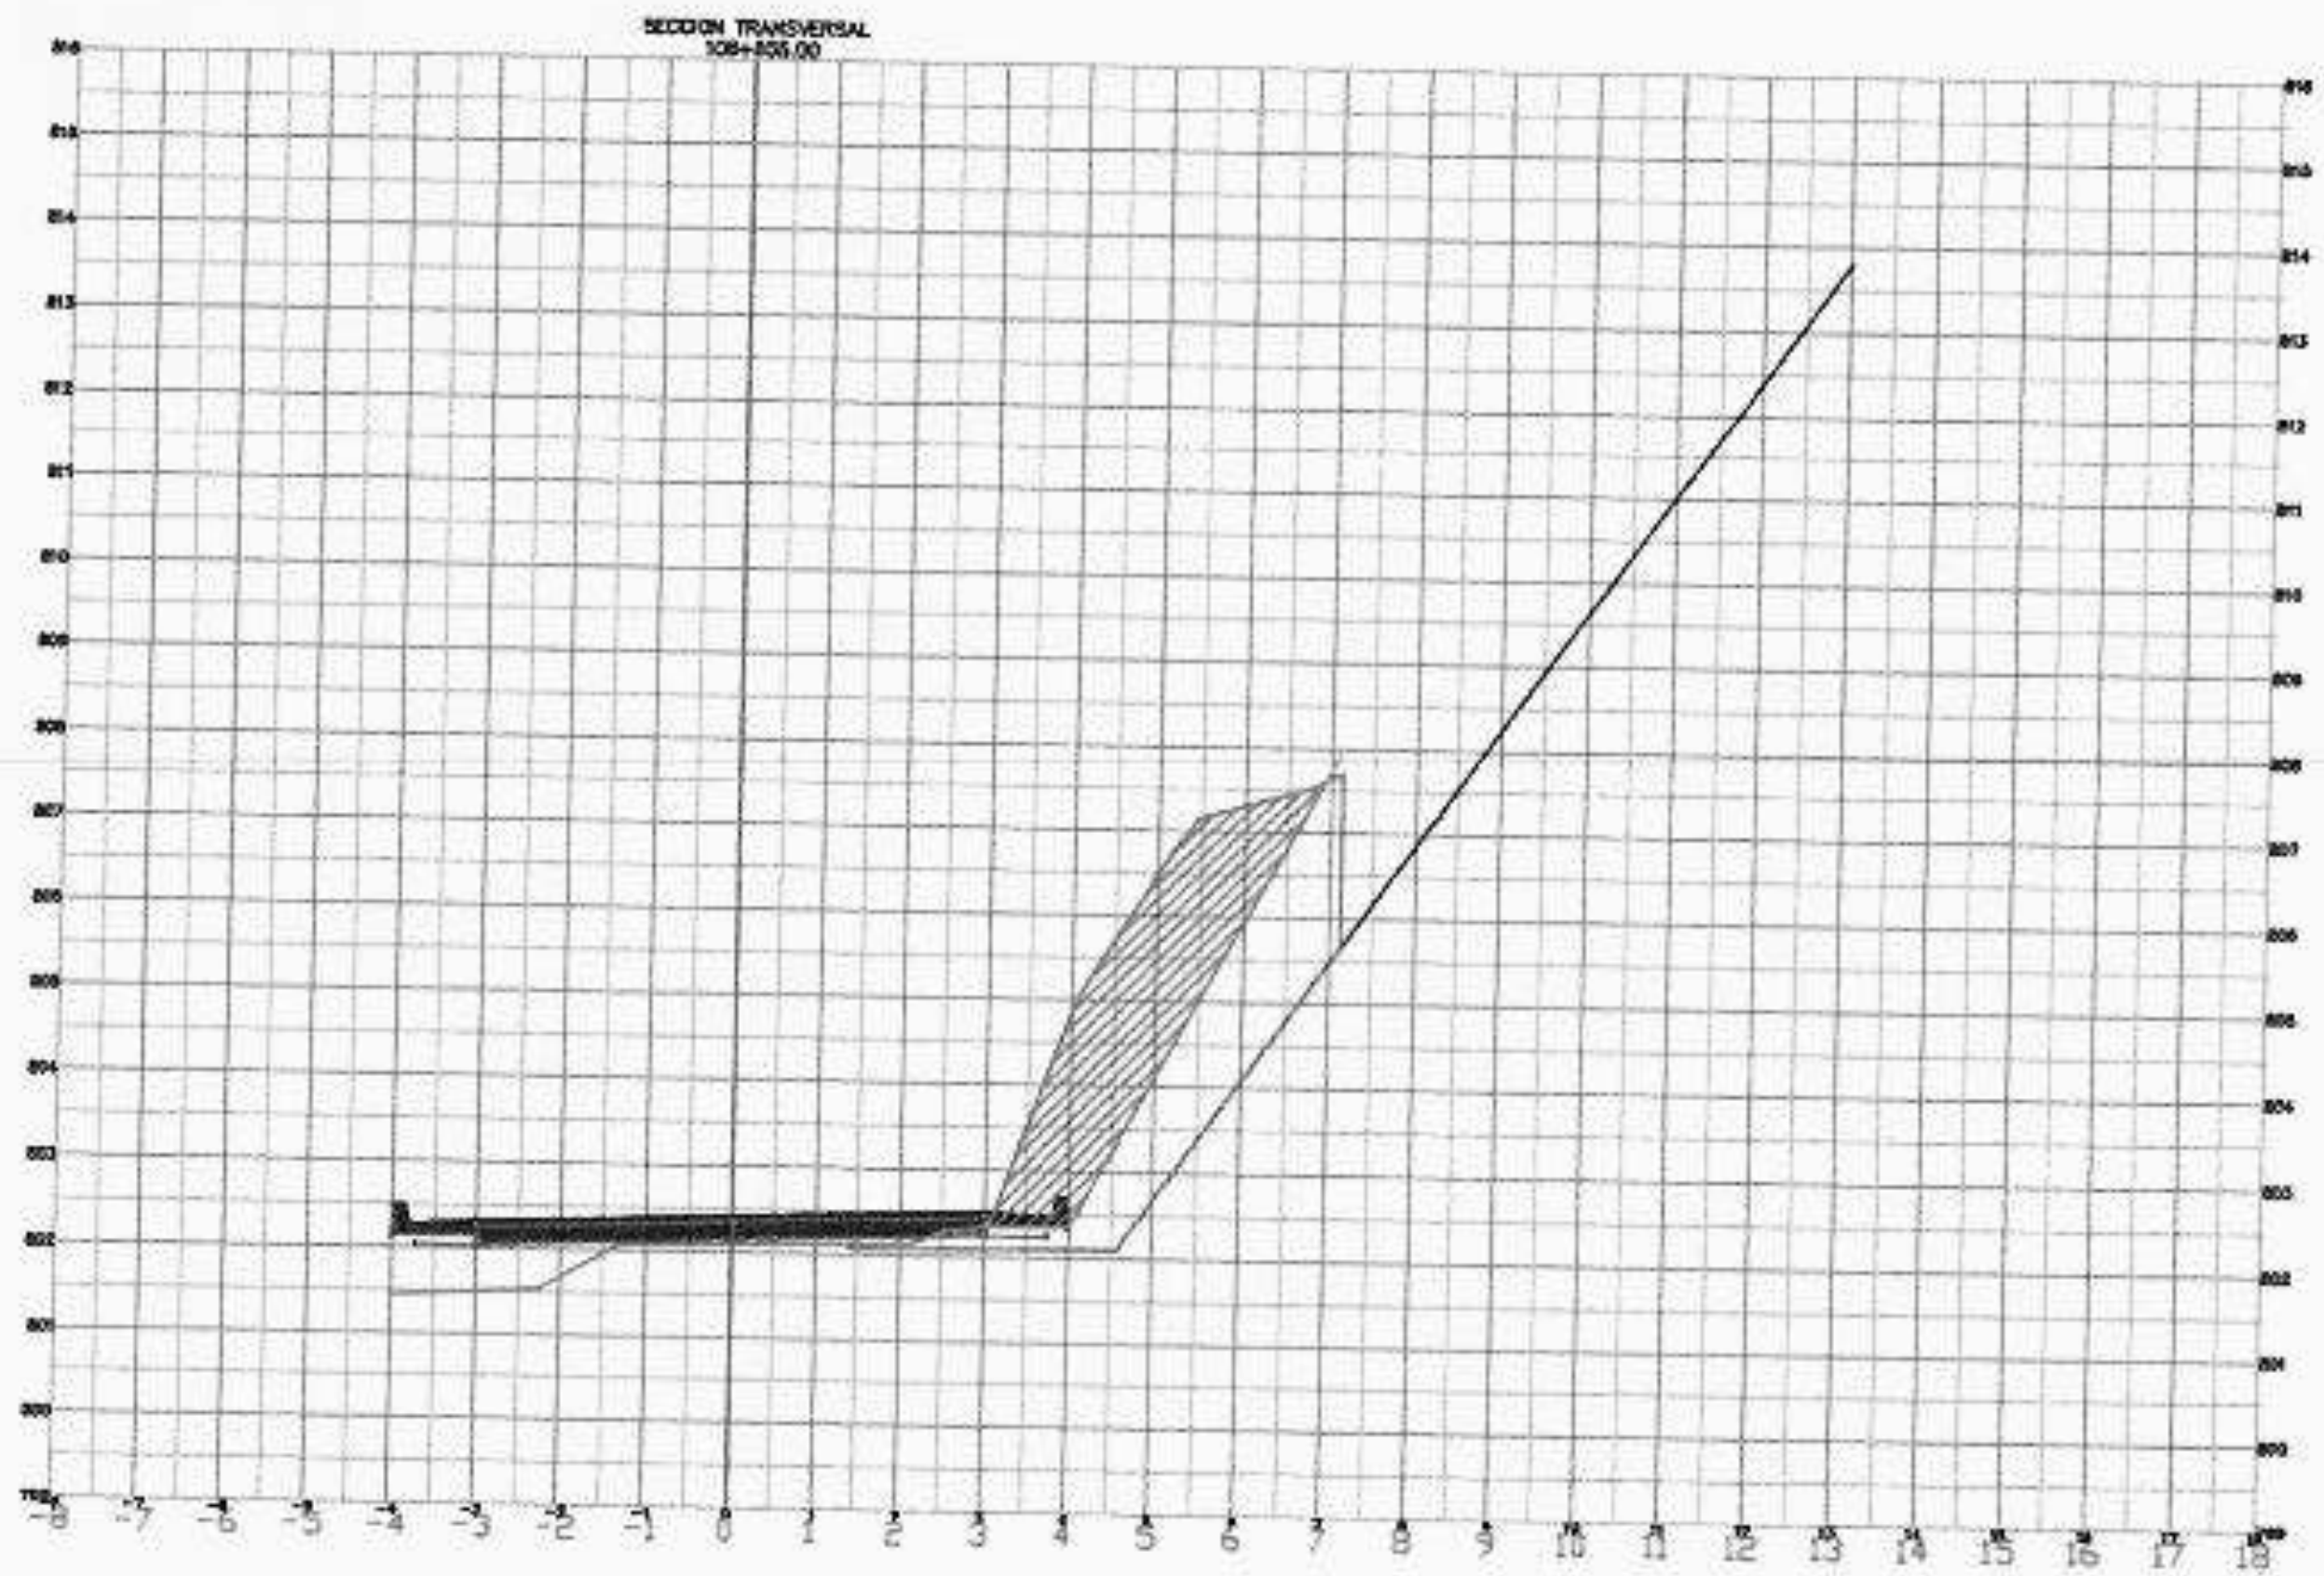

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DIBUJÓ: A.P.C.

INGENIERIA DE VALOR

SAN MIGUEL

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H:1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+880.00

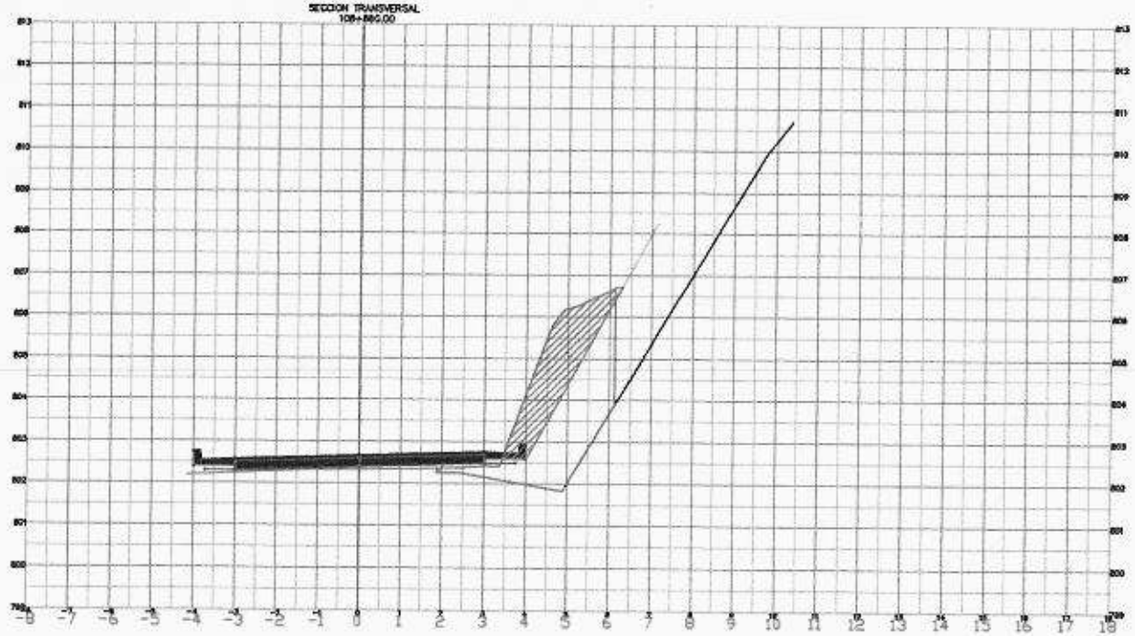

CONVENCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.F.C.	

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK106+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+865.00

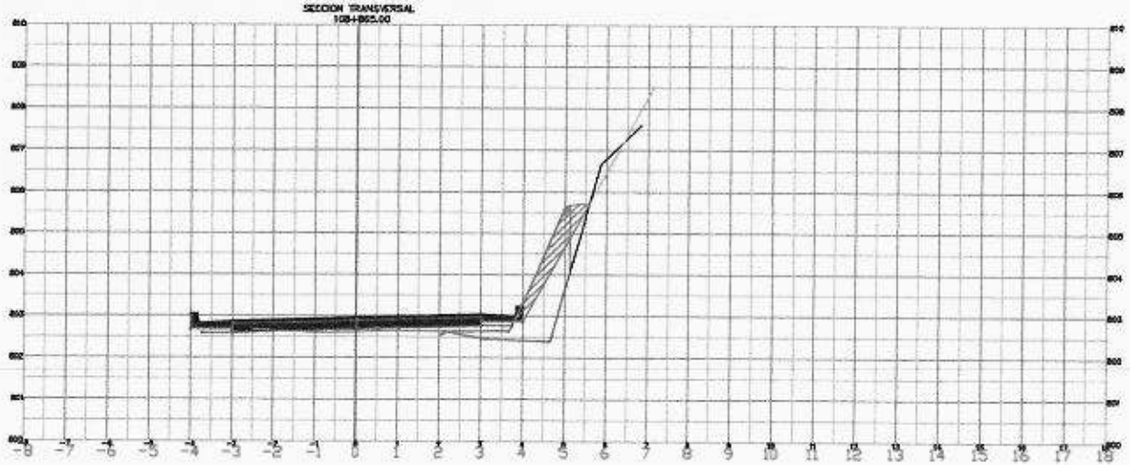

EXCAVACION

CONDICIONES

NOTAS

REFERENCIAS

DIBUJÓ	A.P.C.		
REVISÓ			

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS
PK108+000 – PK120+000


CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4

ESCALA: V: 100
H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
109+870.00

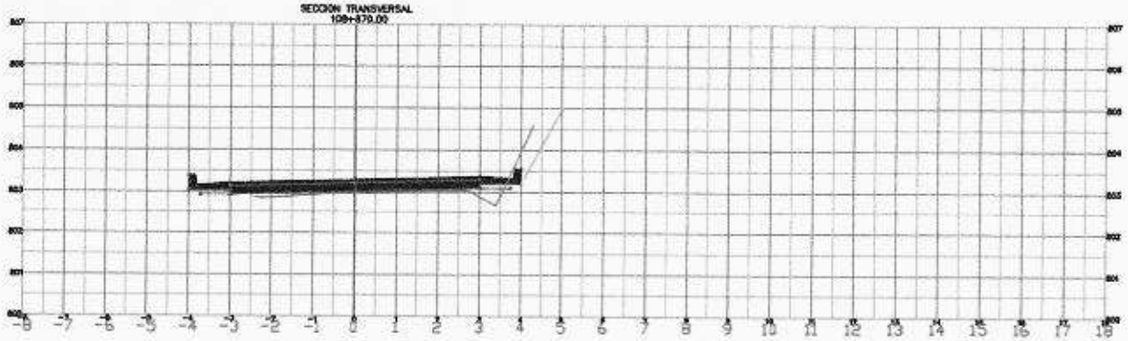

EXCAVACION

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL


TRANSVERSAL

DISPOSICIÓN

NOTAS


REFERENCIAS

		DIBUJÓ: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTENIDO: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1:000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:

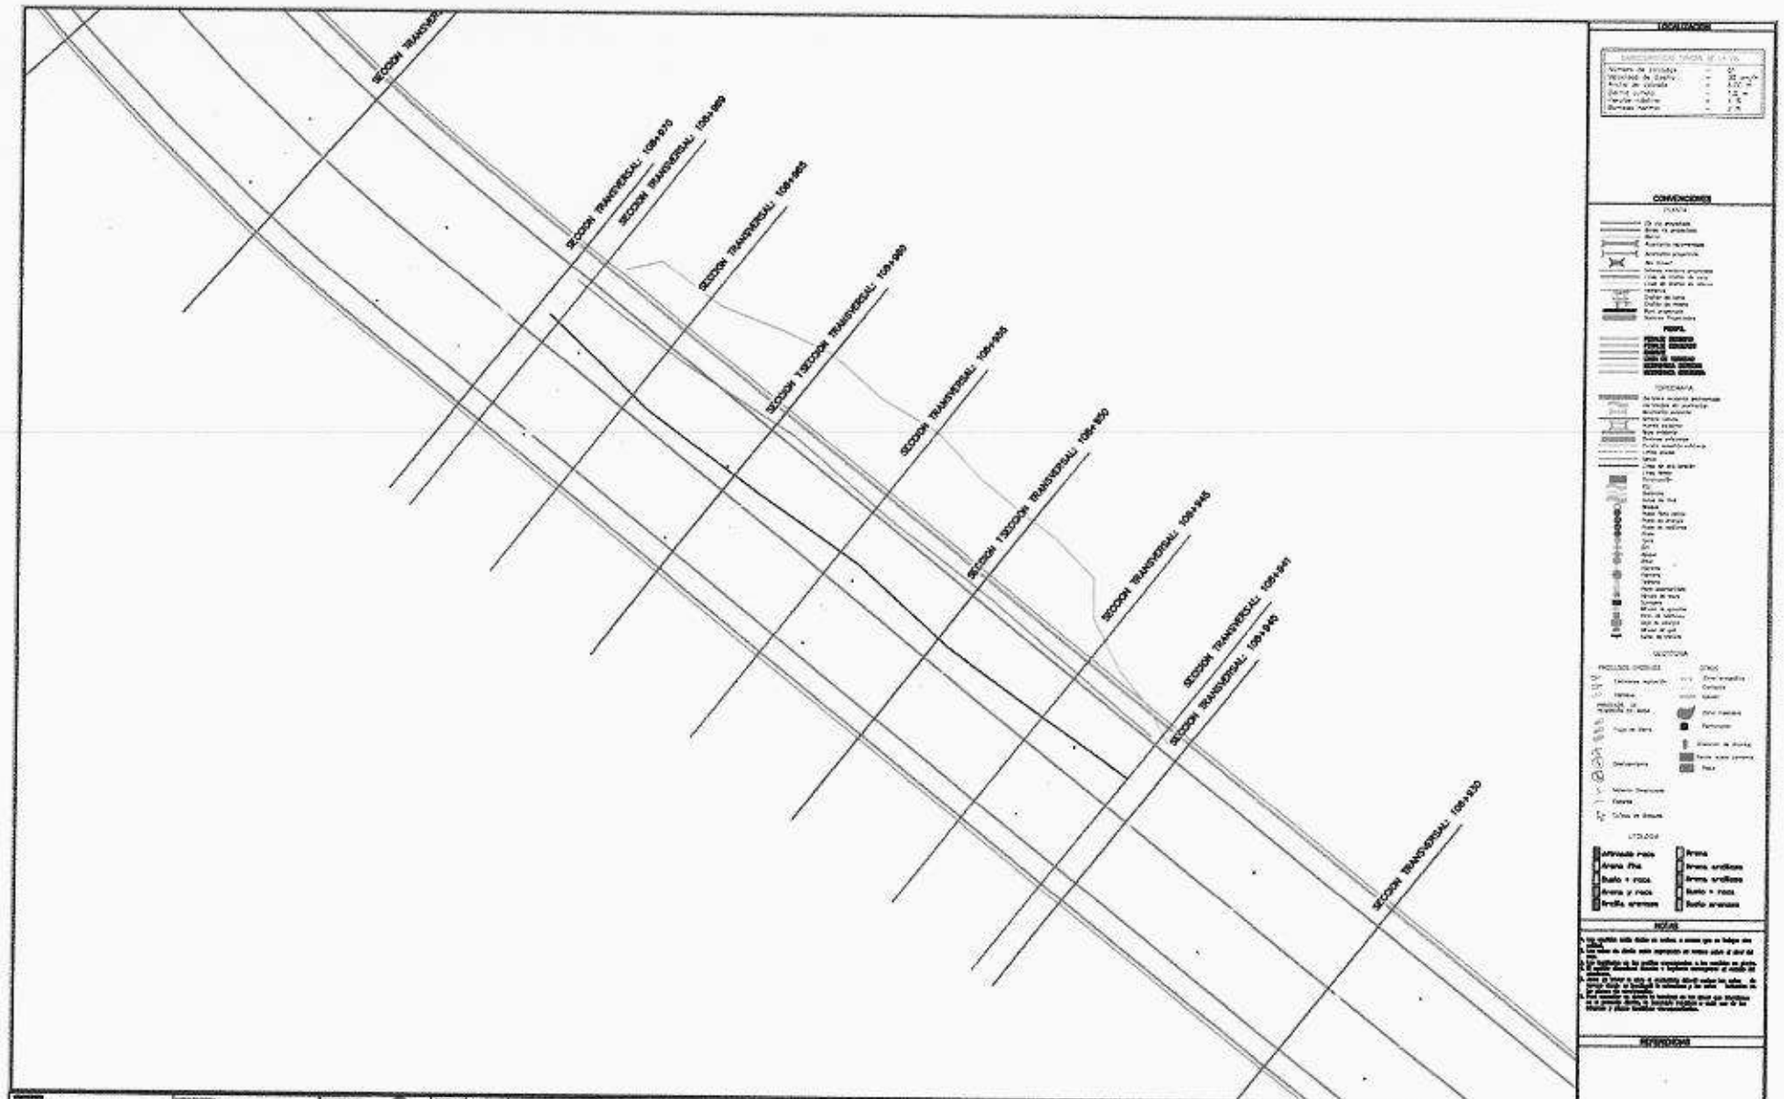

		DIBUJÓ: A.P.C. REVISÓ:		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS PK106+000 – PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025	AM-HMD:

SECCION TRANSVERSAL
108+941.00

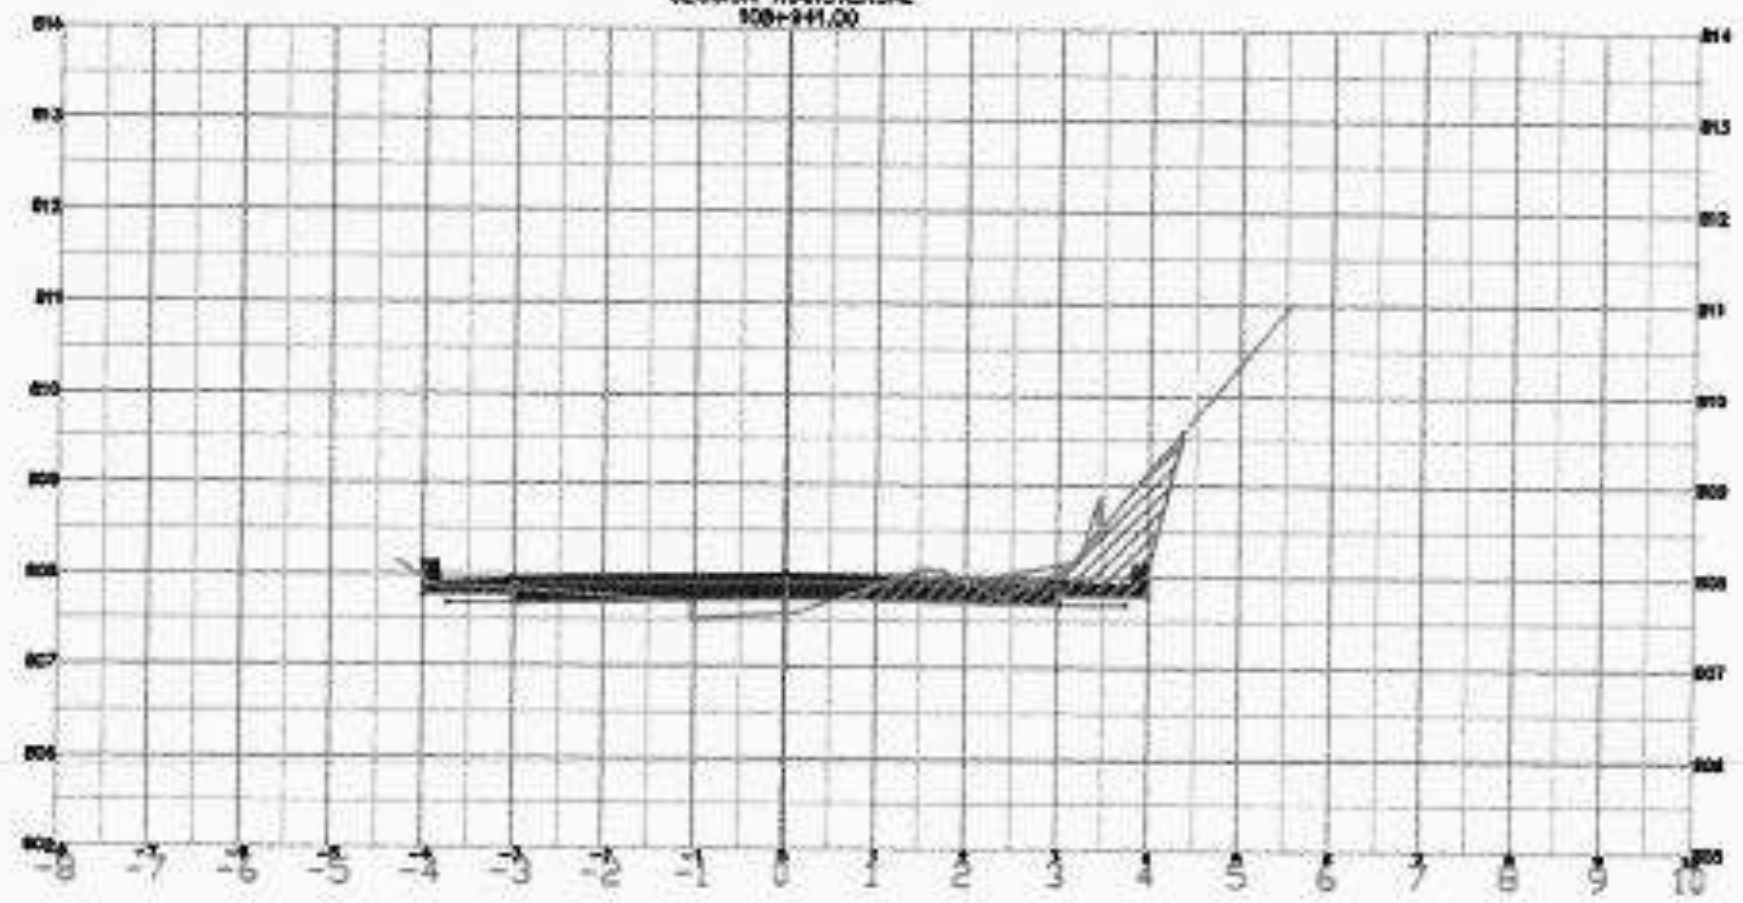

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LOCALIZACION

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA

GEOTECNIA


LITOLOGIA

NOTAS

REFERENCIAS

MAB INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000-PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
108+945.00

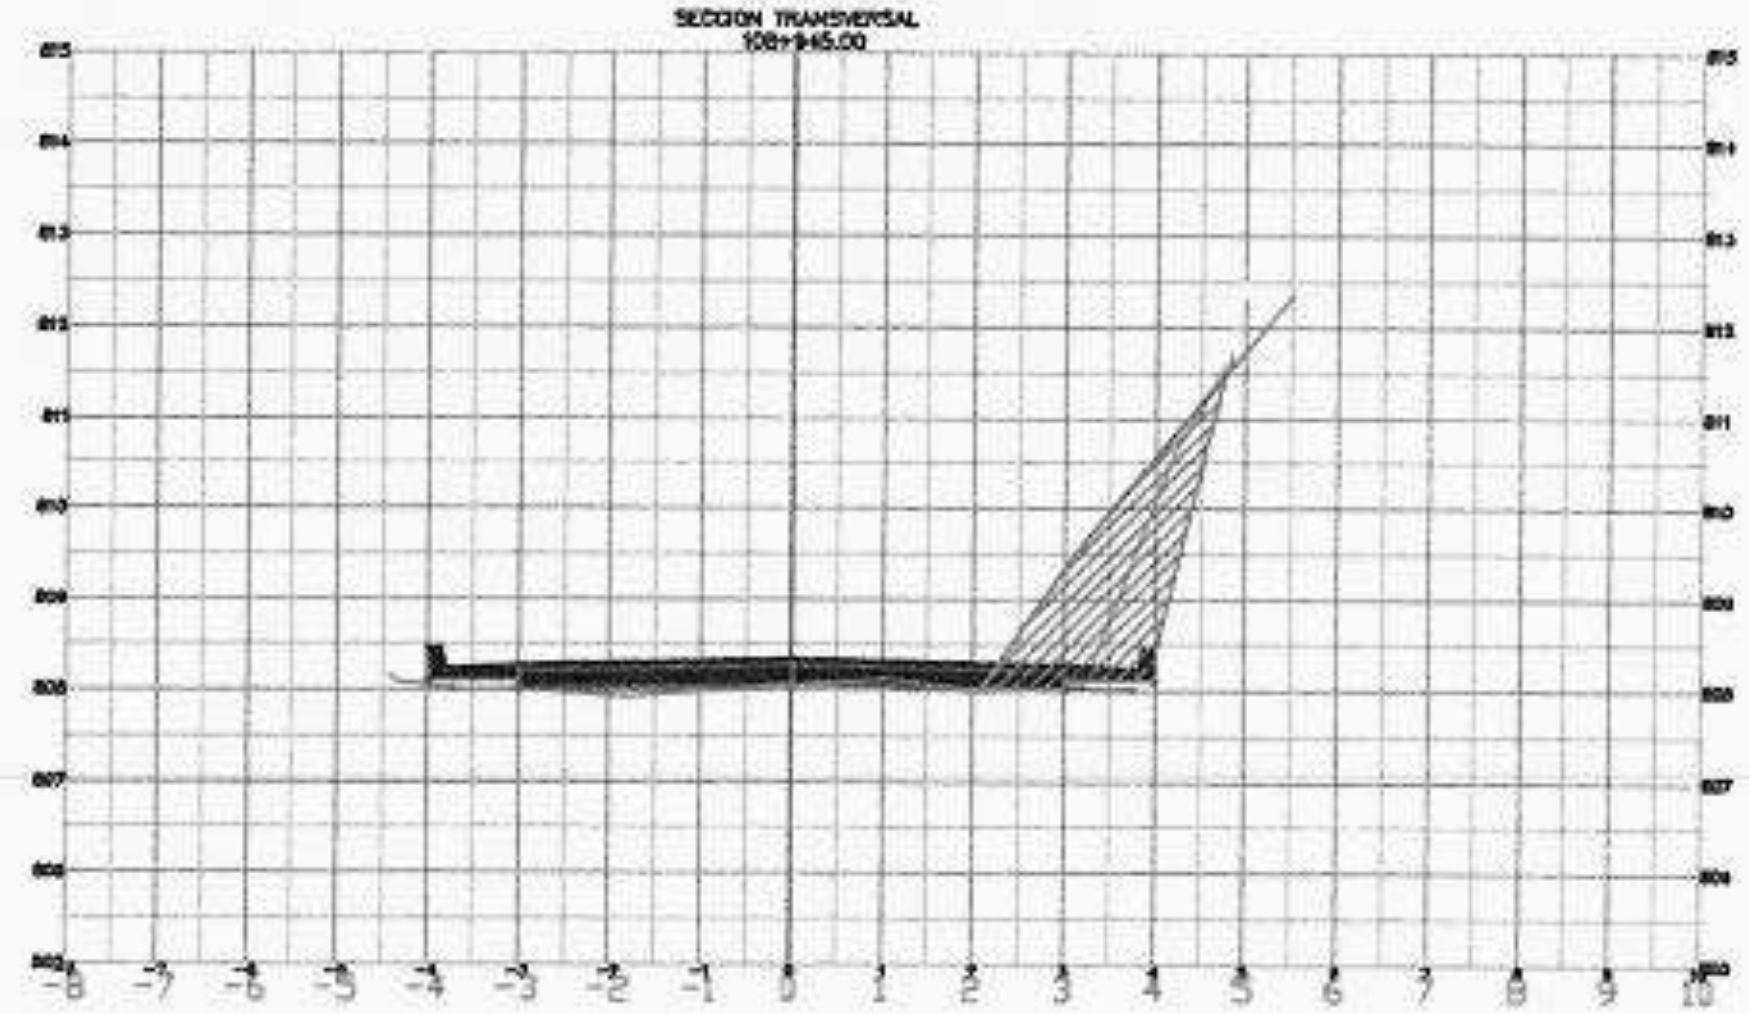

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LOCALIZACION

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA

GEOTECNIA


LITOLOGIA

NOTAS

REFERENCIAS

INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000–PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X
						FECHA: Octubre 2025

SECCION TRANSVERSAL
10B+950.00

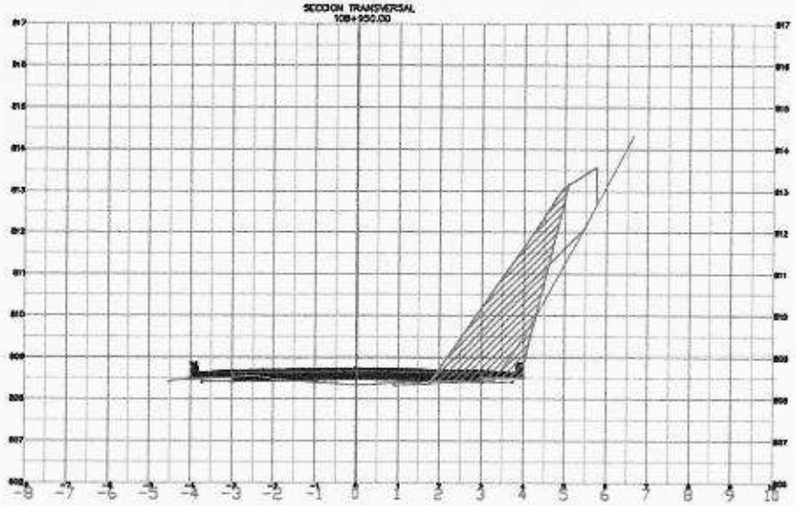

Numero de carriles	2
Velocidad de diseño	80 km/h
Ancho de carriles	4.00 m
Bombeo cuneta	7.0 %
Bombeo máximo	4 %
Bombeo normal	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

CONSTRUCCIÓN

SECCIONES

NOTAS

REFERENCIAS

			DIBUJÓ: A.P.C.				

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA
PK106+000—PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES
EXCAVACION AMPLIACION
TRAMO 4


ESCALA: V: 1:00
H: 1:000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2023

ARCHIVO:

SECCION TRANSVERSAL
108+950.00

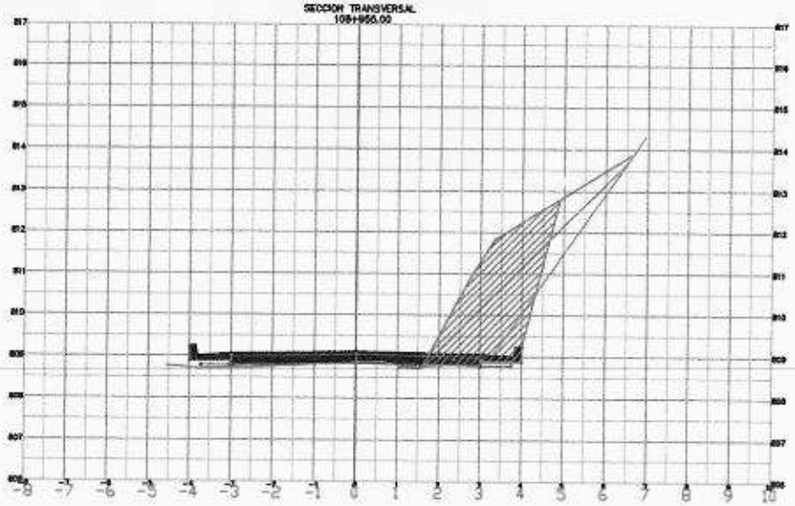

LOCALIZACION


CONVENCIONES

NOTAS

REVISIONES

		DIBUJÓ: A.P.C.	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000–PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 1:00 H: 1:000	PLANOS 1 DE X
					FECHA: Octubre 2023	

SECCION TRANSVERSAL
108+980,00

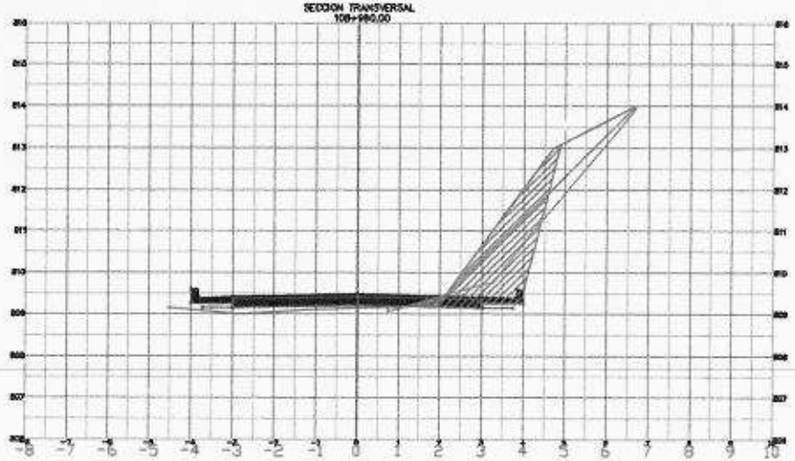

LOCALIZACION

Numero de calzadas	=	01
velocidad de diseño	=	30 km/h
ancho de calzada	=	6.00 m
Bombeo, cuneta	=	2.0 %
Pendiente máxima	=	4 %
Berma lateral	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA


GEOTECNIA

NOTAS

REFERENCIAS

			DIBUJO: A.P.C.		PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000–PK120+000
CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4	ESCALA: V: 100 H: 1000	PLANOS 1 DE X	FECHA: Octubre 2025	ARCHIVO:	

SECCION TRANSVERSAL
108+983.00

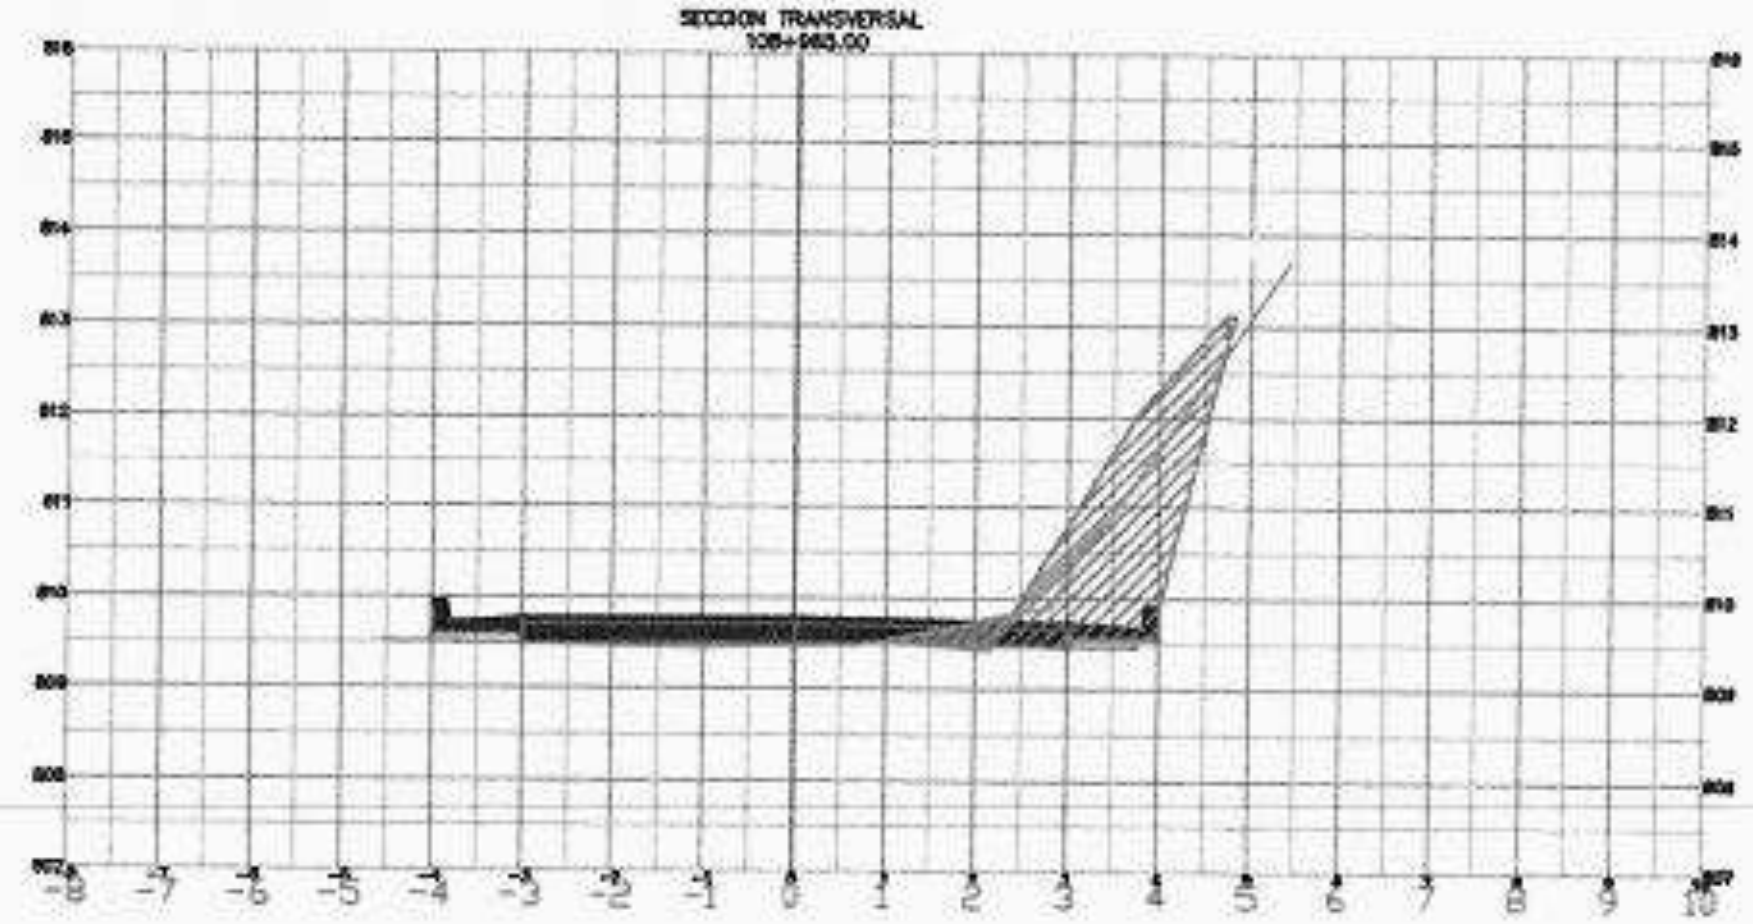

[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000–PK120+000

CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

DIBUJO: A.P.C.

INGENIERIA DE VALOR


SAN MIGUEL

ESCALA: V: 100 H: 1000

PLANOS 1 DE X

FECHA: Octubre 2023

SECCION TRANSVERSAL
108+000.00

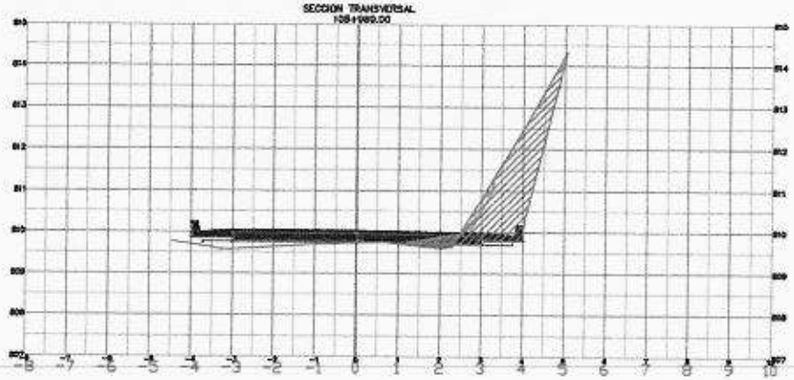

Volúmenes en abscisa PK108+000.00			
Material	Area	Volumen	Volumen Acumulado
Corte Transversal	m2	61.63	123.26

LOCALIZACION

CARACTERISTICAS TIPICAS DE LA VIA		
Numero de calzadas	=	(2)
Velocidad de diseño	=	30 km/h
Radio de curvatura	=	500 m
Pendiente máxima	=	7.5 %
Bombeo normal	=	2 %

CONVENCIONES

PLANTA

PERFIL

TOPOGRAFIA

GEOLOGIA

NOTAS

REFERENCIAS

	INGENIERIA DE VALOR	SAN MIGUEL	DIBUJO: A.P.C. REVISO:	PROYECTO: RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDA PK106+000-PK120+000	CONTIENE: SECCIONES TRANSVERSALES EXCAVACION AMPLIACION TRAMO 4

ESCALA:	PLANOS 1 DE X
V: 1:100 H: 1:1000	
FECHA: Octubre 2025	

Gobierno de CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS

Secretaria de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2021-003-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	107 DE 2022	INTERVENTORIA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM:	91	UNIDAD	
HP4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION y PRESTAMOS. NO INCLUYE CONFORMACION EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE, APLICA PARA LOS MATERIALES DE PRESTAMO SUCIOS DULCE NOMBRE KM9	m3	

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Longitud	Volumen suelto	Factor de compactación		Volumen compacto	Margen	Descripción	Mes de ejecución
ACTA PARCIAL DE COBRO NO. 23									
LLENO MUROS T4									
K107+220.00	K106+810.00	16.00	1.00	2.05		130.08	IZQUIERDA	Relleno de muro	oct-25
K107+220.00	K106+810.00	16.00	0.20	-1.95		-6.55	IZQUIERDA	Descuento de filtro	oct-25
K107+220.00	K106+810.00	3.00	2.14	0.40		2.43	IZQUIERDA	Descuento de tuberia 36"	oct-25
K107+220.00	K107+140.80	8.50	1.66	1.85		15.97	IZQUIERDA	Relleno de muro	oct-25
K107+220.00	K107+140.80	8.50	0.20	-1.19		-1.53	IZQUIERDA	Descuento de filtro	oct-25
K107+220.00	K107+170.00	22.00	2.07	1.22		54.12	IZQUIERDA	Relleno de muro	oct-25
K107+220.00	K107+170.00	22.00	0.20	-0.50		-3.96	IZQUIERDA	Descuento de filtro	oct-25
LLENO MUROS T3									
K107+220.00	K102+670.00	33.23	2.20	1.02		67.27	DERECHA	Relleno de Muro	oct-25
K107+220.00	K102+670.00	33.23	0.20	-1.32		-7.61	DERECHA	Descuento filtro beto	oct-25
K107+220.00	K103+700.00	35.50	3.00	1.24		102.51	DERECHA	Relleno de Muro	oct-25
K107+220.00	K297+700.00	35.50	0.20	-1.24		-5.38	DERECHA	Descuento filtro puro	oct-25
K107+220.00	K304+060.00	31.20	3.00	1.10		63.60	DERECHA	Relleno de Muro	oct-25
K107+220.00	K304+060.00	31.20	0.20	-1.10		-2.97	DERECHA	Descuento filtro puro	oct-25
LLENO SOBRE FILTROS T3									
K97+986.00	K98+085.00	91.00	0.50	0.50		9.55	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+082.00	K98+160.00	68.00	0.10	0.50		3.40	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+161.00	K98+252.00	91.00	0.10	0.50		4.55	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+256.00	K98+272.00	16.00	0.10	0.50		0.80	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+272.00	K98+341.00	69.50	0.10	0.50		3.48	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+502.00	K98+602.00	100.00	0.10	0.50		5.00	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K98+613.00	K98+668.00	55.00	0.10	0.50		2.75	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K99+365.00	K99+140.00	61.00	0.10	0.50		3.05	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
K99+140.00	K99+213.00	73.00	0.10	0.50		3.65	IZQUIERDA	LLENO DE CORRIENTA SOBRE FILTRO	oct-25
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23						442.60			

ACTA PARCIAL No. 1	
ACTA PARCIAL No. 2	
ACTA PARCIAL No. 3	
ACTA PARCIAL No. 4	
ACTA PARCIAL No. 5	
ACTA PARCIAL No. 6	
ACTA PARCIAL No. 7	
ACTA PARCIAL No. 8	
ACTA PARCIAL No. 9	
ACTA PARCIAL No. 10	914.06
ACTA PARCIAL No. 11	198.30
ACTA PARCIAL No. 12	42.50
ACTA PARCIAL No. 13	209.35
ACTA PARCIAL No. 14	242.75
ACTA PARCIAL No. 15	0.00
ACTA PARCIAL No. 16	855.03
ACTA PARCIAL No. 17	6258.33
ACTA PARCIAL No. 18	0.00
ACTA PARCIAL No. 19	5501.45
ACTA PARCIAL No. 20	5023.59
ACTA PARCIAL No. 21	3790.10
ACTA PARCIAL No. 22	3051.60
ACTA PARCIAL NO. 23	**442.60**
TOTAL ACUMULADO	27412.6

ING. [illegible]
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. [illegible]
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2982023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1871 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	85	UNIDAD
NP630.3.2 T4	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS							
K107+330.00	K107+330.00	-1.60	0.45	2.15	-1.55	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	-1.00	-0.20	0.40	0.08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K107+330.00	K107+330.00	-1.80	0.45	1.98	-1.60	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	-2.50	1.80	0.50	-2.32	DERECHA	Muro cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	-3.14	-0.50	0.49	0.38	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
K107+330.00	K107+330.00	-1.40	0.20	2.24	-0.63	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+330.00	K107+330.00	-1.00	-0.20	0.40	0.08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K107+330.00	K107+330.00	-1.40	1.77	0.20	-0.50	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+330.00	K107+330.00	-1.80	2.84	0.20	-0.84	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K107+330.00	K107+330.00	-1.80	2.56	0.20	-0.92	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K107+330.00	K107+330.00	-3.14	-0.20	0.49	0.15	IZQUIERDA	Descuento de tubería de 36"
K107+821.00	K107+821.00	-1.00	1.98	0.20	-0.60	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+821.00	K107+821.00	-1.00	-0.20	0.40	0.08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K107+821.00	K107+821.00	-1.00	0.20	2.03	-0.41	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+821.00	K107+821.00	-1.80	2.42	0.20	-0.87	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K107+821.00	K107+821.00	-1.80	2.56	0.20	-0.92	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K107+821.00	K107+821.00	-3.14	-0.20	0.49	0.15	IZQUIERDA	Descuento de tubería de 36"
K107+821.00	K107+821.00	-1.80	1.80	0.25	-0.81	IZQUIERDA	placa inferior del caja encole
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				-10.80			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	17.80
ACTA PARCIAL NO. 15	2.30
ACTA PARCIAL NO. 16	36.90
ACTA PARCIAL NO. 17	48.50
ACTA PARCIAL NO. 18	2.00
ACTA PARCIAL NO. 19	10.80
ACTA PARCIAL NO. 20	0.00
ACTA PARCIAL NO. 21	0.00
ACTA PARCIAL NO. 22	0.00
ACTA PARCIAL NO. 23	**-10.80**
TOTAL ACUMULADO	107.5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA – SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2809202-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAS INGENIERIA DE VALOR

ITEM	106	UNIDAD
NR16	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 19							
ALCANTARILLAS							
K107+330.00	K107+330.00	1.60	0.45	2.13	1.65	DERECHA	Aleta 1 cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	1.80	-0.26	0.40	-0.08	DERECHA	Descuento entrada cuneta
K107+330.00	K107+330.00	1.80	0.45	1.98	1.60	DERECHA	Aleta 2 cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	2.58	1.50	0.50	2.92	DERECHA	Muro cabezal de salida
K107+330.00	K107+330.00	3.14	-0.50	0.49	-0.38	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
K107+330.00	K107+330.00	1.40	0.20	2.20	0.63	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+330.00	K107+330.00	1.00	-0.20	0.40	-0.08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K107+330.00	K107+330.00	1.40	1.77	0.20	0.50	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+330.00	K107+330.00	1.80	2.36	0.20	0.84	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K107+330.00	K107+330.00	1.80	2.86	0.20	0.92	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K107+330.00	K107+330.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	IZQUIERDA	Descuento de tubería de 36"
K107+821.00	K107+821.00	1.00	1.93	0.20	0.40	IZQUIERDA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+821.00	K107+821.00	1.00	-0.20	0.40	-0.08	IZQUIERDA	Descuento entrada cuneta encole
K107+821.00	K107+821.00	1.00	0.20	2.03	0.41	IZQUIERDA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+821.00	K107+821.00	1.80	2.42	0.20	0.87	IZQUIERDA	Muro posterior caja encole
K107+821.00	K107+821.00	1.80	2.96	0.20	0.92	IZQUIERDA	Muro frontal caja encole
K107+821.00	K107+821.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	IZQUIERDA	Descuento de tubería de 36"
K107+821.00	K107+821.00	1.80	1.80	0.25	0.81	IZQUIERDA	placa inferior del caja encole
ACTA 23							
ALCANTARILLAS							
K107+256.00	K107+256.00	1.80	1.80	0.25	0.81	DERECHA	Losa de fondo caja encole
K107+256.00	K107+256.00	1.40	1.85	0.20	0.46	DERECHA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+256.00	K107+256.00	1.40	2.00	0.20	0.56	DERECHA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+256.00	K107+256.00	1.80	2.20	0.20	0.79	DERECHA	Muro posterior caja encole
K107+256.00	K107+256.00	1.80	2.75	0.20	0.85	DERECHA	Muro frontal caja encole
K107+256.00	K107+256.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
K107+206.00	K107+206.00	2.45	1.20	0.20	0.59	IZQUIERDA	Losa de salida
K107+206.00	K107+206.00	3.10	0.30	0.25	0.23	IZQUIERDA	Dentellon cabezal de salida
K107+206.00	K107+206.00	2.40	1.50	0.45	1.62	IZQUIERDA	Aleta 1 cabezal de salida
K107+206.00	K107+206.00	2.40	1.63	0.45	1.76	IZQUIERDA	Aleta 2 cabezal de salida
K107+206.00	K107+206.00	3.22	2.18	0.50	3.58	IZQUIERDA	Muro cabezal de salida
K107+206.00	K107+206.00	3.14	-0.52	0.49	-0.39	IZQUIERDA	Descuento de tubería de 36"
K107+206.00	K107+206.00	0.80	0.30	-0.20	-0.05	IZQUIERDA	Descuento de entrada cuneta
K107+206.00	K107+206.00	1.80	1.80	0.25	0.81	DERECHA	Losa de fondo caja encole
K107+206.00	K107+206.00	1.40	2.36	0.20	0.66	DERECHA	Muro lateral hacia mayores caja encole
K107+206.00	K107+206.00	1.40	2.82	0.20	0.65	DERECHA	Muro lateral hacia menores caja encole
K107+206.00	K107+206.00	1.80	2.80	0.20	0.83	DERECHA	Muro posterior caja encole
K107+206.00	K107+206.00	1.80	2.40	0.20	0.86	DERECHA	Muro frontal caja encole
K107+206.00	K107+206.00	0.67	-0.20	0.79	-0.11	DERECHA	Descuento de entrada cuneta
K107+206.00	K107+206.00	3.14	-0.20	0.49	-0.15	DERECHA	Descuento de tubería de 36"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				25.10			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**25.10**
TOTAL ACUMULADO	25.1

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAS INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN YEPES
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Secretaría de Infraestructura

Hoja No 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	28092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	107	UNIDAD
NP17	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
ACTA N° 23							
ALCANTARILLAS							
K107+560.00	K107+560.00	5.80	2.85	0.45	6.92	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	6.33	2.85	0.45	7.55	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	7.00	1.75	0.30	3.68	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	6.90	2.95	0.35	7.12	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	7.60	2.00	0.30	4.56	IZQUIERDA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	4.30	0.80	2.05	3.53	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	4.30	0.30	2.65	3.42	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	5.00	0.80	2.05	4.10	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	5.00	0.30	2.40	3.60	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	0.30	3.14	0.49	-0.23	IZQUIERDA	Descuento tubería 36"
K106+810.00	K106+810.00	8.90	0.45	2.65	10.61	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K106+810.00	K106+810.00	8.90	0.35	2.82	8.78	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K106+810.00	K106+810.00	0.35	3.14	0.49	-0.53	IZQUIERDA	Descuento tubería 36"
K106+810.00	K106+810.00	7.20	0.40	2.40	6.91	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K106+810.00	K106+810.00	7.80	0.30	2.50	5.85	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	10.30	0.45	2.40	11.12	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	10.30	0.30	1.50	5.87	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	7.30	0.45	2.40	7.88	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	7.30	0.30	2.70	5.91	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	0.30	3.14	0.49	-0.23	IZQUIERDA	Descuento tubería 36"
K107+140.00	K107+140.00	6.35	0.40	2.05	5.21	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+140.00	K107+140.00	6.35	0.30	2.15	4.10	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	5.35	0.30	1.75	2.81	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	5.35	0.30	1.90	3.05	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	7.55	0.30	1.75	3.96	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	7.55	0.30	1.90	4.30	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	8.80	0.30	1.75	4.62	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 3 de muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	8.80	0.30	1.90	5.02	IZQUIERDA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	5.75	0.40	2.05	4.72	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	6.25	0.30	2.05	3.84	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	4.65	0.45	2.40	5.02	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	4.75	0.30	2.15	3.06	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+700.00	K107+700.00	8.00	0.80	2.05	6.56	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+700.00	K107+700.00	8.20	0.30	1.95	4.80	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	7.90	0.60	2.05	6.49	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	7.90	0.30	1.80	4.27	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	6.65	0.40	2.05	5.45	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	6.65	0.30	2.10	4.19	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	5.90	0.45	2.65	7.04	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	5.90	0.35	2.80	5.78	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	0.35	3.14	0.49	-0.26	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	7.00	0.45	2.65	8.35	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	7.00	0.35	2.95	7.23	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	5.37	0.45	2.65	5.40	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 1 de muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	6.00	0.35	2.70	5.67	IZQUIERDA	Vástago Módulo 1 de muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	5.80	0.45	2.65	6.92	IZQUIERDA	Zarpa Módulo 2 de muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	5.30	0.35	2.57	4.77	IZQUIERDA	Vástago Módulo 2 de muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	0.35	3.14	0.49	-0.26	IZQUIERDA	Vástago Módulo 3 de muro de contención
K106+810.00	K106+810.00	1.85	0.15	2.60	0.72	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 1
K106+810.00	K106+810.00	1.75	0.15	2.30	0.60	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 2
K106+810.00	K106+810.00	1.85	0.15	2.30	0.64	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 3
K106+810.00	K106+810.00	1.95	0.15	2.30	0.67	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 4
K106+810.00	K106+810.00	0.95	0.15	2.30	0.33	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 5
K106+810.00	K106+810.00	1.65	0.15	2.10	0.52	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 6
K106+810.00	K106+810.00	1.80	0.15	2.25	0.61	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 7
K106+810.00	K106+810.00	1.25	0.15	2.30	0.43	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella 8
K106+810.00	K106+810.00	2.00	0.15	1.25	0.38	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 1
K106+810.00	K106+810.00	1.95	0.15	1.05	0.31	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 2
K106+810.00	K106+810.00	2.00	0.15	1.05	0.32	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 3
K106+810.00	K106+810.00	2.00	0.15	1.00	0.30	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 4
K106+810.00	K106+810.00	1.80	0.15	1.00	0.27	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 5
K106+810.00	K106+810.00	1.90	0.15	0.85	0.24	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 6
K106+810.00	K106+810.00	2.00	0.15	1.15	0.35	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella 7
K106+810.00	K106+810.00	1.40	0.15	0.90	0.19	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	1.30	0.15	1.00	0.20	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.00	0.15	1.00	0.30	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.80	0.15	1.80	0.22	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT

K106+810.00	K106+810.00	1.85	0.15	0.90	0.25	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.65	0.15	1.90	0.19	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	1.25	0.15	1.16	0.22	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.68	0.15	1.75	0.18	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.94	0.15	1.20	0.17	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.94	0.15	0.80	0.11	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.60	0.15	1.00	0.09	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	1.20	0.15	1.00	0.18	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	3.05	0.15	1.00	0.46	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.25	0.15	0.95	0.32	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.78	0.15	0.90	0.38	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.56	0.15	0.90	0.35	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.46	0.15	1.07	0.39	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.60	0.15	0.93	0.36	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	3.00	0.15	1.00	0.45	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	2.38	0.15	0.90	0.32	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	1.12	0.15	1.60	0.27	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.50	0.15	1.10	0.08	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.63	0.15	2.60	0.25	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K106+810.00	K106+810.00	0.87	0.15	1.32	0.17	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	2.32	0.20	1.40	0.65	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Huella
K107+256.00	K107+256.00	1.75	0.20	1.40	0.49	IZQUIERDA	Disipador en descole de ODT- Contrahuella
K107+256.00	K107+256.00	1.50	0.20	1.18	0.35	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	1.05	0.20	0.50	0.11	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	1.75	0.20	0.70	0.25	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	1.00	0.20	1.30	0.20	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	0.70	0.20	0.50	0.07	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
K107+256.00	K107+256.00	1.85	0.20	0.65	0.24	IZQUIERDA	Muro en disipador descole de ODT
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				254.70			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**254.70**
TOTAL ACUMULADO	0.0

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2025
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	2509/2023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1971 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	108	UNIDAD
NP16	CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA 21MPa (C) - PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
ACTA N° 23							
MUROS							
K107+256.00	K107+256.00	4.80	2.80	0.27	2.59	IZQUIERDA	Enrocado para soporte losa de fondo (descole)
K107+560.00	K107+560.00	1.50	2.70	1.45	5.87	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 3
K107+560.00	K107+560.00	2.60	8.50	1.45	2.89	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 3
K106+810.00	K106+810.00	8.10	2.90	0.90	21.14	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 1
K106+810.00	K106+810.00	6.10	2.50	1.00	15.25	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 2
K106+810.00	K106+810.00	2.80	2.10	0.52	3.06	IZQUIERDA	Soporte escalón 1 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.50	1.91	0.43	2.05	IZQUIERDA	Soporte escalón 2 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.36	2.37	0.52	2.34	IZQUIERDA	Soporte escalón 3 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.30	2.12	0.35	1.71	IZQUIERDA	Soporte escalón 4 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.60	1.94	0.42	1.14	IZQUIERDA	Soporte escalón 5 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.30	1.60	0.33	1.21	IZQUIERDA	Soporte escalón 6 en disipador descole
K106+810.00	K106+810.00	2.50	1.90	0.50	2.38	IZQUIERDA	Soporte escalón 7 en disipador descole
K107+250.00	K107+250.00	4.50	0.75	0.30	1.01	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 2
K106+810.00	K106+810.00	7.00	3.20	0.20	4.48	IZQUIERDA	Enrocado de protección en descole de ODT
K107+760.00	K107+760.00	5.00	1.00	0.80	4.00	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 1
K107+760.00	K107+760.00	6.70	1.95	1.05	10.99	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 2
K107+820.00	K107+820.00	6.00	1.10	0.60	3.96	IZQUIERDA	Reemplazo de material para soporte de zarpa mod 1
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				85.20			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**85.20**
TOTAL ACUMULADO	85.2

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JUNIOR TIRADO
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACION DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	110	UNIDAD
MP20	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PREPARADO EN OBRA, GRANULARES PUESTOS EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4	m3

Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
AJUSTE ACTA PARCIAL DE COBRO No. 21							
ALCANTARILLAS							
K107+256.60	K107+256.60	1.90	1.80	0.05	0.181	DERECHA	Solado para encole
K106+080.80	K108+080.80	1.90	1.80	0.05	0.181	DERECHA	Solado para encole
K107+208.00	K107+208.00	2.00	0.70	0.05	0.070	IZQUIERDA	Aleta 1 descole
K107+208.00	K107+208.00	2.00	0.70	0.05	0.070	IZQUIERDA	Aleta 2 descole
K107+208.00	K107+208.00	2.18	0.80	0.05	0.087	IZQUIERDA	Cabezal en descole
K107+208.00	K107+208.00	3.07	1.27	0.05	0.195	IZQUIERDA	Losa solera en decole
K107+208.00	K107+208.00	4.34	0.15	0.05	3.050	IZQUIERDA	Cortellon en descole
K107+208.00	K107+208.00	-8.10	0.00	0.00	-3.100	D/I	Descuento de acta N°20
MUROS DE CONTENCIÓN							
K107+560.00	K107+560.00	5.80	2.85	0.05	0.827	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	6.33	2.85	0.05	0.902	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+560.00	K107+560.00	7.00	1.95	0.05	0.683	DERECHA	Solado de zarpa 3 en muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	4.30	2.15	0.05	0.462	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+610.00	K107+610.00	4.70	2.15	0.05	0.505	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
ACTA N° 23							
ALCANTARILLAS							
K107+208.00	K107+208.00	1.90	1.90	0.05	0.181	IZQUIERDA	Solado caja encole
MUROS DE CONTENCIÓN							
K106+810.00	K106+810.00	9.00	2.75	0.05	1.24	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K106+810.00	K106+810.00	7.30	2.50	0.05	0.91	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	10.40	2.80	0.05	1.30	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+250.00	K107+250.00	7.40	2.50	0.05	0.93	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+140.00	K107+140.00	6.45	2.15	0.05	0.69	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	6.35	1.85	0.05	0.59	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	7.65	1.85	0.05	0.71	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+170.00	K107+170.00	8.90	1.85	0.05	0.82	DERECHA	Solado de zarpa 3 en muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	5.85	2.15	0.05	0.63	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+280.00	K107+280.00	4.75	2.50	0.05	0.59	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+700.00	K107+700.00	8.10	2.15	0.05	0.87	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	8.00	2.15	0.05	0.86	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+720.00	K107+720.00	6.75	2.15	0.05	0.73	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	6.00	2.75	0.05	0.83	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+760.00	K107+760.00	7.10	2.75	0.05	0.98	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	5.47	2.75	0.05	0.75	DERECHA	Solado de zarpa 1 en muro de contención
K107+820.00	K107+820.00	5.90	2.75	0.05	0.81	DERECHA	Solado de zarpa 2 en muro de contención
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				18.50			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**18.50**
TOTAL ACUMULADO	18.5

ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JOAQUIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

Gobierno de CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS	

PREACTA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS

PREACTA DE OBRA No:	23 TRAMO 4	FECHA:	30/10/2024
PERIODO:	1 AL 30 OCTUBRE 2024		
CONTRATO DE OBRA No:	29092023-1456	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1071 DE 2022	INTERVENTORÍA:	MAB INGENIERIA DE VALOR

ITEM	111						UNIDAD
NP21	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PUESTO EN OBRA PARA TRAMO 3 Y TRAMO 4						m3
Abscisa Inicial	Abscisa Final	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad	Margen	Descripción
ACTA PARCIAL DE COBRO No. 23							
MUROS DE CONTENCIÓN							
K107+560.00	K107+560.00	19.13	0.20	1.57	6.01	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K107+560.00	K107+560.00	19.13	3.14	-0.003	-0.182	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K107+610.00	K107+610.00	8.73	0.20	1.33	2.32	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K107+610.00	K107+610.00	8.73	3.14	-0.003	-0.083	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K106+810.00	K106+810.00	16.80	0.20	1.95	6.55	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K106+810.00	K106+810.00	8.40	3.14	-0.240	-0.302	DERECHA	Descuento tubería de 36"
K106+810.00	K106+810.00	16.80	3.14	-0.003	-0.160	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K107+140.00	K107+140.00	6.50	0.20	1.18	1.53	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K107+140.00	K107+140.00	6.50	3.14	-0.003	-0.062	DERECHA	Descuento tubería de 4"
K107+170.00	K107+170.00	22.00	0.20	0.90	3.96	DERECHA	Filtro longitudinal muro
K107+170.00	K107+170.00	22.00	3.14	-0.003	-0.209	DERECHA	Descuento tubería de 4"
SUB TOTAL ACTA PARCIAL NO. 23				19.40			

ACTA PARCIAL NO. 1	
ACTA PARCIAL NO. 2	
ACTA PARCIAL NO. 3	
ACTA PARCIAL NO. 4	
ACTA PARCIAL NO. 5	
ACTA PARCIAL NO. 6	
ACTA PARCIAL NO. 7	
ACTA PARCIAL NO. 8	
ACTA PARCIAL NO. 9	
ACTA PARCIAL NO. 10	
ACTA PARCIAL NO. 11	
ACTA PARCIAL NO. 12	
ACTA PARCIAL NO. 13	
ACTA PARCIAL NO. 14	
ACTA PARCIAL NO. 15	
ACTA PARCIAL NO. 16	
ACTA PARCIAL NO. 17	
ACTA PARCIAL NO. 18	
ACTA PARCIAL NO. 19	
ACTA PARCIAL NO. 20	
ACTA PARCIAL NO. 21	
ACTA PARCIAL NO. 22	
ACTA PARCIAL NO. 23	**19.40**
TOTAL ACUMULADO	19.4


ING. SEBASTIAN GOMEZ VERGARA
MAB INGENIERIA DE VALOR
INTERVENTORIA

ING. JACOIN TIBATÁ
CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	


Estructuras de drenaje

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

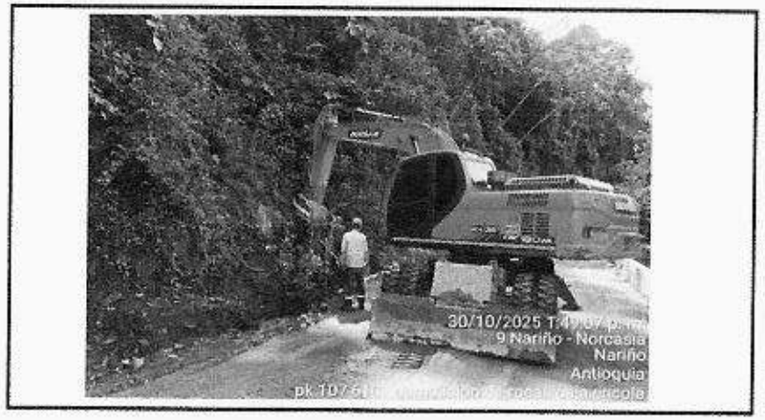





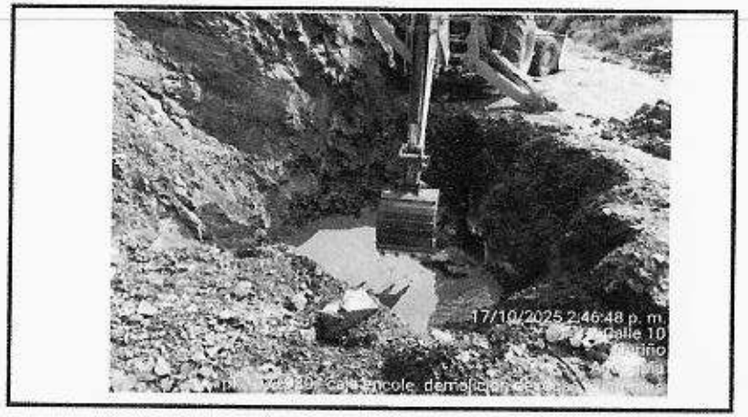

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

Estructuras de drenaje

663.1 Tubería de plastico tipo PVC norma NTC-5055 de diametro 900 mm











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	


Estructuras de drenaje

640.1 T4 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa

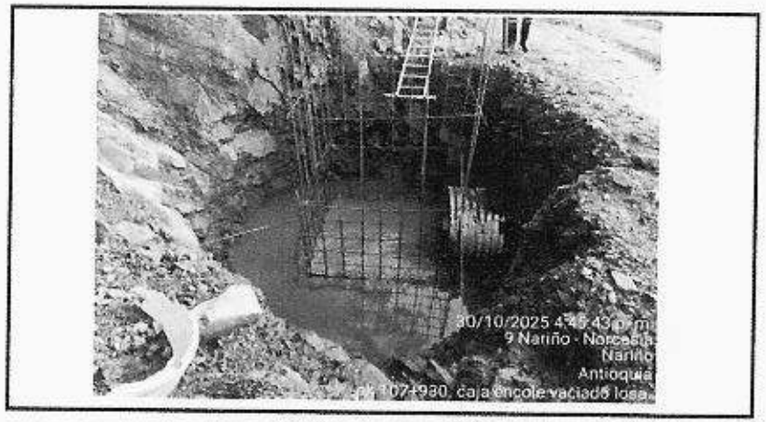

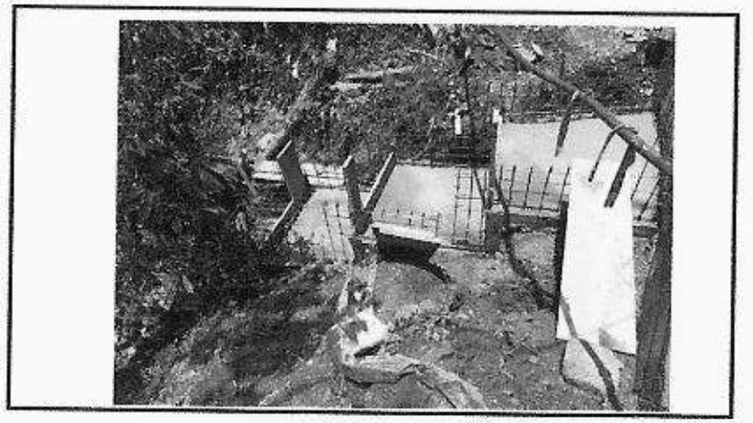



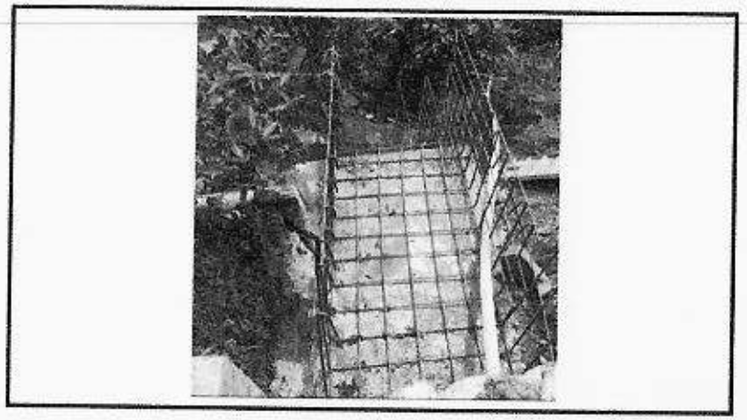

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

Obras de estabilización

600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO










GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	


Obras de estabilización

640.1 T4 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa





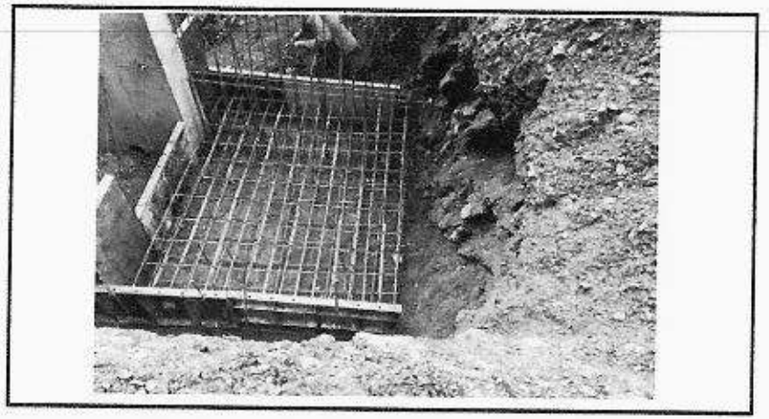

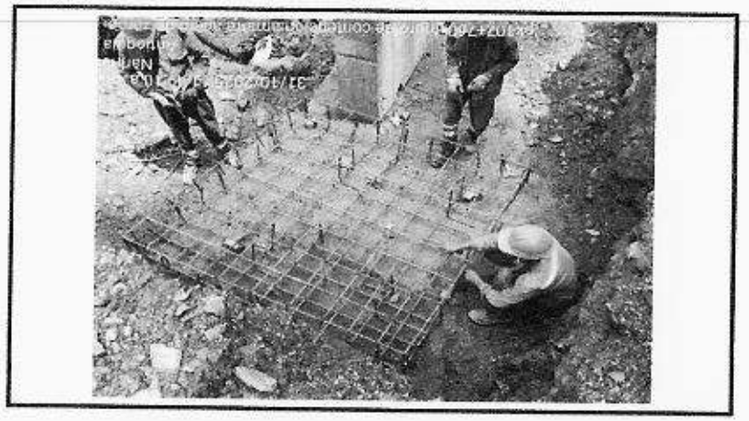



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	


Obras de estabilización

673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE



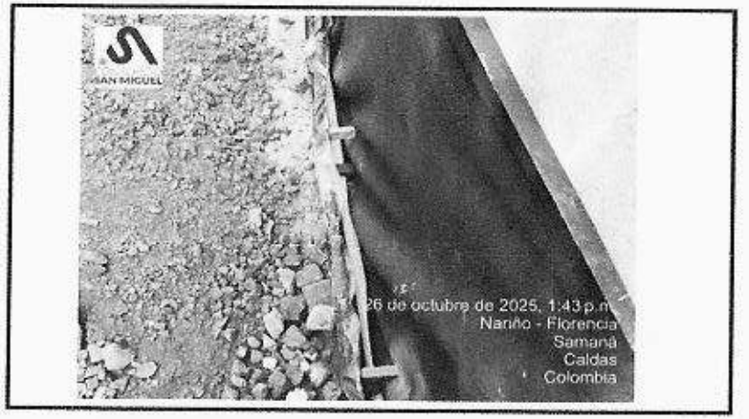

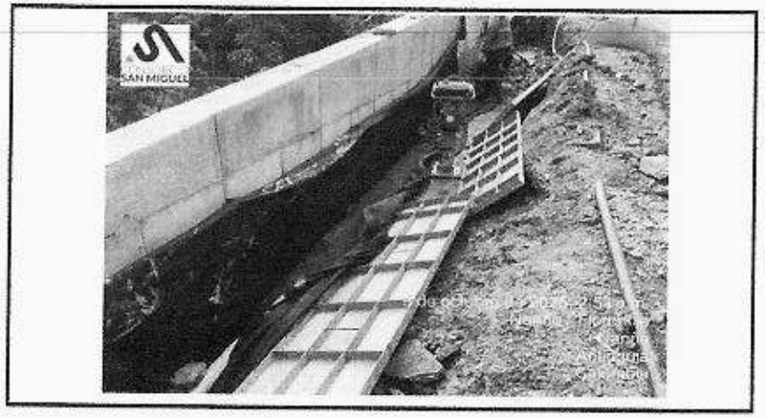

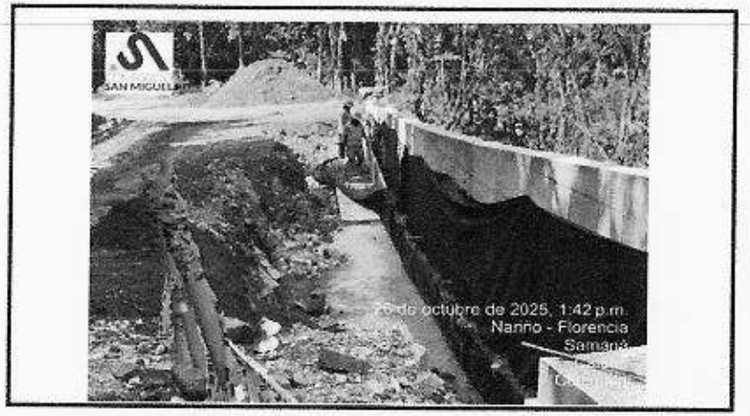


GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

Transporte

900.2.1 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)





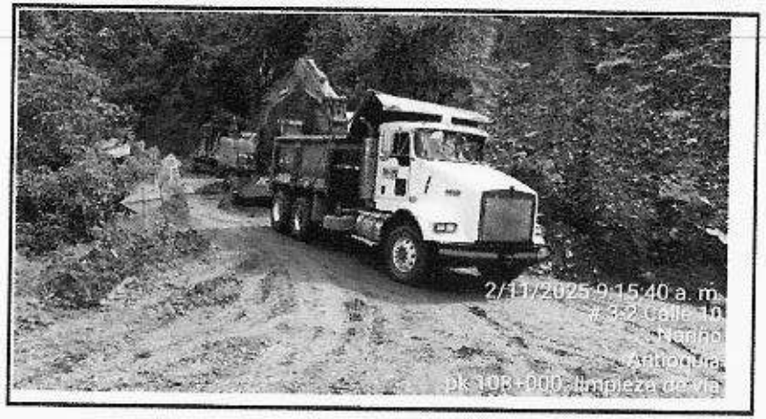





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

No previstos

NP 211.1 Remoción de derrumbes

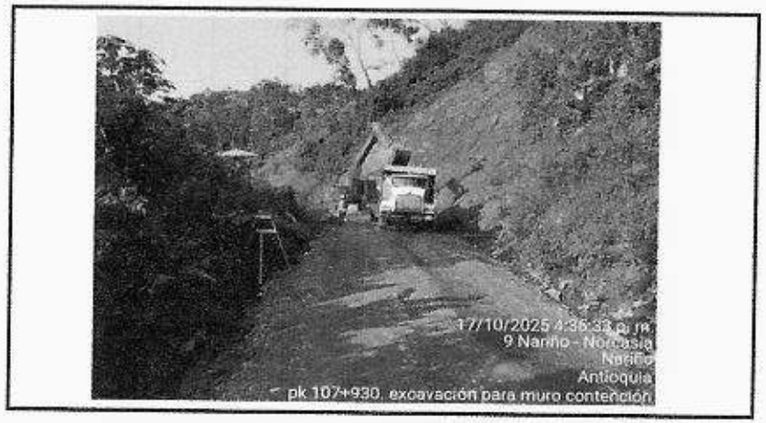

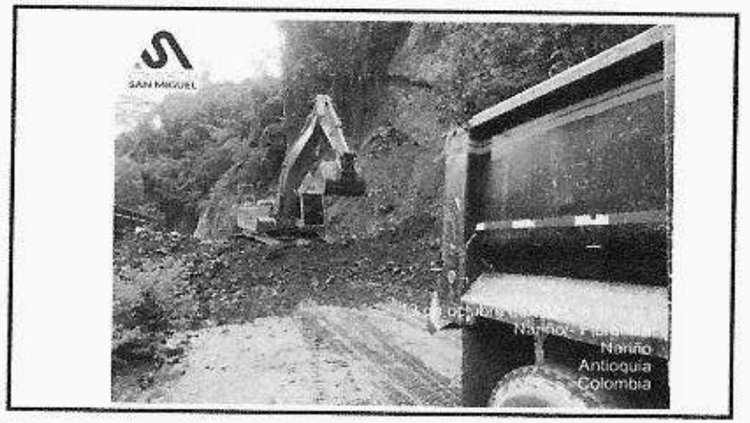





GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4		

No previstos

NP 610.2 **Rellenos para estructuras con material de préstamo, excavaciones y/o derrumbes**











GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4		

No previstos

NP 900.3.2 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)



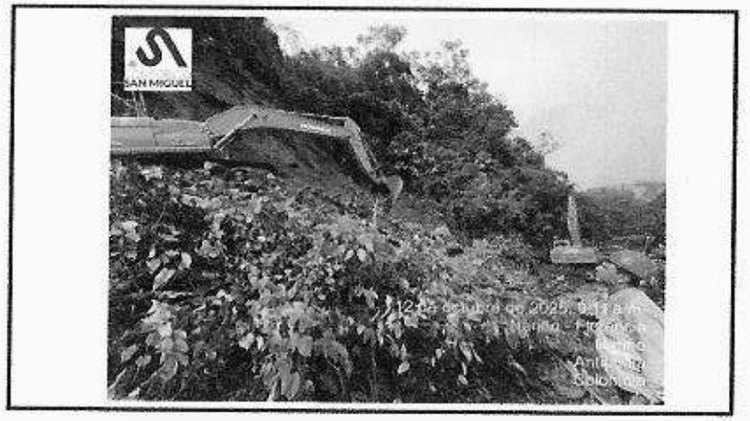

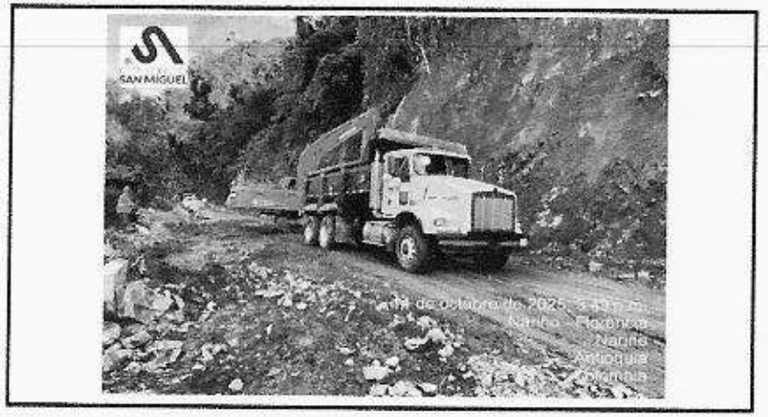



GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4

No previstos

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES





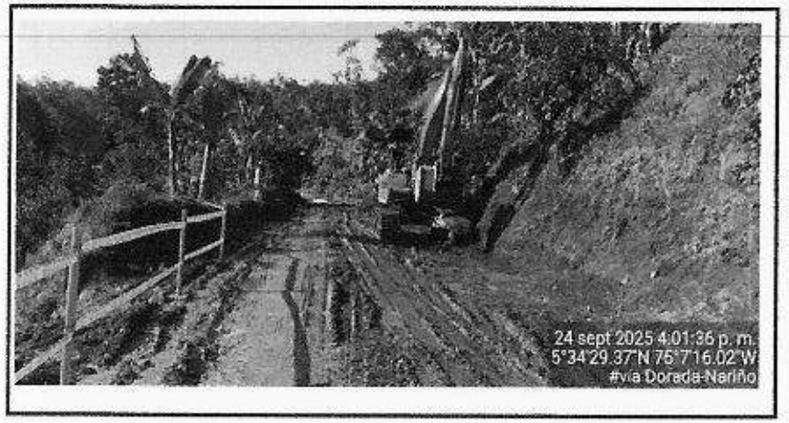



GOBERNACIÓN DE CALDAS		Hoja No 1 de 1
GOBIERNO DE CALDAS	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4

No previstos

NP4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN y PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE, APLICA





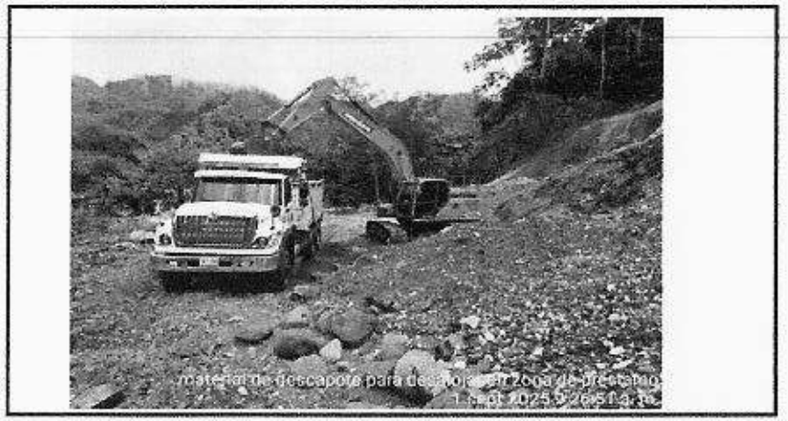





GOBERNACIÓN DE CALDAS		
GOBIERNO DE CALDAS	Secretaria de Infraestructura	Hoja No 1 de 1
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4		

No previstos

NF4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN y PRESTAMOS, NO INCLUYE CONFORMACIÓN EN ZONAS DE DEPOSITO NI TRANSPORTE, APLICA



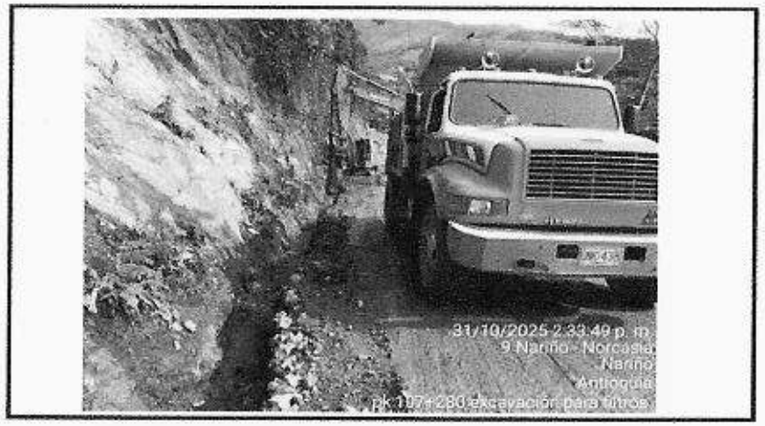

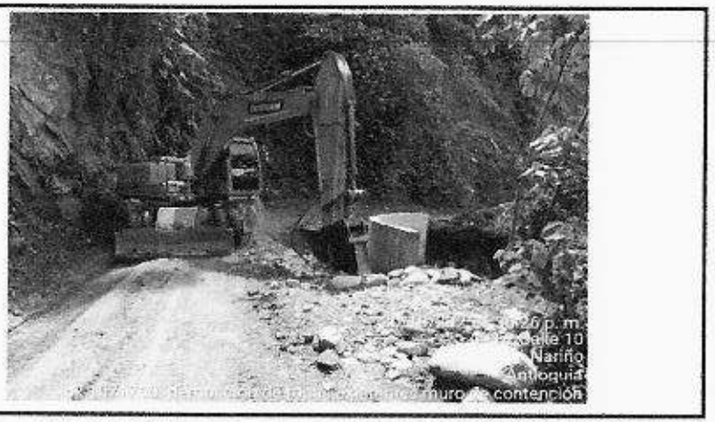




GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4		


Estructuras de drenaje

630.6 T4 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa (F)



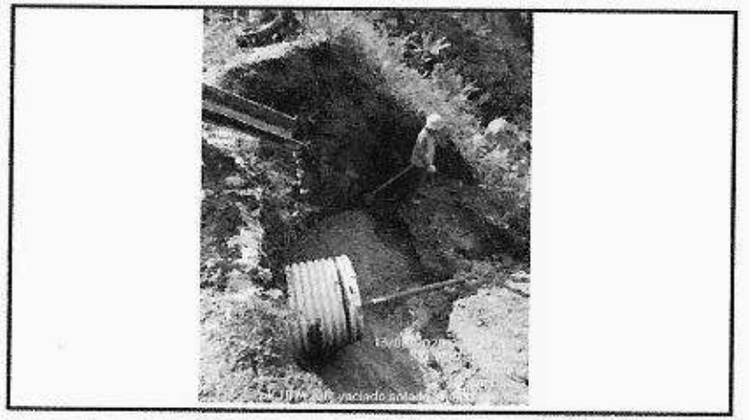



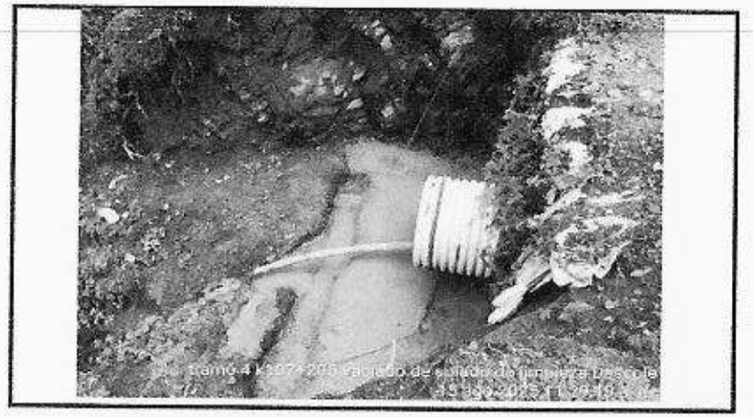

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

Obras de estabilización

630.6 T4 CONCRETO DE RESISTENCIA 14 MPa (F)










GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29052023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	


Obras de estabilización

673.2 T4 MATERIAL GRANULAR DRENANTE



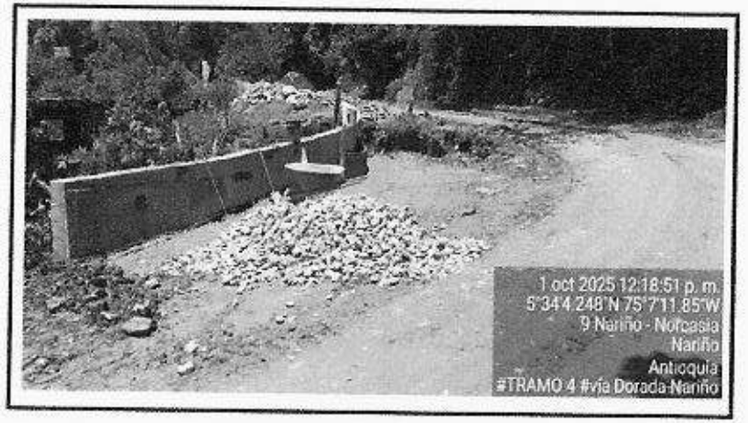



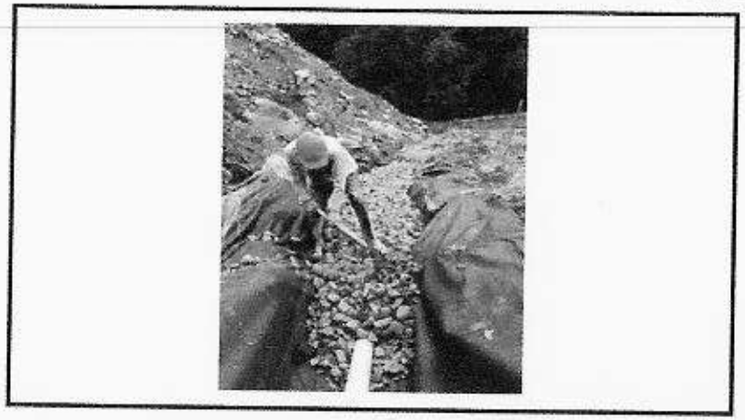

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaría de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4		


No previstos

NP630.3.2 T4 CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4







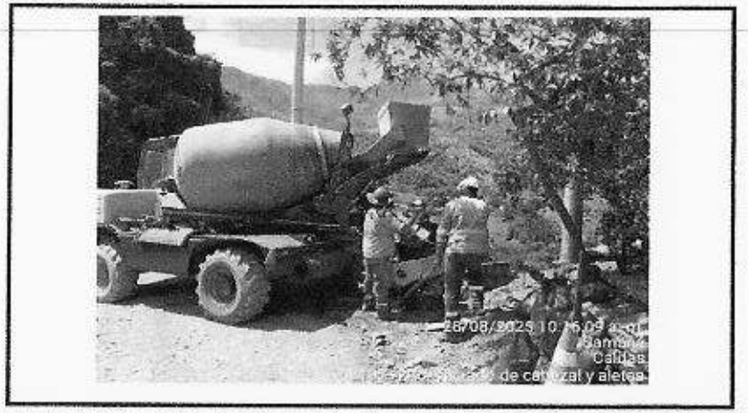

GOBIERNO DE CALDAS	GOBERNACIÓN DE CALDAS	Hoja No 1 de 1
	Secretaria de Infraestructura	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSÓN, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS. CONTRATO - 29092023-1456	
	REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL DE OBRA NRO 23 TRAMO 4	

No previstos

NP630.4.2 T4 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - PREPARADO EN OBRA TRAMO 4

