CONSORCIO ESCENARIOS EP
NIT 901.924.784-1
AK 19 95 20 OF 605 ED SIGMA
Tel: (601) 4327903
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD@PROMCIVILES.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 4

Señores	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
NIT	890.102.018-1	**Teléfono**	(605) 4010205
Dirección	CL 34 43 31	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 14:07
Expedición	24/11/2025, 14:07
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LOTE4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)	1.00	2,285,601,043.00	2,285,601,043.00
2	INDIRECTOS	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	1.00	685,680,312.00	685,680,312.00

Total items: 2

Total Bruto	2,971,281,355.00
Total a Pagar	2,971,281,355.00

Valor en Letras:
Dos mil novecientos setenta y un millones doscientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 2,971,281,355.00

Observaciones:
PROCESO DE CONTRATACIÓN N° LP-031-2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"

CONSORCIO ESCENARIOS EP

Conformado por:
PROMCIVILES SAS NIT 901.001.320-5 40%
PROMOTORA PUGA LTDA NIT 830.024.796-9 30%
EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2 30%

Consignación en BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS # 193-000034-67

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093204472 aprobado en 20250516 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b6133d0df0401e0be8b3a61ad842cb6d8c0ab51bd281a7067a0b4801bc42351863935168f4d9b0eb478f0b2369b11902

CONSORCIO ESCENARIOS EP
NIT 901.924.784-1
AK 19 95 20 OF 605 ED SIGMA
Tel: (601) 4327903
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD@PROMCIVILES.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 6

Señores	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
NIT	890.102.018-1	**Teléfono**	(605) 4010205 - Ext. 000
Dirección	CL 34 43 31	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 14:49
Expedición	24/11/2025, 14:49
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	3	INTERESES REMUNERATORIOS conforme a Claúsula Segunda del Otrosí modificatorio N° 1 al contrato LP-031-2024 LOTE No.4.	1.00	89,120,140.45	89,120,140.45

Total items: 1

Total Bruto	89,120,140.45
Total a Pagar	89,120,140.45

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones ciento veinte mil ciento cuarenta pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 89,120,140.45

Observaciones:
PROCESO DE CONTRATACIÓN N° LP-031-2024 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"

CONSORCIO ESCENARIOS EP

Conformado por:
PROMCIVILES SAS NIT 901.001.320-5 40%
PROMOTORA PUGA LTDA NIT 830.024.796-9 30%
EQUIVER SAS NIT 800.233.401-2 30%

Consignación en BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS
193-000034-67

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093204472 aprobado en 20250516 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 20fd7b5d9e86f4704c74a38ca521de14a6e9a2fc4b436a37682f54074db1fafc0b1538424d835cd3d39efc8ad7cafa70

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO N°LP-031-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**													
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3015	$ 80.656,00	$ 104.853,00	$ 316.131.795,00	3.015,00	$ 316.131.795,00	999,57	$ 104.807.913,21	999,57	$ 104.807.913,21	2.015,43	$ 211.323.881,79
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	$ 23.509,00	$ 30.562,00	$ 30.562,00	1,00	$ 30.562,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.562,00
1,03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	40822	$ 2.908,00	$ 3.780,00	$ 154.307.160,00	55.000,00	$ 207.900.000,00	52.411,78	$ 198.116.528,40	52.411,78	$ 198.116.528,40	2.588,22	$ 9.783.471,60
1,04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	312	$ 34.329,00	$ 44.628,00	$ 13.923.936,00	312,00	$ 13.923.936,00	73,00	$ 3.257.844,00	73,00	$ 3.257.844,00	239,00	$ 10.666.092,00
1,05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	314	$ 82.935,00	$ 107.816,00	$ 33.854.224,00	314,00	$ 33.854.224,00		$ -	-	$ -	314,00	$ 33.854.224,00
1,06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	140	$ 40.371,00	$ 52.482,00	$ 7.347.480,00	140,00	$ 7.347.480,00		$ -	-	$ -	140,00	$ 7.347.480,00
1,07	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	$ 89.604,00	$ 116.485,00	$ 116.485,00	1,00	$ 116.485,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 116.485,00
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 25.119,00	$ 32.655,00	$ 32.655,00	1,00	$ 32.655,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.655,00
1,09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1584	$ 59.276,00	$ 77.059,00	$ 122.061.456,00	1.584,00	$ 122.061.456,00	155,00	$ 11.944.145,00	155,00	$ 11.944.145,00	1.429,00	$ 110.117.311,00
1,1	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	8	$ 204.745,00	$ 266.169,00	$ 2.129.352,00	8,00	$ 2.129.352,00		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.129.352,00
1,11	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1491	$ 55.167,00	$ 71.717,00	$ 106.930.047,00	1.491,00	$ 106.930.047,00		$ -	-	$ -	1.491,00	$ 106.930.047,00
1,12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	429	$ 56.960,00	$ 74.048,00	$ 31.766.592,00	5.300,00	$ 392.454.400,00	4.214,90	$ 312.105.092,92	4.214,90	$ 312.105.092,92	1.085,10	$ 80.349.307,08
1,13	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	5	$ 28.844,00	$ 37.497,00	$ 187.485,00	5,00	$ 187.485,00		$ -	-	$ -	5,00	$ 187.485,00
1,14	DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 51.007,00	$ 66.309,00	$ 66.309,00	1,00	$ 66.309,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 66.309,00
1,15	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3431	$ 12.148,00	$ 15.792,00	$ 54.182.352,00	3.431,00	$ 54.182.352,00	195,12	$ 3.081.336,04	195,12	$ 3.081.336,04	3.235,88	$ 51.101.016,96
1,16	DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1	$ 32.463,00	$ 42.202,00	$ 42.202,00	1,00	$ 42.202,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 42.202,00
1,17	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 18.823,00	$ 24.470,00	$ 24.470,00	1,00	$ 24.470,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 24.470,00
1,18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	4260	$ 46.276,00	$ 60.159,00	$ 256.277.340,00	4.260,00	$ 256.277.340,00	252,91	$ 15.214.782,81	252,91	$ 15.214.782,81	4.007,09	$ 241.062.557,39
1,19	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.315,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	ML	1	$ 26.199,00	$ 34.059,00	$ 34.059,00	1,00	$ 34.059,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.059,00
1,21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	$ 13.909,00	$ 18.082,00	$ 18.082,00	1,00	$ 18.082,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.082,00
1,22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 59.903,00	$ 77.874,00	$ 77.874,00	1,00	$ 77.874,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 77.874,00
1,23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL	M2	3930	$ 14.324,00	$ 18.621,00	$ 73.180.530,00	3.930,00	$ 73.180.530,00		$ -	-	$ -	3.930,00	$ 73.180.530,00
1,24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	$ 20.660,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00	1,00	$ 26.858,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.858,00
1,25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1	$ 23.833,00	$ 30.983,00	$ 30.983,00	1,00	$ 30.983,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.983,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,26	DESMONTE DE SANTARIOS	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	$ 487.449,00	$ 633.684,00	$ 633.684,00	1,00	$ 633.684,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 633.684,00
1,29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL	M2	60	$ 21.476,00	$ 27.919,00	$ 1.675.140,00	60,00	$ 1.675.140,00		$ -	-	$ -	60,00	$ 1.675.140,00
1,3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	$ 16.991,00	$ 22.088,00	$ 22.088,00	1,00	$ 22.088,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.088,00
1,31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	$ 17.860,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00	1,00	$ 23.218,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 23.218,00
1,33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	9	$ 45.560,00	$ 59.228,00	$ 533.052,00	9,00	$ 533.052,00		$ -	-	$ -	9,00	$ 533.052,00
1,34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10	$ 67.453,00	$ 87.689,00	$ 876.890,00	10,00	$ 876.890,00	2,00	$ 175.378,00	2,00	$ 175.378,00	8,00	$ 701.512,00
1,35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 55.996,00	$ 72.795,00	$ 72.795,00	1,00	$ 72.795,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 72.795,00
1,36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1200	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 48.394.800,00	1.200,00	$ 48.394.800,00		$ -	-	$ -	1.200,00	$ 48.394.800,00
1,37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400	$ 12.224,00	$ 15.891,00	$ 22.247.400,00	1.400,00	$ 22.247.400,00		$ -	-	$ -	1.400,00	$ 22.247.400,00
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	36982	$ 15.524,00	$ 20.181,00	$ 746.333.742,00	36.982,00	$ 746.333.742,00	6.473,85	$ 130.648.766,85	6.473,85	$ 130.648.766,85	30.508,15	$ 615.684.975,15
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**													
2,01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12595	$ 61.354,00	$ 79.760,00	$ 1.004.656.960,00	12.595,00	$ 1.004.656.960,00	424,47	$ 33.855.414,54	424,47	$ 33.855.414,54	12.171,53	$ 970.801.545,46
2,02	EXCAVACIÓN DE 0,30 X 0,30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1783	$ 11.634,00	$ 15.124,00	$ 26.966.092,00	1.783,00	$ 26.966.092,00	477,84	$ 7.226.852,16	477,84	$ 7.226.852,16	1.305,16	$ 19.739.239,84
2,03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	10247	$ 54.106,00	$ 70.338,00	$ 720.753.486,00	10.247,00	$ 720.753.486,00	547,67	$ 38.522.012,46	547,67	$ 38.522.012,46	9.699,33	$ 682.231.473,54
2,04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	$ 26.952,00	$ 35.038,00	$ 35.038,00	1,00	$ 35.038,00			-	$ -	1,00	$ 35.038,00
2,05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	$ 132.041,00	$ 171.653,00	$ 171.653,00	1,00	$ 171.653,00			-	$ -	1,00	$ 171.653,00
2,06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	17519	$ 110.331,00	$ 143.430,00	$ 2.512.750.170,00	14.205,20	$ 2.037.452.354,00	1.386,87	$ 198.918.936,22	1.386,87	$ 198.918.936,22	12.818,33	$ 1.838.533.417,78
2,07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	50	$ 219.559,00	$ 285.427,00	$ 14.271.350,00	50,00	$ 14.271.350,00			-	$ -	50,00	$ 14.271.350,00
2,08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAION - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	$ 199.048,00	$ 258.762,00	$ 258.762,00	175	45.283.350,00	173,94	45.009.062,28	173,94	$ 45.009.062,28	1,06	$ 274.287,72
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN)	M3	1	$ 105.971,00	$ 137.762,00	$ 137.762,00	1,00	$ 137.762,00			-	$ -	1,00	$ 137.762,00
2,1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	1287	$ 210.231,00	$ 273.300,00	$ 351.737.100,00	1.287,00	$ 351.737.100,00			-	$ -	1.287,00	$ 351.737.100,00
2,11	RELLENO EN MATERAIL SELCCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS)	M3	3006	$ 94.775,00	$ 123.208,00	$ 370.363.248,00	3.006,00	$ 370.363.248,00			-	$ -	3.006,00	$ 370.363.248,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,36%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	ESTRUCTURA							0,00						
3,01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1783	$ 135.807,00	$ 176.549,00	$ 314.786.867,00	1.783,00	$ 314.786.867,00	166,00	$ 29.307.134,00	166,00	$ 29.307.134,00	1.617,00	$ 285.479.733,00
3,02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	4891	$ 98.184,00	$ 127.839,00	$ 624.282.349,00	4.891,00	$ 624.282.349,00			-	$ -	4.891,00	$ 624.282.349,00
3,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.	ML	733	$ 129.676,00	$ 168.579,00	$ 123.568.407,00	733,00	$ 123.568.407,00			-	$ -	733,00	$ 123.568.407,00
3,04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0,30 - 0,50) X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2261	$ 134.980,00	$ 175.474,00	$ 396.746.714,00	2.261,00	$ 396.746.714,00			-	$ -	2.261,00	$ 396.746.714,00
3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	509	$ 1.344.202,00	$ 1.747.463,00	$ 889.458.667,00	509,00	$ 889.458.667,00			-	$ -	509,00	$ 889.458.667,00
3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	28970	$ 7.904,00	$ 10.275,00	$ 297.666.750,00	28.970,00	$ 297.666.750,00	2.360,25	$ 24.251.568,75	2.360,25	$ 24.251.568,75	26.909,75	$ 273.415.181,25
3,07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	$ 820.132,00	$ 1.066.172,00	$ 1.066.172,00	16,00	$ 17.058.752,00	15,00	$ 15.992.580,00	15,00	$ 15.992.580,00	1,00	$ 1.066.172,00
3,08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS.	ML	1	$ 118.219,00	$ 153.685,00	$ 153.685,00	1,00	$ 153.685,00			-	$ -	1,00	$ 153.685,00
3,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	25100	$ 23.190,00	$ 30.147,00	$ 756.689.700,00	25.100,00	$ 756.689.700,00			-	$ -	25.100,00	$ 756.689.700,00
3,1	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$ 990.628,00	$ 1.287.816,00	$ 1.287.816,00	1,00	$ 1.287.816,00			-	$ -	1,00	$ 1.287.816,00
3,11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 17.189,00	$ 22.348,00	$ 22.348,00	1,00	$ 22.348,00			-	$ -	1,00	$ 22.348,00
3,12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	13827	$ 15.441,00	$ 20.073,00	$ 277.549.371,00	13.827,00	$ 277.549.371,00			-	$ -	13.827,00	$ 277.549.371,00
3,13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 14.922,00	$ 19.399,00	$ 19.399,00	1,00	$ 19.399,00			-	$ -	1,00	$ 19.399,00
3,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	1	$ 1.502.084,00	$ 1.952.709,00	$ 1.952.709,00	1,00	$ 1.952.709,00			-	$ -	1,00	$ 1.952.709,00
3,15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	$ 76.746,00	$ 99.770,00	$ 99.770,00	1,00	$ 99.770,00			-	$ -	1,00	$ 99.770,00
3,16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2	155	$ 67.355,00	$ 87.562,00	$ 13.572.110,00	155,00	$ 13.572.110,00	64,00	$ 5.603.968,00	64,00	$ 5.603.968,00	91,00	$ 7.968.142,00
3,17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3". INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	$ 194.493,00	$ 252.841,00	$ 252.841,00	1,00	$ 252.841,00			-	$ -	1,00	$ 252.841,00
3,18	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 165.982,00	$ 215.777,00	$ 215.777,00	1,00	$ 215.777,00			-	$ -	1,00	$ 215.777,00
4	MAMPOSTERIA													
4,01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7743	$ 137.940,00	$ 179.322,00	$ 1.388.490.246,00	7.743,00	$ 1.388.490.246,00			-	$ -	7.743,00	$ 1.388.490.246,00
4,02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	7551	$ 166.782,00	$ 215.617,00	$ 1.627.388.867,00	7.551,00	$ 1.627.388.867,00			-	$ -	7.551,00	$ 1.627.388.867,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	1307	$ 253.166,00	$ 329.115,00	$ 430.153.305,00	1.307,00	$ 430.153.305,00	88,90	$ 29.258.323,50	88,90	$ 29.258.323,50	1.218,10	$ 400.894.981,50
4,04	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1307	$ 74.731,00	$ 97.150,00	$ 126.975.050,00	1.307,00	$ 126.975.050,00			-	$ -	1.307,00	$ 126.975.050,00
4,05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1307	$ 27.645,00	$ 35.939,00	$ 46.972.273,00	1.307,00	$ 46.972.273,00			-	$ -	1.307,00	$ 46.972.273,00
4,06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	985	$ 18.198,00	$ 23.657,00	$ 23.302.145,00	985,00	$ 23.302.145,00			-	$ -	985,00	$ 23.302.145,00
4,07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE. INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	$ 890.342,00	$ 1.157.445,00	$ 254.637.900,00	220,00	$ 254.637.900,00			-	$ -	220,00	$ 254.637.900,00
4,08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0,05 MTS, ANCHO DE 0,60 MTS, VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO.	ML	1	$ 161.583,00	$ 210.058,00	$ 210.058,00	1,00	$ 210.058,00			-	$ -	1,00	$ 210.058,00
4,09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 192.290,00	$ 249.977,00	$ 249.977,00	1,00	$ 249.977,00			-	$ -	1,00	$ 249.977,00
4,1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 212.358,00	$ 276.065,00	$ 276.065,00	1,00	$ 276.065,00			-	$ -	1,00	$ 276.065,00
4,11	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML	2837	$ 35.900,00	$ 46.670,00	$ 132.402.790,00	2.837,00	$ 132.402.790,00			-	$ -	2.837,00	$ 132.402.790,00
4,12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 METROS	M2	1	$ 45.258,00	$ 58.835,00	$ 58.835,00	1,00	$ 58.835,00			-	$ -	1,00	$ 58.835,00
4,13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	$ 235.009,00	$ 305.512,00	$ 305.512,00	1,00	$ 305.512,00			-	$ -	1,00	$ 305.512,00
4,14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	$ 97.489,00	$ 126.736,00	$ 126.736,00	1,00	$ 126.736,00			-	$ -	1,00	$ 126.736,00
4,15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 MTS.	M2	1	$ 65.082,00	$ 84.581,00	$ 84.581,00	1,00	$ 84.581,00			-	$ -	1,00	$ 84.581,00
4,16	CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	47	$ 1.008.038,00	$ 1.307.849,00	$ 61.488.903,00	47,00	$ 61.488.903,00			-	$ -	47,00	$ 61.488.903,00
4,17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.122,00	$ 70.359,00	$ 70.359,00	1,00	$ 70.359,00			-	$ -	1,00	$ 70.359,00
4,18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 21.300,00	$ 27.690,00	$ 27.690,00	1,00	$ 27.690,00			-	$ -	1,00	$ 27.690,00
5	**ACABADOS**													
5,01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DETALLES	M2	1537	$ 22.257,00	$ 28.934,00	$ 44.471.558,00	1.537,00	$ 44.471.558,00			-	$ -	1.537,00	$ 44.471.558,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.388.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.388.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	**5,38%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUYE AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5,02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	1	$ 4.011,00	$ 5.214,00	$ 5.214,00	1,00	$ 5.214,00			-	$ -	1,00	$ 5.214,00
5,03	PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1035	$ 46.012,00	$ 59.816,00	$ 61.909.560,00	1.035,00	$ 61.909.560,00			-	$ -	1.035,00	$ 61.909.560,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0,55 X 0,55 MTS O SIMILAR.	M2	1	$ 98.433,00	$ 127.963,00	$ 127.963,00	1,00	$ 127.963,00			-	$ -	1,00	$ 127.963,00
5,05	ZÓCALO EN CERAMICA.	ML	1	$ 27.851,00	$ 36.206,00	$ 36.206,00	1,00	$ 36.206,00			-	$ -	1,00	$ 36.206,00
5,06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	$ 78.632,00	$ 102.222,00	$ 102.222,00	1,00	$ 102.222,00			-	$ -	1,00	$ 102.222,00
5,07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	1	$ 126.986,00	$ 165.082,00	$ 165.082,00	1,00	$ 165.082,00			-	$ -	1,00	$ 165.082,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL)	M2	1	$ 111.560,00	$ 145.028,00	$ 145.028,00	1,00	$ 145.028,00			-	$ -	1,00	$ 145.028,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1CM+SBR 1CM)DE 2CM DE ESPESOR	M2	1662	$ 291.368,00	$ 378.765,00	$ 629.507.430,00	1.662,00	$ 629.507.430,00			-	$ -	1.662,00	$ 629.507.430,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	2650	$ 125.454,00	$ 163.090,00	$ 432.188.500,00	2.650,00	$ 432.188.500,00			-	$ -	2.650,00	$ 432.188.500,00
5,11	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO–20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	$ 108.215,00	$ 140.680,00	$ 140.680,00	1,00	$ 140.680,00			-	$ -	1,00	$ 140.680,00
5,12	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	2650	$ 74.461,00	$ 96.799,00	$ 256.517.350,00	2.650,00	$ 256.517.350,00			-	$ -	2.650,00	$ 256.517.350,00
5,13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2	1	$ 80.491,00	$ 104.638,00	$ 104.638,00	1,00	$ 104.638,00			-	$ -	1,00	$ 104.638,00
5,14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	$ 81.847,00	$ 106.401,00	$ 106.401,00	1,00	$ 106.401,00			-	$ -	1,00	$ 106.401,00
5,15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00			-	$ -	1,00	$ 12.315,00
6	**EQUIPAMIENTO**													
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	228	$ 951.892,00	$ 1.238.303,00	$ 281.877.084,00	228,00	$ 281.877.084,00			-	$ -	228,00	$ 281.877.084,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	$ 387.741,00	$ 504.063,00	$ 504.063,00	1,00	$ 504.063,00			-	$ -	1,00	$ 504.063,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	319	$ 727.499,00	$ 945.749,00	$ 301.693.931,00	319,00	$ 301.693.931,00			-	$ -	319,00	$ 301.693.931,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT	M2	1404	$ 251.834,00	$ 327.384,00	$ 459.647.136,00	1.404,00	$ 459.647.136,00			-	$ -	1.404,00	$ 459.647.136,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT	M2	1375	$ 313.748,00	$ 407.872,00	$ 560.824.000,00	1.375,00	$ 560.824.000,00			-	$ -	1.375,00	$ 560.824.000,00
6,06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	6	$ 1.316.183,00	$ 1.711.038,00	$ 10.266.228,00	6,00	$ 10.266.228,00			-	$ -	6,00	$ 10.266.228,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.368.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.368.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	18 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	4	$ 2.361.138,00	$ 3.069.479,00	$ 12.277.916,00	4,00	$ 12.277.916,00			-	$ -	4,00	$ 12.277.916,00
6,08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	1	$ 6.418.694,00	$ 8.344.302,00	$ 8.344.302,00	1,00	$ 8.344.302,00			-	$ -	1,00	$ 8.344.302,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	$ 809.840,00	$ 1.052.792,00	$ 1.052.792,00	1,00	$ 1.052.792,00			-	$ -	1,00	$ 1.052.792,00
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	UN	1	$ 3.382.893,00	$ 4.397.761,00	$ 4.397.761,00	1,00	$ 4.397.761,00			-	$ -	1,00	$ 4.397.761,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	9	$ 4.557.396,00	$ 5.924.615,00	$ 53.321.535,00	9,00	$ 53.321.535,00			-	$ -	9,00	$ 53.321.535,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	$ 5.216.939,00	$ 6.782.021,00	$ 122.076.378,00	18,00	$ 122.076.378,00			-	$ -	18,00	$ 122.076.378,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	36	$ 4.775.997,00	$ 6.208.276,00	$ 223.497.936,00	36,00	$ 223.497.936,00			-	$ -	36,00	$ 223.497.936,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	34	$ 4.443.648,00	$ 5.776.742,00	$ 196.409.228,00	34,00	$ 196.409.228,00			-	$ -	34,00	$ 196.409.228,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	90	$ 978.332,00	$ 1.271.832,00	$ 114.464.880,00	90,00	$ 114.464.880,00			-	$ -	90,00	$ 114.464.880,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.817.476,00	$ 2.362.719,00	$ 2.362.719,00	1,00	$ 2.362.719,00			-	$ -	1,00	$ 2.362.719,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.196.021,00	$ 1.554.827,00	$ 1.554.827,00	1,00	$ 1.554.827,00			-	$ -	1,00	$ 1.554.827,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.630.832,00	$ 7.320.082,00	$ 7.320.082,00	1,00	$ 7.320.082,00			-	$ -	1,00	$ 7.320.082,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.594.079,00	$ 7.272.303,00	$ 7.272.303,00	1,00	$ 7.272.303,00			-	$ -	1,00	$ 7.272.303,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC)	UN	9	$ 4.100.867,00	$ 5.330.867,00	$ 47.977.803,00	9,00	$ 47.977.803,00			-	$ -	9,00	$ 47.977.803,00
7	**JUEGOS INFANTILES**						0,00	0,00						
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	446	$ 263.809,00	$ 342.692,00	$ 152.840.632,00	446,00	$ 152.840.632,00			-	$ -	446,00	$ 152.840.632,00
7,02	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	$ 12.805.435,00	$ 16.647.066,00	$ 16.647.066,00	1,00	$ 16.647.066,00			-	$ -	1,00	$ 16.647.066,00
7,03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9	UN	1	$ 134.714.969,00	$ 175.129.460,00	$ 175.129.460,00	1,00	$ 175.129.460,00			-	$ -	1,00	$ 175.129.460,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS.	UN	6	$ 98.632.736,00	$ 128.222.557,00	$ 769.335.342,00	6,00	$ 769.335.342,00			-	$ -	6,00	$ 769.335.342,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	1	$ 9.779.032,00	$ 12.712.742,00	$ 12.712.742,00	1,00	$ 12.712.742,00			-	$ -	1,00	$ 12.712.742,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	$ 7.497.913,00	$ 9.747.287,00	$ 9.747.287,00	1,00	$ 9.747.287,00			-	$ -	1,00	$ 9.747.287,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	$ 10.002.916,00	$ 13.003.791,00	$ 13.003.791,00	1,00	$ 13.003.791,00			-	$ -	1,00	$ 13.003.791,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.398.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.398.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 15 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	4	$ 11.370.976,00	$ 14.782.269,00	$ 59.129.076,00	4,00	$ 59.129.076,00			-	$ -	4,00	$ 59.129.076,00
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	7	$ 32.900.898,00	$ 42.771.167,00	$ 299.398.169,00	7,00	$ 299.398.169,00			-	$ -	7,00	$ 299.398.169,00
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	$ 4.152.787,00	$ 5.398.623,00	$ 5.398.623,00	1,00	$ 5.398.623,00			-	$ -	1,00	$ 5.398.623,00
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	1	$ 45.462.148,00	$ 59.100.792,00	$ 59.100.792,00	1,00	$ 59.100.792,00			-	$ -	1,00	$ 59.100.792,00
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	$ 90.421.405,00	$ 117.547.827,00	$ 117.547.827,00	1,00	$ 117.547.827,00			-	$ -	1,00	$ 117.547.827,00
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	4	$ 12.809.586,00	$ 16.652.464,00	$ 66.609.856,00	4,00	$ 66.609.856,00			-	$ -	4,00	$ 66.609.856,00
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	$ 83.815.414,00	$ 108.960.038,00	$ 108.960.038,00	1,00	$ 108.960.038,00			-	$ -	1,00	$ 108.960.038,00
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	4	$ 19.359.840,00	$ 25.167.532,00	$ 100.670.128,00	4,00	$ 100.670.128,00			-	$ -	4,00	$ 100.670.128,00
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	2	$ 7.942.168,00	$ 10.324.818,00	$ 20.649.636,00	2,00	$ 20.649.636,00			-	$ -	2,00	$ 20.649.636,00
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	1	$ 68.435.358,00	$ 88.965.965,00	$ 88.965.965,00	1,00	$ 88.965.965,00			-	$ -	1,00	$ 88.965.965,00
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	$ 94.106.739,00	$ 122.338.761,00	$ 122.338.761,00	1,00	$ 122.338.761,00			-	$ -	1,00	$ 122.338.761,00
8	**GYM BIOSALUDABLE**													
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	$ 9.353.050,00	$ 12.158.965,00	$ 12.158.965,00	1,00	$ 12.158.965,00			-	$ -	1,00	$ 12.158.965,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	$ 10.140.021,00	$ 13.182.027,00	$ 13.182.027,00	1,00	$ 13.182.027,00			-	$ -	1,00	$ 13.182.027,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	$ 10.065.989,00	$ 13.085.786,00	$ 13.085.786,00	1,00	$ 13.085.786,00			-	$ -	1,00	$ 13.085.786,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	$ 11.269.605,00	$ 14.650.357,00	$ 14.650.357,00	1,00	$ 14.650.357,00			-	$ -	1,00	$ 14.650.357,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	$ 9.458.501,00	$ 12.296.051,00	$ 12.296.051,00	1,00	$ 12.296.051,00			-	$ -	1,00	$ 12.296.051,00
8,06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	$ 4.604.388,00	$ 5.985.704,00	$ 5.985.704,00	1,00	$ 5.985.704,00			-	$ -	1,00	$ 5.985.704,00
8,07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	$ 4.069.083,00	$ 5.289.808,00	$ 5.289.808,00	1,00	$ 5.289.808,00			-	$ -	1,00	$ 5.289.808,00
8,08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA	UN	1	$ 7.509.143,00	$ 9.761.886,00	$ 9.761.886,00	1,00	$ 9.761.886,00			-	$ -	1,00	$ 9.761.886,00
8,09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	$ 7.625.453,00	$ 9.913.089,00	$ 9.913.089,00	1,00	$ 9.913.089,00			-	$ -	1,00	$ 9.913.089,00
8,1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	$ 2.878.857,00	$ 3.742.514,00	$ 3.742.514,00	1,00	$ 3.742.514,00			-	$ -	1,00	$ 3.742.514,00
8,11	GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).	UN	11	$ 5.118.495,00	$ 6.654.044,00	$ 73.194.484,00	11,00	$ 73.194.484,00			-	$ -	11,00	$ 73.194.484,00
8,12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	9	$ 5.575.998,00	$ 7.248.797,00	$ 65.239.173,00	9,00	$ 65.239.173,00			-	$ -	9,00	$ 65.239.173,00
8,13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO)	UN	8	$ 3.721.891,00	$ 4.838.198,00	$ 38.705.584,00	8,00	$ 38.705.584,00			-	$ -	8,00	$ 38.705.584,00
8,14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	8	$ 5.551.492,00	$ 7.216.940,00	$ 57.735.520,00	8,00	$ 57.735.520,00			-	$ -	8,00	$ 57.735.520,00
8,15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	9	$ 5.573.678,00	$ 7.245.661,00	$ 65.210.859,00	9,00	$ 65.210.859,00			-	$ -	9,00	$ 65.210.859,00
8,16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	3	$ 5.548.712,09	$ 7.210.726,00	$ 21.632.178,00	3,00	$ 21.632.178,00			-	$ -	3,00	$ 21.632.178,00

CONTRATO No:	LP-051-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.388.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.388.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL	UN	3	$ 5.048.075,00	$ 6.562.498,00	$ 19.687.494,00	3,00	$ 19.687.494,00			-	$ -	3,00	$ 19.687.494,00
8,18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	2	$ 3.799.413,00	$ 4.939.237,00	$ 9.878.474,00	2,00	$ 9.878.474,00			-	$ -	2,00	$ 9.878.474,00
8,19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	2	$ 4.117.088,00	$ 5.352.214,00	$ 10.704.428,00	2,00	$ 10.704.428,00			-	$ -	2,00	$ 10.704.428,00
8,2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA;CALISTENIA	UN	1	$ 38.172.865,00	$ 49.624.725,00	$ 49.624.725,00	1,00	$ 49.624.725,00			-	$ -	1,00	$ 49.624.725,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	1	$ 4.620.677,00	$ 6.006.880,00	$ 6.006.880,00	1,00	$ 6.006.880,00			-	$ -	1,00	$ 6.006.880,00
8,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	1	$ 4.577.884,00	$ 5.951.249,00	$ 5.951.249,00	1,00	$ 5.951.249,00			-	$ -	1,00	$ 5.951.249,00
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	4	$ 6.102.981,00	$ 7.933.875,00	$ 31.735.500,00	4,00	$ 31.735.500,00			-	$ -	4,00	$ 31.735.500,00
8,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	3	$ 4.408.843,00	$ 5.731.496,00	$ 17.194.488,00	3,00	$ 17.194.488,00			-	$ -	3,00	$ 17.194.488,00
8,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	3	$ 8.299.326,00	$ 10.785.224,00	$ 32.355.672,00	3,00	$ 32.355.672,00			-	$ -	3,00	$ 32.355.672,00
8,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	1	$ 34.702.717,00	$ 45.113.532,00	$ 45.113.532,00	1,00	$ 45.113.532,00			-	$ -	1,00	$ 45.113.532,00
8,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	1	$ 60.173.619,00	$ 78.225.705,00	$ 78.225.705,00	1,00	$ 78.225.705,00			-	$ -	1,00	$ 78.225.705,00
8,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	1	$ 48.302.775,00	$ 62.793.608,00	$ 62.793.608,00	1,00	$ 62.793.608,00			-	$ -	1,00	$ 62.793.608,00
9	**INSTALACIONES**													
9,01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	1	$ 141.044,00	$ 183.357,00	$ 183.357,00	1,00	$ 183.357,00			-	$ -	1,00	$ 183.357,00
9,02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	$ 110.324,00	$ 143.421,00	$ 143.421,00	1,00	$ 143.421,00			-	$ -	1,00	$ 143.421,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	$ 128.061,00	$ 166.479,00	$ 166.479,00	1,00	$ 166.479,00			-	$ -	1,00	$ 166.479,00
9,04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	1	$ 40.491,00	$ 52.638,00	$ 52.638,00	1,00	$ 52.638,00			-	$ -	1,00	$ 52.638,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	$ 31.506,00	$ 40.958,00	$ 40.958,00	1,00	$ 40.958,00			-	$ -	1,00	$ 40.958,00
9,06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UND	1	$ 50.752,00	$ 65.978,00	$ 65.978,00	1,00	$ 65.978,00			-	$ -	1,00	$ 65.978,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	$ 37.763,00	$ 49.092,00	$ 49.092,00	1,00	$ 49.092,00			-	$ -	1,00	$ 49.092,00
9,08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.339,00	$ 70.641,00	$ 70.641,00	1,00	$ 70.641,00			-	$ -	1,00	$ 70.641,00
9,09	PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2"	UND	1	$ 102.301,00	$ 132.991,00	$ 132.991,00	1,00	$ 132.991,00			-	$ -	1,00	$ 132.991,00
9,1	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4"	UND	1	$ 151.884,00	$ 197.449,00	$ 197.449,00	1,00	$ 197.449,00			-	$ -	1,00	$ 197.449,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC = 2"	ML	1	$ 47.267,00	$ 61.447,00	$ 61.447,00	1,00	$ 61.447,00			-	$ -	1,00	$ 61.447,00
9,12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND	1	$ 856.854,00	$ 1.113.910,00	$ 1.113.910,00	1,00	$ 1.113.910,00			-	$ -	1,00	$ 1.113.910,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUICER O SIMILAR	UND	1	$ 329.700,00	$ 428.610,00	$ 428.610,00	1,00	$ 428.610,00			-	$ -	1,00	$ 428.610,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 792.979,00	$ 1.030.873,00	$ 1.030.873,00	1,00	$ 1.030.873,00			-	$ -	1,00	$ 1.030.873,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UND	1	$ 557.928,00	$ 725.306,00	$ 725.306,00	1,00	$ 725.306,00			-	$ -	1,00	$ 725.306,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 979.233,00	$ 1.273.003,00	$ 1.273.003,00	1,00	$ 1.273.003,00			-	$ -	1,00	$ 1.273.003,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACION:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	$ 33.396,00	$ 43.415,00	$ 43.415,00	1,00	$ 43.415,00			-	$ -	1,00	$ 43.415,00
9,18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC	UND	1	$ 103.185,00	$ 134.141,00	$ 134.141,00	1,00	$ 134.141,00			-	$ -	1,00	$ 134.141,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UND	1	$ 516.417,00	$ 671.342,00	$ 671.342,00	1,00	$ 671.342,00			-	$ -	1,00	$ 671.342,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND	1	$ 13.785,00	$ 17.921,00	$ 17.921,00	1,00	$ 17.921,00			-	$ -	1,00	$ 17.921,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 90.133,00	$ 117.173,00	$ 117.173,00	1,00	$ 117.173,00			-	$ -	1,00	$ 117.173,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 14.516,00	$ 18.871,00	$ 18.871,00	1,00	$ 18.871,00			-	$ -	1,00	$ 18.871,00
9,23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML	1	$ 34.473,00	$ 44.815,00	$ 44.815,00	1,00	$ 44.815,00			-	$ -	1,00	$ 44.815,00
9,24	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	$ 6.174,00	$ 8.026,00	$ 8.026,00	1,00	$ 8.026,00			-	$ -	1,00	$ 8.026,00
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00			-	$ -	1,00	$ 192.386,00
9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00			-	$ -	1,00	$ 192.386,00
9,27	PUESTA A TIERRA	VARILLA COOPER WELL	UND	1	$ 595.744,00	$ 774.467,00	$ 774.467,00	1,00	$ 774.467,00			-	$ -	1,00	$ 774.467,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00			-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	61	$ 81.738,00	$ 106.259,00	$ 6.481.799,00	61,00	$ 6.481.799,00			-	$ -	61,00	$ 6.481.799,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	$ 47.585,00	$ 61.861,00	$ 61.861,00	1,00	$ 61.861,00			-	$ -	1,00	$ 61.861,00
10	OTROS													
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	1	$ 3.285.568,00	$ 4.271.238,00	$ 4.271.238,00	1,00	$ 4.271.238,00			-	$ -	1,00	$ 4.271.238,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL , PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	60	$ 349.528,00	$ 454.386,00	$ 27.263.160,00	60,00	$ 27.263.160,00			-	$ -	60,00	$ 27.263.160,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LABAÑILERÍA MICROPERFORADA	M2	1	$ 170.007,00	$ 221.009,00	$ 221.009,00	1,00	$ 221.009,00			-	$ -	1,00	$ 221.009,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 176.784,00	$ 229.819,00	$ 229.819,00	1,00	$ 229.819,00			-	$ -	1,00	$ 229.819,00
10,05	PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	GL	1	$ 448.515.000,00	$ 583.069.500,00	$ 583.069.500,00	1,00	$ 583.069.500,00			-	$ -	1,00	$ 583.069.500,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.840.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 96.720,00	$ 125.736,00	$ 125.736,00	1,00	$ 125.736,00			-	$ -	1,00	$ 125.736,00
10,07	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 107.481,00	$ 139.725,00	$ 139.725,00	1,00	$ 139.725,00			-	$ -	1,00	$ 139.725,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLEDE 60CMS FIJA	UND	1	$ 296.290,00	$ 385.177,00	$ 385.177,00	1,00	$ 385.177,00			-	$ -	1,00	$ 385.177,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE	UND	1	$ 642.543,00	$ 835.306,00	$ 835.306,00	1,00	$ 835.306,00			-	$ -	1,00	$ 835.306,00
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM	M2	1	$ 358.247,00	$ 465.721,00	$ 465.721,00	1,00	$ 465.721,00			-	$ -	1,00	$ 465.721,00
10,11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	$ 873.142,00	$ 1.135.085,00	$ 1.135.085,00	1,00	$ 1.135.085,00			-	$ -	1,00	$ 1.135.085,00
10,12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UND	1	$ 423.460,00	$ 550.498,00	$ 550.498,00	1,00	$ 550.498,00			-	$ -	1,00	$ 550.498,00
10,13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	$ 211.100,00	$ 274.430,00	$ 274.430,00	1,00	$ 274.430,00			-	$ -	1,00	$ 274.430,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1495	$ 103.464,00	$ 134.503,00	$ 201.216.488,00	1.496,00	$ 201.216.488,00	368,00	$ 49.497.104,00	368,00	$ 49.497.104,00	1.128,00	$ 151.719.384,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO 2025 - 16 DE JUNIO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,38%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,38%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00			-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
10,16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600.	M2	1	$ 9.314,00	$ 12.108,00	$ 12.108,00	1,00	$ 12.108,00			-	$ -	1,00	$ 12.108,00
10,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	3820	$ 144.056,00	$ 187.273,00	$ 715.382.860,00	3.820,00	$ 715.382.860,00			-	$ -	3.820,00	$ 715.382.860,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	1	$ 381.325,00	$ 495.723,00	$ 495.723,00	1,00	$ 495.723,00			-	$ -	1,00	$ 495.723,00
10,19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	$ 24.751.519,00	$ 32.176.975,00	$ 32.176.975,00	1,00	$ 32.176.975,00			-	$ -	1,00	$ 32.176.975,00
	COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 23.206.163.871,00**		**$ 23.206.163.871,00**		**$ 1.256.794.741,93**		**$ 1.256.794.741,93**		**$ 21.949.369.129,07**
	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III					$ 135.000.000,00		$ 135.000.000,00		$ -		$ -		$ 135.000.000,00
	IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III					$ 25.650.000,00		$ 25.650.000,00		$ -		$ -		$ 25.650.000,00
	TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III					**$ 160.650.000,00**		**$ 160.650.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 160.650.000,00**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 23.366.813.871,00**		**$ 23.366.813.871,00**		**$ 1.256.794.741,93**		**$ 1.256.794.741,93**		**$ 22.110.019.129,07**

NOTA:

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoría revisiones efectuadas por parte

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 27 días del mes de junio de 2025.

OSCAR MAYA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

DIEGO RADA ALTAHONA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

CIRO LARA ORDOÑEZ
ASESOR DE DESPACHO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA MODIFICATIVA No. 01
CONTRATO N°LP-031-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.671,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.671,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE JUNIO 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS ADICIONALES			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES																
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3015	$ 80.956,00	$ 104.853,00	$ 316.131.795,00			$ -			$ -			$ -	3.015,00	$ 316.131.795,00
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	$ 23.509,00	$ 30.562,00	$ 30.562,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 30.562,00
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO .	M2	40823	$ 2.908,00	$ 3.780,00	$ 154.307.160,00	+	14178,00	$ 53.592.840,00			$ -			$ -	55.000,00	$ 207.900.000,00
1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES.	ML	312	$ 34.329,00	$ 44.628,00	$ 13.923.936,00			$ -			$ -			$ -	312,00	$ 13.923.936,00
1.05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	314	$ 82.935,20	$ 107.816,00	$ 33.854.224,00			$ -			$ -			$ -	314,00	$ 33.854.224,00
1.06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	140	$ 40.371,00	$ 52.482,00	$ 7.347.480,00			$ -			$ -			$ -	140,00	$ 7.347.480,00
1.07	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	$ 89.604,00	$ 116.485,00	$ 116.485,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 116.485,00
1.08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 25.119,00	$ 32.655,00	$ 32.655,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 32.655,00
1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1584	$ 59.276,00	$ 77.059,00	$ 122.061.456,00			$ -			$ -			$ -	1.584,00	$ 122.061.456,00
1.1	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	8	$ 204.745,00	$ 266.169,00	$ 2.129.352,00			$ -			$ -			$ -	8,00	$ 2.129.352,00
1.11	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1491	$ 55.167,00	$ 71.717,00	$ 106.930.947,00			$ -			$ -			$ -	1.491,00	$ 106.930.947,00
1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	429	$ 59.960,00	$ 74.048,00	$ 31.766.592,00	+	4.871,00	$ 360.687.808,00			$ -			$ -	5.300,00	$ 392.454.400,00
1.13	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	5	$ 28.844,00	$ 37.497,00	$ 187.485,00			$ -			$ -			$ -	5,00	$ 187.485,00
1.14	DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 51.007,00	$ 66.309,00	$ 66.309,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 66.309,00
1.15	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3431	$ 12.148,00	$ 15.792,00	$ 54.182.352,00			$ -			$ -			$ -	3.431,00	$ 54.182.352,00
1.16	DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1	$ 32.463,00	$ 42.202,00	$ 42.202,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 42.202,00
1.17	DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 18.823,00	$ 24.470,00	$ 24.470,00			$ -			$ -				1,00	$ 24.470,00
1.18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0.1 M	M2	4260	$ 46.276,00	$ 60.159,00	$ 256.277.340,00			$ -			$ -			$ -	4.260,00	$ 256.277.340,00
1.19	DEMOLICION DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 12.315,00
1.2	DEMOLICION DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	ML	1	$ 26.199,00	$ 34.059,00	$ 34.059,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 34.059,00
1.21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	$ 13.909,00	$ 18.082,00	$ 18.082,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 18.082,00

1.22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 39.905,00	$ 77.674,00	$ 77.674,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 77.674,00
1.23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICION FINAL	M2	8930	$ 14.324,00	$ 18.621,00	$ 73.180.530,00			$ -			$ -			$ -	3.930,00	$ 73.150.530,00
1.24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	$ 20.660,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 26.858,00
1.25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1	$ 23.833,00	$ 30.983,00	$ 30.983,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 30.983,00
1.26	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 39.900,00
1.27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 39.900,00
1.28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	$ 467.449,00	$ 633.684,00	$ 633.684,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 633.684,00
1.29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL	M2	60	$ 21.476,00	$ 27.919,00	$ 1.675.140,00			$ -			$ -			$ -	60,00	$ 1.675.140,00
1.3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	$ 16.991,00	$ 22.088,00	$ 22.088,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 22.088,00
1.31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 40.329,00
1.32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	$ 17.860,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00			$ -			$ -				1,00	$ 23.218,00
1.33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	9	$ 45.560,00	$ 59.228,00	$ 533.052,00			$ -			$ -			$ -	9,00	$ 533.052,00
1.34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10	$ 67.453,00	$ 87.689,00	$ 876.890,00			$ -			$ -			$ -	10,00	$ 876.890,00
1.35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 55.806,00	$ 72.795,00	$ 72.795,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 72.795,00
1.36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1200	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 48.394.800,00			$ -			$ -			$ -	1.200,00	$ 48.394.800,00
1.37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400	$ 12.224,00	$ 15.891,00	$ 22.247.400,00			$ -			$ -			$ -	1.400,00	$ 22.247.400,00
1.38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	31.022,00	40329,00	$ 40.329,00			$ -			$ -				1,00	$ 40.329,00
1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MAQUINA Y ADECUACION CON COMPACTACION DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	36982	$ 15.524,00	$ 20.181,00	$ 746.333.742,00			$ -			$ -			$ -	36.982,00	$ 746.333.742,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**								$ -								
2.01	EXCAVACION A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12596	$ 61.354,00	$ 79.760,00	$ 1.004.656.960,00			$ -			$ -			$ -	12.596,00	$ 1.004.656.960,00
2.02	EXCAVACION DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1783	$ 11.634,00	$ 15.124,00	$ 26.966.092,00			$ -			$ -			$ -	1.783,00	$ 26.966.092,00
2.03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	10247	$ 54.106,00	$ 70.338,00	$ 720.753.486,00			$ -			$ -			$ -	10.247,00	$ 720.753.486,00
2.04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	$ 26.952,00	$ 35.038,00	$ 35.038,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 35.038,00
2.05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	$ 132.041,00	$ 171.653,00	$ 171.653,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 171.653,00
2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	17519	$ 110.331,00	$ 143.430,00	$ 2.512.750.170,00	-	-3313,80	$ (475.297.816,00)			$ -			$ -	14.200,20	$ 2.037.452.354,50
2.07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	50	$ 219.559,00	$ 285.427,00	$ 14.271.350,00			$ -			$ -				50,00	$ 14.271.350,00
2.08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	$ 198.048,00	$ 258.762,00	$ 258.762,00			$ -	+	174,00	$ 45.024.588,00			$ -	175,00	$ 45.283.350,00
2.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACION)	M3	1	$ 105.971,00	$ 137.792,00	$ 137.792,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 137.792,00
2.1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	1267	$ 210.231,00	$ 273.300,00	$ 351.737.100,00			$ -			$ -			$ -	1.267,00	$ 351.737.100,00
2.11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS)	M3	8006	$ 94.775,00	$ 123.208,00	$ 370.383.248,00			$ -			$ -			$ -	3.006,00	$ 370.383.248,00
3	**ESTRUCTURA**																**0,00**
3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30 X 0.90 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1783	$ 135.607,00	$ 176.549,00	$ 314.786.867,00			$ -			$ -			$ -	1.783,00	$ 314.786.867,00
3.02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8" ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	4891	$ 98.184,00	$ 127.839,00	$ 624.282.349,00			$ -			$ -			$ -	4.891,00	$ 624.282.349,00

3.03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.25 X 0.30 MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2". ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS.	ML	733	$	129.678,00	$	168.579,00	$	123.568.407,00			$	-			$	-			$	-	733,00	$	123.568.407,00
3.04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE (0.30 - 0.30) X (0.80 - 0.50) METROS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2261	$	134.860,00	$	175.474,00	$	396.748.714,00			$	-			$	-			$	-	2.261,00	$	396.748.714,00
3.05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO. INCLUYE FORMALETERIA.	M3	509	$	1.344.202,00	$	1.747.463,00	$	889.458.667,00			$	-			$	-			$	-	509,00	$	889.458.667,00
3.06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	28970	$	7.904,00	$	10.275,00	$	297.686.750,00			$	-			$	-			$	-	28.970,00	$	297.686.750,00
3.07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	$	820.132,00	$	1.066.172,00	$	1.066.172,00			$	-	+	15,00	$	15.992.580,00					16,00	$	17.058.752,00
3.08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS.	ML	1	$	118.219,00	$	153.685,00	$	153.685,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	153.685,00
3.09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	25100	$	23.190,00	$	30.147,00	$	756.689.700,00			$	-			$	-			$	-	25.100,00	$	756.689.700,00
3.1	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$	990.629,00	$	1.287.816,00	$	1.287.816,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	1.287.816,00
3.11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8". INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$	17.188,00	$	22.346,00	$	22.346,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	22.346,00
3.12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	13827	$	15.441,00	$	20.073,00	$	277.549.371,00			$	-			$	-			$	-	13.827,00	$	277.549.371,00
3.13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8". INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$	14.922,00	$	19.399,00	$	19.399,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	19.399,00
3.14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO. INCLUYE FORMALETERIA	M3	1	$	1.502.084,00	$	1.952.709,00	$	1.952.709,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	1.952.709,00
3.15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS. INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8". ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	$	76.746,00	$	99.770,00	$	99.770,00			$	-			$	-					1,00	$	99.770,00
3.16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.05	M2	155	$	67.355,00	$	87.562,00	$	13.572.110,00			$	-			$	-			$	-	155,00	$	13.572.110,00
3.17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3". INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	$	194.493,00	$	252.841,00	$	252.841,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	252.841,00
3.18	PAVIMENTO RIGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS. JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1	$	166.982,00	$	215.777,00	$	215.777,00			$	-			$	-			$	-	1,00	$	215.777,00
4	**MAMPOSTERIA**																							
4.01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7743	$	137.940,00	$	179.322,00	$	1.388.490.246,00			$	-			$	-			$	-	7.743,00	$	1.388.490.246,00
4.02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0.10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	7551	$	165.782,00	$	215.517,00	$	1.627.368.867,00			$	-			$	-			$	-	7.551,00	$	1.627.368.867,00
4.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI. REFUERZO CENTRAL DE 3 x 1/2" A CADA 2.00 METROS. MORTERO DE PEGA 1/4.	M2	1307	$	233.165,00	$	329.115,00	$	430.153.305,00			$	-			$	-			$	-	1.307,00	$	430.153.305,00
4.04	ALFARJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08. INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2". ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1307	$	74.731,00	$	97.150,00	$	126.975.050,00			$	-			$	-			$	-	1.307,00	$	126.975.050,00
4.05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1307	$	27.645,00	$	35.930,00	$	46.972.273,00			$	-			$	-			$	-	1.307,00	$	46.972.273,00
4.06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	985	$	18.198,00	$	23.657,00	$	23.302.145,00			$	-			$	-			$	-	985,00	$	23.302.145,00

4.07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE. INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	$ 690.342,00	$ 1.157.445,00	$ 254.637.900,00			$ -			$ -			$ -	220,00	$ 254.637.900,00
4.08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI. E= 0,06 MTS. ANCHO DE 0,60 MTS. VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO EN GRANITO PULIDO	ML	1	$ 161.563,00	$ 210.058,00	$ 210.058,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 210.058,00
4.09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROS NTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES. ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 192.290,00	$ 249.977,00	$ 249.977,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 249.977,00
4.1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROS NTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION. (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 212.358,00	$ 276.065,00	$ 276.065,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 276.065,00
4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGUN MEP.	ML	2837	$ 35.900,00	$ 46.670,00	$ 132.402.790,00			$ -			$ -			$ -	2.837,00	$ 132.402.790,00
4.12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PS. E=0.05 METROS	M2	1	$ 45.258,00	$ 58.835,00	$ 58.835,00			$ -			$ -				1,00	$ 58.835,00
4.13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT. CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI. MORTERO DE PEGA 1:4. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	$ 235.008,00	$ 305.512,00	$ 305.512,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 305.512,00
4.14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	$ 97.489,00	$ 126.736,00	$ 126.736,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 126.736,00
4.15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1/4 A H > 2 MTS.	M2	1	$ 65.062,00	$ 84.581,00	$ 84.581,00			$ -			$ -				1,00	$ 84.581,00
4.16	CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCION EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	47	$ 1.006.038,00	$ 1.307.849,00	$ 61.468.903,00			$ -			$ -			$ -	47,00	$ 61.468.903,00
4.17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.122,00	$ 70.359,00	$ 70.359,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 70.359,00
4.18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 21.300,00	$ 27.690,00	$ 27.690,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 27.690,00
5	**ACABADOS**																		
5.01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DETALLES	M2	1537	$ 22.257,00	$ 28.934,00	$ 44.471.558,00			$ -			$ -			$ -	1.537,00	$ 44.471.558,00
5.02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	1	$ 4.011,00	$ 5.214,00	$ 5.214,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 5.214,00
5.03	PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1035	$ 46.012,00	$ 59.816,00	$ 61.909.560,00			$ -			$ -			$ -	1.035,00	$ 61.909.560,00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0.55 X 0.55 MTS O SIMILAR.	M2	1	$ 98.433,00	$ 127.963,00	$ 127.963,00			$ -			$ -				1,00	$ 127.963,00
5.05	ZÓCALO EN CERAMICA.	ML	1	$ 27.851,00	$ 36.206,00	$ 36.206,00			$ -			$ -				1,00	$ 36.206,00
5.06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	$ 78.632,00	$ 102.222,00	$ 102.222,00			$ -			$ -				1,00	$ 102.222,00
5.07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	1	$ 126.986,00	$ 165.082,00	$ 165.082,00			$ -			$ -				1,00	$ 165.082,00
5.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL)	M2	1	$ 111.560,00	$ 145.028,00	$ 145.028,00			$ -			$ -				1,00	$ 145.028,00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN CAUCHO (TPV 3CM+SBR 3CM)DE 2CM DE ESPESOR	M2	1662	$ 291.358,00	$ 378.765,00	$ 629.937.430,00			$ -			$ -				1.662,00	$ 629.937.430,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA, HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC. CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	2650	$ 125.454,00	$ 163.090,00	$ 432.188.500,00			$ -			$ -				2.650,00	$ 432.188.500,00
5.11	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	$ 106.215,00	$ 140.680,00	$ 140.680,00			$ -			$ -				1,00	$ 140.680,00
5.12	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	2650	$ 74.461,00	$ 96.790,00	$ 256.517.350,00			$ -			$ -				2.650,00	$ 256.517.350,00
5.13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2	1	$ 80.491,00	$ 104.638,00	$ 104.638,00			$ -			$ -				1,00	$ 104.638,00
5.14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	$ 81.847,00	$ 106.401,00	$ 106.401,00			$ -			$ -				1,00	$ 106.401,00
5.15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.315,00
6	**EQUIPAMENTO**																		
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	228	$ 851.002,00	$ 1.258.303,00	$ 261.877.084,00			$ -			$ -				228,00	$ 261.877.084,00

6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS. ANCLAJE CADA 0.15 METROS. INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	$ 387.741,00	$ 504.063,00	$ 504.063,00			$ -			$ -				1,00	$ 504.063,00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAVIANOS. 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14. CON APOYOS EN PLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLD APLATEADO TIPO BUQUE. SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	919	$ 727.450,00	$ 945.749,00	$ 301.693.931,00			$ -			$ -				319,00	$ 301.693.931,00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2.40 MT	M2	1404	$ 251.834,00	$ 327.384,00	$ 459.647.136,00			$ -			$ -				1.404,00	$ 459.647.136,00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3.60 MT	M2	1375	$ 313.748,00	$ 407.872,00	$ 560.824.000,00			$ -			$ -				1.375,00	$ 560.824.000,00
6.06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	6	$ 1.316.183,00	$ 1.711.038,00	$ 10.266.228,00			$ -			$ -				6,00	$ 10.266.228,00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	4	$ 2.361.138,00	$ 3.069.479,00	$ 12.277.916,00			$ -			$ -				4,00	$ 12.277.916,00
6.08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FUTBOL Y BASQUETBOLL CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	1	$ 6.418.894,00	$ 8.344.302,00	$ 8.344.302,00			$ -			$ -				1,00	$ 8.344.302,00
6.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	$ 809.840,00	$ 1.052.792,00	$ 1.052.792,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.052.792,00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	UN	1	$ 3.382.893,00	$ 4.397.761,00	$ 4.397.761,00			$ -			$ -				1,00	$ 4.397.761,00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO. ACABADO MATE PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	9	$ 4.557.396,00	$ 5.924.615,00	$ 53.321.535,00			$ -			$ -				9,00	$ 53.321.535,00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	$ 5.216.938,00	$ 6.782.021,00	$ 122.076.378,00			$ -			$ -				18,00	$ 122.076.378,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT. BICOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	36	$ 4.775.997,00	$ 6.208.276,00	$ 223.497.936,00			$ -			$ -				36,00	$ 223.497.936,00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT. BICOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	34	$ 4.443.648,00	$ 5.776.742,00	$ 196.409.228,00			$ -			$ -				34,00	$ 196.409.228,00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	90	$ 978.332,00	$ 1.271.832,00	$ 114.464.880,00			$ -			$ -				90,00	$ 114.464.880,00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE ALIGERADA. PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI. CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.817.478,00	$ 2.362.719,00	$ 2.362.719,00			$ -			$ -				1,00	$ 2.362.719,00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE ALIGERADA. PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI. CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.196.021,00	$ 1.554.827,00	$ 1.554.827,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.554.827,00
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.630.832,00	$ 7.320.082,00	$ 7.320.082,00			$ -			$ -				1,00	$ 7.320.082,00
6.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.594.079,00	$ 7.272.303,00	$ 7.272.303,00			$ -			$ -				1,00	$ 7.272.303,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS. ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC)	UN	9	$ 4.100.667,00	$ 5.330.667,00	$ 47.977.803,00			$ -			$ -				9,00	$ 47.977.803,00
7	**JUEGOS INFANTILES**															-	$ -
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1.00 METRO. PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	446	$ 263.609,00	$ 342.692,00	$ 152.840.632,00			$ -			$ -				446,00	$ 152.840.632,00

7.02	JUEGOS INFANTILES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	$ 12.603.436,00	$ 16.647.068,00	$ 16.647.068,00			$ -			$ -				1,00	$ 16.647.068,00
7.03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.6X10X3.9	UN	1	$ 134.714.969,00	$ 175.129.460,00	$ 175.129.460,00			$ -			$ -				1,00	$ 175.129.460,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS	UN	6	$ 98.632.736,00	$ 128.222.557,00	$ 769.335.342,00			$ -			$ -				6,00	$ 769.335.342,00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	1	$ 9.779.032,00	$ 12.712.742,00	$ 12.712.742,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.712.742,00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	$ 7.497.913,00	$ 9.747.287,00	$ 9.747.287,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.747.287,00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	$ 10.002.916,00	$ 13.003.791,00	$ 13.003.791,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.003.791,00
7.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	4	$ 11.370.976,00	$ 14.782.269,00	$ 59.129.076,00			$ -			$ -				4,00	$ 59.129.076,00
7.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL, INCLUSIVO	UN	7	$ 32.900.898,00	$ 42.771.167,00	$ 299.398.169,00			$ -			$ -				7,00	$ 299.398.169,00
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	$ 4.152.787,00	$ 5.398.623,00	$ 5.398.623,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.398.623,00
7.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	1	$ 45.462.148,00	$ 59.100.792,00	$ 59.100.792,00			$ -			$ -				1,00	$ 59.100.792,00
7.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	$ 90.421.405,00	$ 117.547.827,00	$ 117.547.827,00			$ -			$ -				1,00	$ 117.547.827,00
7.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	4	$ 12.809.588,00	$ 16.652.464,00	$ 66.609.856,00			$ -			$ -				4,00	$ 66.609.856,00
7.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	$ 83.515.414,00	$ 108.960.038,00	$ 108.960.038,00			$ -			$ -				1,00	$ 108.960.038,00
7.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	4	$ 19.359.640,00	$ 25.167.532,00	$ 100.670.128,00			$ -			$ -				4,00	$ 100.670.128,00
7.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	2	$ 7.942.168,00	$ 10.324.818,00	$ 20.649.636,00			$ -			$ -				2,00	$ 20.649.636,00
7.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	1	$ 68.435.358,00	$ 88.965.965,00	$ 88.965.965,00			$ -			$ -				1,00	$ 88.965.965,00
7.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	$ 94.106.739,00	$ 122.338.761,00	$ 122.338.761,00			$ -			$ -				1,00	$ 122.338.761,00
8	**GYM BIOSALUDABLE**																	
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	$ 9.353.050,00	$ 12.158.965,00	$ 12.158.965,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.158.965,00
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	$ 10.140.021,00	$ 13.182.027,00	$ 13.182.027,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.182.027,00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	$ 10.065.989,00	$ 13.085.786,00	$ 13.085.786,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.085.786,00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	$ 11.269.505,00	$ 14.650.357,00	$ 14.650.357,00			$ -			$ -				1,00	$ 14.650.357,00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	$ 9.458.501,00	$ 12.296.051,00	$ 12.296.051,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.296.051,00
8.06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	$ 4.604.369,00	$ 5.985.704,00	$ 5.985.704,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.985.704,00
8.07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	$ 4.069.083,00	$ 5.289.808,00	$ 5.289.808,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.289.808,00
8.08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA	UN	1	$ 7.509.143,00	$ 9.761.886,00	$ 9.761.886,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.761.886,00
8.09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	$ 7.625.453,00	$ 9.913.089,00	$ 9.913.089,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.913.089,00
8.1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	$ 2.878.857,00	$ 3.742.514,00	$ 3.742.514,00			$ -			$ -				1,00	$ 3.742.514,00
8.11	GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).	UN	11	$ 5.118.496,00	$ 6.654.044,00	$ 73.194.484,00			$ -			$ -				11,00	$ 73.194.484,00
8.12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 14 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	9	$ 5.575.098,00	$ 7.248.797,00	$ 65.239.173,00			$ -			$ -				9,00	$ 65.239.173,00
8.13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	8	$ 3.721.691,00	$ 4.838.199,00	$ 38.705.584,00			$ -			$ -				8,00	$ 38.705.584,00
8.14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	8	$ 5.551.492,00	$ 7.216.940,00	$ 57.735.520,00			$ -			$ -				8,00	$ 57.735.520,00

8.15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTÁTICA.	UN	9	$ 5.573.978.00	$ 7.245.651,00	$ 65.210.859,00			$ -			$ -				9,00	$ 65.210.859,00
8.16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	3	$ 5.546.712,00	$ 7.210.726,00	$ 21.632.178,00			$ -			$ -				3,00	$ 21.632.178,00
8.17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA. POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO. EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	3	$ 5.048.075,00	$ 6.562.498,00	$ 19.687.494,00			$ -			$ -				3,00	$ 19.687.494,00
8.18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	2	$ 3.799.413,00	$ 4.939.237,00	$ 9.878.474,00			$ -			$ -				2,00	$ 9.878.474,00
8.19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA. POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO. EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	2	$ 4.117.088,00	$ 5.352.214,00	$ 10.704.428,00			$ -			$ -				2,00	$ 10.704.428,00
8.2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA/CALISTENIA.	UN	1	$ 38.172.865,00	$ 49.624.725,00	$ 49.624.725,00			$ -			$ -				1,00	$ 49.624.725,00
8.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	1	$ 4.620.677,00	$ 6.006.880,00	$ 6.006.880,00			$ -			$ -				1,00	$ 6.006.880,00
8.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	1	$ 4.577.884,00	$ 5.951.249,00	$ 5.951.249,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.951.249,00
8.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	4	$ 6.102.981,00	$ 7.933.875,00	$ 31.735.500,00			$ -			$ -				4,00	$ 31.735.500,00
8.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	3	$ 4.408.843,00	$ 5.731.496,00	$ 17.194.488,00			$ -			$ -				3,00	$ 17.194.488,00
8.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	3	$ 8.295.328,00	$ 10.785.224,00	$ 32.355.672,00			$ -			$ -				3,00	$ 32.355.672,00
8.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	1	$ 34.702.717,00	$ 45.113.532,00	$ 45.113.532,00			$ -			$ -				1,00	$ 45.113.532,00
8.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	1	$ 60.173.619,00	$ 78.225.705,00	$ 78.225.705,00			$ -			$ -				1,00	$ 78.225.705,00
8.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	1	$ 48.302.776,00	$ 62.793.608,00	$ 62.793.608,00			$ -			$ -				1,00	$ 62.793.608,00
9	**INSTALACIONES**																	
9.01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERIA EMT	UN	1	$ 141.944,00	$ 183.357,00	$ 183.357,00			$ -			$ -				1,00	$ 183.357,00
9.02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	$ 110.324,00	$ 143.421,00	$ 143.421,00			$ -			$ -				1,00	$ 143.421,00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	$ 128.061,00	$ 166.479,00	$ 166.479,00			$ -			$ -				1,00	$ 166.479,00
9.04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	1	$ 40.491,00	$ 52.638,00	$ 52.638,00			$ -			$ -				1,00	$ 52.638,00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	$ 31.506,00	$ 40.958,00	$ 40.958,00			$ -			$ -				1,00	$ 40.958,00
9.06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UND	1	$ 50.752,00	$ 65.978,00	$ 65.978,00			$ -			$ -				1,00	$ 65.978,00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	$ 37.763,00	$ 49.092,00	$ 49.092,00			$ -			$ -				1,00	$ 49.092,00
9.08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.339,00	$ 70.641,00	$ 70.641,00			$ -			$ -				1,00	$ 70.641,00
9.09	PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2"	UND	1	$ 102.301,00	$ 132.991,00	$ 132.991,00			$ -			$ -				1,00	$ 132.991,00
9.1	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4"	UND	1	$ 151.884,00	$ 197.449,00	$ 197.449,00			$ -			$ -				1,00	$ 197.449,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC = 2"	ML	1	$ 47.267,00	$ 61.447,00	$ 61.447,00			$ -			$ -				1,00	$ 61.447,00
9.12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND	1	$ 856.854,00	$ 1.113.910,00	$ 1.113.910,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.113.910,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCERO SIMILAR	UND	1	$ 329.700,00	$ 428.610,00	$ 428.610,00			$ -			$ -				1,00	$ 428.610,00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 792.979,00	$ 1.030.873,00	$ 1.030.873,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.030.873,00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INTEGRAL, BLANCO. INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UND	1	$ 557.928,00	$ 725.306,00	$ 725.306,00			$ -			$ -				1,00	$ 725.306,00
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 979.233,00	$ 1.273.003,00	$ 1.273.003,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.273.003,00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	$ 33.396,00	$ 43.415,00	$ 43.415,00			$ -			$ -				1,00	$ 43.415,00
9.18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC	UND	1	$ 103.185,00	$ 134.141,00	$ 134.141,00			$ -			$ -				1,00	$ 134.141,00
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO BLANCO INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UND	1	$ 516.417,00	$ 671.342,00	$ 671.342,00			$ -			$ -				1,00	$ 671.342,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND	1	$ 13.785,00	$ 17.921,00	$ 17.921,00			$ -			$ -				1,00	$ 17.921,00

9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 90.133,00	$ 117.173,00	$ 117.173,00			$ -			$ -				1,00	$ 117.173,00
9.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 14.516,00	$ 18.871,00	$ 18.871,00			$ -			$ -				1,00	$ 18.871,00
9.23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML	1	$ 34.473,00	$ 44.815,00	$ 44.815,00			$ -			$ -				1,00	$ 44.815,00
9.24	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	$ 6.174,00	$ 8.026,00	$ 8.026,00			$ -			$ -				1,00	$ 8.026,00
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UND	1	$ 147.969,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00			$ -			$ -				1,00	$ 192.360,00
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110	UND	1	$ 147.969,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00			$ -			$ -				1,00	$ 192.360,00
9.27	PUESTA A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	UND	1	$ 595.744,00	$ 774.467,00	$ 774.467,00			$ -			$ -				1,00	$ 774.467,00
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.527.171,00
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	61	$ 81.738,00	$ 108.259,00	$ 6.481.799,00			$ -			$ -				61,00	$ 6.481.799,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	$ 47.585,00	$ 61.861,00	$ 61.861,00			$ -			$ -				1,00	$ 61.861,00
10	**OTROS**																	
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2.50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	1	$ 3.265.568,00	$ 4.271.238,00	$ 4.271.238,00			$ -			$ -				1,00	$ 4.271.238,00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PANAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL., PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS., RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	60	$ 349.526,00	$ 454.385,00	$ 27.263.160,00			$ -			$ -				60,00	$ 27.263.160,00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LABAÑERIA MICROPERFORADA	M2	1	$ 170.007,00	$ 221.009,00	$ 221.009,00			$ -			$ -				1,00	$ 221.009,00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 176.784,00	$ 229.819,00	$ 229.819,00			$ -			$ -				1,00	$ 229.819,00
10.05	PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	GL	1	$ 448.515.000,00	$ 583.069.500,00	$ 583.069.500,00			$ -			$ -				1,00	$ 583.069.500,00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.6X0.93 MT 2M UPVC. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 96.720,00	$ 125.736,00	$ 125.736,00			$ -			$ -				1,00	$ 125.736,00
10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 107.481,00	$ 139.725,00	$ 139.725,00			$ -			$ -				1,00	$ 139.725,00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE 60CMS P/A	UND	1	$ 296.290,00	$ 385.177,00	$ 385.177,00			$ -			$ -				1,00	$ 385.177,00
10.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE	UND	1	$ 642.943,00	$ 835.306,00	$ 835.306,00			$ -			$ -				1,00	$ 835.306,00
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 3 MM	M2	1	$ 358.247,00	$ 465.721,00	$ 465.721,00			$ -			$ -				1,00	$ 465.721,00
10.11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	$ 873.142,00	$ 1.135.085,00	$ 1.135.085,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.135.085,00
10.12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UND	1	$ 423.460,00	$ 550.498,00	$ 550.498,00			$ -			$ -				1,00	$ 550.498,00
10.13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	$ 211.100,00	$ 274.430,00	$ 274.430,00			$ -			$ -				1,00	$ 274.430,00

10,14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1496	$	103.464,00	$	134.503,00	$	201.216.488,00			$ -			$ -				1.496,00	$	201.216.488,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$	1.174.747,00	$	1.527.171,00	$	1.527.171,00			$ -			$ -				1,00	$	1.527.171,00
10,16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600.	M2	1	$	9.314,00	$	12.108,00	$	12.108,00			$ -			$ -				1,00	$	12.108,00
10,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	3820	$	144.056,00	$	187.273,00	$	715.382.860,00			$ -			$ -				3.820,00	$	715.382.860,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	1	$	381.325,00	$	495.723,00	$	495.723,00			$ -			$ -				1,00	$	495.723,00
10,19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	$	24.751.519,00	$	32.176.975,00	$	32.176.975,00			$ -			$ -				1,00	$	32.176.975,00
							COSTO TOTAL DE OBRA	$	23.206.163.871,00			$ (475.297.816,00)			$ 475.297.816,00			$ -		$	23.206.163.871,00
							AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$	135.000.000,00										$	135.000.000,00
							IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$	25.650.000,00										$	25.650.000,00
							TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$	160.650.000,00			$ -			$ -			$ -		$	160.650.000,00
							COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$	23.366.813.871,00			$ (475.297.816,00)			$ 475.297.816,00			$ -		$	23.366.813.871,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoria revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de junio de 2025.

OSCAR MAYA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

DIEGO RADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ANGELLY CHANTA ARIAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

[illegible] LAB ORDOÑEZ
DIRECTOR DE DESPACHO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 2 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

CONTRATO N°LP-031-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**															
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3015	$ 80.656,00	$ 104.853,00	$ 316.131.795,00	3.015,00	$ 316.131.795,00	999,57	$ 104.807.913,21	445,11	$ 46.671.118,83	1.444,68	$ 151.479.032,04	1.570,32	$ 164.652.762,96
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	$ 23.509,00	$ 30.562,00	$ 30.562,00	1,00	$ 30.562,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.562,00
1,03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO.	M2	40822	$ 2.908,00	$ 3.780,00	$ 154.307.160,00	150.000,00	$ 567.000.000,00	52.411,78	$ 198.116.528,40	96.435,95	$ 364.527.891,00	148.847,73	$ 562.644.419,40	1.152,27	$ 4.355.580,60
1,04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	332	$ 34.329,00	$ 44.628,00	$ 13.923.936,00	312,00	$ 13.923.936,00	73,00	$ 3.257.844,00	42,00	$ 1.874.376,00	115,00	$ 5.132.220,00	197,00	$ 8.791.716,00
1,05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	314	$ 82.935,00	$ 107.816,00	$ 33.854.224,00	314,00	$ 33.854.224,00	-	$ -		$ -	-	$ -	314,00	$ 33.854.224,00
1,06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	140	$ 40.371,00	$ 52.482,00	$ 7.347.480,00	140,00	$ 7.347.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 7.347.480,00
1,07	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	$ 89.604,00	$ 116.485,00	$ 116.485,00	1,00	$ 116.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 116.485,00
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 25.119,00	$ 32.655,00	$ 32.655,00	1,00	$ 32.655,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.655,00
1,09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1584	$ 59.276,00	$ 77.059,00	$ 122.061.456,00	1.584,00	$ 122.061.456,00	155,00	$ 11.944.145,00	670,84	$ 51.694.259,56	825,84	$ 63.638.404,56	758,16	$ 58.423.051,44
1,1	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	8	$ 204.745,00	$ 266.169,00	$ 2.129.352,00	8,00	$ 2.129.352,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.129.352,00
1,11	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1491	$ 55.167,00	$ 71.717,00	$ 106.930.047,00	791,00	$ 56.728.147,00	-	$ -		$ -	-	$ -	791,00	$ 56.728.147,00
1,12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	429	$ 56.960,00	$ 74.048,00	$ 31.766.592,00	5.800,00	$ 429.478.400,00	4.214,90	$ 312.105.092,92	473,31	$ 35.047.382,89	4.688,21	$ 347.152.455,60	1.111,79	$ 82.325.944,40
1,13	DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	5	$ 28.844,00	$ 37.497,00	$ 187.485,00	5,00	$ 187.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 187.485,00
1,14	DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 51.007,00	$ 66.309,00	$ 66.309,00	1,00	$ 66.309,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 66.309,00
1,15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3431	$ 12.148,00	$ 15.792,00	$ 54.182.352,00	3.431,00	$ 54.182.352,00	155,12	$ 3.061.335,04	73,61	$ 1.165.807,52	268,93	$ 4.246.942,56	3.162,07	$ 49.935.409,44
1,16	DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1	$ 32.463,00	$ 42.202,00	$ 42.202,00	1,00	$ 42.202,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 42.202,00
1,17	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 18.823,00	$ 24.470,00	$ 24.470,00	1,00	$ 24.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 24.470,00
1,18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M3	4760	$ 46.276,00	$ 60.159,00	$ 286.277.340,00	2.760,00	$ 166.038.840,00	252,91	$ 15.214.782,61	-	$ -	252,91	$ 15.214.782,61	2.507,09	$ 150.824.057,39
1,19	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.315,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M1	1	$ 26.199,00	$ 34.059,00	$ 34.059,00	1,00	$ 34.059,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 34.059,00
1,21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	$ 13.909,00	$ 18.082,00	$ 18.082,00	1,00	$ 18.082,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 18.082,00
1,22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 59.903,00	$ 77.874,00	$ 77.874,00	1,00	$ 77.874,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 77.874,00
1,23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL	M2	3930	$ 14.324,00	$ 18.621,00	$ 73.180.530,00	3.930,00	$ 73.180.530,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.930,00	$ 73.180.530,00
1,24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	$ 20.660,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00	1,00	$ 26.858,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.858,00
1,25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1	$ 23.833,00	$ 30.983,00	$ 30.983,00	1,00	$ 30.983,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 30.983,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,26	DESMONTE DE SANTARIOS	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 39.900,00
1,28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	$ 487.449,00	$ 633.684,00	$ 633.684,00	1,00	$ 633.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 633.684,00
1,29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL	M2	60	$ 21.476,00	$ 27.919,00	$ 1.675.140,00	60,00	$ 1.675.140,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 1.675.140,00
1,3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	$ 16.991,00	$ 22.088,00	$ 22.088,00	1,00	$ 22.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.088,00
1,31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	$ 17.860,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00	1,00	$ 23.218,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 23.218,00
1,33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	9	$ 45.560,00	$ 59.228,00	$ 533.052,00	9,00	$ 533.052,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 533.052,00
1,34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10	$ 67.453,00	$ 87.689,00	$ 876.890,00	10,00	$ 876.890,00	2,00	$ 175.378,00	-	$ -	2,00	$ 175.378,00	8,00	$ 701.512,00
1,35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 55.996,00	$ 72.795,00	$ 72.795,00	1,00	$ 72.795,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 72.795,00
1,36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1200	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 48.394.800,00	1.200,00	$ 48.394.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.200,00	$ 48.394.800,00
1,37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400	$ 12.224,00	$ 15.891,00	$ 22.247.400,00	1.400,00	$ 22.247.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.400,00	$ 22.247.400,00
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.329,00
1,39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E = 0,25	M2	36882	$ 15.524,00	$ 20.181,00	$ 744.333.742,00	26.962,00	$ 544.523.742,00	6.473,85	$ 130.648.766,85	592,30	$ 11.953.206,30	7.066,15	$ 142.601.973,15	19.915,85	$ 401.921.768,85
2	MOVIMIENTO DE TIERRA												-			
2,01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12596	$ 61.354,00	$ 79.760,00	$ 1.004.656.960,00	8.177,96	$ 652.273.815,00	424,47	$ 33.855.414,54	623,29	$ 49.713.211,60	1.047,75	$ 83.568.626,14	7.130,21	$ 568.705.188,86
2,02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1781	$ 11.634,00	$ 15.124,00	$ 26.946.092,00	1.783,00	$ 26.966.092,00	477,64	$ 7.226.852,16	368,79	$ 5.577.579,96	846,83	$ 12.804.432,12	936,37	$ 14.161.659,88
2,03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	10247	$ 54.108,00	$ 70.338,00	$ 720.753.486,00	8.747,00	$ 615.246.486,00	547,67	$ 38.522.012,46	841,94	$ 59.220.024,03	1.389,61	$ 97.742.036,49	7.357,40	$ 517.504.449,51
2,04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	$ 26.952,00	$ 35.038,00	$ 35.038,00	1,00	$ 35.038,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 35.038,00
2,05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	$ 132.041,00	$ 171.653,00	$ 171.653,00	1,00	$ 171.653,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 171.653,00
2,06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	17519	$ 110.331,00	$ 143.430,00	$ 2.512.750.170,00	14.205,23	$ 2.037.452.354,00	1.386,67	$ 198.818.836,22	2.119,44	$ 303.961.562,01	3.506,32	$ 502.910.918,22	10.698,89	$ 1.534.541.435,78
2,07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	50	$ 219.559,00	$ 285.427,00	$ 14.271.350,00	50,00	$ 14.271.350,00	-	$ -			-	$ -	50,00	$ 14.271.350,00
2,08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAION - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	$ 199.648,00	$ 258.762,00	$ 258.762,00	190	49.184.780,00	173,94	45.009.092,28	8,40	1.656.904,84	180,34	$ 46.665.997,12	9,66	$ 2.498.812,88
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACION)	M3	1	$ 105.971,00	$ 137.762,00	$ 137.762,00	1,00	$ 137.762,00	-	$ -		-	-	$ -	1,00	$ 137.762,00
2,1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	1287	$ 210.231,00	$ 273.300,00	$ 351.737.100,00	1.287,00	$ 351.737.100,00	-	$ -	68,32	18.673.181,51	68,32	$ 18.673.181,51	1.218,68	$ 333.063.918,50
2,11	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (ARENA DE SANTO TOMAS)	M3	3006	$ 94.775,00	$ 123.208,00	$ 370.363.248,00	3.006,00	$ 370.363.248,00	-	$ -		-	-	$ -	3.006,00	$ 370.363.248,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDONEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	16 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	ESTRUCTURA							0,00					-			
3,01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1783	$ 135.807,00	$ 176.549,00	$ 314.786.867,00	1.783,00	$ 314.786.867,00	166,00	$ 29.307.134,00	161,97	28.595.641,53	327,97	$ 57.902.775,53	1.455,03	$ 256.884.091,47
3,02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	4691	$ 98.184,00	$ 127.639,00	$ 624.282.349,00	4.891,00	$ 624.282.349,00	-	$ -	365,59	46.663.542,01	365,59	$ 46.663.542,01	4.525,41	$ 577.618.806,99
3,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS.	ML	733	$ 129.876,00	$ 168.579,00	$ 123.568.407,00	733,00	$ 123.568.407,00	-	$ -		0,00	-	$ -	733,00	$ 123.568.407,00
3,04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0,30 - 0,50) X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2261	$ 134.980,00	$ 175.474,00	$ 396.746.714,00	2.261,00	$ 396.746.714,00	-	$ -		0,00	-	$ -	2.261,00	$ 396.746.714,00
3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	509	$ 1.344.202,00	$ 1.747.463,00	$ 889.458.667,00	509,00	$ 889.458.667,00	-	$ -		0,00	-	$ -	509,00	$ 889.458.667,00
3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	28970	$ 7.904,00	$ 10.275,00	$ 297.666.750,00	28.970,00	$ 297.666.750,00	2.360,25	$ 24.251.568,75	4.224,17	$ 43.403.322,09	6.584,42	$ 67.654.890,84	22.385,58	$ 230.011.859,16
3,07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	$ 820.132,00	$ 1.066.172,00	$ 1.066.172,00	60,00	$ 63.970.320,00	15,00	$ 15.992.580,00	40,37	$ 43.042.429,81	55,37	$ 59.035.009,81	4,63	$ 4.935.310,19
3,08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS.	ML	1	$ 118.219,00	$ 153.685,00	$ 153.685,00	1,00	$ 153.685,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 153.685,00
3,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	25.100	$ 23.190,00	$ 30.147,00	$ 756.689.700,00	25.100,00	$ 756.689.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25.100,00	$ 756.689.700,00
3,10	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$ 988.824,00	$ 1.287.816,00	$ 1.287.816,00	1,00	$ 1.287.816,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.287.816,00
3,11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 17.189,00	$ 22.346,00	$ 22.346,00	750,00	$ 16.759.500,00	-	$ -	692,00	$ 15.463.432,00	692,00	$ 15.463.432,00	58,00	$ 1.296.068,00
3,12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	13827	$ 15.441,00	$ 20.073,00	$ 277.549.371,00	13.827,00	$ 277.549.371,00	-	$ -	2.224,69	$ 44.656.242,52	2.224,69	$ 44.656.242,52	11.602,31	$ 232.893.128,48
3,13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 14.922,00	$ 19.399,00	$ 19.399,00	1,00	$ 19.399,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 19.399,00
3,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	1	$ 1.502.084,00	$ 1.952.709,00	$ 1.952.709,00	1,00	$ 1.952.709,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.952.709,00
3,15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	$ 76.746,00	$ 99.770,00	$ 99.770,00	1,00	$ 99.770,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 99.770,00
3,16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.05	M2	155	$ 67.355,00	$ 87.562,00	$ 13.572.110,00	195,00	$ 17.074.590,00	64,00	$ 5.603.968,00	129,54	$ 11.343.131,73	193,54	$ 16.947.099,73	1,46	$ 127.490,27
3,17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3", INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	$ 194.493,00	$ 252.841,00	$ 252.841,00	1,00	$ 252.841,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 252.841,00
3,18	PAVIMENTO RIGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	MJ	1	$ 165.982,00	$ 215.777,00	$ 215.777,00	1,00	$ 215.777,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 215.777,00
4	MAMPOSTERIA											$ -	-			
4,01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E : 0,30 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7743	$ 137.940,00	$ 179.322,00	$ 1.388.490.246,00	7.743,00	$ 1.388.490.246,00	-	$ -	1.305,64	$ 234.129.976,08	1.305,64	$ 234.129.976,08	6.437,36	$ 1.154.360.269,92
4,02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	7551	$ 165.782,00	$ 215.517,00	$ 1.627.368.867,00	7.551,00	$ 1.627.368.867,00	-	$ -	373,62	$ 80.522.108,09	373,62	$ 80.522.108,09	7.177,38	$ 1.546.846.758,91
4,03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ARIUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	1307	$ 253.165,00	$ 329.115,00	$ 430.153.305,00	1.307,00	$ 430.153.305,00	88,96	$ 29.258.323,50	39,68	$ 13.059.283,20	128,58	$ 42.317.606,70	1.178,42	$ 387.835.698,30
4,04	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1307	$ 74.731,00	$ 97.150,00	$ 126.975.050,00	1.307,00	$ 126.975.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.307,00	$ 126.975.050,00
4,05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1307	$ 27.645,00	$ 35.939,00	$ 46.972.273,00	1.307,00	$ 46.972.273,00	-	$ -	137,59	$ 4.944.775,13	137,59	$ 4.944.775,13	1.169,41	$ 42.027.497,87
4,06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	985	$ 18.188,00	$ 23.657,00	$ 23.302.145,00	985,00	$ 23.302.145,00	-	$ -		$ -	-	$ -	985,00	$ 23.302.145,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUYE AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4,07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE, INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	$ 890.342,00	$ 1.157.445,00	$ 254.637.900,00	220,00	$ 254.637.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	220,00	$ 254.637.900,00
4,08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E = 0,06 MTS, ANCHO DE 0,60 MTS, VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO.	ML	1	$ 161.583,00	$ 210.058,00	$ 210.058,00	1,00	$ 210.058,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 210.058,00
4,09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE CUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 192.290,00	$ 249.977,00	$ 249.977,00	1,00	$ 249.977,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 249.977,00
4,10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 212.358,00	$ 276.065,00	$ 276.065,00	1,00	$ 276.065,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 276.065,00
4,11	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGUN MEP.	ML	2837	$ 35.900,00	$ 46.670,00	$ 132.402.790,00	2.837,00	$ 132.402.790,00	-	$ -	83,74	$ 3.908.145,80	83,74	$ 3.908.145,80	2.753,26	$ 128.494.644,20
4,12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E =0,05 METROS	M2	1	$ 45.258,00	$ 58.835,00	$ 58.835,00	1,00	$ 58.835,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 58.835,00
4,13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ARUZARDADO DE CEMENTO; DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	$ 235.009,00	$ 305.512,00	$ 305.512,00	100,00	$ 30.551.200,00	-	$ -	97,91	$ 29.912.068,90	97,91	$ 29.912.068,90	2,09	$ 639.131,10
4,14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	$ 97.489,00	$ 126.736,00	$ 126.736,00	1,00	$ 126.736,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 126.736,00
4,15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 MTS.	M2	1	$ 65.062,00	$ 84.581,00	$ 84.581,00	1,00	$ 84.581,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 84.581,00
4,16	CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	47	$ 1.009.038,00	$ 1.307.849,00	$ 61.468.903,00	47,00	$ 61.468.903,00	-	$ -		$ -	-	$ -	47,00	$ 61.468.903,00
4,17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.122,00	$ 70.359,00	$ 70.359,00	1,00	$ 70.359,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 70.359,00
4,18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 21.300,00	$ 27.690,00	$ 27.690,00	1,00	$ 27.690,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 27.690,00
5	**ACABADOS**											$ -	-			
5,01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DETALLES	M2	1537	$ 22.257,00	$ 28.934,00	$ 44.471.558,00	1.537,00	$ 44.471.558,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.537,00	$ 44.471.558,00
5,02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	1	$ 4.011,00	$ 5.214,00	$ 5.214,00	1,00	$ 5.214,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.214,00
5,03	PINTURA EPODICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1035	$ 46.012,00	$ 59.816,00	$ 61.909.560,00	1.035,00	$ 61.909.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.035,00	$ 61.909.560,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0,55 X 0,55 MTS O SIMILAR.	M2	1	$ 98.433,00	$ 127.963,00	$ 127.963,00	1,00	$ 127.963,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.963,00
5,05	ZOCALO EN CERAMICA.	ML	1	$ 27.851,00	$ 36.206,00	$ 36.206,00	1,00	$ 36.206,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 36.206,00
5,06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	$ 78.632,00	$ 102.222,00	$ 102.222,00	1,00	$ 102.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 102.222,00
5,07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	1	$ 126.986,00	$ 165.082,00	$ 165.082,00	1,00	$ 165.082,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 165.082,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL)	M2	1	$ 111.560,00	$ 145.028,00	$ 145.028,00	1,00	$ 145.028,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 145.028,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 10M+SBR 10M)DE 20M DE ESPESOR	M2	1662	$ 291.358,00	$ 378.765,00	$ 629.507.430,00	1.662,00	$ 629.507.430,00	-	$ -			-	$ -	1.662,00	$ 629.507.430,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	2650	$ 125.454,00	$ 163.090,50	$ 432.188.500,00	2.650,00	$ 432.188.500,00	-	$ -			-	$ -	2.650,00	$ 432.188.500,00
5,11	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO=20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	$ 108.215,00	$ 140.680,00	$ 140.680,00	1,00	$ 140.680,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 140.680,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,12	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	2650	$ 74.461,00	$ 96.799,00	$ 256.517.350,00	2.650,00	$ 256.517.350,00	-	$ -			-	$ -	2.650,00	$ 256.517.350,00
5,13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2	1	$ 80.491,00	$ 104.638,00	$ 104.638,00	1,00	$ 104.638,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 104.638,00
5,14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	$ 81.847,00	$ 106.401,00	$ 106.401,00	1,00	$ 106.401,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 106.401,00
5,15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.315,00
6	**EQUIPAMENTO**												-			
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	228	$ 961.002,00	$ 1.236.303,00	$ 281.877.084,00	228,00	$ 281.877.084,00	-	$ -			-	$ -	228,00	$ 281.877.084,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	$ 387.741,00	$ 504.063,00	$ 504.063,00	1,00	$ 504.063,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 504.063,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA BODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *15*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	319	$ 727.499,00	$ 945.749,00	$ 301.693.931,00	319,00	$ 301.693.931,00	-	$ -			-	$ -	319,00	$ 301.693.931,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT	M2	1404	$ 251.834,00	$ 327.384,00	$ 459.647.136,00	1.404,00	$ 459.647.136,00	-	$ -			-	$ -	1.404,00	$ 459.647.136,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT	M2	1375	$ 313.748,00	$ 407.872,00	$ 560.824.000,00	1.375,00	$ 560.824.000,00	-	$ -			-	$ -	1.375,00	$ 560.824.000,00
6,06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	6	$ 1.316.183,00	$ 1.711.038,00	$ 10.266.228,00	6,00	$ 10.266.228,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 10.266.228,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	4	$ 2.361.138,00	$ 3.069.479,00	$ 12.277.916,00	4,00	$ 12.277.916,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 12.277.916,00
6,08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	1	$ 6.418.694,00	$ 8.344.302,00	$ 8.344.302,00	1,00	$ 8.344.302,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 8.344.302,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	$ 809.840,00	$ 1.052.792,00	$ 1.052.792,00	1,00	$ 1.052.792,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.052.792,00
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 20 MM, MALLAS Y ARCOS	UN	1	$ 3.382.893,00	$ 4.397.761,00	$ 4.397.761,00	1,00	$ 4.397.761,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 4.397.761,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	9	$ 4.557.396,00	$ 5.924.615,00	$ 53.321.535,00	9,00	$ 53.321.535,00	-	$ -			-	$ -	9,00	$ 53.321.535,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	$ 5.216.939,00	$ 6.782.021,00	$ 122.076.378,00	18,00	$ 122.076.378,00	-	$ -			-	$ -	18,00	$ 122.076.378,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BICOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	36	$ 4.775.597,00	$ 6.208.276,00	$ 223.497.936,00	36,00	$ 223.497.936,00	-	$ -			-	$ -	36,00	$ 223.497.936,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BICOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	34	$ 4.443.648,00	$ 5.776.742,00	$ 196.409.228,00	34,00	$ 196.409.228,00	-	$ -			-	$ -	34,00	$ 196.409.228,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	90	$ 978.332,00	$ 1.271.832,00	$ 114.464.880,00	90,00	$ 114.464.880,00	-	$ -			-	$ -	90,00	$ 114.464.880,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.817.476,00	$ 2.362.719,00	$ 2.362.719,00	1,00	$ 2.362.719,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.362.719,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.196.021,00	$ 1.554.827,00	$ 1.554.827,00	1,00	$ 1.554.827,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.554.827,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.630.832,00	$ 7.320.082,00	$ 7.320.082,00	1,00	$ 7.320.082,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.320.082,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.594.079,00	$ 7.272.303,00	$ 7.272.303,00	1,00	$ 7.272.303,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.272.303,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC)	UN	9	$ 4.100.667,00	$ 5.330.867,00	$ 47.977.803,00	9,00	$ 47.977.803,00	-	$ -			-	$ -	9,00	$ 47.977.803,00
7	**JUEGOS INFANTILES**						0,00	0,00					-			

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACION:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1,00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	446	$ 263.609,00	$ 342.692,00	$ 152.840.632,00	446,00	$ 152.840.632,00	-	$ -			-	$ -	446,00	$ 152.840.632,00
7,02	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	$ 12.805.430,00	$ 16.647.068,00	$ 16.647.068,00	1,00	$ 16.647.068,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 16.647.068,00
7,03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9	UN	1	$ 134.714.969,00	$ 175.129.460,00	$ 175.129.460,00	1,00	$ 175.129.460,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 175.129.460,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS	UN	6	$ 98.632.736,00	$ 128.222.557,00	$ 769.335.342,00	6,00	$ 769.335.342,00	-	$ -			-	$ -	6,00	$ 769.335.342,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	1	$ 9.779.032,00	$ 12.712.742,00	$ 12.712.742,00	1,00	$ 12.712.742,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.712.742,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	$ 7.497.913,00	$ 9.747.287,00	$ 9.747.287,00	1,00	$ 9.747.287,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.747.287,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	$ 10.002.916,00	$ 13.003.791,00	$ 13.003.791,00	1,00	$ 13.003.791,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.003.791,00
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	4	$ 11.370.976,00	$ 14.782.269,00	$ 59.129.076,00	4,00	$ 59.129.076,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 59.129.076,00
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	7	$ 32.900.894,00	$ 42.771.167,00	$ 299.398.169,00	7,00	$ 299.398.169,00	-	$ -			-	$ -	7,00	$ 299.398.169,00
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	$ 4.152.787,00	$ 5.398.623,00	$ 5.398.623,00	1,00	$ 5.398.623,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.398.623,00
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	1	$ 45.462.148,00	$ 59.100.792,00	$ 59.100.792,00	1,00	$ 59.100.792,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 59.100.792,00
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	$ 90.421.405,00	$ 117.547.827,00	$ 117.547.827,00	1,00	$ 117.547.827,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.547.827,00
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	4	$ 12.809.568,00	$ 16.652.464,00	$ 66.609.856,00	4,00	$ 66.609.856,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 66.609.856,00
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	$ 83.815.414,00	$ 108.960.038,00	$ 108.960.038,00	1,00	$ 108.960.038,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 108.960.038,00
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	4	$ 19.359.640,00	$ 25.167.532,00	$ 100.670.128,00	4,00	$ 100.670.128,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 100.670.128,00
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	2	$ 7.942.168,00	$ 10.324.818,00	$ 20.649.636,00	2,00	$ 20.649.636,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 20.649.636,00
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4.12AÑOS	UN	1	$ 68.435.358,00	$ 88.965.965,00	$ 88.965.965,00	1,00	$ 88.965.965,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 88.965.965,00
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	$ 94.106.739,00	$ 122.338.761,00	$ 122.338.761,00	1,00	$ 122.338.761,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 122.338.761,00
8	**GYM BIOSALUDABLE**															
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	$ 9.353.050,00	$ 12.158.965,00	$ 12.158.965,00	1,00	$ 12.158.965,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.158.965,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	$ 10.140.021,00	$ 13.182.027,00	$ 13.182.027,00	1,00	$ 13.182.027,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.182.027,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	$ 10.065.989,00	$ 13.085.786,00	$ 13.085.786,00	1,00	$ 13.085.786,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.085.786,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	$ 11.269.505,00	$ 14.650.357,00	$ 14.650.357,00	1,00	$ 14.650.357,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 14.650.357,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	$ 9.458.501,00	$ 12.296.051,00	$ 12.296.051,00	1,00	$ 12.296.051,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 12.296.051,00
8,06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	$ 4.604.388,00	$ 5.985.704,00	$ 5.985.704,00	1,00	$ 5.985.704,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.985.704,00
8,07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	$ 4.069.083,00	$ 5.289.808,00	$ 5.289.808,00	1,00	$ 5.289.808,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.289.808,00
8,08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA	UN	1	$ 7.509.143,00	$ 9.761.886,00	$ 9.761.886,00	1,00	$ 9.761.886,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.761.886,00
8,09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	$ 7.625.453,00	$ 9.913.089,00	$ 9.913.089,00	1,00	$ 9.913.089,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.913.089,00
8,1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	$ 2.878.857,00	$ 3.742.514,00	$ 3.742.514,00	1,00	$ 3.742.514,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.742.514,00
8,11	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO)	UN	11	$ 5.118.495,00	$ 6.654.044,00	$ 73.194.484,00	11,00	$ 73.194.484,00	-	$ -			-	$ -	11,00	$ 73.194.484,00
8,12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	9	$ 5.575.898,00	$ 7.248.797,00	$ 65.239.173,00	9,00	$ 65.239.173,00	-	$ -			-	$ -	9,00	$ 65.239.173,00
8,13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	8	$ 3.721.691,00	$ 4.838.198,00	$ 38.705.584,00	8,00	$ 38.705.584,00	-	$ -			-	$ -	8,00	$ 38.705.584,00
8,14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	8	$ 5.551.492,00	$ 7.216.940,00	$ 57.735.520,00	8,00	$ 57.735.520,00	-	$ -			-	$ -	8,00	$ 57.735.520,00
8,15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	9	$ 5.573.578,00	$ 7.245.651,00	$ 65.210.859,00	9,00	$ 65.210.859,00	-	$ -			-	$ -	9,00	$ 65.210.859,00
8,16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	3	$ 5.546.712,00	$ 7.210.726,00	$ 21.632.178,00	3,00	$ 21.632.178,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 21.632.178,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	3	$ 5.048.075,00	$ 6.562.498,00	$ 19.687.494,00	3,00	$ 19.687.494,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 19.687.494,00
8,18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	2	$ 3.799.413,00	$ 4.939.237,00	$ 9.878.474,00	2,00	$ 9.878.474,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 9.878.474,00
8,19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	2	$ 4.117.088,00	$ 5.352.214,00	$ 10.704.428,00	2,00	$ 10.704.428,00	-	$ -			-	$ -	2,00	$ 10.704.428,00
8,2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA:CALISTENIA.	UN	1	$ 38.172.865,00	$ 49.624.725,00	$ 49.624.725,00	1,00	$ 49.624.725,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 49.624.725,00
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	1	$ 4.620.677,00	$ 6.006.880,00	$ 6.006.880,00	1,00	$ 6.006.880,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 6.006.880,00
8,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	1	$ 4.577.884,00	$ 5.951.249,00	$ 5.951.249,00	1,00	$ 5.951.249,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.951.249,00
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	4	$ 6.102.981,00	$ 7.933.875,00	$ 31.735.500,00	4,00	$ 31.735.500,00	-	$ -			-	$ -	4,00	$ 31.735.500,00
8,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	3	$ 4.498.843,00	$ 5.731.496,00	$ 17.194.488,00	3,00	$ 17.194.488,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 17.194.488,00
8,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	3	$ 8.298.328,00	$ 10.785.224,00	$ 32.355.672,00	3,00	$ 32.355.672,00	-	$ -			-	$ -	3,00	$ 32.355.672,00
8,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	1	$ 34.702.717,00	$ 45.113.532,00	$ 45.113.532,00	1,00	$ 45.113.532,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 45.113.532,00
8,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	1	$ 60.173.619,00	$ 78.225.705,00	$ 78.225.705,00	1,00	$ 78.225.705,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 78.225.705,00
8,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	1	$ 48.302.775,00	$ 62.793.608,00	$ 62.793.608,00	1,00	$ 62.793.608,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 62.793.608,00
9	**INSTALACIONES**															
9,01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	1	$ 141.044,00	$ 183.357,00	$ 183.357,00	1,00	$ 183.357,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 183.357,00
9,02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	$ 110.324,00	$ 143.421,00	$ 143.421,00	1,00	$ 143.421,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 143.421,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	$ 128.061,00	$ 166.479,00	$ 166.479,00	1,00	$ 166.479,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 166.479,00
9,04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	1	$ 40.491,00	$ 52.638,00	$ 52.638,00	1,00	$ 52.638,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 52.638,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	$ 31.506,00	$ 40.958,00	$ 40.958,00	1,00	$ 40.958,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 40.958,00
9,06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UNO	1	$ 50.752,00	$ 65.978,00	$ 65.978,00	1,00	$ 65.978,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 65.978,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	$ 37.763,00	$ 49.092,00	$ 49.092,00	1,00	$ 49.092,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 49.092,00
9,08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UNO	1	$ 54.339,00	$ 70.641,00	$ 70.641,00	1,00	$ 70.641,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 70.641,00
9,09	PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2"	UNO	1	$ 102.301,00	$ 132.991,00	$ 132.991,00	1,00	$ 132.991,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 132.991,00
9,1	PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4"	UNO	1	$ 151.864,00	$ 197.449,00	$ 197.449,00	1,00	$ 197.449,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 197.449,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC = 2"	ML	1	$ 47.267,00	$ 61.447,00	$ 61.447,00	1,00	$ 61.447,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 61.447,00
9,12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UNO	1	$ 856.854,00	$ 1.113.910,00	$ 1.113.910,00	1,00	$ 1.113.910,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.113.910,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR	UNO	1	$ 329.700,00	$ 428.610,00	$ 428.610,00	1,00	$ 428.610,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 428.610,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UNO	1	$ 792.979,00	$ 1.030.873,00	$ 1.030.873,00	1,00	$ 1.030.873,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.030.873,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UNO	1	$ 557.928,00	$ 725.306,00	$ 725.306,00	1,00	$ 725.306,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 725.306,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UNO	1	$ 979.233,00	$ 1.273.003,00	$ 1.273.003,00	1,00	$ 1.273.003,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.273.003,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	$ 33.396,00	$ 43.415,00	$ 43.415,00	1,00	$ 43.415,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 43.415,00
9,18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC	UNO	1	$ 103.185,00	$ 134.141,00	$ 134.141,00	1,00	$ 134.141,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 134.141,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL	UNO	1	$ 516.417,00	$ 671.342,00	$ 671.342,00	1,00	$ 671.342,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 671.342,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UNO	1	$ 13.785,00	$ 17.921,00	$ 17.921,00	1,00	$ 17.921,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 17.921,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 90.133,00	$ 117.173,00	$ 117.173,00	1,00	$ 117.173,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.173,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 14.516,00	$ 18.871,00	$ 18.871,00	1,00	$ 18.871,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 18.871,00
9,23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	1	$ 34.473,00	$ 44.815,00	$ 44.815,00	1,00	$ 44.815,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 44.815,00
9,24	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	$ 6.174,00	$ 8.026,00	$ 8.026,00	1,00	$ 8.026,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 8.026,00
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UNO	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 192.386,00
9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110	UNO	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 192.386,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9,27	PUESTA A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	UNO	1	$ 585.744,00	$ 774.467,00	$ 774.467,00	1,00	$ 774.467,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 774.467,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	61	$ 81.738,00	$ 106.259,00	$ 6.481.799,00	61,00	$ 6.481.799,00	-	$ -			-	$ -	61,00	$ 6.481.799,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	$ 47.585,00	$ 61.861,00	$ 61.861,00	1,00	$ 61.861,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 61.861,00
10	OTROS												-			
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	1	$ 3.285.568,00	$ 4.271.238,00	$ 4.271.238,00	1,00	$ 4.271.238,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 4.271.238,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL , PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	60	$ 349.528,00	$ 454.386,00	$ 27.263.160,00	60,00	$ 27.263.160,00	-	$ -			-	$ -	60,00	$ 27.263.160,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LABAÑILERÍA MICROPERFORADA	M2	1	$ 170.007,00	$ 221.009,00	$ 221.009,00	1,00	$ 221.009,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 221.009,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 176.784,00	$ 229.819,00	$ 229.819,00	1,00	$ 229.819,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 229.819,00
10,05	PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	GL	1	$ 448.515.000,00	$ 583.069.500,00	$ 583.069.500,00	1,00	$ 583.069.500,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 583.069.500,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.800.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 96.720,00	$ 125.736,00	$ 125.736,00	1,00	$ 125.736,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 125.736,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 107.481,00	$ 139.725,00	$ 139.725,00	1,00	$ 139.725,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 139.725,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE 60CMS FIJA	UND	1	$ 296.290,00	$ 385.177,00	$ 385.177,00	1,00	$ 385.177,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 385.177,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE	UND	1	$ 642.543,00	$ 835.306,00	$ 835.306,00	1,00	$ 835.306,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 835.306,00
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM	M2	1	$ 358.247,00	$ 465.721,00	$ 465.721,00	1,00	$ 465.721,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 465.721,00
10,11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	$ 873.142,00	$ 1.135.085,00	$ 1.135.085,00	1,00	$ 1.135.085,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.135.085,00
10,12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UNO	1	$ 423.460,00	$ 550.498,00	$ 550.498,00	1,00	$ 550.498,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 550.498,00
10,13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	$ 211.100,00	$ 274.430,00	$ 274.430,00	1,00	$ 274.430,00	-	$ -			-	$ -	1,00	$ 274.430,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1496	$ 103.464,00	$ 134.503,00	$ 201.216.488,00	1.496,00	$ 201.216.488,00	368,00	$ 49.497.104,00	-	$ -	368,00	$ 49.497.104,00	1.128,00	$ 151.719.384,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.527.171,00
10,16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600	M2	1	$ 9.314,00	$ 12.108,00	$ 12.108,00	1,00	$ 12.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.108,00
10,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	3820	$ 144.656,00	$ 187.273,00	$ 715.382.860,00	3.820,00	$ 715.382.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.820,00	$ 715.382.860,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1,00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	1	$ 381.325,00	$ 495.723,00	$ 495.723,00	1,00	$ 495.723,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 495.723,00
10,19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	$ 24.751.519,00	$ 32.176.975,00	$ 32.176.975,00	1,00	$ 32.176.975,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.176.975,00
11	ITEMS NO PREVISTOS											$ -	-			
NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR AZUL C-148, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M2		$ 317.494,00	$ 412.742,00	$ -	30,00	$ 12.382.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 12.382.260,00
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,15X0,30 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLA D = 1/2", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0,20 METROS.	ML		$ 67.148,00	$ 87.292,00	$ -	10,00	$ 872.920,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 872.920,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI, PARA NIVELACIÓN DE PISOS, REFORZADA CON FIBRAS MACRO SINTETICAS, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M3		$ 1.327.806,00	$ 1.726.148,00	$ -	10,00	$ 17.261.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 17.261.480,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML		$ 222.220,00	$ 288.886,00	$ -	300,00	$ 86.665.800,00	-	$ -	211,00	$ 60.954.946,00	211,00	$ 60.954.946,00	89,00	$ 25.710.854,00

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.871,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.871,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17 DE JUNIO 2025 - 15 DE AGOSTO 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	7,34%
% DE AVANCE ACUMULADO:	12,72%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUYE AIU**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML		$ 165.429,00	$ 215.058,00	$ -	170,00	$ 36.559.860,00	-	$ -	130,00	$ 27.957.540,00	130,00	$ 27.957.540,00	40,00	$ 8.602.320,00
NP-06	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 21.679,00	$ 28.183,00	$ -	1.484,54	$ 41.833.065,00	-	$ -	749,80	$ 21.125.976,80	749,80	$ 21.125.976,80	734,74	$ 20.707.088,20
NP-07	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL	M2		$ 87.820,00	$ 114.166,00	$ -	220,00	$ 25.116.520,00	-	$ -	137,59	$ 15.707.871,61	137,59	$ 15.707.871,61	82,41	$ 9.408.648,33
NP-08	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLA D = 3/8", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML		$ 117.651,00	$ 152.946,00	$ -	170,00	$ 26.000.820,00	-	$ -	46,59	$ 7.125.754,14	46,59	$ 7.125.754,14	123,41	$ 18.875.065,86
NP-09	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0,15 X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0,20 METROS (VER DISEÑO).	ML		$ 123.177,00	$ 160.130,00	$ -	350,00	$ 56.045.500,00	-	$ -	188,62	$ 30.203.720,60	188,62	$ 30.203.720,60	161,38	$ 25.841.779,40
						COSTO TOTAL DE OBRA	$ 23.206.163.871,00	$ 23.206.163.871,00		$ 1.256.794.741,93		$ 1.714.486.613,67		$ 2.971.281.355,60		$ 20.234.882.515,20
						AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 135.000.000,00	$ 135.000.000,00				$ -		$ -		$ 135.000.000,00
						IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 25.650.000,00	$ 25.650.000,00				$ -		$ -		$ 25.650.000,00
						TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 160.650.000,00	$ 160.650.000,00				$ -		$ -		$ 160.650.000,00
						COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 23.366.813.871,00	$ 23.366.813.871,00		$ 1.256.794.741,93		$ 1.714.486.613,67		$ 2.971.281.355,60		$ 20.395.532.515,20

NOTA:

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoria revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 20 días del mes de agosto de 2025.

OSCAR MAYA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

DIEGO RADA ALTAHONA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

CIRO LARA ORDOÑEZ
ASESOR DE DESPACHO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA MODIFICATIVA No. 02
CONTRATO №LP-031-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	$ 23.366.813.671,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 23.366.813.671,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE MAYO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE AGOSTO 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							CONDICIONES MODIFICATIVA No.1		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS ADICIONALES			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 02	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES																		
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	3015	$ 80.656,00	$ 104.853,00	$ 316.131.795,00	3.015,00	$ 316.131.795,00			$ -			$ -			$ -	3.015,00	$ 316.131.795,00
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS	ML	1	$ 23.509,00	$ 30.562,00	$ 30.562,00	1,00	$ 30.562,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 30.562,00
1,03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	40822	$ 2.908,00	$ 3.780,00	$ 154.307.160,00	55.000,00	$ 207.900.000,00			$ -	+	95000,00	$ 359.100.000,00			$ -	150.000,00	$ 567.000.000,00
1,04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	312	$ 34.329,00	$ 44.628,00	$ 13.923.936,00	312,00	$ 13.923.936,00			$ -			$ -			$ -	312,00	$ 13.923.936,00
1,05	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA	M3	314	$ 82.935,00	$ 107.816,00	$ 33.854.224,00	314,00	$ 33.854.224,00			$ -			$ -			$ -	314,00	$ 33.854.224,00
1,06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	140	$ 40.371,00	$ 52.482,00	$ 7.347.480,00	140,00	$ 7.347.480,00			$ -			$ -			$ -	140,00	$ 7.347.480,00
1,07	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	1	$ 89.604,00	$ 116.485,00	$ 116.485,00	1,00	$ 116.485,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 116.485,00
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 25.119,00	$ 32.655,00	$ 32.655,00	1,00	$ 32.655,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 32.655,00
1,09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	1584	$ 59.276,00	$ 77.059,00	$ 122.061.456,00	1.584,00	$ 122.061.456,00			$ -			$ -			$ -	1.584,00	$ 122.061.456,00
1,1	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO	UN	8	$ 294.745,00	$ 266.169,00	$ 2.129.352,00	8,00	$ 2.129.352,00			$ -			$ -			$ -	8,00	$ 2.129.352,00
1,11	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1491	$ 55.167,00	$ 71.717,00	$ 106.930.047,00	1.491,00	$ 106.930.047,00	-	-700,00	$ (50.201.900,00)			$ -			$ -	791,00	$ 56.728.147,00
1,12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	429	$ 56.960,00	$ 74.048,00	$ 31.766.592,00	5.300,00	$ 392.454.400,00			$ -	+	500,00	$ 37.024.000,00			$ -	5.800,00	$ 429.478.400,00
1,13	DEMOLICION DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	5	$ 26.844,00	$ 37.497,00	$ 187.485,00	5,00	$ 187.485,00			$ -			$ -			$ -	5,00	$ 187.485,00
1,14	DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 51.007,00	$ 66.309,00	$ 66.309,00	1,00	$ 66.309,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 66.309,00
1,15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3431	$ 12.148,00	$ 15.792,00	$ 54.182.352,00	3.431,00	$ 54.182.352,00			$ -			$ -			$ -	3.431,00	$ 54.182.352,00
1,16	DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1	$ 32.463,00	$ 42.202,00	$ 42.202,00	1,00	$ 42.202,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 42.202,00
1,17	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1	$ 18.823,00	$ 24.470,00	$ 24.470,00	1,00	$ 24.470,00			$ -			$ -				1,00	$ 24.470,00
1,18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	4260	$ 46.276,00	$ 60.159,00	$ 256.277.340,00	4.260,00	$ 256.277.340,00	-	-1500,00	$ (90.238.500,00)			$ -			$ -	2.760,00	$ 166.038.840,00
1,19	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 12.315,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO	ML	1	$ 26.199,00	$ 34.059,00	$ 34.059,00	1,00	$ 34.059,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 34.059,00
1,21	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UND	1	$ 13.909,00	$ 18.082,00	$ 18.082,00	1,00	$ 18.082,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 18.082,00
1,22	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 59.903,00	$ 77.874,00	$ 77.874,00	1,00	$ 77.874,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 77.874,00
1,23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL	M2	3930	$ 14.324,00	$ 18.621,00	$ 73.160.530,00	3.930,00	$ 73.160.530,00			$ -			$ -			$ -	3.930,00	$ 73.160.530,00
1,24	DESMONTE DE SARDINEL	ML	1	$ 20.660,00	$ 26.858,00	$ 26.858,00	1,00	$ 26.858,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 26.858,00

1,25	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNO	1	$ 23.833,00	$ 30.983,00	$ 30.983,00	1,00	$ 30.983,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 30.983,00
1,26	DESMONTE DE SANITARIOS	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 39.900,00
1,27	DESMONTE DE ORINAL	UND	1	$ 30.692,00	$ 39.900,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 39.900,00
1,28	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN	1	$ 487.449,00	$ 633.684,00	$ 633.684,00	1,00	$ 633.684,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 633.684,00
1,29	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL	M2	60	$ 21.476,00	$ 27.919,00	$ 1.675.140,00	60,00	$ 1.675.140,00			$ -			$ -			$ -	60,00	$ 1.675.140,00
1,3	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS	ML	1	$ 16.991,00	$ 22.088,00	$ 22.088,00	1,00	$ 22.088,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 22.088,00
1,31	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	M2	1	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 40.329,00
1,32	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	1	$ 17.860,00	$ 23.218,00	$ 23.218,00	1,00	$ 23.218,00			$ -			$ -				1,00	$ 23.218,00
1,33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) VER DISEÑO.	UN	9	$ 45.560,00	$ 59.228,00	$ 533.052,00	9,00	$ 533.052,00			$ -			$ -			$ -	9,00	$ 533.052,00
1,34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10	$ 67.453,00	$ 87.689,00	$ 876.890,00	10,00	$ 876.890,00			$ -			$ -			$ -	10,00	$ 876.890,00
1,35	DESMONTE DE PUERTAS	UN	1	$ 55.996,00	$ 72.795,00	$ 72.795,00	1,00	$ 72.795,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 72.795,00
1,36	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1200	$ 31.022,00	$ 40.329,00	$ 48.394.800,00	1.200,00	$ 48.394.800,00			$ -			$ -			$ -	1.200,00	$ 48.394.800,00
1,37	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400	$ 12.224,00	$ 15.891,00	$ 22.247.400,00	1.400,00	$ 22.247.400,00			$ -			$ -			$ -	1.400,00	$ 22.247.400,00
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1	31.022,00	40329,00	$ 40.329,00	1,00	$ 40.329,00			$ -			$ -				1,00	$ 40.329,00
1,39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	36982	$ 15.524,00	$ 20.181,00	$ 746.333.742,00	36.982,00	$ 746.333.742,00	-	-10000,00	$ (201.810.000,00)			$ -			$ -	26.982,00	$ 544.523.742,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										$ -								
2,01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	12596	$ 61.354,00	$ 79.760,00	$ 1.004.656.960,00	12.596,00	$ 1.004.656.960,00	-	-4418,04	$ (352.383.145,00)			$ -			$ -	8.177,96	$ 652.273.815,00
2,02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1783	$ 11.634,00	$ 15.124,00	$ 26.966.092,00	1.783,00	$ 26.966.092,00			$ -			$ -			$ -	1.783,00	$ 26.966.092,00
2,03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	10247	$ 54.106,00	$ 70.338,00	$ 720.753.486,00	10.247,00	$ 720.753.486,00	-	-1500,00	$ (105.507.000,00)			$ -			$ -	8.747,00	$ 615.246.486,00
2,04	RELLENO EN MATERIAL DE SITIO	M3	1	$ 26.952,00	$ 35.038,00	$ 35.038,00	1,00	$ 35.038,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 35.038,00
2,05	RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO	M3	1	$ 132.041,00	$ 171.653,00	$ 171.653,00	1,00	$ 171.653,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 171.653,00
2,06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	17519	$ 110.331,00	$ 143.430,00	$ 2.512.750.170,00	14.205,20	$ 2.037.452.354,00			$ -			$ -			$ -	14.205,20	$ 2.037.452.354,00
2,07	SUB-BASE GRANULAR CBR 20%	M3	50	$ 219.559,00	$ 285.427,00	$ 14.271.350,00	50,00	$ 14.271.350,00			$ -			$ -				50,00	$ 14.271.350,00
2,08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1	$ 198.048,00	$ 258.762,00	$ 258.762,00	175,00	$ 45.283.350,00			$ -	*	15,00	$ 3.881.430,00			$ -	190,00	$ 49.164.780,00
2,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN)	M3	1	$ 105.971,00	$ 137.762,00	$ 137.762,00	1,00	$ 137.762,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 137.762,00
2,1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	1287	$ 210.231,00	$ 273.300,00	$ 351.737.100,00	1.287,00	$ 351.737.100,00			$ -			$ -			$ -	1.287,00	$ 351.737.100,00
2,11	RELLENO EN MATERAIL SELECCIONADO (ARENA DE SANTO TOMAS)	M3	3006	$ 94.775,00	$ 123.208,00	$ 370.363.248,00	3.006,00	$ 370.363.248,00			$ -			$ -			$ -	3.006,00	$ 370.363.248,00
3	ESTRUCTURA							0,00											0,00
3,01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30 X 0.30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1783	$ 135.807,00	$ 176.549,00	$ 314.786.867,00	1.783,00	$ 314.786.867,00			$ -			$ -			$ -	1.783,00	$ 314.786.867,00
3,02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	4891	$ 98.184,00	$ 127.639,00	$ 624.282.349,00	4.891,00	$ 624.282.349,00			$ -			$ -			$ -	4.891,00	$ 624.282.349,00
3,03	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.25 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS.	ML	733	$ 129.676,00	$ 168.579,00	$ 123.568.407,00	733,00	$ 123.568.407,00			$ -			$ -			$ -	733,00	$ 123.568.407,00
3,04	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0.30 - 0.50) X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	2261	$ 134.980,00	$ 175.474,00	$ 396.746.714,00	2.261,00	$ 396.746.714,00			$ -			$ -			$ -	2.261,00	$ 396.746.714,00

3,05	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA.	M3	509	$ 1.344.202,00	$ 1.747.463,00	$ 889.458.667,00	509,00	$ 889.458.667,00			$ -			$ -			$ -	509,00	$ 889.458.667,00
3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	28970	$ 7.904,00	$ 10.275,00	$ 297.666.750,00	28.970,00	$ 297.666.750,00			$ -			$ -			$ -	28.970,00	$ 297.666.750,00
3,07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	1	$ 820.132,00	$ 1.066.172,00	$ 1.066.172,00	16,00	$ 17.058.752,00			$ -	+	44,00	$ 46.911.968,00				60,00	$ 63.970.320,00
3,08	VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS.	ML	1	$ 118.219,00	$ 153.685,00	$ 153.685,00	1,00	$ 153.685,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 153.685,00
3,09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	25100	$ 23.190,00	$ 30.147,00	$ 756.689.700,00	25.100,00	$ 756.689.700,00			$ -			$ -			$ -	25.100,00	$ 756.689.700,00
3,1	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	$ 990.628,00	$ 1.287.816,00	$ 1.287.816,00	1,00	$ 1.287.816,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 1.287.816,00
3,11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 17.189,00	$ 22.346,00	$ 22.346,00	1,00	$ 22.346,00			$ -	+	749,00	$ 16.737.154,00			$ -	750,00	$ 16.759.500,00
3,12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	13827	$ 15.441,00	$ 20.073,00	$ 277.549.371,00	13.827,00	$ 277.549.371,00			$ -			$ -			$ -	13.827,00	$ 277.549.371,00
3,13	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	1	$ 14.922,00	$ 19.399,00	$ 19.399,00	1,00	$ 19.399,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 19.399,00
3,14	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA	M3	1	$ 1.502.084,00	$ 1.952.709,00	$ 1.952.709,00	1,00	$ 1.952.709,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 1.952.709,00
3,15	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	1	$ 76.746,00	$ 99.770,00	$ 99.770,00	1,00	$ 99.770,00			$ -			$ -				1,00	$ 99.770,00
3,16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2	155	$ 67.355,00	$ 87.562,00	$ 13.572.110,00	155,00	$ 13.572.110,00			$ -	+	40,00	$ 3.502.480,00			$ -	195,00	$ 17.074.590,00
3,17	PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3", INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	1	$ 194.493,00	$ 252.841,00	$ 252.841,00	1,00	$ 252.841,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 252.841,00
3,18	PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 165.982,00	$ 215.777,00	$ 215.777,00	1,00	$ 215.777,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 215.777,00
4	**MAMPOSTERIA**																			
4,01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	7743	$ 137.940,00	$ 179.322,00	$ 1.388.490.246,00	7.743,00	$ 1.388.490.246,00			$ -			$ -			$ -	7.743,00	$ 1.388.490.246,00
4,02	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	7551	$ 165.782,00	$ 215.517,00	$ 1.627.368.867,00	7.551,00	$ 1.627.368.867,00			$ -			$ -			$ -	7.551,00	$ 1.627.368.867,00
4,03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	1307	$ 253.165,00	$ 329.115,00	$ 430.153.305,00	1.307,00	$ 430.153.305,00			$ -			$ -			$ -	1.307,00	$ 430.153.305,00
4,04	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.25 METROS	ML	1307	$ 74.731,00	$ 97.150,00	$ 126.975.050,00	1.307,00	$ 126.975.050,00			$ -			$ -			$ -	1.307,00	$ 126.975.050,00
4,05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1307	$ 27.645,00	$ 35.939,00	$ 46.972.273,00	1.307,00	$ 46.972.273,00			$ -			$ -			$ -	1.307,00	$ 46.972.273,00
4,06	FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4	ML	985	$ 18.198,00	$ 23.657,00	$ 23.302.145,00	985,00	$ 23.302.145,00			$ -			$ -			$ -	985,00	$ 23.302.145,00
4,07	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE, INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	220	$ 890.342,00	$ 1.157.445,00	$ 254.637.900,00	220,00	$ 254.637.900,00			$ -			$ -			$ -	220,00	$ 254.637.900,00
4,08	MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0,06 MTS, ANCHO DE 0,60 MTS, VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO.	ML	1	$ 161.583,00	$ 210.058,00	$ 210.058,00	1,00	$ 210.058,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 210.058,00
4,09	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES. ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 192.290,00	$ 249.977,00	$ 249.977,00	1,00	$ 249.977,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 249.977,00

4,1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	1	$ 212.358,00	$ 276.065,00	$ 276.065,00	1,00	$ 276.065,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 276.065,00
4,11	SUMINISITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML	2837	$ 35.900,00	$ 46.670,00	$ 132.402.790,00	2.837,00	$ 132.402.790,00			$ -			$ -			$ -	2.837,00	$ 132.402.790,00
4,12	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0,05 METROS	M2	1	$ 45.258,00	$ 58.835,00	$ 58.835,00	1,00	$ 58.835,00			$ -			$ -				1,00	$ 58.835,00
4,13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1	$ 235.009,00	$ 305.512,00	$ 305.512,00	1,00	$ 305.512,00			$ -	+	99,00	$ 30.245.688,00			$ -	100,00	$ 30.551.200,00
4,14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS	M2	1	$ 97.489,00	$ 126.736,00	$ 126.736,00	1,00	$ 126.736,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 126.736,00
4,15	PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 MTS.	M2	1	$ 65.062,00	$ 84.581,00	$ 84.581,00	1,00	$ 84.581,00			$ -			$ -				1,00	$ 84.581,00
4,16	CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO	UN	47	$ 1.006.038,00	$ 1.307.849,00	$ 61.468.903,00	47,00	$ 61.468.903,00			$ -			$ -			$ -	47,00	$ 61.468.903,00
4,17	CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.122,00	$ 70.359,00	$ 70.359,00	1,00	$ 70.359,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 70.359,00
4,18	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1	$ 21.300,00	$ 27.690,00	$ 27.690,00	1,00	$ 27.690,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 27.690,00
5	ACABADOS																			
5,01	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DETALLES	M2	1537	$ 22.257,00	$ 28.934,00	$ 44.471.558,00	1.537,00	$ 44.471.558,00			$ -			$ -			$ -	1.537,00	$ 44.471.558,00
5,02	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA	ML	1	$ 4.011,00	$ 5.214,00	$ 5.214,00	1,00	$ 5.214,00			$ -			$ -			$ -	1,00	$ 5.214,00
5,03	PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA)	M2	1035	$ 46.012,00	$ 59.816,00	$ 61.909.560,00	1.035,00	$ 61.909.560,00			$ -			$ -			$ -	1.035,00	$ 61.909.560,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0,55 X 0,55 MTS O SIMILAR.	M2	1	$ 98.433,00	$ 127.963,00	$ 127.963,00	1,00	$ 127.963,00			$ -			$ -				1,00	$ 127.963,00
5,05	ZÓCALO EN CERAMICA.	ML	1	$ 27.851,00	$ 36.206,00	$ 36.206,00	1,00	$ 36.206,00			$ -			$ -				1,00	$ 36.206,00
5,06	CIELO RASO EN YESO CARTON.	M2	1	$ 78.632,00	$ 102.222,00	$ 102.222,00	1,00	$ 102.222,00			$ -			$ -				1,00	$ 102.222,00
5,07	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO)	M2	1	$ 126.986,00	$ 165.082,00	$ 165.082,00	1,00	$ 165.082,00			$ -			$ -				1,00	$ 165.082,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL)	M2	1	$ 111.560,00	$ 145.028,00	$ 145.028,00	1,00	$ 145.028,00			$ -			$ -				1,00	$ 145.028,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1CM+SBR 1CM)DE 2CM DE ESPESOR	M2	1662	$ 291.358,00	$ 378.765,00	$ 629.507.430,00	1.662,00	$ 629.507.430,00			$ -			$ -				1.662,00	$ 629.507.430,00
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	2650	$ 125.454,00	$ 163.090,00	$ 432.188.500,00	2.650,00	$ 432.188.500,00			$ -			$ -				2.650,00	$ 432.188.500,00
5,11	CESPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	1	$ 108.215,00	$ 140.680,00	$ 140.680,00	1,00	$ 140.680,00			$ -			$ -				1,00	$ 140.680,00
5,12	BASE ELASTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CESPED ARTIFICIAL	M2	2650	$ 74.461,00	$ 96.799,00	$ 256.517.350,00	2.650,00	$ 256.517.350,00			$ -			$ -				2.650,00	$ 256.517.350,00
5,13	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES.	M2	1	$ 80.491,00	$ 104.638,00	$ 104.638,00	1,00	$ 104.638,00			$ -			$ -				1,00	$ 104.638,00
5,14	ENCHAPE CERAMICA PARA MURO	M2	1	$ 81.847,00	$ 106.401,00	$ 106.401,00	1,00	$ 106.401,00			$ -			$ -				1,00	$ 106.401,00
5,15	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	ML	1	$ 9.473,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	1,00	$ 12.315,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.315,00
6	EQUIPAMENTO																			
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO	ML	228	$ 951.002,00	$ 1.236.303,00	$ 281.877.084,00	228,00	$ 281.877.084,00			$ -			$ -				228,00	$ 281.877.084,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	1	$ 387.741,00	$ 504.063,00	$ 504.063,00	1,00	$ 504.063,00			$ -			$ -				1,00	$ 504.063,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1". GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1.2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	319	$ 727.499,00	$ 945.749,00	$ 301.693.931,00	319,00	$ 301.693.931,00			$ -			$ -				319,00	$ 301.693.931,00

6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT	M2	1404	$ 251.834,00	$ 327.384,00	$ 459.647.136,00	1.404,00	$ 459.647.136,00			$ -			$ -				1.404,00	$ 459.647.136,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT	M2	1375	$ 313.768,00	$ 407.872,00	$ 560.824.000,00	1.375,00	$ 560.824.000,00			$ -			$ -				1.375,00	$ 560.824.000,00
6,06	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	UN	6	$ 1.316.183,00	$ 1.711.038,00	$ 10.266.228,00	6,00	$ 10.266.228,00			$ -			$ -				6,00	$ 10.266.228,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS	UN	4	$ 2.361.138,00	$ 3.069.479,00	$ 12.277.916,00	4,00	$ 12.277.916,00			$ -			$ -				4,00	$ 12.277.916,00
6,08	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MULTIPLE (FUTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA.	JG	1	$ 6.418.694,00	$ 8.344.302,00	$ 8.344.302,00	1,00	$ 8.344.302,00			$ -			$ -				1,00	$ 8.344.302,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1	$ 809.840,00	$ 1.052.792,00	$ 1.052.792,00	1,00	$ 1.052.792,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.052.792,00
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRILICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	UN	1	$ 3.382.893,00	$ 4.397.761,00	$ 4.397.761,00	1,00	$ 4.397.761,00			$ -			$ -				1,00	$ 4.397.761,00
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	9	$ 4.557.396,00	$ 5.924.615,00	$ 53.321.535,00	9,00	$ 53.321.535,00			$ -			$ -				9,00	$ 53.321.535,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	18	$ 5.216.939,00	$ 6.782.021,00	$ 122.076.378,00	18,00	$ 122.076.378,00			$ -			$ -				18,00	$ 122.076.378,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	36	$ 4.775.597,00	$ 6.208.276,00	$ 223.497.936,00	36,00	$ 223.497.936,00			$ -			$ -				36,00	$ 223.497.936,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	34	$ 4.443.648,00	$ 5.776.742,00	$ 196.409.228,00	34,00	$ 196.409.228,00			$ -			$ -				34,00	$ 196.409.228,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	90	$ 978.332,00	$ 1.271.832,00	$ 114.464.880,00	90,00	$ 114.464.880,00			$ -			$ -				90,00	$ 114.464.880,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.817.476,00	$ 2.362.719,00	$ 2.362.719,00	1,00	$ 2.362.719,00			$ -			$ -				1,00	$ 2.362.719,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	1	$ 1.196.021,00	$ 1.554.827,00	$ 1.554.827,00	1,00	$ 1.554.827,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.554.827,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.630.832,00	$ 7.320.082,00	$ 7.320.082,00	1,00	$ 7.320.082,00			$ -			$ -				1,00	$ 7.320.082,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO	UND	1	$ 5.594.079,00	$ 7.272.303,00	$ 7.272.303,00	1,00	$ 7.272.303,00			$ -			$ -				1,00	$ 7.272.303,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTI-BANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	9	$ 4.100.667,00	$ 5.330.867,00	$ 47.977.803,00	9,00	$ 47.977.803,00			$ -			$ -				9,00	$ 47.977.803,00
7	**JUEGOS INFANTILES**						-	$ -										-	$ -
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1,00 METRO. PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	446	$ 263.609,00	$ 342.692,00	$ 152.840.632,00	446,00	$ 152.840.632,00			$ -			$ -				446,00	$ 152.840.632,00
7,02	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	1	$ 12.805.435,00	$ 16.647.066,00	$ 16.647.066,00	1,00	$ 16.647.066,00			$ -			$ -				1,00	$ 16.647.066,00
7,03	SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9	UN	1	$ 134.714.969,00	$ 175.129.460,00	$ 175.129.460,00	1,00	$ 175.129.460,00			$ -			$ -				1,00	$ 175.129.460,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS	UN	6	$ 98.632.736,00	$ 128.222.557,00	$ 769.335.342,00	6,00	$ 769.335.342,00			$ -			$ -				6,00	$ 769.335.342,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	1	$ 9.779.032,00	$ 12.712.742,00	$ 12.712.742,00	1,00	$ 12.712.742,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.712.742,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO	UN	1	$ 7.497.913,00	$ 9.747.287,00	$ 9.747.287,00	1,00	$ 9.747.287,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.747.287,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL	UN	1	$ 10.002.916,00	$ 13.003.791,00	$ 13.003.791,00	1,00	$ 13.003.791,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.003.791,00
7,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	4	$ 11.370.976,00	$ 14.782.269,00	$ 59.129.076,00	4,00	$ 59.129.076,00			$ -			$ -				4,00	$ 59.129.076,00
7,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	7	$ 32.900.858,00	$ 42.771.167,00	$ 299.398.169,00	7,00	$ 299.398.169,00			$ -			$ -				7,00	$ 299.398.169,00

7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	1	$ 4.152.787,00	$ 5.398.623,00	$ 5.398.623,00	1,00	$ 5.398.623,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.398.623,00
7,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	1	$ 45.462.148,00	$ 59.100.792,00	$ 59.100.792,00	1,00	$ 59.100.792,00			$ -			$ -				1,00	$ 59.100.792,00
7,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	1	$ 90.421.405,00	$ 117.547.827,00	$ 117.547.827,00	1,00	$ 117.547.827,00			$ -			$ -				1,00	$ 117.547.827,00
7,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	4	$ 12.809.588,00	$ 16.652.464,00	$ 66.609.856,00	4,00	$ 66.609.856,00			$ -			$ -				4,00	$ 66.609.856,00
7,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	1	$ 83.815.414,00	$ 108.960.038,00	$ 108.960.038,00	1,00	$ 108.960.038,00			$ -			$ -				1,00	$ 108.960.038,00
7,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	4	$ 19.359.640,00	$ 25.167.532,00	$ 100.670.128,00	4,00	$ 100.670.128,00			$ -			$ -				4,00	$ 100.670.128,00
7,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	2	$ 7.942.168,00	$ 10.324.818,00	$ 20.649.636,00	2,00	$ 20.649.636,00			$ -			$ -				2,00	$ 20.649.636,00
7,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12AÑOS	UN	1	$ 68.435.258,00	$ 88.965.965,00	$ 88.965.965,00	1,00	$ 88.965.965,00			$ -			$ -				1,00	$ 88.965.965,00
7,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	1	$ 94.106.736,00	$ 122.338.761,00	$ 122.338.761,00	1,00	$ 122.338.761,00			$ -			$ -				1,00	$ 122.338.761,00
8	GYM BIOSALUDABLE																			
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1	$ 9.353.050,00	$ 12.158.965,00	$ 12.158.965,00	1,00	$ 12.158.965,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.158.965,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1	$ 10.140.021,00	$ 13.182.027,00	$ 13.182.027,00	1,00	$ 13.182.027,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.182.027,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT	UN	1	$ 10.065.989,00	$ 13.085.786,00	$ 13.085.786,00	1,00	$ 13.085.786,00			$ -			$ -				1,00	$ 13.085.786,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO	UN	1	$ 11.269.505,00	$ 14.650.357,00	$ 14.650.357,00	1,00	$ 14.650.357,00			$ -			$ -				1,00	$ 14.650.357,00
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1	$ 9.458.581,00	$ 12.296.051,00	$ 12.296.051,00	1,00	$ 12.296.051,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.296.051,00
8,06	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS	UN	1	$ 4.604.388,00	$ 5.985.704,00	$ 5.985.704,00	1,00	$ 5.985.704,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.985.704,00
8,07	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO	UN	1	$ 4.069.083,00	$ 5.289.808,00	$ 5.289.808,00	1,00	$ 5.289.808,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.289.808,00
8,08	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA	UN	1	$ 7.509.143,00	$ 9.761.886,00	$ 9.761.886,00	1,00	$ 9.761.886,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.761.886,00
8,09	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA	UN	1	$ 7.625.453,00	$ 9.913.089,00	$ 9.913.089,00	1,00	$ 9.913.089,00			$ -			$ -				1,00	$ 9.913.089,00
8,1	GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO	UN	1	$ 2.878.857,00	$ 3.742.514,00	$ 3.742.514,00	1,00	$ 3.742.514,00			$ -			$ -				1,00	$ 3.742.514,00
8,11	GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO).	UN	11	$ 5.118.495,00	$ 6.654.044,00	$ 73.194.484,00	11,00	$ 73.194.484,00			$ -			$ -				11,00	$ 73.194.484,00
8,12	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	9	$ 5.575.998,00	$ 7.248.797,00	$ 65.239.173,00	9,00	$ 65.239.173,00			$ -			$ -				9,00	$ 65.239.173,00
8,13	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	8	$ 3.721.691,00	$ 4.838.198,00	$ 38.705.584,00	8,00	$ 38.705.584,00			$ -			$ -				8,00	$ 38.705.584,00
8,14	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTÁTICA	UN	8	$ 5.551.492,00	$ 7.216.940,00	$ 57.735.520,00	8,00	$ 57.735.520,00			$ -			$ -				8,00	$ 57.735.520,00
8,15	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR. REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA.	UN	9	$ 5.573.576,00	$ 7.245.651,00	$ 65.210.859,00	9,00	$ 65.210.859,00			$ -			$ -				9,00	$ 65.210.859,00
8,16	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	3	$ 5.546.712,00	$ 7.210.726,00	$ 21.632.178,00	3,00	$ 21.632.178,00			$ -			$ -				3,00	$ 21.632.178,00
8,17	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	3	$ 5.048.075,00	$ 6.562.498,00	$ 19.687.494,00	3,00	$ 19.687.494,00			$ -			$ -				3,00	$ 19.687.494,00
8,18	GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	UN	2	$ 3.799.413,00	$ 4.939.237,00	$ 9.878.474,00	2,00	$ 9.878.474,00			$ -			$ -				2,00	$ 9.878.474,00
8,19	GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL.	UN	2	$ 4.117.088,00	$ 5.352.214,00	$ 10.704.428,00	2,00	$ 10.704.428,00			$ -			$ -				2,00	$ 10.704.428,00
8,2	GYM BIOSALUDABLE PARALELA:CALISTENIA.	UN	1	$ 38.172.865,00	$ 49.624.725,00	$ 49.624.725,00	1,00	$ 49.624.725,00			$ -			$ -				1,00	$ 49.624.725,00

8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	1	$ 4.620.677,00	$ 6.006.880,00	$ 6.006.880,00	1,00	$ 6.006.880,00			$ -			$ -				1,00	$ 6.006.880,00
8,22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	1	$ 4.577.884,00	$ 5.951.249,00	$ 5.951.249,00	1,00	$ 5.951.249,00			$ -			$ -				1,00	$ 5.951.249,00
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	4	$ 6.102.981,00	$ 7.933.875,00	$ 31.735.500,00	4,00	$ 31.735.500,00			$ -			$ -				4,00	$ 31.735.500,00
8,24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	3	$ 4.498.843,00	$ 5.731.496,00	$ 17.194.488,00	3,00	$ 17.194.488,00			$ -			$ -				3,00	$ 17.194.488,00
8,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	3	$ 8.296.326,00	$ 10.785.224,00	$ 32.355.672,00	3,00	$ 32.355.672,00			$ -			$ -				3,00	$ 32.355.672,00
8,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS	UN	1	$ 34.752.717,00	$ 45.113.532,00	$ 45.113.532,00	1,00	$ 45.113.532,00			$ -			$ -				1,00	$ 45.113.532,00
8,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	1	$ 60.173.619,00	$ 78.225.705,00	$ 78.225.705,00	1,00	$ 78.225.705,00			$ -			$ -				1,00	$ 78.225.705,00
8,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	1	$ 48.302.775,00	$ 62.793.608,00	$ 62.793.608,00	1,00	$ 62.793.608,00			$ -			$ -				1,00	$ 62.793.608,00
9	INSTALACIONES																				
9,01	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM	UN	1	$ 141.044,00	$ 183.357,00	$ 183.357,00	1,00	$ 183.357,00			$ -			$ -				1,00	$ 183.357,00
9,02	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	$ 110.324,00	$ 143.421,00	$ 143.421,00	1,00	$ 143.421,00			$ -			$ -				1,00	$ 143.421,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1	$ 128.061,00	$ 166.479,00	$ 166.479,00	1,00	$ 166.479,00			$ -			$ -				1,00	$ 166.479,00
9,04	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	1	$ 40.491,00	$ 52.638,00	$ 52.638,00	1,00	$ 52.638,00			$ -			$ -				1,00	$ 52.638,00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC	ML	1	$ 31.506,00	$ 40.958,00	$ 40.958,00	1,00	$ 40.958,00			$ -			$ -				1,00	$ 40.958,00
9,06	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC	UND	1	$ 50.752,00	$ 65.978,00	$ 65.978,00	1,00	$ 65.978,00			$ -			$ -				1,00	$ 65.978,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC	ML	1	$ 37.763,00	$ 49.092,00	$ 49.092,00	1,00	$ 49.092,00			$ -			$ -				1,00	$ 49.092,00
9,08	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC	UND	1	$ 54.339,00	$ 70.641,00	$ 70.641,00	1,00	$ 70.641,00			$ -			$ -				1,00	$ 70.641,00
9,09	PUNTO [SALIDA]SANITARIO DE 2"	UND	1	$ 102.301,00	$ 132.991,00	$ 132.991,00	1,00	$ 132.991,00			$ -			$ -				1,00	$ 132.991,00
9,1	PUNTO [SALIDA] SANITARIO DE 4"	UND	1	$ 151.884,00	$ 197.449,00	$ 197.449,00	1,00	$ 197.449,00			$ -			$ -				1,00	$ 197.449,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC + 2"	ML	1	$ 47.267,00	$ 61.447,00	$ 61.447,00	1,00	$ 61.447,00			$ -			$ -				1,00	$ 61.447,00
9,12	CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND	1	$ 856.854,00	$ 1.113.910,00	$ 1.113.910,00	1,00	$ 1.113.910,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.113.910,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR	UND	1	$ 329.700,00	$ 428.610,00	$ 428.610,00	1,00	$ 428.610,00			$ -			$ -				1,00	$ 428.610,00
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 792.979,00	$ 1.030.873,00	$ 1.030.873,00	1,00	$ 1.030.873,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.030.873,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA	UND	1	$ 557.928,00	$ 725.306,00	$ 725.306,00	1,00	$ 725.306,00			$ -			$ -				1,00	$ 725.306,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	UND	1	$ 979.233,00	$ 1.273.003,00	$ 1.273.003,00	1,00	$ 1.273.003,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.273.003,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC	ML	1	$ 33.396,00	$ 43.415,00	$ 43.415,00	1,00	$ 43.415,00			$ -			$ -				1,00	$ 43.415,00
9,18	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC	UND	1	$ 103.185,00	$ 134.141,00	$ 134.141,00	1,00	$ 134.141,00			$ -			$ -				1,00	$ 134.141,00
9,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERIA TRADICIONAL	UND	1	$ 516.417,00	$ 671.342,00	$ 671.342,00	1,00	$ 671.342,00			$ -			$ -				1,00	$ 671.342,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2"	UND	1	$ 13.785,00	$ 17.921,00	$ 17.921,00	1,00	$ 17.921,00			$ -			$ -				1,00	$ 17.921,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 90.133,00	$ 117.173,00	$ 117.173,00	1,00	$ 117.173,00			$ -			$ -				1,00	$ 117.173,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1	$ 14.516,00	$ 18.871,00	$ 18.871,00	1,00	$ 18.871,00			$ -			$ -				1,00	$ 18.871,00
9,23	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML	1	$ 34.473,00	$ 44.815,00	$ 44.815,00	1,00	$ 44.815,00			$ -			$ -				1,00	$ 44.815,00
9,24	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS	ML	1	$ 6.174,00	$ 8.026,00	$ 8.026,00	1,00	$ 8.026,00			$ -			$ -				1,00	$ 8.026,00
9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00			$ -			$ -				1,00	$ 192.386,00
9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110	UND	1	$ 147.989,00	$ 192.386,00	$ 192.386,00	1,00	$ 192.386,00			$ -			$ -				1,00	$ 192.386,00
9,27	PUESTA A TIERRA (VARILLA COOPER WELL)	UND	1	$ 595.744,00	$ 774.467,00	$ 774.467,00	1,00	$ 774.467,00			$ -			$ -				1,00	$ 774.467,00
9,28	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.527.171,00
9,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	61	$ 81.736,00	$ 106.259,00	$ 6.481.799,00	61,00	$ 6.481.799,00			$ -			$ -				61,00	$ 6.481.799,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE	ML	1	$ 47.585,00	$ 61.861,00	$ 61.861,00	1,00	$ 61.861,00			$ -			$ -				1,00	$ 61.861,00
10	OTROS																				

10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2.50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	UN	1	$ 3.285.568,00	$ 4.271.238,00	$ 4.271.238,00	1,00	$ 4.271.238,00			$ -			$ -				1,00	$ 4.271.238,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL , PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS.	UN	60	$ 349.528,00	$ 454.386,00	$ 27.263.160,00	60,00	$ 27.263.160,00			$ -			$ -				60,00	$ 27.263.160,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAMAÑILERIA MICROPERFORADA	M2	1	$ 170.007,00	$ 221.009,00	$ 221.009,00	1,00	$ 221.009,00			$ -			$ -				1,00	$ 221.009,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	$ 176.784,00	$ 229.819,00	$ 229.819,00	1,00	$ 229.819,00			$ -			$ -				1,00	$ 229.819,00
10,05	PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	GL	1	$ 448.515.000,00	$ 583.069.500,00	$ 583.069.500,00	1,00	$ 583.069.500,00			$ -			$ -				1,00	$ 583.069.500,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.8X0.95 MT 2M UPVC. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 96.720,00	$ 125.736,00	$ 125.736,00	1,00	$ 125.736,00			$ -			$ -				1,00	$ 125.736,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	M2	1	$ 107.481,00	$ 139.725,00	$ 139.725,00	1,00	$ 139.725,00			$ -			$ -				1,00	$ 139.725,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLEDE 60CMS FIJA	UND	1	$ 296.290,00	$ 385.177,00	$ 385.177,00	1,00	$ 385.177,00			$ -			$ -				1,00	$ 385.177,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE	UND	1	$ 642.543,00	$ 835.306,00	$ 835.306,00	1,00	$ 835.306,00			$ -			$ -				1,00	$ 835.306,00
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM	M2	1	$ 358.247,00	$ 465.721,00	$ 465.721,00	1,00	$ 465.721,00			$ -			$ -				1,00	$ 465.721,00
10,11	PUERTA EN ALUMINIO	M2	1	$ 873.142,00	$ 1.135.085,00	$ 1.135.085,00	1,00	$ 1.135.085,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.135.085,00
10,12	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ	UND	1	$ 423.460,00	$ 550.498,00	$ 550.498,00	1,00	$ 550.498,00			$ -			$ -				1,00	$ 550.498,00
10,13	MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES	DIA	1	$ 211.100,00	$ 274.430,00	$ 274.430,00	1,00	$ 274.430,00			$ -			$ -				1,00	$ 274.430,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	1496	$ 103.464,00	$ 134.503,00	$ 201.216.488,00	1.496,00	$ 201.216.488,00			$ -			$ -				1.496,00	$ 201.216.488,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR	M2	1	$ 1.174.747,00	$ 1.527.171,00	$ 1.527.171,00	1,00	$ 1.527.171,00			$ -			$ -				1,00	$ 1.527.171,00
10,16	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600.	M2	1	$ 9.314,00	$ 12.108,00	$ 12.108,00	1,00	$ 12.108,00			$ -			$ -				1,00	$ 12.108,00
10,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA)	ML	3820	$ 144.056,00	$ 187.273,00	$ 715.382.860,00	3.820,00	$ 715.382.860,00			$ -			$ -				3.820,00	$ 715.382.860,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES.	M2	1	$ 381.325,00	$ 495.723,00	$ 495.723,00	1,00	$ 495.723,00			$ -			$ -				1,00	$ 495.723,00
10,19	PROVISION PMT, PMA Y PGS	Gb	1	$ 24.751.519,00	$ 32.176.975,00	$ 32.176.975,00	1,00	$ 32.176.975,00			$ -			$ -				1,00	$ 32.176.975,00
11	ITEMS NO PREVISTOS																			
NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR AZUL C-148, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2		$ 317.494,00	$ 412.742,00										+	30,00	$ 12.382.260,00	30,00	$ 12.382.260,00
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,15X0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLA D = 3/8", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML		$ 67.148,00	$ 87.292,00										+	10,00	$ 872.920,00	10,00	$ 872.920,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI, PARA NIVELACIÓN DE PISOS, REFORZADA CON FIBRAS MACRO SINTÉTICAS, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M3		$ 1.327.806,00	$ 1.726.148,00										+	10,00	$ 17.261.480,00	10,00	$ 17.261.480,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1.2 METROS	ML		$ 222.220,00	$ 288.886,00										+	300,00	$ 86.665.800,00	300,00	$ 86.665.800,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL, CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1.2 METROS	ML		$ 165.429,00	$ 215.058,00										+	170,00	$ 36.559.860,00	170,00	$ 36.559.860,00
NP-06	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 21.673,00	$ 28.183,00										+	1.484,34	$ 41.833.065,00	1.484,34	$ 41.833.065,00

NP-07	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL	M2		$ 87.820,00	$ 114.166,00										+	220,00	$ 25.116.520,00	220,00	$ 25.116.520,00
NP-08	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.2X0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLA D = 3/8", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML		$ 117.651,00	$ 152.946,00										+	170,00	$ 26.000.820,00	170,00	$ 26.000.820,00
NP-09	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML		$ 123.177,00	$ 160.130,00										+	350,00	$ 56.045.500,00	350,00	$ 56.045.500,00

COSTO TOTAL DE OBRA	$ 23.206.163.871,00		$ 23.206.163.871,00		$ (800.140.545,00)		$ 497.402.320,00		$ 302.738.225,00	$ 23.206.163.871,00
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 135.000.000,00		$ 135.000.000,00							$ 135.000.000,00
IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 25.650.000,00		$ 25.650.000,00							$ 25.650.000,00
TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	$ 160.650.000,00		$ 160.650.000,00		$ -		$ -		$ -	$ 160.650.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 23.366.813.871,00		$ 23.366.813.871,00		$ (800.140.545,00)		$ 497.402.320,00		$ 302.738.225,00	$ 23.366.813.871,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por la interventoría revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 06 días del mes de agosto de 2025.

OSCAR MAYA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

DIEGO RADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESCENARIOS EP
CONTRATISTA

CIRO LARA ORDOÑEZ
ASESOR DE DESPACHO
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CERRAMIENTO LADO VIVIENDAS	32.56				32.56		
2. CERRAMIENTO LADO CALLE 13D (cerramiento bandalizado en su totalidad)	61.55				61.55		

Vo. Bo RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	TOTAL PRESENTE ACTA: 94.11


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FA.-29
Versión:	0%
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DI 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

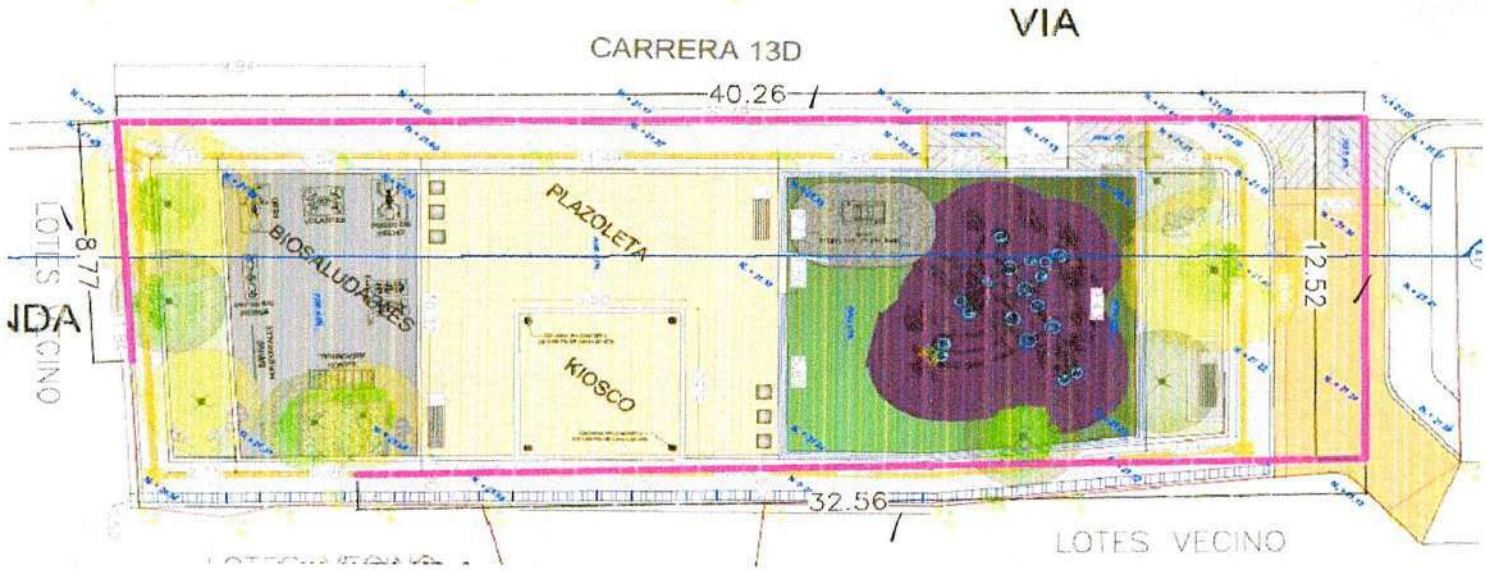

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA** NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
ZONA CANCHA DE FUTBOL							
1. LADO CARRERA 1 (cerramiento afectado por las fuertes lluvias)	44.81		44.81		44.81		
2. LADO CARRERA 1A (reparación)	28.55				28.55		
3. PARTE TRASERA DEL PARQUE	10.40				10.40		
ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES							
1. LADO CARRERA 1 (cerramiento bandalizado)	28.30				28.30		
2. LADO CALLE 50E (movimiento de cerramiento por construcción de anden perimetral)	29.40				29.40		
3. LADO VIVIENDAS (propietaria predio aledaño al parque desmantó cerramiento)	36.24				36.24		
TOTAL PRESENTE ACTA							177.70

Vo. Bo RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo. Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IC-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

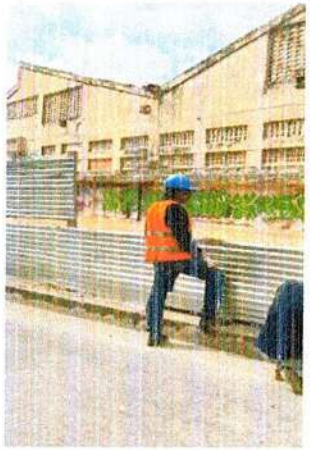



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CERRAMIENTO LADO CARRERA 51	39.50				39.50		
2. CERRAMIENTO LADO CALLE 43 ENTRE CARRERAS 50B Y 51	44.00				44.00		
3. CERRAMIENTO LADO CARRERA 50B	45.15				45.15		
4. CERRAMIENTO LADO CALLE 42	44.65				44.65		

Cantidad contractual según modificatorio N°2	3.015.00
Acumulado anterior	999.57
Acumulado a presente acta	1.444.68
Obra por ejecutar	1.570.32

TOTAL PRESENTE ACTA	173.30


OBSERVACIONES: El cerramiento de Plaza aguila, fue retirado en su totalidad, ya que, las fuertes brisas de la zona lo afectaron, y fué reforzado con listones de mas calibre.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IC-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)

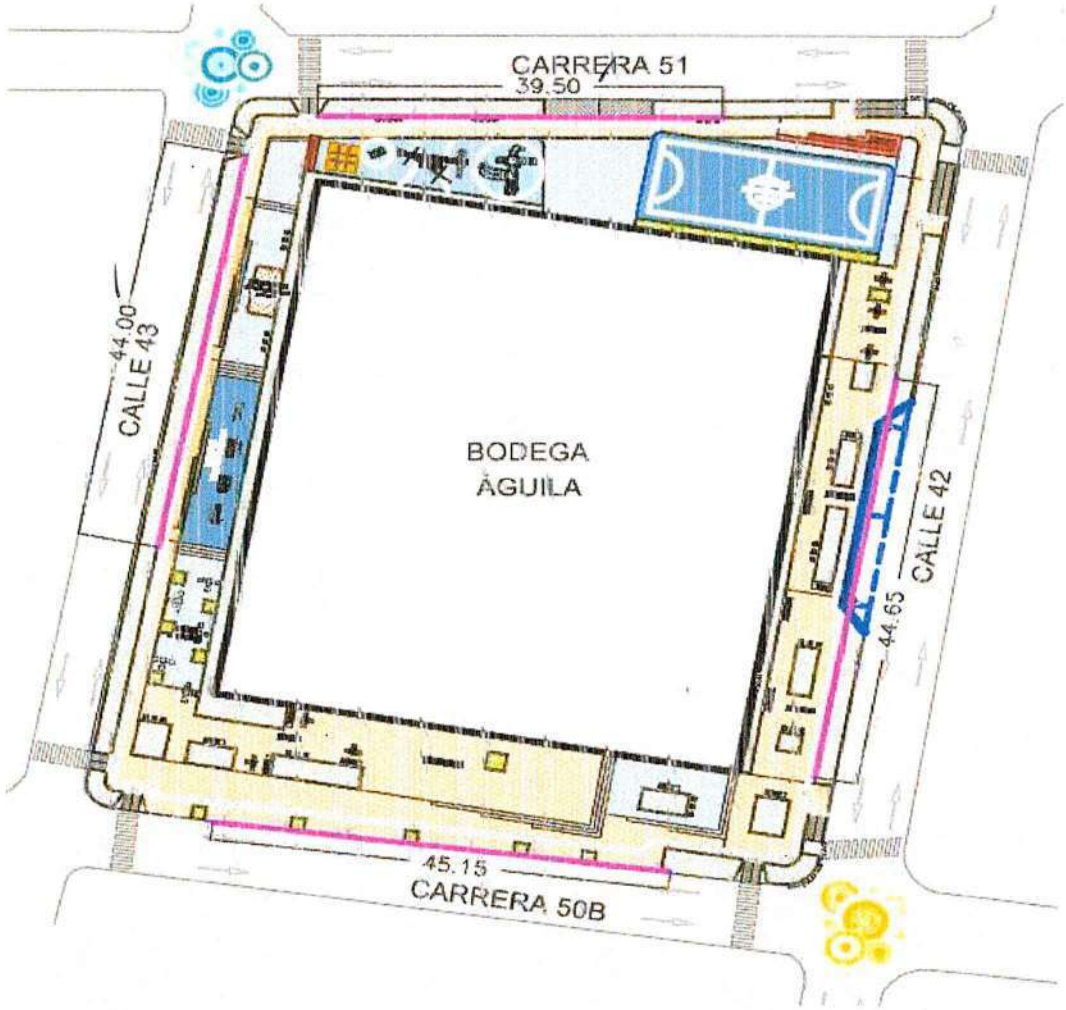

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025			
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM: 1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL DEL PARQUE						1411.13	

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,411.13

OBSERVACIONES: se realizó nivelación y replanteo del parque, por ajuste a los diseños iniciales.


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

ÁREA DE NIVELACIÓN =
1.411.13 M2

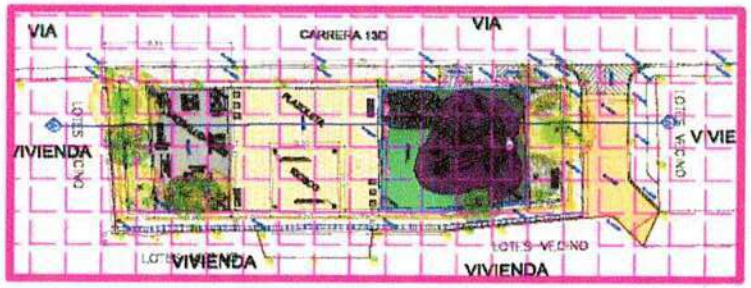

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL DEL PARQUE						3597.99	


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	TOTAL PRESENTE ACTA:	3,597.99
		OBSERVACIONES:	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 3 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

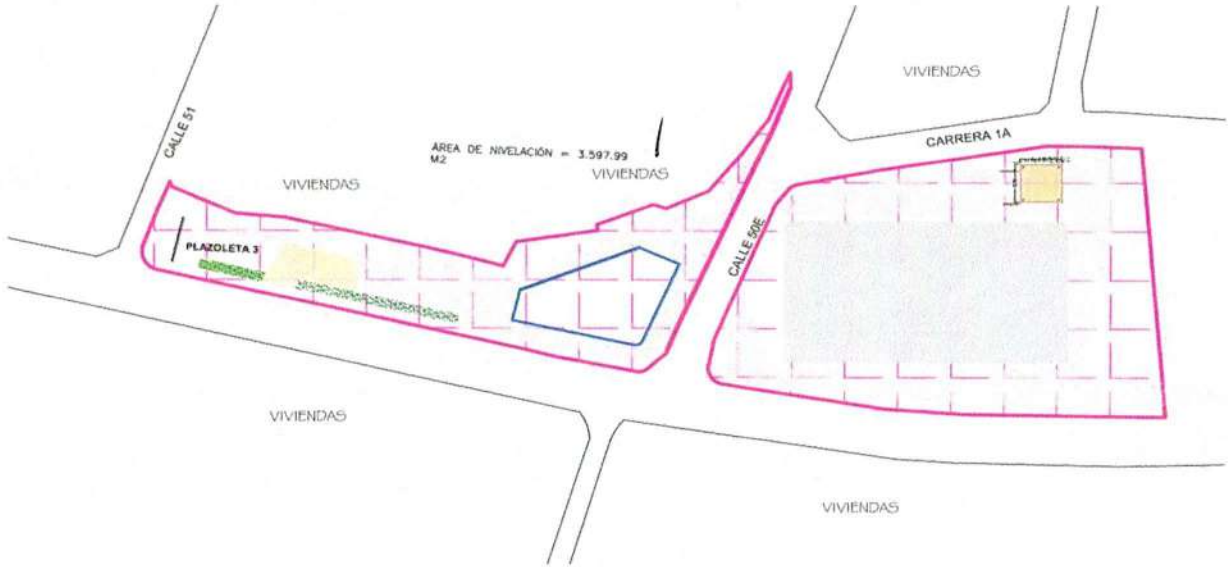

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (AJUSTES A DISEÑOS)						6221.18	
TOTAL PRESENTE ACTA:							6,221.18


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8901020181		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

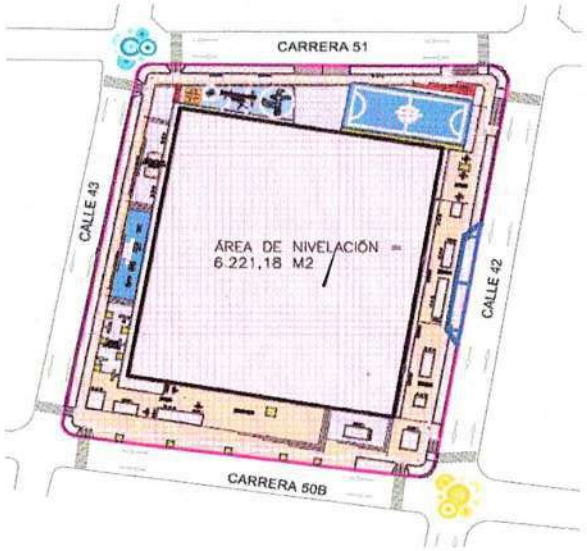

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (SEGÚN AJUSTE A DISEÑOS)						5323.58	
TOTAL PRESENTE ACTA:							5,323.58


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORYA MALECON
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

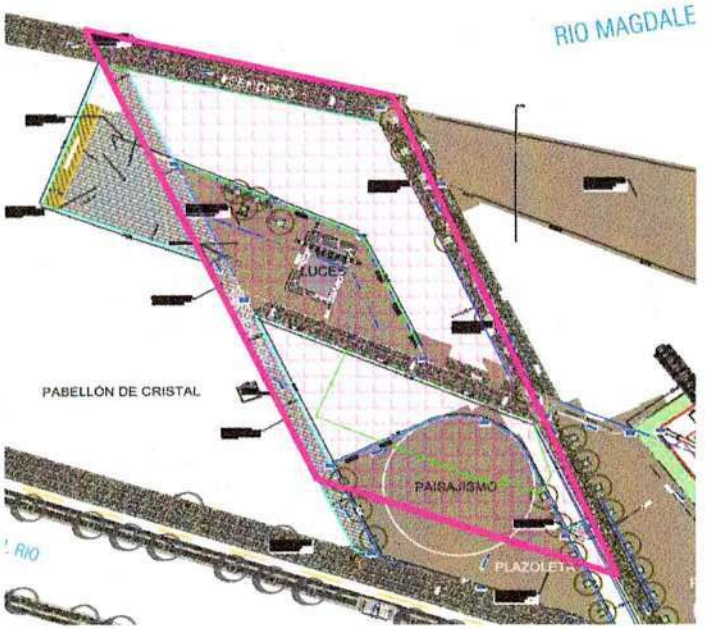

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO.

PARQUE BARLOVENTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYE ARROYO Y VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						7157.60	
TOTAL PRESENTE ACTA:							7,157.60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


AREA DE
LEVANTAMIENTO
7157,6 M2

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LA PIÑUELA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						1246.95	
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,246.95

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA PINUELA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE SAN SALVADOR

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

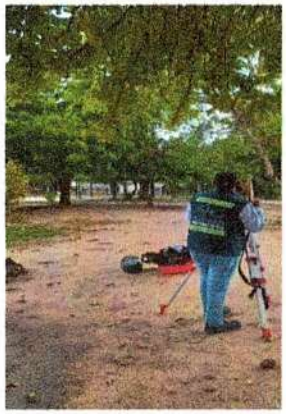

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						3152.70	
TOTAL PRESENTE ACTA:							3,152.70

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE SAN SALVADPR
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMIANRES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE SIAPE

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						3245.31	
TOTAL PRESENTE ACTA:							3,245.31

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE SIAPE
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025			
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE PUENTE CARRERA 38

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						22307.04	
TOTAL PRESENTE ACTA:							22,307.04

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PUENTE CARRERA 38
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025			
CAPITULO:	PRELIMIANRES	**CÓDIGO DEL ITEM:** 1.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LOS ENAMORADOS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						14508.31	

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	**Vo.Bo. INTERVENTORIA:**	**TOTAL PRESENTE ACTA:** 14,508.31

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 2 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LOS ENAMORADOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	PRELIMIANRES / **CÓDIGO DEL ITEM:** 1,03	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .

PARQUE LOS MUSICOS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1, NIVELACION Y REPLANTEO DEL AREA TOTAL POR TOPOGRAFÍA (INCLUYENDO VÍAS ALEDAÑAS AL PARQUE)						28264.16	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**150,000.00**						
Acumulado anterior	**52,411.78**						
Acumulado a presente acta	**148,847.73**						
Obra por ejecutar	**1,152.27**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**28,264.16**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LOS MUSICOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .



AREA DE LEVANTAMIENTO= 28.264,16 M2

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.04	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DEMOLICION JARDINERAS EXISTENTES	42.00				42.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	312.00						
Acumulado anterior	73.00						
Acumulado a presente acta	115.00						
Obra por ejecutar	197.00						
TOTAL PRESENTE ACTA:							42.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA PLAZOLETA)	84.00				84.00		
2. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA ANDEN ALEDAÑO A PREDIOS)	36.80				36.80		
TOTAL PRESENTE ACTA:							120.80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DEL TERRENO NATURAL (ZONA DONDE ESTÁ UBICADO EL KIOSKO LADO DE LA 1A)	35.50				35.50		
2. DEMOLICIÓN DE VIGAS EXISTENTES EN ZONA DE BIOSALUDABLE SOBRE CALLE 50E Y ZONA VERDE SOBRE CARRERA 1	175.00				175.00		
3, DEMOLICIÓN DE VIGAS ZONA CANCHA	84.00				84.00		
TOTAL PRESENTE ACTA:							294.50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

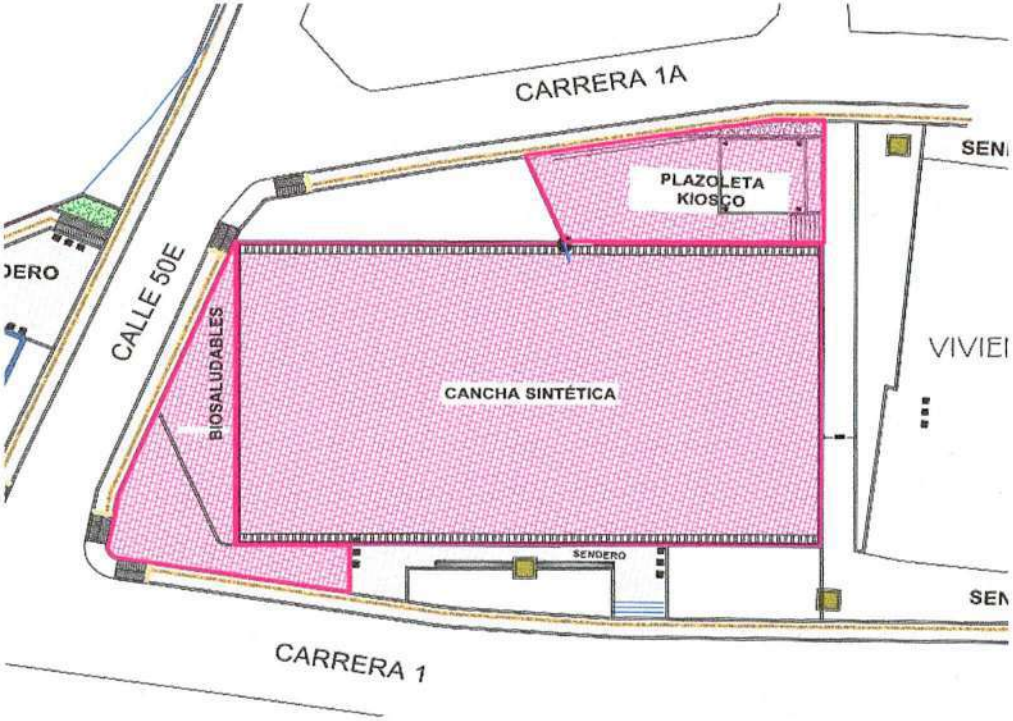

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1


CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"	
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM: 1.09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DEMOLICIÓN VIGAS ENCONTRADAS DEBAJO DE LOSA EXISTENTE (PERIMETRO BODEGA)	218.78				218.78		
2. DEMOLICIÓN VIGA ACCESO VEHICULAR ENTRADA A BODEGA SOBRE CARRERA 51B	36.76				36.76		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,584.00						
Acumulado anterior	155.00						
Acumulado a presente acta	825.84						
Obra por ejecutar	758.16						

TOTAL PRESENTE ACTA:	255.54


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8901020184-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION

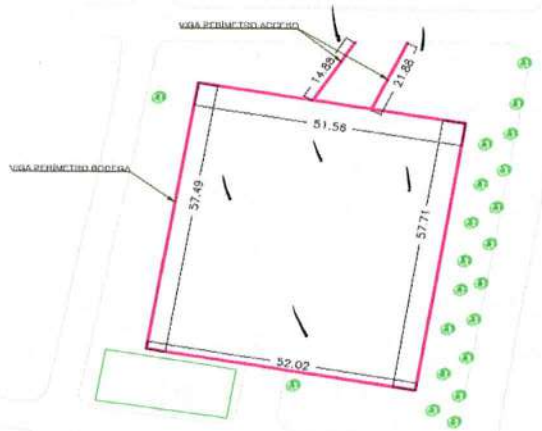

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/05/2021
Páginas:	1 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO	17/01/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM	1.12	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

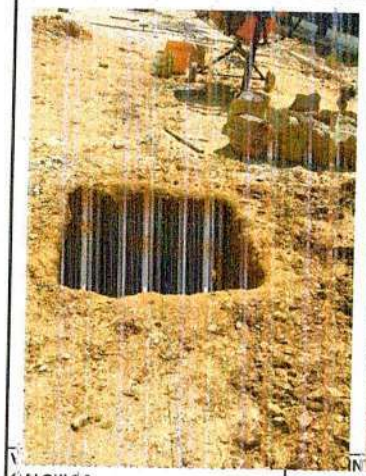


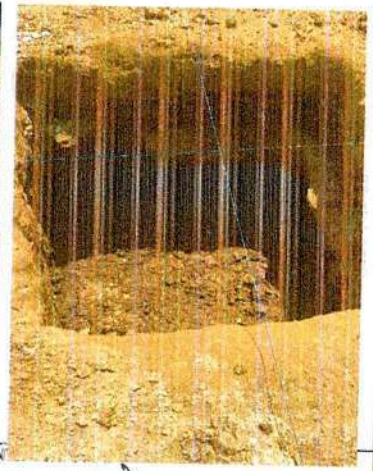

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		MI	M2	M3
1. DEMOLICION DE PLACA ENCONTRADA EN ZONA DE KIOSKO	14.50	9.60				139.20	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

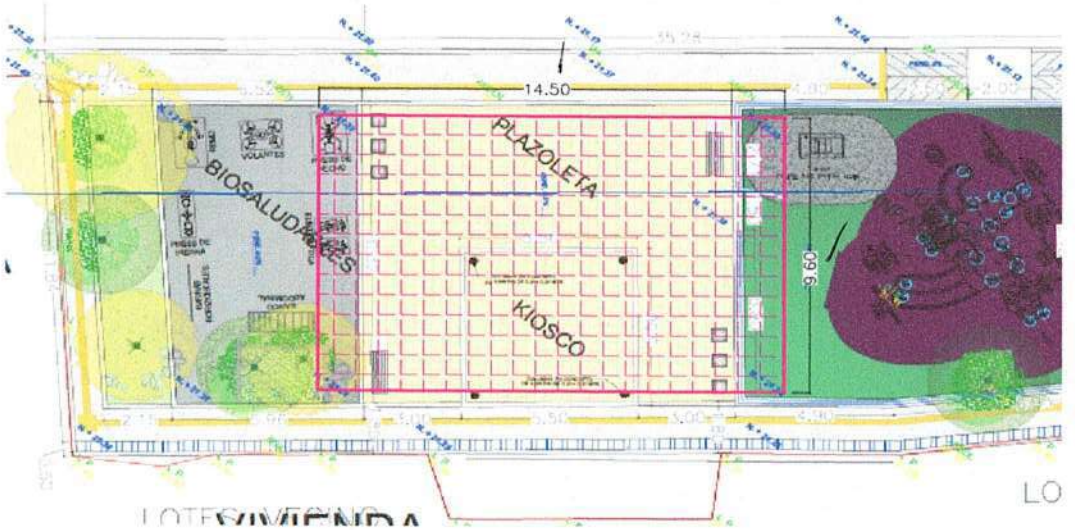

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 A 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. DEMOLICIÓN DE PLACA EN ZONA JUEGOS INFANTILES Y PLAZOLETA 3 (PLACA FRENTE A PREDIOS)	58.80	2.87				168.76	
TOTAL PRESENTE ACTA:							168.76


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

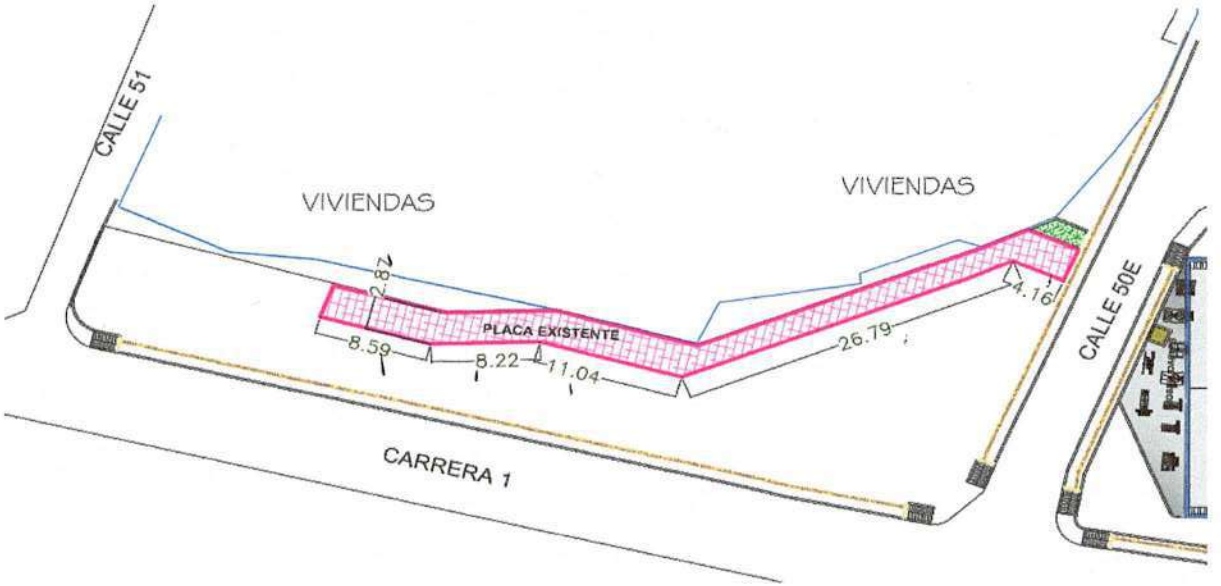

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	4 DE 4

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	**CÓDIGO DEL ITEM:**	1.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

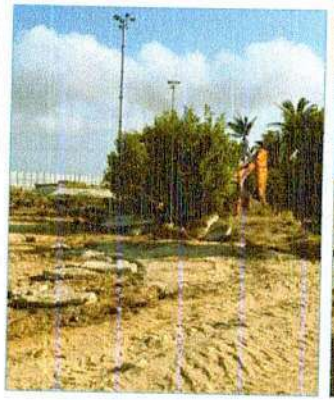



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1, DEMOLICION DE PLACA 0,10 - 0,30, PLACA EN CONCRETO UBICADA EN LA INTERSECCION DEL SENDERO CON LA VIA DE ACCESO VEHICULAR						165.35	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	5,800.00						
Acumulado anterior	4,214.90						
Acumulado a presente acta	4,688.21						
Obra por ejecutar	1,111.79						


TOTAL PRESENTE ACTA:	165.35

OBSERVACIONES: EN EL ACTA 1 SE HIZO UN COBRO PARCIAL DE LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA EN LA NORIA, EN ESTA SE ESTÁ COBRANDO EL EXCEDENTE.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA MALECON
DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M

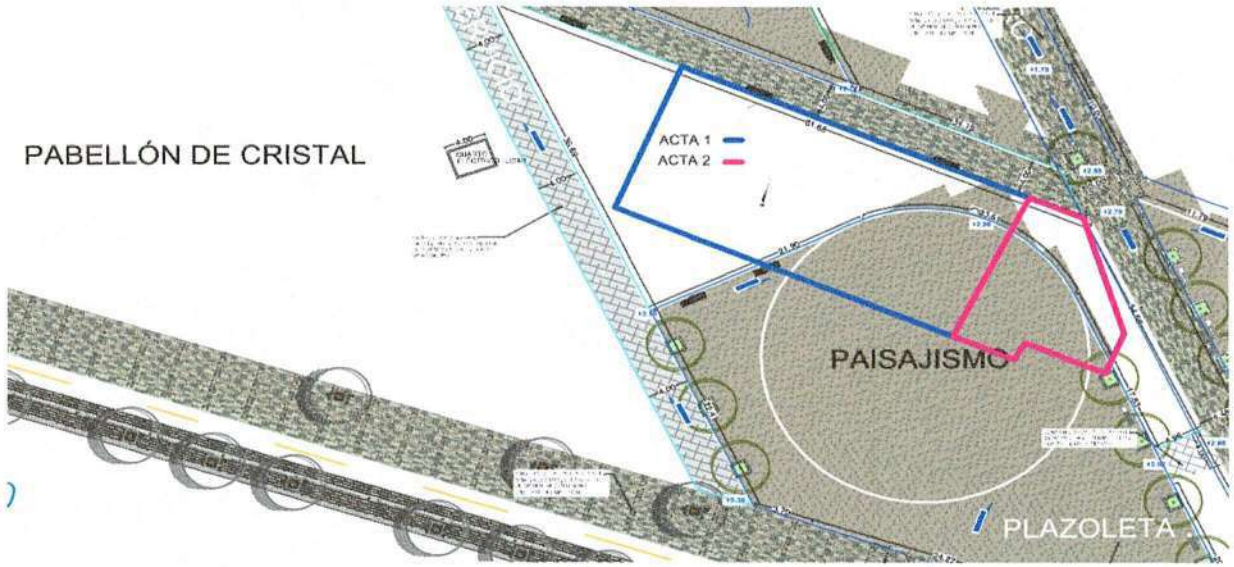

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	10-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1


CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 16/08/2026				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	1.15	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





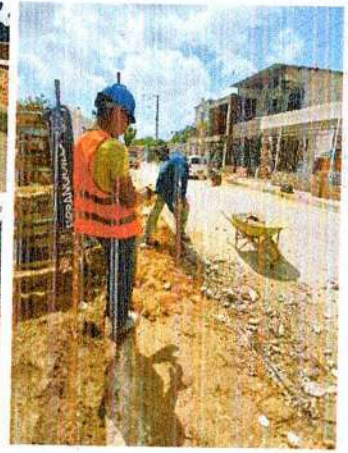

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DEMOLICION BORDILLO DEL ANDEN DE LA VÍA PRINCIPAL	57.67				57.67		
2. DEMOLICION BORDILLO (LADO DE POMPEYANO)	16.14				16.14		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	3,431.00						
Acumulado anterior	195.12						
Acumulado el presente acta	268.93						
Obra por ejecutar	3,162.07						
TOTAL PRESENTE ACTA:							73.81

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	1.39	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

PARQUE LA NORIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. DESCAPOTE SOBRE ÁREA DE SENDERO						592.30	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	26,982.00						
Acumulado anterior	6,473.85						
Acumulado a presente acta	7,066.15						
Obra por ejecutar	19,915.85						

TOTAL PRESENTE ACTA:	592.30

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA MALECON

DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25

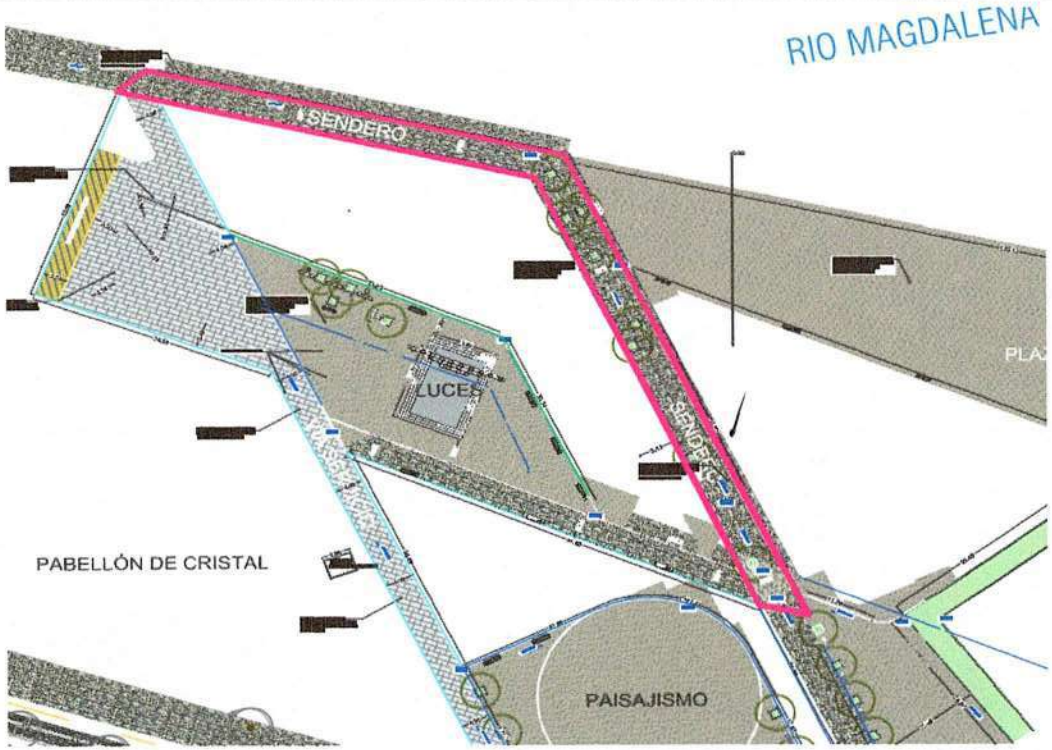

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

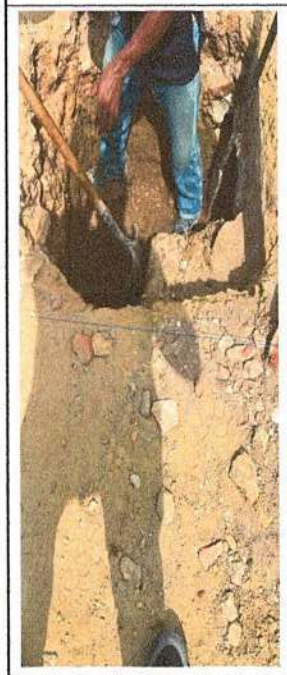




LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1 EXCAVACION ACCESO CASA 2	9.40	2.95	0.40				11.09
2. EXCAVACION RAMPA DE ACCESO A CASA 5	3.00	3.00	0.40				3.60
3. EXCAVACION DE ZAPATAS PARA KIOSKO	1.20	1.20	1.20	4.00			6.91
4. EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS	4.00	0.50	1.20	4.00			9.60
5. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 1	16.10	0.50	1.20				9.66
6. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 2	11.40	0.50	1.20				6.84
7. EXCAVACIONES PARA ALCORQUE 3	16.10	0.50	1.20				9.66
TOTAL PRESENTE ACTA:							57.36

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES: LA LONGITUD DE LOS ALCORQUES ES POR PERIMETRO.

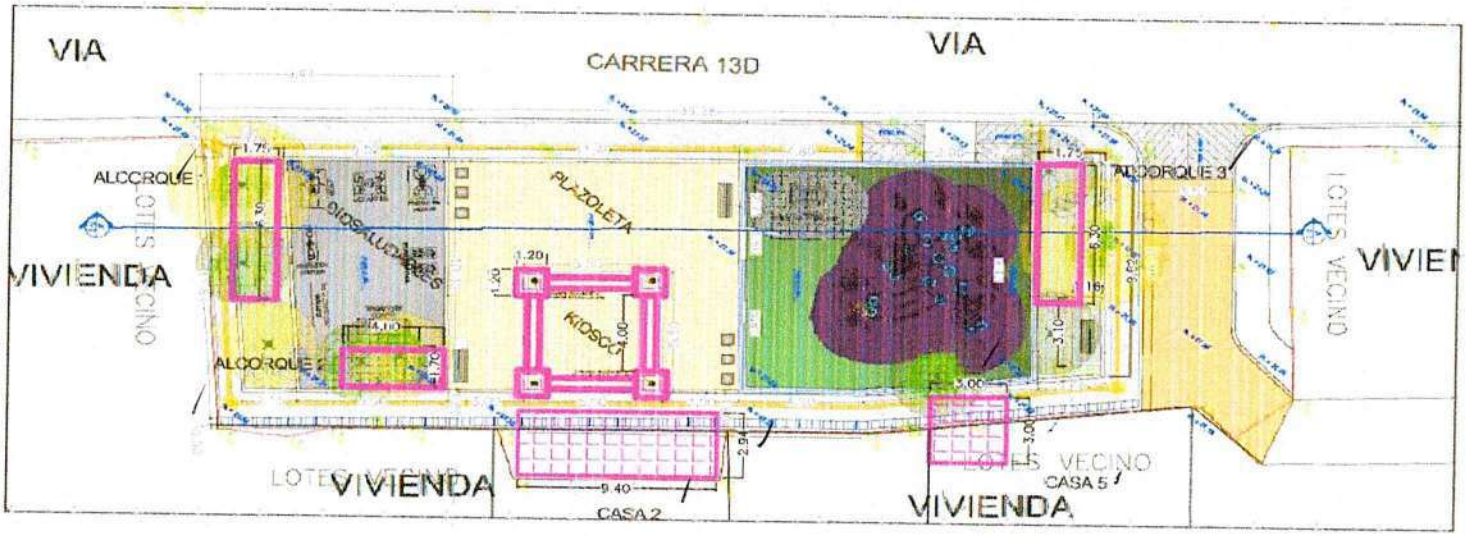
VIA
CARRERA 13D
VIA
ALCORQUE
ALCORQUE 3
PLAZOLETA
KIOSCO
LOTES VECINO
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
CASA 2
CASA 5
LOTES VECINO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)









LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE PLAZOLETA ZONA KIOSKO			0.30			139.61	41.88
2. EXCAVACION ALCORQUE PLAZOLETA ZONA KIOSKO	1.50	1.50	1.20				2.70
3. EXCAVACION CARCAMO CANCHA DE FUTBOL	37.20	0.70	0.70	2.00			36.46
4. ESCALERAS DE ACCESO SENDERO 1	1.10	3.50	0.40				1.54
5. EXCAVACION A MANO SENDERO PARALELO A LA CARRERA 1, AREA POR AUTOCAD			0.30			45.83	13.75
6. ZONA DE JUEGO INFANTILES AREA POR AUTOCAD			0.30			370.15	111.05
7. ZONA PLAZOLETAS AL LADO DE JUEGOS INFANTILES			0.30			429.28	128.78

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

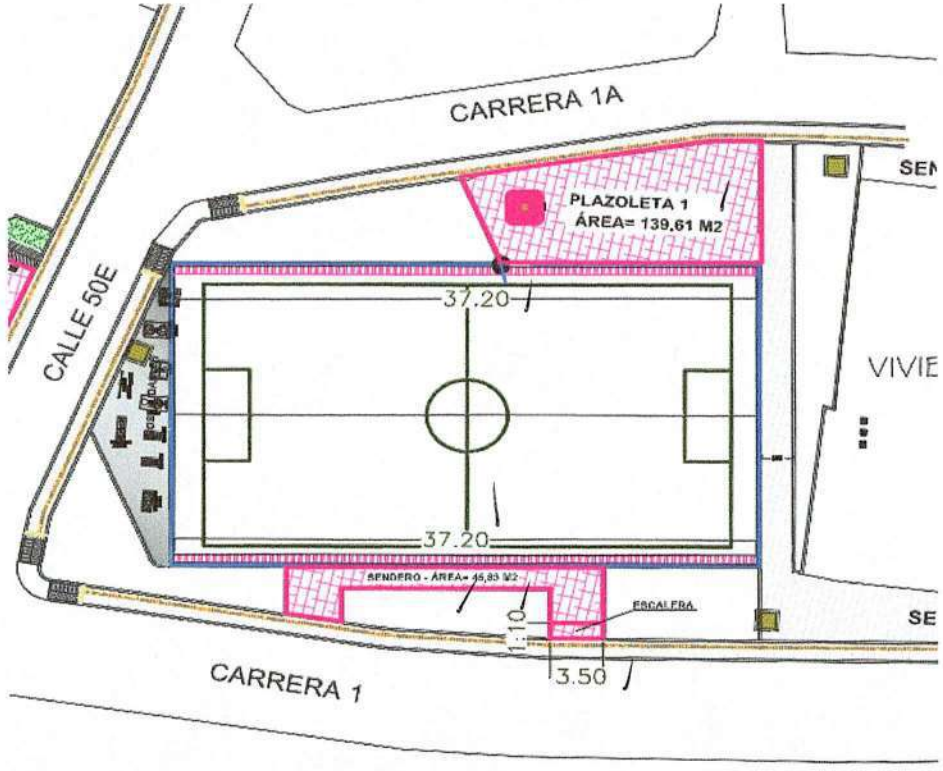

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código: IO-FM-29 Versión: 02 Fecha: 06/09/2021 Páginas: 1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

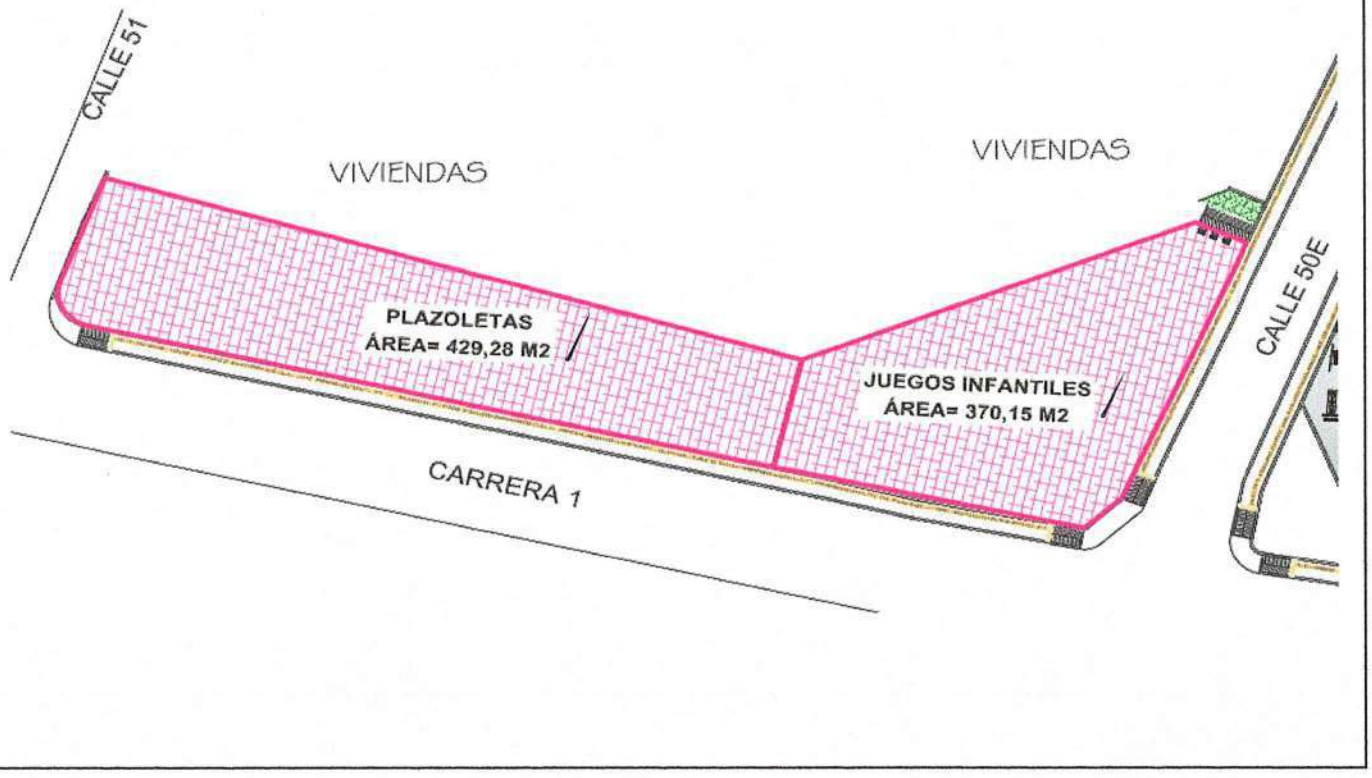

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE LA NORIA MALECON


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION A MANO SENDERO ADYACENTE AL CERRAMIENTO PERIMIETRAL			0.36			592.40	213.26

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE NORIA MALECON
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

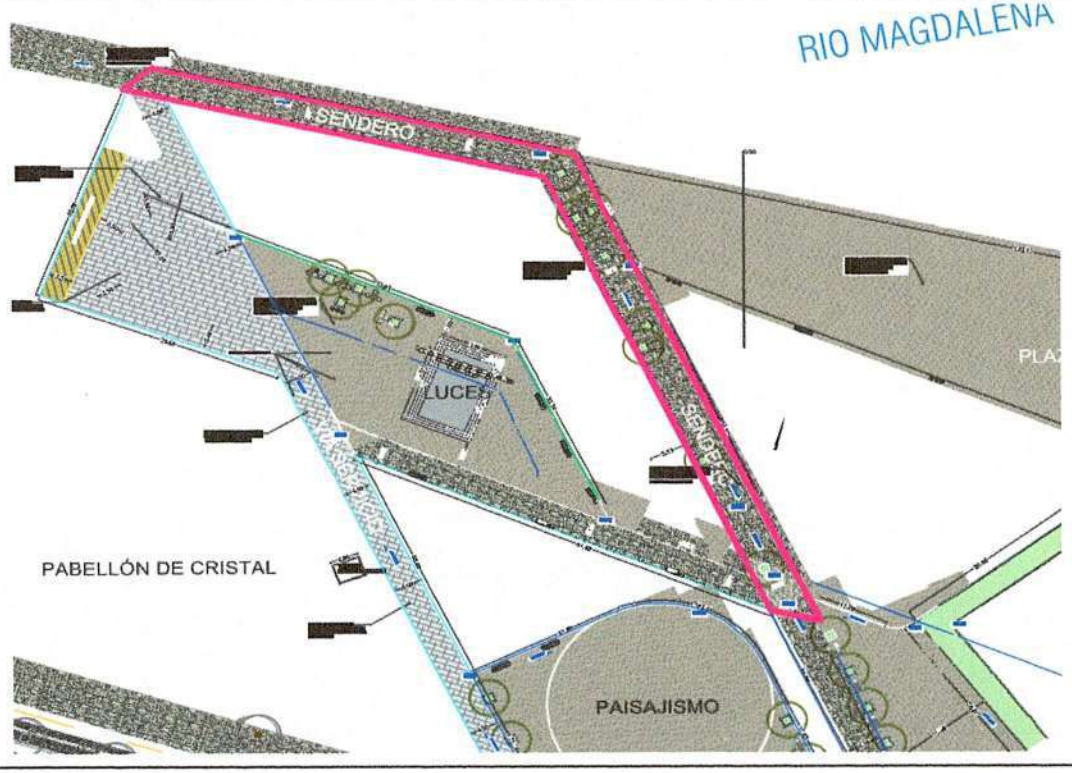

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102015-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	3 DE 3

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10	0.30				16.50
Cantidad contractual según modificatoria N°2	8,177.96						
Acumulado anterior	424.47						
Acumulado a presente acta	1,047.75						
Obra por ejecutar	7,130.21						

TOTAL PRESENTE ACTA:	16.50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

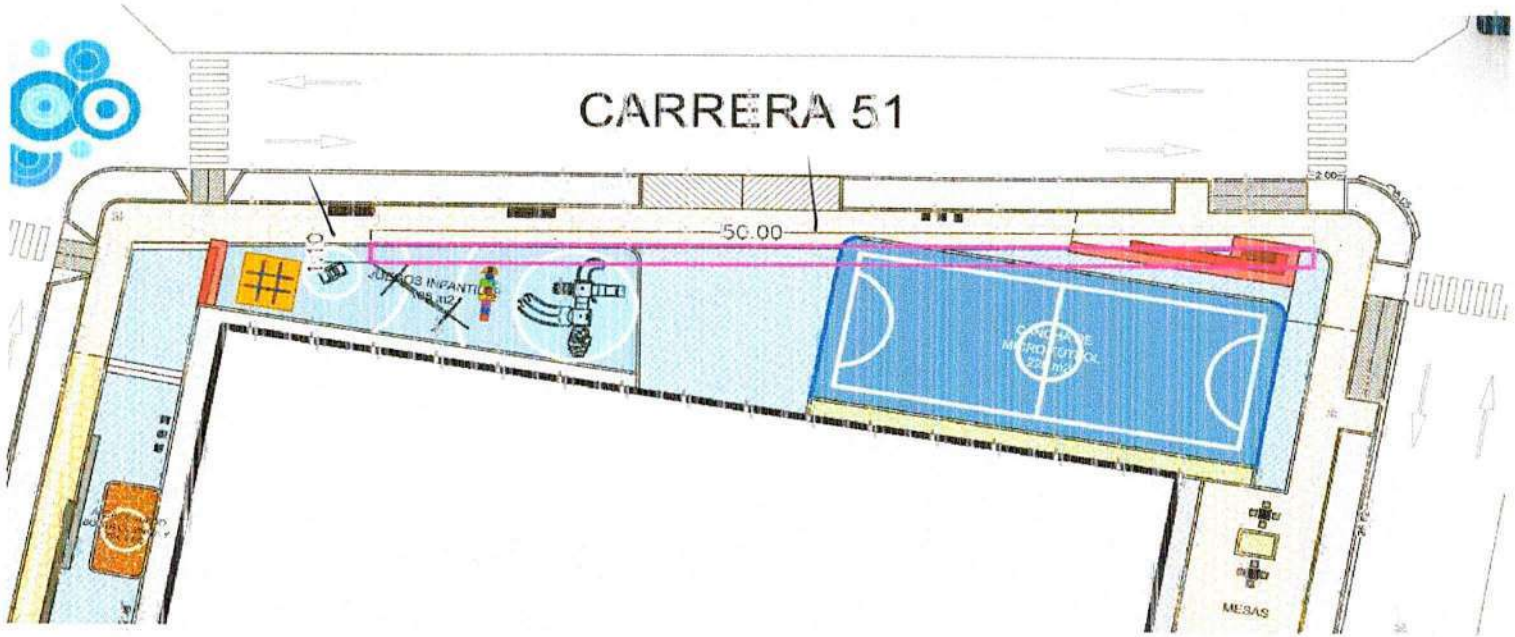

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION VIGA PERIMETRAL JUEGO INFANTILES	44.84				44.84		
2. EXCAVACION VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA DEL KIOSKO	44.54				44.54		
3 EXCAVACION VIGA PERIMETRAL BIOSALUDABLE	24.32				24.32		
4. EXCAVACION VIGA PARALELA A PREDIOS	37.80				37.80		
5. EXCAVACION VIGA PARALELA A PREDIO CONTIGUO AL PARQUE (ZONA VERDE)	28.40				28.40		
6. EXCAVACION DE VIGA PERIMETRAL DE PLAZOLETA ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y VIA DE ACCESO	15.72				15.72		
7. EXCAVACIÓN DE VIGA ENTRE JARDINE Y JUEGOS INFANTILES	11.84				11.84		
TOTAL PRESENTE ACTA:							207.46


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

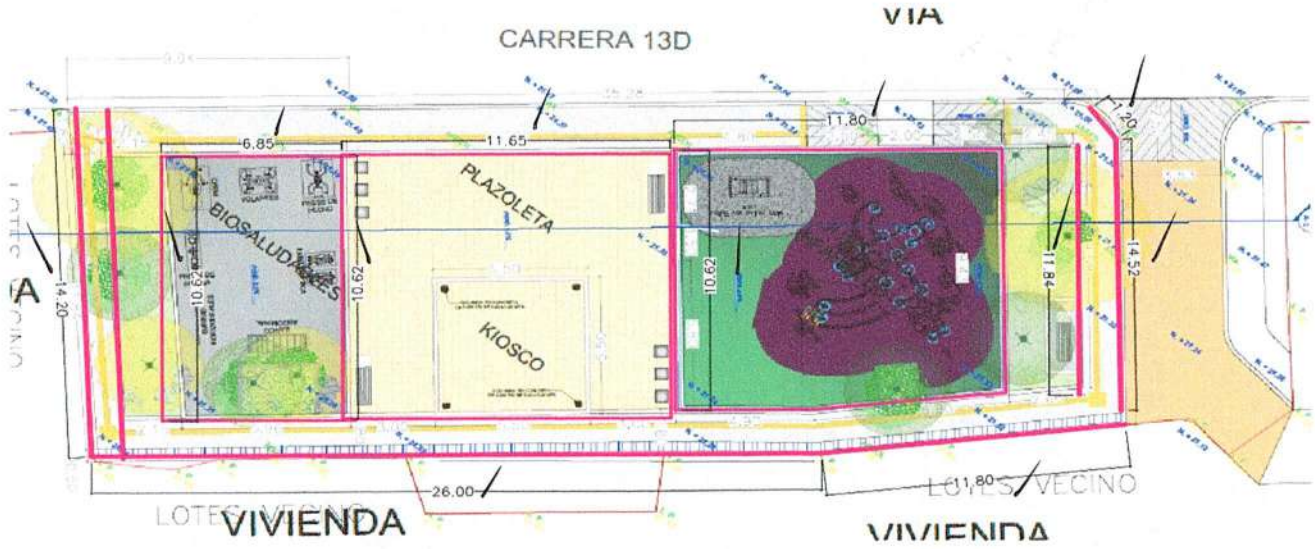

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	TO-FM-29
Versión:	02
Fecha	06/09/2021
Página:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4		OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)"	
PERIODO:	17/06/2024 - 15/08/2024				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CODIGO DEL ITEM: 2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN DE 0.40 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	

PARQUE LA NOVIA MALECON

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA M)	CANT	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA ADYACENTE AL AREA DE LUCES					67.80		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 131.25 NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

LA NORIA MALECON
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

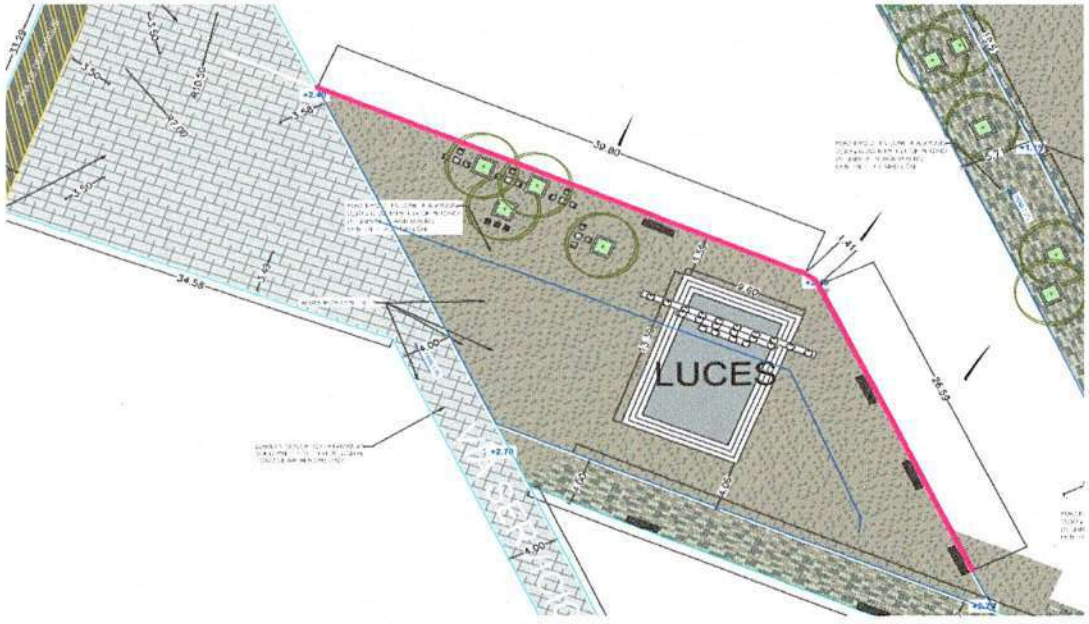

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA 30 X 30 PERIMETRO JUEGOS INFANTILES					57.53		
TOTAL PRESENTE ACTA:							57.53

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 131.25
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

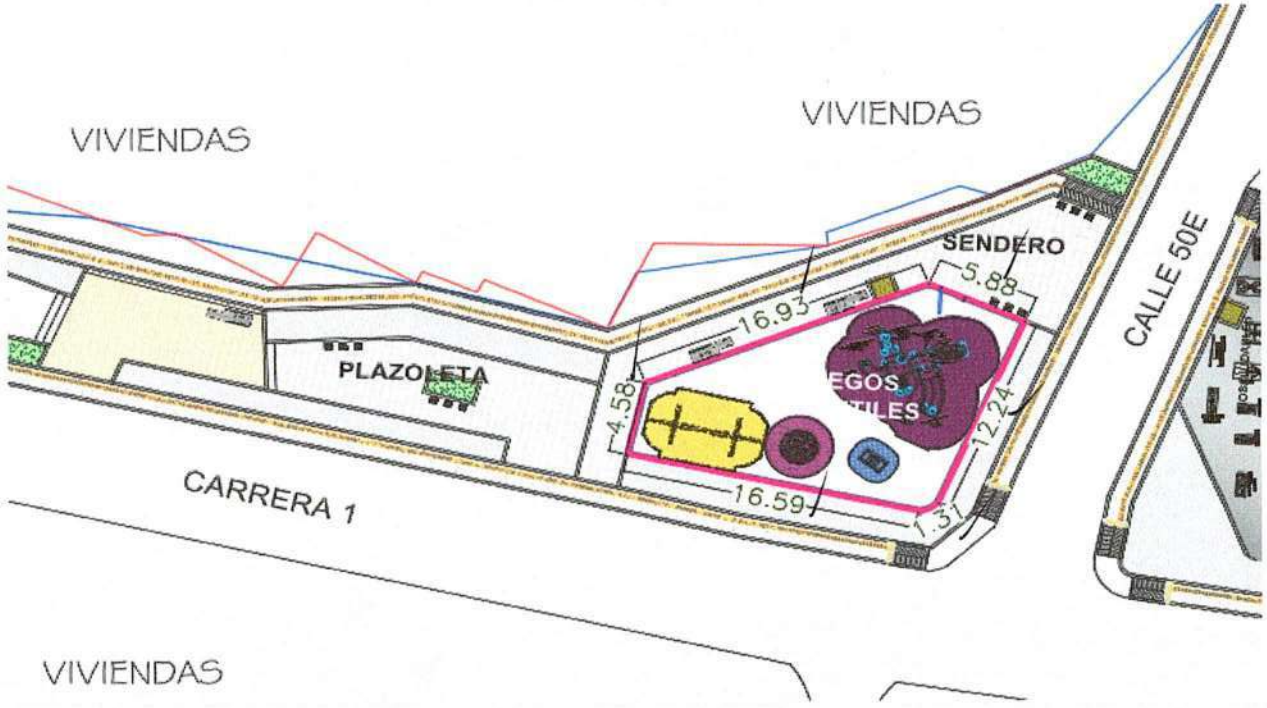

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA 30X30 CANCHA DE FUTBOL					36.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,783.00						
Acumulado anterior	477.84						
Acumulado a presente acta	846.63						
Obra por ejecutar	936.37						

TOTAL PRESENTE ACTA:	36.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 191.25 NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.03	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA POR CARTERAS TOPOGRÁFICAS (LADO 51)			0.50			763.10	381.55
2. EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA POR CARTERAS TOPOGRÁFICAS (LADO 50B)			0.50			920.77	460.39
Cantidad contractual según modificatoria N°2	8,747.00						
Acumulado anterior	547.67						
Acumulado a presente acta	1,389.61						
Obra por ejecutar	7,357.40						
TOTAL PRESENTE ACTA:							841.94


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO

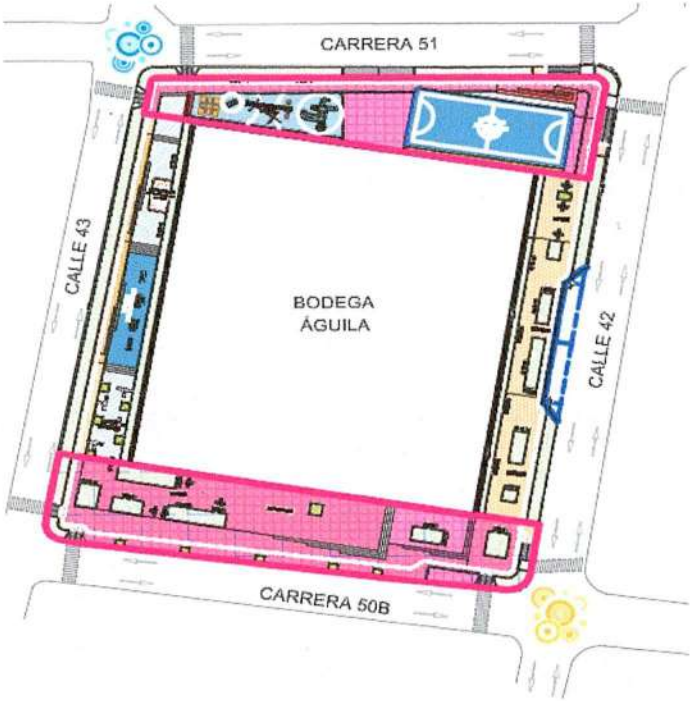

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA CORTE CARRERA 50B								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	36,02		0,00		0	0		
0+03,00	36,02		3,00		108,06	108,06		
0+06,00	36,02		3,00		108,06	216,12		
0+009,00	36,02		3,00		108,06	324,18		
0+012,00	28,64		3,00		85,91	410,09		
0+017,37	9,37		5,37		50,30	460,39		

TOTAL VOLUMEN CORTE	**460,39**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA RELLENO CARRERA 50B								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	36,02		0,00				0	0
0+03,00	36,02		3,00				108,06	108,06
0+06,00	36,02		3,00				108,06	216,12
0+009,00	36,02		3,00				108,06	324,18
0+012,00	28,64		3,00				85,91	410,09
0+017,37	9,37		5,37				50,30	460,39

TOTAL VOLUMEN CORTE	**460,39**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO.
T.P. 01-17145 del **C.P.N.T**
TOPOGRAFO PROFESIONAL

Fabio Ruiz Bolivar
N° = 08202-3373326 ATL
COPNIA

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA CORTE CARRERA 51								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00		33,36		0,00	0	0		
0+03,00		33,36		3,00	100	100,08		
0+06,00		33,36		3,00	100	200,16		
0+009,00		24,36		3,00	73	273,24		
0+012,00		15,04		3,00	45	318,35		
0+016,43		14,27		4,43	63	381,55		

TOTAL VOLUMEN CORTE	**381,55**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE PLAZA AGUILA RELLENO CARRERA 51								
ESTACION	AREAS (M2)		DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	33,36		0,00				0	0
0+03,00	33,36		3,00				100,08	100,08
0+06,00	33,36		3,00				100,08	200,16
0+009,00	24,36		3,00				73,08	273,24
0+012,00	15,04		3,00				45,11	318,35
0+016,43	14,27		4,43				63,21	381,55

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN	**381,55**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO.
T.P. 01-17145 del **C.P.N.T**
TOPOGRAFO PROFESIONAL

Fabio Ruiz Bolivar
N° = 08202-3373326 ATL
COPNIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TERRAZA CASA 2	9.40	2.94	0.20	1.00			5.53
2. RELLENO CON MATERIAL SELLECCIONADO DE CANTERA RAMPA DE ACCESO A CASA 5	3.00	3.00	0.20	1.00			1.80
3. RELLENO DE ZAPATAS PARA ESTRUCTURA METALICA	1.20	1.20	0.90	4.00			5.18
4. RELLENO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	11.80	10.62	0.20	1.00			25.06
5. RELLENO DE ZONA BIOSALUDABLE	6.85	10.62	0.20	1.00			14.55
6. RELLENO DE ZONA PLAZOLETA KIOSKO	11.65	10.62	0.20	1.00			24.74
TOTAL PRESENTE ACTA:							76.87

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8901020184-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)



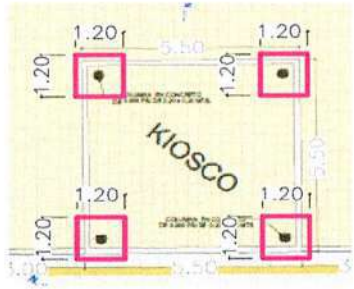

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102015-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. RELLENO ZONA DE JARDINERA Y PLAZOLETA KIOSKO			1.10			224.61	247.07
2. SENDERO PARALELO A LA CARRERA 1, AREA POR AUTOCAD SENDERO 1			1.10			45.83	50.41
3. RELLENO DE SENDERO PEATONAL LADO VIVIENDAS	30.76	2.00	1.45				89.20
4. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA DE JUEGO INFANTILES			0.65			370.15	240.60
5. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA PLAZOLETAS AL LADO DE JUEGOS INFANTILES			0.55			429.28	236.10
6. RELLENO CANCHA FUTBOL (ALTURA FINAL)	37.80	21.70	0.20				164.05
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,027.44

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
PIH: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CAMICHE)

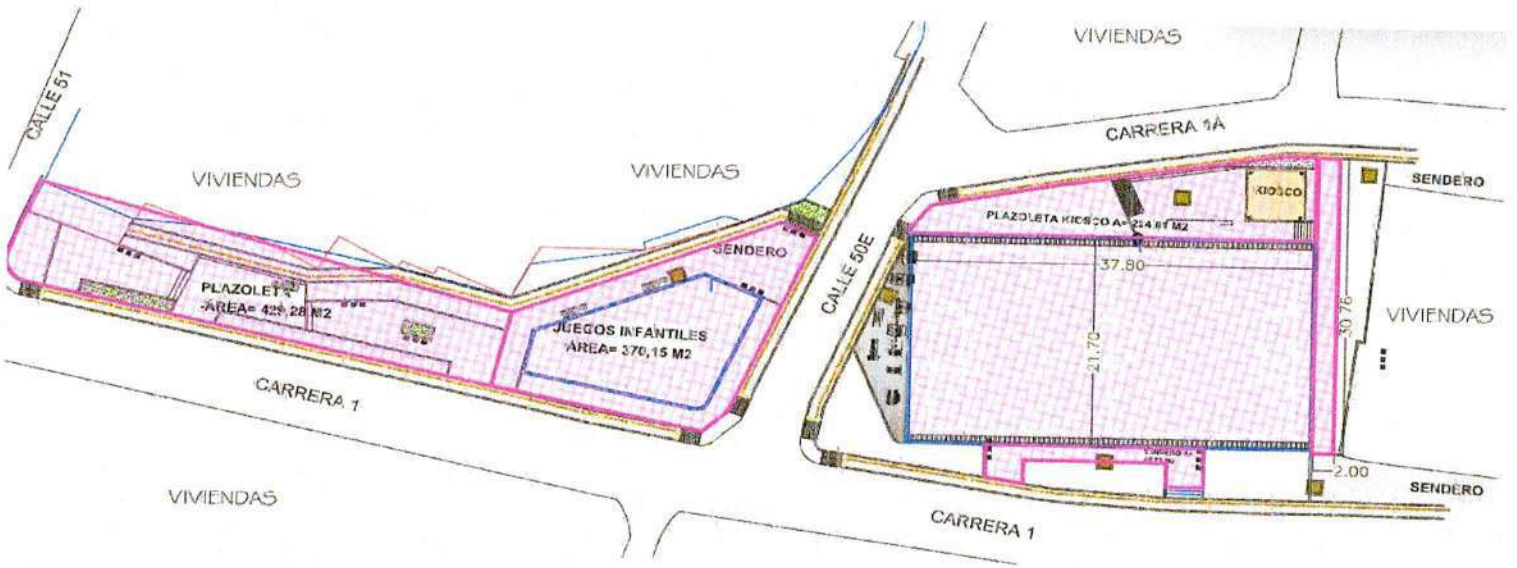


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

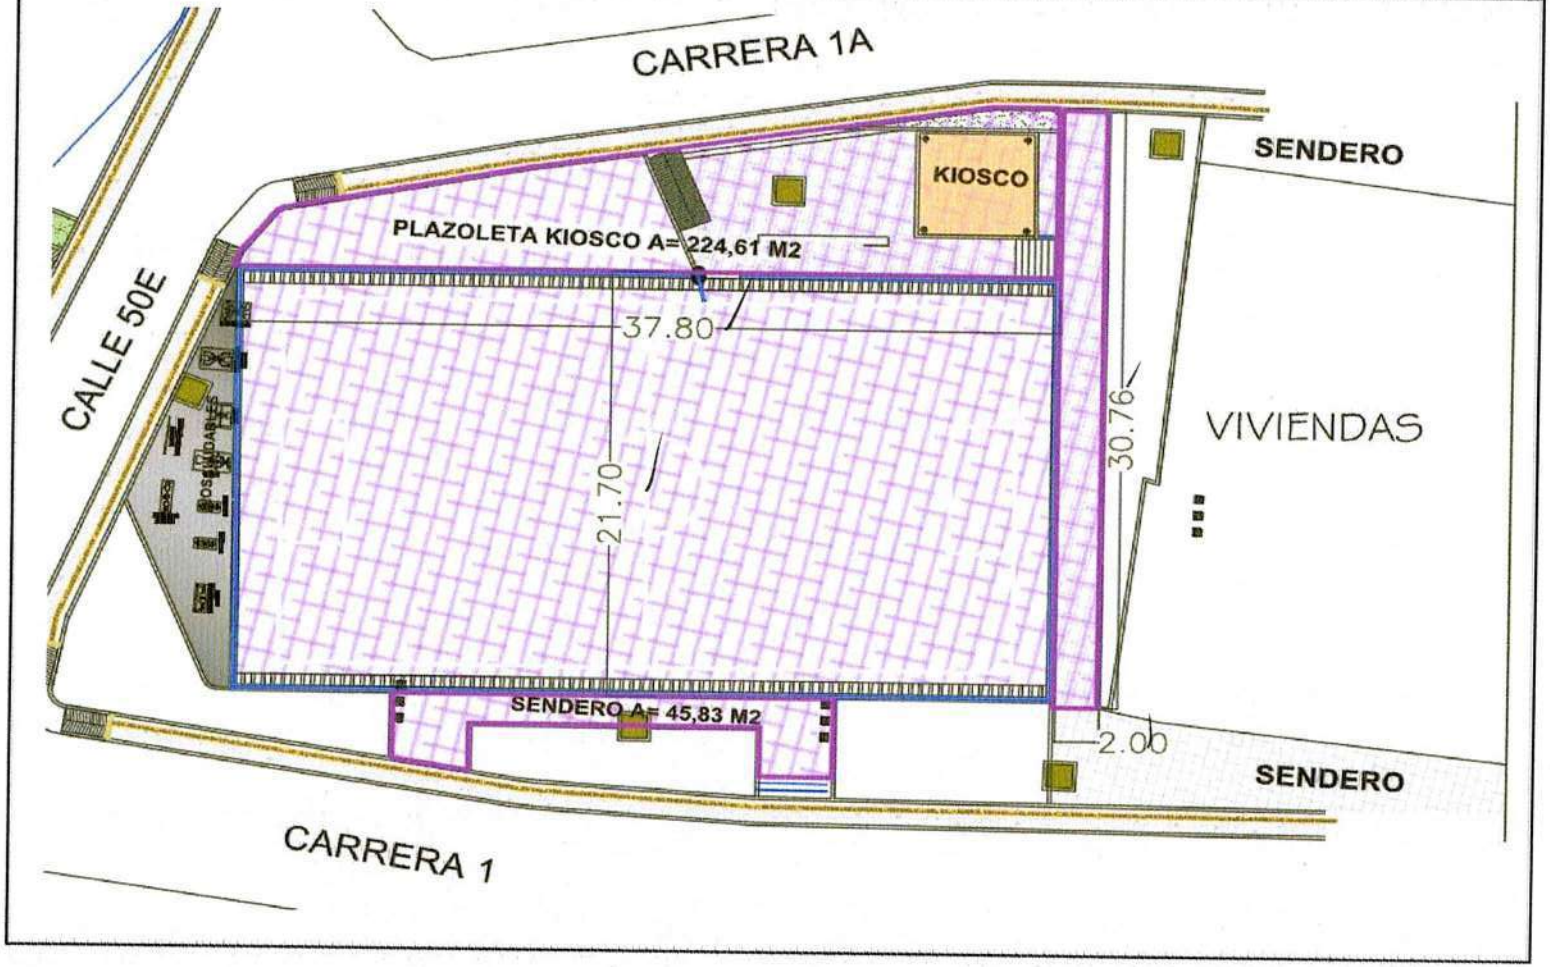


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

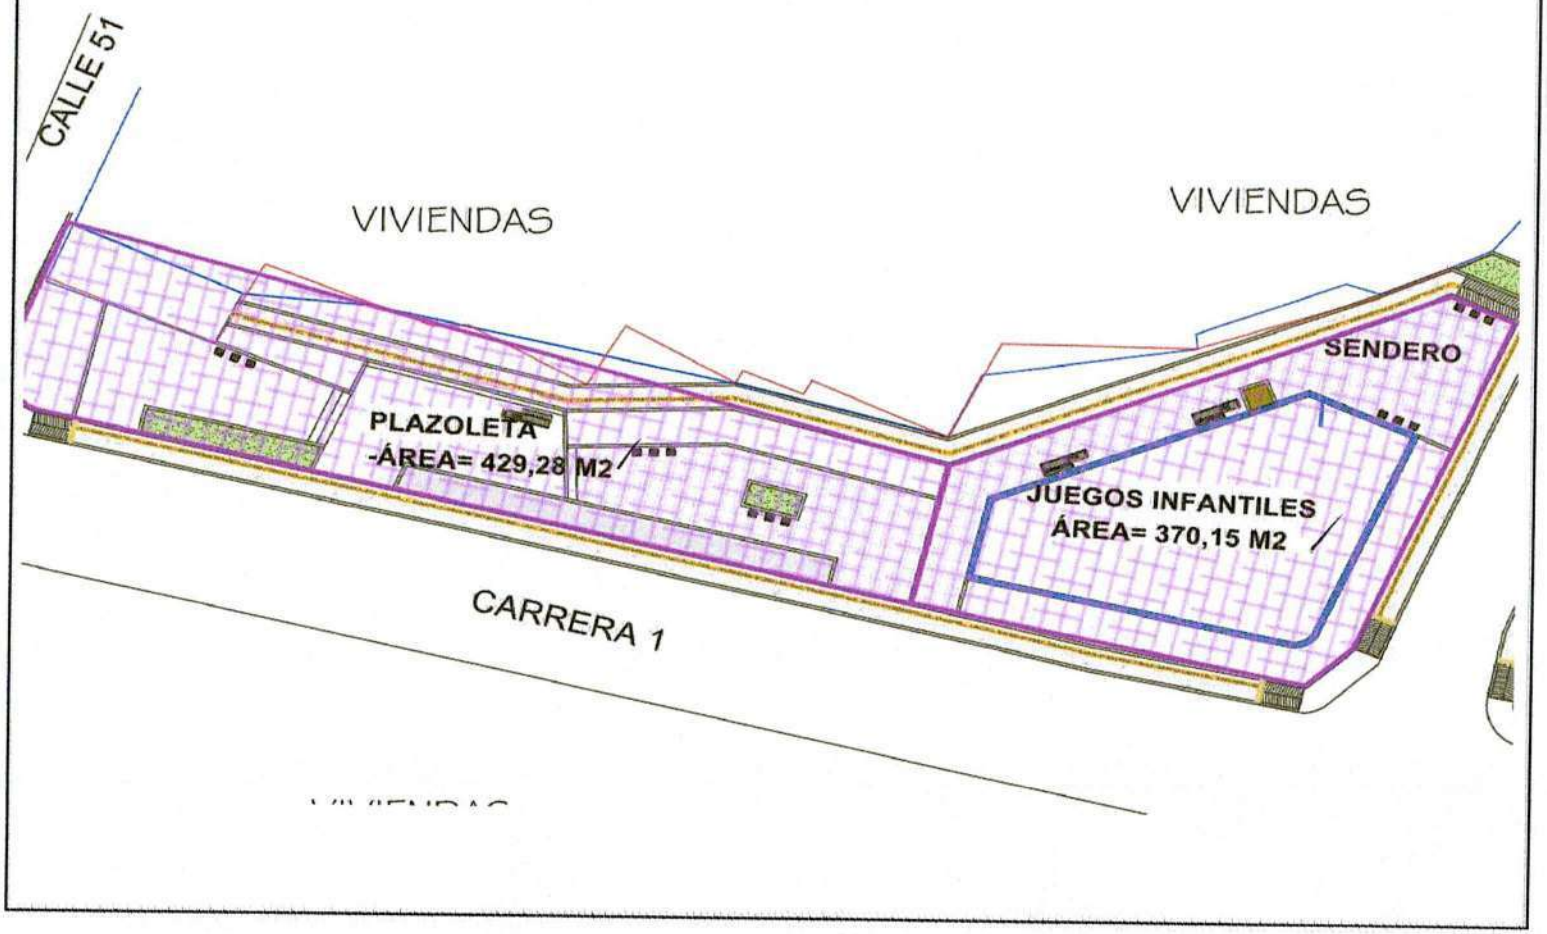

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
1. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO CARTERA TOPOGRAFICA (LADO 51)			0.50			763.10	381.55
2. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO CARTERA TOPOGRAFICA (LADO 50B)			0.50			920.77	460.39
						TOTAL PRESENTE ACTA:	841.94


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

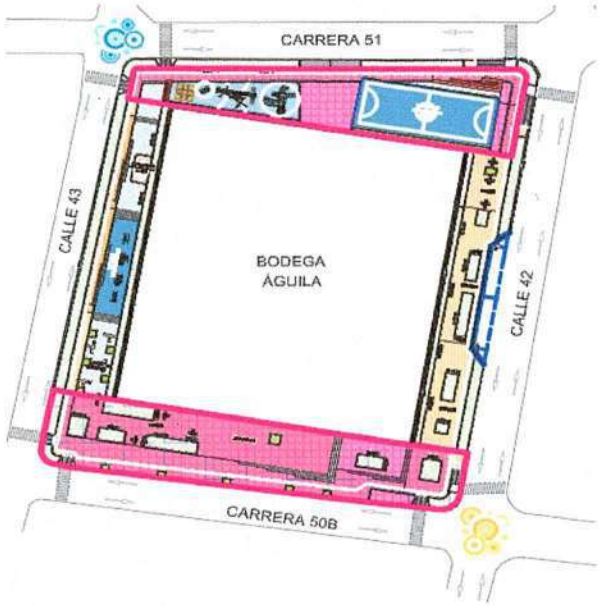

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 5 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	2 DE 2

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SENDERO			0.20			866.00	173.20
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**14,205.20**						
Acumulado anterior	**1,386.87**						
Acumulado a presente acta	**3,506.32**						
Obra por ejecutar	**10,698.89**						

TOTAL PRESENTE ACTA: 173.20

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PIH. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO(CALICHE)

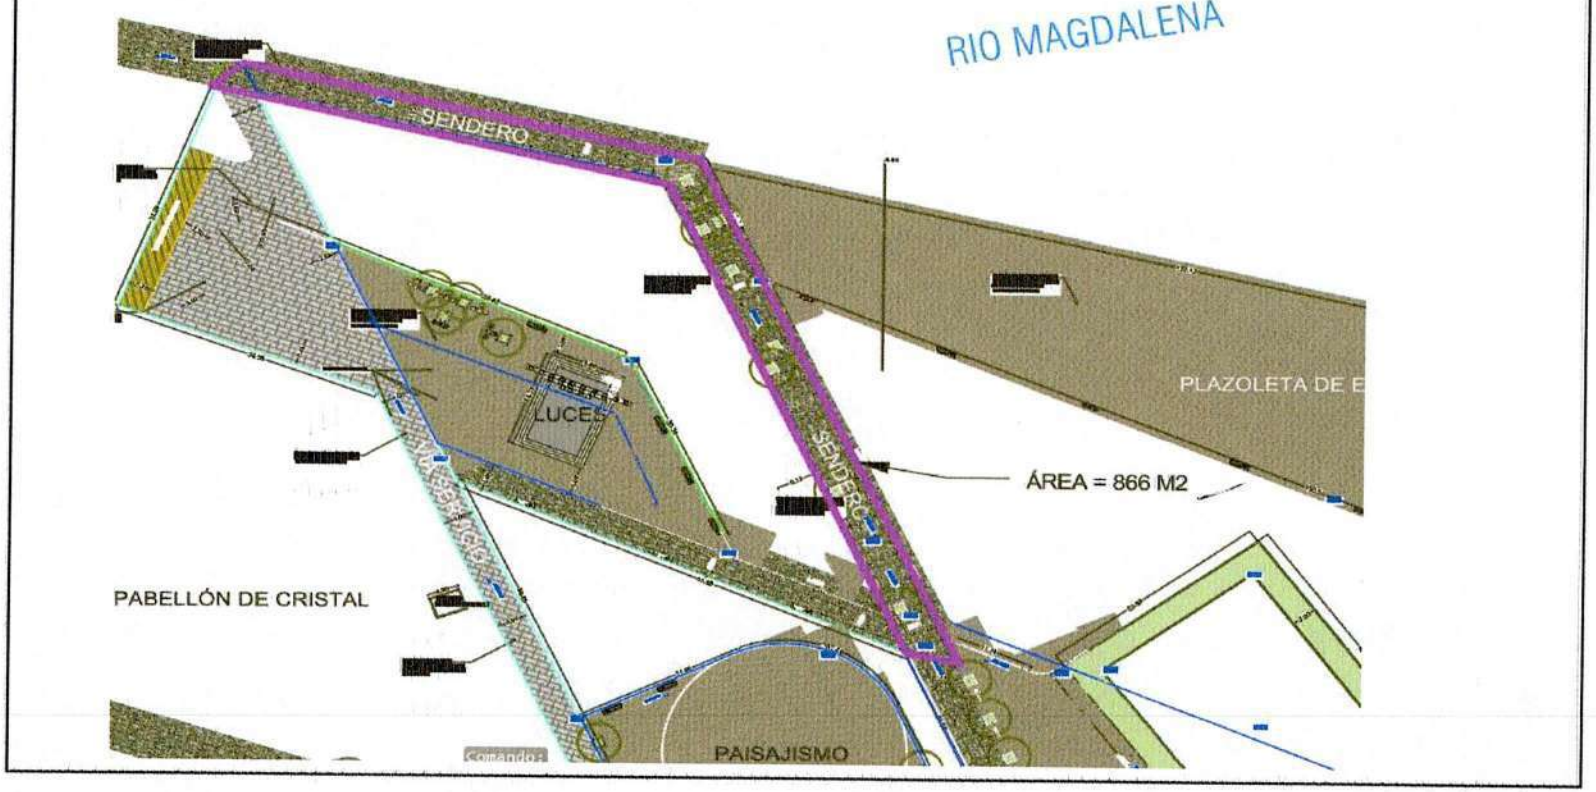

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	2.08	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ESTABILIZACION CANCHA SINTETICA

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
Estabilizacion de cancha sintetica lado de viviendas	5.80	1.38	0.80				6.40
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**190.00**						
Acumulado anterior	**173.94**						
Acumulado a presente acta	**180.34**						
Obra por ejecutar	**9.66**						

TOTAL PRESENTE ACTA: **6.40**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA

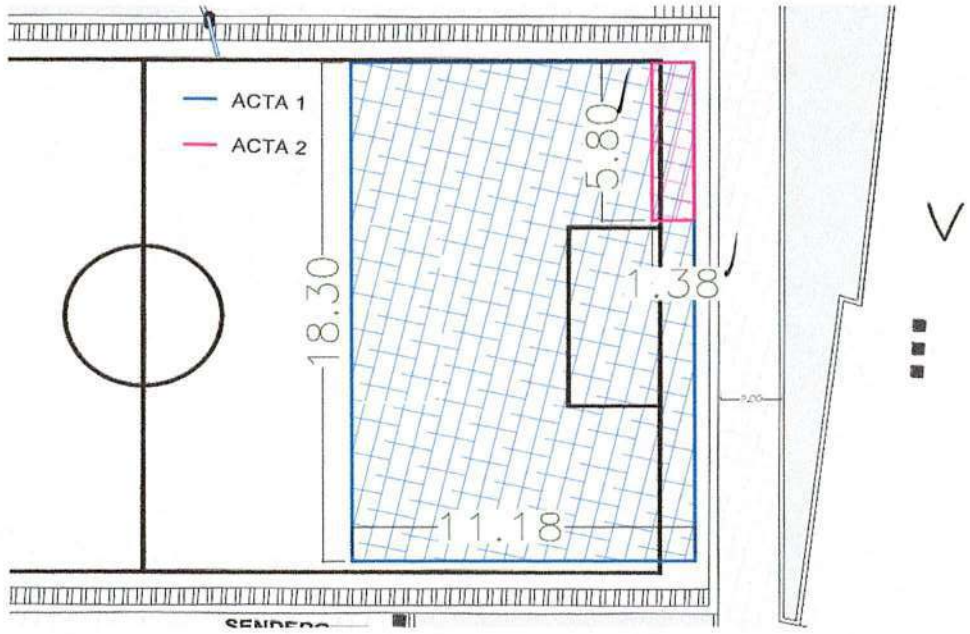

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	2.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ZONA DE ESTAMPADO PLAZOLETA DEL KIOSKO	11.65	10.62	0.15				18.56
2. ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	11.80	10.62	0.15				18.80
3. ZONA DE BIOSALUDABLES	6.85	10.62	0.15				10.91
5. PLACA DE ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	36.45	1.50	0.15				8.20
6. PLACA DE ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	34.47	1.50	0.15				7.76
7. PLACA DE ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA 1	10.59	1.20	0.15				1.91
8. PLACA DE ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y JARDINERA 3	9.75	1.50	0.15				2.19
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**1,287.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**68.32**						
Obra por ejecutar	**1,218.68**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**68.32**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 6 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM.-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA — CODIGO DE DEV: 3.0	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

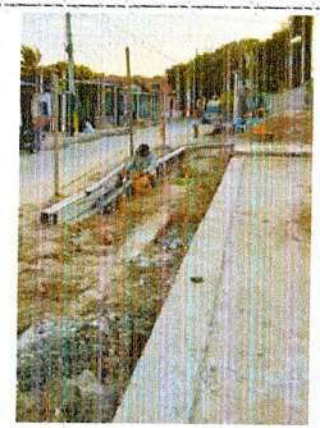



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. VIGA PERIMETRAL JUEGO DE LOS NIÑOS	44.84				44.84		
2. VIGA PARA ALCORQUE 1	16.10				16.10		
3. VIGA PARA ALCORQUE 2	11.40				11.40		
4. VIGA PARA ALCORQUE 3	16.10				16.10		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.01	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA 30 X 30 PERIMETRO JUEGO DE NINOS					57.53		
2. VIGA 30X30 DE ALCORQUE PLAZOLETA 1					6.00		
TOTAL PRESENTE ACTA:							63.53

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO


VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

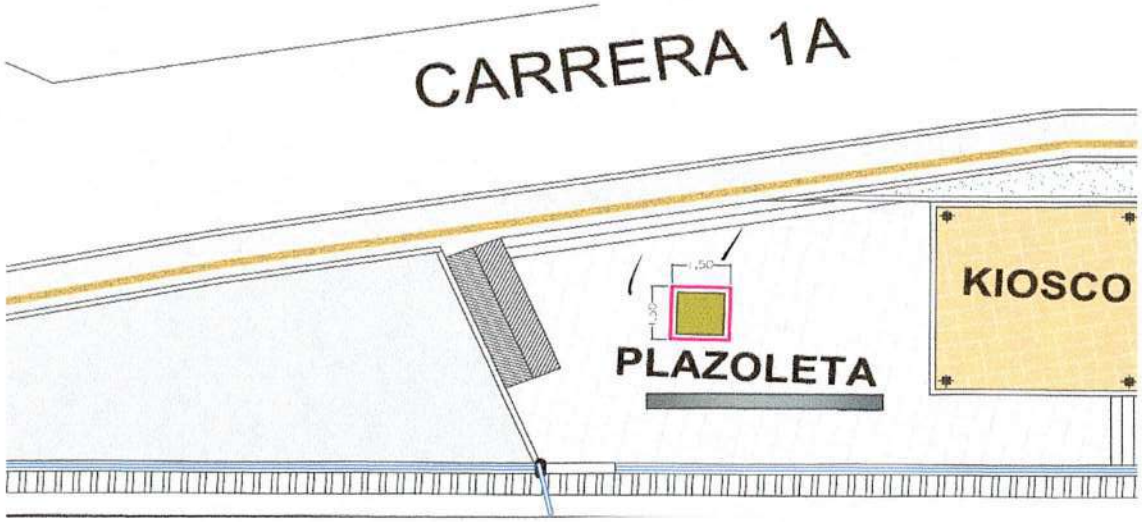

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA 30 X 30 CANCHA DE FUTBOL					10.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,783.00						
Acumulado anterior	166.00						
Acumulado a presente acta	327.97						
Obra por ejecutar	1,455.03						

TOTAL PRESENTE ACTA:	10.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

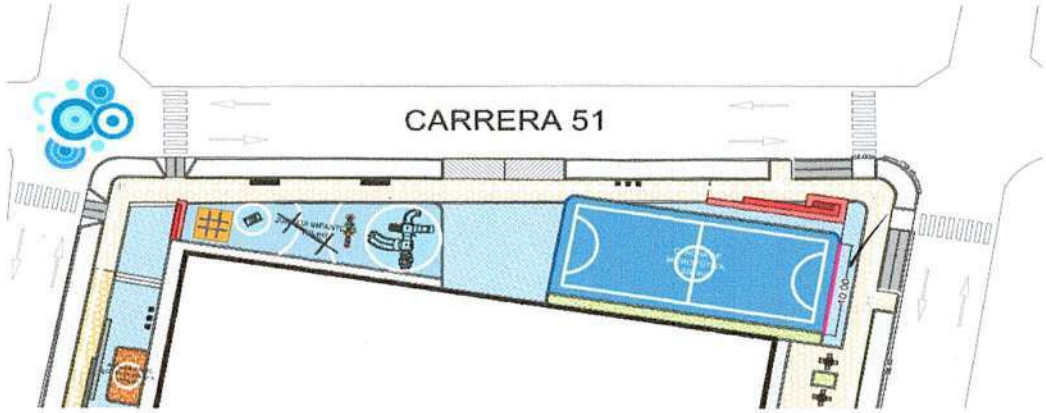

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8900102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLÜYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 1	16.10				16.10		
3. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 2	11.40				11.40		
4. VIGA CORONA PARA ALCORQUE 3	16.10				16.10		
4. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN VIA PRINCIPAL	57.57				57.57		
4. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN AL LADO DE LAS VIVIENDAS	11.42				11.42		
TOTAL PRESENTE ACTA:							112.59

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

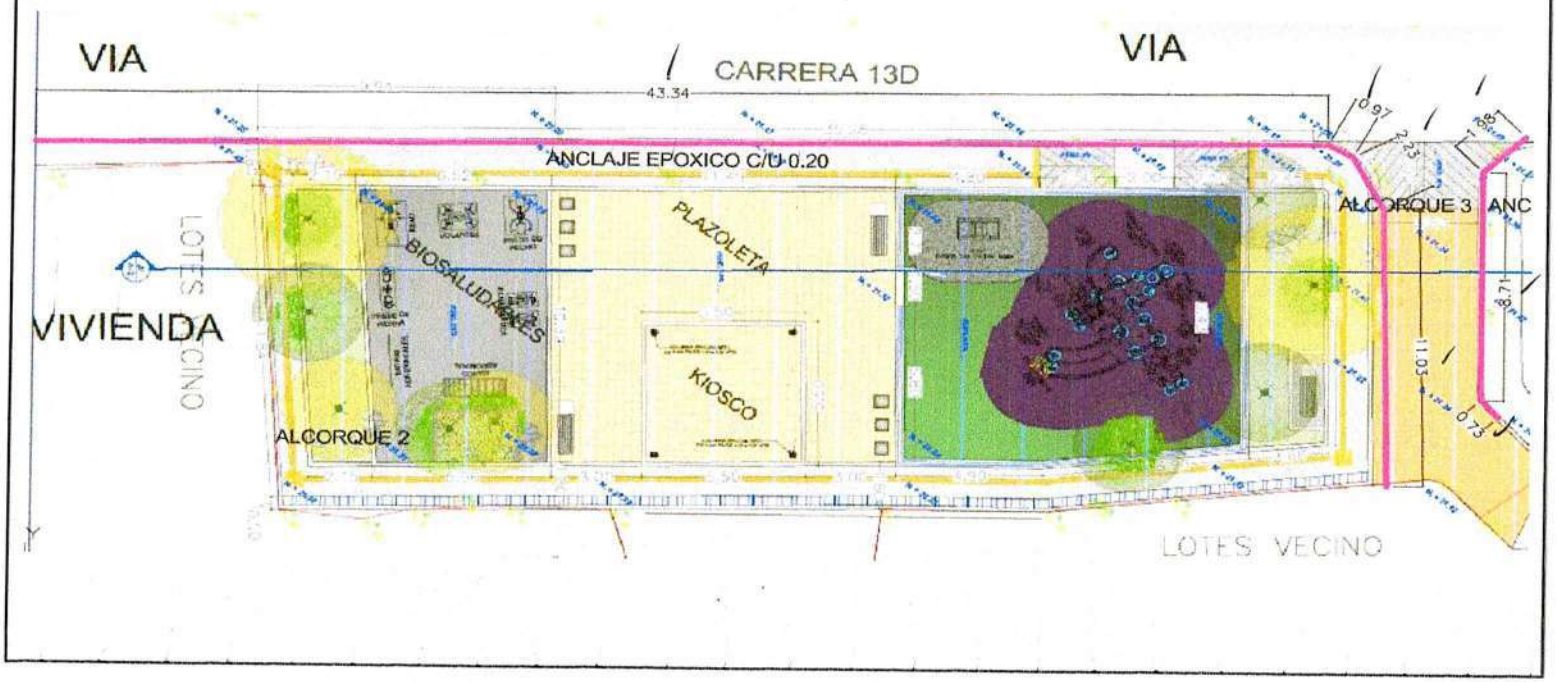

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.02	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGA DE 15 X 20 LADO DERECHO DE SENDERO (AZUL)	126.00				126.00		
2. VIGA DE 15 X 20 LADO IZQUIERDO DE SENDERO (MAGENTA)	127.00				127.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	4,891.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	365.59						
Obra por ejecutar	4,525.41						

TOTAL PRESENTE ACTA:	253.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.

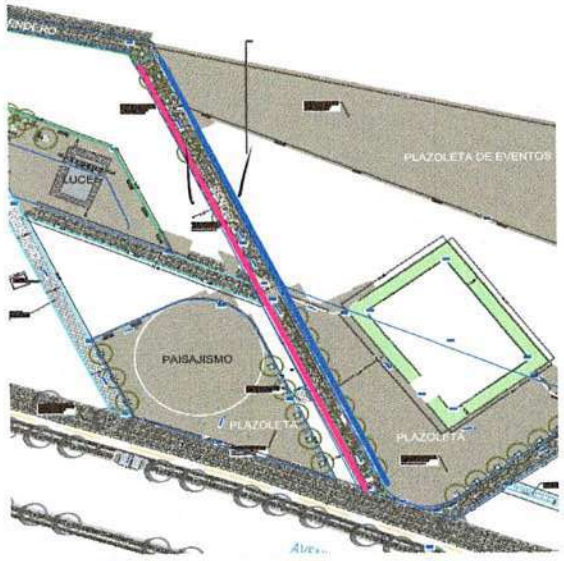

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.06	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



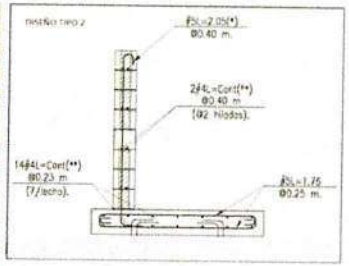





LOCALIZACION	DIMENSIONES KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)		UND	CAN	TOTALES ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	14.00			410.90
2. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.56	1.76	#5	5/8"	KG	214.00			587.56
3. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2- (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) TIPO 2 ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.56	2.05	#5	5/8"	KG	67.00			214.27
4. ACERO PARA MURO DE CONTENCION (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) 2-TIPO 2 TRANSVERSAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	8.00			234.80
5. ACERO PARA MURO DE CONTENCION 1-TIPO 2 TRANSCERSAL	1.00	36.00	#4	1/2"	KG	8.00			288.00
6 ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	1.00	21.91	#4	1/2"	KG	14.00			306.74
7. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.56	1.76	#5	5/8"	KG	162.00			444.79
8. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2, ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.56	2.05	#5	5/8"	KG	51.00			163.10
9. ACERO PARA MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)-TIPO 2 TRANSVERSAL	1.00	21.91	#4	1/2"	KG	8.00			175.28
6. ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DE PLACA PARA ESCALERA DE ACCESO SENDERO ZONA CANCHA	1.00	1.10	#4	1/2"	KG	36.00			39.60
7. ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL DE PLACA ESCALERA DE ACCESO SENDERO ZONA ESCALERA	1.00	1.10	#4	1/2"	KG	12.00			13.20
8. MURO INICIO ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	1.56	3.80	#5	1/2"	KG	6.00			35.57
9. MURO FINAL ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	1.56	3.80	#5	1/2"	KG	6.00			35.57
10. ESTRIBOS MURO INICIAL Y FINAL	0.56	2.30	#3	3/8"	KG	36.00			46.37
DESCUENTO ACERO DE ZAPATA LONGITUDINAL ACTA 1									-417.60
								TOTAL PRESENTE ACTA:	2,578.13

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



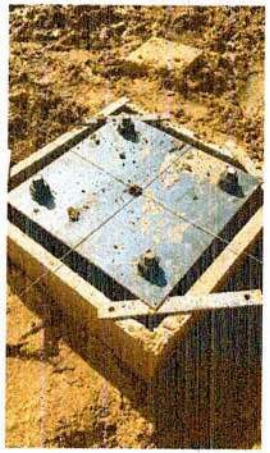

LOCALIZACION	DIMENSIONES				UND	CAN	TOTALES		
	KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)				ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL KIOSKO	1.56	1.60	#5	5/8"	KG	60.00			149.76
2. ACERO PARA PEDESTAL DE KIOSKO	1.56	1.40	#5	5/8"	KG	16.00			34.94
3. ACERO ESTIBOS PARA PEDESTALES	0.56	1.80	#3	3/8"	KG	32.00			32.26
4. ACERO PERNOS DE 3/4" PARA DE KIOSKO INCLUYE TIERCA	2.25	1.20	#6	1/2"	KG	16.00			43.20
5. ACERO PARA FLANCHES DE NIVELACION DE PEDESTALES DE KIOSKO	4.00	1.00	#6	1/2"	KG	16.00			64.00
6. ACERO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS DE KIOSKO	1.00	5.60	#4	1/2"	KG	16.00			89.60
7. ACERO ESTRIBOS DE VIGAS DE AMARRE DE ZAPATAS DE KIOSKO	0.56	1.80	#3	3/8"	KG	136.00			137.09
TOTAL PRESENTE ACTA:									550.85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)		UND	CAN	TOTALES ML	M2	KG
1. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO LONGITUDINAL	0.56	55.81	#3	3/8"	KG	10.00			312.54
2. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) - TIPO 2 ACERO TRANSVERSAL	1.00	1.21	#4	1/2"	KG	400.00			484.00
3. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION 2- (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) TIPO 2 ACERO PARA DOBELAS DE BLOQUES	1.00	1.45	#4	1/2"	KG	125.00			181.25
4. ACERO PARA MURO DE CONTENCION (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA) 2-TIPO 2 TRANSVERSAL	1.00	29.35	#4	1/2"	KG	4.00			117.40
Cantidad contractual según	28,970.00								
Acumulado anterior	2,360.25								
Acumulado a presente acta	6,584.42								
Obra por ejecutar	22,385.58								
TOTAL PRESENTE ACTA:									1,095.19

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.07	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA)	26.63	1.60	0.25				10.65
2. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)	19.96	1.60	0.25				7.98
3. ESCALERAS DE ACCESO SENDERO 1	1.10	3.50	0.30				1.16
4. MURO INICIO ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	0.60	3.50	0.40				0.84
5. MURO FINAL ESCALERA DE ACCESO SENDERO 1	0.60	3.50	0.40				0.84
TOTAL PRESENTE ACTA:							**21.47**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

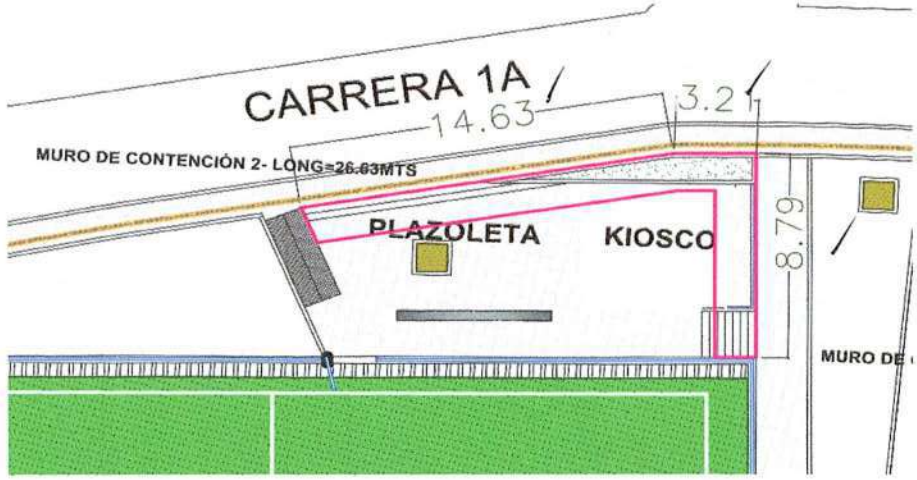

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

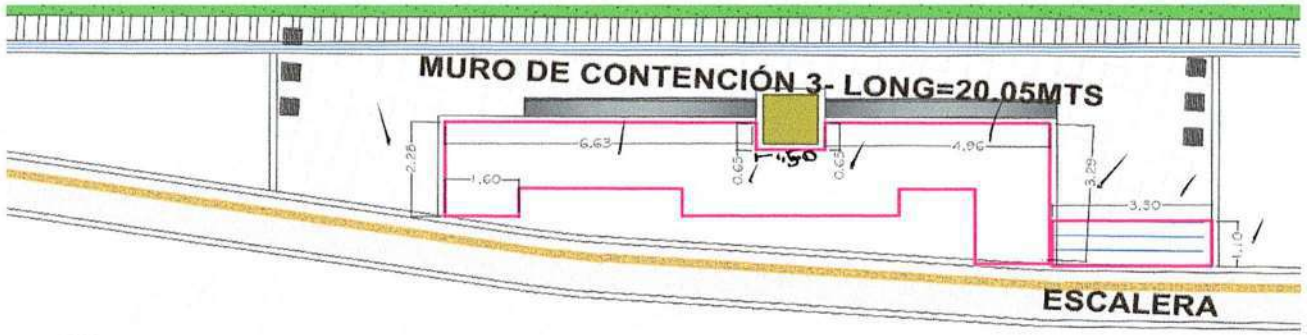


CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.



CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA / CÓDIGO DEL ITEM: 3.07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA DE KIOSKO	1.00	1.00	0.40	4.00			1.60
2. CONCRETO PARA PEDESTAL DE KIOSKO	0.50	0.50	0.80	4.00			0.80
TOTAL PRESENTE ACTA:							2.40


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

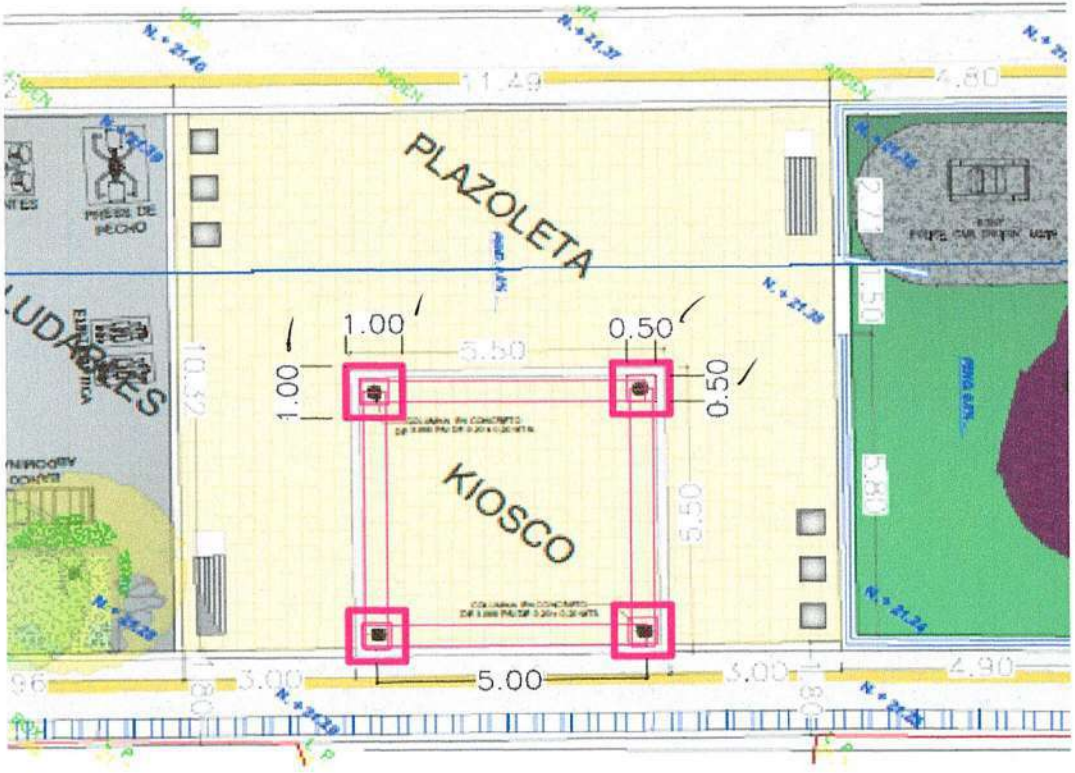

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025		
CAPITULO:	ESTRUCTURA — CÓDIGO DEL ITEM: 3.07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. CONCRETO PARA ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10	0.30				16.50
Cantidad contractual según modificatoria N°2	60.00						
Acumulado anterior	15.00						
Acumulado a presente acta	55.37						
Obra por ejecutar	4.63						
TOTAL PRESENTE ACTA:							16.50


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

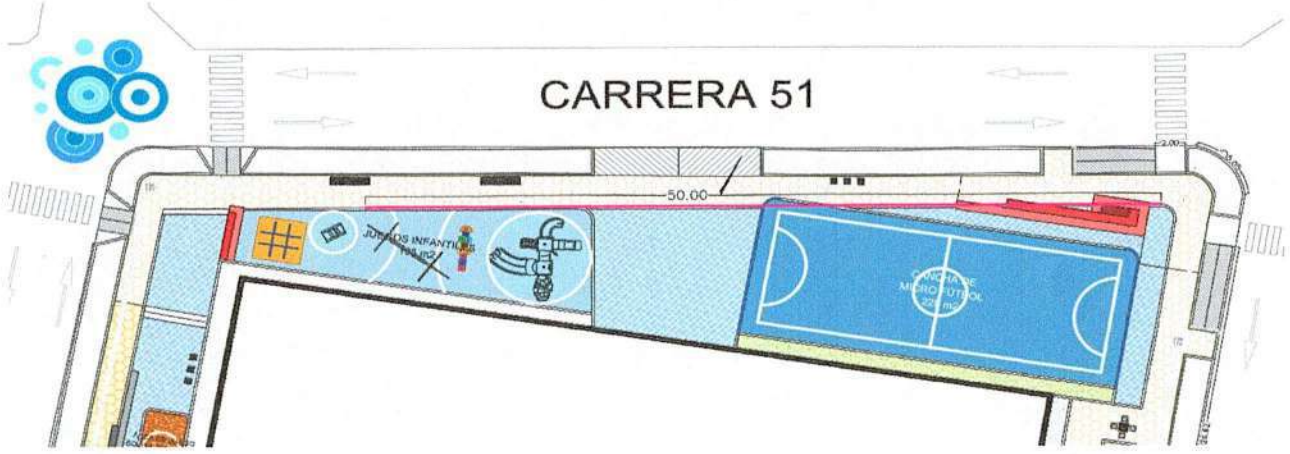

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	3.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	UND	ANCHO (M)	ALTURA (M)		UND	M2	M3
1. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN VIA PRINCIPAL	288.00			2.00	576.00		
2. VIGA DE CONFINAMIENTO ANDEN LADO DE VIVIENDAS	58.00			2.00	116.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**750.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**692.00**						
Obra por ejecutar	**58.00**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**692.00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	200.51				200.51		
2. ZONA DE BIOSALUDABLE	116.40				116.40		
5. PLAZOLETA KIOSKO	197.11				197.11		
TOTAL PRESENTE ACTA:							514.02

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.12	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PARTE TRASERA DE LA CANCHA SOBRE EL MURO DE CONTENCION 1	80.96				80.96		
2. PISO ESTAMPADO SENDERO 1	73.33				73.33		
3. PLACA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	1267.78				1267.78		
4. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	288.61				288.61		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	13,827.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	2,224.69						
Obra por ejecutar	11,602.31						
TOTAL PRESENTE ACTA:							1,710.67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

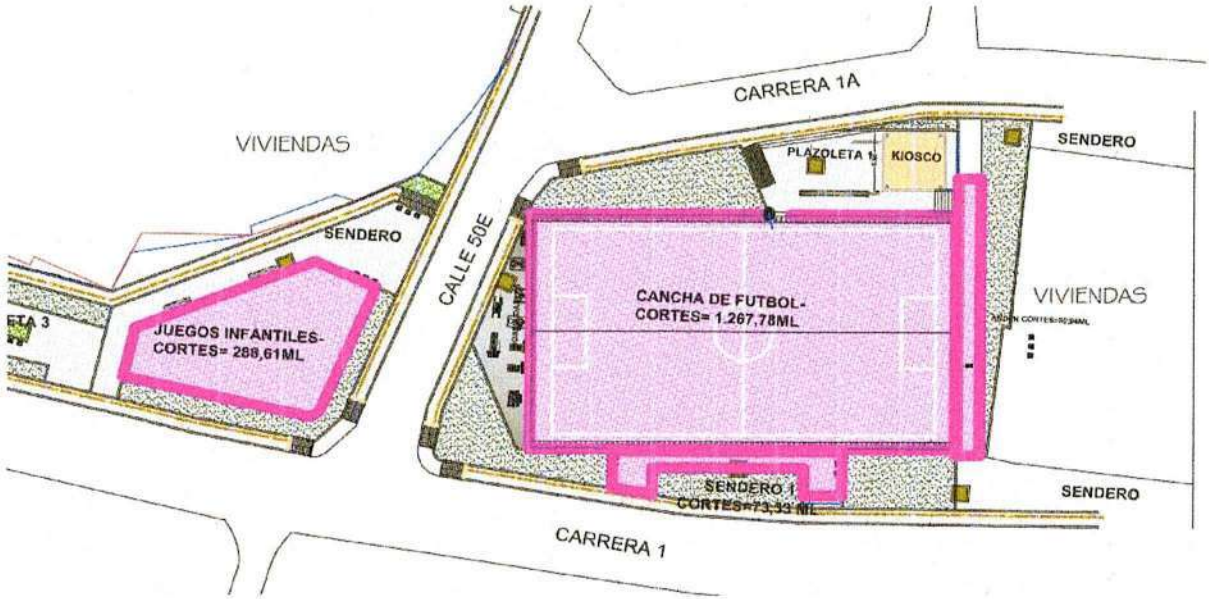

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.16	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

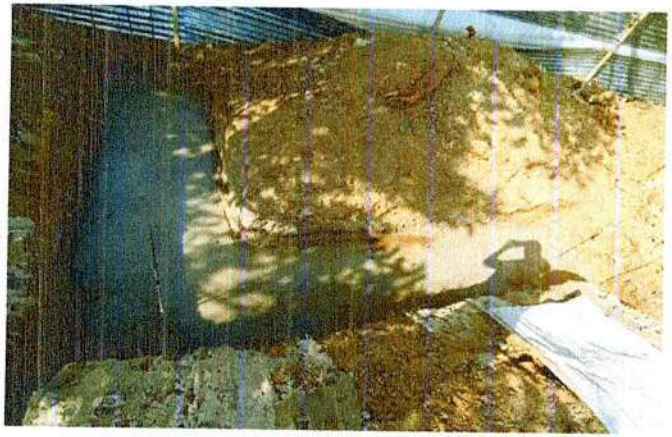

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
4. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 2 (ZONA DE KIOSKO Y PLAZOLETA)	26.63	1.60				42.61	
5. ZAPATA DE MURO DE CONTENCION 3 (SENDERO ZONA CANCHA)	19.96	1.60				31.94	
TOTAL PRESENTE ACTA:							74.54

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
	Versión:	02
	Fecha:	06/09/2021
	Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

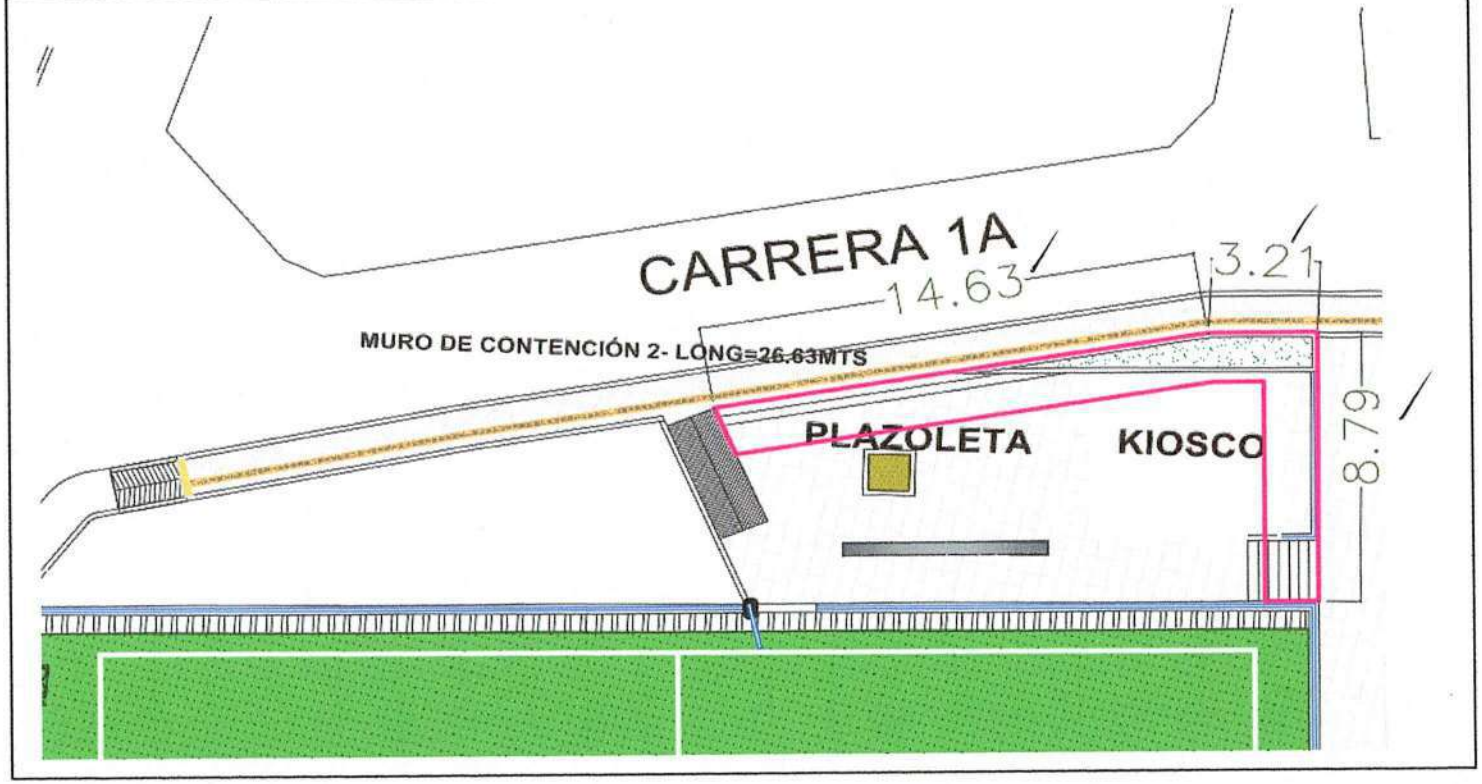

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.

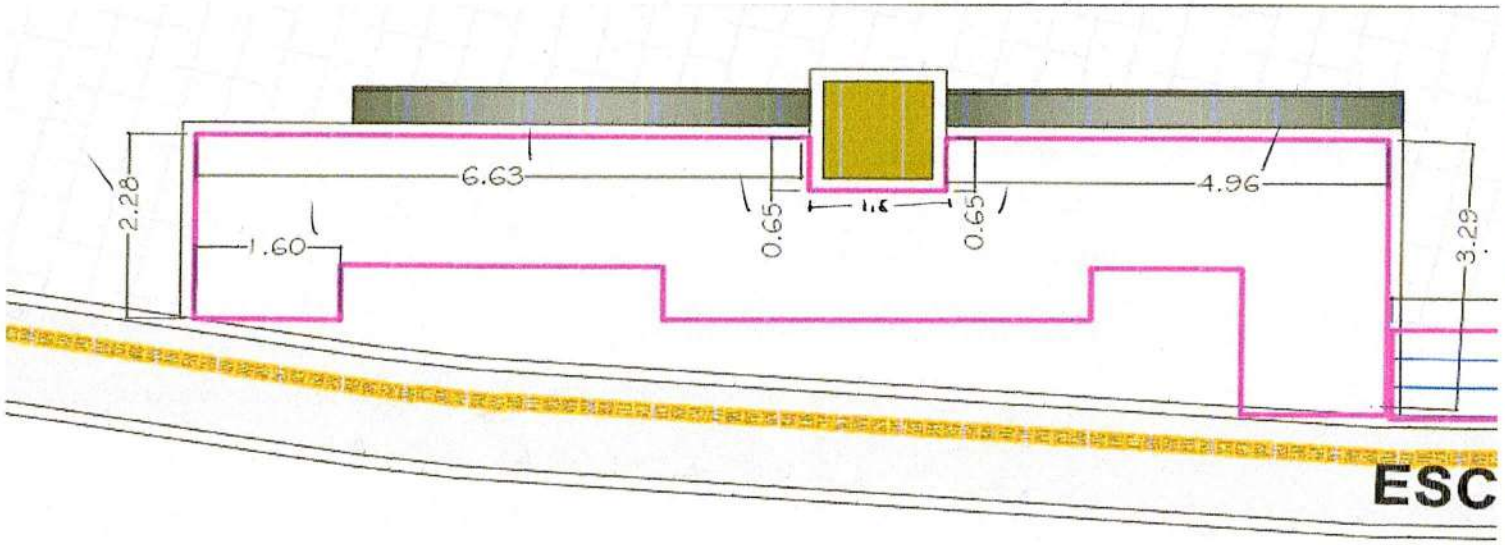

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.16	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

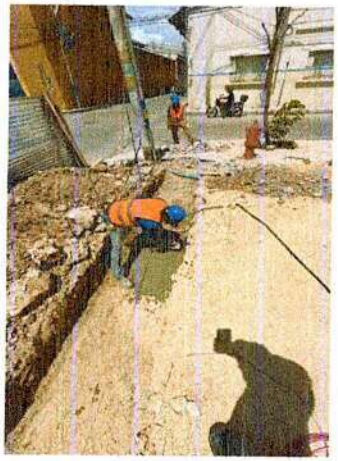



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. SOLADO PARA ZAPATA MURO TIPO 1 ENTRE CALLE 42 Y CARRERA 51	50.00	1.10				55.00	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	195.00						
Acumulado anterior	64.00						
Acumulado a presente acta	193.54						
Obra por ejecutar	1.46						

TOTAL PRESENTE ACTA: 55.00


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA
SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05

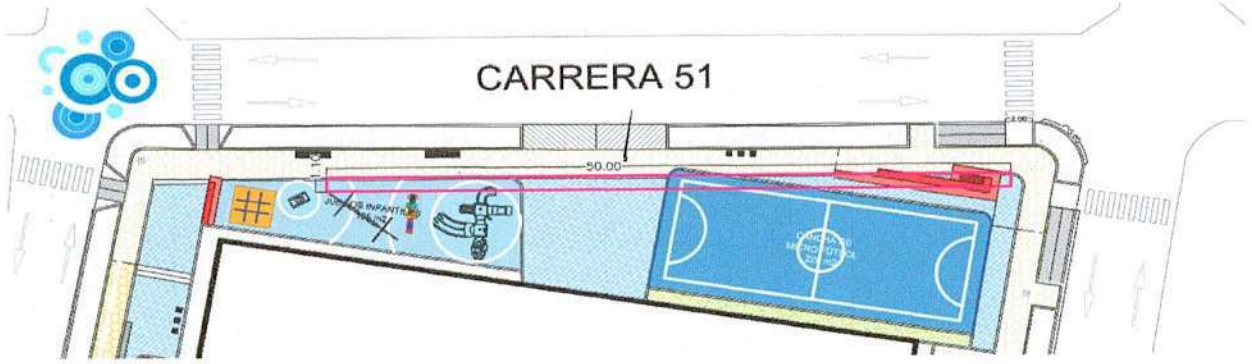

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

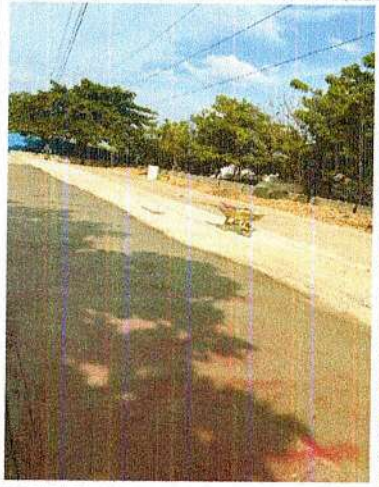

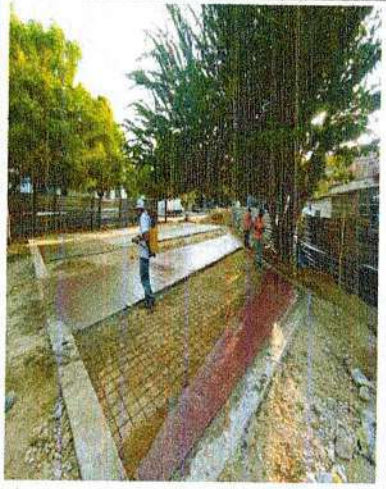


LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. PLACA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	37.20	20.04				745.49	
2. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES						191.74	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

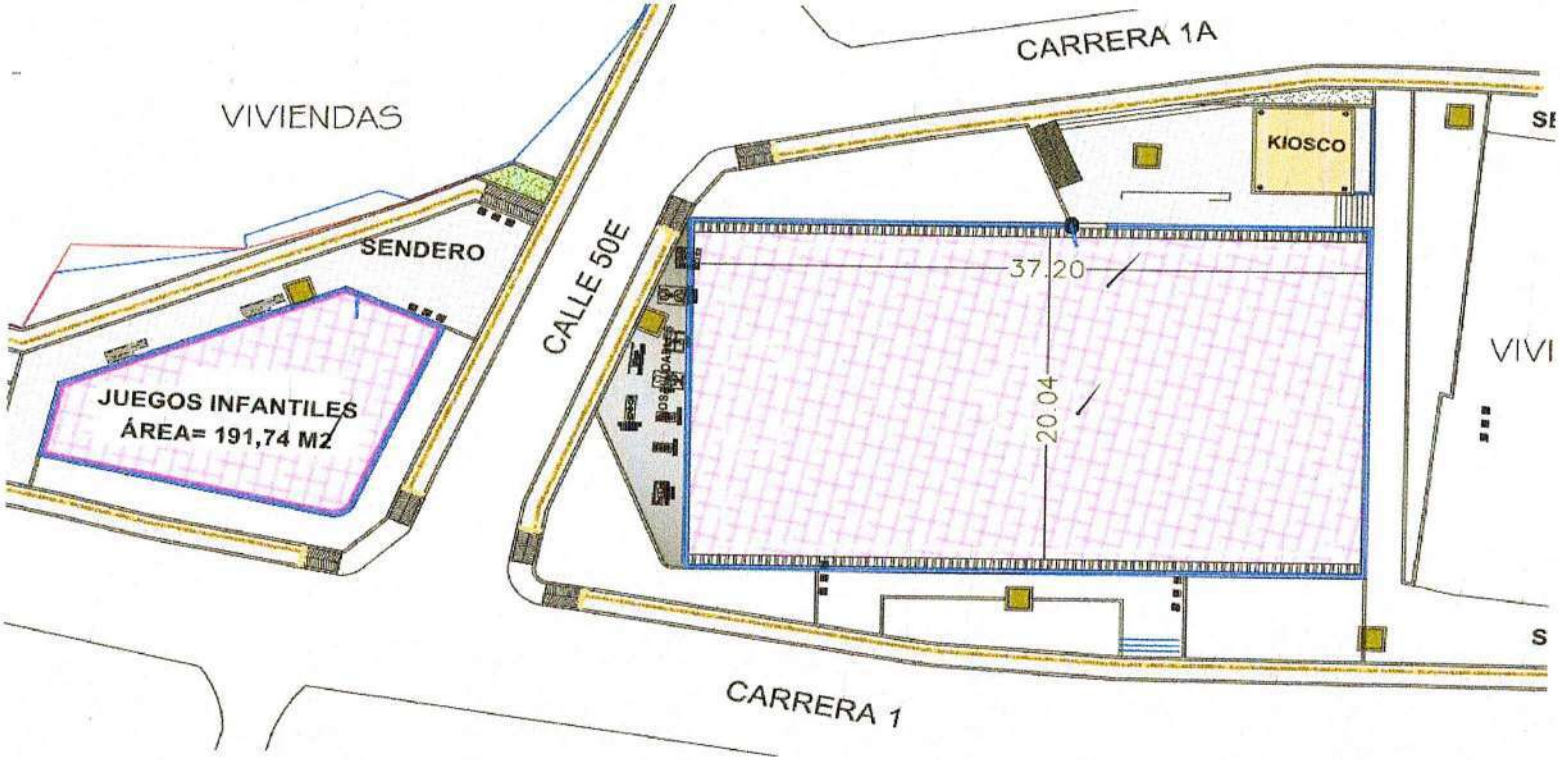

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.01	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES	11.80	10.62				125.32	
2. PLACA DE BIOSALUDABLE	6.85	10.62				72.75	
3. PLACA TERRAZA DE CASA 2	9.40	2.94				27.64	
4. PLACA RAMPA ACCESO CADA 5	3.00	3.00				9.00	
5. PLACA DE ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	36.45	1.50				54.68	
6. PLACA DE ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	34.47	1.50				51.71	
7. PLACA DE ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA 1	10.59	1.20				12.71	
8. PLACA DE ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y JARDINERA 3	9.75	1.50				14.63	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**7,743.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**1,305.64**						
Obra por ejecutar	**6,437.36**						
					TOTAL PRESENTE ACTA:		**368.41**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

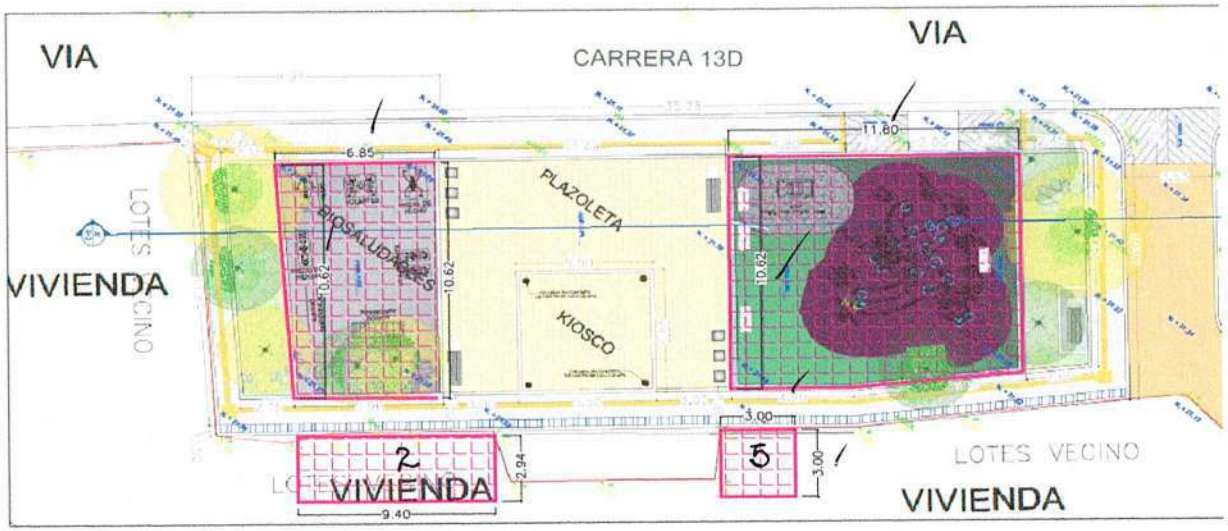

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PARTE TRASERA DE LA CANCHA LADO VIVIENDAS	25.30	2.00				50.60	
2. PISO ESTAMPADO SENDERO LADO CANCHA						45.83	
3. PISO ESTAMPADO PLAZOLETA Y KIOSKO, LADO CARRERA 1A						139.61	
TOTAL PRESENTE ACTA:							236.04

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD DEL ESTAMPADO DE LOS NUMERALES 2 Y 3, FUERON TOMADAS DE AUTOCAD

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.02	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. ANDEN ESTAMPADO PLAZOLETA DEL KIOSKO	11.65	10.62				123.72	
2, ANDEN ESTAMPADO ENTRE VÍA Y PARQUE INFANTIL	6.60	2.10				13.86	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**7,551.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**373.62**						
Obra por ejecutar	**7,177.38**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**137.58**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

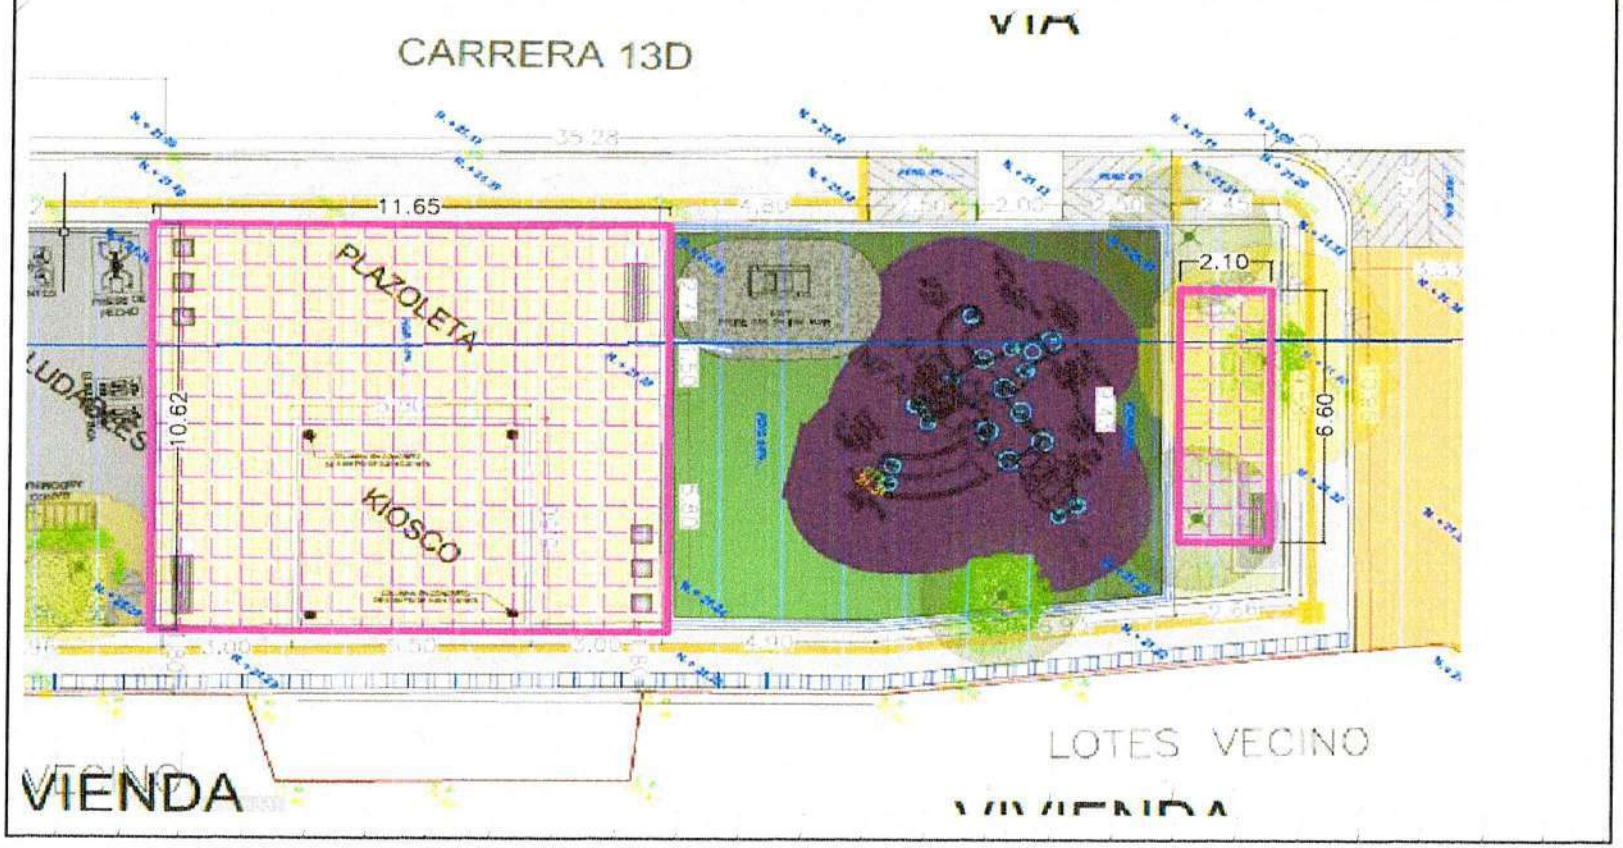

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
TOTAL PRESENTE ACTA:							34.88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.03	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. LEVANTE DE MURO PARA ALCORQUE ZONA PLAZOLETA	1.50		0.80	4.00		4.80	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,307.00						
Acumulado anterior	88.90						
Acumulado a presente acta	128.58						
Obra por ejecutar	1,178.42						
TOTAL PRESENTE ACTA:							4.80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.05	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
4. LEVANTE DE ALCORQUE ZONA PLAZOLETA LADO CARRERA 1A	6.00		0.80			4.80	
TOTAL PRESENTE ACTA:							102.71


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

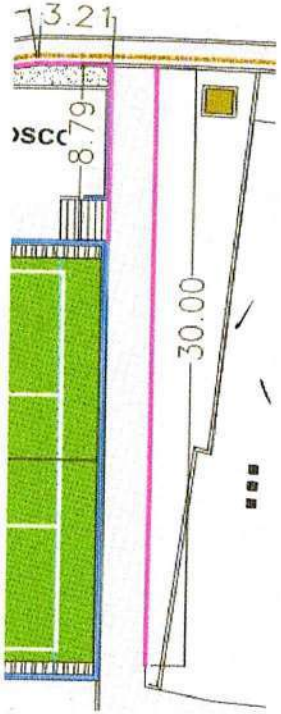

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-3

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

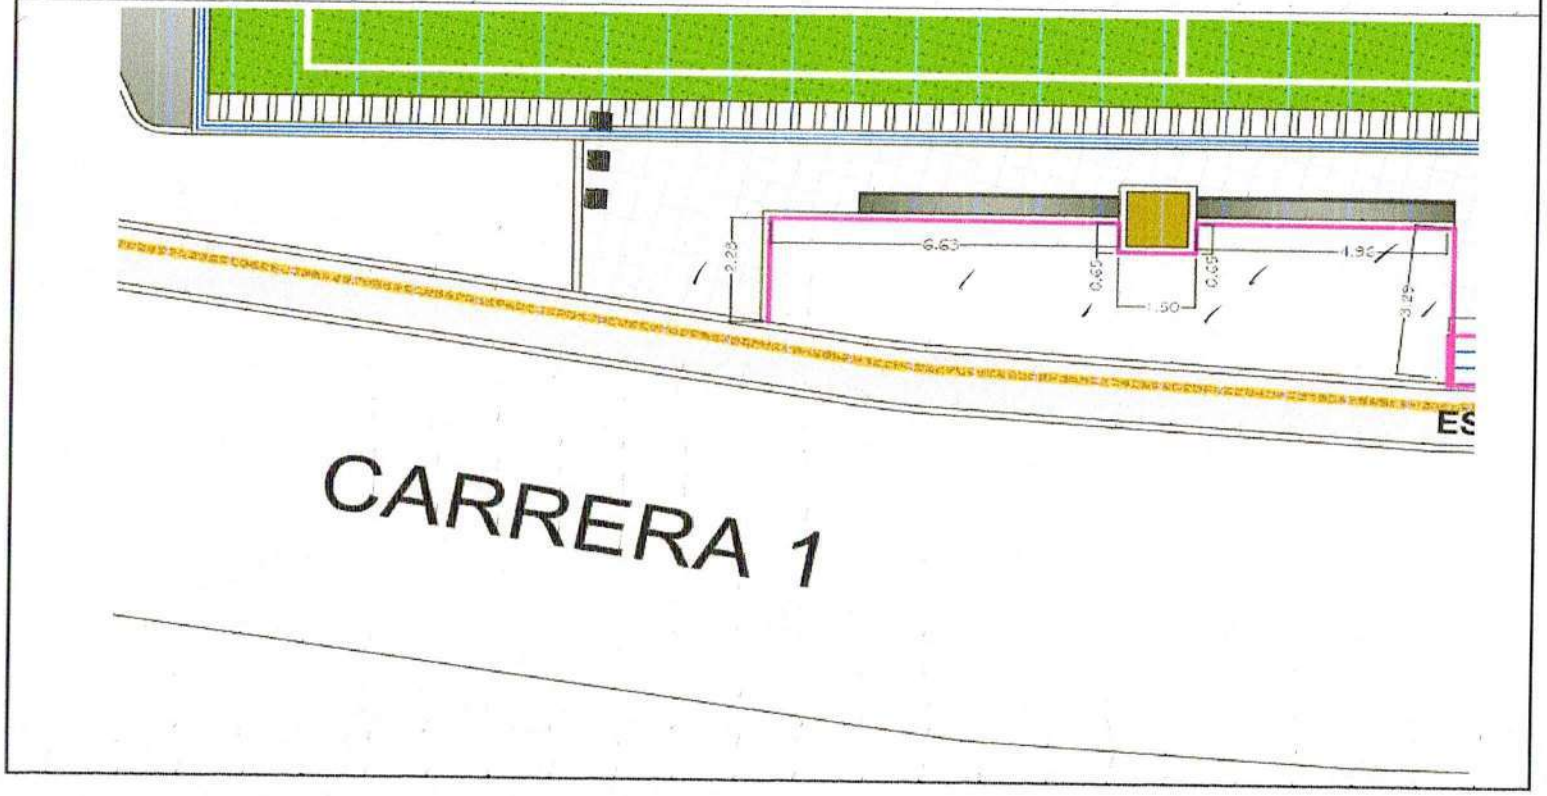

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	4.05	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	1,307.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	137.59						
Obra por ejecutar	1,169.41						

TOTAL PRESENTE ACTA:	34.88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


VIA
CARRERA 13D
VIA
ALCORQUE 1
ALCORQUE 2
ALCORQUE 3
PLAZOLETA
KIOSCO
BIOSALUDABLE
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
LOTES VECINO
LOTES VECINO
LOTES VECINO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERÍODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.11	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. TABLETA GUIA EN ANDEN PARALELO A LA VIA 13D	23.95				23.95		
2. TABLETA GUIA EN ANDEN PARALLEO A LAS VIVIENDAS	32.58				32.58		
3. TABLETA GUIA EN ANDEN ENTRE BIOSALUDABLES Y JARDINERA	10.9				10.90		
4. TABLETA GUIA EN ANDEN ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y ALCORQUE 3	13.11				13.11		
5. TABLETA GUIA DE RECUADROS INTERSECCIONES TOPEROL 1	0.80			1.00	0.80		
6. TABLETA GUIA DE RECUADROS INTERSECCIONES TOPEROL 2	1.20			2.00	2.40		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**2,837.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**83.74**						
Obra por ejecutar	**2,753.26**						

TOTAL PRESENTE ACTA:	**83.74**

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	MAMPOSTERIA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	4.13	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	100.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	97.91						
Obra por ejecutar	2.09						
TOTAL PRESENTE ACTA:							97.91


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

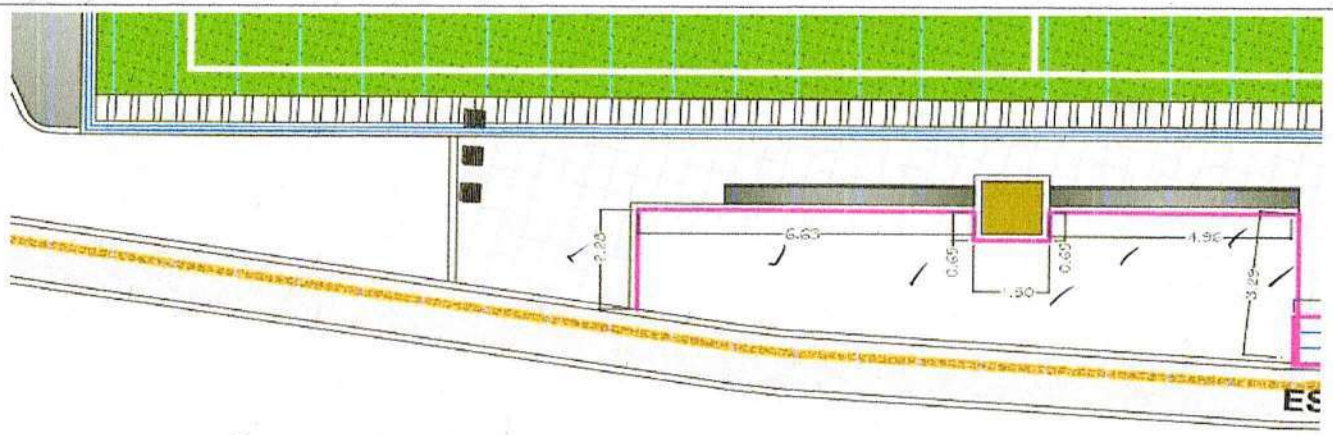

CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100MM X 50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO, LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN SUPERBOARD					211.00		

Cantidad contractual según modificatoria N°2	300.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	211.00
Obra por ejecutar	89.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	211.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:


Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100MM X 50MM CALIBRE 14 GALVANIZADO, LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILES A CADA 1,2 METROS

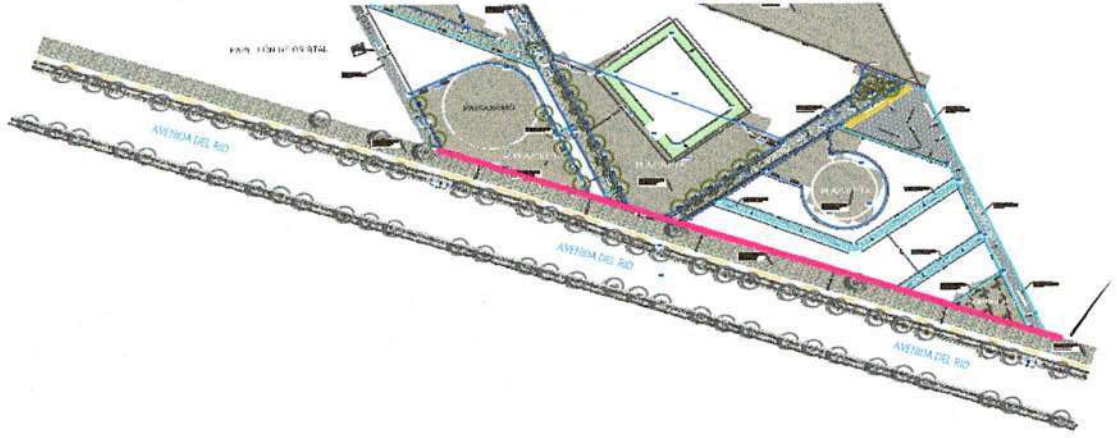

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC					130.00		

Cantidad contractual según modificatoria N°2	170.00
Acumulado anterior	0.00
Acumulado a presente acta	130.00
Obra por ejecutar	40.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	130.00

100MMX50MM ZINC


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	06/09/2021
		Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS

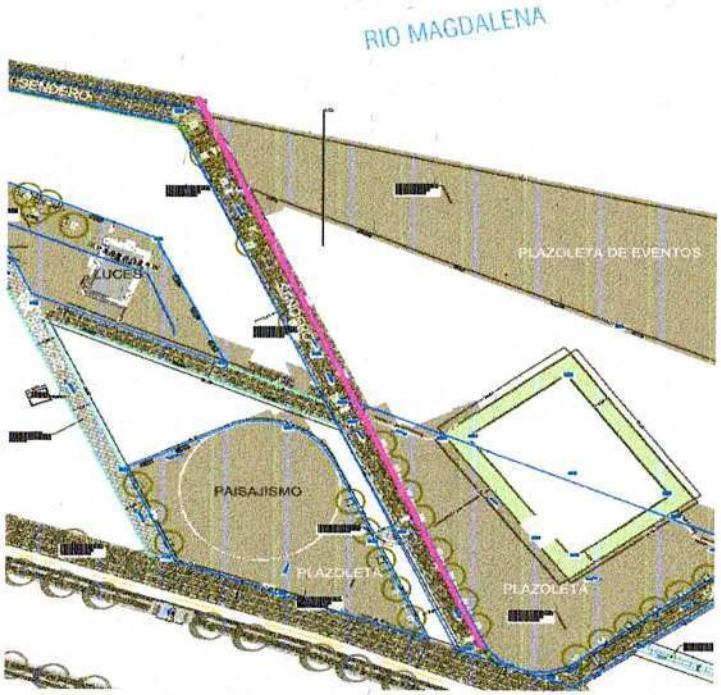

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-6	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

PARQUE LA NORIA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. DESMONTE DE LOSETAS EN SENDERO VÍA DE SERVICIO				385.20		385.20	
2. DESMONTE DE LOSETAS EN ZONA DE LUCES				364.40		364.40	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**1,484.34**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**749.60**						
Obra por ejecutar	**734.74**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**749.60**


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE LA NORIA
DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

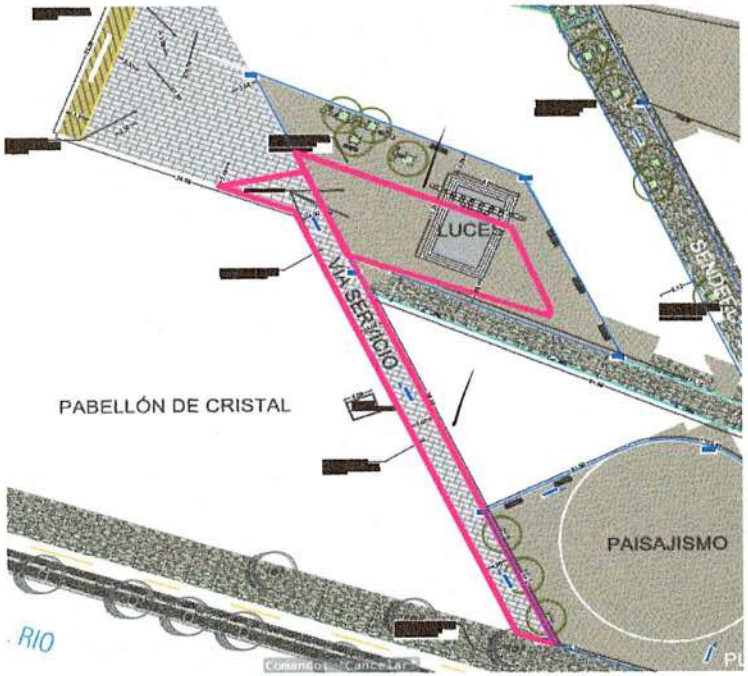

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 07/	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
1. MURO DE CONTENCION 1	30.00		1.40			42.00	
2. MURO DE CONTENCION 2	26.63		1.20			31.96	
3. MURO DE CONTENCION 3	19.96		1.20			23.95	
4. ALCORQUE ZONA PLAZOLETA LADO CARRERA 1A	6.00		0.80			4.80	
TOTAL PRESENTE ACTA:							102.71

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018 1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1


PARQUE JHON JAIRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

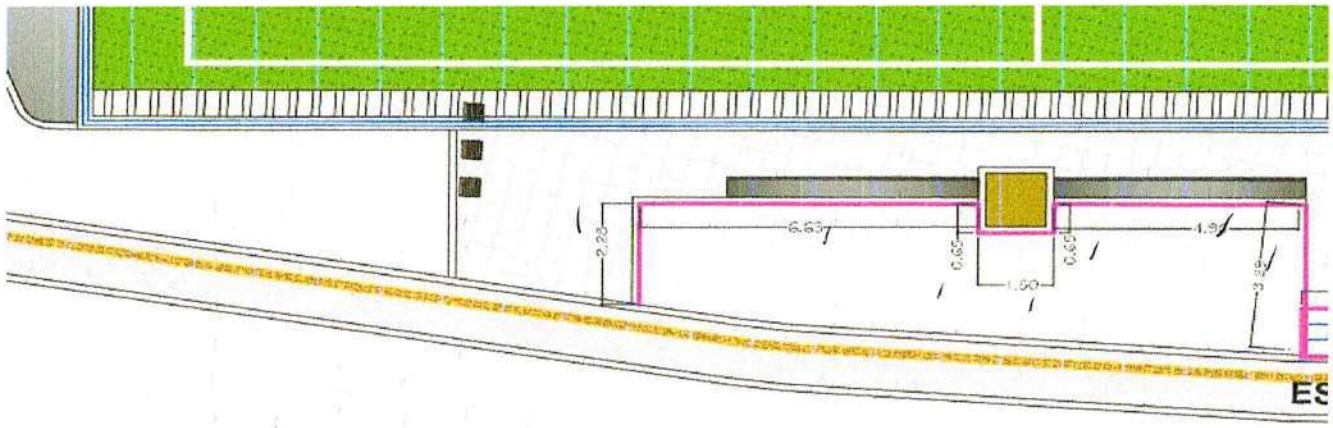

CARRERA 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

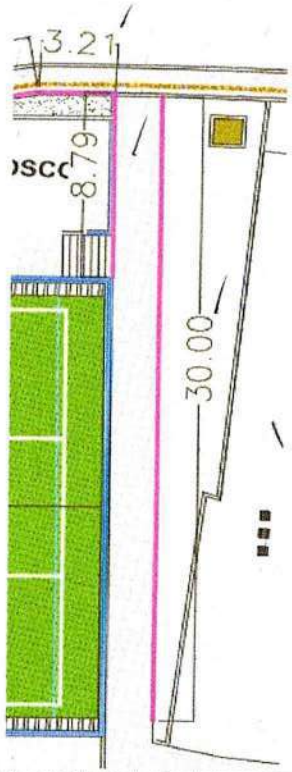

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP 07	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
PAÑETE PARA APLICACIÓN DE IGOL DENSO (IMPERMEABILIZACIÓN, PARTE INTERNA)							
2. MURO PARA ALCORQUE 1	16.10		0.80			12.88	
3. MURO PARA ALCORQUE 2	11.40		0.80			9.12	
4. MURO PARA ALCORQUE 3	16.10		0.80			12.88	
Cantidad contractual según modificatoria N°2	220.00						
Acumulado anterior	0.00						
Acumulado a presente acta	137.59						
Obra por ejecutar	82.41						

TOTAL PRESENTE ACTA:	34.88


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO
IMPERMEABILIZACION CON IGASOL

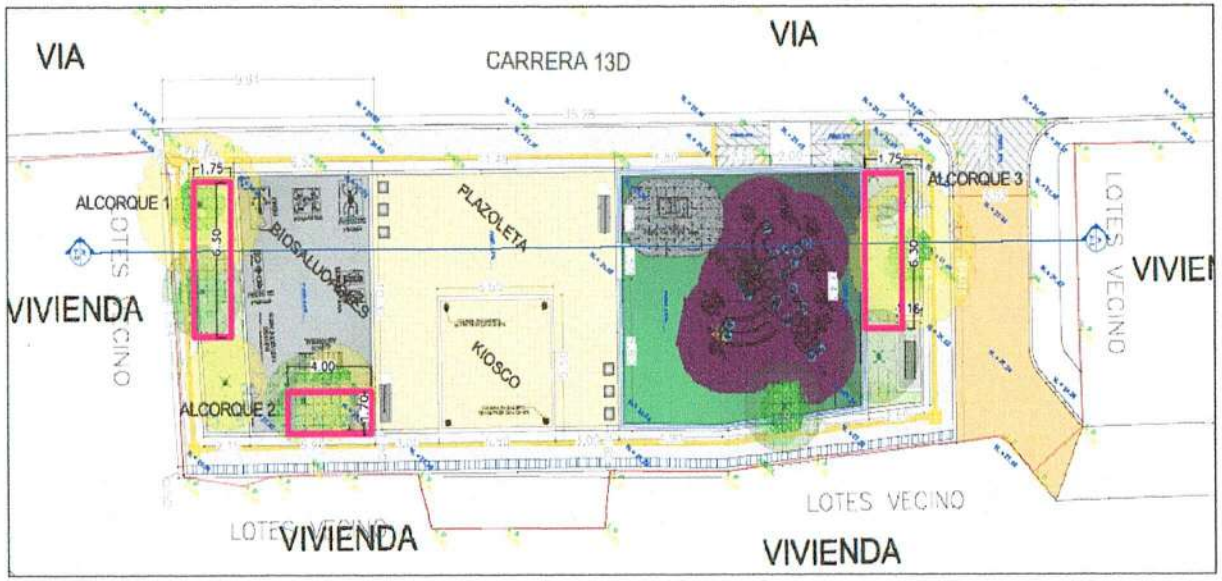

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-08	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,2 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 METROS

PARQUE JHON JAIRO HURTADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)






LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. VIGAS CORONA MURO DE CONTENCIÓN 2 (PLAZOLETA KIOSKO)	26.63				26.63		
2. VIGAS CORONA MURO DE CONTENCIÓN 3 (LADO CANCHA)	19.96				19.96		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**170.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**46.59**						
Obra por ejecutar	**123.41**						

TOTAL PRESENTE ACTA: **46.59**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAITRO HURTADO

VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,2 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 METROS




ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE JHON JAIRO HURTADO
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

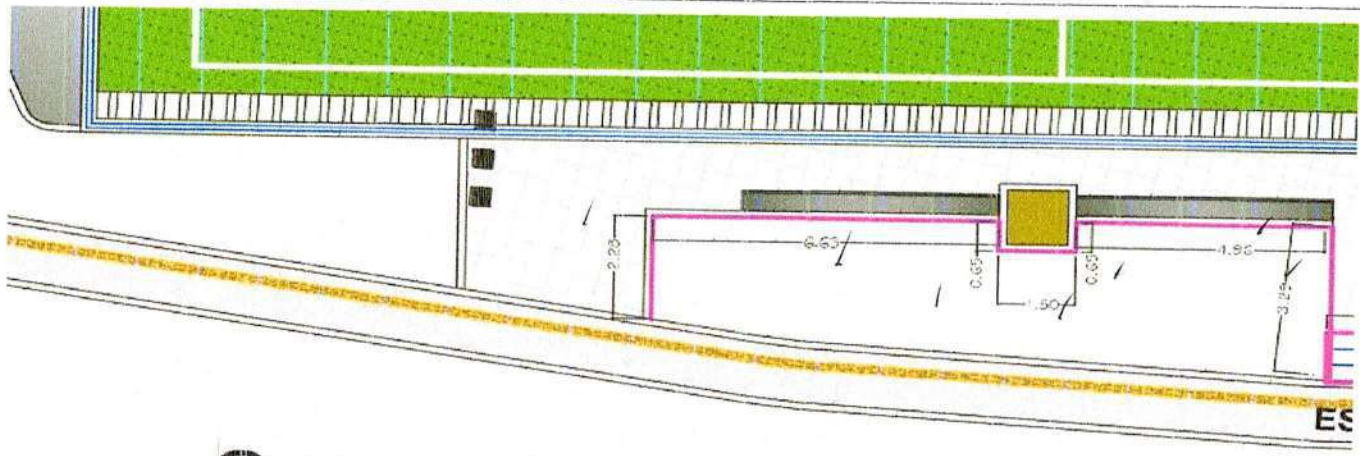

CARRERA 1

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/05/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-09	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE CIUDAD MODESTO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



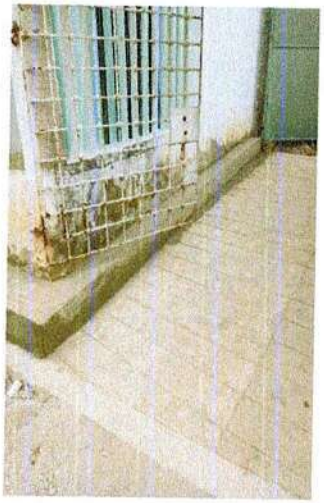

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
2. VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA DEL KIOSKO	44.54				44.54		
3 EXCAVACION VIGA PERIMETRAL BIOSALUDABLE	24.32				24.32		
4. VIGA PARALELA A PREDIOS	37.80				37.80		
5. VIGA PARALELA A PREDIO CONTIGUO AL PARQUE (ZONA VERDE)	28.40				28.40		
6. VIGA PERIMETRAL DE PLAZOLETA ENTRE JUEGO DE NIÑOS Y VIA DE ACCESO	15.72				15.72		
7. VIGA ENTRE JARDINE Y JUEGOS INFANTILES	11.84				11.84		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

PARQUE CIUDAD MODESTO

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 7 0 1 6 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°2

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	06/09/2021
Páginas:	1 DE 1

CONTRATO:	LP-031-2024 LOTE 4			**OBJETO DEL CONTRATO:**	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"
PERIODO:	17/06/2025 - 15/08/2025				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	**CÓDIGO DEL ITEM:**	NP-09	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).

PARQUE PLAZA AGUILA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. EXCAVACION DE VIGA VARIABE CANCHA DE FUTBOL	26.00				26.00		
Cantidad contractual según modificatoria N°2	**350.00**						
Acumulado anterior	**0.00**						
Acumulado a presente acta	**188.62**						
Obra por ejecutar	**161.38**						
TOTAL PRESENTE ACTA:							**26.00**

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA N°2	Código:	IO-FM-29
			Versión:	02
			Fecha:	06/09/2021
			Páginas:	1 DE 1

PARQUE PLAZA AGUILA

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20

