CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
1		**LOTE 2**	**42 días**	**$894.155.890**	**mié 19/11/25**	**mar 30/12/25**		
2		**URBANO**	**26 días**	**$200.433.348**	**jue 4/12/25**	**lun 29/12/25**		
3	**5**	**# 5 - COMUNA 18- CARRERA 73 ENTRE CALLES 2C Y 3**	**26 días**	**$184.492.045**	**jue 4/12/25**	**lun 29/12/25**		
4		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**4 días**	**$989.500**	**vie 5/12/25**	**lun 8/12/25**		
6		**II - DEMOLICIONES**	**4 días**	**$15.458.832**	**jue 4/12/25**	**dom 7/12/25**		
7		CORTE DE CARPETA	1 día	$147.276	jue 4/12/25	jue 4/12/25	8CC	
8		FRESADO	4 días	$15.311.556	jue 4/12/25	dom 7/12/25	10;12CC	7CC
9		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	**8 días**	**$6.553.235**	**jue 4/12/25**	**jue 11/12/25**		
10		EXCAVACION A MAQUINA	4 días	$220.838	lun 8/12/25	jue 11/12/25	14;11CC	8
11		RETIRO DE EXCAVACION A MAQUINA	4 días	$1.177.576	lun 8/12/25	jue 11/12/25		10CC
12		RETIRO DE FRESADO	4 días	$5.154.821	jue 4/12/25	dom 7/12/25		8CC
13		**IV - RELLENOS Y BASES**	**7 días**	**$24.446.790**	**vie 12/12/25**	**jue 18/12/25**		
14		ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	2 días	$7.751.250	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	15	10
15		INSTALACION DE BASE	5 días	$16.695.540	dom 14/12/25	jue 18/12/25	17	14
16		**V - PAVIMENTO ASFALTICO**	**3 días**	**$131.867.325**	**vie 19/12/25**	**dom 21/12/25**		
17		IMPRIMACION	2 días	$4.576.500	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	18CC	15
18		CARPETA ASFALTICA	3 días	$127.290.825	vie 19/12/25	dom 21/12/25	24	17CC
19		**VI - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**$2.692.667**	**vie 26/12/25**	**lun 29/12/25**		
20		DEMARCACION ML	2 días	$1.372.410	vie 26/12/25	sáb 27/12/25	21	23
21		DEMARCACION M2	2 días	$1.320.257	dom 28/12/25	lun 29/12/25		20
22		**VII - DRENAJES**	**4 días**	**$2.483.696**	**lun 22/12/25**	**jue 25/12/25**		
23		NIVELACION SUMIDERO	2 días	$904.268	mié 24/12/25	jue 25/12/25	20	24
24		NIVELACION DE CAMARA	2 días	$1.579.428	lun 22/12/25	mar 23/12/25	23	18
25	**8**	**# 8 - COMUNA 18 - CALLE 2 ENTRE CARRERA 96 Y 97**	**22 días**	**$15.941.303**	**jue 4/12/25**	**jue 25/12/25**		
26		**I - ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**$316.640**	**jue 4/12/25**	**jue 4/12/25**		
27		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANA	1 día	$316.640	jue 4/12/25	jue 4/12/25	5	
28		**II - DEMOLICIONES**	**3 días**	**$62.480**	**jue 4/12/25**	**sáb 6/12/25**		
29		DEMOLICION DE ANDEN	3 días	$62.480	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	31	
30		**III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORT**	**4 días**	**$1.922.251**	**dom 7/12/25**	**mié 10/12/25**		
31		EXCAVACION A MANO	4 días	$660.752	dom 7/12/25	mié 10/12/25	32CC;34;41	29
32		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	4 días	$1.261.499	dom 7/12/25	mié 10/12/25		31CC

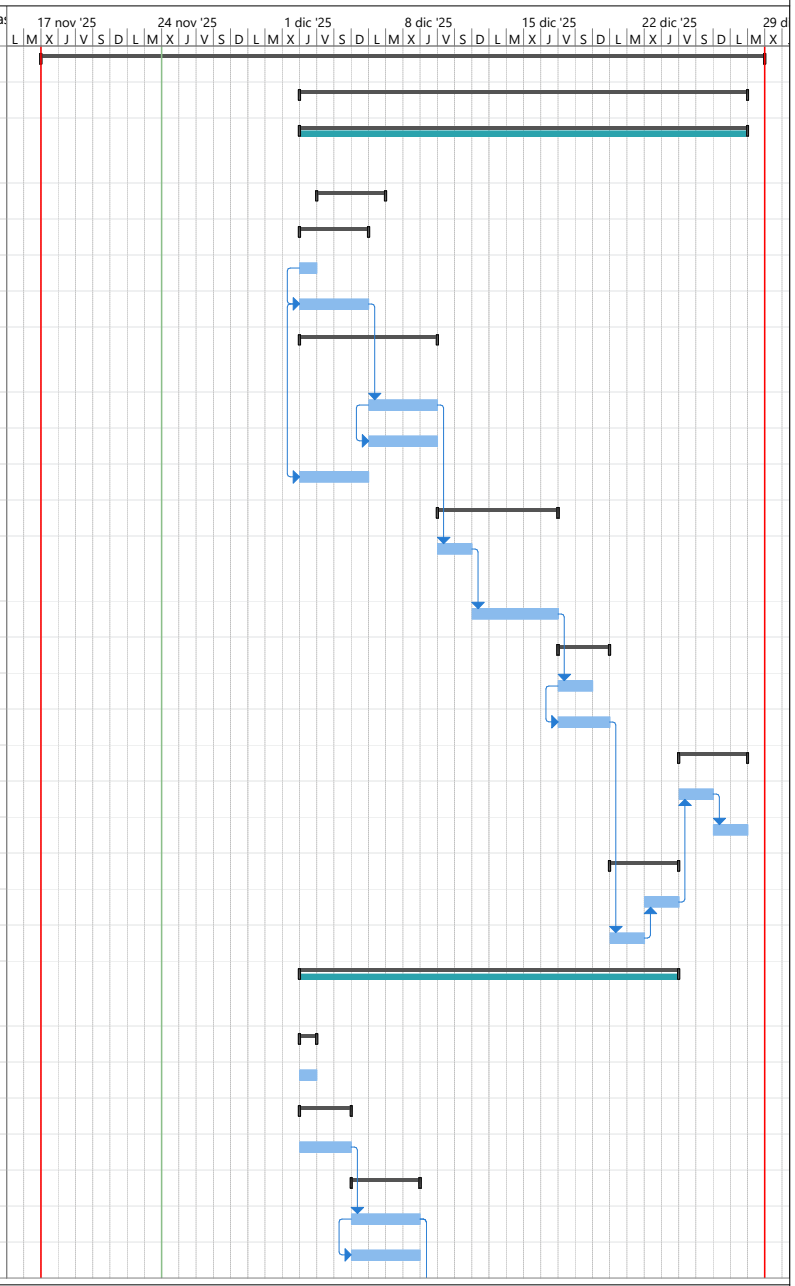

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
33		**IV - RELLENOS Y BASES**	**3 días**	**$616.406**	**jue 11/12/25**	**sáb 13/12/25**		
34		RELLENO CON ROCA	3 días	$616.406	jue 11/12/25	sáb 13/12/25	36	31
35		**CONCRETOS**	**8 días**	**$4.759.149**	**dom 14/12/25**	**dom 21/12/25**		
36		CONSTRUCCION DE ANDEN	5 días	$2.325.288	dom 14/12/25	jue 18/12/25	37CC	34
37		CONSTRUCCION DE GRADA	8 días	$2.433.861	dom 14/12/25	dom 21/12/25	39CC	36CC
38		**ACEROS**	**4 días**	**$336.350**	**dom 14/12/25**	**mié 17/12/25**		
39		ACERO DE REUERZO	4 días	$336.350	dom 14/12/25	mié 17/12/25	43	37CC
40		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**2 días**	**$214.078**	**jue 11/12/25**	**vie 12/12/25**		
41		LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	2 días	$214.078	jue 11/12/25	vie 12/12/25		31
42		**VIII - DRENAJES**	**8 días**	**$7.713.949**	**jue 18/12/25**	**jue 25/12/25**		
43		CONSTRUCCIONES DE CUNETA	8 días	$7.713.949	jue 18/12/25	jue 25/12/25		39
44		**RURAL**	**42 días**	**$693.722.542**	**mié 19/11/25**	**mar 30/12/25**		
45	**1**	**VIA AL PATO PUEBLO PANCE - PANCE**	**41 días**	**$135.826.075**	**mié 19/11/25**	**lun 29/12/25**		
59	**3**	**VORAGINE A PUEBLO PANCE - PANCE**	**26 días**	**$145.645.461**	**mié 19/11/25**	**dom 14/12/25**		
73	**4**	**KM 18 SECTOR PINERA - LA ELVIRA**	**25 días**	**$184.705.826**	**vie 5/12/25**	**lun 29/12/25**		
74		**PRELIMINARES**	**4 días**	**$1.092.841**	**vie 5/12/25**	**lun 8/12/25**		
75		LOCALIZACION Y REPLANTEO	4 días	$1.092.841	vie 5/12/25	lun 8/12/25	93;77CC	47
76		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**15 días**	**$32.440.540**	**vie 5/12/25**	**vie 19/12/25**		
77		EXCAVACION A MAQUINA	15 días	$2.445.113	vie 5/12/25	vie 19/12/25	78CC;79CC;81C	75CC
78		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	15 días	$15.978.929	vie 5/12/25	vie 19/12/25		77CC
79		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	15 días	$14.016.498	vie 5/12/25	vie 19/12/25		77CC
80		**RELLENOS Y BASES**	**10 días**	**$22.779.951**	**vie 5/12/25**	**dom 14/12/25**		
81		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	10 días	$3.229.495	vie 5/12/25	dom 14/12/25	82CC	77CC
82		RELLENO SUBBASE	10 días	$19.550.456	vie 5/12/25	dom 14/12/25	88	81CC
83		**CONCRETOS**	**15 días**	**$80.519.222**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**		
84		CONSTRUCCION DE HUELLAS	15 días	$38.585.911	lun 15/12/25	lun 29/12/25	85CC;86CC	88CC
85		EMPEDRADO	15 días	$31.128.271	lun 15/12/25	lun 29/12/25	90CC	84CC
86		CONSTRUCCION DE VIGA	15 días	$10.805.040	lun 15/12/25	lun 29/12/25		84CC
87		**ACEROS**	**8 días**	**$14.668.560**	**lun 15/12/25**	**lun 22/12/25**		
88		ACERO DE REFUERZO	8 días	$14.668.560	lun 15/12/25	lun 22/12/25	84CC	82
89		**DRENAJES**	**15 días**	**$33.204.712**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**		
90		CONSTRUCCION DE CUNETAS	15 días	$33.204.712	lun 15/12/25	lun 29/12/25		85CC
91	**5**	**VIA PRINCIPAL SECTOR LIMONES - LA CASTILLA**	**15 días**	**$19.599.510**	**mar 9/12/25**	**mar 23/12/25**		
92		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$101.072**	**mar 9/12/25**	**mié 10/12/25**		

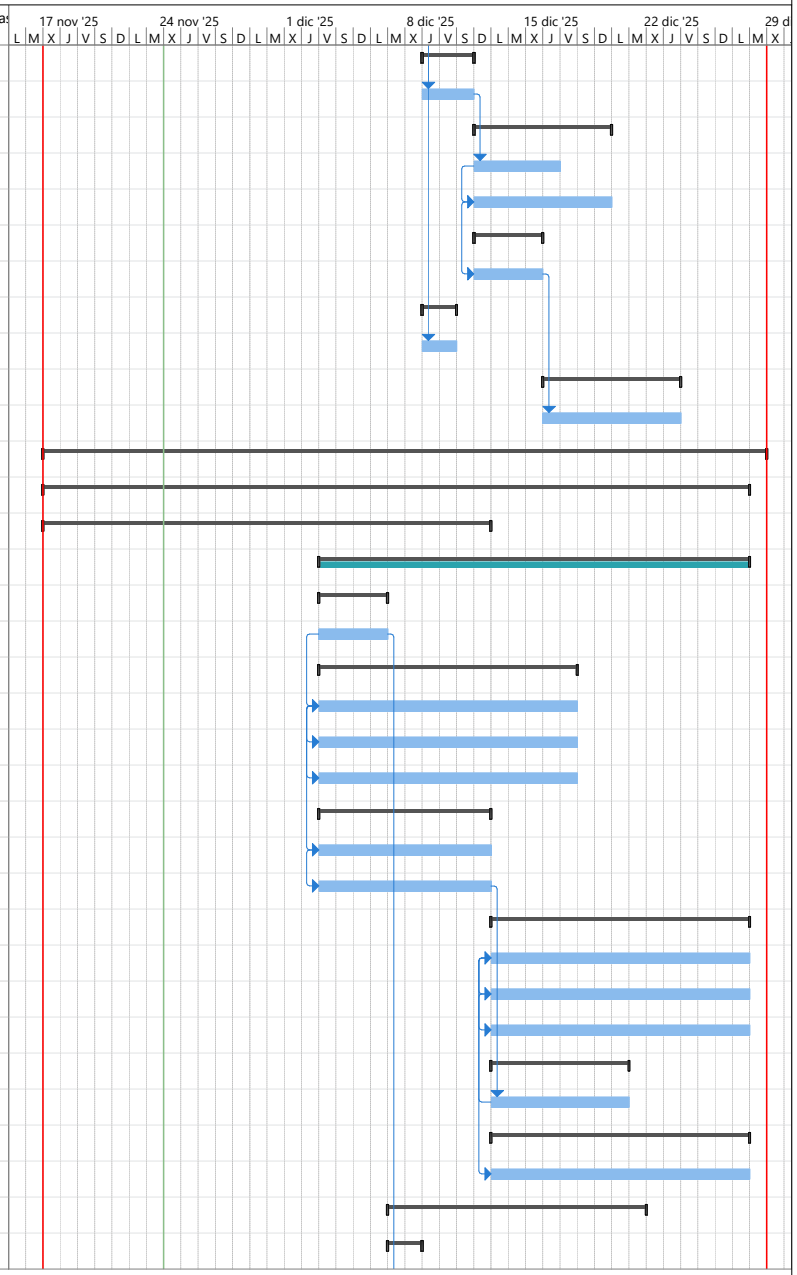

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
93		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$101.072	mar 9/12/25	mié 10/12/25	95CC	75
94		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**2 días**	**$4.066.160**	**mar 9/12/25**	**mié 10/12/25**		
95		EXCAVACION A MAQUINA	2 días	$248.123	mar 9/12/25	mié 10/12/25	96CC;97CC;99	93CC
96		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	$1.322.911	mar 9/12/25	mié 10/12/25		95CC
97		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	2 días	$2.495.126	mar 9/12/25	mié 10/12/25		95CC
98		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**$2.296.261**	**jue 11/12/25**	**dom 14/12/25**		
99		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	2 días	$320.016	jue 11/12/25	vie 12/12/25	100	95
100		RELLENO SUBBASE	2 días	$1.976.245	sáb 13/12/25	dom 14/12/25	106	99
101		**CONCRETOS**	**4 días**	**$8.236.680**	**mié 17/12/25**	**sáb 20/12/25**		
102		CONSTRUCCION DE HUELLAS	2 días	$3.568.639	mié 17/12/25	jue 18/12/25	103;104CC	106
103		EMPEDRADO	2 días	$3.290.189	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	108CC	102
104		CONSTRUCCION DE VIGA	2 días	$1.377.852	mié 17/12/25	jue 18/12/25		102CC
105		**ACEROS**	**2 días**	**$1.535.909**	**lun 15/12/25**	**mar 16/12/25**		
106		ACERO DE REFUERZO	2 días	$1.535.909	lun 15/12/25	mar 16/12/25	102	100
107		**DRENAJES**	**5 días**	**$3.363.428**	**vie 19/12/25**	**mar 23/12/25**		
108		CONSTRUCCION DE CUNETAS	5 días	$3.363.428	vie 19/12/25	mar 23/12/25		103CC
109	6	**VIA PRINCIPAL QUEBARA EL SUSPIRO - LA CASTILLA**	**20 días**	**$23.990.100**	**mié 10/12/25**	**lun 29/12/25**		
110		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$50.536**	**mié 10/12/25**	**jue 11/12/25**		
111		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$50.536	mié 10/12/25	jue 11/12/25	113;131	
112		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**3 días**	**$3.103.542**	**vie 12/12/25**	**dom 14/12/25**		
113		EXCAVACION A MANO	3 días	$1.029.947	vie 12/12/25	dom 14/12/25	114CC;115CC;1	111
114		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	3 días	$1.538.390	vie 12/12/25	dom 14/12/25		113CC
115		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	3 días	$535.205	vie 12/12/25	dom 14/12/25		113CC
116		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**$500.378**	**mar 16/12/25**	**vie 19/12/25**		
117		RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	2 días	$302.983	mar 16/12/25	mié 17/12/25	118	125
118		RELLENO CON ROCA	2 días	$197.395	jue 18/12/25	vie 19/12/25	120	117
119		**CONCRETOS**	**2 días**	**$292.229**	**sáb 20/12/25**	**dom 21/12/25**		
120		CONSTRUCCION DE SOLADO	2 días	$292.229	sáb 20/12/25	dom 21/12/25	122	118
121		**ACEROS**	**2 días**	**$4.036.200**	**lun 22/12/25**	**mar 23/12/25**		
122		ACERO DE REFUERZO	2 días	$4.036.200	lun 22/12/25	mar 23/12/25	126	120
123		**DRENAJES**	**15 días**	**$16.007.215**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**		

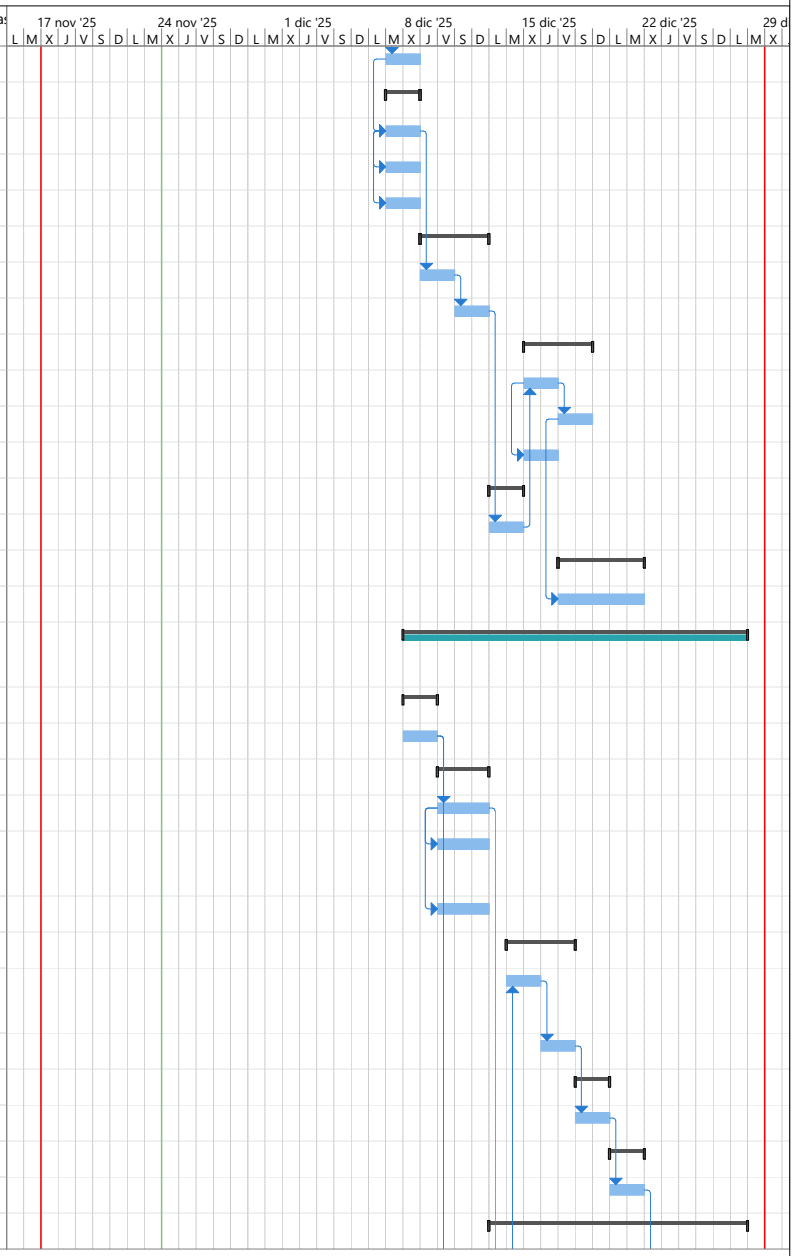

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
124		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO	1 día	$193.792	lun 15/12/25	lun 15/12/25	125CC	113
125		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 36	1 día	$8.188.224	lun 15/12/25	lun 15/12/25	117	124CC
126		CONSTRUCCION DE CABEZAL	3 días	$5.411.226	mié 24/12/25	vie 26/12/25	127;128	122
127		CONSTRUCCION DE DISIPADORES	3 días	$1.939.780	sáb 27/12/25	lun 29/12/25		126
128		CONSTRUCCION DE CUNETAS	2 días	$274.193	sáb 27/12/25	dom 28/12/25		126
129	7	**VIA AL K 18 CABECERA PARTE ALTA DESDE DON LINO HASTA LAS MENECES - LA PAZ**	**15 días**	**$106.538.120**	**vie 12/12/25**	**vie 26/12/25**		
130		**PRELIMINARES**	**3 días**	**$2.665.774**	**vie 12/12/25**	**dom 14/12/25**		
131		LOCALIZACION Y REPLANTEO	3 días	$2.665.774	vie 12/12/25	dom 14/12/25	133	111
132		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**5 días**	**$15.870.998**	**lun 15/12/25**	**vie 19/12/25**		
133		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	5 días	$15.870.998	lun 15/12/25	vie 19/12/25	135	131
134		**RELLENOS Y BASES**	**7 días**	**$88.001.348**	**sáb 20/12/25**	**vie 26/12/25**		
135		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	2 días	$14.067.370	sáb 20/12/25	dom 21/12/25	136	133
136		RELLENO SUBBASE	5 días	$73.933.978	lun 22/12/25	vie 26/12/25		135
137	8	**CABECERA PARTE ALTA DESDE DONDE LINO HASTA LAS MENESES - LA PAZ**	**18 días**	**$22.172.802**	**mié 26/11/25**	**sáb 13/12/25**		
138		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$808.576**	**vie 12/12/25**	**sáb 13/12/25**		
139		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$808.576	mié 26/11/25	jue 27/11/25	153;141	
140		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**4 días**	**$5.376.690**	**vie 28/11/25**	**lun 1/12/25**		
141		EXCAVACION A MANO	4 días	$1.572.590	vie 28/11/25	lun 1/12/25	142CC;145CC+2	139
142		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	4 días	$3.032.450	vie 28/11/25	lun 1/12/25	143CC	141CC
143		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	4 días	$771.650	vie 28/11/25	lun 1/12/25		142CC
144		**RELLENOS Y BASES**	**7 días**	**$1.736.607**	**dom 30/11/25**	**sáb 6/12/25**		
145		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	4 días	$749.632	dom 30/11/25	mié 3/12/25	146CC+2 días	141CC+2 dí
146		RELLENO ROCA	5 días	$986.975	mar 2/12/25	sáb 6/12/25	148CC+2 días	145CC+2 dí
147		**ACEROS**	**4 días**	**$797.217**	**jue 4/12/25**	**dom 7/12/25**		
148		ACERO DE REFUERZO	4 días	$797.217	jue 4/12/25	dom 7/12/25	150CC+2 días	146CC+2 dí
149		**DRENAJES**	**8 días**	**$13.453.712**	**sáb 6/12/25**	**sáb 13/12/25**		
150		CONSTRUCCION DE CUNETAS	8 días	$13.453.712	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25	155	148CC+2 dí
151	10	**SECTOR LA CALDERA - GOLONDRINAS**	**29 días**	**$15.864.077**	**mar 2/12/25**	**mar 30/12/25**		
152		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$568.530**	**mar 2/12/25**	**mié 3/12/25**		
153	3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$568.530	mar 2/12/25	mié 3/12/25	155	139
154		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**3 días**	**$3.771.202**	**lun 15/12/25**	**mié 17/12/25**		

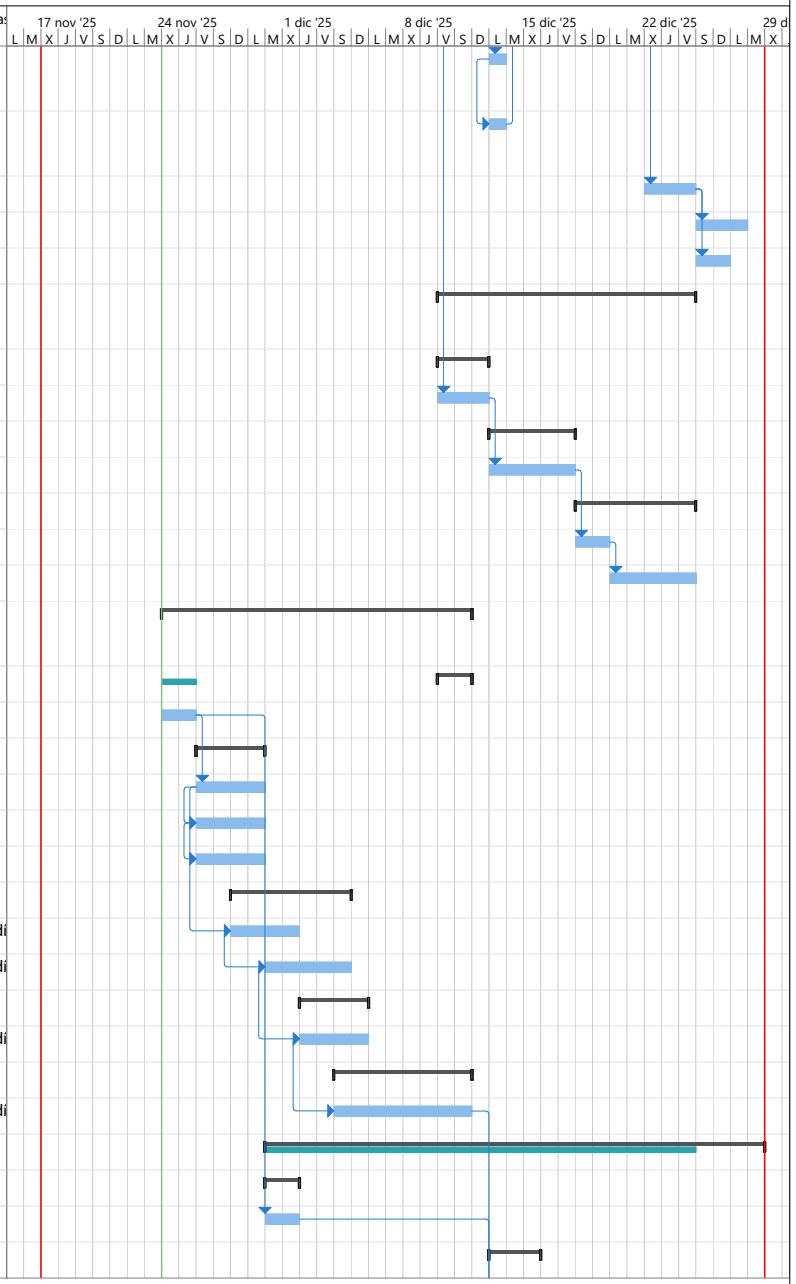

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
155		EXCAVACION A MANO	3 días	$1.105.934	lun 15/12/25	mié 17/12/25	156CC;157CC;1	150;153
156		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	3 días	$2.122.715	lun 15/12/25	mié 17/12/25		155CC
157		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	3 días	$542.553	lun 15/12/25	mié 17/12/25		155CC
158		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**$1.244.885**	**mié 17/12/25**	**sáb 20/12/25**		
159		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	2 días	$527.085	mié 17/12/25	jue 18/12/25	160CC+2 días	155CC+2 dí
160		RELLENO ROCA	2 días	$717.800	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	162CC+1 día	159CC+2 dí
161		**ACEROS**	**2 días**	**$819.819**	**sáb 20/12/25**	**dom 21/12/25**		
162		ACERO DE REFUERZO	2 días	$819.819	sáb 20/12/25	dom 21/12/25	164CC+2 días	160CC+1 dí
163		**DRENAJES**	**5 días**	**$9.459.641**	**lun 22/12/25**	**vie 26/12/25**		
164		CONSTRUCCION DE CUNETAS	5 días	$9.459.641	lun 22/12/25	vie 26/12/25		162CC+2 dí
165	**11**	**SECTOR LA CADERA LIMITES CON LA PAZ - GOLONDRINAS**	**12 días**	**$13.843.984**	**lun 15/12/25**	**vie 26/12/25**		
166		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$492.726**	**lun 15/12/25**	**mar 16/12/25**		
167		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$492.726	lun 15/12/25	mar 16/12/25		
168		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**3 días**	**$3.248.201**	**lun 15/12/25**	**mié 17/12/25**		
169		EXCAVACION A MANO	3 días	$958.503	lun 15/12/25	mié 17/12/25	170CC;171CC;1	
170		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	3 días	$1.819.470	lun 15/12/25	mié 17/12/25		169CC
171		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	3 días	$470.228	lun 15/12/25	mié 17/12/25		169CC
172		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**$1.084.882**	**mié 17/12/25**	**sáb 20/12/25**		
173		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	2 días	$456.807	mié 17/12/25	jue 18/12/25	174CC+2 días	169CC+2 dí
174		RELLENO ROCA	2 días	$628.075	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	176CC+2 días	173CC+2 dí
175		**ACEROS**	**3 días**	**$819.819**	**dom 21/12/25**	**mar 23/12/25**		
176		ACERO DE REFUERZO	3 días	$819.819	dom 21/12/25	mar 23/12/25	178CC+2 días	174CC+2 dí
177		**DRENAJES**	**4 días**	**$8.198.356**	**mar 23/12/25**	**vie 26/12/25**		
178		CONSTRUCCION DE CUNETAS	4 días	$8.198.356	mar 23/12/25	vie 26/12/25		176CC+2 dí
179	**12**	**SECTOR SAN ISIDRO - GOLONDRINAS**	**10 días**	**$5.478.695**	**sáb 6/12/25**	**lun 15/12/25**		
180		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$126.340**	**sáb 6/12/25**	**dom 7/12/25**		
181		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$126.340	sáb 6/12/25	dom 7/12/25	183	
182		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**2 días**	**$851.489**	**lun 8/12/25**	**mar 9/12/25**		
183		EXCAVACION A MANO	2 días	$245.717	lun 8/12/25	mar 9/12/25	184CC;185CC;1	181
184		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	$485.192	lun 8/12/25	mar 9/12/25		183CC
185		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	2 días	$120.580	lun 8/12/25	mar 9/12/25		183CC
186		**RELLENOS Y BASES**	**3 días**	**$296.580**	**mié 10/12/25**	**vie 12/12/25**		

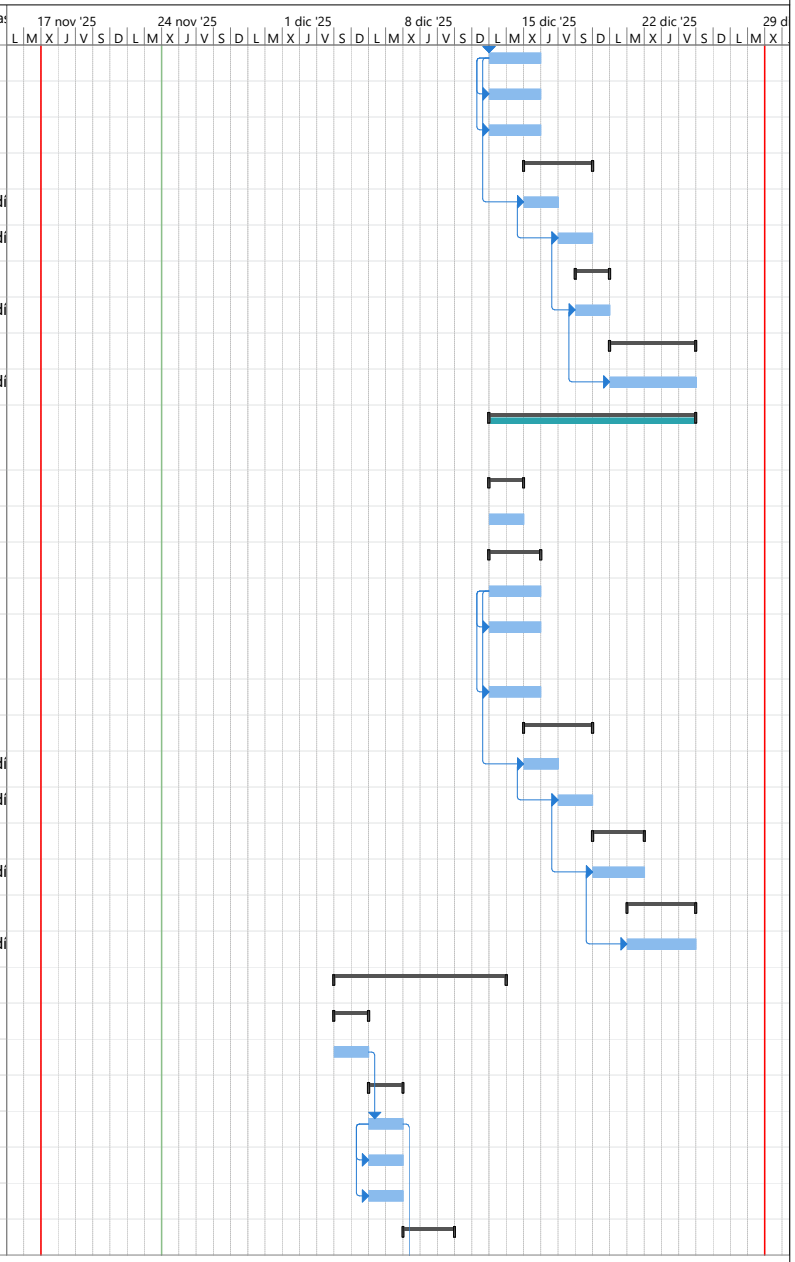

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
187		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	1 día	$117.130	mié 10/12/25	mié 10/12/25	188	183
188		RELLENO ROCA	2 días	$179.450	jue 11/12/25	vie 12/12/25	190	187
189		**ACEROS**	**1 día**	**$2.102.143**	**sáb 13/12/25**	**sáb 13/12/25**		
190		ACERO DE REFUERZO	1 día	$2.102.143	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	192	188
191		**DRENAJES**	**2 días**	**$2.102.143**	**dom 14/12/25**	**lun 15/12/25**		
192		CONSTRUCCION DE CUNETAS	2 días	$2.102.143	dom 14/12/25	lun 15/12/25		190
193	**13**	**SECTOR LA CALDERA 2- GOLONDRINAS**	**15 días**	**$10.873.187**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**		
194		**PRELIMINARES**	**2 días**	**$410.605**	**lun 15/12/25**	**mar 16/12/25**		
195		LOCALIZACION Y REPLANTEO	2 días	$410.605	lun 15/12/25	mar 16/12/25	197	
196		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**5 días**	**$2.707.026**	**mié 17/12/25**	**dom 21/12/25**		
197		EXCAVACION A MANO	5 días	$798.684	mié 17/12/25	dom 21/12/25	198CC;199CC;2	195
198		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	5 días	$1.516.225	mié 17/12/25	dom 21/12/25		197CC
199		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	2 días	$392.117	mié 17/12/25	jue 18/12/25		197CC
200		**RELLENOS Y BASES**	**7 días**	**$919.023**	**jue 18/12/25**	**mié 24/12/25**		
201		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	3 días	$380.673	jue 18/12/25	sáb 20/12/25	202CC+2 días	197CC+1 dí
202		RELLENO ROCA	5 días	$538.350	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	204CC+2 días	201CC+2 dí
203		**DRENAJES**	**8 días**	**$6.836.533**	**lun 22/12/25**	**lun 29/12/25**		
204		CONSTRUCCION DE CUNETAS	8 días	$6.836.533	lun 22/12/25	lun 29/12/25		202CC+2 dí
205	**14**	**SECTOR LOS PINOS - GOLONDRINAS**	**15 días**	**$9.184.705**	**mié 3/12/25**	**mié 17/12/25**		
206		**PRELIMINARES**	**1 día**	**$347.435**	**mié 3/12/25**	**mié 3/12/25**		
207		LOCALIZACION Y REPLANTEO	1 día	$347.435	mié 3/12/25	mié 3/12/25	209	
208		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**4 días**	**$2.281.075**	**mié 3/12/25**	**sáb 6/12/25**		
209		EXCAVACION A MAQUINA	3 días	$675.619	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	213CC+2 días	207
210		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	3 días	$1.273.629	mié 3/12/25	vie 5/12/25		
211		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	3 días	$331.827	mié 3/12/25	vie 5/12/25		
212		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**$770.733**	**sáb 6/12/25**	**mar 9/12/25**		
213		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	2 días	$322.108	sáb 6/12/25	dom 7/12/25	214CC+2 días	209CC+2 dí
214		RELLENO ROCA	2 días	$448.625	lun 8/12/25	mar 9/12/25	216CC+2 días	213CC+2 dí
215		**DRENAJES**	**8 días**	**$5.785.462**	**mié 10/12/25**	**mié 17/12/25**		
216		CONSTRUCCION DE CUNETAS	8 días	$5.785.462	mié 10/12/25	mié 17/12/25		214CC+2 dí

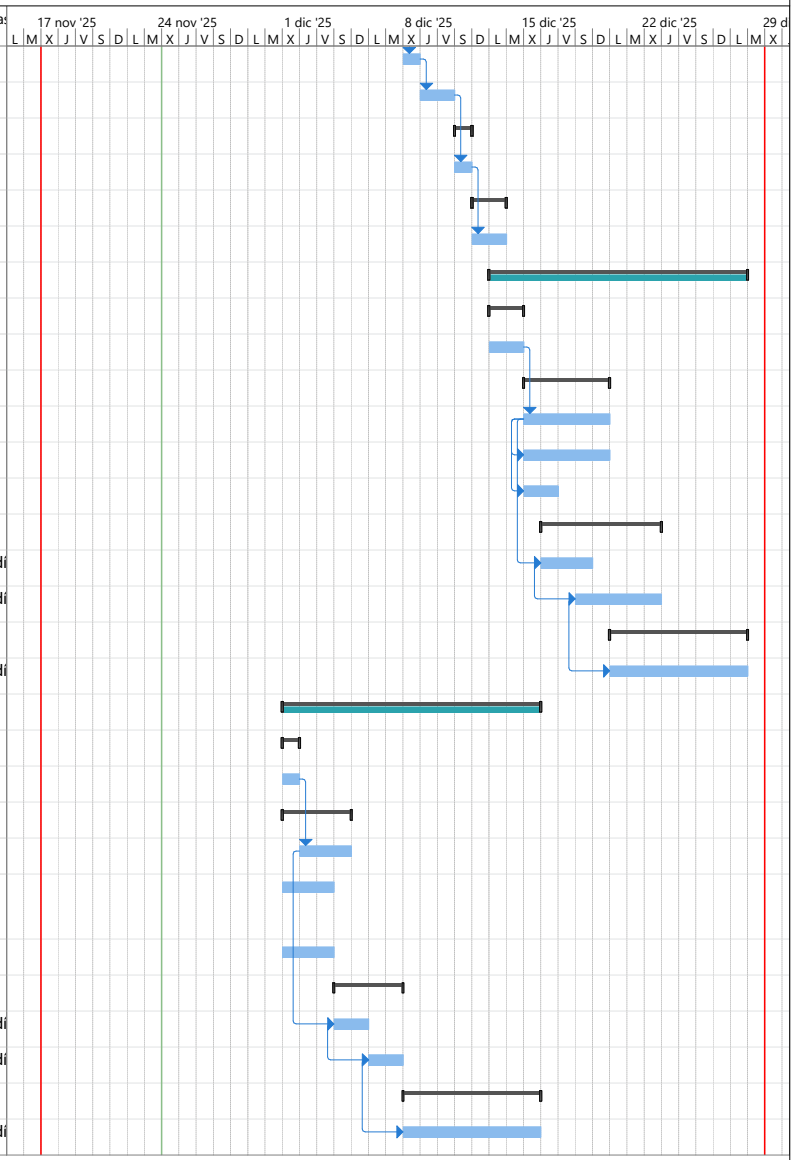

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
