SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	Valentín Eduardo Barajas Santos	No. de Celular.	Fecha	
6	11	2025	Cargo:	Director de Interventoria - Consorcio Movilidad Capital	3116387026	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD**

N° C.C. / NIT: 901.933.921-0

Dirección: **CALLE 105 No. 46 - 26**

No. Celular: 3007942555

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: sdm2780.bzc@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2025/05/31 No.: 2025-2780 Fecha de inicio: 2025/04/29 Plazo de Ejecución: Meses 10 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 1

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes SI _X_ NO ___
Cabe resaltar que la SDM garantiza un flujo de caja permanente al prever en la forma de pago, el corte mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría contratada para tal fin.
La Entidad cancelará al contratista, el valor del contrato como, se establece a continuación:
La Secretaría Distrital de Movilidad pagará, el valor de los servicios efectivamente prestados mediante pagos mensuales vencidos, acorde con los valores unitarios descritos en la propuesta, con base en cortes al último día de cada mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El primer y último pago se realizará de la siguiente forma:
El primer pago se hará por los servicios efectivamente prestados en el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día contable de ese mismo mes, previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado.
El último pago será igualmente por los servicios efectivamente prestados, quedando sujeto a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato para el periodo facturado. La SDM efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.
La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.
El Interventor en conjunto con el contratista liquidarán para cada corte, los valores realmente ejecutados en el componente del lote o grupo 1, indicados en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE, literal "a. Items de pago" del anexo mencionado, así como los precios unitarios, dejarán plasmado en el acta de recibo parcial de cada periodo a pagar, los soportes que conducen a dichos valores por cada componente, haciendo referencia a los ítems de la oferta.
Sobre el valor total del corte mensual facturado, se realizará una retención del cinco (5%) por ciento como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato, una vez se suscriba el acta de liquidación del mismo.
El (los) pago(s) se efectuará(n) previa presentación de los documentos señalados por el Supervisor del contrato, información que se suministrará con la suscripción del acta de inicio.
NOTA 1: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad sólo adquiere obligaciones con el proponente ganador en el proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
El pago será realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de ley.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	01	09	2025		30	09	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 Pensionado:

VALOR IVA: Pensionado:

No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0

No. Autorización o Planilla:

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 341.896.623 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 10 Número de pago actual: 5

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 5.141.951.324	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	106	fecha	2025/01/02
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 648.146.996	$ 52.107.559	No. Registro Presupuestal	2448	fecha	2025/04/21
4. Valor a cancelar	$ 341.896.623	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 4.151.907.705		Código cuenta presupuestal	O230117240920240127		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar:
16 - Banco Davivienda S.A.	Ahorros	469500044000	Código SWIFT:

VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

Las facturas electrónicas de venta FE11 presentadas por CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD., correspondiente al corte 5 (01/09/2025 - 30/09/2025), en desarrollo del Contrato No. 2025-2780, son aceptadas por la interventoría, en ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Representante legal
Consorcio Balzon - Movilidad
C.C. / NIT 79.249.755

Firma supervisor
C.C. / NIT

Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos
Firma Director de Interventoría
C.C. / NIT 1.098.614.976

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Movilidad
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA		
6	11	2025	**Nombre: Valentin Eduardo Barajas Santos** **Cargo: Director de Interventoria**	3116387026

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD		No. C.C. / NIT	901.933.921-0

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] **No.** 2025-2780

OBJETO CONTRACTUAL:

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 1

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	**Hasta**	DD	MM	AA
	01	**9**	**2025**		**30**	**9**	**2025**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS				PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C LOTE 1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	43,14	SE ANEXA CORTE FINAL DEL MES Y FORMATOS DE ACTIVIDADES EN TERRENO PARA EL CORTE No. 5 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	2	Localización, verificación y replanteo	UN	4	
	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	13	
	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	6,3	
	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	10,75	
	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	37,3	
	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	2,46	
	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	58,77	
	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	19,35	
	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	28,15	
	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	36,58	
	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	5	
	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	78	
	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	20	
	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	4,33	
	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	24,15	
	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	16,38	
	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	154,39	
	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	19,44	
	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	14	
	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	2	
	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	2	
	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	4,43	
	43	Construcción de Pañetes	M2	6,31	
	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	7	
	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	1	
	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	5	
	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de	UN	3	
	49	Perforación dirigida	ML	169,46	
	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	72,36	
	53	Empradización	M2	4,7	
	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	11	
	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	2	
	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	49	
	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	2,01	
	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	32,62	
	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	3	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	12	
	76	Ensayo de compactación	UN	5	
	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	6	
	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	1	
	80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el trasladado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	48	
	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1	
	82	Personal Técnico de Obra	MES	1	

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte. **NO**

Representante legal Consorcio Belzcon - Movilidad	Firma supervisor	Ing. Valentín Eduardo Barajas Santos Firma Director de Interventoría
C.C. / NIT 79.249.755	C.C. / NIT	C.C. / NIT 1.098.614.976

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

NIT: 901933921-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 105 NO 46 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6018086625

Email. facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764092511661 válida desde 2025-04-29 hasta 2027-04-29 rango desde FE1 hasta FE100.

BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90%
INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

Nombre o Razón Social:	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT :	899999061
Dirección:	AV CALLE 13 35 37, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3649400
Email:	adrodriguez@movilidadbogota.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	06/02/2026
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE11**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:13:17-05:00**
FECHA FIRMADO:	**06/11/2025 12:13:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	11	2025	06	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	Contrato 2025 -2780 EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1 Corte 5: Septiembre 2025 (01/09/2025 - 30/09/2025)	WSD	1,00	$271.145.319,00				0,00	$271.145.319,00
2	4	AIU Retegarantia 5%: $17.994.559---------- ----------DIAN concepto 017132 de marzo 24 de2001NO SE GENERA IVA DE ACUERDOCON LEY 80DE 1993 ARTICULO 100DE LA LEY 21 DE1992	WSD	1,00	$88.745.863,00				0,00	$88.745.863,00

Notas:
Nota: Cobro de items de conformidad a lo establecido en el contrato de obra No. 2025 ? 2780 Cuyo Objeto es:?EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. ? LOTE 1?--- BELZCON SAS- NIT 901.252.860-7 90% INGELAS SAS - NIT 891.200.711-1 10%

SON: (trescientos cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y dos pesos)
CUFE: 41aef253c85da695288a4c1b8778a3208912901956154d9fcf453935894ded1433486d142d71de1457d774abf8ddad41

Subtotal:	$359.891.182,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$359.891.182,00

Firma Digital: AMy70dLqWoU6oJM85cUsykK17KxH6g726N3d38VPsH55JchvweP4qaBtVT45eJC4
7zvgqCwL3rI1lt9hdSE18TfHdrguQBoZ+1++ychzTKj7HJZ+AD
TJdB1rDtuboc6e /r6NPQdoRIRVGqd3j7VDfzfoF5OTFrYOUWZ++tmcB8aFOy/pg9JbdchYkfqKy6mv z4mVSMNXukV++DHb1JSLYuGMzoAgLadOUBo
ze4456qB197tkvZAlWz9Vf7xPSEOu IGEmy99iYpKexybieyKel8FM3O3gCdZ7ARvS3rXu6zliR/Q5QPL4/3IB7sJf65YG VfBZxlZdczfDCQKW1Szk
AQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FORMATO DE ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA N°:	2025-2780	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 5.141.951.324	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"	**ACTA DE INICIO**	29 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	**FECHA DE INICIO:**	29 DE ABRIL DE 2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	**PLAZO DE EJECUCION:**	10 MESES	
FECHA DEL ACTA	30/9/2025	**PORCENTAJE DE AVANCE**	**7,00%**	

				CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL N°5		ACUMULADO TOTAL	
N°	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**		**VALOR UNITARIO 2025**	**VALOR UNITARIO 2026****	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
I. ITEMS por disponibilidad mensual												
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML		$17.235		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN		$17.235		87,00	$ 1.499.445,00	4,00	$ 68.940,00	91,00	$ 1.568.385,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN		$17.235		10,00	$ 172.350,00	13,00	$ 224.055,00	23,00	$ 396.405,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN		$17.235		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 1.671.795,00**		**$ 292.995,00**		**$ 1.964.790,00**
II. Demoliciones												
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3		$326.365		6,16	$ 2.010.408,00	6,30	$ 2.056.100,00	12,46	$ 4.066.508,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en	M3		$1.569.620		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3		$298.367		9,94	$ 2.965.768,00	10,75	$ 3.207.445,00	20,69	$ 6.173.213,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML		$38.864		59,85	$ 2.326.010,00	37,30	$ 1.449.627,00	97,15	$ 3.775.638,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de	M2		$48.816		1,20	$ 58.579,00	2,46	$ 120.087,00	3,66	$ 178.667,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3		$147.024		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 7.360.765,00**		**$ 6.833.259,00**		**$ 14.194.026,00**
III. Excavaciones												
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre	M3		$242.035		113,79	$ 27.541.163,00	58,77	$ 14.224.397,00	172,56	$ 41.765.560,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 27.541.163,00**		**$ 14.224.397,00**		**$ 41.765.560,00**
IV. Transporte de escombros												
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por	M3		$110.209		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 0,00**		**$ -**		**$ 0,00**
V. Suministro para redes												
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de	ML		$81.725		18,80	$ 1.536.430,00	19,35	$ 1.581.379,00	38,15	$ 3.117.809,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de	ML		$109.243		0,45	$ 49.159,00	28,15	$ 3.075.190,00	28,60	$ 3.124.350,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP	ML		$154.401		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos	ML		$33.658		1,50	$ 50.487,00	0,00	$ -	1,50	$ 50.487,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres	ML		$48.669		22,85	$ 1.112.087,00	36,58	$ 1.780.312,00	59,43	$ 2.892.399,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de	ML		$53.575		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de	UN		$16.268		3,00	$ 48.804,00	5,00	$ 81.340,00	8,00	$ 130.144,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de	UN		$18.438		30,00	$ 553.140,00	78,00	$ 1.438.164,00	108,00	$ 1.991.304,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de	UN		$32.605		12,00	$ 391.260,00	20,00	$ 652.100,00	32,00	$ 1.043.360,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 3.741.367,00**		**$ 8.608.485,00**		**$ 12.349.853,00**
VI. Rellenos												
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y	M3		$263.408		2,90	$ 763.883,00	4,33	$ 1.140.557,00	7,23	$ 1.904.440,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3		$284.705		23,41	$ 6.664.944,00	24,15	$ 6.875.626,00	47,56	$ 13.540.570,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3		$358.589		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3		$1.667.118		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3		$1.702.001		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la	M3		$113.315		3,92	$ 444.195,00	16,38	$ 1.856.100,00	20,30	$ 2.300.295,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 7.873.022,00**		**$ 9.872.283,00**		**$ 17.745.305,00**
VII. Construcciones												
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la	M2		$143.115		79,24	$ 11.340.433,00	154,39	$ 22.095.525,00	233,63	$ 33.435.957,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la	M3		$1.224.092		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2		$243.872		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2		$220.159		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico	M2		$280.338		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico	M2		$286.009		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o	M2		$282.241		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla	M2		$394.694		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito	M2		$399.789		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56	M2		$214.458		8,52	$ 1.827.182,00	19,44	$ 4.169.064,00	27,96	$ 5.996.246,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN		$1.134.375		3,00	$ 3.403.125,00	14,00	$ 15.881.250,00	17,00	$ 19.284.375,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN		$2.345.671		1,00	$ 2.345.671,00	2,00	$ 4.691.342,00	3,00	$ 7.037.013,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye	UN		$1.846.130		0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.692.260,00	2,00	$ 3.692.260,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto	M2		$268.906		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2		$240.798		2,24	$ 539.388,00	4,43	$ 1.066.735,00	6,67	$ 1.606.123,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2		$184.278		2,26	$ 416.468,00	6,31	$ 1.162.794,00	8,57	$ 1.579.262,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de	UN		$424.684		4,00	$ 1.698.736,00	7,00	$ 2.972.788,00	11,00	$ 4.671.524,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de	UN		$505.650		0,00	$ 0,00	1,00	$ 505.650,00	1,00	$ 505.650,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja	UN		$333.800		103,00	$ 34.381.400,00	5,00	$ 1.669.000,00	108,00	$ 36.050.400,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y	UN		$208.177		3,00	$ 624.531,00	3,00	$ 624.531,00	6,00	$ 1.249.062,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y	UN		$257.665		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML		$700.343		405,65	$ 284.094.138,00	169,46	$ 118.680.125,00	575,11	$ 402.774.263,00
50	50	Perforación neumática	ML		$567.624		26,50	$ 15.042.036,00	0,00	$ -	26,50	$ 15.042.036,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML		$303.894		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en	ML		$137.732		103,45	$ 14.248.375,00	72,36	$ 9.966.288,00	175,81	$ 24.214.663,00
53	53	Empradización	M2		$56.243		0,00	$ 0,00	4,70	$ 264.342,00	4,70	$ 264.342,00

FORMATO DE ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA N°:	2025-2780	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 5.141.951.324	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"	**ACTA DE INICIO**	29 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	**FECHA DE INICIO:**	29 DE ABRIL DE 2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	**PLAZO DE EJECUCION:**	10 MESES	
FECHA DEL ACTA	30/9/2025	**PORCENTAJE DE AVANCE**	**7,00%**	

				CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA PARCIAL N°5		ACUMULADO TOTAL	
N°	**ITEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**		**VALOR UNITARIO 2025**	**VALOR UNITARIO 2026****	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2	UN		$1.137.937		7,00	$ 7.965.559,00	11,00	$ 12.517.307,00	18,00	$ 20.482.866,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50	UN		$2.494.917		0,00	$ 0,00	2,00	$ 4.989.834,00	2,00	$ 4.989.834,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video	UN		$1.154.318		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video	UN		$1.278.127		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video	UN		$1.325.663		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m	UN		$542.557		10,00	$ 5.425.570,00	0,00	$ -	10,00	$ 5.425.570,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN		$300.014		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN		$339.272		0,00	$ 0,00	49,00	$ 16.624.328,00	49,00	$ 16.624.328,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a	M3		$1.414.389		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano,	M2		$145.164		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico	M2		$176.897		1,21	$ 214.045,00	2,01	$ 355.563,00	3,22	$ 569.608,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil	M2		$134.166		2,20	$ 295.165,00	32,62	$ 4.376.495,00	34,82	$ 4.671.660,00
66	66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN		$41.129.176		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN		$38.548.008		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN		$590.591		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN		$525.641		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular	UN		$520.334		0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.561.002,00	3,00	$ 1.561.002,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular	UN		$677.267		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular	UN		$482.671		104,00	$ 50.197.784,00	12,00	$ 5.792.052,00	116,00	$ 55.989.836,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja	UN		$368.010		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN		$428.571		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN		$424.290		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 434.059.606,00**		**$ 233.658.275,00**		**$ 667.717.880,00**
VIII. Ensayos de Laboratorio												
76	76	Ensayo de compactación	UN		$227.539		7,00	$ 1.592.773,00	5,00	$ 1.137.695,00	12,00	$ 2.730.468,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN		$53.173		28,00	$ 1.488.844,00	6,00	$ 319.038,00	34,00	$ 1.807.882,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN		$148.980		0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 3.081.617,00**		**$ 1.456.733,00**		**$ 4.538.350,00**
IX. Transportes												
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES		$14.509.500		1,53	$ 22.199.535,00	1,00	$ 14.509.500,00	2,53	$ 36.709.035,00
80	80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y	HR		$439.157		0,00	$ 0,00	48,00	$ 21.079.536,00	48,00	$ 21.079.536,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 22.199.535,00**		**$ 35.589.036,00**		**$ 57.788.571,00**
X. Personal												
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES		$37.224.896		3,70	$ 137.732.115,00	1,00	$ 37.224.896,00	4,70	$ 174.957.011,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES		$12.130.823		3,05	$ 36.999.010,00	1,00	$ 12.130.823,00	4,05	$ 49.129.833,00
				Subtotal 2025		Subtotal 2026		**$ 174.731.125,00**		**$ 49.355.719,00**		**$ 224.086.844,00**
				TOTAL 2025		**TOTAL 2026**	**T. Anterior**	**$ 682.259.995,00**	**T. Acta**	**$ 359.891.182,00**	T. Acumulado	**$ 1.042.151.179,00**
TAL OBRAS CIVILES												

****Nota: El valor unitario del año 2026 será definido cuando se tenga el IPC oficial del 2025**

DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE**
ADMINISTRACION	26,73%
IMPREVISTO	2%
UTILIDAD	4%
TOTAL A.I.U.	**32,73%**

BALANCE DEL CONTRATO 2025			
VALOR CONTRATO	$	5.141.951.324,00	
ACTA PARCIAL N° 5			$ 359.891.182,00
RETENCIÓN EN GARANTÍA (5%)			$ 17.994.559,00
VALOR A PAGAR			$ 341.896.623,00
FALTANTE POR EJECUTAR			$ 4.782.060.142,00
SUMAS IGUALES	$	5.141.951.324,00	$ 5.141.951.324,00

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	2,0	DESCRIPCIÓN	Localización, verificación y replanteo	UND.	UN

EXT 3664 ID 767 AK 50 X DG 16 S



ID	EXT - INT	Direccion	Localizacion	Coordenadas	Elemento	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	ANDÉN NORTE		Caja de paso sencilla	UN	4,0	4,00		Mantenimiento	SI	
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,00
Anterior	0,00
TOTAL	**4,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	3,0	DESCRIPCIÓN	Limpieza de Caja de Paso	UND.	UN

EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 S



EXT 3664 ID 767 AK 50 X DG 8 S





EXT 1492 ID 105 KRA 49B X CL 170





EXT 1119 ID 113 AK 11 X AC 85





EXT 2760 ID 714 AK 86 X CL 69B



EXT 2014 ID 238 AK 7 X AC 53







EXT 2483 ID 762 AK 96 X CL 66A









ID	EXT - INT	Direccion	Localizacion	Coordenadas	Elemento	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	NORTE - CENTRO - SUR		Caja de paso sencilla	UN	4,0	4,00	13/9/2025	Complemento	SI	
767	3664	AK 50 X AC 8 S	ORIENTE		Caja de paso sencilla	UN	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		Caja de paso sencilla	UN	1,0	1,00	15/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	SEPARADOR SUR		Caja de paso sencilla	UN	2,0	2,00	16/9/2025	Mantenimiento	SI	
714	2560	AK 86 X CL 69B			Caja de paso sencilla	UN	1,0	1,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
238	2014	AK 7 X AC 53	SEPARADOR Y ORIENTE		Caja de paso sencilla	UN	2,0	2,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
762	2483	AK 96 X CL 66A			Caja de paso sencilla	UN	2,0	2,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	13,00
Anterior	0,00
TOTAL	**13,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	5,0	DESCRIPCIÓN	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	UNID.	M3

EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones			Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
						Ancho	Largo	Espesor					
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M3	5,25	0,77	0,20	0,81	5/9/2025	complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M3	5,25	2,57	0,20	2,70	5/9/2025	complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	OCCIDENTAL		M3	1,58	7,46	0,20	2,36	5/9/2025	complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	OCCIDENTAL		M3	1,58	1,37	0,20	0,43	5/9/2025	complemento	SI	
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	6,30
Anterior	0,00
TOTAL	6,30

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**7,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General**	**UNID.**	M3


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 3659 / ID 770 AK 50 X DIG 16 S



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



EXT 2950 / ID 742 AK 50 X CL 4F



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones			Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
						Ancho	Largo	Espesor					
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL		M3	1,27	6,40	0,10	0,81	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	VADO ORIENTAL
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL		M3	0,30	11,20	0,40	1,34	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CARCAMO EN ZANJA
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR SUR		M3	0,15	3,60	0,10	0,05	13/9/2025	complemento	SI	CINTA DE CAJA DE PASO EXIST
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTAL		M3	0,90	0,80	0,10	0,07	19/9/2025	complemento	SI	CAJA DE PASO
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTAL		M3	0,30	2,00	0,10	0,06	19/9/2025	complemento	SI	ZANJA TUBERÍA
742	2950	AK 50 X CL 4F	SUR ORIENTAL		M3	1,20	2,00	0,10	0,24	23/9/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTAL		M3	1,34	1,80	0,10	0,24	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTAL		M3	0,30	3,34	0,10	0,10	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTAL		M3	0,80	0,80	0,10	0,06	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTAL		M3	1,55	2,05	0,10	0,32	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ALABEO ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M3	5,00	5,00	0,20	5,00	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	PAÑO ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	1,86	2,08	0,10	0,39	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	1,34	1,21	0,10	0,16	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	1,56	2,16	0,10	0,34	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	0,30	3,63	0,10	0,11	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ZANJA TUBERÍA
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	1,00	1,30	0,10	0,13	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	1,42	3,00	0,10	0,43	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		M3	0,32	1,00	0,10	0,03	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARDOR SUR		M3	0,80	0,80	0,10	0,06	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARDOR SUR		M3	0,30	2,70	0,1	0,08	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ZANJA TUBERÍA
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTE		M3	1,60	2,00	0,1	0,32	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTE		M3	0,30	3,03	0,1	0,09	2/09/2025 - 23/09/2025	complemento	SI	ZANJA TUBERÍA
105	1492	KR 49B X CL 170	SEPARADOR		M3	0,20	3,10	0,1	0,06	29/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	SEPARADOR		M3	0,15	6,00	0,1	0,09	16/9/2025	Mantenimiento	SI	

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO		SEPTIEMBRE							SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							**CIUDAD** / **BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** / **VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							**DIRECTOR DE CONTRATISTA** / **ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	7,0	**DESCRIPCIÓN**	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	**UNID.**	M3

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152

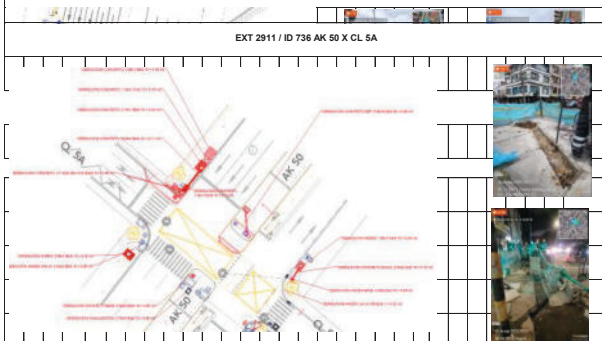

EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A







EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85



EXT 2014 / ID 238 AK 7 X AC 53





EXT 1552 / ID 671 AK 104 X AC 132



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Largo	Dimensiones Espesor	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
238	2014	AK 7 X AC 53	SEPARADOR		M3	0,60	1,00	0,1	0,06	1/10/2025	Mantenimiento	SI	
671	1552	AK 104 X AC 132	SEPARADOR		M3	0,60	1,62	0,1	0,10	23/9/2025	Mantenimiento	SI	CAJA DOBLE
									0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	10,75
Anterior	0,00
TOTAL	**10,75**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	8,0	DESCRIPCIÓN	Demolición de Sardinel Existente	UND.	ML


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152







EXT 2950 / ID 742 AK 50 X CL 4F





ID	EXT - PREF	Direccion	Localizacion	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		ML	6,4	6,40	17/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		ML	6,4	6,40	17/9/2025	Intersección Nueva	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTE		ML	5,0	5,00	2/9/2025	Complemento	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR		ML	4,2	4,20	2/9/2025	Complemento	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	ORIENTE		ML	4,0	4,00	2/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	OCCIDENTE		ML	11,3	11,30	2/9/2025	Complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	37,30
Anterior	0,00
TOTAL	**37,30**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	1	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA: VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA: ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	9,0	DESCRIPCIÓN	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	UNID.	M2

EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A





EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	3,40	0,30	1,02	8/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		M2	0,80	0,84	0,67	13/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	ORIENTAL		M2	1,10	0,70	0,77	16/9/2025	Mantenimiento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,46
Anterior	0,00
TOTAL	**2,46**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**11,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad**	**UNID.**	M3


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 3659 / ID 770 AK 50 X DG 16 S



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones			Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
							Ancho	Largo	Espesor					
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Base para poste de 8.5m	M3	0,90	0,90	1,70	1,38	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE			M3	1,28	6,40	0,30	2,46	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	RAMPA
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Caja de paso sencilla	M3	1,00	0,97	1,00	0,97	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	RAMPA
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,30	0,50	0,35	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,90	0,80	0,80	0,58	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	11,00	0,50	1,65	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		Caja de paso sencilla	M3	1,00	1,49	1,00	1,49	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	SEPARADOR		Caja de paso doble	M3	1,00	2,40	1,00	2,40	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	SEPARADOR		Caja de paso doble	M3	1,00	1,40	2,00	2,80	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Base para poste de 8.5m	M3	0,90	0,90	1,70	1,38	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,65	0,50	0,55	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,90	0,80	0,90	0,65	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	7,62	0,50	1,14	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,90	0,80	0,90	0,65	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	5,00	0,50	0,75	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	SUR OCCIDENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,80	1,60	1,20	1,54	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	OCCIDENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,80	0,85	0,90	0,61	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	10,80	0,50	1,62	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR		Caja de paso sencilla	M3	0,72	1,46	2,00	2,10	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR		Canalizacion en anden	M3	0,30	6,70	0,40	0,80	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR		Canalizacion en anden	M3	0,30	5,30	0,50	0,80	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	ORIENTE		Caja de paso sencilla	M3	1,00	1,08	1,00	1,08	16-09-2025 / 17-09-2025	Intersección Nueva	SI	
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR NORTE		Caja de paso sencilla	M3	1,23	1,30	0,40	0,64	10/9/2025	Complemento	SI	EXC PARA REHABILITAR CAJA
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTE		Caja de paso sencilla	M3	0,90	0,80	0,90	0,65	2/9/2025	Complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,00	0,4	0,24	2/9/2025	Complemento	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTE			M3	0,20	3,66	0,33	0,24	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC. BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTE			M3	0,20	4,00	0,4	0,32	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC BORDILLO
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTE			M3	0,20	1,70	0,4	0,14	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC BORDILLO
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTE			M3	1,20	4,00	0,3	1,44	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	VADO
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR			M3	1,67	2,15	0,4	1,44	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	PASO A NIVEL
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR			M3	0,20	5,06	0,4	0,40	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC BORDILLO
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR			M3	0,20	3,34	0,4	0,27	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC. BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	ORIENTE			M3	0,20	4,00	0,33	0,26	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC. BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	ORIENTE			M3	1,80	4,10	0,30	2,21	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	VADO
742	2950	AK 50 X CL 4F	ORIENTE			M3	1,20	2,00	0,2	0,48	02-09-2025 /04-09-2025	Complemento	SI	EXC PLACA
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,34	0,40	0,40	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTE		Base para poste	M3	0,80	0,80	0,9	0,58	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTE			M3	1,55	2,05	0,2	0,64	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN ALABEO
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,20	6,46	0,4	0,52	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	SARDINEL PUNTA SEPARADOR
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,37	4,85	0,1	0,18	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXC PUNTA SEPARADOR
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,20	4,85	0,4	0,39	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	BORDILLO CONFINAMIENTO SUR

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	11,0	**DESCRIPCIÓN**	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	**UNID.**	M3

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152


EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G




EXT 2950 / ID 742 AK 50 X CL 4F



EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A



EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 1552 / ID 671 AK 104 X AC 132



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Largo	Dimensiones Espesor	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,20	5,25	0,4	0,42	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	BORDILLO CONFINAMIENTO NORTE
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,20	7,70	0,33	0,51	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXC BAJO RAMPAS
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	2,57	4,85	0,1	1,25	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	VADO PEATONAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	1,28	4,85	0,3	1,86	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	VADO PEATONAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		Base para poste	M3	0,80	0,80	0,8	0,51	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	1,80	5,00	0,1	0,90	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN DESPUÉS DE BASES
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,70	0,20	0,22	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,86	2,08	0,2	0,77	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,21	1,34	0,2	0,32	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	0,28	0,50	1	0,14	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,63	0,4	0,44	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,00	1,30	0,2	0,26	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	0,80	0,80	0,8	0,51	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,00	0,90	0,9	0,81	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,42	3,00	0,35	1,30	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN ZONA ANDÉN SE RESTA ((0,8*0,7)*0,35) QUE ES LA DIMENSIÓN DE UNA CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,00	0,32	0,35	0,11	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,58	7,46	0,1	1,18	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN EN ZONA ASFALTO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,58	1,37	0,1	0,15	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	EXCAVACIÓN EN ZONA ASFALTO. SE RESTA (0,8*0,8*0,1) DE UNA BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	0,42	0,2	0,03	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,16	0,2	0,13	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR		Base para poste	M3	0,80	0,80	0,8	0,51	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,70	0,4	0,32	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,03	0,4	0,36	05-09-2025/ 06-09-2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR			M3	0,90	0,80	0,84	0,60	13/9/2025	Mantenimiento	SI	CAJA AUCE
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR			M3	0,15	3,20	0,2	0,10	15/9/2025	Mantenimiento	SI	CAJA AUCE
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR			M3	0,15	3,20	0,2	0,10	15/9/2025	Mantenimiento	SI	CAJA AUCE
671	1552	AK 104 X AC 132	OCCIDENTE			M3	1,04	1,28	1,6	2,13	24/9/2025	Mantenimiento	SI	
671	1552	AK 104 X AC 132	SEPARADOR NORTE			M3	0,60	1,62	1,4	1,36	24/9/2025	Mantenimiento	SI	
671	1552	AK 104 X AC 132	ORIENTE			M3	0,80	1,80	1,6	2,30	24/9/2025	Mantenimiento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	58,77
Anterior	0,00
TOTAL	**58,77**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA


ITEM	13,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	UND.	ML

EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A






EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A

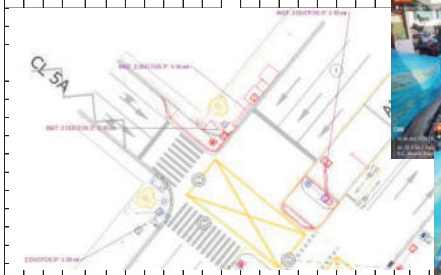





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL		ML	5,30	5,30	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	Tubería 2 Und x 3 ml
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		ML	3,70	3,70	2/09/2025 / 04-09-2025	Complemento	SI	Tubería 2 Und x 3 ml
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTE		ML	5,16	5,16	2/09/2025 / 04-09-2025	Complemento	SI	Tubería 2 Und x 3 ml
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTE		ML	2,16	2,16	2/09/2025 / 04-09-2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUROCCIDENTE		ML	3,03	3,03	2/09/2025 / 04-09-2025	Complemento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	19,35
Anterior	0,00
TOTAL	19,35

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	14,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	UND.	ML

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152

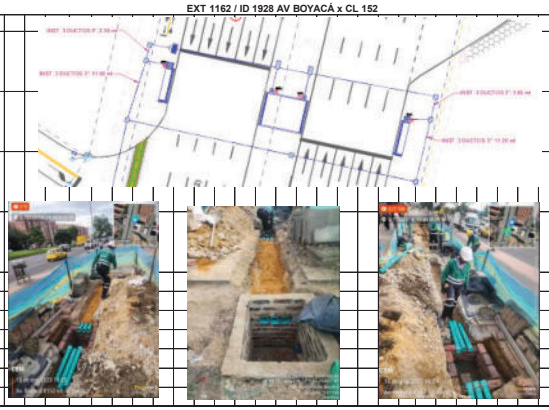

ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		ML	2,30	2,30	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		ML	11,00	11,00	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		ML	3,65	3,65	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		ML	11,20	11,20	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
							0,00			SI	
							0,00			SI	
							0,00			SI	
							0,00			SI	
							0,00			SI	
							0,00			SI	
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	28,15
Anterior	0,00
TOTAL	**28,15**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	17,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	UND.	ML


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		ML	7,62	7,62	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		ML	5,00	5,00	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	OCCIDENTAL		ML	10,80	10,80	25/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR		ML	6,70	6,70	25/9/2025	Intersección Nueva	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NORORIENTAL		ML	3,34	3,34	28/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL		ML	0,42	0,42	28/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR		ML	2,70	2,70	28/9/2025	Complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	36,58
Anterior	0,00
TOTAL	36,58

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS	
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA	

ITEM	19,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN


EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85



EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
759	3660	AK 50 X CL 1G	ANDÉN ORIENTAL		UN	2,0	2,00	4/9/2025	Complemento	SI	CAJA EXISTENTE HABILITADA.
113	1119	AK 11 X AC 85	ORIENTE		UN	2,0	2,00	16/9/2025	mantenimiento	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	ACOMETIDA OCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	30/9/2025	Intersección Nueva	SI	CONEXIÓN ACOMIETIDA

OBSERVACIONES:

Subtotal	5,00
Anterior	0,00
TOTAL	5,00

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA	

ITEM	20,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN


EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152



EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A




EXT 3659 / ID 770 AK 50 x DG 16 S



EXT 3664 / ID 767 AK 50 x AC 8 S



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	AV. BOYACÁ CL 152		UN	30,0	30,00	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A		UN	8,0	8,00	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
770	3659	AK 50 X DG 16 S	AK 50 X DG 16 S		UN	5,0	5,00	10/9/2025	Complemento	SI	
767	3664	AK 50 X AC 8 S	AK 50 X AC 8 S		UN	3,0	3,00	12/9/2025	Complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	AK 50 X CL 1G		UN	5,0	5,00	4/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	AK 50 X CL 5A		UN	26,0	26,00	2/9/2025	Complemento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	AK 11 X AC 85		UN	1,0	1,00	16/9/2025	mantenimiento	SI	

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA


ITEM	20,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN

EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152






EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A

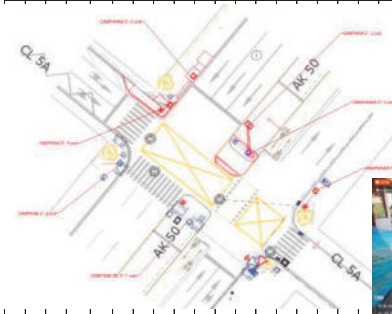







EXT 1119 / ID 113 AK 11 x AC 85



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones

VACIONES:

Subtotal	78,00
Anterior	0,00
TOTAL	**78,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	21,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UND.	UN

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	AV. BOYACÁ CL 152		UN	10,0	10,00	18/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A		UN	4,0	4,00	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	AK 50 X CL 5A		UN	6,0	6,00	13/9/2025	complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00		

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**22,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos**	**UNID.**	M3


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152








EXT 11675 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A





EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A

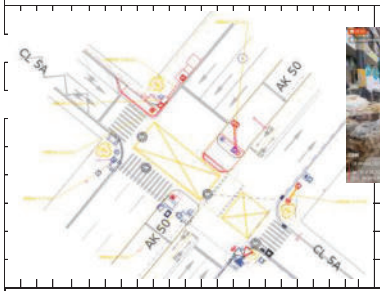



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Largo	Dimensiones Espesor	Diametro Tubería (m)	Cant Ductos	Dcto (m3)	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,30	0,20	0,08	3,00	0,0104	0,11	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO OCCIDENTE		Canalizacion en anden	M3	0,30	11,00	0,20	0,08	3,00	0,0499	0,51	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,65	0,20	0,08	3,00	0,0166	0,17	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	11,20	0,20	0,08	3,00	0,0508	0,52	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	7,62	0,20	0,08	1,00	0,0346	0,43	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	5,00	0,20	0,08	1,00	0,0227	0,28	15/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	COSTADO OCCIDENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	10,80	0,20	0,08	1,00	0,0490	0,60	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	6,70	0,20	0,08	1,00	0,0304	0,37	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	5,30	0,20	0,08	2,00	0,0240	0,27	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,34	0,20	0,08	1,00	0,0152	0,18	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR CENTRAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,70	0,20	0,08	2,00	0,0168	0,19	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	5,16	0,20	0,08	2,00	0,0234	0,26	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	0,42	0,20	0,08	1,00	0,0019	0,03	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,16	0,20	0,08	2,00	0,0098	0,11	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	2,70	0,20	0,08	1,00	0,0122	0,15	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL		Canalizacion en anden	M3	0,30	3,03	0,20	0,08	2,00	0,0137	0,15	8/9/2025	Complemento	SI	
													0,00			SI	
													0,00				
													0,00				
													0,00				
													0,00				
													0,00				
													0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,33
Anterior	0,00
TOTAL	**4,33**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA: VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA: ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	23,0	DESCRIPCIÓN	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	UNID.	M3

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152




EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



EXT 2950 / ID 742 AK 50 x CL 4F



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones			Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
							Ancho	Largo	Espesor					
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTAL			M3	1,28	6,40	0,30	2,46	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	RAMPA
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTAL			M3	0,30	2,30	0,20	0,14	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTAL			M3	0,30	11,00	0,20	0,66	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL			M3	0,30	3,65	0,20	0,22	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL			M3	0,30	11,20	0,20	0,67	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL			M3	0,30	7,62	0,20	0,46	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTAL			M3	0,30	5,00	0,20	0,30	16/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	OCCIDENTAL			M3	0,30	10,80	0,20	0,65	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL			M3	0,30	6,70	0,20	0,40	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL			M3	0,30	5,30	0,20	0,32	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTAL			M3	0,30	2,00	0,20	0,12	9/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
742	2950	AK 50 X CL 4F	OCCIDENTAL			M3	1,20	4,00	0,20	0,96	2/9/2025	Complemento	SI	RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR			M3	1,67	2,15	0,20	0,72	2/9/2025	Complemento	SI	RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	ANDÉN SUR ORIENTAL			M3	1,80	4,10	0,20	1,48	2/9/2025	Complemento	SI	RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	ANDÉN SUR ORIENTAL			M3	1,20	2,00	0,20	0,48	2/9/2025	Complemento	SI	PLACA ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL			M3	0,30	3,34	0,20	0,20	8/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL			M3	1,55	2,05	0,20	0,64	8/9/2025	Complemento	SI	ALABEO ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	0,37	4,85	0,20	0,36	8/9/2025	Complemento	SI	PUNTA SEPARADOR
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	3,85	4,85	0,20	3,73	8/9/2025	Complemento	SI	VADO PEATONAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	3,53	5,00	0,20	3,53	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,86	2,08	0,20	0,77	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,21	1,34	0,20	0,32	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,56	2,16	0,10	0,28	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO. SE RESTAN 0,8 x 0,7 M2 DE LA DIMENSIÓN DE 1 CAJA
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	0,30	3,63	0,20	0,22	8/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,00	1,30	0,20	0,26	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,58	7,46	0,20	2,12	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO, SE RESTA 0,8 x 0,8 M2 DE BASE Y 0,8 x 0,7 M2 DE UNA CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,58	1,37	0,20	0,43	8/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO, SE RESTA 0,8 x 0,8 M2 DE BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	1,42	3,00	0,20	0,85	8/9/2025	Complemento	SI	ADEN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTAL			M3	0,32	1,00	0,20	0,06	8/9/2025	Complemento	SI	ADEN EN CONCRETO

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780								**CIUDAD** / **BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL								**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** / **VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD								**DIRECTOR DE CONTRATISTA** / **ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**23,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS**	**UNID.**	M3

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152	ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones			Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
								Ancho	Largo	Espesor					
EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A	736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR			M3	0,30	2,70	0,20	0,16	8/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
	736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR			M3	0,30	3,03	0,20	0,18	8/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				
											0,00				



OBSERVACIONES:

Subtotal	24,15
Anterior	0,00
TOTAL	**24,15**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SUTERA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780								**CIUDAD** BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL								**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD								**DIRECTOR DE CONTRATISTA** ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	**27,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación**	**UNID.**	M3


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152




EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	Elemento	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Largo	Dimensiones Espesor	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	SEPARADOR CENTRAL			M3	1,00	1,40	1,70	2,38	28/9/2025	Intersección Nueva	SI	APIQUE
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL			M3	0,70	3,50	1,40	1,96	30/9/2025	Complemento	SI	RELLENO ALREDEDOR DE CAJA DOBLE, SE RESTA LA DIMENSIÓN DE LA CAJA CONSTRUIDA (1,5*0,7*1,4) M3
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE			M3	1,20	3,92	0,20	0,94	12/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NORORIENTAL			M3	1,25	1,80	0,70	1,18	10/9/2025	Complemento	SI	RELLENO ALREDEDOR DE CAJA, SE RESTA LA DIMENSIÓN DE LA CAJA CONSTRUIDA (0,8*0,8*0,7) M3
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE			M3	1,60	4,00	1,52	8,38	10/9/2025	Complemento	SI	RELLENO ALREDEDOR DE CAJA DOBLE, SE RESTA LA DIMENSIÓN DE LA CAJA CONSTRUIDA (1,3*0,8*1,3) M3
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUROCCIDENTAL			M3	1,95	1,10	0,90	1,54	10/9/2025	Complemento	SI	RELLENO ALREDEDOR DE CAJA, SE RESTA LA DIMENSIÓN DE LA CAJA CONSTRUIDA (0,8*0,7*0,7) M3

OBSERVACIONES:

Subtotal	16,38
Anterior	0,00
TOTAL	**16,38**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**28,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)**	**UNID.**	M2

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 3659 / ID 759 AK 50 x DG 16S



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
						Ancho	Alto					
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		M2	1,28	6,40	8,19	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	VADO
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		M2	1,27	6,40	8,13	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	VADO
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR NORTE		M2	0,20	4,20	0,84	10/9/2025	Complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTE		M2	1,66	2,72	4,52	1/9/2025	Complemento	SI	VADO
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTE		M2	0,30	2,00	0,60	1/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR		M2	1,37	3,56	4,88	1/9/2025	Complemento	SI	PUNTA SEPARADOR
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR		M2	3,56	5,10	18,16	1/9/2025	Complemento	SI	PASO PEATONAL
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		M2	1,66	1,78	2,95	1/9/2025	Complemento	SI	PUNTA SEPARADOR
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		M2	3,52	4,77	16,79	1/9/2025	Complemento	SI	PASO PEATONAL
742	2950	AK 50 X CL 4F	SUR OCCIDENTAL		M2	1,20	4,00	4,80	9/9/2025	Complemento	SI	VADO
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR		M2	1,67	2,15	3,59	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN
742	2950	AK 50 X CL 4F	SUR ORIENTAL		M2	1,80	4,10	7,38	9/9/2025	Complemento	SI	VADO
742	2950	AK 50 X CL 4F	SUR ORIENTAL		M2	1,20	2,00	2,40	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN PLACA
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORIENTAL		M2	1,34	1,80	1,77	9/9/2025	Complemento	SI	FUNDIDA ANDÉN. SE RESTAN (0,85*0,75) DE UNA CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORIENTAL		M2	0,30	3,34	1,00	9/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORIENTAL		M2	1,55	2,05	3,18	9/9/2025	Complemento	SI	ALABEO ANDÉN
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	0,37	4,85	1,79	9/9/2025	Complemento	SI	PUNTA SEPARADOR
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	3,85	4,85	18,67	9/9/2025	Complemento	SI	PASO PEATONAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	3,53	5,00	16,37	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO. SE RESTAN (1,35*0,95) DE UNA CAJA DOBLE
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,86	2,08	3,87	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,21	1,34	1,62	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,56	2,16	2,73	9/9/2025	Complemento	SI	SE RESTAN DE UNA CAJA DE PASO (0,85*0,75)
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	0,30	3,63	1,09	9/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,00	1,30	1,30	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,18	7,06	7,05	9/9/2025	Complemento	SI	FUNDIDA DE ANDEN SE RESTAN (0,8*0,8) DE UNA BASE Y (0,85*0,75) DE UNA CAJA DE PASO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,18	1,17	1,38	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**


ITEM	**28,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)**	**UNID.**	M2

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152

EXT 2950 / ID 742 AK 50 x CL 4F



EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A

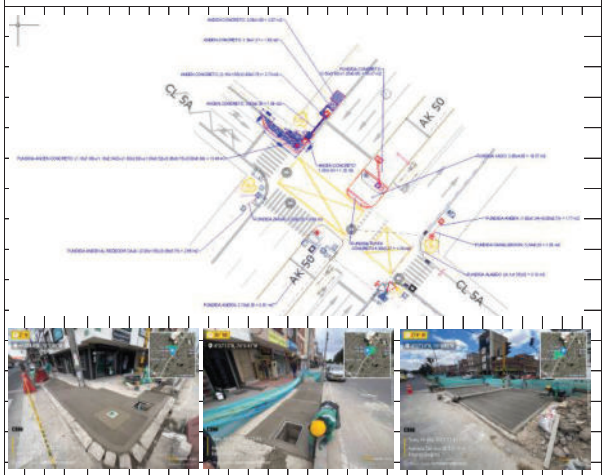

ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,62	2,80	4,54	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORCCIDENTAL		M2	1,00	0,52	0,52	9/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN EN CONCRETO
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR		M2	0,30	2,70	0,81	9/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTAL		M2	1,60	2,00	2,56	9/9/2025	Complemento	SI	FUNDIDA DE ANDÉN, SE RESTAN (0,85*0,75) DE UNA CAJA
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTAL		M2	0,30	3,03	0,91	9/9/2025	Complemento	SI	CANALIZACIÓN
								0,00			SI	
								0,00			SI	
								0,00			SI

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780								**CIUDAD** / **BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL								**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** / **VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD								**DIRECTOR DE CONTRATISTA** / **ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**37,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)**	**UNID.**	M2


EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



EXT 2950 / ID 742 AK 50 x CL 4F



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
						Larggo	Ancho					
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	RAMPA OCCIDENTAL		M2	7,27	0,20	1,45	27/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	BASE OCCIDENTAL		M2	2,00	0,20	0,40	27/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	RAMPA ORIENTAL		M2	7,27	0,20	1,45	27/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	RAMPA ORIENTAL		M2	1,84	0,20	0,37	27/9/2025	Intersección Nueva	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	VADO ORIENTAL		M2	6,60	0,20	1,32	19/9/2025	Complemento	SI	VADO Y BASE
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR		M2	10,20	0,20	2,04	19/9/2025	Complemento	SI	PASO A NIVEL
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR		M2	5,60	0,20	1,12	19/9/2025	Complemento	SI	BASE
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		M2	9,60	0,20	1,92	19/9/2025	Complemento	SI	PASO A NIVEL
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		M2	5,60	0,20	1,12	19/9/2025	Complemento	SI	BASES
742	2950	AK 50 X CL 4F	SUR OCCIDENTAL		M2	5,90	0,20	1,18	23/9/2025	Complemento	SI	VADO
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR CENTRAL		M2	3,20	0,20	0,64	23/9/2025	Complemento	SI	PASO A NIVEL
742	2950	AK 50 X CL 4F	ANDÉN SUR ORIENTAL		M2	6,30	0,20	1,26	23/9/2025	Complemento	SI	VADO
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR ORIENTAL		M2	2,80	0,20	0,56	21/9/2025	Complemento	SI	BASE
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	0,80	0,20	0,16	21/9/2025	Complemento	SI	BASE ORIENTAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	1,70	0,20	0,34	21/9/2025	Complemento	SI	BASE OCCIDENTAL EXISTENTE
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	3,85	0,20	0,77	21/9/2025	Complemento	SI	ORIENTAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		M2	3,85	0,20	0,77	21/9/2025	Complemento	SI	OCCIDENTAL
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOR OCCIDENTAL		M2	12,80	0,20	2,56	21/9/2025	Complemento	SI	ANDÉN ALABEO


OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							**CIUDAD** / **BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							**DIRECTOR DE INTERVENTORIA** / **VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							**DIRECTOR DE CONTRATISTA** / **ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**37,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)**	**UNID.**	M2

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152	ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
							Larggo	Ancho					
EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A									0,00				
 									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	19,44
	Anterior	0,00
	TOTAL	**19,44**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	38,0	DESCRIPCIÓN	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UND.	UN


EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152

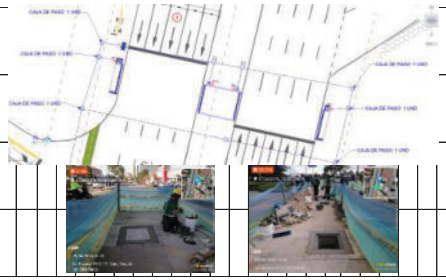

EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G




ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	OCCIDENTE		UN	3,0	3,00	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	ORIENTE		UN	4,0	4,00	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	OCCIDENTE		UN	1,0	1,00	30/9/2025	Intersección Nueva	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	ORIENTE		UN	1,0	1,00	4/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ORIENTE		UN	1,0	1,00	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	NOROCCIDENTE		UN	2,0	2,00	8/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SUR OCCIDENTE		UN	1,0	1,00	8/9/2025	Complemento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	SEPARADOR		UN	1,0	1,00	16/9/2025	Mantenimiento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	38,0	DESCRIPCIÓN	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UND.	UN

EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152	ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A								0,00				
  								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
EXT 1119 / ID 113 AK 11 x AC 85								0,00				
 								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	14,00
Anterior	0,00
TOTAL	**14,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**39,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa**	**UND.**	UN

EXT 1175 / ID 1929 AV CIUDAD DE CALI x CL 135A










EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A









ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL		UN	1,0	1,00	19/9/2025	Intersección Nueva	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR CENTRAL		UN	1,0	1,00	6/09/2025 - 08-09-2025	Complemento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,00
Anterior	0,00
TOTAL	**2,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTA D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**40,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa**	**UND.**	UN

EX 2150 ID 1923 AK 50 x AC 3 GLORIETA





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1923	2150	AK 50 x AC 3 GLORIETA	ORIENTE - OCCIDENTE		UN	2,0	2,00	9/9/2025	Complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,00
Anterior	0,00
TOTAL	**2,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA: VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA: ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	42,0	DESCRIPCIÓN	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	UNID.	M2

EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 SUR



EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR ISLETA CENTRAL		M2	3,40	0,50	1,70	10/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		M2	3,00	0,84	2,52	15/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	NORTE		M2	3,00	0,07	0,21	6/9/2025	Mantenimiento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,43
Anterior	0,00
TOTAL	4,43

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO


ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5
PERIODO	SEPTIEMBRE							
CONTRATO N°:	2025-2780							
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							


ELABORÓ	
ING SERGIO TORRES	
CIUDAD	**BOGOTÁ D.C.**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**VALENTIN BARAJAS**
DIRECTOR DE CONTRATISTA	**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**43,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Pañetes**	**UNID.**	M2

EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 SUR









EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170





EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
						Perimetro	Alto					
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR ISLETA CENTRAL		M2	3,40	0,50	1,70	10/9/2025	Complemento	SI	
767	3664	AK 50 X AC 8 S	ORIENTE		M2	2,20	0,58	1,28	12/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		M2	3,00	0,84	2,52	29-09-2025 / 15-09-2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	NORTE		M2	3,00	0,07	0,21	16/9/2025	Mantenimiento	SI	
238	2014	AK 7 X AC 53	SEPARADOR		M2	1,000	0,60	0,60	1/10/2025	Mantenimiento	SI	

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA: VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA: ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	43,0	DESCRIPCIÓN	Construcción de Pañetes	UNID.	M2

EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 SUR	ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
							Perimetro	Alto					
EXT 2014 / ID 238 AK 7 X AC 53 													

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	6,31
	Anterior	0,00
	TOTAL	6,31

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**		
PERIODO		SEPTIEMBRE							**ING SERGIO TORRES**		
CONTRATO N°:		2025-2780							**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**	
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**VALENTIN BARAJAS**	
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							**DIRECTOR DE CONTRATISTA**	**ANDRÉS VALDERRAMA**	

ITEM	**44,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC**	**UND.**	UN

EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G





EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85




EXT 2014 / ID 238 AK 7 X AC 53



EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR Y NORTE		UN	2,0	2,00	10/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		UN	2,0	2,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85	NORTE		UN	1,0	1,00		Mantenimiento	SI	
238	2014	AK 7 X AC 53	SEPARADOR		UN	1,0	1,00		Mantenimiento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR Y NORTE		UN	1,0	1,00		Complemento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	7,00
Anterior	0,00
TOTAL	**7,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional


OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	45,0	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UND.	UN





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		UN	1,0	1,00	15/9/2025	Mantenimiento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00
Anterior	0,00
TOTAL	1,00

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	46,0	DESCRIPCIÓN	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UND.	UN

EXT 1492 / ID 105 KR 49B X CL 170



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G






EXT 1119 / ID 113 AK 11 X AC 85





EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR Y NORTE		UN	2,0	2,00	11/9/2025	Complemento	SI	
105	1492	KR 49B X CL 170			UN	1,0	1,00	15/9/2025	Mantenimiento	SI	
113	1119	AK 11 X AC 85			UN	1,0	1,00	16/9/2025	Mantenimiento	SI	
736	2911	AK 50 x CL 5A	SEPARADOR NORTE		UN	1,0	1,00		Complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	5,00
Anterior	0,00
TOTAL	**5,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	47,0	DESCRIPCIÓN	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UND.	UN


EXT 2560 / ID 714 AK 86 X CL 69B



EXT 2014 / ID 238 AK 7 X AC 53



EXT 2483 / ID 762 3. AK 96 X CL 66A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
714	2560	AK 86 X CL 69B			UN	1,0	1,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
238	2014	AK 7 X AC 53			UN	1,0	1,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
762	2483	AK 96 X CL 66A			UN	1,0	1,00	30/9/2025	Mantenimiento	SI	
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	3,00
Anterior	0,00
TOTAL	**3,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interv CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**49,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Perforación dirigida**	**UND.**	ML

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ X CL 152


CALLE 147
AV. AUTOPISTA NORTE
AV. CALLE 147
AV. AUTOPISTA NORTE
AV. CALLE 147
AV. AUTOPISTA NORTE
AV.

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**


ITEM	**52,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto**	**UND.**	ML

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ X CL 152






EXT 2950 / ID 742 AK 50 X CL 4F







EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	VADO ORIENTAL		ML	6,40	6,40	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	BAJO RAMPA
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	VADO OCCIDENTAL		ML	6,40	6,40	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO ORIENTAL		ML	4,00	4,00	5/9/2025	complemento	SI	BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR		ML	5,06	5,06	5/9/2025	complemento	SI	BORDILLOS
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR SUR		ML	3,34	3,34	5/9/2025	complemento	SI	BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO OCCIDENTAL		ML	4,00	4,00	5/9/2025	complemento	SI	BORDILLO SUPERIOR
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO OCCIDENTAL		ML	1,70	1,70	5/9/2025	complemento	SI	BORDILLO LATERAL
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO OCCIDENTAL		ML	3,60	3,60	5/9/2025	complemento	SI	BAJO RAMPA
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO OCCIDENTAL		ML	0,80	0,80	5/9/2025	complemento	SI	SARDINEL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE - PUNTA		ML	6,46	6,46	8/9/2025	complemento	SI	SARDINEL
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE - PUNTA		ML	4,85	4,85	8/9/2025	complemento	SI	BORDILLO CONFINAMIENTO SUR
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		ML	5,25	5,25	8/9/2025	complemento	SI	BORDILLO CONFINAMIENTO NORTE
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		ML	7,70	7,70	8/9/2025	complemento	SI	BAJO RAMPA
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NOR OCCIDENTAL		ML	12,8	12,80	8/9/2025	complemento	SI	BAJO RAMPA
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	72,36
Anterior	0,00
TOTAL	**72,36**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	1	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	53,0	DESCRIPCIÓN	Empradización	UNID.	M2

EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G



ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones		Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
						Ancho	Alto					
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		M2	3,920	1,20	4,70	20/9/2025	Complemento	SI	
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	4,70
Anterior	0,00
TOTAL	**4,70**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**Bogota**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**


ITEM	**54,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)**	**UND.**	UN

EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G






EXT 2950 / ID 742 AK 50 X CL 4F





EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
759	3660	AK 50 X CL 1G	COSTADO ORIENTAL		UN	1,0	1,00	1/9/2025	Complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR NORTE		UN	2,0	2,00	1/9/2025	Complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	SEPARADOR SUR		UN	2,0	2,00	1/9/2025	Complemento	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	SEPARADOR NORTE		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	
742	2950	AK 50 X CL 4F	COSTADO SUR OCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	COSTADO NORORIENTAL		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR NORTE		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	COSTADO NOROCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	SEPARADOR SUR		UN	1,0	1,00	23/9/2025	Complemento	SI	

OBSERVACIONES:

Subtotal	11,00
Anterior	0,00
TOTAL	**11,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	55,0	DESCRIPCIÓN	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UND.	UN

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ X CL 152







ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTAOD ORIENTAL		UN	1,0	1,00	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO OCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	29/9/2025	Intersección Nueva	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,00
Anterior	0,00
TOTAL	**2,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ** ING SERGIO TORRES
PERIODO	SEPTIEMBRE								
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**	Bogota	
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	VALENTIN BARAJAS	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**	ANDRÉS VALDERRAMA	

ITEM	**61,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63**	**UND.**	UN


EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 SUR




EXT 3664 ID 767 AK 50 X AC 8 S



EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G

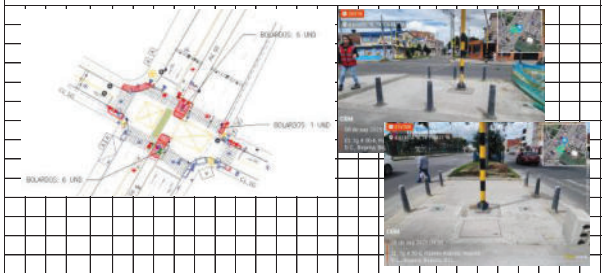

EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	ANDÉN SUR OCCIDENTAL		UN	11,0	11,00	8/9/2025	complemento	SI	
767	3664	AK 50 X AC 8 S	SEPARADOR CENTRAL Y VADO ORIENTAL		UN	5,0	5,00	8/9/2025	complemento	SI	
759	3660	AK 50 X CL 1G	VADO ORIENTAL, SEPARADOR NORTE Y SUR		UN	13,0	13,00	8/9/2025	complemento	SI	
1316	3658	AK 50 X CL 2C	SEPARADOR NORTE Y VADO OCCIDENTAL		UN	3,0	3,00	8/9/2025	complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	VADO ORIENTAL Y SEPARDOR NORTE		UN	6,0	6,00	23/9/2025	complemento	SI	
736	2911	AK 50 X CL 5A	ANDÉN NOROCCIDENTAL		UN	11,0	11,00	23/9/2025	complemento	SI	

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO


ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ** ING SERGIO TORRES
PERIODO	SEPTIEMBRE								
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		Bogota
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	**61,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63**	**UND.**	UN

EXT 3659 ID 770 AK 50 X DG 16 SUR

EXT 3658 / ID 1316 AK 50 X CL 2C





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	49,00
Anterior	0,00
TOTAL	**49,00**

Vo.Bo. Ing. ANDRES ALEJANDRO BARRIGA FLORIAN
Residente de obra:
Mat. Profesional

Vo.Bo. Ing.
Residente de interventoria:
Mat. Profesional


OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**		
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**		
CONTRATO N°:	2025-2780								**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**	
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL								**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**VALENTIN BARAJAS**	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD								**DIRECTOR DE CONTRATISTA**	**ANDRÉS VALDERRAMA**	

ITEM	**64,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio**	**UNID.**	M2

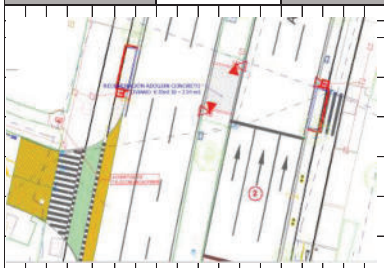





ID	**EXT - INT**	**Direccion**	**Localización**	**Coordenadas**	**UND**	**Dimensiones**		**Medida Total**	**Fecha**	**Tipo Actividad**	**Aprobado Interventoría**	**Observaciones**
						Ancho	**Alto**					
1929	1175	AV CIUDAD DE CALI x CL 135A	SEPARADOR CENTRAL		M2	0,30	6,70	2,01		Intersección Nueva	SI	
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	2,01
Anterior	0,00
TOTAL	**2,01**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		Bogota
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**65,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio**	**UNID.**	M2

EXT 1162 / ID 1928 AV BOYACÁ x CL 152







ID	EXT - INT	Direccion	Localización	Coordenadas	UND	Dimensiones Ancho	Dimensiones Largo	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO OCCIDENTE		M2	0,80	2,30	1,84	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO OCCIDENTE		M2	0,80	11,00	8,80	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		M2	0,80	3,65	2,92	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		M2	0,80	11,20	8,96	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		M2	0,80	7,62	6,10	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	COSTADO ORIENTAL		M2	0,80	5,00	4,00	26/9/2025	Intersección Nueva	SI	CANALIZACIÓN
								0,00				
								0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	32,62
Anterior	0,00
TOTAL	**32,62**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional


OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	**DD**	30	**MM**	9	**AA**	2025	**ACTA N°**	5	**ELABORÓ**
PERIODO	SEPTIEMBRE								**ING SERGIO TORRES**
CONTRATO N°:	2025-2780						**CIUDAD**		**BOGOTÁ D.C.**
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		**VALENTIN BARAJAS**
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						**DIRECTOR DE CONTRATISTA**		**ANDRÉS VALDERRAMA**

ITEM	**70,0**	**DESCRIPCIÓN**	**Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla**	**UND.**	UN





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	ANDÉN NORTE		UN	1,0	1,00	12/9/2025	complemento	SI	
770	3659	AK 50 X DG 16 S	PARADOR CENTRAL ISL		UN	1,0	1,00	12/9/2025	complemento	SI	
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR SUR		UN	1,0	1,00	12/9/2025	complemento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	3,00
Anterior	0,00
TOTAL	**3,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS	
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA	

ITEM	72,0	DESCRIPCIÓN	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UND.	UN


EXT 3659 / ID 770 AK 50 x DG 16 S



EXT 1492 / ID 105 KR 49B x CL 170




EXT 2014 / ID 238 AK 7 x AC 53



EXT 2560 / ID 714 AK 86 x CL 69B



EXT 2483 / ID 762 AK 96 x CL 66A



ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR NORTE		UN	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	CAJA REHABILITADA
770	3659	AK 50 X DG 16 S	ANDÉN NORTE		UND.	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	CAJA REHABILITADA
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR ISLETA CENTRAL		UN	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	
770	3659	AK 50 X DG 16 S	ANDÉN SUR ORIENTAL		UN	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	CAJA AUCE
770	3659	AK 50 X DG 16 S	SEPARADOR SUR		UN	1,0	1,00	12/9/2025	Complemento	SI	CAJA ADECUADA
105	1492	KR 49B X CL 170	SUR		UN	3,0	3,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	
714	2560	AK 86 X CL 69B			UN	1,0	1,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	
238	2014	AK 7 X AC 53	NORTE		UN	2,0	2,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	
762	2483	AK 96 X CL 66A	OCCIDENTE		UN	1,0	1,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				
							0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	12,00
Anterior	0,00
TOTAL	**12,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	Bogota
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	76,0	DESCRIPCIÓN	Ensayo de compactación	UND.	UN


EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152

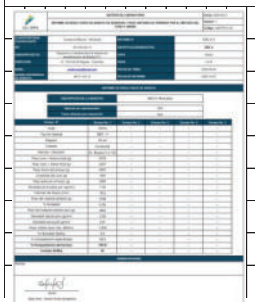





EXT 2950 / ID 742 AK 50 x 4F

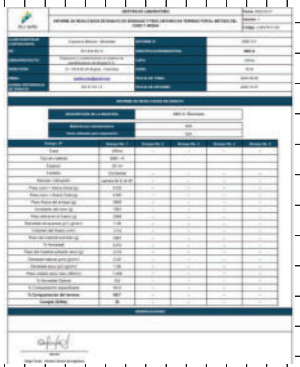



EXT 2911 / ID 736 AK 50 X CL 5A





ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1928	1162	AV BOYACÁ X CL 152	VADO OCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	26/9/2025	intersección nueva	SI	ENSAYO DE COMPACTACIÓN
742	2950	AK 50 X CL 4F	VADO OCCIDENTAL		UN	1,0	1,00	8/9/2025	complemento	SI	ENSAYO DE COMPACTACIÓN
736	2911	AK 50 X CL 5A	PASO A NIVEL SEP NORTE		UN	3,0	3,00	8/9/2025	complemento	SI	ENSAYO DE COMPACTACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD	Bogota	
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS	
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA	

ITEM	76,0	DESCRIPCIÓN	Ensayo de compactación	UND.	UN

EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152	ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
EXT 1162 / ID 1928 AV. BOYACÁ x CL 152												

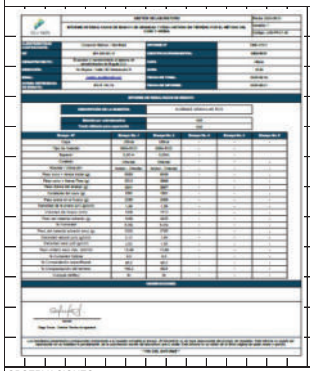



OBSERVACIONES:	Subtotal	5,00
	Anterior	0,00
	TOTAL	**5,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional



OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO	SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:	2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	77,0	DESCRIPCIÓN	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UND.	UN

EXT 3660 / ID 759 AK 50 x CL 1G Y CL 4F FUNDIDA 01/09/2025	EXT 2911 / ID 736 AK 50 x CL 5A Y CL 4F FUNDIDA	ID	EXT - INT	Direccion	Ubicación	Coordenadas	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
		759	3660	AK 50 X CL 1G	FUNDIDA SEPARADORES, BASES Y VADOS Y BASES DE LA AK 50 x CL 4F		UN	2,0	2,00	8/9/2025	Complemento	SI	A 7 DÍAS
		759	3660	AK 50 X CL 1G	FUNDIDA SEPARADORES, BASES Y VADOS Y BASES DE LA AK 50 x CL 4F		UN	2,0	2,00	29/9/2025	Complemento	SI	A 28 DÍAS
		736	2911	AK 50 X CL 5A	FUNDIDA SEPARDORES, BASES Y VADOS AK 50 x CL 5A Y VADOS AK 50 x CL 4F		UN	2,0	2,00	12/9/2025	Complemento	SI	A 3 DÍAS
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	6,00
Anterior	0,00
TOTAL	**6,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional


OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	79,0	DESCRIPCIÓN	Vehículo tipo camión, incluye conductor	UND.	MES

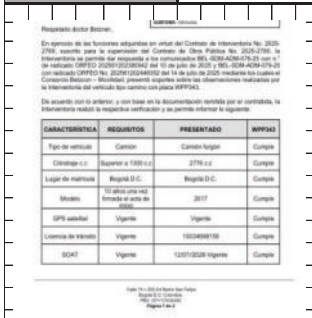







ID	EXT - INT	Direccion	UND.	Dias laborados	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
N.A.		OBRA ZONA NORTE	1,0	30,0	1,00		Complemento	SI	
					0,00				
					0,00				
					0,00		

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	80,0	DESCRIPCIÓN	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	UND.	HR

EXT 2150 ID 1923 AK 50 x AC 3 GLORIETA

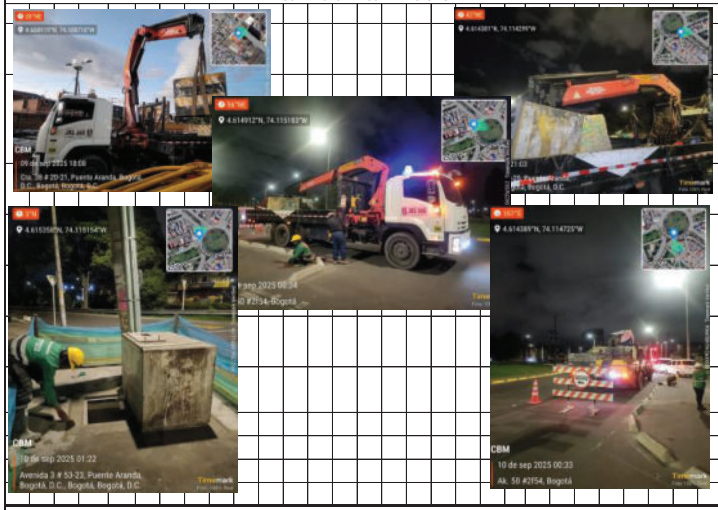

EXT 1492 ID 105 KR 49B X CL 170



ID	EXT - INT	Direccion	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones
1923	2150	AK 50 x AC 3 GLORIETA	HR	7,0	7,00	3/9/2025	Complemento	SI	TRASLADO BASES A GLORIETA AC 3 - JORNADA NOCTURNA
1923	2150	AK 50 x AC 3 GLORIETA	HR	17,0	17,00	9/9/2025	Complemento	SI	INSTALACIÓN DE AUCES JORNADA DIURNA Y DISTRIBUCIÓN DE BASES EN PUNTOS SEGÚN DISEÑO JORNADA NOCTURNA
1923	2150	AK 50 x AC 3 GLORIETA	HR	7,0	7,00	10/9/2025	Complemento	SI	UBICACIÓN DE BASES EN PUNTOS SEGÚN DISEÑO JORNADA NOCTURNA
1923	2150	AK 50 x AC 3 GLORIETA	HR	7,0	7,00	11/9/2025	Complemento	SI	UBICACIÓN DE BASES EN PUNTOS SEGÚN DISEÑO JORNADA NOCTURNA
105	1492	KR 49B X CL 170	HR	3,0	3,00	15/9/2025	mantenimiento	SI	TRASLADO DE AUCE A NUEVA UBICACIÓN
238	2014	AK 7 X AC 53	HR	4,0	4,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	RETIRO DE PEDESTALES
762	2483	AK 96 X CL 66A	HR	3,0	3,00	30/9/2025	mantenimiento	SI	RETIRO DE PEDESTALES

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ	
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES	
CONTRATO N°:		2025-2780							CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL							DIRECTOR DE INTERVENTORIA	VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD							DIRECTOR DE CONTRATISTA	ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	80,0	DESCRIPCIÓN	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	UND.	HR

EXT 2150 ID 1923 AK 50 x AC 3 GLORIETA



EXT 2014 ID 238 AK 7 X AC 53







ID	EXT - INT	Direccion	UND.	Cantidad	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoría	Observaciones

OBSERVACIONES:

Subtotal	48,00
Anterior	0,00
TOTAL	**48,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de inter CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"


MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025	ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE							ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780					CIUDAD		Bogotá
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL					DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD					DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	81,0	DESCRIPCIÓN	Personal Profesional Técnico y Administrativo	UND.	MES





ID	EXT - INT	Direccion	UND.	Dias laborados	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
N.A.	N.A.	**ESPECIALISTA EN TRÁNSITO** - JAVIER ANDRÉS MEZA GIL	UN	30,0	0,25	SEPTIEMBRE		SI	
N.A.	N.A.	**PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL** - LUZ DARY LOZADA DELGADO	UN	25,0	0,21	SEPTIEMBRE		SI	
N.A.	N.A.	**PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL** - MARIA CAMILA PÉREZ ROA	UN	5,0	0,04	SEPTIEMBRE		SI	
N.A.	N.A.	**AUXILIAR DE INGENIERÍA** - NATALIA HERNANDEZ GÓMEZ	UN	30,0	0,25	SEPTIEMBRE		SI	
N.A.	N.A.	**TECNÓLOGO SST** - ANGÉLICA MARÍA CUERVO GIL	UN	30,0	0,25	SEPTIEMBRE		SI	
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				

OBSERVACIONES: SE PRESENTA LA HV. DE LA PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL MARIA CAMILA PEREZ ROA COMO REEMPLAZO DE LUZ DARY LOZADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE COMUNICADO BEL-SDM-ADM-154-25 ORFEO 202561203533482. INTERVENTORÍA APRUEBA SIN NOVEDADES EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE COMUNICADO SEM-CMC-CBM-101-25 ORFEO 202561203563402

Subtotal	1,00
Anterior	0,00
TOTAL	**1,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional

OBJETO DEL CONTRATO: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

MEMORIA DE CÁLCULO

ACTA PARCIAL N°: 5

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2025		ACTA N°	5	ELABORÓ
PERIODO		SEPTIEMBRE								ING SERGIO TORRES
CONTRATO N°:		2025-2780						CIUDAD		BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORIA		CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		VALENTIN BARAJAS
CONTRATISTA		CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD						DIRECTOR DE CONTRATISTA		ANDRÉS VALDERRAMA

ITEM	82,0	DESCRIPCIÓN	Personal Técnico de Obra	UND.	MES





ID	EXT - INT	Direccion	UND.	Dias laborados	Medida Total	Fecha	Tipo Actividad	Aprobado Interventoria	Observaciones
N.A.	N.A.	MAESTRO DE OBRA DAVID ORTIZ SABOGAL	UN	30,0	0,50	SEPTIEMBRE		SI	
N.A.	N.A.	INSPECTOR DE OBRA CRISTIAN CAMILO MALDONADO	UN	30,0	0,50	SEPTIEMBRE		SI	
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				
					0,00				

OBSERVACIONES:

Subtotal	1,00
Anterior	0,00
TOTAL	**1,00**

Vo.Bo. Ing. SERGIO ANDRES TORRES TOLOZA
Residente de obra: CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD
Mat. Profesional 68202-346098 STD

Vo.Bo. Ing. JOHAN ENRIQUE MOJICA SIERRA
Residente de interventoria: CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
Mat. Profesional


CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, en mi calidad de Representante Legal certifica que el CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del mes de Septiembre del 2025


El CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD, se encuentra exenta del pago de aportes de SENA Y ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 05 días del mes de Noviembre de 2025



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
C.C 79.249.755
Representante Legal
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.249.755
NUMERO
BELZNER SALAZAR
APELLIDOS
WILLY PATRICK
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

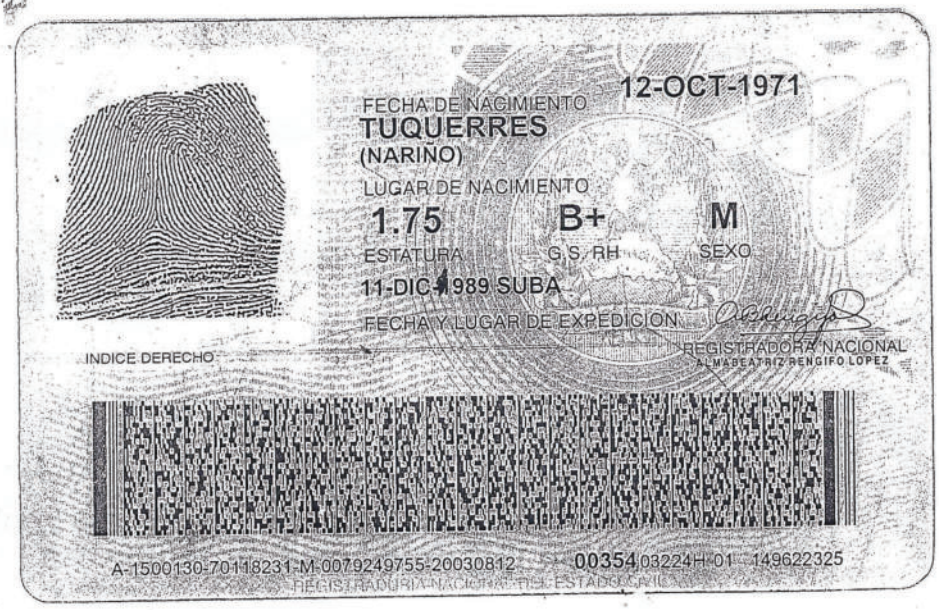
FECHA DE NACIMIENTO
12-OCT-1971
TUQUERRES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-1989 SUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500130-70118231-M-0079249755-20030812
00354 03224H 01 149622325

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174898490

(415)7707212489984(8020) 000014117489849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 105 # 46 - 26

42. Correo electrónico facturacionmovilidad.bzc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 7 6 8 9 2 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 4 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174898490

(415)7707212489984(8020) **000014117489849 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 2 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141174898490

(415)7707212489984(8020) **000014117489849 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 4 9 7 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELZNER	SALAZAR	WILLY	PATRICK

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 3 9 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	HERRERA	SILVIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141174898490

(415)7707212489984(8020) **000014117489849 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 3 9 2 1	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 5 2 8 6 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BELZCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 5 0 2 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 1 2 0 0 7 1 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 2 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/10/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901933921	CONSORCIO BELZCON- MOVILIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 105 N 46 26 Teléfonos: 6017689259

Dirección electrónica: licitaciones.bzc@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 06/05/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 06/05/2025

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 01/04/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/02/2025	C.C.	17139120	SILVIO SALAZAR HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL
24/02/2025	C.C.	79249755	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA D.C. **11/04/2025**
COLOMBIA
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD** con **NIT** número **9019339210**

Posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	469500044000
Fecha de apertura	11/04/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

BELZCON S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO identificado con 19.384.460 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 34998-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BELZCON SAS identificada con NIT 901.252.860-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones laborales (Pago de salarios y nomina), así como de las obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación en el mes de septiembre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BELZCON SAS se encuentra exenta del pago aportes de SENA e ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efecto de dar cumplimento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 05 días del mes de noviembre de 2025

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO
C. C. No. 19.384.460 de Bogotá D.C
Revisor Fiscal Belzcon SAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BELZCON SAS
Nit: 901252860 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03064171
Fecha de matrícula:	8 de febrero de 2019
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	28 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 105 No. 46 26 P 2
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	correo.bzc@gmail.com
Teléfono comercial 1:	7689259
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 105 No. 46 26 P 2
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	correo.bzc@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	8052552
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 29 de enero de 2019 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2019, con el No. 02422158 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BELZCON SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Gestión, estructuración, diseño y construcción de proyectos públicos o privados, gestión y desarrollo de alianzas público privadas, concesiones para proyectos de infraestructura o actividades similares, actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, interventoría y consultoría de proyectos, asesoría de inversiones, actividades auxiliares de la intermediación financiera, asesorías en relaciones públicas, actividades jurídicas, asesorías en calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, servicios de recursos humanos, actividades de todo tipo de comercio al por mayor y al por menor, comercialización de materiales de construcción, explotación de minas y canteras, procesamiento y comercialización de materiales pétreos, asfaltos y concretos, actividades inmobiliarias, presentación de licitaciones y cotizaciones públicas y privadas, construcción y mantenimiento de obras civiles, construcción y mantenimiento de obras arquitectónicas y de urbanismo, construcción y mantenimiento de obras electromecánicas, alquiler de maquinaria y equipos de construcción, consultoría en programas de informática y suministro de los mismos, además todas las actividades relacionadas con las anteriormente mencionadas; en desarrollo del expresado objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos sean de carácter civil, comercial o administrativo necesarios para su realización; adquirir, gravar y limitar el dominio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de toda clase de bienes muebles e inmuebles, equipos y maquinarias de construcción y para la producción y transporte de materiales; ejecutar por cuenta propia obras de urbanización o de construcción de inmuebles de su propiedad, dividirlos, fraccionarios o enajenarlos; dar equipos en arrendamiento o a otro título no traslaticio de dominio, o tomarlos en igual forma; contratar y realizar estudios diseños, cálculos, presupuestos y otros servicios similares para la ejecución de obras subcontratar con terceros y asociarse con estos bajo cualquier modalidad de carácter contractual para la ejecución de obras o la prestación de servicios; explotar minas, canteras u otros depósitos naturales para la extracción de minerales y/o materiales con destino a las obras; procesar materiales, agregados o mezclas y distribuir comercialmente esta clase de productos u otros similares para la ejecución de obras, construcciones o pavimentos; tomar dinero en mutuo y celebrar todas las operaciones financieras que le permitan obtener los fondos u otros activo necesarios para el desarrollo de sus actividades; construir o tomar intereses como asociada industrial o capitalista de otras compañías que tengan fines similares o complementarios al suyo, fusionarse con ellas o absorberlas; y en general, ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado y todos que tengan como finalidad ejercer el derecho y cumplir la obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $100.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un representante legal denominado: gerente administrativo y financiero y/o un suplente del representante legal denominado: presidente de la sociedad, ambos con idénticas funciones.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien tendrá facultades ilimitadas de contratación en la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que impliquen venta de activos o consecusión de préstamos, para lo cual deberá solicitar autorización a la Asamblea de Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal y/o sus suplentes. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 17 del 21 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2023 con el No. 02979065 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente Administrativo	Willy Patrick Belzner Salazar	C.C. No. 79249755

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Representante Legal	Nestor Orlando Bautista Castellanos	C.C. No. 80190955

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 11 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2021 con el No. 02677086 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Jose Gonzalo Moreno Montejo	C.C. No. 19384460 T.P. No. 34998-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 10 del 4 de julio de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02587109 del 14 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 11 del 17 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02677027 del 24 de marzo de 2021 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4111
Otras actividades Código CIIU: 4220, 1392

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 10.915.818.178
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de septiembre de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 31 de octubre de 2025 Hora: 14:50:56
Recibo No. AB25659169
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25659169A9BB3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.384.460**
MORENO MONTEJO

APELLIDOS
JOSE GONZALO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1956**
LA CAPILLA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **M** SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00288458-M-0019384460-20110402 **00265**12953A 3 1151235644

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



34998-T

JOSE GONZALO
MORENO MONTEJO
C.C. 19.384.460
RESOLUCION INSCRIPCION 031-T FECHA 4-III-93
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00042440

C. CARVAJAL S.A. 02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2E588F0974060C57

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GONZALO MORENO MONTEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19384460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34998-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INGELAS S.A.S

Bogotá D.C., Noviembre 05 de 2025

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Ciudad

Ref: Contrato de Obra No. 2025 – 2780 Cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1"

El suscrito Ricardo Forero Leal, en mi calidad de Revisor Fiscal certifica que la firma INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS S.A.S, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Certifico que son cero (0) trabajadores asignados para el Consorcio Belzcon Movilidad , para el mes de Septiembre de 2025

Ricardo Forero Leal
CC No. 79.318.917 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 47729-T

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S
N.I.T. : 891200711 1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327127 DEL 29 DE ABRIL DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
ACTIVO TOTAL : 2,064,015,136
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 66 NO. 5-34
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INGELASSAS@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 66 NO. 5-34
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INGELASSAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 296, NOTARIA 1A. DE PASTO DEL 15 DE ABRIL DE 1.975, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.815 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "IN GENIEROS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LIMITADA" -INGELAS-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 103, NOTARIA 1A. DE PASTO DEL 8 DE FEBRERO DE 1.978, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.817 EL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: " INGENIEROS ELECTRICISTAS ASOCIADOS LIMITADA" -INGELAS- POR EL DE: " INGELAS LTDA" (INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS), E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA . NO. 433 NOTARIA 10 DE BOGOTA D, C. DEL 22 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 04 DE ABRIL DE 2002 BAJO EL NUMERO 821103 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, POR EL DE : INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA INGELAS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 136 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 2012, INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 0165870 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INGELAS LTDA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS, PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA INGELAS LTDA. POR EL DE: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 4353, NOTARIA 32 DE BOGOTA DEL 24 DE DICIEMBRE - DE 1.987, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.819 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE - PASTO A LA DE BOGOTA E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SO--- CIAL.

CERTIFICA:

QUE ACTA NO 136 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 27 DE JULIO DE 2012, INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01658709 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE COMERCIAL DE INGELAS S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1416	31-XII-1.977	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.816
103	8--II-1.978	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.817
200	14-III-1.980	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.828
246	18-III-1.983	1A. PASTO	29-IV-1.988 - 234.818
4353	24-XII-1.987	32. BOGOTA	29-IV-1.988 - 234.819
10.066	28-XII-1.993	2 STFE BTA	6- I-1.994 - 433.108

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0005403	1997/10/02	NOTARIA 2	1997/11/07	00609543
0000433	2002/03/22	NOTARIA 10	2002/04/04	00821103
0002114	2002/12/27	NOTARIA 10	2002/12/31	00860594
136	2012/07/27	JUNTA DE SOCIOS	2012/08/15	01658709

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: 1) ELABORAR ESTUDIOS, PROYECTAR Y REALIZAR OBRAS DE INGENIERÍA. 2) REALIZAR CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN INGENIERIA PRINCIPALMENTE EN LAS

ESPECIALIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.3) REALIZAR INTERVENTORÍAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, PLANES Y OBRAS DE INGENIERÍA PRINCIPALMENTE EN LAS ESPECIALIDADES CITADAS.4) CON EL FIN DE LOGRAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, TODOS LOS ACTOS CONTRATOS Y OPERACIONES NECESARIOS E INHERENTES A LOS FINES LÍCITOS QUE PERSIGA, BIEN SEA QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL, O BIEN CON ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE TIENDAN A FACILITAR LA OBTENCIÓN DE DICHOS FINES. 5) ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, SER SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS AQUELLOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : $5,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA GERENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 136 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 2012,

INSCRITA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01658709 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE

SALAZAR HERRERA SILVIO C.C. 000000017139120

QUE POR ACTA NO. 149 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02349912 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

VASQUEZ GODOY GLADYS MARINA C.C. 000000028789085

CERTIFICA:

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. SE ENTIENDE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS Y DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS ESTATUTOS AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. PARÁGRAFO 1: EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR SUS REPRESENTANTES LEGALES. NO OBSTANTE, LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, DE CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO QUE IMPLIQUE OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES SUPEREN EL MONTO EQUIVALENTE A 20.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; REQUERIRÁ, PARA VINCULAR A ÉSTA, LA FIRMA SIMULTÁNEA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 142 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 31 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01926485 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

FORERO LEAL RICARDO C.C. 000000079318917

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 1 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE ABRIL DE

2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $4,037,453,655

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.318.917**

FORERO LEAL

APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1964**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129372-M-0079318917-20081118 0006294677A 2 1460021855

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO




47729-T

RICARDO
FORERO LEAL
C.C. 79318917
RESOLUCION INSCRIPCION 60 FECHA 06/06/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

000056000

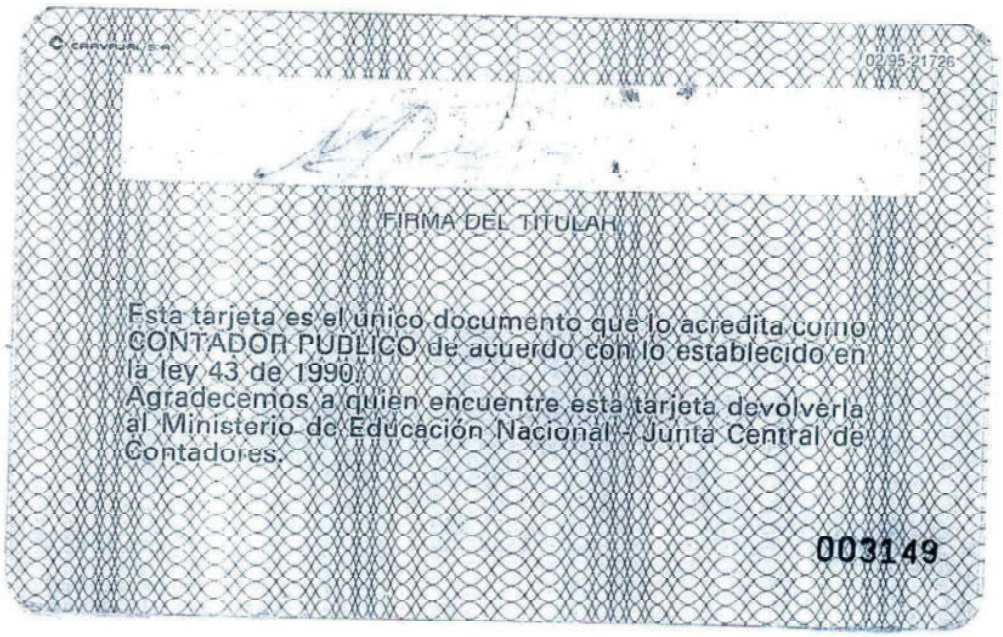

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003149

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 F 6 5 1 F 2 9 4 7 1 7 C 6 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO FORERO LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79318917 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD con documento NIT 901933921, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUZ DARY LOZADA DELGADO con documento CC 52480993, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7989900409	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/17	Número de Autorización	1860404704

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN		Administradora		25-14 COLPENSIONES
Días	26	Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal			

SALUD	Administradora		EPS008 - COMPENSAR
Días	26	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora		14-11 - ARL SURA
Días	26	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	26	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANGELICA MARIA CUERVO GIL con documento CC 52901081, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7991554615	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/17	Número de Autorización	1860479879

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DAVID ORLANDO ORTIZ SABOGAL con documento CC 1012423111, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7991554615	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/17	Número de Autorización	1860479879

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LIZETH NATALIA HERNANDEZ GOMEZ con documento CC 1049656174, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7991442280	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/17	Número de Autorización	1860540656

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN		Administradora		230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal			

SALUD	Administradora		EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora		14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BELZCON SAS con documento NIT 901252860, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAVIER ANDRES MEZA GIL con documento CC 1053343954, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7991556782	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/20	Número de Autorización	1865926597

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD con documento NIT 901933921, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CRISTIAN CAMILO SANCHEZ BALCERO con documento CC 1070919818, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7989900409	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/17	Número de Autorización	1860404704

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN		Administradora		230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal			

SALUD	Administradora		EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora		14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5

CONTRATO No. 2025-2780 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Objeto:	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – LOTE 1
Contratista:	CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD Director del Contrato: Natalia Patiño Chacón Ingeniero Residente: Sergio Torres Toloza
Interventoría:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL Contrato No. 2025-2769 Director de Interventoría: Ing. Valentín Eduardo Barajas Coordinador de Interventoría: Ing. Andrés García Avendaño Residente Interventoría Obras Civiles: Ing. Johan Mojica Sierra
Período del acta:	Del 01 al 30 de Septiembre de 2025
Valor inicial del contrato:	CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 5.141.951.324,00) M/CTE.
Plazo inicial del Contrato:	Diez (10) meses o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, contados a partir de contados de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Fecha de inicio:	29 de abril de 2025
Fecha de terminación:	28 de febrero de 2026

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025, se reunieron Valentín Eduardo Barajas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.614.976 de B/manga, Andrés García Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.735.810 de Bogotá, en representación del CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, cuyo NIT es 901035290-0, en su calidad de Interventores, por una parte, y por la otra, Natalia Patiño Chacón identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.466.521, en calidad de director del contrato No. 2025-2780 de

CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD, cuyo NIT es 901933921-0, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato No 2025-2780.

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la interventoría, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades propias del contrato:

La presente acta corresponde al pago parcial de actividades de obras ejecutadas para la construcción de intersecciones nuevas, complementos y mantenimientos; igualmente correspondiente al pago del personal profesional técnico y administrativo y el personal técnico de obra correspondiente a los ítems de pago No 81 y 82 enmarcados dentro de la oferta económica aprobada al Consorcio Belzcon Movilidad teniendo en cuenta las fechas de aprobación por parte de la Interventoría para los profesionales relacionados acorde a la memoria de cálculo adjunta, tal y como se describe a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$17.235	0,00
2	Localización, verificación y replanteo	UN	$17.235	4,00
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	$17.235	13,00
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$326.365	6,30
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$298.367	10,75
8	Demolición de Sardinel Existente	ML	$38.864	37,30
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$48.816	2,46
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$242.035	58,77
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$81.725	19,35
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$109.243	28,15
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$48.669	36,58
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$16.268	5,00
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$18.438	78,00
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	$32.605	20,00
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$263.408	4,33
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$284.705	24,15
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$113.315	16,38
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$143.115	154,39
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$214.458	19,44
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$1.134.375	14,00

39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$2.345.671	2,00
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$1.846.130	2,00
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$240.798	4,43
43	Construcción de Pañetes	M2	$184.278	6,31
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$424.684	7,00
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$505.650	1,00
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$333.800	5,00
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$208.177	3,00
49	Perforación dirigida	ML	$700.343	169,46
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$137.732	72,36
53	Empradización	M2	$56.243	4,70
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$1.137.937	11,00
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$2.494.917	2,00
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$339.272	49,00
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$176.897	2,01
65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$134.166	32,62
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$520.334	3,00
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$482.671	12,00
76	Ensayo de compactación	UN	$227.539	5,00
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$53.173	6,00
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$14.509.500	1,00
80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	$439.157	48,00
81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$37.224.896	1,00
82	Personal Técnico de Obra	MES	$12.130.823	1,00

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la interventoría realizo verificación de la documentación soportada por el contratista acorde a los requerimientos contractuales y dio aprobación a los profesionales reportados en la presente acta de pago parcial de obra.

Los trabajos fueron desarrollados por el contratista de forma satisfactoria, de conformidad con lo estipulado en el Contrato No. 2025-2780, los estudios previos, anexos técnicos (y demás documentación que hacen parte integral del contrato) y de acuerdo con los requerimientos realizados directamente por la SDM, o a través de la interventoría.

Mediante la presente acta se realiza el recibo a satisfacción del informe mensual presentado por el contratista Consorcio Belzcon Movilidad, para el periodo de la presente acta, los cuales fueron revisados y realizadas observaciones por la Interventoría del contrato y corregidos por el contratista.

Se realizo verificación por parte de esta interventoría de las obligaciones generales y especificas requeridas por el contratista para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato No 2025-2780

3. Liquidación de servicios efectivamente prestados

A continuación, se realiza la liquidación de los servicios efectivamente prestados durante el periodo de la presente acta. Las siguientes son las cantidades efectivamente ejecutadas, para el presente periodo, los valores ofertados y la liquidación de costos del periodo a facturar:

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO 2025	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS					
1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	$17.235	0,00	$ -
2	Localización, verificación y replanteo	UN	$17.235	4,00	$ 68.940,00
3	Limpieza de Caja de Paso	UN	$17.235	13,00	$ 224.055,00
4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	$17.235	0,00	$ -
			Subtotal 2025		**$ 292.995,00**
II. Demoliciones					
5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	$326.365	6,30	$ 2.056.100,00
6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	$1.569.620	0,00	$ -
7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	$298.367	10,75	$ 3.207.445,00
8	Demolición de Sardinel Existente	ML	$38.864	37,30	$ 1.449.627,00
9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	$48.816	2,46	$ 120.087,00
10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	$147.024	0,00	$ -
			Subtotal 2025		**$ 6.833.259,00**
III. Excavaciones					
11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	$242.035	58,77	$ 14.224.397,00
			Subtotal 2025		**$ 14.224.397,00**
IV. Transporte de escombros					
12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	$110.209	0,00	$ -
			Subtotal 2025		**$ -**
V. Suministro para redes					
13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$81.725	19,35	$ 1.581.379,00
14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$109.243	28,15	$ 3.075.190,00
15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$154.401	0,00	$ -
16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	$33.658	0,00	$ -
17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	$48.669	36,58	$ 1.780.312,00
18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	$53.575	0,00	$ -
19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	$16.268	5,00	$ 81.340,00
20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	$18.438	78,00	$ 1.438.164,00
21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	$32.605	20,00	$ 652.100,00
			Subtotal 2025		**$ 8.608.485,00**
VI. Rellenos					
22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	$263.408	4,33	$ 1.140.557,00
23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	$284.705	24,15	$ 6.875.626,00
24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	$358.589	0,00	$ -
25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	$1.667.118	0,00	$ -

26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	$1.702.001	0,00	$	-
27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	$113.315	16,38	$	1.856.100,00
			Subtotal 2025		**$**	**9.872.283,00**
VII. Construcciones						
28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	$143.115	154,39	$	22.095.525,00
29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	$1.224.092	0,00	$	-
30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	$243.872	0,00	$	-
31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	$220.159	0,00	$	-
32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	$280.338	0,00	$	-
33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	$286.009	0,00	$	-
34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	$282.241	0,00	$	-
35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	$394.694	0,00	$	-
36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	$399.789	0,00	$	-
37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	$214.458	19,44	$	4.169.064,00
38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	$1.134.375	14,00	$	15.881.250,00
39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	$2.345.671	2,00	$	4.691.342,00
40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	$1.846.130	2,00	$	3.692.260,00
41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	$268.906	0,00	$	-
42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	$240.798	4,43	$	1.066.735,00
43	Construcción de Pañetes	M2	$184.278	6,31	$	1.162.794,00
44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	$424.684	7,00	$	2.972.788,00
45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$505.650	1,00	$	505.650,00
46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	$333.800	5,00	$	1.669.000,00
47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	$208.177	3,00	$	624.531,00
48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	$257.665	0,00	$	-
49	Perforación dirigida	ML	$700.343	169,46	$	118.680.125,00
50	Perforación neumática	ML	$567.624	0,00	$	-
51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	$303.894	0,00	$	-
52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	$137.732	72,36	$	9.966.288,00
53	Empradización	M2	$56.243	4,70	$	264.342,00
54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	$1.137.937	11,00	$	12.517.307,00
55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	$2.494.917	2,00	$	4.989.834,00
56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	$1.154.318	0,00	$	-
57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	$1.278.127	0,00	$	-
58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	$1.325.663	0,00	$	-
59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	$542.557	0,00	$	-
60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	$300.014	0,00	$	-
61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	$339.272	49,00	$	16.624.328,00
62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centimetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de freguado)	M3	$1.414.389	0,00	$	-
63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$145.164	0,00	$	-
64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	$176.897	2,01	$	355.563,00

65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	$134.166	32,62	$	4.376.495,00
66	Suministro e instación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$41.129.176	0,00	$	-
67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	$38.548.008	0,00	$	-
68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	$590.591	0,00	$	-
69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto pefabricada para base de AUCE o GICE	UN	$525.641	0,00	$	-
70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	$520.334	3,00	$	1.561.002,00
71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	$677.267	0,00	$	-
72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	$482.671	12,00	$	5.792.052,00
73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	$368.010	0,00	$	-
74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	$428.571	0,00	$	-
75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	$424.290	0,00	$	-
			Subtotal 2025		**$**	**233.658.275,00**
VIII. Ensayos de Laboratorio						
76	Ensayo de compactación	UN	$227.539	5,00	$	1.137.695,00
77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	$53.173	6,00	$	319.038,00
78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	$148.980	0,00	$	-
			Subtotal 2025		**$**	**1.456.733,00**
IX. Transportes						
79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	$14.509.500	1,00	$	14.509.500,00
80	Camion tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	$439.157	48,00	$	21.079.536,00
			Subtotal 2025		**$**	**35.589.036,00**
X. Personal						
81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	$37.224.896	1,00	$	37.224.896,00
82	Personal Técnico de Obra	MES	$12.130.823	1,00	$	12.130.823,00
			Subtotal 2025		**$**	**49.355.719,00**
			TOTAL 2025	**T. Acta**	**$**	**359.891.182,00**

Factura No. 11

Valor por facturar:

CONCEPTO	FACTURA
Costo directo	$ 271.145.319,00
Administración	$ 72.477.144,00
Imprevistos	$ 5.422.906,00
Utilidad	$ 10.485.813,00
Valor total ejecutado	**$ 359.891.182,00**

Mediante la presente acta, la INTERVENTORIA autoriza al CONTRATISTA a presentar factura por TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE **($ 359.891.182,00)** sin incluir el descuento por retegarantia del 5%.

Valor por cancelar

Retegarantia (5%)	$ 17.994.559
Valor a cancelar Acta No.5	$ 341.896.623

4. Resumen Financiero del Contrato

A continuación, se presenta el balance financiero del contrato, en el cual se relacionan los pagos realizados y el saldo del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.141.951.324**

I	Valor Del Corte	Valor Retegarantia	Valor A Pagar	Valor Ejecutado Acumulado	Valor Pagado Acumulado	Saldo Crp´S	Saldo Por Ejecutar	Fecha De Radicación	No. De Documento Contable	Fecha De Estado De Pago	Fecha Del Acta De Recibo Parcial
1/04/2025 Al 30/04/2025	$ 14.145.460	$ 707.273	$ 13.438.187	$ 14.145.460	$ 13.438.187	$ 5.128.513.137	$ 5.127.805.864	08/07/2025	3000700776	24/07/2025	4/07/2025
1/06/2025 AL 30/06/2025	$ 62.236.162	$ 3.111.808	$ 59.124.354	$ 76.381.622	$ 72.562.541	$ 5.069.388.783	$ 5.065.569.702	06/08/2025	3000822223	22/08/2025	5/08/2025
1/07/2025 AL 31/07/2025	$ 303.006.734	$ 15.150.336	$ 287.856.398	$ 379.388.356	$ 360.418.939	$ 4.781.532.385	$ 4.762.562.968	20/09/2025	300983868	23/09/2025	5/09/2025
1/08/2025 AL 31/08/2025	$ 302.871.640	$ 15.143.582	$ 287.728.059	$ 682.259.996	$ 648.146.997	$ 4.493.804.327	$ 4.459.691.328	7/10/2025	3001112798	23/10/2025	6/10/2025
01/09/2025 AL 30/09/2025	$ 359.891.182	$ 17.994.559	$ 341.896.623	$ 1.042.151.178		$ 4.151.907.705	$ 4.099.800.146				
TOTALES	**$ 1.042.151.178**	$ 52.107.559	$ 990.043.619								

5. Garantías

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 18 del contrato. el contratista presentó a la Entidad las garantías con la compañía Nacional de Seguros con Nit 860.002.527-9. Póliza de cumplimiento número: 400063638; igualmente la póliza RCE No. 400063639.

			Pólizas iniciales		
Amparo	**Vigencia**	**Valor asegurado**	**Inicio**	**Fin**	**Valor**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. 400063638					
Cumplimiento general.	Desde la suscripción del contrato hasta la liquidación.	30% del valor total del contrato	29/04/2025	29/08/2026	**$ 1.542.585.397,20**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Contados a partir de la Suscripción del contrato.	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	29/04/2025	28/02/2029	$514.195.132,40
Calidad del servicio.	Por el plazo de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato Adjudicado para dicho lote.	29/04/2026	28/08/2026	$1.542.585.397,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Por el término de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de las obras.	Cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote.	29/04/2026	28/08/2026	$2.056.780.529.60
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción final de las obras.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato adjudicado para dicho lote.	28/05/2026	28/05/2031	$1.542.585.397,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 400063639					
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.	Igual al período de ejecución del contrato.	400 SMMLV			$ 569.400.000,00
Notas	La verificación de las pólizas relacionadas anteriormente corresponde a la versión inicial de los documentos allegados a la Entidad con ocasión de la suscripción del contrato y con anterioridad a la firma del acta de inicio. El presente cuadro fue elaborado con base en las pólizas aprobadas por la Subdirección de Mantenimiento el 28 de abril de 2025.				

Se suscribe la presente acta de recibo parcial No. 5 del contrato No. 2025-2780 por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los seis (06) días del mes de noviembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD

Director del Contrato
Natalia Patiño Chacón

Residente de Obra Contratista
Sergio Torres Toloza

POR LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Director de Interventoría
Valentín Eduardo Barajas Santos

Coordinador Técnico De Interventoría
Andrés García Avendaño

Residente Obras Civiles Interventoría
Johan Mojica Sierra

Outlook

Formatos para pago n.° 5 - Periodo 01 a 30 de septiembre 2025 - Contrato 2025-2780

Desde DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>
Fecha Lun 10/11/2025 15:13
Para Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
CC Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co>; Consorcio Belzcon Movilidad <sdm2780.bzc@gmail.com>; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA <SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co>; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES <SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-1@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (10 MB)
CORTE 5 - CBM - 01 AL 30 SEPTIEMBRE.pdf;

Cordial saludo Ingeniera Adriana.

Teniendo en cuenta el acta de recibo parcial n.° 5 suscrita entre el contratista **Consorcio Belzcon Movilidad – Contrato 2025-2780** y la Interventoría **Consorcio Movilidad Capital – Contrato 2025-2769**, y la factura electrónica de venta n.° **FE11** recibida. Remito el documento de trámite de la factura debidamente firmado por las partes para continuar con el trámite al interior de la SDM.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente.

Valentín Eduardo Barajas Santos
Director de Interventoría
Calle 74 N.° 20C-04 Barrio San Felipe
Tel: 7 43 44 40 Celular: 3116387026
Email: sem-director@redtic.com.co
Bogotá D.C., Colombia

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Movilidad Capital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
	CÓDIGO PA01-PR14-F03	VERSIÓN 1.0

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

Calle 13 No. 37 - 35

Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2

Radicado ORFEO No: 202561204149872

Fecha de Radicado:	13/11/2025	**Canal de recepcion:**	Formulario Web

Remitente:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	**Radicado BTE No:**	
Dignatario:	VALENTÍN BARAJAS SANTOS	**Direccion de Correspondencia:**	Cl 74 20C 04 (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	sem-aux-administrativo@redtic.com.co	**Barrio/Localidad:**	
Interesado:		**Direccion de Correspondencia:**	
Correo Electronico:		**Barrio/Localidad:**	/
Tipo de Requerimiento:		**Datos comparendo:**	No: 0/
Datos del contrato:	-	**Datos de los hechos:**	/

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

SEM-CMC-SDM-105-25 Entrega de factura electrónica de venta n.° FE11 correspondientes al quinto pago deL CONSORCIO BELZCON ? MOVILIDAD.

Descripcion pqrs:

Entrega de factura electrónica de venta n.° FE11 correspondientes al quinto pago deL CONSORCIO BELZCON ? MOVILIDAD.

Anexos	Notificarme por correo electronico
Anexo:2 documentos	NO

La Secretaría Distrital de Movilidad, como responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en las bases de datos y/o archivos que gestiona, realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y administración de los mismos garantizando la seguridad en cuanto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tal como se ha definido en los lineamientos, estrategias, programas, manuales, guías, procedimientos, instructivos y demás documentos del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD de la Secretaría Distrital de Movilidad, vigentes y relacionados con la protección de datos personales, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

En ningún caso la Entidad permite el acceso a la información reportada por terceros, salvo en casos expresamente previstos en la ley, ni la violación de derechos de los titulares.

La recolección de la información, entre otras, tendrá como finalidad permitir el desarrollo de las funciones propias de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 672 de 2018, la cual, siendo entidad pública, está exenta de solicitar autorización para el tratamiento de datos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, la entidad ha establecido la finalidad en ciertas autorizaciones especiales otorgadas por el titular del dato (Funcionarios, Proveedores), o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad particular del tratamiento de un dato personal se informará al titular del dato personal al obtener su autorización.

El almacenamiento y uso de la información personal se regirá por lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, teniendo en cuenta el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la(s) información(es) que la Entidad registre en las bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento.

SEM-CMC-SDM-105-25

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025.

Ingeniera:
ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ FONSECA
Supervisora Contrato de Interventoría
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37-35
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Entrega de factura electrónica de venta n.° FE11 correspondientes al quinto pago deL CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD.
TEMA: Financiero.
SUBTEMA: Facturación.

Respetada Ingeniera Adriana Lucía,

En el marco del Contrato n.° 2025-2780, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el contratista Consorcio Belzcon – Movilidad, se establecieron diversas obligaciones contractuales, dentro de las cuales se destaca la prevista en la Cláusula Octava – Forma de Pago, que indica lo siguiente:

> *"La Secretaría pagará al Contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los precios ofertados por el contratista y/o los servicios efectivamente prestados durante el mes.*
>
> *La Secretaría pagará, única y exclusivamente, los trabajos efectivamente realizados durante el periodo de facturación, de acuerdo a los precios unitarios presentados en la oferta.*
>
> *Para que la Secretaría realice los desembolsos correspondientes, se deberá radicar ante la subdirección financiera de la SDM la siguiente documentación mínima, la cual deberá ser revisada y avalada previamente por parte de la interventoría:*
>
> ***1)** Certificado de cumplimiento y recibo de satisfacción, firmado por el contratista y el supervisor del contrato. **2)** Informe de actividades, el cual debe cubrir el período estipulado en el certificado de supervisión. **3)** Cuadro en el que se discriminan los ítems (precios unitarios) efectivamente suministrados o ejecutados en el período, con cantidades, valores unitarios, subtotales, valor total y valor acumulado. **4)** Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria. **5)** Para personas jurídicas certificación de Existencia y Representación Legal con vencimiento no mayor a 30 días calendario a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del*

acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía. ***6)*** *Para las personas jurídicas, consorcio o unión temporal, certificado suscrito por el revisor fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el/la representante legal del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de los últimos seis (6) meses (Art. 50 de la Ley 789 de 2002).* ***8)*** *Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador público, si aplica.* ***9)*** *Fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador Público (según aplique) expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición.****11)*** *Anexar fotocopia del Registro Único Tributario - RUT y Registro de Información Tributaria - RIT. (…)"*

Resaltado fuera de texto

De acuerdo con lo anterior, el contratista mediante correo electrónico[1] remitió a la Interventoría los soportes de la factura n.° FE11. A su vez, la Interventoría realizó la respectiva revisión del informe de actividades entregado por el contratista y diligenció los formatos PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o Interventoría y PA03-PR09-F03 Informe de Actividades del Contratista que lo acreditan.

Esta Interventoría verificó los soportes reglamentarios de la factura, la completitud de la información y a través de correo electrónico[2] remitió a la SDM el documento debidamente firmado, con el fin de que la SDM realice el pago de la factura electrónica de venta: n.° FE11 correspondiente al servicio efectivamente prestado por el CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025.

Los documentos que soportan la facturación antes mencionada, se remiten anexos al presente comunicado mediante el archivo "CORTE 5 - CBM - 01 AL 30 SEPTIEMBRE Cto 2025-2780.pdf", el cual contiene los siguientes soportes:

1. PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o Interventoría.
2. PA03-PR09-F03 Informe de Actividades del Contratista.
3. Factura Electrónica de venta No FE11.
4. Corte de obra mensual 01 hasta 30 de septiembre de 2025.

[1] **De:** Consorcio Belzcon Movilidad sdm2780.bzc@gmail.com; **Enviado:** Lunes, 10 de Noviembre de 2025 12:07 **Para:** PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co; **Asunto:** Re: CORTE No 5 - CBM - 1 SEPTIEMBRE 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE- CTO 2025-2780.

[2] **De:** DIRECTOR DE INTERVENTORIA SEM-DIRECTOR@redtic.com.co; **Enviado:** Lunes, 10 de Noviembre de 2025 15:13; **Para:** Adriana Lucia Rodriguez Fonseca adrodriguez@movilidadbogota.gov.co; **CC:** Nancy Mateus Raquira nmateus@movilidadbogota.gov.co; PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co; Consorcio Belzcon Movilidad sdm2780.bzc@gmail.com; COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA SEM-COORDINADOR-TECNICO@redtic.com.co; INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS CIVILES SEM-ING-RES-OBRASCIVILES-1@redtic.com.co; **Asunto:** Formatos para pago n.° 5 - Periodo 01 a 30 de septiembre 2025 - Contrato 2025-2780.

5. Fotocopia cedula del representante legal Consorcio Belzcon – Movilidad.

6. Certificado de paz y salvo por concepto de pagos al sistema general de seguridad social integral y legales – Personas jurídicas. Consorcio Belzcon – Movilidad por Representante Legal.

7. RUT Consorcio Belzcon – Movilidad.

8. RIT Consorcio Belzcon – Movilidad.

9. Certificación bancaria.

10. Certificado de paz y salvo por concepto de pagos al sistema general de seguridad social integral y legales – Personas jurídicas. Belzcon Construcción Propositiva.

11. Certificación de existencia y representación legal. Belzcon S.A.S.

12. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal de Belzcon Construcción Propositiva.

13. Fotocopia del certificado disciplinario expedidos por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal de Belzcon Construcción Propositiva.

14. Certificado de revisor fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

15. Certificación de existencia y representación legal. Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

16. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

17. Fotocopia del certificado disciplinario expedidos por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal de Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S.

18. Planillas pago de seguridad social septiembre de 2025.

19. Acta de recibo parcial n.° 5.

Atentamente,

VALENTÍN BARAJAS SANTOS
Director Interventoría

Copia: Nancy Mateus Ráquira nmateus@movilidadbogota.gov.co, Apoyo a la Supervisión.

Anexos: Archivo: “CORTE 5 - CBM - 01 AL 30 SEPTIEMBRE Cto 2025-2780.pdf”

Elaboró: LCastellanos. Revisó: VBarajas.

Outlook

RV: Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Desde DIRECTOR DE INTERVENTORIA <SEM-DIRECTOR@redtic.com.co>
Fecha Mar 11/11/2025 18:39
Para PROFESIONAL FINANCIERO Y CONTABLE <SEM-P-FINANCIERO@redtic.com.co>

1 archivo adjunto (10 MB)
20252780-2025-09.pdf;

Buenas tardes Laura.

Comparto para tu información.

Atentamente.

Valentín Eduardo Barajas Santos
Director de Interventoría
Calle 74 N.° 20C-04 Barrio San Felipe
Tel: 7 43 44 40 Celular: 3116387026
Email: sem-director@redtic.com.co
Bogotá D.C., Colombia

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen al Consorcio Movilidad Capital y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibidos y puede ser sancionada legalmente.

De: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Enviado el: martes, 11 de noviembre de 2025 6:37 p. m.
Para: Angelica Maria Sanchez Poveda <amsanchez@movilidadbogota.gov.co>; Ana de Dios Silva Martinez <asilva@movilidadbogota.gov.co>
CC: DIRECTOR DE INTERVENTORIA <sem-director@redtic.com.co>; Omar Fernando Mateus Pineda

<ofmateus@movilidadbogota.gov.co>; Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Cordial saludo

Se adjunta evidencia de la radicación de la cuenta No. 5 del contrato 2025-2780, correspondiente al pago del mes de septiembre para lo pertinente.

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ FONSECA
Profesional Especializado
Subdirección de Semaforización
Secretaría Distrital de Movilidad
adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
(571) 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Acuses de recibo de respuestas al formulario** <forms-receipts-noreply@google.com>
Date: mar, 11 nov 2025 a la(s) 6:23 p.m.
Subject: Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión
To: <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>

Gracias por rellenar este formulario: Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Esto es lo que se recibió.

Ventanilla Virtual II - Radicación Cuentas Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión

Este formulario debe ser diligenciado únicamente por el supervisor del contrato y aplica única y exclusivamente para los contratos de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión; Las cuentas correspondientes a Servicios Públicos, Resoluciones, Sentencias, ARL y otros Pagos Prioritarios, deben ser radicadas en la Ventanilla Virtual III, en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqV8rkmfY_H5hv0JS0Km6nE5HbCrKILU2v_ADdoD-kPNKfA/viewform

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Se ha registrado tu correo (**adrodriguez@movilidadbogota.gov.co**) al enviar este formulario.

Ingrese el número de contrato (Ej: 2019231). Sin guiones ni espacios comenzando con el año del contrato. *

20252780

Periodo a Pagar (Año) *

- 2019
- 2020
- 2021

2022

2023

2024

2025

Ingrese el valor bruto de la cuenta *

341896623

Periodo a Pagar (Mes) *

Septiembre

¿Esta cuenta ya fue devuelta? (Marque SÍ, en el evento que la cuenta corresponda a una corrección por devolución) *

Sí

No

Ordenador de Gasto *

Subsecretaría de Política de Movilidad

Subsecretaría de Gestión de la Movilidad

Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía

Subsecretaría de Gestión Jurídica

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Tipo de identificación Contratista *

Cédula de Ciudadanía

Cédula de Extranjería

NIT

Otro

Número de Identificación del Contratista *

901933921

Nombres y Apellidos o Razón Social del Contratista *

CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

Número de Identificación del Supervisor *

901193529

Nombres y Apellidos del Supervisor *

Consorcio Movilidad Capital

Dependencia a la que pertenece el supervisor *

18 - Subdirección de Semaforización

Plataforma donde está registrado el contrato *

SECOP I

SECOP II

Certificado de Supervisión, Informe de Actividades, Planilla de aportes y documentos adicionales.

Entregar todo combinado en un único archivo .pdf en el orden indicado, con el siguiente formato NumContrato_AAAA_MM (Ej: 2019323_2020_04.pdf). Se sugiere que el contratista envíe el paquete en un sólo archivo PDF al supervisor.

Puede utilizar herramientas gratuitas por internet para unir PDF. Por ejemplo: https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf

NOTA 1: CON MOTIVO DEL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, A PARTIR DE LA FECHA SE REQUIERE SUBIR LA DOCUMENTACIÓN FIRMADA POR LAS PARTES, INCLUYENDO LA FACTURA, PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SE REQUIERA APORTAR ESTE DOCUMENTO.

Archivo *

Archivos enviados

20252780-2025-09 - Adriana Lucia Rodriguez Fonseca.pdf

Observaciones (Opcional)

Advertencia

AL DAR ENVIAR, USTED COMO SUPERVISOR MANIFIESTA QUE APRUEBA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

NOTA IMPORTANTE: Las cuentas únicamente deben ser radicadas por el supervisor. Cuentas que se encuentren radicadas por el contratista serán devueltas.

Para este efecto, el formulario registra automáticamente el correo electrónico de la persona que genera la radicación.

Recuerde que esta ventanilla es exclusiva para la radicación de cuentas de Contratistas Personas Jurídicas o Naturales Diferentes a Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión. Si radica otro tipo de cuenta, ésta será devuelta.

Crea tu propio formulario de Google

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013860346	NIT	901933921	CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1558	3001222336	002	20-nov-25	20-nov-25	PAGADA	21-nov-25	5005968765	Transferencia Giradora	341.896.623	299.213.528	469500044000 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001222336	RETEICA 7,6 X MIL	0.7600	359.891.182	2.735.173
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.891.182	3.958.803
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.891.182	1.799.456
	RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	2.0000	359.891.182	7.197.824
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.891.182	7.197.824
	ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5%	0.5000	359.891.182	1.799.456
	CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA 5%	5.0000	359.891.182	17.994.559
			TOTAL DESCUENTOS	42.683.095

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001222336	5000878464	001	O232020200888759	1-100-F039	2025

25-nov-25 08:17:30

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.
