ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN
CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
1062299836 - 0

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 AL
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 469 - 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA No.1

DEL 18 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

CARTA DE ACEPTACIÓN N.º 468-2025

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN MIRADOR BELÉN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA".



Ilustración 1 Parque Bolívar, foto tomada de internet

CALLE 8 # 15 – 41 B/ PANAMERICANO
SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA 3103608419
arqchristiancastillo@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, adjudicado mediante Carta de Aceptación N.º 468-2025 por el Municipio de Santander de Quilichao, se presenta el Informe de Interventoría N.º 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 18 y el 31 de julio de 2025. El objeto del contrato es realizar la interventoría a la consultoría para la **elaboración de los estudios y diseños para la adecuación del espacio público en el Mirador Belén, el Parque Lineal y el Parque Bolívar**.

El proyecto busca optimizar y revitalizar estos tres espacios públicos estratégicos, con el fin de mejorar la movilidad peatonal, la integración paisajística, las condiciones de accesibilidad, la oferta recreativa y la seguridad ciudadana. Entre las acciones previstas se incluyen la adecuación de zonas verdes y mobiliario urbano, la construcción e instalación de elementos de iluminación, el mejoramiento de vías y senderos, la intervención en bordes de ríos y muros, la adecuación interna de los parques y la construcción de casetas acordes a las dinámicas sociales y ambientales del entorno.

La consultoría, a cargo de **MD2 Proyectos S.A.S.**, tiene una duración de **cinco (5) meses** contados a partir del 18 de julio de 2025, fecha de inicio formal del Contrato de Consultoría N.º 469-2025, y finalizará el 18 de diciembre de 2025. Durante este periodo, el consultor deberá desarrollar todas las actividades técnicas y administrativas requeridas para entregar los estudios y diseños completos, mientras la interventoría ejerce el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los términos contractuales, normativos y de calidad.

El presente informe recoge las actividades ejecutadas por el consultor en el primer periodo de trabajo, así como las observaciones y verificaciones realizadas por la interventoría, garantizando la trazabilidad y transparencia en el desarrollo del proyecto.

2. ANTECEDENTES

En el año 2000 – 2003 el municipio de Santander de Quilichao inició la elaboración de unos estudios y diseños para intervenir el cerro Belén, uno de los cerros tutelares del municipio de Santander de Quilichao, la intervención de este cerro comprendía resaltar el cerro como un hito urbano con el diseño de espacios de permanecía los cuales buscan rememorar los 7 templos doctrineros de la colonia y resaltando las visuales del municipio, dentro de estos diseños también se contemplaba restaurar las escalinatas de acceso al cerro e impulsar la parte superior como un mirador turístico que cuente con algunos locales comerciales de artesanías y comidas típicas de la región. En la siguiente imagen se muestra el estado actual:



Ilustración 2 Estado actual de las escalinatas (imagen tomada del estudio previo del proceso de consultoría MSQ-CM-006-2024)

Por otro lado, el sector del parque Simón Bolívar se consolida como una zona de desarrollo urbanístico importante, en la cual se ha construido infraestructura y equipamiento como el colegio Instituto Técnico, EMQUILICHAO, IPS, QUILISALUD, UNAD, etc. En las siguientes imágenes se delimitan los espacios:



Ilustración 3 Imagen en planta Parque Simón Bolívar (imagen tomada del estudio previo del proceso de consultoría MSQ-CM-006-2024)



Ilustración 4 Imagen en planta Parque lineal (imagen tomada del estudio previo del proceso de consultoría MSQ-CM-006-2024)



Los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre.

Los espacios existentes están deteriorados, específicamente, los sectores del área urbana como el Cerro de Belén y el parque Simón Bolívar, y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, también los escenarios deportivos y/o recreativos que están en buenas condiciones no son de uso público.

Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y al aumento de los niveles de sedentarismo en el municipio de Santander de Quilichao.

(INFORMACIÓN TOMADA DEL DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO DE CONSULTORÍA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7875237&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true)

3. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN
Número de contrato	469-2025
Tipo y objeto	Consultoría: Estudios y diseños para adecuación del espacio público en Mirador Belén, Parque Lineal y Parque Bolívar
Contratista	MD2 Proyectos S.A.S.
Contratante	Municipio de Santander de Quilichao
Plazo	5 meses
Fecha de inicio	18/07/2025
Fecha de terminación (inicial)	18/12/2025
Valor del contrato	$260.610.000
Anticipo pactado:	40% ($104.244.000)
Estado de pagos al corte	Valor pagado: $0 | Saldo: $260.610.000 antes de descuento de anticipo
Corte del informe	31/07/2025

3.1. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
Producto 1	Levantamiento topográfico y planimetría base
Producto 2	Estudio geotécnico y de pavimentos
Producto 3	Diseño arquitectónico y paisajístico preliminar
Producto 4	Diseños técnicos de redes (hidrosanitarias, eléctricas, drenaje)
Producto 5	Diseños estructurales y obras de contención
Producto 6	Planos constructivos y detalles por especialidad
Producto 7	Memorias de cálculo y justificación técnica
Producto 8	Especificaciones técnicas y presupuesto oficial
Producto 9	Informe final de consultoría con toda la documentación consolidada

3.2. PAGOS DESARROLLADOS EN EL PRESENTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN	FECHA REAL DE PAGO
Anticipo pactado:	40% ($104.244.000)	5/08/2025

Comprobante de PAGO:

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 7 FECHA: 12/23/2024

CHEQUE AÑO 2025 MES 08 DIA 01 Valor $ 0.00

Paguese A MD2 PROYECTOS SAS
Valor en Letras : Cero Pesos M/C

FECHA COMPROBANTE	01/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002372**
A FAVOR DE	MD2 PROYECTOS SAS	**NIT**	**901773817**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**0.00**
POR VALOR DE	Cero Pesos M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002175
DETALLE	Pago anticipo 40% de regalias del Registro Presupuestal #: 2025001184 cuyo objeto es ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN MIRADOR BELÉN PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	SGR107035350220002024 1969801823502110350021 1000N1622.3.2.02.02.005 - 2.2.06.01.003.02.01		0	104,244,000.00	0.00
130702	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			0	0.00	104,244,000.00
				SUMAS IGUALES:	**104,244,000.00**	**104,244,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000526 **Registro** 2025001184 **Obligacion** 2025002307
Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 01/08/2025** **Número: 2025002421**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
SGR107035350220002024 1969801823502110350021 1000N1622.3.2.02.02.005 2.2.06.01.003.02.01	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	2.2.06.01.003.02.01	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA	104,244,000.00	0.00
			Pagos Total :	**104,244,000.00**	**0.00**

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

3.3. PÓLIZAS CONTRACTUALES:

AMPAROS	ASEGURADORA	N°. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Compañía Mundial de Seguros S.A.	45-44-101167464	03/07/2025	04/06/2026	$52.122.000
		45-44-101167464	03/07/2025	04/06/2026	$104.244.000

CALIDAD DEL SERVICIO		45-44-101167464	03/07/2025	04/06/2026	$52.122.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		45-44-101167464	03/07/2025	04/12/2028	$13.030.500

APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por ítems, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo 100.00 Fecha de vigencia (desde) 3/07/2025 11:59:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 3/07/2025 11:59:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Pago de salarios

% del valor del contrato 5.00 Fecha de vigencia (desde) 3/07/2025 11:59:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 3/07/2025 11:59:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 3/07/2025 11:59:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 4/07/2025 4:00:00 PM Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17000040	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	221.910.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/12/2028	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17000080	Seriedad de la oferta		26.096.700 COP	-	19/09/2025	Vencida	Detalle
CO1.WRT.17498705	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	221.910.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/12/2028	Aprobada	Detalle

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentarios:

Dirección de notificaciones

NOTA: LAS PÓLIZAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS.


4. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA INTERVENTORIA:

Elemento	Detalle
Número de contrato	468-2025
Tipo y objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de los estudios y diseños para adecuación del espacio público en Mirador Belén, Parque Lineal y Parque Bolívar
Contratista	Cristian Ernesto Castillo Sanclemente
Contratante	Municipio de Santander de Quilichao
Plazo	5 meses
Fecha de inicio	18/07/2025
Fecha de terminación (inicial)	18/12/2025
Valor del contrato	$ 52.300.000,00
Anticipo pactado	0%
Estado de pagos al corte	Valor pagado: $0 | Saldo: $ 52.300.000,00
Corte del informe	31/07/2025

4.1. PÓLIZAS CONTRACTUALES INTERVENTORÍA

AMPAROS	ASEGURADORA	N°. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7701861000019	18/07/2025	17/06/2026	$ 10.460.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			18/07/2025	17/12/2028	$ 2.615.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO			18/07/2025	17/06/2026	$ 10.460.000,00

APROBACIÓN DE PÓLIZAS POR ENTIDAD:

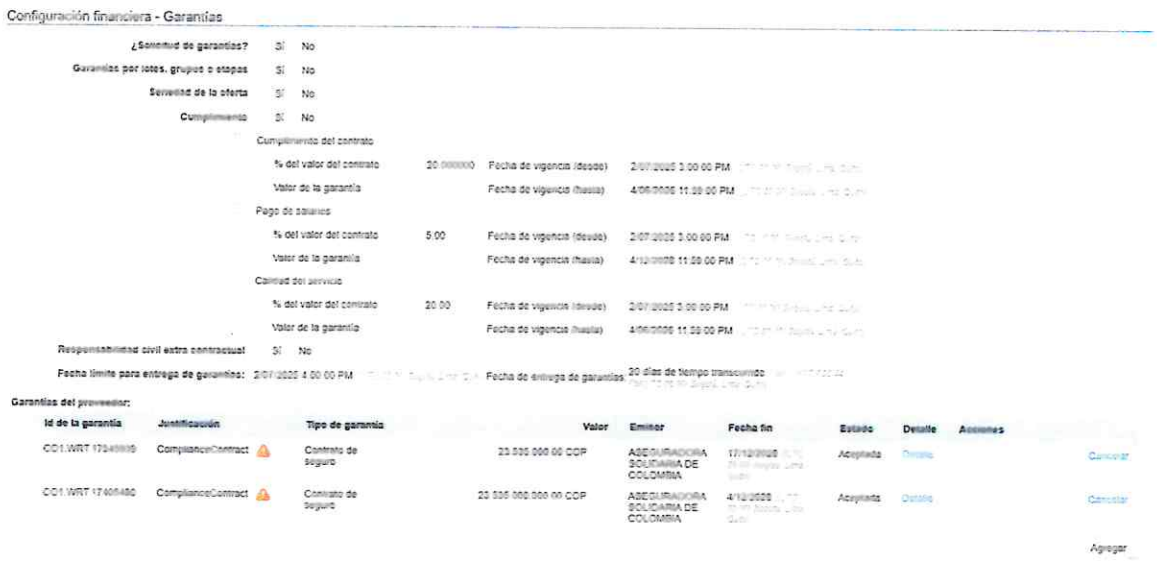

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20.000000 Fecha de vigencia (desde) 2/07/2025 3:00:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Pago de salarios

% del valor del contrato 5.00 Fecha de vigencia (desde) 2/07/2025 3:00:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/12/2026 11:59:00 PM

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 2/07/2025 3:00:00 PM

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/06/2026 11:59:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 2/07/2025 4:00:00 PM Fecha de entrega de garantías 20 días de tiempo transcurrido

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
CO1.WRT.17345939	ComplianceContract	Contrato de seguro	23.535.000.00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/12/2026	Aceptada	Detalle	Cancelar
CO1.WRT.17405480	ComplianceContract	Contrato de seguro	23.535.000.000.00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/12/2026	Aceptada	Detalle	Cancelar

Agregar

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

5.1. APROBACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

MANEJO DE ANTICIPO

MD2 PROYECTOS S.A.S.

1. FECHA ELABORACIÓN: 17 7 25

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO CONSULTORIA No: 469 3. FECHA CONTRATO: 25 JUNIO 2025 4. VALOR CONTRATO: $ 260.610.000

5. PLAZO EJEC. (MESES): 5 MESES

6. CONSULTOR: MD2 PROYECTOS S.A.S.

7. INTERVENTOR: CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE

8. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

9. VALOR ANTICIPO: $ 104,244,000 10. PORCENTAJE ANTICIPO: 40%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

11. ITEM	12. DESCRIPCIÓN	13. VALOR	14. PORCENTAJE
1	Topografía	$ 46.648.000	44.75%
2	Estudios Geologicos y Geotecnicos	$ 30.347.000	29.11%
3	Diseño Arquitectónico, Urbanistico y Paisajistico	$ 12.591.000	12.08%
4	Diseño Estructural	$ -	0.00%
5	Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	$ 14.660.000	14.06%
6	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	$ -	0.00%
7	Diseño Hidrosanitario	$ -	0.00%
8	Diseño Eléctrico y Fotometrico	$ -	0.00%
9	Plan de Manejo Ambiental	$ -	0.00%
10	Análisis de Riesgos	$ -	0.00%
11	Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentacion	$ -	0.00%
12	Presupuesto, Cantidades de Obra y APU	$ -	0.00%
	TOTAL	**$ 104,244,000**	**100%**

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en el municipio de Santander de Quilichao, a los 18 días del mes de julio del año 2025


ELABORADO POR:

ING. MILENA KATHERINE MORENO
REPRESENTANTE LEGAL MD2 PROYECTOS S.A.S.

APROBADO POR: Fecha: 2025.07.21 17:40:44 -05'00'


ING. ANDRES FELIPE CAICEDO
INTERVENTORIA

5.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO

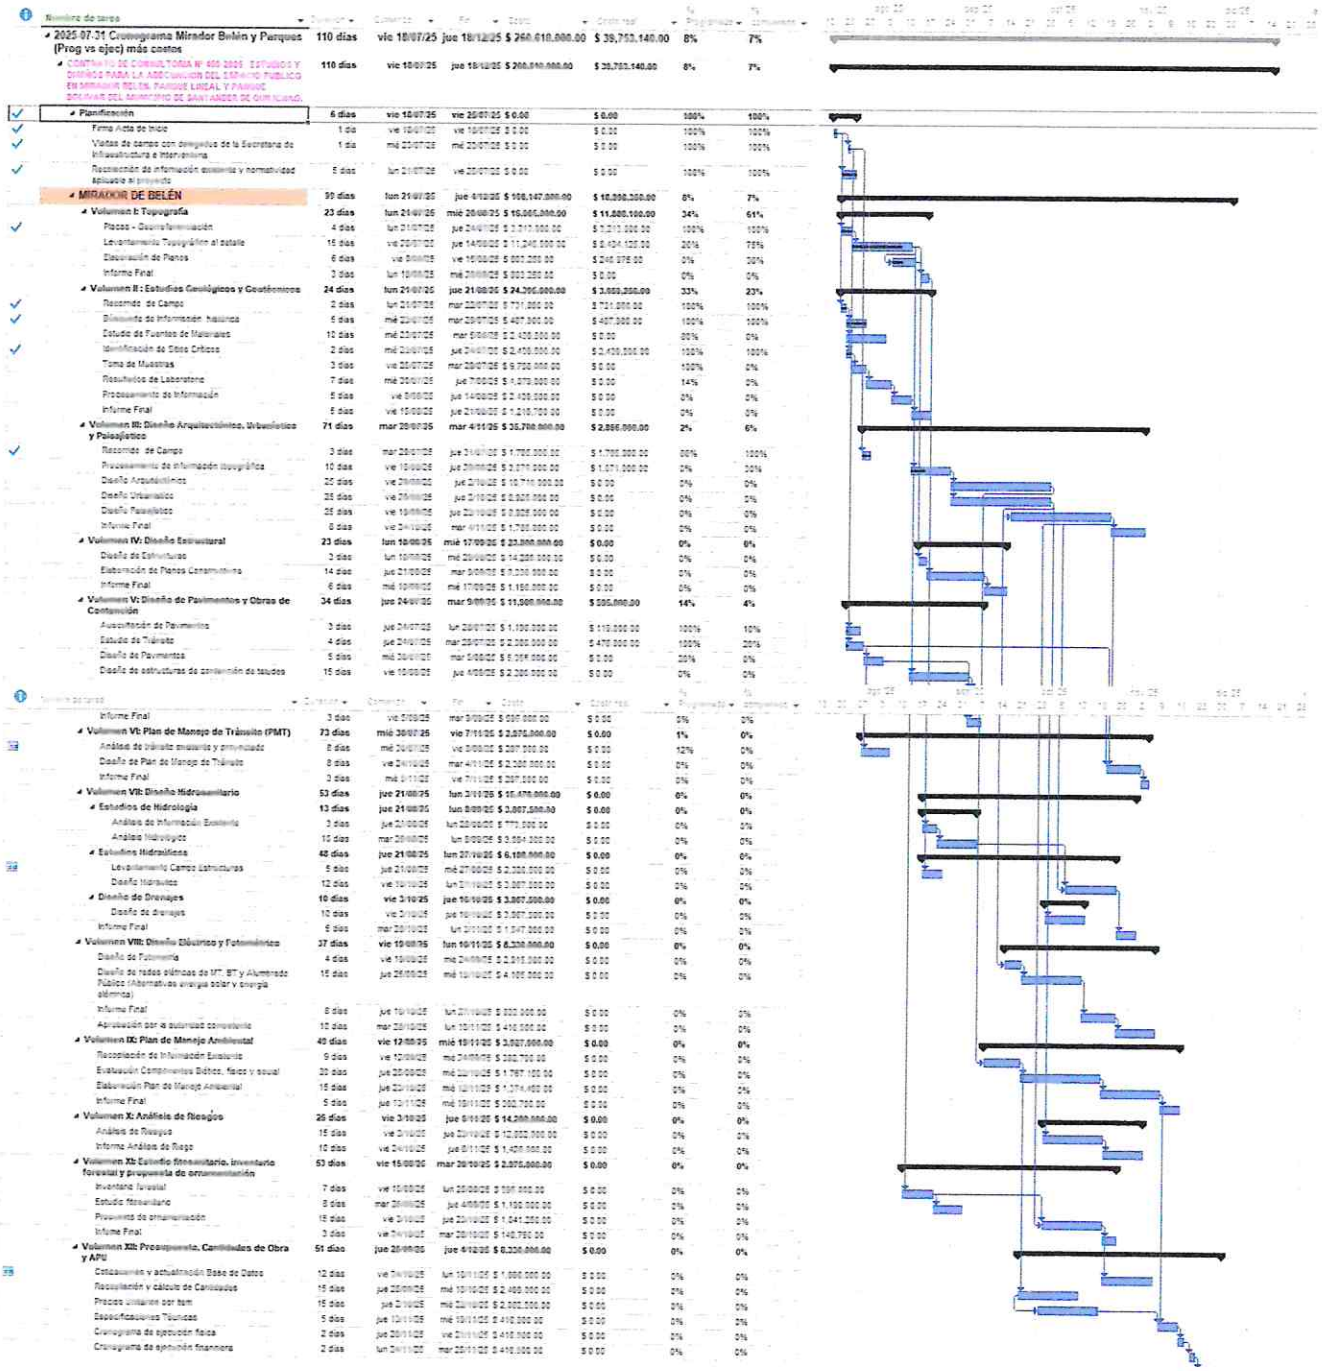

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo real	% Progreso	% Completado
2025-07-31 Cronograma Mirador Belén y Parques (Prog vs ejec) más costos	110 días	vie 18/07/25	jue 18/12/25	$ 260.610.000,00	$ 39.753.140,00	8%	7%
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	110 días	vie 18/07/25	jue 18/12/25	$ 260.610.000,00	$ 39.753.140,00	8%	7%
Planificación	6 días	vie 18/07/25	vie 25/07/25	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
Firma Acta de Inicio	1 día	vie 18/07/25	vie 18/07/25	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
Visitas de campo con delegados de la Secretaria de Infraestructura e Interventoria	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
Reconocimiento de información existente y normatividad aplicable al proyecto	5 días	lun 21/07/25	vie 25/07/25	$ 0,00	$ 0,00	100%	100%
MIRADOR DE BELÉN	90 días	lun 21/07/25	jue 4/12/25	$ 168.147.000,00	$ 16.306.330,00	6%	7%
Volumen I: Topografía	23 días	lun 21/07/25	mié 20/08/25	$ 10.005.000,00	$ 11.800.100,00	34%	61%
Planos - Georreferenciación	4 días	lun 21/07/25	jue 24/07/25	$ 3.211.000,00	$ 3.211.000,00	100%	100%
Levantamiento Topográfico al detalle	15 días	vie 25/07/25	jue 14/08/25	$ 11.040.000,00	$ 8.424.122,00	20%	76%
Elaboración de Planos	6 días	vie 8/08/25	vie 15/08/25	$ 667.200,00	$ 246.978,00	0%	37%
Informe Final	3 días	lun 18/08/25	mié 20/08/25	$ 667.200,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen II : Estudios Geológicos y Geotécnicos	24 días	lun 21/07/25	jue 21/08/25	$ 24.300.000,00	$ 3.600.200,00	33%	23%
Reconocimiento de Campo	2 días	lun 21/07/25	mar 22/07/25	$ 721.000,00	$ 721.000,00	100%	100%
Diseño de Información Histórica	5 días	mié 23/07/25	mar 29/07/25	$ 467.300,00	$ 467.300,00	100%	100%
Estudio de Fuentes de Materiales	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25	$ 2.400.000,00	$ 0,00	0%	0%
Identificación de Sitios Críticos	2 días	mié 23/07/25	jue 24/07/25	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	100%	100%
Toma de Muestras	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25	$ 9.700.000,00	$ 0,00	100%	0%
Resultados de Laboratorio	7 días	mié 30/07/25	jue 7/08/25	$ 1.270.000,00	$ 0,00	14%	0%
Procesamiento de Información	5 días	vie 8/08/25	jue 14/08/25	$ 2.400.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	vie 15/08/25	jue 21/08/25	$ 1.210.700,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen III: Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	71 días	mar 29/07/25	mar 4/11/25	$ 35.700.000,00	$ 2.866.000,00	2%	6%
Reconocimiento de Campo	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	100%	100%
Procesamiento de información topográfica	10 días	vie 15/08/25	jue 28/08/25	$ 3.570.000,00	$ 1.071.000,00	0%	30%
Diseño Arquitectónico	25 días	vie 29/08/25	jue 2/10/25	$ 10.710.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño Urbanístico	25 días	vie 29/08/25	jue 2/10/25	$ 8.925.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño Paisajístico	25 días	vie 19/09/25	jue 23/10/25	$ 8.925.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	8 días	vie 24/10/25	mar 4/11/25	$ 1.700.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen IV: Diseño Estructural	23 días	lun 18/08/25	mié 17/09/25	$ 23.800.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de Estructuras	3 días	lun 18/08/25	mié 20/08/25	$ 14.280.000,00	$ 0,00	0%	0%
Elaboración de Planos Constructivos	14 días	jue 21/08/25	mar 9/09/25	$ 8.330.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	6 días	mié 10/09/25	mié 17/09/25	$ 1.190.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen V: Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	34 días	jue 24/07/25	mar 9/09/25	$ 11.900.000,00	$ 595.000,00	14%	4%
Auscultación de Pavimentos	3 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	$ 1.190.000,00	$ 119.000,00	100%	10%
Estudio de Tráfico	4 días	jue 24/07/25	mar 29/07/25	$ 2.380.000,00	$ 476.000,00	100%	20%
Diseño de Pavimentos	5 días	mié 30/07/25	mar 5/08/25	$ 5.355.000,00	$ 0,00	20%	0%
Diseño de estructuras de contención de taludes	15 días	vie 15/08/25	jue 4/09/25	$ 2.380.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	vie 5/09/25	mar 9/09/25	$ 595.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VI: Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	73 días	mié 30/07/25	vie 7/11/25	$ 2.975.000,00	$ 0,00	1%	0%
Análisis de tráfico inducido y proyectado	8 días	mié 30/07/25	vie 8/08/25	$ 297.500,00	$ 0,00	12%	0%
Diseño de Plan de Manejo de Tráfico	8 días	vie 24/10/25	mar 4/11/25	$ 2.380.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VII: Diseño Hidrosanitario	53 días	jue 21/08/25	lun 3/11/25	$ 15.470.000,00	$ 0,00	0%	0%
Estudios de Hidrología	13 días	jue 21/08/25	lun 8/09/25	$ 2.007.500,00	$ 0,00	0%	0%
Análisis de Información Existente	3 días	jue 21/08/25	lun 25/08/25	$ 773.500,00	$ 0,00	0%	0%
Análisis Hidrológico	10 días	mar 26/08/25	lun 8/09/25	$ 3.094.000,00	$ 0,00	0%	0%
Estudios Hidráulicos	40 días	jue 21/08/25	lun 27/10/25	$ 6.188.000,00	$ 0,00	0%	0%
Levantamiento Campo Estructuras	5 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25	$ 2.380.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño Hidráulico	12 días	vie 19/09/25	lun 29/09/25	$ 3.807.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de Drenajes	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 3.807.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de drenajes	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 3.807.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	mar 28/10/25	lun 3/11/25	$ 1.547.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VIII: Diseño Eléctrico y Fotométrico	37 días	vie 19/09/25	lun 10/11/25	$ 6.230.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de Fotometría	4 días	vie 19/09/25	mié 24/09/25	$ 2.015.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eólica)	15 días	jue 25/09/25	mié 15/10/25	$ 4.165.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	8 días	jue 16/10/25	lun 27/10/25	$ 332.500,00	$ 0,00	0%	0%
Aprobación por la autoridad competente	10 días	mar 28/10/25	lun 10/11/25	$ 415.500,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen IX: Plan de Manejo Ambiental	40 días	vie 12/09/25	mié 12/11/25	$ 3.027.000,00	$ 0,00	0%	0%
Recolección de Información Existente	9 días	vie 12/09/25	mié 24/09/25	$ 382.700,00	$ 0,00	0%	0%
Evaluación Componentes Bótico, físico y social	20 días	jue 25/09/25	mié 22/10/25	$ 1.787.100,00	$ 0,00	0%	0%
Elaboración Plan de Manejo Ambiental	15 días	jue 23/10/25	mié 12/11/25	$ 1.274.400,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$ 382.700,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen X: Análisis de Riesgos	26 días	vie 3/10/25	jue 9/11/25	$ 14.280.000,00	$ 0,00	0%	0%
Análisis de Riesgos	15 días	vie 3/10/25	jue 23/10/25	$ 12.002.700,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Análisis de Riesgo	10 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	$ 1.401.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen Xb: Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	53 días	vie 15/08/25	mar 28/10/25	$ 2.975.000,00	$ 0,00	0%	0%
Inventario forestal	7 días	vie 15/08/25	lun 25/08/25	$ 595.000,00	$ 0,00	0%	0%
Estudio fitosanitario	8 días	mar 26/08/25	jue 4/09/25	$ 1.190.000,00	$ 0,00	0%	0%
Propuesta de ornamentación	15 días	vie 5/09/25	jue 25/09/25	$ 1.041.250,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	vie 26/09/25	mar 28/10/25	$ 148.750,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen XI: Presupuesto, Cantidades de Obra y APU	51 días	jue 28/08/25	jue 4/12/25	$ 8.330.000,00	$ 0,00	0%	0%
Actualización y actualización Base de Datos	12 días	vie 26/09/25	lun 13/10/25	$ 1.666.000,00	$ 0,00	0%	0%
Recopilación y cálculo de Cantidades	15 días	jue 25/09/25	mié 15/10/25	$ 2.499.000,00	$ 0,00	0%	0%
Precios unitarios por ítem	15 días	jue 2/10/25	mié 22/10/25	$ 2.082.500,00	$ 0,00	0%	0%
Especificaciones Técnicas	5 días	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$ 416.500,00	$ 0,00	0%	0%
Cronograma de ejecución física	2 días	jue 20/11/25	vie 21/11/25	$ 416.500,00	$ 0,00	0%	0%
Cronograma de ejecución financiero	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25	$ 416.500,00	$ 0,00	0%	0%

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN
CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
1062299836 - 0

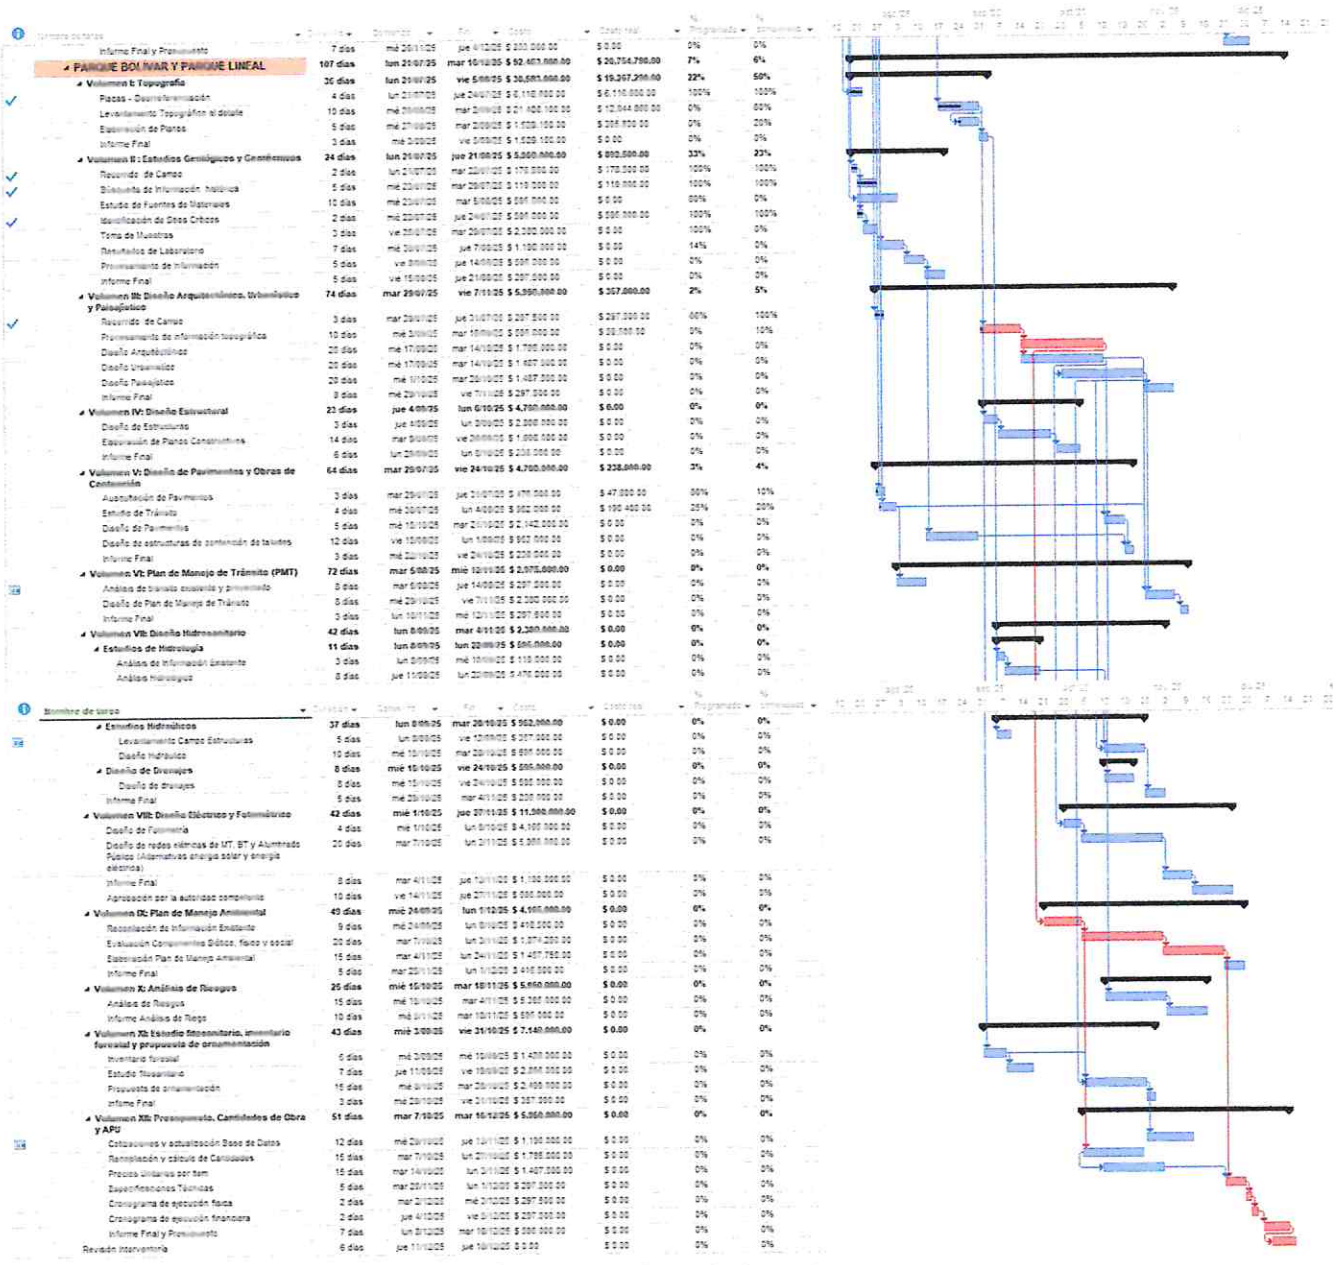

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo real	% Programado	% Completado
Informe Final y Presupuesto	7 días	mié 26/11/25	jue 4/12/25	$ 333.000,00	$ 0,00	0%	0%
PARQUE BOLÍVAR Y PARQUE LINEAL	**107 días**	**lun 21/07/25**	**mar 16/12/25**	**$ 92.461.000,00**	**$ 20.754.700,00**	**7%**	**6%**
Volumen I: Topografía	**30 días**	**lun 21/07/25**	**vie 5/09/25**	**$ 30.581.000,00**	**$ 19.267.200,00**	**22%**	**50%**
Picas - Georreferenciación	4 días	lun 21/07/25	jue 24/07/25	$ 6.110.000,00	$ 6.110.000,00	100%	100%
Levantamiento Topográfico al detalle	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25	$ 21.400.100,00	$ 12.044.800,00	0%	80%
Elaboración de Planos	5 días	mié 27/08/25	mar 2/09/25	$ 1.020.100,00	$ 205.800,00	0%	20%
Informe Final	3 días	mié 3/09/25	vie 5/09/25	$ 1.020.100,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen II : Estudios Geológicos y Geotécnicos	**24 días**	**lun 21/07/25**	**jue 21/08/25**	**$ 5.300.500,00**	**$ 892.500,00**	**33%**	**23%**
Recorrido de Campo	2 días	lun 21/07/25	mar 22/07/25	$ 170.000,00	$ 170.000,00	100%	100%
Diagnóstico de Información histórica	5 días	mié 23/07/25	mar 29/07/25	$ 110.000,00	$ 110.000,00	100%	100%
Estudio de Fuentes de Materiales	10 días	mié 23/07/25	mar 5/08/25	$ 500.000,00	$ 0,00	80%	0%
Identificación de Sitios Críticos	2 días	mié 23/07/25	jue 24/07/25	$ 500.000,00	$ 500.000,00	100%	100%
Toma de Muestras	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25	$ 2.000.000,00	$ 0,00	100%	0%
Ensayos de Laboratorio	7 días	mié 29/07/25	jue 7/08/25	$ 1.100.000,00	$ 0,00	14%	0%
Procesamiento de Información	5 días	vie 8/08/25	jue 14/08/25	$ 500.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	vie 15/08/25	jue 21/08/25	$ 500.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen III: Diseño Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico	**74 días**	**mar 29/07/25**	**vie 7/11/25**	**$ 5.300.500,00**	**$ 307.000,00**	**2%**	**5%**
Recorrido de Campo	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	$ 307.500,00	$ 297.000,00	100%	100%
Procesamiento de información topográfica	10 días	mié 3/09/25	mar 16/09/25	$ 500.000,00	$ 10.000,00	0%	10%
Diseño Arquitectónico	20 días	mié 17/09/25	mar 14/10/25	$ 1.700.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño Urbanístico	20 días	mié 17/09/25	mar 14/10/25	$ 1.407.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño Paisajístico	20 días	mié 1/10/25	mar 28/10/25	$ 1.407.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	8 días	mié 29/10/25	vie 7/11/25	$ 297.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen IV: Diseño Estructural	**22 días**	**jue 4/09/25**	**lun 6/10/25**	**$ 4.750.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Diseño de Estructuras	3 días	jue 4/09/25	lun 8/09/25	$ 2.000.000,00	$ 0,00	0%	0%
Elaboración de Planos Constructivos	14 días	mar 9/09/25	vie 26/09/25	$ 1.000.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	6 días	lun 29/09/25	lun 6/10/25	$ 238.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen V: Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	**64 días**	**mar 29/07/25**	**vie 24/10/25**	**$ 4.750.000,00**	**$ 238.000,00**	**3%**	**4%**
Auscultación de Pavimentos	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	$ 477.000,00	$ 47.000,00	100%	10%
Estudio de Tráfico	4 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25	$ 982.000,00	$ 190.400,00	25%	20%
Diseño de Pavimentos	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25	$ 2.142.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de estructuras de contención de taludes	12 días	vie 15/08/25	lun 1/09/25	$ 992.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 238.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VI: Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	**72 días**	**mar 5/08/25**	**mié 12/11/25**	**$ 2.975.600,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Análisis de tránsito existente y proyectado	5 días	mar 5/08/25	jue 14/08/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de Plan de Manejo de Tráfico	5 días	mié 29/10/25	vie 7/11/25	$ 2.380.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VII: Diseño Hidrosanitario	**42 días**	**lun 8/09/25**	**mar 4/11/25**	**$ 2.380.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Estudios de Hidrología	**11 días**	**lun 8/09/25**	**lun 22/09/25**	**$ 595.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Análisis de información existente	3 días	lun 8/09/25	mié 10/09/25	$ 119.000,00	$ 0,00	0%	0%
Análisis hidrológico	8 días	jue 11/09/25	lun 22/09/25	$ 476.000,00	$ 0,00	0%	0%

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo real	% Programado	% Completado
Estudios Hidráulicos	**37 días**	**lun 8/09/25**	**mar 28/10/25**	**$ 952.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Levantamiento Campo Estructuras	5 días	lun 8/09/25	vie 12/09/25	$ 297.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño hidráulico	10 días	mié 10/10/25	mar 28/10/25	$ 655.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de Drenajes	**8 días**	**mié 15/10/25**	**vie 24/10/25**	**$ 595.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Diseño de drenajes	8 días	mié 15/10/25	vie 24/10/25	$ 595.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	$ 200.700,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen VIII: Diseño Eléctrico y Fotométrico	**42 días**	**mié 1/10/25**	**jue 27/11/25**	**$ 11.500.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Diseño de Fotometría	4 días	mié 1/10/25	lun 6/10/25	$ 4.100.000,00	$ 0,00	0%	0%
Diseño de redes eléctricas de MT, BT y Alumbrado Público (Alternativas energía solar y energía eléctrica)	20 días	mar 7/10/25	lun 3/11/25	$ 5.500.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	8 días	mar 4/11/25	jue 13/11/25	$ 1.100.000,00	$ 0,00	0%	0%
Agrupación por la autoridad competente	10 días	vie 14/11/25	jue 27/11/25	$ 800.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen IX: Plan de Manejo Ambiental	**40 días**	**mié 24/09/25**	**lun 1/12/25**	**$ 4.100.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Recolección de información Existente	9 días	mié 24/09/25	lun 6/10/25	$ 410.000,00	$ 0,00	0%	0%
Evaluación Componente Físico, físico y social	20 días	mar 7/10/25	lun 3/11/25	$ 1.374.200,00	$ 0,00	0%	0%
Elaboración Plan de Manejo Ambiental	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 1.407.750,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	5 días	mar 25/11/25	lun 1/12/25	$ 410.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen X: Análisis de Riesgos	**25 días**	**mié 15/10/25**	**mar 18/11/25**	**$ 5.950.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Análisis de Riesgos	15 días	mié 15/10/25	mar 4/11/25	$ 5.267.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Análisis de Riesgo	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	$ 595.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen XI: Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	**43 días**	**mié 3/09/25**	**vie 31/10/25**	**$ 7.140.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Inventario forestal	6 días	mié 3/09/25	mié 10/09/25	$ 1.400.000,00	$ 0,00	0%	0%
Estudio fitosanitario	7 días	jue 11/09/25	vie 19/09/25	$ 2.000.000,00	$ 0,00	0%	0%
Propuesta de ornamentación	15 días	mié 3/10/25	mar 28/10/25	$ 2.400.000,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final	3 días	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 357.000,00	$ 0,00	0%	0%
Volumen XII: Presupuesto, Cantidades de Obra y APU	**51 días**	**mar 7/10/25**	**mar 16/12/25**	**$ 5.950.000,00**	**$ 0,00**	**0%**	**0%**
Cotizaciones y actualización Base de Datos	12 días	mié 29/10/25	jue 13/11/25	$ 1.190.000,00	$ 0,00	0%	0%
Ramplación y cálculo de Cantidades	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 1.785.000,00	$ 0,00	0%	0%
Precios Unitarios por ítem	15 días	mar 14/10/25	lun 3/11/25	$ 1.407.000,00	$ 0,00	0%	0%
Especificaciones Técnicas	5 días	mar 28/10/25	lun 3/11/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Cronograma de ejecución física	2 días	mar 2/12/25	mié 3/12/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Cronograma de ejecución financiera	2 días	jue 4/12/25	vie 5/12/25	$ 297.500,00	$ 0,00	0%	0%
Informe Final y Presupuesto	7 días	lun 8/12/25	mar 16/12/25	$ 595.000,00	$ 0,00	0%	0%
Revisión interventoría	6 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%

NOTA; Esta programación de obra fue subida al Gesproy

5.3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AVANCE DE OBRA


Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Costo real	% Programado	% completado
2025-07-31 Cronograma Mirador Belén y Parques (Prog vs ejec) más costos	110 días	vie 18/07/25	jue 18/12/25	$ 260,610,000.00	$ 39,753,140.00	8%	7%
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 469 2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO EN MIRADOR BELEN, PARQUE LINEAL Y PARQUE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.	110 días	vie 18/07/25	jue 18/12/25	$ 260,610,000.00	$ 39,753,140.00	8%	7%
Planificación	6 días	vie 18/07/25	vie 25/07/25	$ 0.00	$ 0.00	100%	100%
MIRADOR DE BELÉN	99 días	lun 21/07/25	jue 4/12/25	$ 168,147,000.00	$ 18,998,350.00	8%	7%
Volumen I: Topografía	23 días	lun 21/07/25	mié 20/08/25	$ 16,065,000.00	$ 11,888,100.00	34%	61%
Volumen II : Estudios Geológicos y Geotécnicos	24 días	lun 21/07/25	jue 21/08/25	$ 24,395,000.00	$ 3,659,250.00	33%	23%
Volumen III: Diseño Arquitectónico, Urbanistico y Paisajistico	71 días	mar 29/07/25	mar 4/11/25	$ 35,700,000.00	$ 2,856,000.00	2%	6%
Volumen IV: Diseño Estructural	23 días	lun 18/08/25	mié 17/09/25	$ 23,800,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen V: Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	34 días	jue 24/07/25	mar 9/09/25	$ 11,900,000.00	$ 595,000.00	14%	4%
Volumen VI: Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	73 días	mié 30/07/25	vie 7/11/25	$ 2,975,000.00	$ 0.00	1%	0%
Volumen VII: Diseño Hidrosanitario	53 días	jue 21/08/25	lun 3/11/25	$ 15,470,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen VIII: Diseño Eléctrico y Fotométrico	37 días	vie 19/09/25	lun 10/11/25	$ 8,330,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen IX: Plan de Manejo Ambiental	49 días	vie 12/09/25	mié 19/11/25	$ 3,927,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen X: Análisis de Riesgos	25 días	vie 3/10/25	jue 6/11/25	$ 14,280,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen XI: Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	53 días	vie 15/08/25	mar 28/10/25	$ 2,975,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen XII: Presupuesto, Cantidades de Obra y APU	51 días	jue 25/09/25	jue 4/12/25	$ 8,330,000.00	$ 0.00	0%	0%
PARQUE BOLÍVAR Y PARQUE LINEAL	107 días	lun 21/07/25	mar 16/12/25	$ 92,463,000.00	$ 20,754,790.00	7%	6%
Volumen I: Topografía	35 días	lun 21/07/25	vie 5/09/25	$ 30,583,000.00	$ 19,267,290.00	22%	50%
Volumen II : Estudios Geológicos y Geotécnicos	24 días	lun 21/07/25	jue 21/08/25	$ 5,950,000.00	$ 892,500.00	33%	23%
Volumen III: Diseño Arquitectónico, Urbanistico y Paisajistico	74 días	mar 29/07/25	vie 7/11/25	$ 5,950,000.00	$ 357,000.00	2%	5%
Volumen IV: Diseño Estructural	23 días	jue 4/09/25	lun 6/10/25	$ 4,760,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen V: Diseño de Pavimentos y Obras de Contención	64 días	mar 29/07/25	vie 24/10/25	$ 4,760,000.00	$ 238,000.00	3%	4%
Volumen VI: Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	72 días	mar 5/08/25	mié 12/11/25	$ 2,975,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen VII: Diseño Hidrosanitario	42 días	lun 8/09/25	mar 4/11/25	$ 2,380,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen VIII: Diseño Eléctrico y Fotométrico	42 días	mié 1/10/25	jue 27/11/25	$ 11,900,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen IX: Plan de Manejo Ambiental	49 días	mié 24/09/25	lun 1/12/25	$ 4,165,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen X: Análisis de Riesgos	25 días	mié 15/10/25	mar 18/11/25	$ 5,950,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen XI: Estudio fitosanitario, inventario forestal y propuesta de ornamentación	43 días	mié 3/09/25	vie 31/10/25	$ 7,140,000.00	$ 0.00	0%	0%
Volumen XII: Presupuesto, Cantidades de Obra y APU	51 días	mar 7/10/25	mar 16/12/25	$ 5,950,000.00	$ 0.00	0%	0%
Revisión Interventoría	6 días	jue 11/12/25	jue 18/12/25	$ 0.00	$ 0.00	0%	0%


5.4. SOCIALIZACIÓN PROYECTO CON COMERCIANTES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS

Fecha 07/08/2025

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN
CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
1062299836 - 0

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 AL
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 469 - 2025

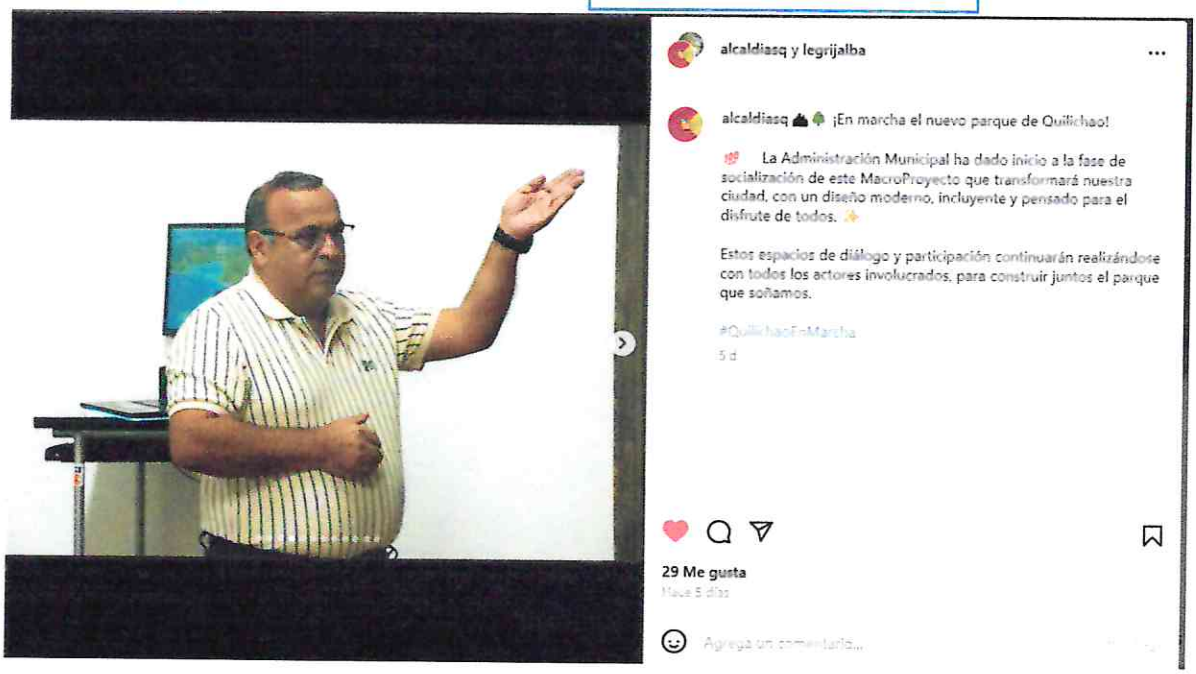

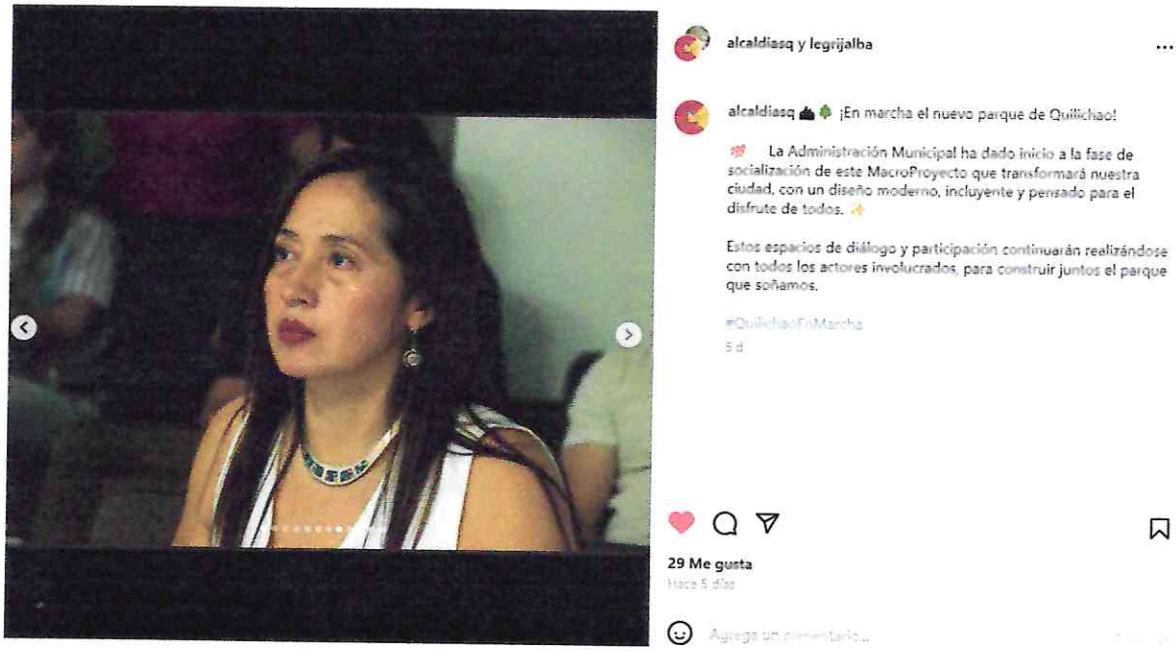




5.5. COMITÉ DE PROYECTO OFICINA PLANEACIÓN:

07/08/2025



5.6. RECORRIDO INICIAL



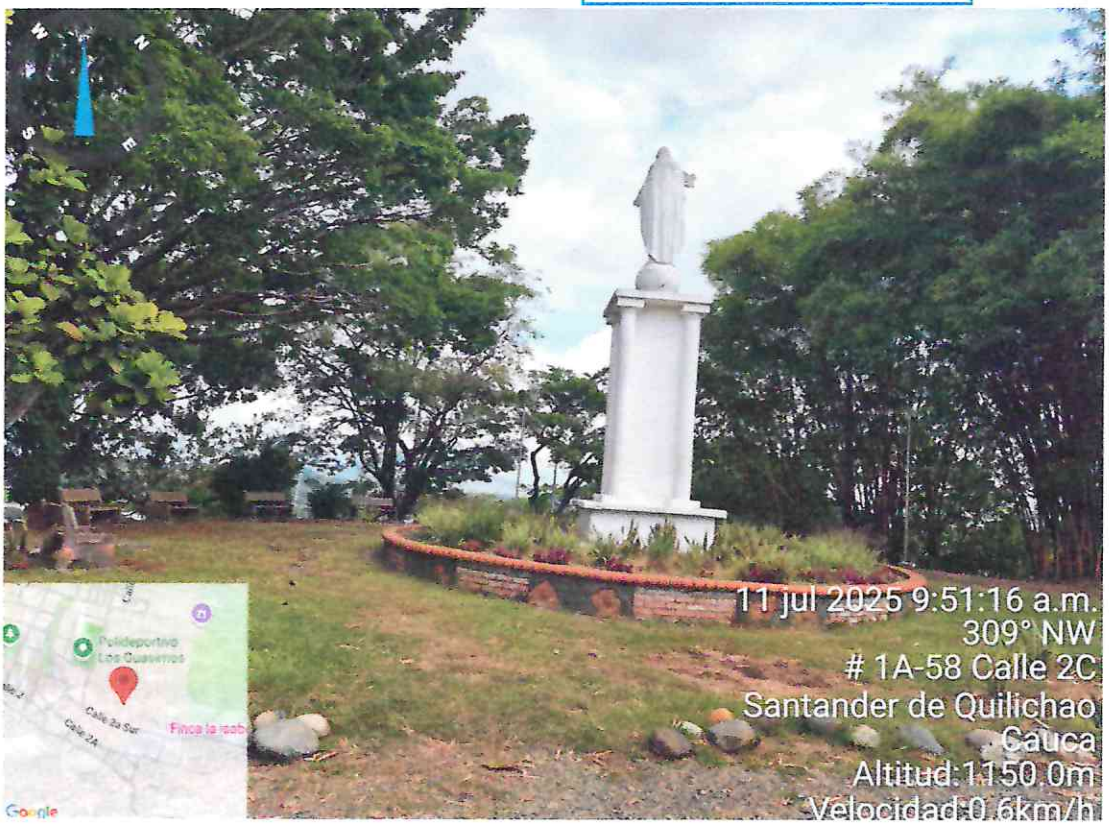

ACOMPAÑAMIENTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



Anexo Seguridades sociales

Quedamos atentos a cualquier inquietud

ANDRES FELIPE CASANOVA APARICIO
Ingeniero Civil
Residente de interventoría

CHRISTIAN ERNESTO CASTILLO SANCLEMENTE
Arquitecto Especialista en Construcción
Contratista

ANEXOS SEGURIDAD SOCIAL LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL INFORME DE CONSULTOR.
