| TIPO DE INFORME | INFORME PARCIAL |
|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Informe No. | | | 1 | | |
| 1.2. Período del informe | | Del | 8/09/2025 | | |
| | | Al | 12/11/2025 | | |
| 1.3. Contrato # | FGN-NC-0189 | Fecha | 21/08/2025 | Tipo de Contrato | OBRA PÚBLICA |
| 1.4. Objeto | | | | | |
| REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –FASE IV- BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | | | | | |
| 1.5. Nombre del contratista | | | | | |
| CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 integrado por la firma TRED INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S con Nit. 901.734.321-8 con el (60%) de participación y la firma CSS CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE S.A.S con Nit. 901.645.174-1 con el (40%) | | | | | |
| 1.6. Cédula o NIT | | | 1.7. Correo electrónico | | |
| 901.973.871-1 | | | Consorcioremodelacionescst@gmail.com | | |
| 1.8. Dirección | | | 1.9. Teléfono | | |
| Carrera 59 No. 167 A – 03 oficina 308 | | | 3137640402 | | |
| 1.10. Fecha de Inicio | | | 8/09/2025 | | |
| 1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)* | | | | | |
| ☑ Acta de Inicio | | | ☑ Registro Presupuestal | | |
| ☑ Aprobación de la Garantía | | | ☑ Suscripción del Contrato | | |
| 1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)* | | | SI APLICA | | 31/12/2025 |

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* | |
|---|---|
| 2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es) | |
| Ricardo Andrés Rincón Almanza | |
| 2.2. Dependencia | 2.3. N° Extensión o teléfono |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | |
|---|---|
| Departamento de Construcciones y Administración de Sedes | (57+1) 5169665 Ext. 33270 |
| **2.4. Correo electrónico** | ricardo.rincon@fiscalia.gov.co |
| **2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)**<br>*(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)* | |
| Geovanny Cely Urrea | |
| **2.6. Dependencia** | **2.7. N° Extensión o teléfono** |
| Departamento de Construcciones y Administración de Sedes | (57+1) 5169665 Ext. 33270 |
| **2.8. Correo electrónico** | geovanny.cely@fiscalia.gov.co |

## 3. RESUMEN FINANCIERO

### 3.1. Valor inicial del contrato

| | | |
|---|---|---|
| **Es hasta por la suma de** | $ 3.817.400.000 | Pesos M/CTE |
| **3.2. Vigencias futuras** | ○ SI | ◉ NO |

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| N/A | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| N/A | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| TOTAL | | |

(Agregar tantas filas como se requieran)

### 3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 5525 | 19/05/2025 |
| 22025 | 16/05/2025 |
| Escriba acá el número del CDP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

### 3.4. Número y fecha de registro presupuestal

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal |
|---|---|
| 72825 | 22/08/2025 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | |
|---|---|---|
| | 1069125 | 22/08/2025 |
| | Escriba acá el número del RP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

| 3.5. Cesión | ○ SI ● NO | Fecha | Si es un SI busca acá la fecha |
|---|---|---|---|

**3.6. Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4 - Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 3.817.400.000 | 0 | 126.280.584.68 | 3.691.119.415.32 |
| 12/11/2025 | 3.817.400.000 | 126.280.584.68 | 663.537.492.69 | 3.027.581.922.63 |

(Agregar tantas filas como se requieran)

**3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales**

| Fecha | Modificatorio | Adición | Prórroga | Suspensión | Reanudación | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquí puedes buscar la fecha | Elija acá el numero | Elija acá el numero | N.A | N.A | N.A | |
| Aquí puedes buscar la fecha | Elija acá el numero | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | N.A |

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

## 4. OTROS ASPECTOS

**4.1. Acta de liquidación:** (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| 4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha | 20.69 % |
|---|---|

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

| 4.3. Estado de avance físico a la fecha (%) | 31.21 % |
|---|---|

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4. Persona natural**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 5 – Persona Natural

| OBLIGACIONES | número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

(Si no aplica colocar N/A)

### 4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 5/11/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

## 5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

En el presente informe se realiza la descripción al seguimiento de las actividades realizadas por la obra, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 08/09/2025 al 12/11/2025 y que permita dar cumplimiento al objeto del contrato de obra en el marco de la ejecución de los trabajos de obra que se adelantan en las sedes de la Fiscalia en la ciudad de Bogotá (Bunker – Edificio Paloquemao).

**ACTIVIDADES DESARROLADAS:**

**FRENTES DE TRABAJO:**

Suministro de materiales, ingreso de personal operativo, ingreso de herramienta y equipos, se realiza la entrega, el replanteo y presupuesto de las áreas a intervenir.

**Edificio Paloquemao**

- **Punto fijo costado sur:**

✓ Cerramiento de la zona a intervenir.
✓ Empapelado de las escaleras.
✓ Aplicación de estuco sobre muros.
✓ Pintura de muros.
✓ Pintura sobre guardaescoba.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- **Adecuación trazas 2 piso:**

- ✓ Demolición de enchape de piso y muros.
- ✓ Desmonte de cielo raso.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Desmonte de sanitario.
- ✓ Desmonte de lavamanos.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

**Edificio Inurbe**

- **Piso 3:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Retiro de divisiones de baños.
- ✓ Desmonte de sanitarios.
- ✓ Desmonte de lavamanos.
- ✓ Desmonte de orinales.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Demolición de enchape existente.
- ✓ Pañete sobre muros.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de instalaciones hidráulicas.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Desmonte de mobiliario.
- ✓ Desmonte de divisiones de oficina abierta.
- ✓ Desmonte de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para muros en drywall.
- ✓ Instalación de frescasa en muros en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- **Piso 2:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Desmonte de luminarias.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Pañete sobre muros.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Desmonte de mobiliario.
- ✓ Desmonte de divisiones de oficina abierta.
- ✓ Desmonte de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Piso 1:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Demolición de mesón.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Pañete sobre muros.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Demolición de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de cerámica.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en drywall.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

**Bunker**

- o **Impermeabilización Materas Plataforma:**

- ✓ Desmonte de láminas de superboard.
- ✓ Desmonte de estructura en aluminio.
- ✓ Retiro de grava.
- ✓ Retiro de placas prefabricadas.
- ✓ Retiro de tierra de las materas.
- ✓ Preparación y limpieza de la superficie.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Inspección del sustrato.
- ✓ Instalación de geotextil.
- ✓ Instalación de la membrana PVC
- ✓ Fijación de la membrana.
- ✓ Soldadura termoplástica de la membrana en los traslapos.
- ✓ Fijación de la membrana al antepecho con perfilería y sellado con poliuretano.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Caniles:**

- ✓ Preparación y limpieza de la superficie.
- ✓ Inspección del sustrato.
- ✓ Instalación de geotextil.
- ✓ Instalación de la membrana PVC
- ✓ Fijación de la membrana.
- ✓ Soldadura termoplástica de la membrana en los traslapos.
- ✓ Fijación de la membrana al antepecho con perfilería y sellado con poliuretano.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Edificio F - Piso 1 – Secretaria de Lavado de Activos:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Desmonte de puertas.
- ✓ Desmonte de divisiones de vidrio.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Demolición de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en fibra mineral.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cenefas de cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Edificio F - Sótano – Secretaria de Extinción de Dominio:**

- ✓ Demolición de muros.
- ✓ Desmonte de luminarias.
- ✓ Desmonte de puertas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- ✓ Desmonte de divisiones de vidrio.
- ✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
- ✓ Demolición de cielo raso.
- ✓ Instalación de tubería eléctrica para iluminación.
- ✓ Cableado de iluminación eléctrica.
- ✓ Resanes de pisos.
- ✓ Instalación de estructura metálica en el vacio.
- ✓ Instalación de estructura para cielo raso en fibra mineral.
- ✓ Instalación de láminas de drywall para cenefas de cielo raso.
- ✓ Resane de muros.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Edificio H – Piso 1 – DAUITA:**

- ✓ Desmonte de puestos.
- ✓ Retiro de piso vinílico.
- ✓ Aplicación de mastico.
- ✓ Aplicación de pegante.
- ✓ Instalación de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guarda escoba.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

- o **Edificio H – Piso 1 – Secretaria de la Corte:**

- ✓ Desmonte de puestos.
- ✓ Desmonte de vidrios templados.
- ✓ Desmonte de puertas en vidrio.
- ✓ Instalación de divisiones de vidrio templado.
- ✓ Instalación de puertas en vidrio.
- ✓ Retiro de piso vinílico, para cenefas.
- ✓ Aplicación de mastico.
- ✓ Aplicación de pegante.
- ✓ Instalación de cenefas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de soldadura de juntas de piso vinílico.
- ✓ Instalación de guarda escoba.
- ✓ Pintura de muros.
- ✓ Retiro de escombros.
- ✓ Aseo y limpieza general.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- **Edificio T – Segundo piso – Investigaciones CTI:**

✓ Demolición de muros en dry wall.
✓ Desmonte de puestos de trabajo.
✓ Desmonte de divisiones de SOA.
✓ Desmonte de luminarias.
✓ Desmonte de puertas.
✓ Desmonte de instalaciones eléctricas.
✓ Desmonte de piso.
✓ Resanes de pisos.
✓ Resane de muros.
✓ Retiro de escombros.
✓ Aseo y limpieza general.

- **Edificio F – Primer Piso – Sala de Audiencias:**

✓ Demolición de Enchape.
✓ Desmonte de aparatos sanitarios.
✓ Desmonte de luminarias.
✓ Resane de muros.
✓ Pintura de muros.
✓ Retiro de escombros.
✓ Aseo y limpieza general.

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

| ASPECTOS A VERIFICAR | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | Se están llevando a cabo los ítems contractualmente adquiridos cumpliendo con las especificaciones técnicas | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | | | El contrato no cuenta con una cantidad definida por ítem contractual, sin embargo, se ejecutan los ítems contenidos en el presupuesto y las cantidades son revisadas y avaladas por la Interventoria | X |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | X | | Se están ejecutando las actividades pactadas | |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | Las actividades ejecutadas | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | El contrato no contempla este tipo de actividad | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | El contrato no contempla este tipo de actividad | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | X | | Se entregan los espacios a entera satisfacción | |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | | | No aplica este tipo de actividades | X |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | Se han llevado a cabo las entregas de acuerdo con lo acordado | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | X | | El contratista ha cumplido con el recurso humano requerido | |

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

- ✓ Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente los planos y las especificaciones técnicas dispuestas por la Entidad

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, los cuales serán suministrados por el supervisor del contrato.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Verificar las medidas y cotas: se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del CONTRATISTA el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá ser consultada por escrito al Supervisor y/o Interventoría en forma oportuna para no retrasar el cronograma de la obra.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Observación de la Supervisión:

De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Inspeccionar el lugar de la obra, para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para mitigarlas.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con las actividades ejecutadas el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Elaborar el plan de control de calidad y ensayos, el cual establece los procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente. Incluye la realización de pruebas de redes, control de soldaduras; demás pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad de cada una de las partes de la obra. El cual deberá entregar a la Interventoría dentro de los diez (10) días calendario; posteriores a la suscripción del acta de inicio. Entregando las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por parte del Supervisor y/o Interventoría para su respectiva aprobación y posterior adquisición.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 entrego el plan de control de calidad y ensayos.

✓ Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad con las especificaciones técnicas.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 ha suministrado los materiales necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas.

✓ Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor y/o Interventoría del contrato.

Observación de la Supervisión:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 a acatado las observaciones y recomendaciones impartidas por parte de la supervisión.

- ✓ Dar cumplimiento a las aprobaciones y exigencias del Supervisor y/o Interventoría, sobre los materiales. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las exigencias requeridas en las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Elaborar y entregar una vez finalizada la obra, el original impreso y en medio magnético de los planos RECORD de la misma.

  Observación de la Supervisión:

  Teniendo en cuenta que las obras no han finalizado, aun no se cuenta con los planos RECORD.

- ✓ Elaborar y entregar un plan de trabajo y cronograma, para el inicio de las obras previa aprobación del Supervisor y/o Interventoría, incluyendo balance del presupuesto de obra con base en la propuesta económica y la revisión de cantidades de obra dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 entrego plan de trabajo cumpliendo así con lo contractualmente adquirido.

- ✓ Informar oportunamente a la interventoría en caso de requerir acompañamientos o conceptos técnicos.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIUONES CST 25 ha cumplido con lo descrito en la obligación.

- ✓ Dar respuesta a toda información que requiera al FEAB- Fiscalía o la interventoría, de tipo financiero, técnico, administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato y su

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

objeto. La información que se presente deberá ser clara, certera y debidamente soportada, en caso de que haya lugar a ello.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con lo estipulado el contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 ha cumplido con lo descrito en la obligación.

✓ Entregar oportunamente a la interventoría la información completa de todas las áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Salvaguardar y custodiar, bajo su entera responsabilidad los bienes de su propiedad; utilizados para la ejecución del contrato.

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, punto de almacenamiento temporal de RCD, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura circulación del personal de obra y terceros

Observación de la Supervisión:

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

✓ Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla con las especificaciones establecidas y/o las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Observación de la Supervisión:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades diarias. La cual debe encontrarse debidamente foliada. Las primeras páginas se reservarán para el registro de las firmas del personal directivo del contratista y de la interventoría, con nombre y cargo. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, la interventoría y los profesionales de apoyo del FEAB - Fiscalía.

  Observación de la Supervisión:

  El contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 lleva la bitácora de la obra en la cual se describen todos los acontecimientos ocurridos y las decisiones tomadas hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Retirar, de la obra los equipos y maquinaria que no se encuentre en buen estado de funcionamiento o que por sus deficiencias represente un riesgo para la seguridad de los trabajadores, así como el retiro de equipos y elementos que no se requieran para la ejecución de la obra. De acuerdo con las solicitudes que en tal sentido le realice la Interventoría.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

- ✓ Asumir la responsabilidad de la calidad de la obra. Para cumplir esta obligación, implementará el plan de gestión de calidad correspondiente para asegurar la calidad de los materiales y de las obras de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas tanto en los estudios técnicos del proyecto, como de las prevalentes en normas técnicas vigentes en Colombia o las subsidiarias de organismos internacionales. Para el efecto, presentará al interventor el plan de gestión calidad para aprobación, con el correspondiente acápite "Plan de control de calidad", incluyendo fichas técnicas y certificados de calidad de los diferentes materiales a utilizar. El certificado de calidad es requisito indispensable para la aprobación del uso del material y/o equipos.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se presentó, reviso y avalo el Plan de gestión de calidad el cual

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

se viene implementando durante la ejecución de las actividades y garantizando su cumplimiento.

- ✓ Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. El contratista deberá proteger materiales, equipos y demás elementos, contra daños y deterioro, y realizar adecuada manipulación y almacenamiento de estos.

  Observación de la Supervisión:

  De conformidad con el avance del contratista de obra CONSORCIO REMODELACIONES CST 25 y hasta la fecha, se observa el cumplimiento de esta obligación.

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- ✓ Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- ✓ Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- ✓ Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- ✓ Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- ✓ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informes anexos** | ○ SI | ◉ NO | ○ N/A |
| **Tipo y detalle del informe**: | | | |
| **5.1. El contratista "CUMPLIÓ"** | ◉ **Si cumplió** | ○ **No cumplió** | |
| Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento) | | | |
| Pulse aquí para escribir la justificación. | | | |

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato de obra FGN-NC-0078-2024, que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| I | PRELIMINARES | | | |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1,1** | Demolición muros en mampostería | M2 | 1,00 | 90,17 |
| **1,2** | Desmonte de manto asfaltico existente | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **1,3** | Demolición de mortero de nivelación existente | M2 | 1,00 | 92,46 |
| **1,4** | Demolición de medias cañas | ML | 1,00 | 68,65 |
| **1,5** | Desmonte de domos acrílicos | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,6** | Desmonte de equipos de extracción | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,7** | Demolición de piso existente | M2 | 1,00 | 878,86 |
| **1,8** | Desmonte de guarda escoba | ML | 1,00 | 294,46 |
| **1,9** | Demolición muros en Dry wall | M2 | 1,00 | 37,26 |
| **1,1** | Demolición de cielo raso | M2 | 1,00 | 1265,70 |
| **1,11** | Desmonte de marcos y puertas | UN | 1,00 | 37,00 |
| **1,12** | Regata instalación sanitaria | ML | 1,00 | 0,00 |
| **1,13** | Sellamiento punto hidráulico | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,14** | Sellamiento punto sanitario | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,15** | Desmonte de puesto de trabajo | UN | 1,00 | 111,00 |
| **1,16** | Montaje de puesto de trabajo | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,17** | Desmonte de divisiones de oficina abierta | M2 | 1,00 | 480,89 |
| **1,18** | Desmonte de unidades de archivo rodante | UN | 1,00 | 24,00 |
| **1,19** | Montaje de unidades de archivo rodante | UN | 1,00 | 0,00 |
| **1,2** | Desmonte de Sanitario | UN | 1,00 | 7,00 |
| **1,21** | Desmonte de lavamanos | UN | 1,00 | 7,00 |
| **1,22** | Desmonte de orinal | UN | 1,00 | 3,00 |
| **1,23** | Desmonte de divisiones de baño | M2 | 1,00 | 20,09 |
| **1,24** | Demolición de mesón | ML | 1,00 | 16,68 |
| **1,25** | Demolición de enchape | M2 | 1,00 | 96,97 |
| **1,26** | Demolición de pisos baños | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **1,27** | Desmonte de piso vinílico | M2 | 1,00 | 388,55 |
| **1,28** | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 1,00 | 45,43 |
| **1,29** | Desmonte de secador de manos | UN | 1,00 | 1,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,30 | Cerramiento provisional (poli sombra y parales de madera) | M2 | 1,00 | 322,84 |
| 1,31 | localización y replanteo | M2 | 1,00 | 987,59 |
| 1,32 | Desmonte de muebles de cocina | ML | 1,00 | 0,94 |
| 1,33 | Desmonte de parlantes | UN | 1,00 | 0,00 |
| 1,34 | Desmonte de detectores de humo | UN | 1,00 | 0,00 |
| 1,35 | Desmonte de salida de voz y datos | UN | 1,00 | 41,00 |
| 1,36 | Desmonte de salida eléctrica normal y regulada | UN | 1,00 | 61,00 |
| 1,37 | Retiro de cableado eléctrico y UTP | ML | 1,00 | 1236,82 |
| 1,38 | Demolición de pañete | M2 | 1,00 | 85,54 |
| 1,39 | Demolición de poyo | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 1,40 | Demolición de placa | M2 | 1,00 | 80,76 |
| 1,41 | Desmonte de ventanas | UN | 1,00 | 0,00 |
| 1,42 | Regata tubería eléctrica | ML | 1,00 | 0,00 |
| 1,43 | Demolición y trasiego de placas prefabricadas en concreto | UN | 1,00 | 105,00 |
| 1,44 | Demolición y trasiego de soportes de placas prefabricadas en concreto | UN | 1,00 | 80,00 |
| 1,45 | Desmonte de canaleta metálica | ML | 1,00 | 265,89 |
| 1,46 | Desmonte de tubería metálica PVC, IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4" | ML | 1,00 | 1386,79 |
| 1,47 | Desmonte de salida de interruptor de alumbrado | UN | 1,00 | 29,00 |
| 1,48 | Desmonte de tablero eléctrico existente de 30 circuitos. Incluye identificación de circuitos | UN | 1,00 | 2,00 |
| II. | **MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA** | | | |
| 2,1 | Muro en Dry wall doble cara de 0.12 (insonorizado con frescasa) | M2 | 1,00 | 282,35 |
| 2,2 | Dintel en Dry wall reforzado con madera | ML | 1,00 | 18,92 |
| 2,3 | Muros en mampostería bloque No.5 | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 2,4 | Placas en concreto de 10 cms de espesor, incluye refuerzo | M2 | 1,00 | 12,39 |
| 2,5 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | 1,00 | 99,48 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 | Pañetes caras lineales | ML | 1,00 | 0,00 |
| 2,7 | Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4 | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 2,8 | Suministro e instalación de muro en Superboard | M2 | 1,00 | 6,77 |
| 2,9 | Suministro e instalación de placas de concreto con acabado en granito 60x120 cm incluye pedestales de soporte en concreto | UN | 1,00 | 0,00 |
| III. | **IMPERMEABILIZACIONES** | | | |
| 3,1 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en poliurea en frio, para tráfico pesado | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 3,2 | Suministro e instalación de manto asfáltico 4 mm con alma central de polietileno de alta densidad sin foil | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 3,3 | Destrocado de superficie para retiro de material bituminoso y exposición de placa | M2 | 1,00 | 303,58 |
| 3,4 | Sello de fisuras y discontinuidades | ML | 1,00 | 133,75 |
| 3,5 | Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.60 mts | ML | 1,00 | 0,00 |
| 3,6 | Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.30 mts | ML | 1,00 | 0,00 |
| 3,7 | Suministro y aplicación de boquilla con mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 3,8 | Suministro y aplicación de impermeabilizante al frio sikafill 300 thermic o similar | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 3,9 | Suministro y aplicación de poliuretano elastomerico en goteros, uniones de concreto | ML | 1,00 | 841,83 |
| 3,10 | Suministro y aplicación de hidrofugo impermeabilizante Sika transparente 10 o similar | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 3,11 | Suministro e instalación de membrana en PVC de 1200 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | M2 | 1,00 | 935,25 |
| 3,12 | Suministro e instalación de membrana en PVC de 1500 micras, reforzada con poliéster antideslizante, resistente a rayos UV. Incluye remates necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | M2 | 1,00 | 0,00 |
| IV. | **CARPINTERIA METALICA Y MADERA** | | | |
| 4,1 | Suministro e instalación de bisagra hidráulica | UN | 1,00 | 0,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,2 | Puntos de anclaje | UN | 1,00 | 0,00 |
| 4,3 | Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20 | UN | 1,00 | 0,00 |
| 4,4 | Suministro e instalación de puerta en madera de .80 a .1,00 x 2.20 | UN | 1,00 | 0,00 |
| 4,5 | Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolled de .90 a 1.20 x 2.20 | UN | 1,00 | 0,00 |
| 4,6 | Suministro e instalación de película samblasting | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 4,7 | Mueble alto en madera y formica | ML | 1,00 | 0,00 |
| 4,8 | Mueble bajo en madera y formica | ML | 1,00 | 0,00 |
| 4,9 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 4,1 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable | ML | 1,00 | 0,00 |
| 4,11 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 1,00 | 0,00 |
| 4,12 | Suministro e instalación de enchape de muro elaborado en MDF de 9mm recubierto en laminado de alta presión FB con dilataciones en formica negra. | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 4,13 | Suministro e instalación de pasamanos en tubo redondo cold rolled cal 18 * 2", incluye soporte metálico con tornillería anclada a paral existente, pintura electroestática color a elegir | ML | 1,00 | 0,00 |
| 4,14 | Suministro e Instalación de ventana en sistema proyectante, marco general ALN 174, Nave movible ALN 176, pisavidrio plano ALN 177, empaques de neopreno, 2 brazos de 8" en acero inoxidable y manija en aluminio anodizado mate. Vidrio laminado 3+3 incoloro | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 4,15 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio anodizado al natural 100%. Ref. 5020 Incluye vidrio laminado 3+3, empaques, cerraduras de impacto. | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 4,16 | Suministro e instalación de estructura metálica incluye anticorrosivo y esmalte | Kg | 1,00 | 1133,36 |
| V. | **PISOS Y ENCHAPES** | | | |
| 5,1 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 | M2 | 1,00 | 68,68 |
| 5,2 | Media Caña en mortero impermeabilizado 1:3 | ML | 1,00 | 5,86 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5,3** | Alistado de piso mortero 1:4 | M2 | 1,00 | 365,17 |
| **5,4** | Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,5** | Cerámica para muro de 30 x 60 cm, rectificado | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,6** | Bocapuerta en granito lavado | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,7** | Suministro e instalación de cerámica para exterior 60x60, antideslizante | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,8** | Suministro e instalación de piso vinílico de tráfico alto | M2 | 1,00 | 190,06 |
| **5,9** | Suministro e instalación de guarda escoba en vinilo | ML | 1,00 | 127,07 |
| **5,10** | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico) | M2 | 1,00 | 190,06 |
| **5,11** | Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato de 10 cms de alto | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,12** | Suministro e instalación de porcelanato de 60*60 cms, semimate, trafico alto. | M2 | 1,00 | 62,17 |
| **5,13** | Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,14** | Media Caña en granito pulido 0.30 m | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,15** | Suministro e instalación de guarda escoba en madera forrado en melaminico | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,16** | Suministro e Instalación Piso Laminado Tipo Click revestido en PVC, Trafico 33 Ref. 133212 o similar | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,17** | Suministro e Instalación de lámina en Super board de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mts , incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalación y funcionamiento. | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,18** | Suministro e instalación de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura y niveladores | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,19** | Suministro e instalación de cinta antideslizante | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,2** | Resane de piso con granito pulido similar al existente | ML | 1,00 | 0,00 |
| **5,21** | Pulida de Piso en Granito | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **5,22** | Suministro e instalación Media Caña en granito pulido 0.30 m | ML | 1,00 | 0,00 |
| **VI.** | **PINTURAS Y ACABADOS** | | | |
| **6,1** | Pintura en vinilo tipo Koraza | M2 | 1,00 | 0,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6,2 | Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos) | M2 | 1,00 | 597,01 |
| 6,3 | Pintura antihumedad | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,4 | Estuco | M2 | 1,00 | 177,45 |
| 6,5 | Pintura epóxica | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,6 | Pintura bajo placa | M2 | 1,00 | 457,43 |
| 6,7 | Pintura de muros en esmalte 3 manos, mate | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,8 | Pintura de puertas en esmalte 3 manos | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,9 | Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos | ML | 1,00 | 0,00 |
| 6,10 | Pintura en esmalte para guardaescoba | ML | 1,00 | 0,00 |
| 6,11 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano | M2 | 1,00 | 133,61 |
| 6,12 | Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60 | M2 | 1,00 | 610,34 |
| 6,13 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry wall plano antihongos | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,14 | Suministro e instalación de cenefas en Dry wall ancho hasta 0,60 m | ML | 1,00 | 103,50 |
| 6,15 | Suministro e instalación de cenefas en Dry wall antihongos, ancho hasta 0,60 m, para zonas húmedas | ML | 1,00 | 0,00 |
| 6,16 | Suministro e instalación de cielo raso en lámina metálica perforada 60x60 | M2 | 1,00 | 41,31 |
| 6,17 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura y mediacaña | M2 | 1,00 | 0,00 |
| 6,18 | Papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 1,00 | 0,00 |
| VII. | **ADECUACION DE ACOMETIDAS PARCIALES** | | | |
| 7,1 | Desmonte de acometida de longitud de 100 metros existente en cable de cobre THWN, calibre 2x(3 # 300 MCM) | ML | 1,00 | 0,00 |
| 7,2 | Suministro e instalación de acometida de longitud de 100 metros en cable de cobre THHN-THWN-2, calibre 2x(3 # 300 MCM) | ML | 1,00 | 0,00 |
| 7,3 | Medición del nivel de aislamiento de la acometida instalada y presentación de informe | UN | 1,00 | 0,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7,4** | Desmonte de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA existente | UN | 1,00 | 0,00 |
| **7,5** | Suministro e instalación de breaker industrial graduable de corriente nominal 3x400 amperios y corriente de cortocircuito 35 KA | UN | 1,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **ADECUACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y RED DE VOLTAJE** | | | |
| **8,1** | Desmonte de luminarias existentes de diferentes dimensiones, incluye retiro de cableado y resane de puntos | UN | 1,00 | 282,00 |
| **8,2** | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2". | ML | 1,00 | 1108,31 |
| **8,3** | Suministro e instalación de tubería Conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4" | ML | 1,00 | 0,00 |
| **8.4** | Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 1/2". | ML | 1,00 | 0,00 |
| **8.5** | Suministro e instalación de tubería PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes de Ø 3/4". | ML | 1,00 | 0,00 |
| **8,6** | Suministro e instalación de cableado por tubería o canaleta o bandejas, para los circuitos de tomas de voltaje, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | 1,00 | 0,00 |
| **8,7** | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | UN | 1,00 | 0,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8,8** | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en cable de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1,00 | 297,00 |
| **8,9** | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en cable de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | 1,00 | 0,00 |
| **8,10** | Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diámetro 8", tipo Código P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida útil mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **8,11** | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 40W, 6000°K, tipo Código P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida útil mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar o colgar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane, caja. | UN | 1,00 | 22,00 |
| **8,12** | Suministro e instalación de Sensor de Movimiento Dual infrarrojo para control de alumbrado, 360º de techo, carga máxima 400W incandescente y 200W ahorrador fluorescente a 120V; distancia de detección máxima 6 metros; tiempo de operación ajustable de 10 segundos a 7 minutos; altura de instalación de 2.20 a 4 metros, caja. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **8,13** | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaria tipo LED 60X60 cielo raso plano en Dry wall. | UN | 1,00 | 8,00 |
| **8,14** | Suministro e instalación luminaria spot led con base tipo riel 6500K 10 W | UN | 1,00 | 0,00 |
| **8,15** | Suministro e instalación de luminaria de emergencia voltaje 120VAC, autonomía de 90 minutos. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#16 AWG hasta la salida; tornillos, fijación y resanes. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **IX.** | **ADECUACION DE INTERRUPTORES DE ALUMBRADO** | | | |
| **9,1** | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. incluye cajas, cableado en alambre de Cu | UN | 1,00 | 16,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores. | | | |
| **9,2** | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye caja, incluye cajas, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 1,00 | 1,00 |
| **9,3** | Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye caja, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **9,4** | Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **9,5** | Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **9,6** | Suministro e instalación de interruptor triple. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye tornillos, conectores. | UN | 1,00 | 0,00 |
| **X.** | **REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | |
| **10,1** | Punto de agua fría de ½" | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,2** | Acometida en pvcp de 1", incluye accesorios, soportes regatas, | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,3** | Acometida en pvcp de 1/2" incluye accesorios, soportes regatas, | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,4** | Punto de agua fría PVCP 1" | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,5** | Registro de 1" | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,6** | Reventilacion PVC 3" | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,7** | Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,8** | Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,9** | Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,1** | Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,11** | Suministro e instalación de orinal institucional | UN | 1,00 | 0,00 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10,12** | Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,13** | Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,14** | Suministro e instalación de sanitario tipo avanti ahorrador o similar | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,15** | Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti ahorrador o similar de pedestal | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,16** | Suministro e instalación de grifería con sensor para lavamanos | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,17** | Suministro e instalación de grifería de lavamanos | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,18** | Tubería sanitaria PVC 4" | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,19** | Tubería sanitaria PVC 3" | ML | 1,00 | 0,00 |
| **10,2** | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,21** | Suministro e Instalación grifería sensor fluxómetro orinal | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,22** | Suministro e instalación grifería sensor fluxómetro sanitario | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,23** | Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,24** | Suministro e instalación de rejilla en aluminio tipo cúpula | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,25** | Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería de cobre (Inc. Corte, soldadura, accesorios en cobre diam 1/2" a 1 1/2") | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,26** | Suministro e instalación de barra de seguridad tipo L pared piso | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,27** | Suministro e instalación de barra de seguridad plegable para para baño de discapacitados | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,28** | Suministro e instalación de barra fija para baño de discapacitados | UN | 1,00 | 0,00 |
| **10,29** | Suministro e instalación de lavamanos para baño discapacitados | UN | 1,00 | 0,00 |
| **XI.** | **DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO** | | | |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11,1** | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1,00 | 11,86 |
| **11,2** | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, Perfilería en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **11,3** | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfilería en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1,00 | 50,68 |
| **11,4** | Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8mm, incluye samblasting, postes y herrajes de acero inoxidable y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **11,5** | Suministro e instalación de vidrio laminado 4+4, incluye película | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **11,6** | Suministro e instalación de espejos para baños de 4 mm flotado | M2 | 1,00 | 0,00 |
| **XII.** | **ASEO Y LIMPIEZA GENERAL** | | | |
| **12,1** | Aseo y limpieza general | M2 | 1,00 | 835,99 |

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- Dentro de los diferentes recorridos de obra se solicita al contratista contar con mayor número de personal con el fin de mitigar los atrasos que se vienen presentando en los diferentes frentes.
- Mediante radicado No. 20256120010811 del 10 de octubre de 2025, se remite a la Subdirección Financiera, corte de obra No.1, por valor de $ 126.280.584.68.
- 
- Se realiza tramite en la Subdireccion financiera del corte de obra No. 1 por valor de $ 126.280.584.68.
- Mediante radicado No. 20256120004323 del 08 de septiembre de 2025, se remite a la Subdirección de Gestión Contractual acta de inicio del contrato de obra FGN No. 0189 de 2025.
- Mediante radicado No. 20256120009391 del 08 de septiembre de 2025, se remite a la Gerencia del FEAB acta de inicio del contrato de interventoría FEAB No. 011 de 2025.
- Mediante radicado No. 20256120010991 del 17 de octubre de 2025, se remite a la Subdirección Financiera, autorización del Consorcio Remodelaciones CST de descontar el impuesto de timbre del corte de obra No.1.
- Mediante correo electrónico del 08 de octubre de 2025, se remite a la al Consorcio Remodelaciones solicitud de programaciones por frentes de trabajo.
- Mediante radicado No. 20256120011191 del 22 de octubre de 2025, se remite a la Subdirección Financiera, corte de interventoría No. 1, por valor de $ 72.593.766.59
- Mediante radicado No. 20256120011211 del 22 de octubre de 2025, se remite a la Gerencia del FEAB informe de interventoría No.1 del contrato de interventoría FEAB No. 011 de 2025.
- Mediante radicado No. 20256120011221 del 22 de octubre de 2025, se remite a la Gerencia del FEAB informes semanales de interventoría del 1 al 4 del contrato de interventoría FEAB No. 011 de 2025.
- Mediante radicado No. 20256120005683 del 24 de octubre de 2025, se remite a la Subdirección de Gestión Contractual documentos del contrato de obra FGN No. 0189 de 2025.cListado de materiales, listado de herramientas, listado de transporte, listado de mano de obra, análisis de AIU.
- Mediante correo electrónico del 08 de octubre de 2025, se remite al Consorcio TG y Consorcio Remodelaciones, los planos arquitectónicos de los pisos 3 y 4 del edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite plano definitivo del diseño del segundo piso del edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio TG y Consorcio Remodelaciones, el plan de emergencias del Bunker.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio TG y Consorcio Remodelaciones, plano del segundo piso del edificio Inurbe en autocad.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para conocimiento y respuesta correspondiente, observaciones al balance de obra.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para conocimiento y tramite correspondiente, observaciones a los ítems no previstos.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones y Consorcio TG, plano del sótano del edificio F, secretaria de Extinción de Dominio.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional de la FGN, documentación del personal del contrato FGN – 0189 de 2025 para su revisión y comentarios.
- Mediante correo electrónico del 09 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, aprobación de los APUS contractuales.
- Mediante correo electrónico del 10 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones y Consorcio TG, fechas de inducción SG-SST para contratistas por parte de la FGN.
- Mediante correo electrónico del 18 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones y Consorcio TG, plano de iluminación del edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones y Consorcio TG, plano de detalle cielo raso edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y respuesta correspondiente solicitud de aumento de personal operativo en todos los frentes de trabajo.
- Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y respuesta, observaciones realizadas por el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional de la FGN, sobre los documentos SGSST de los contratistas.
- Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y tramite correspondiente, el requerimiento que no se requiere PIN-GEN ambiental.
- Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y tramite correspondiente, documentos de trabajos en espacios confinados.
- Mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento plano actualizado de la planta 2 del edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y respuesta correspondiente, observaciones balance.
- Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, propuesta iluminación Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y fines pertinentes observaciones niveles placa de entrepiso piso 3 edificio Inurbe.
- Mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y fines pertinentes, reiteración para el aumento de personal operativo en todas las sedes y frentes de trabajo.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, para su conocimiento y respuesta inmediata llamado de atención No.1 por bajo rendimiento en la ejecución.
- Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2025, se remite al Consorcio Remodelaciones, plano del 2 piso del edificio T GIE.
- Mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2025, se remite al Grupo de Cuentas para su conocimiento y tramite informando que los documentos del corte No. 1 de obra fueron subidos al SECOP.1 por bajo rendimiento en la ejecución.
- Los informes de interventoría, de obra, hacen parte del presente informe.
- Se realizaron las autorizaciones de ingreso de personal en los diferentes frentes de trabajo.
- Se realizo el acta de fijación de precios de ítems complementarios.
- Informe de supervisión con corte al 12 de noviembre de 2025.
- Se realizo el balance del contrato por frentes de trabajo.
- El presente informe de supervisión se presenta para dar tramite al modificatorio No. 1 del contrato de obra No. FGN-NC-0189 de 2025.

| FIRMA RESPONSABLES | | | |
|---|---|---|---|
| <br>Supervisor | | | |
| **Nombre: Ricardo Rincón Almanza** | | **Cédula: 79.473.487** | |
| | | | |
| **Ciudad** | Bogotá | **Fecha** | 12/11/2025 |

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | **Santiago Rojas Bonilla** |  | **12/11/2025** |
| Revisó | **Geovanny Cely Urrea** | | **12/11/2025** |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**



demolicion de piso existe tercer piso museo fiscalia



demolicion de mjuro existe segundo piso museo fiscalia




pintura el cielo raso primer piso museo fiscalia




Demolicion de enchape existente primer piso museo fiscalia



Demolicion de muro tercer piso museo fiscalia

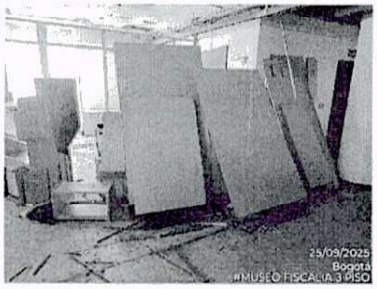


Desmonte modulares

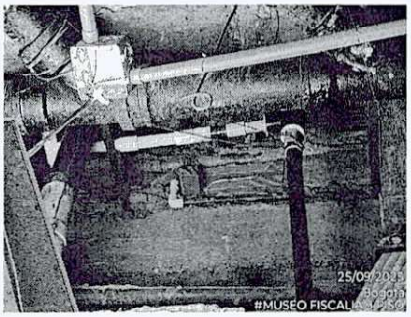

Reparacion de tuberia hidraulica primer piso museo fiscalia



Demolicion de enchape de muros en bao 3 psio museo fiscalia



Recorrido de obra




Uso EPP Interventoria



Protección de mobiliario




Protección de pisos

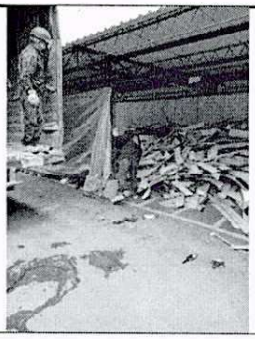

Cargue de residuos




Acopio material residuo

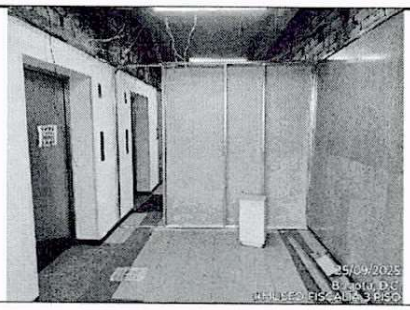

Demarcación de áreas



Orden y aseo áreas de trabajo

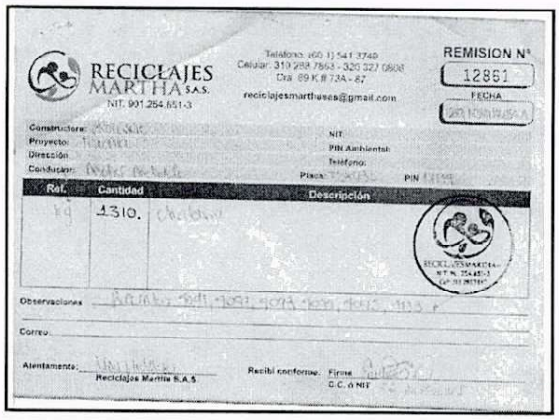

RECICLAJES MARTHA S.A.S.
NIT. 901.254.651-3

Teléfono: (60 1) 541 3749
Celular: 310 288 7863 - 320 327 0808
Dirección: 69 K # 73A - 87
reciclajesmarthaes@gmail.com


REMISION N°
12851
FECHA

Constructora:
Proyecto:
Dirección:
Conductor:
NIT
PIN Ambiental:
Teléfono:
Placa:
PIN


| Ref. | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| | 1310. | |

Observaciones
Correo
Atentamente,
Reciclajes Martha S.A.S
Recibí conforme. Firma
C.C. o NIT

Acta de entrega, residuos reciclables (Chatarra-cielorraso)

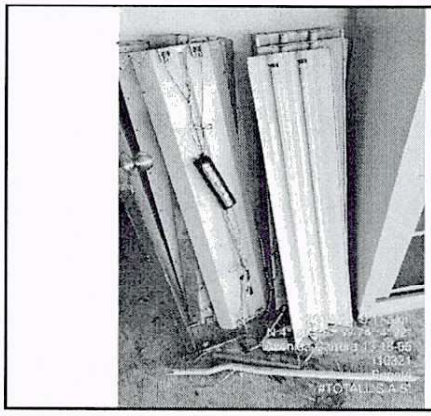

RESPEL y RAEE´S fuera de acopio

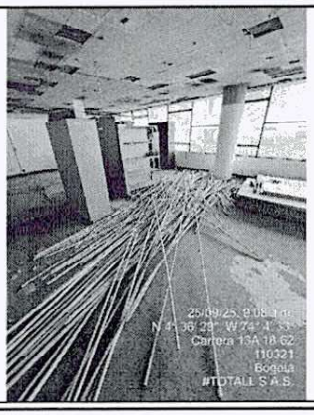


PVC fuera de acopio




Piso vinilico (RESPEL), material reciclable y mobiliario. Residuos fuera de acopio.




RCD y reciclable, inadecuada segregación en acopio.



Inadecuada segregación de material ordinario y RCD

**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**



Himpermeabilización Plataforma





Cómite de obra



Levantamiento piso vinilico auditorio



Retiro y acopio de material plataforma

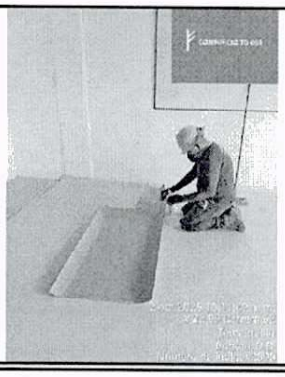

Instalación piso vinilico




Aplicación pintura auditorio



Inurbe - Punto de acopio - Necesidad orden y aseo



Inurbe - piso 2 - Necesidad orden y aseo




Inurbe - piso 2 - trabajo en piso (cemento)



Bunker - Plataforma - punto de acopio




Bunker - Plataforma - acopio de tierra negra

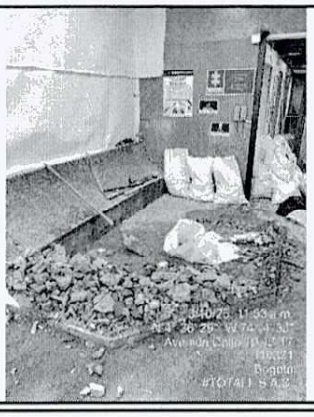

Inurbe - piso 1 - Demolición de recepción

**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**

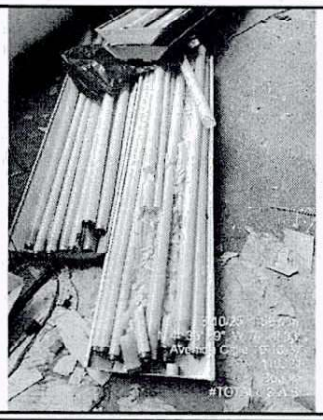

Inurbe - piso 3 - inadecuada manipulación RESPEL



Inurbe - Punto de acopio - RCD



Inurbe - Piso 3 - RCD (orden y aseo)



Inurbe - piso 3 - inadecuada manipulación RESPEL




SEÑALIZACIÓN



USO EPP




USO EPP ADMINISTRATIVOS




USO DE ANDAMIO




SENDERO PEATONAL



ORDEN Y ASEO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**



Retiro y trasiego RCD Materas



Intalación Cerramientos de areas intervenir




Uso de EPP



Orden y Aseo



Socialización a funcionarios Intervenciones Edificio F

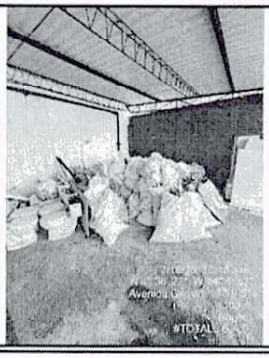

Inurbe - Punto de acopio

**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**



Búnker - Punto de acopio



Búnker - Punto de acopio


**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**





Luminaria rota embalada como RESPEL - Piso 3 INURBE



Demolición porcelanato, Baño - piso 3 - INURBE

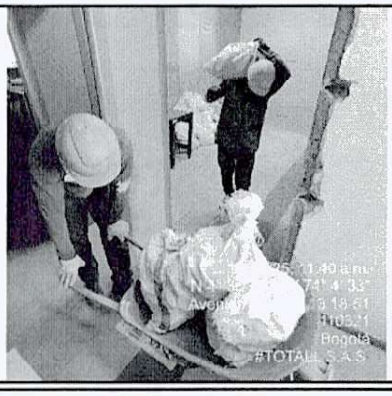

Trasiego RCD - Piso 1 - INURBE

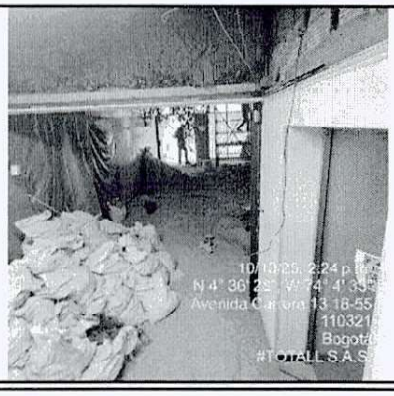


Acopio RCD - Piso 1 - INURBE



Inurbe - Punto de acopio




Inurbe - Punto de acopio

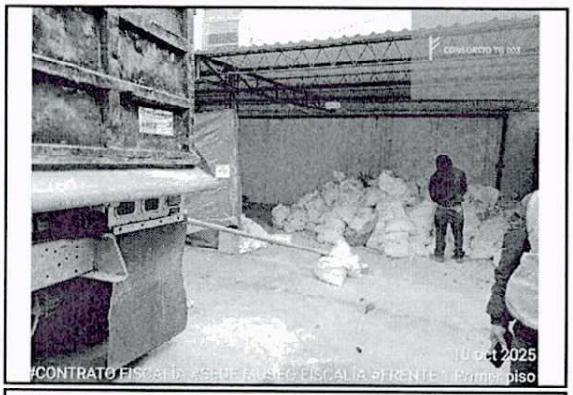

Recolección RCD - INURBE




Finalizacion de pintura en museo

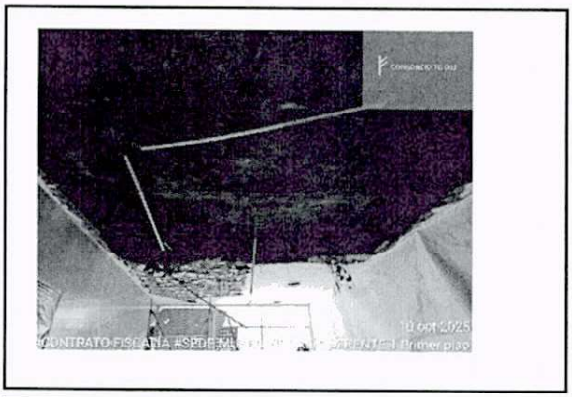

Demolcion d e cielo raso en recepcion




Desmonte




Limpieza de tercer piso




Medicion de espacio piso dos




Acopio de escombro museo fiscalia



Bunker- retiro de tierra y elementos en materas

**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**




Desmonte de cableado electrico




Desmonte de canaleta




Demolicion de enchape




Demolicionde cielo raso





Fundicion de rampa




Instalacion de tuberia emt



Instalacion de puntos de iluminacion

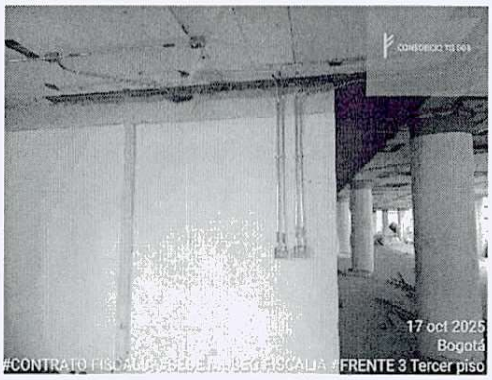


Insatalcionde puntos electricos

**REGISTRO FOTOGRÁFICO PALOQUEMAO**













DEMOLICION VENTILACION LAVADO DE ACTIVOS

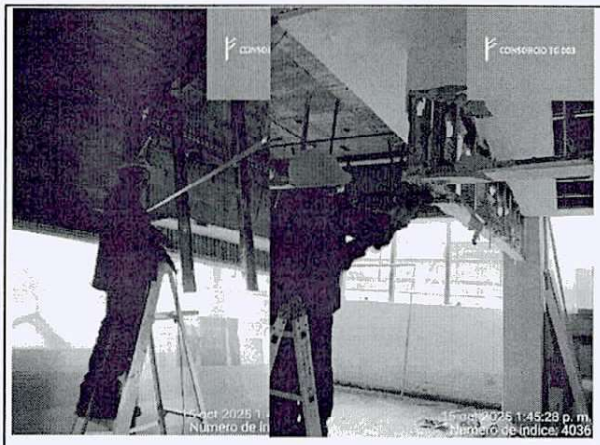



DEMOLICION VENTILACION LAVADO DE ACTIVOS

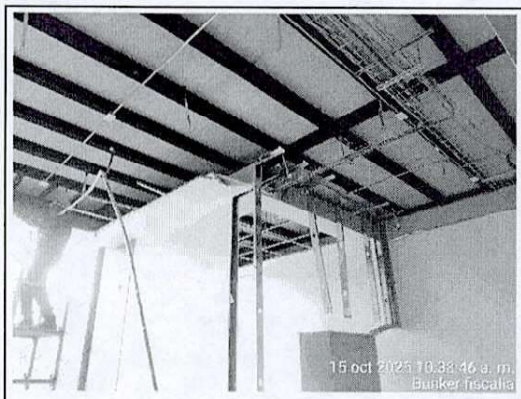


ESTRUCTURA PARA MUROS DRYWALL LAVADO ACTIVOS

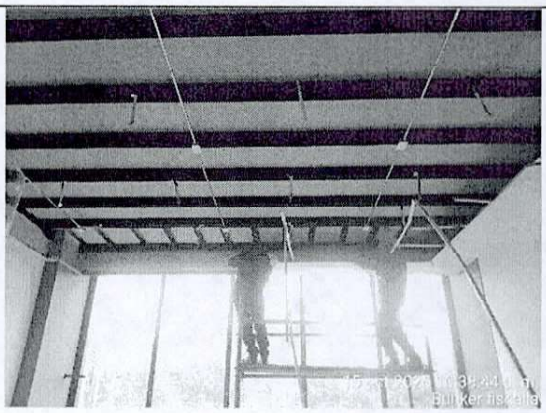

ESTRUCTURA PARA MUROS DRYWALL LAVADO ACTIVOS

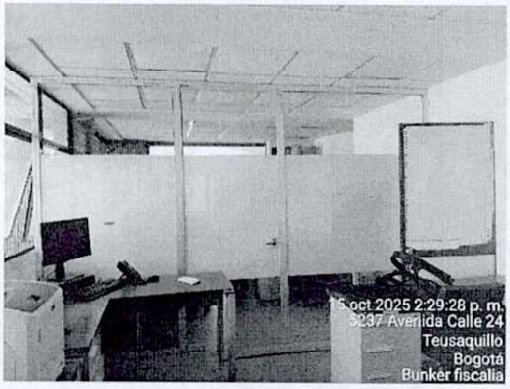


DIVSION VIDRIO CONTROL




DIVSION VIDRIO CONTROL






IMPERMEABILIZACION PLATAFORMA






IMPERMEABILIZACION PLATAFORMA



DIVISION VIDRIO EDIFICIO H PISO3

DIVISION VIDRIO EDIFICIO H PISO3

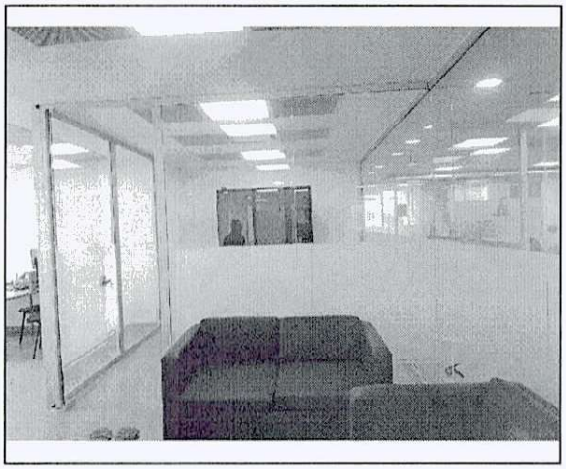

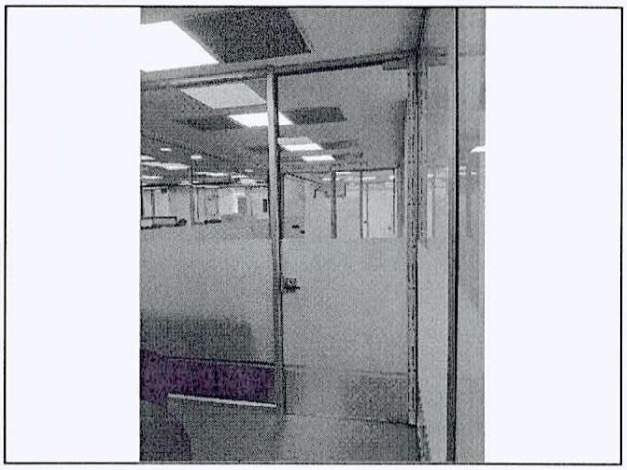


DIVISION VIDRIO EDIFICIO H PISO3 DELEGADA CRIMINALIDAD

DIVISION VIDRIO EDIFICIO H PISO3 DELEGADA CRIMINALIDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE




Tuberia electrica

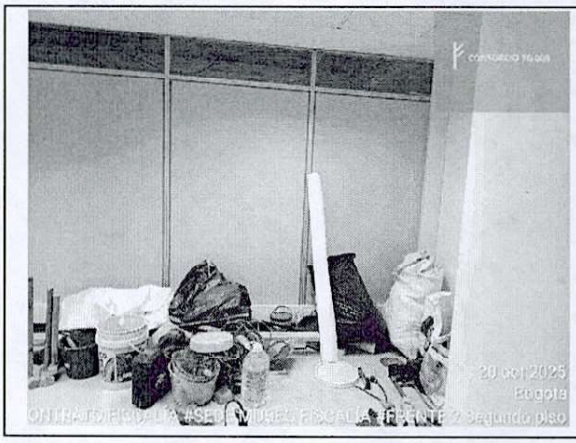


Muro Drywall

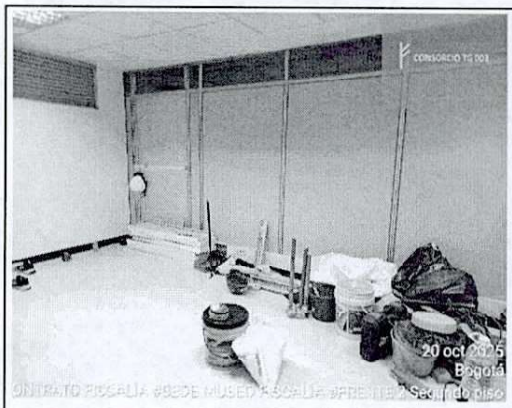


Muro Drywall





Tuberia electrica




alistado de pisos




alistado de pisos

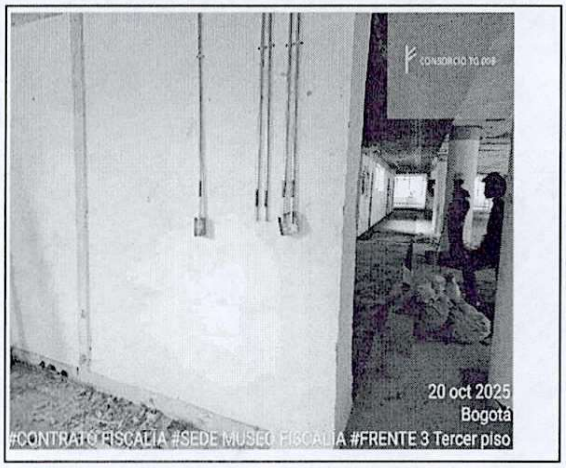


tuberia electrica




material para muros drywall




alistado para pisos




tuberia electrica




material RCD




desmonte cieloraso


**REGISTRO FOTOGRÁFICO PALOQUEMAO**





resanes punto fijo




resanes punto fijo

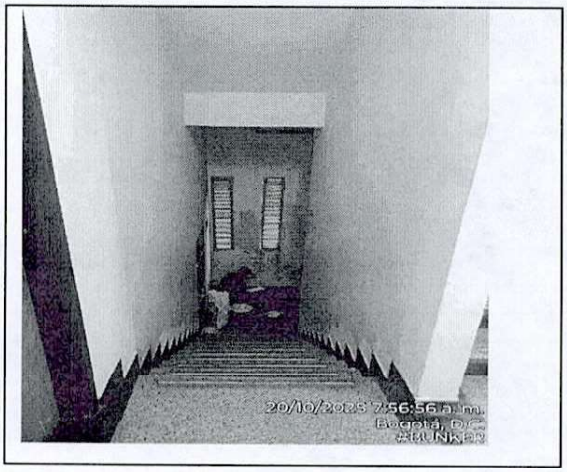



pintura punto fijo

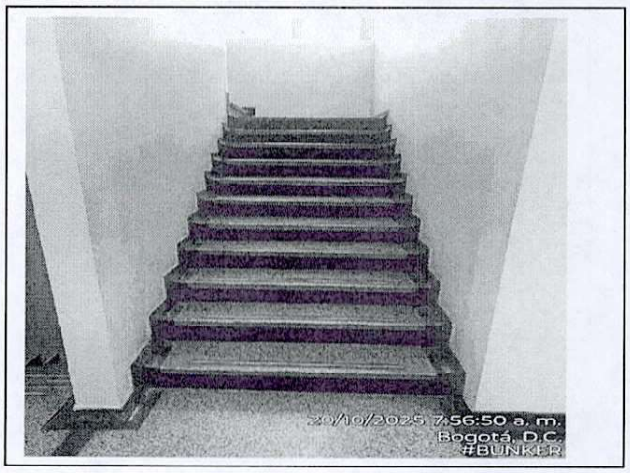



pintura punto fijo

**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**

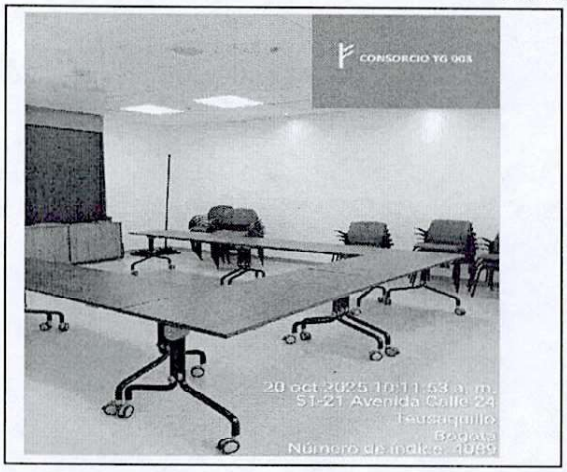


entrega auditorio

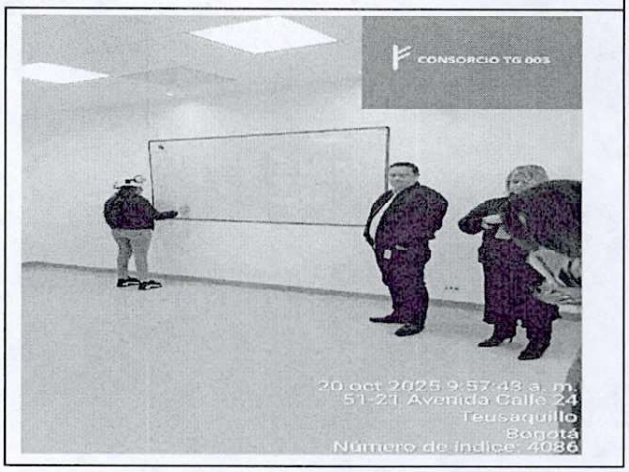


entrega auditorio



desmonte guardaescoba vinilico



desmonte guardaescoba vinilico





destronque piso




destronque piso

**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**

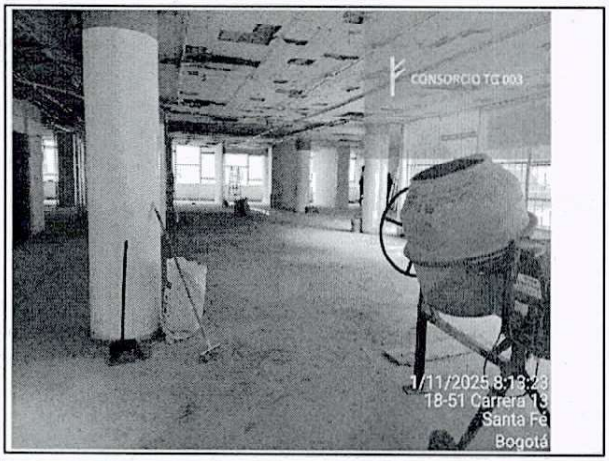


ALISTADO PISO




MODULACION CIELORASO




DESMONTE 4 PISO




DESMONTE 4 PISO




TUBERIA ELECTRICA




ALISTADO PISO





MUROS DRYWALL





MUROS DRYWALL


**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**

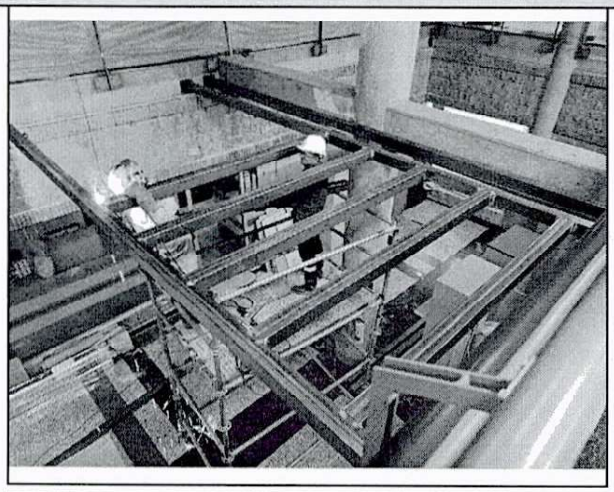


ESTRUCTURA METALICA

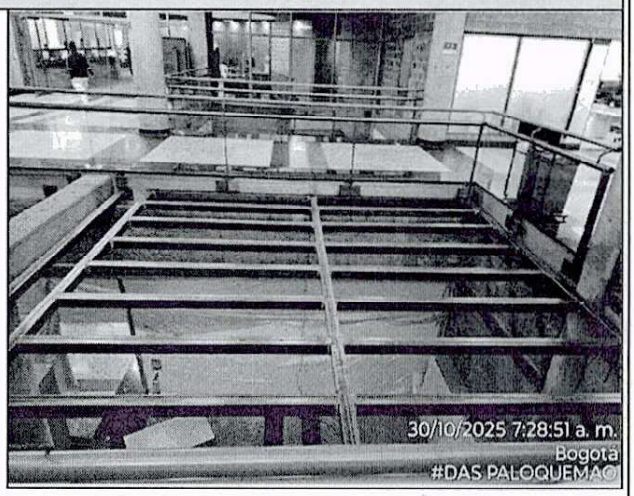



ESTRUCTURA METALICA

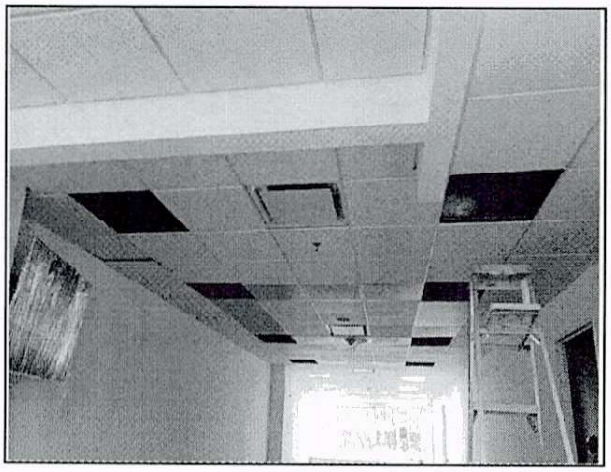

REEMPLAZO LUMINARIAS

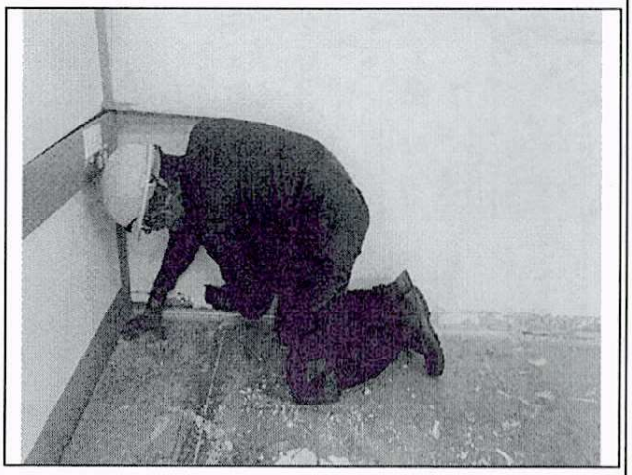

DESMONTE GUARDAESCOBA

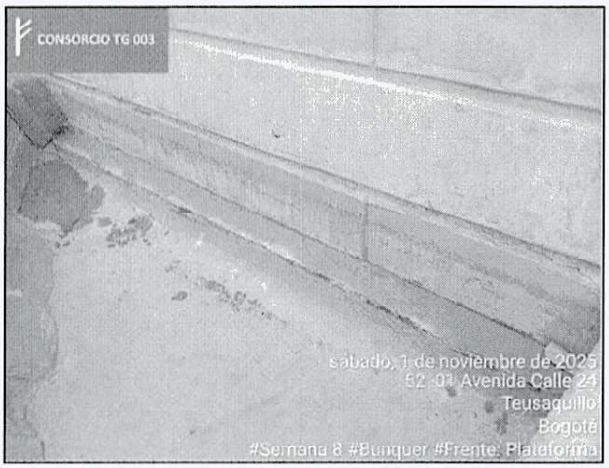



MEDIACAÑA EN MATERA




ALISTADO MATERAS




DIVISION EN VIDRIO

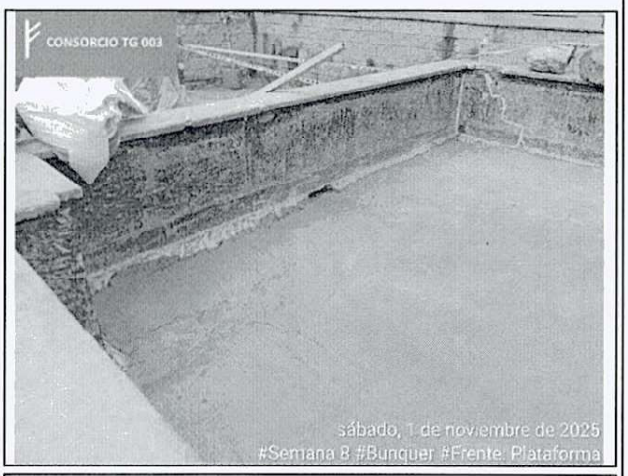


ALISTADO MATERAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO PALOQUEMAO**





DSMONTE CIELORASO




DESMONTE PISO VINILICO





PINTURA VINILO TRAZAS

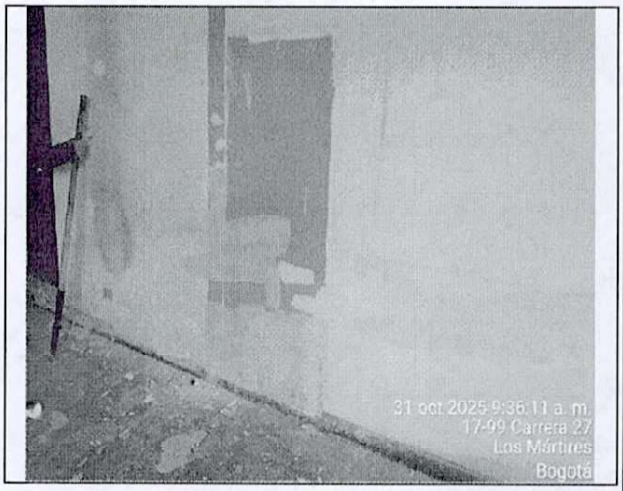


PINTURA VINILO TRAZAS




PINTURA VINILO TRAZAS

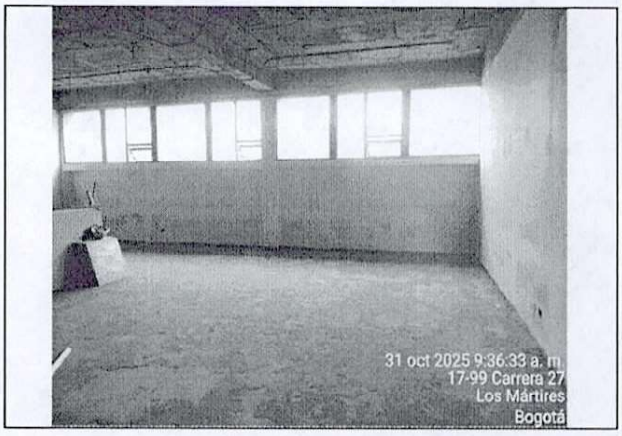


PINTURA VINILO TRAZAS


**REGISTRO FOTOGRÁFICO INURBE**




Desmonte de cielo raso cuerto piso




Desmonte de cielo raso cuerto piso

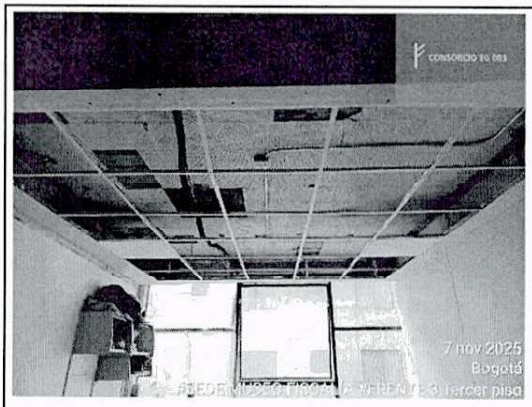


Instalcion de cielo raso 3 piso





Instalacion de muros en drywall 3 piso




Instalacion de cielo raso segundo piso




Instalacion de cielo raso segundo piso

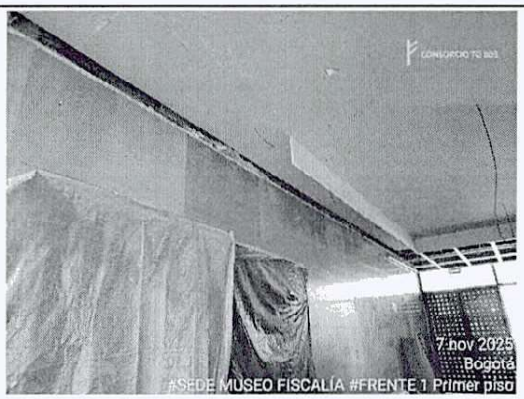



instalacion de cielo raso primer piso





instalacion de cielo raso primer piso


**REGISTRO FOTOGRÁFICO BUNKER**

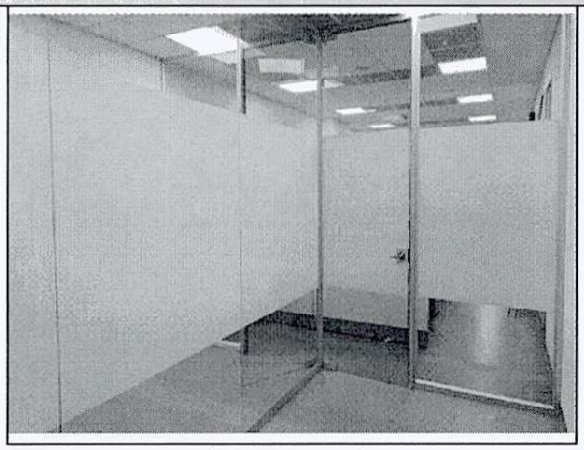

DIVISION DE VIDRIO DAUITA

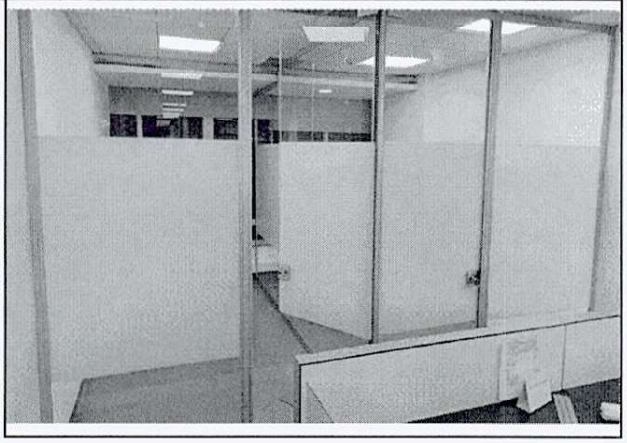


DIVISION DE VIDRIO DAUITA

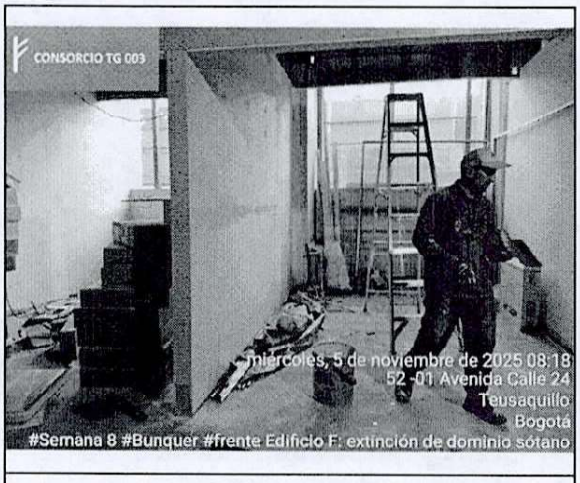


MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO




MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO

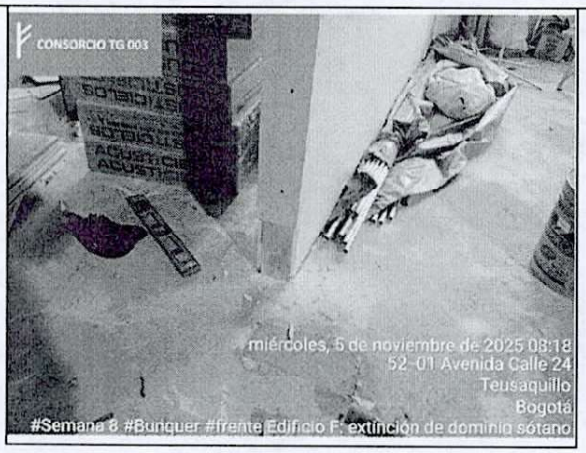


MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO






MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO






**REGISTRO FOTOGRÁFICO PALOQUEMAO**
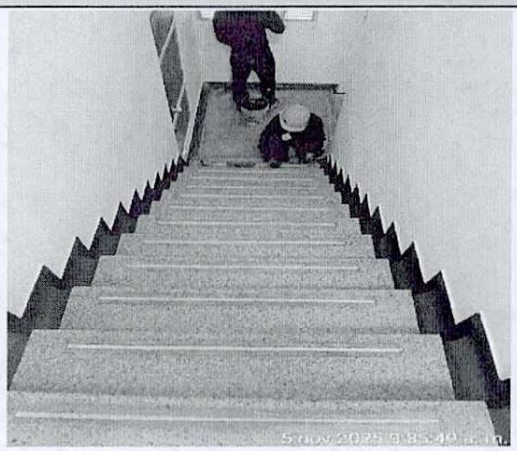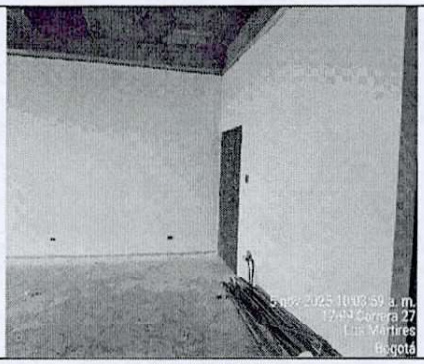
| | |
|---|---|
| MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO | MUROS DRYWALL EXTINCION DOMINO |
|  |  |
| PUNTO FIJO | PUNTO FIJO |
|  |  |
| PUNTO FIJO | PINTURA TRAZAS |
|  |  |
| PINTURA TRAZAS | PINTURA TRAZAS |
