ORDEN DEL DIA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Nº 019 – CONSERVACIÓN ESPACIO PUBLICO - FDLCH
CONTRATO FDLCH-105 DE 2017 - INTERVENTORÍA
CONTRATO FDLCH-100 DE 2017 - CONTRATISTA
Julio 13 de 2018

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoria - FDLCH.
TEMAS A TRATAR: COMITÉ DE SEGUIMIENTO
FECHA: JULIO 13 – 2018 **HORA:** 2:00 PM **ACTA No.:** 019
LUGAR: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Cesar Yomes	RyM	rymcei@yahoo	3153350706	
César Fonseca	CONCON	ccesar7075@hotmail.com	3115922713	
Javier H. Perilla V.	FDLCH	javier.perilla@gobiernobogota.gov.co	3486200	
Alejandra Chaves	RyM	ambientalrym@gmail.com	3185217410	
Carlos Reyes	RyM	espaciopublico105@gmail.com	3123230403	
[illegible]	Consyce SAS	[illegible]	3102273287	
Javier A. Méndez	Interventoria	espaciopublico105@gmail.com	3105586677	
Esperanza Rueda	INTEN.	espaciopublico105@gmail.com	2697427	

- **VERIFICACION DE COMPROMISOS:**

  - Acta Parcial No. 2 – CONTRATISTA
  - Informes Mensuales
  - Presupuestos y APUS
  - Consolidado de Diagnósticos Adicionales
  - Planes de Manejo de Transito Aprobados
  - Ajustes de diseños de Calle 83

2. **TEMAS TÉCNICOS**

   - Estado de los Segmentos.
     - Materiales en Obra
     - Mano de Obra
     - Segmentos a Iniciar
   - Correcciones resultadas de Ensayos de Laboratorio

4. **TEMAS SOCIALES – AMBIENTALES - SISO**

   - Actas de Vecindad corregidas.
   - ~~Observaciones a informes mensuales.~~

5. **TEMAS FDLCH**

6. **TEMAS CONTRATISTA**

Se da inició con verificación de compromisos:
- Acta Parcial el contratista manifiesta que horá la respectiva entrega
- CALLE 76 ENTRE 9 Y 11:
• Se autoriza por parte de FDLCH la colocación de contenedores para árboles, adicional la rehabilitación de sardinel A-10.
- CALLE 74 ENTRE 11-10
• Se realizará confinamiento para contener raices grandes, por lo tanto se realizoró ela modulación pertinente.
- POMPEYANO CALLE 62 CRA 13
• El Contratista manifiesta que aún no se encuentra aprobado el PMT debido a obras de Codensa y contratos IDU.
- CALLE 83 ESCALERAS
• Se recomiendo iniciar desde Cra 1 a Cra 6 con el fin de evitar inconvenientes con la comunidad.


- POMPEYANO CLL 71 CRA 5, se está a la espera de aprobación de PMT por parte de SDM por lo tanto no se ha podido iniciar hasta no tener aprobación.

- ANDEN CLL 88 CRA 13 - CRA 14, ya se cuenta con señales instaladas por lo tanto se iniciará la próxima semana.

- ANDEN CLL 70 CRA 12 - CRA 14, se autoriza por parte del FDLCH realizar la rehabilitación de sardinel A-10, con el fin de dar estabilidad.

- DIAGNOSTICOS TRAMOS ADICIONALES: El Contratista manifiesta que el día de hoy se radicó en oficina de Interventoria

- ASPECTOS SOCIAL
  - Los Actas de Vecindad a corregir se encuentra en subsanación por lo tanto se hará la respectiva entrega.

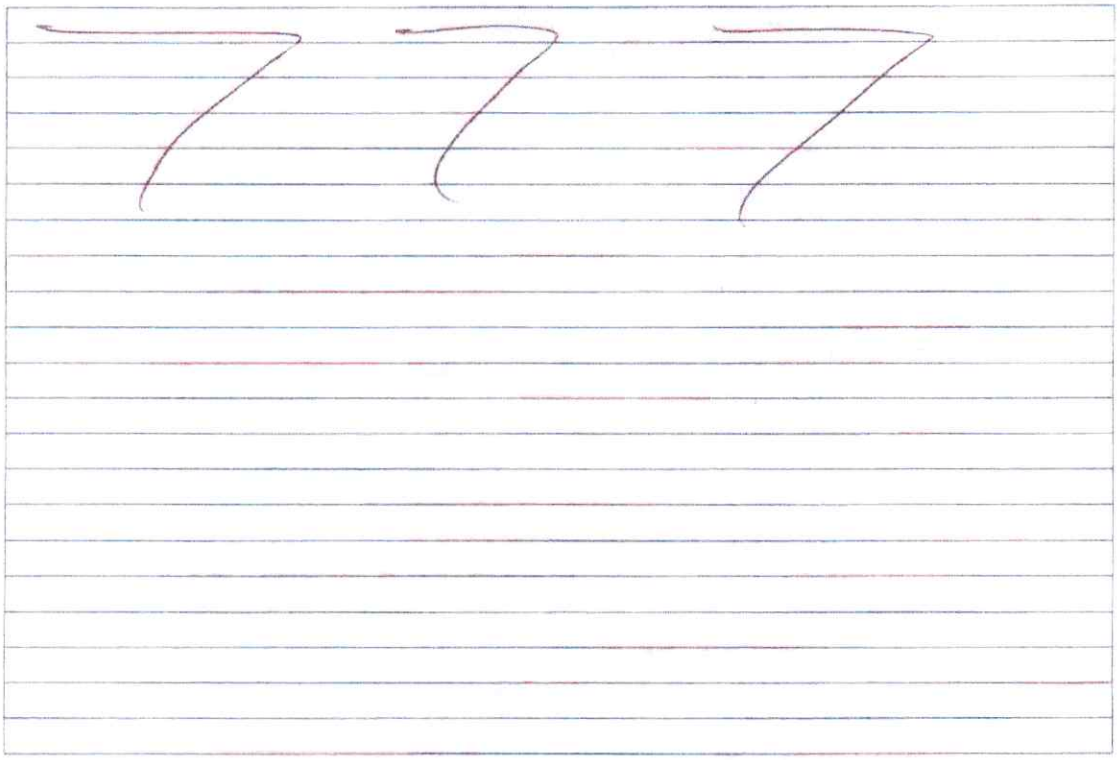

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
01	Presentación Acta Parcial #2	Contratista	16-07-18
02	Solicitud de Prorroga.	Contratista	16-07-18
03	Inicio actividades CLL 88	Contratista.	17-07-18.
04	Vaciado Concreto segmentos	Contratista.	——
05			
06			
07			
09			
10			
11			

Fecha de Próxima Reunión:

Elaborada Por: Javier Méndez
Interventoria

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.

OBRA : CONTRATO No. 100 de 2017

CANTIDADES DE OBRA - ACTUALIZADAS A JULIO 13 DE 2018

CONTRATISTA: CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

INTERVENTOR: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

CANTIDADES DE OBRA DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS Y DISEÑOS

Nº	CIV	PK ID		TIPO DE ELELMENTO	DIRECCIÓN			DIAGNOSTICO	AREA DISEÑOS	TIPO DE INTERVENCION SEGÚN DIAGNÓSTICO	AREA M2 (PLIEGOS)	INDICE INICIAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO SEGÚN DIAGN Y DISEÑOS
		IZQ	DER		EJE	DESDE	HASTA	Calz/Seg	AREA TOTAL (m2)					
1	2000999	X		ANDEN	CALLE 76	CARRERA 9	CARRERA 11	1	[illegible]	RECONSTRUCCION	409.5	$ 239.518,04	$ 98.082.637,38	$ 126.526.117,75
2	2001023	X		ANDEN	CARRERA 9	CALLE 75	CALLE 76	1	[illegible]	RECONSTRUCCION	215.1	$ 239.518,04		
3	2001046	X		ANDEN	CARRERA 9	CALLE 74	CALLE 75	1	[illegible]	RECONSTRUCCION	215,28	$ 239.518,04		
4	2001047		X	ANDEN	CALLE 74	CARRERA 9	CARRERA 10	1	[illegible]	RECONSTRUCCION	159,3	$ 239.518,04	$ 38.155.223,77	$ 48.149.274,69
5	2001030		X	ANDEN	CALLE 74	CARRERA 10	CARRERA 11	1	[illegible]	RECONSTRUCCION	252,9	$ 239.518,04	$ 60.574.112,32	$ 60.614.668,14
6	2001675		X	BAHIA	CALLE 54 A	CARRERA 9		1	386,24	REHABILITACION	358,8	$ 308.724,89	$ 110.770.490,53	$ 127.646.326,04
7	2001596		X	POMPEYANO	CARRERA 13	CALLE 56 BIS		1	[illegible]	REHABILITACION	18	$ 308.724,89	$ 5.557.048,02	$ 3.319.893,19
AD			X	POMPEYANO	CARRERA 13	CALLE 61		1	127,68	REHABILITACION	128		$ -	$ 87.069.057,29
8	2001379		X	POMPEYANO	CARRERA 13	CALLE 62		1	114,55	REHABILITACION	112	$ 308.724,89	$ 34.577.187,68	$ 86.474.600,28
9	2000898		X	ESCALERAS	CALLE 83	CARRERA 6	CARRERA 7	1	125,00	REHABILITACION	341	$ 239.518,04	$ 81.675.651,64	$ 219.930.398,38
10	2000933		X	ESCALERAS	CALLE 83	CARRERA 1	CARRERA 6	1	175,20	REHABILITACION	450,64	$ 239.518,04	$ 107.936.409,55	$ 214.199.075,57
11	2001379	X		ANDEN	CALLE 62	CARRERA 13	CARRERA 13	1	224,64	PERIODICO	177	$ 239.518,04	$ 42.396.655,08	$ 193.825,79
12	2001202		X	POMPEYANO	CALLE 71	DIAGONAL 70 A	CARRERA 5	1	83,81	REHABILITACION	56	$ 308.724,89	$ 17.906.043,62	$ 44.213.144,16
13	2000493	X		ANDEN	CALLE 88	CARRERA 13	CARRERA 14	1	206,40	PERIODICO	225	$ 239.518,04	$ 53.891.559,00	$ 17.469.205,41
14	2001024		X	ANDEN	CARRERA 13	CALLE 72	CALLE 73	1	460,00	PERIODICO	553,5	$ 239.518,04	$ 132.573.235,14	$ 57.275.590,43
15	2001123		X	ANDEN	CALLE 70	CARRERA 12	CARRERA 14	1	840,00	PERIODICO	609,75	$ 239.518,04	$ 146.046.124,89	$ 47.152.345,04
16			N	ANDEN	CALLE 56	CARRERA 6	CARRERA 7	1	369,92	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
17				ANDEN	CARRERA 6	CALLE 57	CALLE 58	1	266,24	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
18				ANDEN	CARRERA 3 A	CALLE 57	CALLE 58	1	176,28	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
19				ANDEN	CARRERA 4 A	CALLE 59	CALLE 59 A BIS	1	202,50	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
20				ANDEN	CALLE 81	CARRERA 4	CARRERA 5	1	37,95	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
21				ANDEN	CALLE 84	TRANSV 1	TRANSV 3	1	187,00	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
22				ANDEN	CALLE 89	CARRERA 17	CARRERA 18	1	412,50	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
23				ANDEN	CARRERA 8	CALLE 96	CALLE 96 BIS	1	142,60	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
24				ANDEN	CARRERA 8 A	CALLE 96	CALLE 96 BIS	1	138,00	PERIODICO		$ 239.518,04	$ -	$ 100.000,00
25	2001502			ANDEN	CALLE 61	CARRERA 4 A	CARRERA 5	1	[illegible]	RECONSTRUCCION		$ 239.518,04	$ -	$ 39.754.000,00
24	2001489			ANDEN	CALLE 61	CARRERA 4A	CARRERA 5	1	[illegible]	RECONSTRUCCION		$ 239.518,04	$ -	$ 56.940.000,00
25				ANDEN	CARRERA 5	CALLE 60 A	CALLE 61	1	[illegible]	RECONSTRUCCION		$ 239.518,04	$ -	
26				ANDEN	CALLE 68	TRANSV 1 ESTE	CARRERA 1	1	[illegible]	RECONSTRUCCION		$ 239.518,04	$ -	$ 60.697.000,00
27				ANDEN	CARRERA 1	CALLE 68	CALLE 70	1	[illegible]	RECONSTRUCCION		$ 239.518,04	$ -	$ 156.156.000,00
TOTAL								30	8528,95		4283,77		$ 930.140.417	$ 1.455.280.482
TOTAL AREA PERIODICO									3647,23					
TOTAL AREA TRAMOS NO INTERVENIR									[illegible]					
TOTAL AREA A DISEÑAR									3381,06					
TOTAL AREA A INTERVENIR (PERIODICO + REHABILITACIÓN + RECONSTRUCCION)									7028,29					

NOTA: EL TRAMO 7 Y 11 YA NO SE EJECUTAN POR QUE EL IDU LOS VA A REALIZAR

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.879.393.996,00
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$ 1.455.280.482,27
VALOR TOTAL POR DEFINIR ALCALDIA	$ 424.113.513,73
