
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA**	**0%**	**443 días**	**lun 22/04/24**	**mié 31/12/25**		
2		**INICIO DEL CONTRATO**	0%	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24		4;5;6;58FC+115 d
3		**GESTIONES PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA**	**0%**	**26 días**	**lun 22/04/24**	**lun 27/05/24**		**8**
4		ACTAS DE VECINDAD	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
5		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
6		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
7		**CANCHA DE FUTBOL No 2**	**0%**	**264 días**	**mar 28/05/24**	**vie 30/05/25**		**216**
8		Muros de contencción	0%	110 días	mar 28/05/24	lun 28/10/24	3	9;12FC+70 días;23
9		Mampostería colegio preescolar	0%	40 días	mar 29/10/24	lun 23/12/24	8	10
10		Carcamo costado sur	0%	50 días	mar 24/12/24	lun 3/03/25	9	11FC+5 días
11		Construcción de filtro	0%	15 días	mar 11/03/25	lun 31/03/25	10FC+5 días	18
12		Mamposteria	0%	50 días	mar 4/02/25	lun 14/04/25	8FC+70 días	14FC-10 días;15C
13		Columnetas	0%	13 días	mar 15/04/25	jue 1/05/25	14CC+10 días	17CC
14		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	38 días	mar 1/04/25	jue 22/05/25	12FC-10 días	13CC+10 días;20
15		Alfajías	0%	37 días	mar 1/04/25	mié 21/05/25	12CC+40 días	20
16		Pañete impermeabilizado	0%	48 días	mar 18/03/25	jue 22/05/25	12CC+30 días	20
17		Relleno con arena de alta especificación	0%	11 días	mar 15/04/25	mar 29/04/25	12FC-4 días;13CC	19;96CC+3 días
18		Tapas de carcamo	0%	7 días	jue 22/05/25	vie 30/05/25	19FC+15 días;11	20
19		Porterias	0%	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	17	18FC+15 días;20
20		***Fin cancha No 2***	***0%***	***0 días***	***vie 30/05/25***	***vie 30/05/25***	***19;18;16;15;14***	
21		**MODULO DE SERVICIO Y RIN DE BOXEO**	**0%**	**317 días**	**mar 15/10/24**	**mié 31/12/25**		**216**
22		**MODULO DE SERVICIO**	**0%**	**315 días**	**mar 15/10/24**	**lun 29/12/25**		**47**
23		Excavación	0%	40 días	mar 15/10/24	lun 9/12/24	8FC-10 días	24
24		Cimentación	0%	30 días	mar 10/12/24	lun 20/01/25	23	25;29FC+35 días;3
25		Estructura	0%	32 días	mar 21/01/25	mié 5/03/25	24	29FC+35 días;30F
26		Impermeabilización de cubierta	0%	10 días	jue 19/06/25	mié 2/07/25	28FC+7 días	35
27		Placa de contrapiso	0%	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25	29CC+12 días;30C	28CC+3 días
28		Mamposteria	0%	18 días	jue 15/05/25	lun 9/06/25	27CC+3 días	26FC+7 días;31
29		Redes hidrosanitarias	0%	50 días	jue 24/04/25	mié 2/07/25	24FC+35 días;25F	27CC+12 días
30		Sistema eléctrico	0%	175 días	jue 24/04/25	mié 24/12/25	24FC+35 días;25F	27CC+12 días
31		Acabados	0%	70 días	mar 10/06/25	lun 15/09/25	28	32FC-30 días;33F
32		Puertas y ventanas	0%	7 días	mar 5/08/25	mié 13/08/25	31FC-30 días	
33		Inatalacion de lavamanos y aparatos sanitarios	0%	12 días	vie 12/12/25	lun 29/12/25	31FC+63 días	35
34		Divisiones de baños	0%	10 días	vie 12/12/25	jue 25/12/25	31FC+63 días	
35		***Fin modulo de servicio***	***0%***	***0 días***	***lun 29/12/25***	***lun 29/12/25***	***33;26***	
36		**RIN DE BOXEO**	**0%**	**197 días**	**mar 1/04/25**	**mié 31/12/25**		**47**
44		**URBANISMO MODULO DE SERVICIO Y BOXEO**	**0%**	**5 días**	**jue 31/07/25**	**mié 6/08/25**		**47**
47		***Fin Modulo de servicio y rin de boxeo***	***0%***	***0 días***	***mié 31/12/25***	***mié 31/12/25***	***22;36;44***	
48		**PISTA DE PATINAJE**	**0%**	**147 días**	**lun 30/09/24**	**mar 22/04/25**		**216**
49		**OVALO CENTRAL**	**0%**	**131 días**	**lun 30/09/24**	**lun 31/03/25**		**73**
50		Carcamo de aguas lluvias central	0%	15 días	vie 8/11/24	jue 28/11/24	51CC+29 días	
51		Relleno	0%	60 días	lun 30/09/24	vie 20/12/24	2FC+115 días	50CC+29 días;52
52		Asfalto	0%	13 días	lun 23/12/24	mié 8/01/25	51	53FC+15 días;59
53		Acabado - Recubrimiento	0%	38 días	jue 30/01/25	lun 24/03/25	52FC+15 días	54
54		Demarcación	0%	5 días	mar 25/03/25	lun 31/03/25	53	55
55		***Fin Ovalo Central***	0%	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	54	
56		**OVALO EXTERNO - CALZADA DE VELOCIAD**	**0%**	**137 días**	**lun 30/09/24**	**mar 8/04/25**		**73**
57		Vigas de confinamiento	0%	18 días	mar 5/11/24	jue 28/11/24	58CC+26 días	
58		Relleno	0%	65 días	lun 30/09/24	vie 27/12/24	2FC+115 días	57CC+26 días;59
59		Asfalto	0%	5 días	jue 9/01/25	mié 15/01/25	58;52	60FC+15 días;62F
60		Acabado - Recubrimiento	0%	32 días	jue 6/02/25	vie 21/03/25	59FC+15 días	61
61		Demarcación	0%	5 días	lun 24/03/25	vie 28/03/25	60	64
62		Cerramiento - Pasamanos	0%	20 días	jue 6/02/25	mié 5/03/25	59FC+15 días	63;66
63		Policarbonato	0%	7 días	jue 6/03/25	vie 14/03/25	62	66
64		Pasamanos anden en voladizo	0%	7 días	lun 31/03/25	mar 8/04/25	61;65	66
65		Anden perimetral exterior	0%	15 días	jue 16/01/25	mié 5/02/25	59	64
66		***Fin Ovalo Externo***	0%	0 días	mar 8/04/25	mar 8/04/25	62;63;64	
67		**URBANISMO**	**0%**	**69 días**	**jue 16/01/25**	**mar 22/04/25**		**73**
68		Zonas duras	0%	33 días	jue 13/02/25	lun 31/03/25	69;70	71FC+4 días;72;75
69		Carcamos laterales	0%	20 días	jue 16/01/25	mié 12/02/25	59	68;70FF
70		Contenedores de raiz	0%	10 días	jue 30/01/25	mié 12/02/25	69FF	68
71		Tapas de carcamos	0%	12 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	68FC+4 días	72
72		***Fin Urbanismo***	0%	0 días	mar 22/04/25	mar 22/04/25	68;71	
73		***Fin pista de patinaje***	0%	0 días	mar 22/04/25	mar 22/04/25	49;56;67	
74		**ACCESO COLEGIO A POLIDEPORTIVO**	**0%**	**124 días**	**vie 21/03/25**	**mié 10/09/25**		**216**
75		Excavaciones	0%	7 días	vie 21/03/25	lun 31/03/25	68FC-7 días	76;83;85
76		Muros de contencción	0%	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	75	77
77		Relleno en material seleccionado	0%	16 días	mar 15/04/25	mar 6/05/25	76	78CC+7 días;79;8
78		Vigas de cimiento	0%	12 días	jue 24/04/25	vie 9/05/25	77CC+7 días	80
79		Bordillos	0%	7 días	mié 7/05/25	jue 15/05/25	77	
80		Pisos estampados	0%	8 días	lun 12/05/25	mié 21/05/25	78	81CC+3 días
81		Rampas	0%	4 días	jue 15/05/25	mar 20/05/25	80CC+3 días	84
82		Escalera rampa	0%	96 días	mié 30/04/25	mié 10/09/25	77FC-5 días	86
83		Mampostería	0%	30 días	mar 1/04/25	lun 12/05/25	75	85
84		Pasamanos	0%	7 días	mié 21/05/25	jue 29/05/25	81	86
85		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	8 días	mar 13/05/25	jue 22/05/25	83;75	86
86		***Fin Acceso colegio a polideportivo***	0%	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	84;85;82	
87		**CANCHA DE FUTBOL No 1**	**0%**	**316 días**	**lun 22/04/24**	**lun 7/07/25**		**216**
88		**CANCHA DE FUTBOL No 1**	**0%**	**218 días**	**mar 27/08/24**	**jue 26/06/25**		
89		Cimentación de mamposteria	0%	20 días	mar 27/08/24	lun 23/09/24	2FC+91 días	90
90		Mamposteria	0%	47 días	mar 24/09/24	mié 27/11/24	89	95FC-10 días;92;9
91		Columnetas	0%	56 días	jue 10/04/25	jue 26/06/25	94CC+7 días	95FF
92		Pañete impermeabilizado	0%	106 días	jue 28/11/24	jue 24/04/25	90	98
93		Filtro	0%	18 días	jue 6/02/25	lun 3/03/25	90FC+50 días	96FF
94		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	58 días	mar 1/04/25	jue 19/06/25	90FC+88 días	91CC+7 días
95		Alfajías	0%	116 días	jue 16/01/25	jue 26/06/25	90FC-10 días;91F	98
96		Relleno con arena de alta especificación	0%	8 días	vie 18/04/25	mar 29/04/25	17CC+3 días;93FF	97
97		Porterias	0%	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	96	98
98		***Fin cancha de futbol***	***0%***	***0 días***	***jue 26/06/25***	***jue 26/06/25***	***97;92;95***	
99		**GRADERIAS**	**0%**	**150 días**	**mar 3/12/24**	**lun 30/06/25**		
100		Cimentación	0%	30 días	mar 3/12/24	lun 13/01/25	90FC+3 días	101FC+55 días
101		Gradas	0%	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	100FC+55 días	102;104FC+35 día
102		Estructura de cubierta	0%	50 días	mar 22/04/25	lun 30/06/25	101	103FC-5 días;105
103		Pasamanos	0%	5 días	mar 24/06/25	lun 30/06/25	102FC-5 días	105
104		Bodegas bajo graderias	0%	12 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	101FC+35 días	105
105		***Fin Graderias***	***0%***	***0 días***	***lun 30/06/25***	***lun 30/06/25***	***102;103;104***	
106		**URBANISMO - CANCHA No 1**	**0%**	**65 días**	**mar 8/04/25**	**lun 7/07/25**		
107		Rellenos en material seleccionado	0%	55 días	mar 8/04/25	lun 23/06/25	101CC+5 días	108CC+12 días;10
108		Carcamo	0%	12 días	jue 24/04/25	vie 9/05/25	107CC+12 días	111
109		Pisos estampados	0%	50 días	mié 23/04/25	mar 1/07/25	107CC+11 días	110;111
110		Rampas	0%	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	109	111
111		***Fin urbanismo***	***0%***	***0 días***	***lun 7/07/25***	***lun 7/07/25***	***109;110;108***	
112		***Fin cancha de futbol No 1***	**0%**	**0 días**	**lun 22/04/24**	**lun 22/04/24**		
113		**ESTADIO DE BEISBOL**	**0%**	**310 días**	**mar 22/10/24**	**lun 29/12/25**		**216**
114		**TERCERA BASE**	**0%**	**308 días**	**mar 22/10/24**	**jue 25/12/25**		**192**
115		**GRADERIAS TERCERA BASE**	**0%**	**250 días**	**mié 13/11/24**	**mar 28/10/25**		
116		Cimentación	0%	30 días	mié 13/11/24	mar 24/12/24	135	117FC+75 días;12
117		Graderias	0%	20 días	mié 9/04/25	mar 6/05/25	116FC+75 días	118FC+15 días
118		Estructura metálica	0%	35 días	mié 28/05/25	mar 15/07/25	117FC+15 días	119;120FC+70 día
119		Cubierta	0%	5 días	mié 16/07/25	mar 22/07/25	118	122
120		Pasamanos	0%	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	118FC+70 días	122
121		Kioscos bajo graderias	0%	25 días	mié 6/08/25	mar 9/09/25	118FC+15 días	
122		***Fin graderias tercera base***	0%	0 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	118;119;120	
123		**Baños Dogout y Kiosco**	**0%**	**192 días**	**mié 5/03/25**	**jue 27/11/25**		
124		Cimentación	0%	20 días	mié 5/03/25	mar 1/04/25	116FC+50 días	129
125		Instalaciones hidrosanitarias	0%	39 días	mié 2/07/25	lun 25/08/25	129FC+40 días	127CC+25 días
126		Instalaciones electricas	0%	60 días	mié 2/07/25	mar 23/09/25	129FC+40 días	
127		Placa de contrapiso	0%	7 días	mié 6/08/25	jue 14/08/25	125CC+25 días	128
128		Mamaposteria	0%	15 días	vie 15/08/25	jue 4/09/25	127	130;131FC+15 día
129		Estructura	0%	25 días	mié 2/04/25	mar 6/05/25	124	125FC+40 días;12
130		Impermeabilización de cubiertas	0%	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25	128	132
131		Acabados	0%	45 días	vie 26/09/25	jue 27/11/25	128FC+15 días	132
132		***Fin baños, dogout y kiosco***	0%	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	130;131	139
133		**ZONA DE BATEO**	**0%**	**308 días**	**mar 22/10/24**	**jue 25/12/25**		
134		Cimentación Vigas perimetrales	0%	8 días	mar 22/10/24	jue 31/10/24	2CC+131 días	135
135		Losa de contrapiso	0%	8 días	vie 1/11/24	mar 12/11/24	134	137FC+239 días;1
136		Pasto sintetico	0%	8 días	mar 16/12/25	jue 25/12/25	137FC+15 días	138
137		Cerramiento postes y malla	0%	30 días	mar 14/10/25	lun 24/11/25	135FC+239 días	136FC+15 días;13
138		***Fin zona de bateo***	0%	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25	136;137	139
139		***Fin Tercera base***	***0%***	***0 días***	***jue 25/12/25***	***jue 25/12/25***	***12;132;138***	
140		**PRIMERA BASE**	**0%**	**262 días**	**mié 25/12/24**	**jue 25/12/25**		**192**
141		**GRADERIAS PRIMERA BASE**	**0%**	**227 días**	**mié 25/12/24**	**jue 6/11/25**		**166**
142		Cimentación	0%	30 días	mié 25/12/24	mar 4/02/25	116	143
143		Muro de contención	0%	50 días	mié 5/02/25	mar 15/04/25	142	144CC+25 días;15
144		Graderias	0%	30 días	mié 12/03/25	mar 22/04/25	143CC+25 días	145FC+15 días;14
145		Estructura metálica	0%	35 días	mié 14/05/25	mar 1/07/25	144FC+15 días	146;147FC+80 día
146		Cubierta	0%	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	145	149
147		Pasamanos	0%	12 días	mié 22/10/25	jue 6/11/25	145FC+80 días	149
148		Kioscos bajo graderias	0%	25 días	mié 13/08/25	mar 16/09/25	144FC+80 días	149
149		***Fin graderias primera base***	***0%***	***0 días***	***jue 6/11/25***	***jue 6/11/25***	***146;147;148***	***166***
150		**Baños Dogout y Kiosco**	**0%**	**175 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**		
151		Cimentación	0%	20 días	mié 19/03/25	mar 15/04/25	143FC-20 días	156CC+10 días
152		Instalaciones hidrosanitarias	0%	39 días	mié 25/06/25	lun 18/08/25	156FC+28 días	154CC+45 días
153		Instalaciones electricas	0%	60 días	vie 27/06/25	jue 18/09/25	156FC+30 días	
154		Placa de contrapiso	0%	10 días	mié 27/08/25	mar 9/09/25	152CC+45 días	155
155		Mamaposteria	0%	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	154	157;158FC+10 día
156		Estructura	0%	32 días	mié 2/04/25	jue 15/05/25	151CC+10 días	152FC+28 días;15
157		Impermeabilización de cubiertas	0%	5 días	mié 1/10/25	mar 7/10/25	155	159
158		Acabados	0%	25 días	mié 15/10/25	mar 18/11/25	155FC+10 días	159
159		***Fin baños, dogout y Kiosko***	***0%***	***0 días***	***mar 18/11/25***	***mar 18/11/25***	***157;158***	***166***
160		**ZONA DE BATEO**	**0%**	**248 días**	**mar 14/01/25**	**jue 25/12/25**		
161		Cimentación Vigas perimetrales	0%	10 días	mar 14/01/25	lun 27/01/25	135FC+44 días	162
162		Losa de contrapiso	0%	10 días	mar 28/01/25	lun 10/02/25	161	164FC+170 días
163		Pasto sintetico	0%	8 días	mar 16/12/25	jue 25/12/25	164FC+20 días	165
164		Cerramiento postes y malla	0%	30 días	mar 7/10/25	lun 17/11/25	162FC+170 días	163FC+20 días
165		***Fin zona de bateo***	0%	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25	163	
166		***Fin primera base***	***0%***	***0 días***	***mar 18/11/25***	***mar 18/11/25***	***141;149;159***	
167		**LOBBY**	**0%**	**93 días**	**vie 15/08/25**	**mar 23/12/25**		**192**
168		Cimentación	0%	12 días	vie 15/08/25	lun 1/09/25	156FC+65 días	169
169		Estructura	0%	22 días	mar 2/09/25	mié 1/10/25	168	170
170		Mamposteria	0%	7 días	jue 2/10/25	vie 10/10/25	169	172;173;175;174
171		Puerta de acceso	0%	5 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25	172FC+17 días	
172		Acabados	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	170	171FC+17 días;17
173		Escaleras	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	170	176
174		Rampa	0%	15 días	lun 13/10/25	vie 31/10/25	170	176
175		Zonas duras	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	170	176
176		***Fin lobby***	***0%***	***0 días***	***vie 21/11/25***	***vie 21/11/25***	***172;173;174;175***	
177		**ZONA DE JUEGO**	**0%**	**156 días**	**vie 16/05/25**	**vie 19/12/25**		**192**
178		Excavaciones	0%	35 días	vie 16/05/25	jue 3/07/25	156	213FC+85 días;18
179		Rellenos	0%	45 días	vie 16/05/25	jue 17/07/25	156	181CC+15 días;18
180		Sistema de drenaje y sistema de riego	0%	110 días	vie 11/07/25	jue 11/12/25	179FC-5 días	181CC+50 días;18
181		Siembra de grama	0%	55 días	vie 19/09/25	jue 4/12/25	179CC+15 días;18	182
182		Demarcaciones	0%	6 días	vie 12/12/25	vie 19/12/25	181;180	183
183		***Fin zona de juego***	***0%***	***0 días***	***vie 19/12/25***	***vie 19/12/25***	***182***	
184		**URBANISMO**	**0%**	**92 días**	**vie 22/08/25**	**lun 29/12/25**		**192**
185		Mampostería	0%	20 días	vie 22/08/25	jue 18/09/25	178FC+35 días	189FC+42 días;19
186		Columnetas	0%	12 días	vie 21/11/25	lun 8/12/25	189CC+3 días	187;188
187		Alfajías	0%	4 días	mar 9/12/25	vie 12/12/25	186	191
188		Pañetes impermeabilizados	0%	15 días	mar 9/12/25	lun 29/12/25	186	
189		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	20 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25	185FC+42 días	186CC+3 días;191
190		Zonas duras	0%	37 días	vie 26/09/25	lun 17/11/25	185CC+25 días	191
191		***Fin Urbanismo***	***0%***	***0 días***	***lun 15/12/25***	***lun 15/12/25***	***187;189;190***	
192		***Fin estadio de beisbol***	**0%**	**0 días**	**lun 29/12/25**	**lun 29/12/25**	**114;140;167;177;**	
193		**URBANISMOS EXTERIORES**	**0%**	**217 días**	**mar 4/03/25**	**mié 31/12/25**		**216**
194		**Calle 36B**	**0%**	**38 días**	**mar 4/03/25**	**jue 24/04/25**		
195		Andenes y bordillos	0%	38 días	mar 4/03/25	jue 24/04/25	12CC+20 días	196CC+29 días;19
196		Pisos estampados	0%	9 días	lun 14/04/25	jue 24/04/25	195CC+29 días	199
197		Escaleras y rampas	0%	8 días	mar 15/04/25	jue 24/04/25	195CC+30 días	198FF;203CC+3 d
198		Pasamanos	0%	4 días	lun 21/04/25	jue 24/04/25	197FF	199
199		***Fin Urbanismo Calle 36B***	0%	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	195;196;197;198	
200		**Carrera 7C**	**0%**	**28 días**	**mar 18/03/25**	**jue 24/04/25**		
201		Andenes y bordillos	0%	28 días	mar 18/03/25	jue 24/04/25	195CC+10 días	202CC;206CC+40
202		Pisos estampados	0%	8 días	mar 18/03/25	jue 27/03/25	201CC	
203		Escaleras y rampas	0%	5 días	vie 18/04/25	jue 24/04/25	197CC+3 días	204
204		***Fin Urbanismo Carrera 7C***	0%	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	201;203	
205		**Calle 38B**	**0%**	**155 días**	**mar 13/05/25**	**lun 15/12/25**		
206		Andenes y bordillos	0%	60 días	mar 13/05/25	lun 4/08/25	201CC+40 días	207CC+100 días;2
207		Pisos estampados	0%	30 días	mar 30/09/25	lun 10/11/25	206CC+100 días	209CC+10 días;21
208		Pavimentos	0%	17 días	mar 29/07/25	mié 20/08/25	206CC+55 días	210FC+70 días
209		Casetas de ventas	0%	30 días	mar 14/10/25	lun 24/11/25	207CC+10 días	
210		Escaleras y rampas	0%	13 días	jue 27/11/25	lun 15/12/25	208FC+70 días	211
211		***Fin Urbanismo Calle 38B***	0%	0 días	lun 15/12/25	lun 15/12/25	206;207;210	
212		**Carrera 6B**	**0%**	**44 días**	**vie 31/10/25**	**mié 31/12/25**		
213		Andenes y bordillos	0%	35 días	vie 31/10/25	jue 18/12/25	178FC+85 días	214;215
214		Escaleras y rampas	0%	9 días	vie 19/12/25	mié 31/12/25	213	215
215		***Fin Urbanismo Carrera 6B***	0%	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	213;214	
216		**Fin de la obra**	0%	0 días	mié 31/12/25	mié 31/12/25	7;21;48;74;87;11	

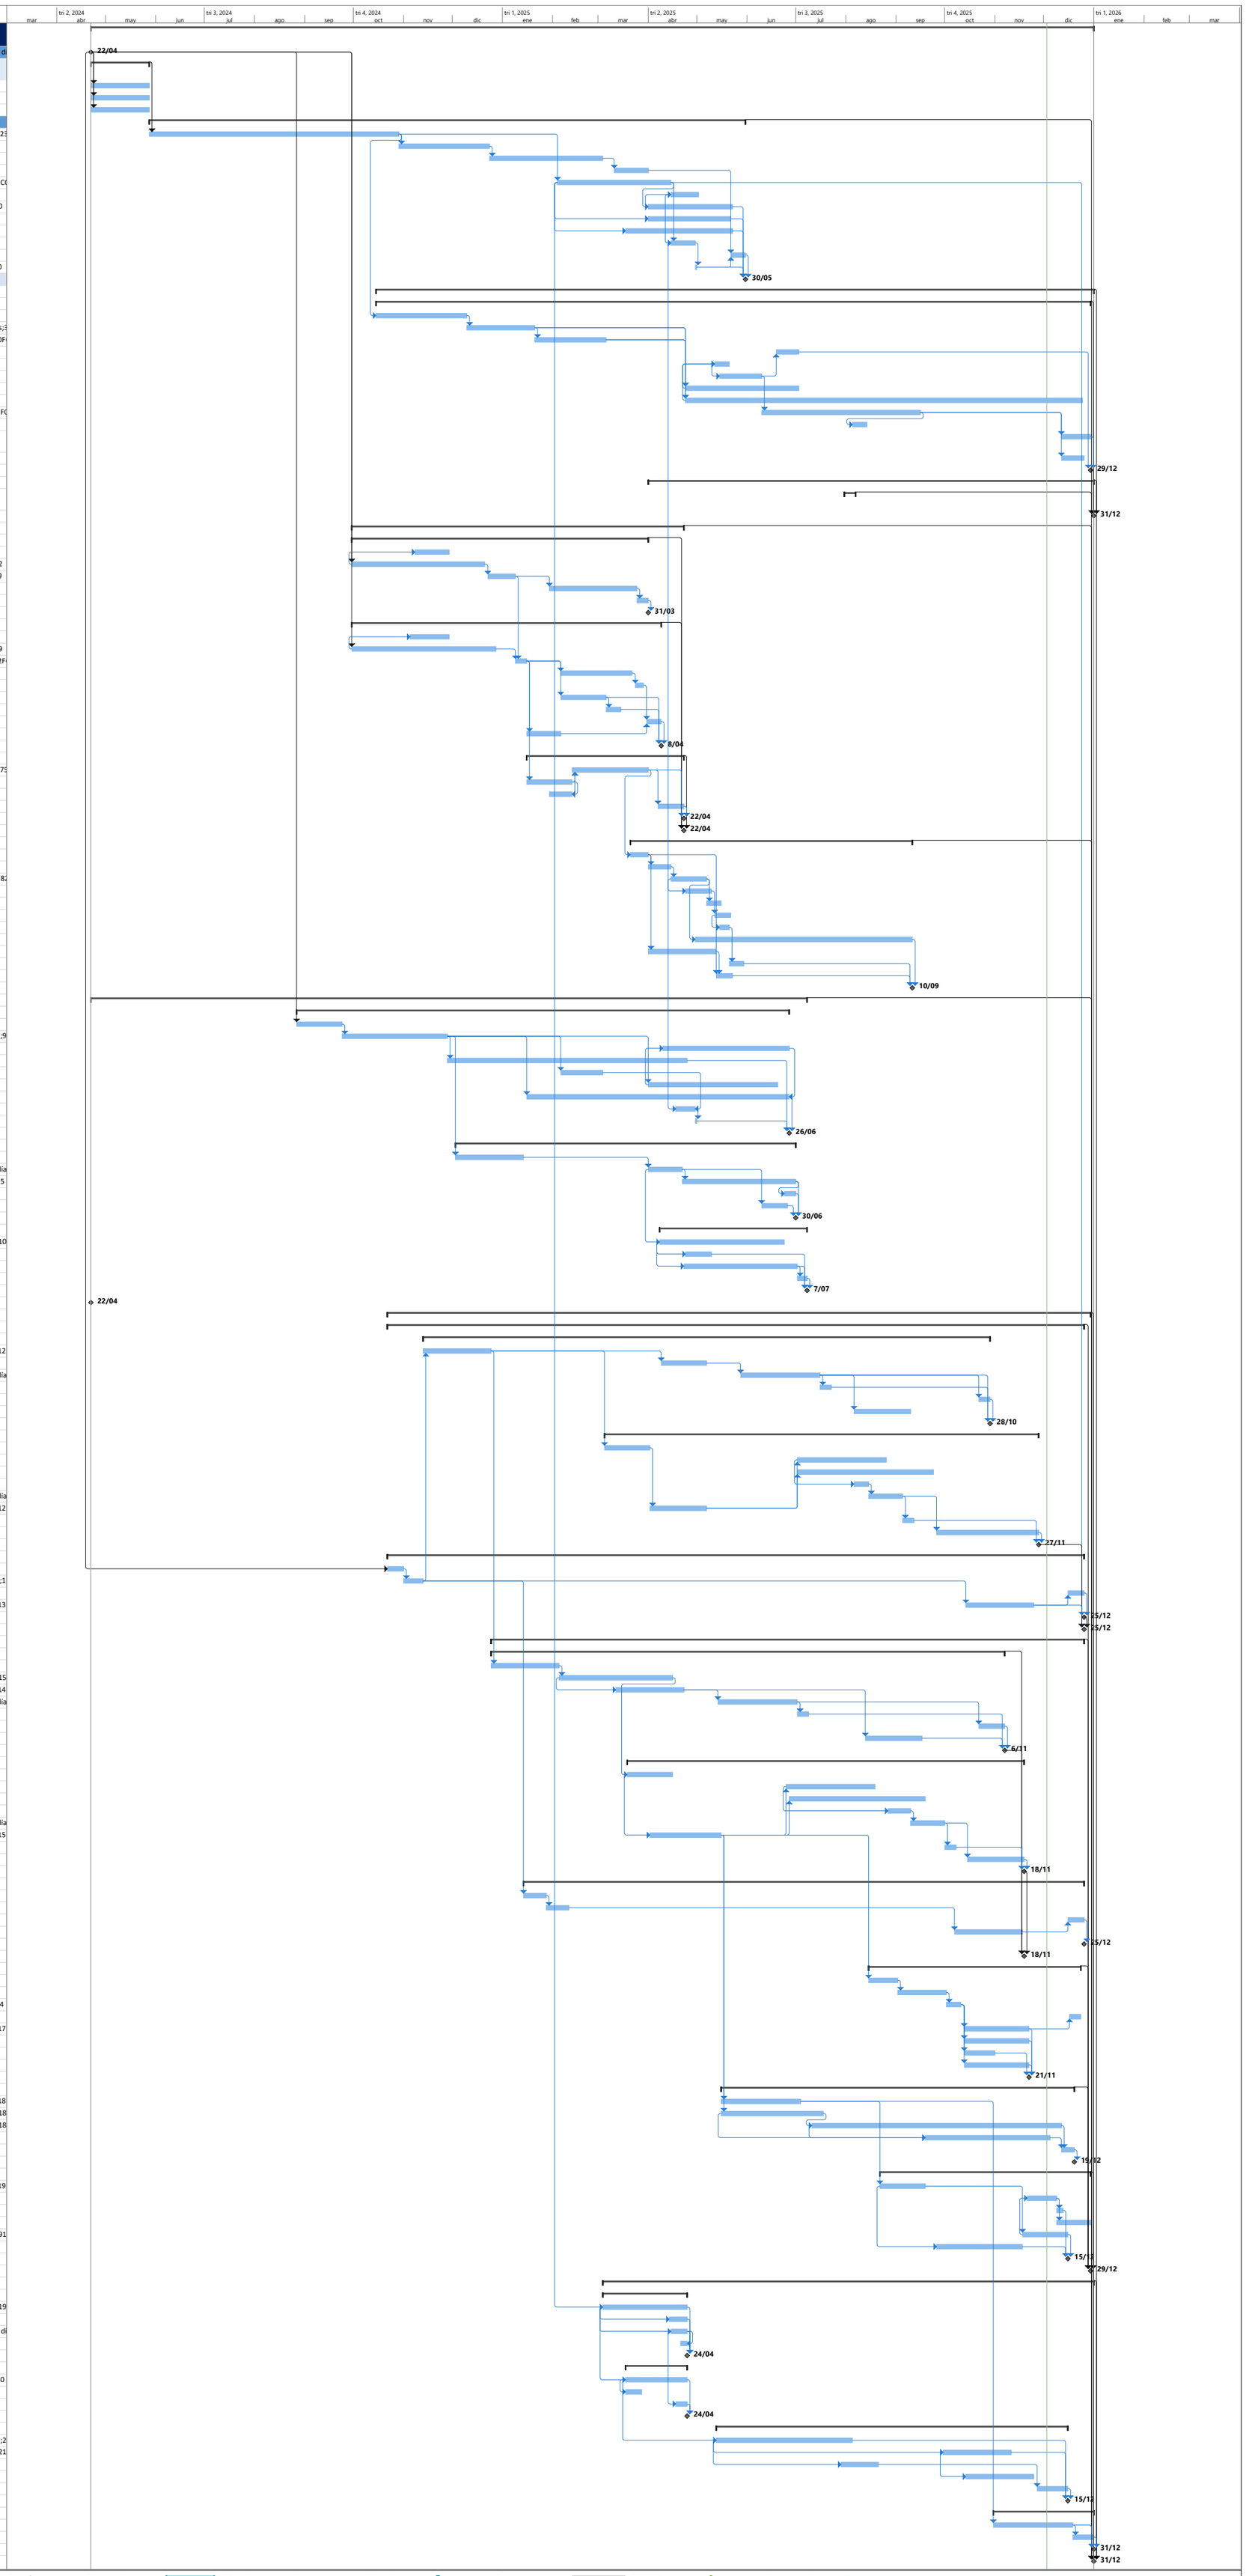

Proyecto: Cronograma Polidep
Fecha: mié 3/12/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
