1

MECI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA

Sistema de Gestión Integrado

CODIGO: GJ-M.03-F18

VERSIÓN: 03

FECHA: 15-09-2021

PÁGINA 1 de 2

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA (1)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 -

AVANCE Y CONTROL DE OBRA (1)

Fecha del acta: 12 DE ABRIL DEL 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA RL. MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL RL. JUAN AMADO LIZARAZO

CANTIDADES ORIGINALES (Corresponde a los ítems o productos contratados)									ACTA (1)		ACUMULADO TOTAL	
ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
				I. EXPLANACIONES								
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y	m3	660,00	$ 12.094,00	$ 7.982.040,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	220.1	220		Terraplenes	m3	2364,00	$ 32.020,00	$ 75.695.280,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	200,00	$ 222.122,00	$ 44.424.400,00	200,00	$ 44.424.400,00	200,00	$ 44.424.400,00
							Total EXPLANACIONES	$ 128.101.720,00		$ 44.424.400,00		$ 44.424.400,00
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L=								
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	400,00	$ 79.452,00	$ 31.780.800,00	400,00	$ 31.780.800,00	400,00	$ 31.780.800,00
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .	m3	940,90	$ 74.410,00	$ 70.012.369,00	940,90	$ 70.012.369,00	940,90	$ 70.012.369,00
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	21,00	$ 296.822,00	$ 6.233.262,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34,00	$ 1.727.492,00	$ 58.734.728,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	68,00	$ 1.500.674,00	$ 102.045.832,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	m3	250,00	$ 1.329.945,00	$ 332.486.250,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	7,10	$ 660.145,00	$ 4.687.030,00	7,10	$ 4.687.029,50	7,10	$ 4.687.029,50
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)	m	444,00	$ 3.955.413,00	$ 1.756.203.372,00	399,00	$ 1.578.209.787,00	399,00	$ 1.578.209.787,00
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	38987,00	$ 8.638,00	$ 336.769.706,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	tf/m	58588,20	$ 2.409,00	$ 141.138.974,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	642.1	642		Apoyo elastometrico	und	6,00	$ 617.491,00	$ 3.704.946,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	12,00	$ 1.141.607,00	$ 13.699.284,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	632.1 P	632,1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	60,00	$ 830.166,00	$ 49.809.960,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	1,00	$ 77.542.211,00	$ 77.542.211,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Total 'CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M	$ 2.984.848.724,00		$ 1.684.689.985,50		$ 1.684.689.985,50

MECI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA (1)

CODIGO: GJ-M.03-F18
VERSIÓN: 03
FECHA: 10-09-2021
PÁGINA 1 de 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 -

AVANCE Y CONTROL DE OBRA (1)

Fecha del acta: 12 DE ABRIL DEL 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA RL. MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL RL. JUAN AMADO LIZARAZO

CANTIDADES ORIGINALES (Corresponde a los ítems o productos contratados)									ACTA (1)		ACUMULADO TOTAL	
ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
				III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.								
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	400,70	$ 770.531,00	$ 308.751.772,00	57,40	$ 44.228.479,40	57,40	$ 44.228.479,40
19	682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	96,00	$ 389.394,00	$ 37.381.824,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0.4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144,00	$ 2.062.890,00	$ 297.056.160,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	186,00	$ 252.910,00	$ 47.041.260,00	28,70	$ 7.258.517,00	28,70	$ 7.258.517,00
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1331,00	$ 9.399,00	$ 12.510.069,00	143,50	$ 1.348.756,50	143,50	$ 1.348.756,50
				Total PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE				$ 702.741.085,00		$ 52.835.752,90		$ 52.835.752,90
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO								
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	440,00	$ 296.822,00	$ 130.601.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	330,00	$ 213.578,00	$ 70.480.740,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	400,00	$ 935.666,00	$ 374.266.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	120,00	$ 770.236,00	$ 92.428.320,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	6000,00	$ 8.638,00	$ 51.828.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO				$ 719.605.140,00		$ 0,00		$ 0,00
				V. TRANSPORTE								
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	340000,00	$ 1.807,00	$ 614.380.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Total SEÑALIZACION Y LIMPIEZA				$ 614.380.000,00		$ 0,00		$ 0,00

MECI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA (1)

CODIGO: GI-M.03.F18
VERSIÓN: 03
FECHA: 19-09-2021
PÁGINA 1 de 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 -

AVANCE Y CONTROL DE OBRA (1)

Fecha del acta: 12 DE ABRIL DEL 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA RL. MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL RL. JUAN AMADO LIZARAZO

CANTIDADES ORIGINALES (Corresponde a los ítems o productos contratados)								ACTA (1)		ACUMULADO TOTAL	
ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								
29	700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío	m	1200,00	$ 2.086,00	$ 2.503.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	und	7,00	$ 561.555,00	$ 3.930.885,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	80,00	$ 177.857,00	$ 14.228.560,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	730.2	730		Sección Final	und	4,00	$ 88.182,00	$ 352.728,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
33	740.1	740		Captafaros	und	20,00	$ 16.439,00	$ 328.780,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Total SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 21.344.153,00		$ 0,00		$ 0,00
							COSTO TOTAL	$ 5.171.020.822,00		$ 1.781.950.138,40		$ 1.781.950.138,40
							OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 152.879.720,00				
							REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 51.012.000,00		$ 51.012.000,00		$ 51.012.000,00
							IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.692.280,00		$ 9.692.280,00		$ 9.692.280,00
							TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 60.704.280,00		$ 60.704.280,00		$ 60.704.280,00
							VALOR TOTAL	$ 5.384.604.822,00		$ 1.842.654.418,40		$ 1.842.654.418,40
										34,22079204163%		34,22079204162 63%

La interventoria certifica que se reciben a satisfacción las obras estipuladas en el acta parcial (1) del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 , realizadas por el CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA representado legalmente por MARIO ALBERTO PETRO REYES identificado con cedula de ciudadanía No 73.203.584.

ANTICIPO	30%	$ 1.615.381.447,00
VALOR AMORTIZAR ACTA PARCIAL No 1		$ 552.796.325,52
ACUMULADO AMORTIZADO		$ 552.796.325,52
SALDO AMORTIZACION		$ 1.062.585.121,48

Total presente acta: Mil ochocientos cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos con cuarenta centavos M/ Cte

EL CONTRATISTA:

Firma:
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
NIT. 901627719
RL. MARIO ALBERTO PETRO REYES
CC. 73.203.584

INTERVENTORIA

Firma:
CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT.901.578.761-6
JUAN E. VILLALOBOS
CC. 92.228.199

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 1

Elaborado

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha: Abril 12 de 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: EXPLANEACIONES

Item: 201.6

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Unidad: M3

Ubicación



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE	GUARDA LLANTAS	M3	0,26	0,27	15,73			1,10	2,00	2,21
	LOSA	M3	4,2	0,19	15,73			12,55	1,00	12,55
	VIGAS	M3	0,3	1,26	15,73			5,95	2,00	11,89
	ALETAS DE ESTRIBOS	M3				31,3515	0,5	15,68	4,00	62,70
	CUERPO DE ESTRIBOS	M3	4,2	6,6	0,5			13,86	2,00	27,72
	VIGAS DE CORONACIÓN	M3	0,3	1,26	3,6			1,36	2,00	2,72
	RIOSTRAS CENTRAL	M3	0,22	1,26	2,6			0,72	1,00	0,72
	ZAPATAS	M3				64,12	1,20	76,94	2,00	153,88
	GAVIONES	M3	1	2	6			12,00	1,00	12,00
	CICLOPEO	M3	1	0,1	6			0,60	2,00	1,20
				TOTAL						287,60

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD TOTAL DE DEMOLICION REALIZADA POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL ACTA PARCIAL No 1 ES DE 287,6 M3, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CONSOCIONES INICIALES DE LA ACTIVIDAD ES 200 M3 Y QUE A LA FECHA NO SE HA REALIZADO BALANCE DE MAYORES CANTIDADES, SE COBRARA EN EL ACTA PARCIAL No 1, 200 M3 DE DEMOLICION Y EL EXCEDENTE CORREPONDIENTE A 87,6, SE COBRARAN EN EL ACTA PARCIAL No 2

V/B BO. RESIDENTE Y/O CONTRATISTA

V/B BO. RESIDENTE Y/O INTERVENTOR

5

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

INVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 4

Elaborado

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA
DIRECTOR DE OBRA:	

Fecha: Abril 12 de 2023

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE								

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
01/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	CORTE SECO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	CORTE SECO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-97.03	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-65.87	5.00	0.00	-407.23	9,592.77
0+195.00	0.07	-53.95	5.00	0.00	-299.53	9,293.23
0+200.00	3.35	-38.63	5.00	0.00	-231.45	9,061.79
0+205.00	10.52	-28.05	5.00	0.00	-166.70	8,895.09

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -1,101.30m3

TOTAL	1101,30

OBSERVACIONES: REMITIR A CARTERA TOPOGRAFICA, MOVIMIENTO DE TIERRA VOLUMEN CORTE SECO. . SE ACLARA SE TENIENDO ENCUENTA QUE A LA FECHA DEL COBRO DEL ACTA PARCIAL No 1, NO SE HAN REALIZADO EL BLANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, SE PRESENTARA COBRO DE LAS CANTIDADES CORREPONDIENTE A LAS CONDICIONES INICIALES ES DECIR 940,9 M3 Y QUE UNA VEZ SE TENGA BALANCE DE OBRA SE COBRARA EN LA SIGUEINTE ACTA LAS CANTIDAD FALTANTE ES DECIR 160,4 M3

V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

6

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA	1 de 3
013 - 2022		Elaborado	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Fecha	Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	Unidad	Ubicación
Item: 600.2.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE								

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAR/23 6:34pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE HUMEDO	DISTANCIA CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE HUMEDO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-18.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-23.17	5.00	0.00	-104.67	9,895.33
0+195.00	0.00	-25.49	5.00	0.00	-121.65	9,773.69
0+200.00	0.00	-23.28	5.00	0.00	-121.91	9,651.77
0+205.00	0.00	-31.20	5.00	0.00	-136.19	9,515.59

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO = -428.00m3

TOTAL								428,00

OBSERVACIONES: REMITIR A CARTERA TOPOGRAFICA, MOVIMIENTO DE TIERRA VOLUMEN CORTE HUMEDO. SE ACLARA QUE TENIENDO ENCUENTA QUE A LA FECHA DEL COBRO DEL ACTA PARCIAL No 1, NO SE HAN REALIZADO EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, SE PRESENTARA COBRO DE LAS CANTIDADES CORREPONDIENTE A LAS CONDICIONES INICIALES ES DECIR 400 M3 Y QUE UNA VEZ SE TENGA BALANCE DE OBRA SE COBRARA EN LA SIGUEINTE ACTA LAS CANTIDAD FALTANTE ES DECIR 28 M3

V0.B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA	V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 3

Elaborado

CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
013 - 2022		Fecha
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	Unidad	Ubicación
Item: 630.6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE	LADO A	M3	17,00	6,00	0,05	5,10	1,00	5,10
	AREA PILOTES	M3		0,95	0,05	0,05	12,00	-0,57
	LADO B	M3	17,00	6,00	0,05	5,10	1,00	5,10
	AREA PILOTES	M3		0,95	0,05	0,05	12,00	-0,57
TOTAL								9,06

OBSERVACIONES:SE ACLARA SE TENIENDO ENCUENTA QUE A LA FECHA DEL COBRO DEL ACTA PARCIAL No 1, NO SE HAN REALIZADO EL BLANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, SE PRESENTARA COBRO DE LAS CANTIDADES CORREPONDIENTE A LAS CONDICIONES INICIALES ES DECIR 7,1 M3 Y QUE UNA VEZ SE TENGA BALANCE DE OBRA SE COBRARA EN LA SIGUEINTE ACTA LAS CANTIDAD FALTANTE ES DECIR 1,96 M3


V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA	1 de 1
013 - 2022		Elaborado	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Fecha	Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
DIRECTOR DE OBRA:			
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 62.1P	PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	

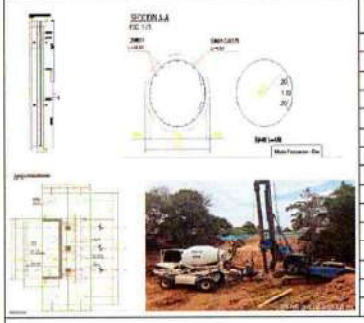

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	DIAMETRO	ALTURA	No DE PILOTES	CANT	TOTAL PARCIAL
	LADO A	ML	19,00	1,10		11,00		209,00
	LADO B	ML	19,00	1,10		10,00		190,00
TOTAL								399,00

V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR


ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA	1 de 1
013 - 2022		Elaborado	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Fecha	Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
DIRECTOR DE OBRA:			
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 630.7P	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	ML	







UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
TRAMO 1	N1404003.133 E1141934.202	M3	17.00	5.00	0.40		1.00	34.00
TRAMO 2	N1403998.724 E11419426442	M3	13.00	4.50	0.40		1.00	23.40
TOTAL								57.40

V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR


ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA		
1	de	1
Elaborado		
CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
013 - 2022		Fecha
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	
DIRECTOR DE OBRA:		
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	Unidad	Ubicación
Item: 673.2	ML	

MATERIAL GRANULAR DRENANTE





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
TRAMO 1	N1404003.133 E1141934.202	M3	17,00	5,00	0,20		1,00	17,00
TRAMO 2	N1403998.724 E11419426442	M3	13,00	4,50	0,20		1,00	11,70
		TOTAL						28,70

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA


VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA		
1	de	1
Elaborado		
CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
013 - 2022		Fecha
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Abril 12 de 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	
DIRECTOR DE OBRA:		
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	Unidad	Ubicación
Item: 673.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	ML





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
TRAMO 1	N1404003.133 E1141934.202	M2	17,00	5,00			1,00	85,00
TRAMO 2	N1403998.724 E11419426442	M2	13,00	4,50			1,00	58,50
		TOTAL						143,50

V0BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAR/23 6:34pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO


ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	CORTE HUMEDO	CORTE	CORTE	CORTE HUMEDO	CURVA MASA
0+185.00	0.00	-18.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-23.17	5.00	0.00	-104.67	9,895.33
0+195.00	0.00	-25.49	5.00	0.00	-121.65	9,773.69
0+200.00	0.00	-23.28	5.00	0.00	-121.91	9,651.77
0+205.00	0.00	-31.20	5.00	0.00	-136.19	9,515.59

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO = -428.00m3


MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAR/23 6:34pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	COTE SECO	COTA HUMEDO	CORTE	CORTE HUMEDO
0+185.00	43.00	44.40	----	1.40
0+190.00	43.40	44.37	----	0.97
0+195.00	42.88	44.39	----	1.51
0+200.00	43.21	44.36	----	1.15
0+205.00	42.64	44.27	----	1.63



cota	corte
00+185	
0	44.40
4.6	44.45
9	44.25
-6.5	44.23
-9	44.23
00+190	
0	44.37
5	44.36
9	44.20
-5.8	44.46
-9	44.25
00+195	
0	44.39
7	44.39
9	44.48
-5	44.47
-9	44.35
00+200	
0	44.36
6	44.37
9	44.38
-4	44.48
-9	44.37
00+205	
0	44.27
6	44.3
9	44.26
-7	44.38
-9	44.25



MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
01/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO


ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE SECO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE SECO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-97.03	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-65.87	5.00	0.00	-407.23	9,592.77
0+195.00	0.07	-53.95	5.00	0.00	-299.53	9,293.23
0+200.00	3.35	-38.63	5.00	0.00	-231.45	9,061.79
0+205.00	10.52	-28.05	5.00	0.00	-166.70	8,895.09

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -1,101.30m3


MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
01/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO

ESTACION	ELEVACIONES SUBRASANTE	ELEVACIONES TERRENO	ESPESORES CORTE	ESPESORES CORTE SECO
0+185.00	44.40	50.15	----	5.75
0+190.00	44.37	50.30	----	5.93
0+195.00	44.39	50.22	----	5.83
0+200.00	44.36	50.03	----	5.67
0+205.00	44.27	49.85	----	5.58



cota corte	
00+185	
0	43
4.6	43.3
9	43.4
-6.5	43.5
-9	43.75
00+190	
0	43.4
5	43
9	43.2
-5.8	42.76
-9	42.9
00+195	
0	42.88
7	42.5
9	43.22
-5	43.5
-9	43.2
00+200	
0	43.21
6	42.8
9	43.33
-4	43
-9	43.48
00+205	
0	42.64
6	42.33
9	43.04
-7	42.5
-9	42.8



cota terreno	
00+185	
0	50.15
2	49.9
10.5	48.58
-3	50.3
-12.2	48.83
00+190	
0	50.3
2	50.3
10.43	48.51
12.5	48.31
00+195	
0	50.22
2	50.4
4	49.85
5	46.2
9	44.2
12	44.85
-1	50.1
-1.5	49.2
-7	45
-11	44.07
00+200	
0	50.03
2.5	50
4	44.25
12	43.19
-9	43.1
-12	43.17
00+205	
0	49.85
2	49.2
2.5	43.20
12	43.15
-2	49.3
-3	46.35
-6.8	43.2
-12	43.17





Resultados de Verificación de Equipos Topográficos

Fecha de Verificación	Noviembre 5 de 2022	Válida hasta	Mayo 4 de 2023

Datos del Topógrafo o la Empresa	
Nombre	DIEGO SOLANO PEÑA
Cedula	78.690.199

Licencia	

Datos del Equipo			
Equipo	Nivel Autom.	Número de Equipo	303721
Marca - Modelo	Geomax ZAL 132		
Propietario	DIEGO SOLANO PEÑA		

Verificación Horizontal	
Corrección Error Angular	----------
Error Actual	0.001 Mts. En lecturas de cambios cerrados, distantes 100 Metros.

Ref. 11 06 VALIDA HASTA MAYO 4 DE 2023

Después de realizadas las verificaciones, se procedió a corregir errores verticales encontrados, haciendo los respectivos ajustes de calibración según parámetros de trabajo utilizado en estas mediciones, realizados sobre patrones pre-establecidos; por lo tanto, este equipo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

Advertencia: Esta Certificación no exime al operador de realizar controles periódicos en el sitio de desarrollo de proyectos en ejecución.

Cordialmente,

EMIRO BUSTOS VILLERA
Topógrafo Universidad de Córdoba
L.P. 00-0548 Consejo Profesional Nal. de Topografía - Bogotá
C.C. 6.861.777 de Montería
Radicado: Libro 1 Folio 137-Mayo 19 de 1986 del Consejo Profesional Nal. de Topografía de Bogotá

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Licencia No. 01-4550



DIEGO LUIS
SOLANO PEÑA

Documento de Identidad: 78.690.199

Lugar de Expedicion: MONTERIA


Resolucion: 091/2014 M.C.: 4545



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 78.690.199
SOLANO PEÑA
APELLIDOS
DIEGO LUIS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1966
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAY-1984 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

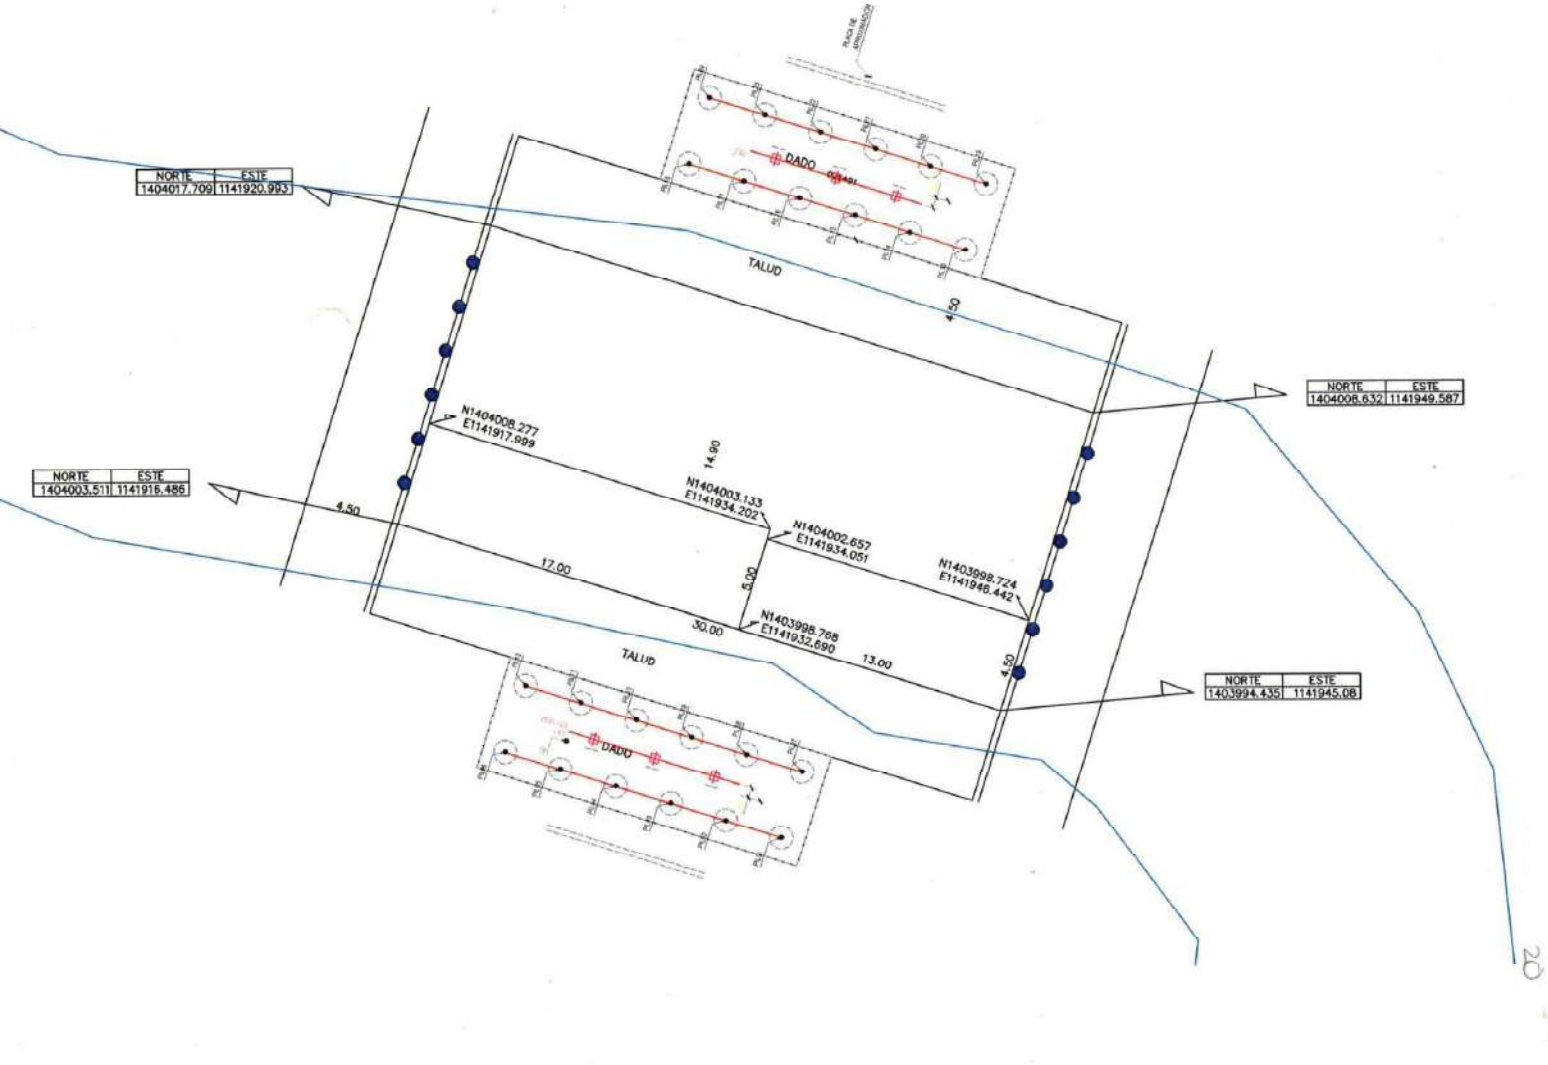
NORTE
1404017.709
ESTE
1141920.993
DADO
TALUD
NORTE
1404008.632
ESTE
1141949.587
N1404008.277
E1141917.999
14.90
N1404003.133
E1141934.202
N1404002.657
E1141934.051
N1403998.724
E1141946.442
NORTE
1404003.511
ESTE
1141916.486
4.50
17.00
5.00
30.00
N1403998.768
E1141932.690
13.00
4.50
TALUD
NORTE
1403994.435
ESTE
1141945.08
DADO

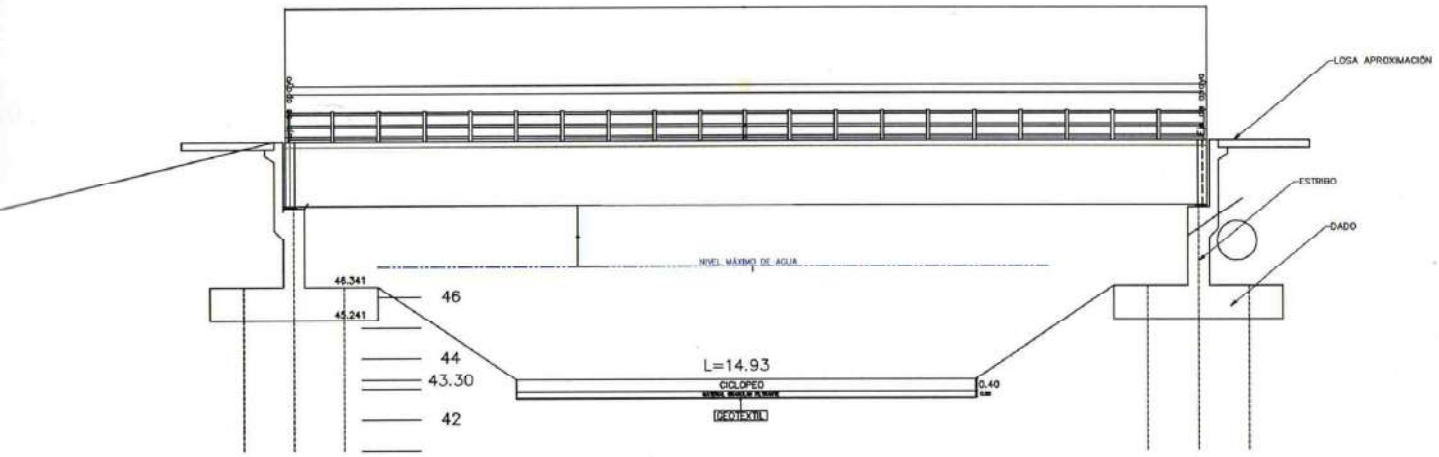
LOSA APROXIMACIÓN
ESTRIBO
DADO
NIVEL MÁXIMO DE AGUA
46.341
45.241
46
44
43.30
42
L=14.93
CICLOPEO
0.40
PEDRAPLEN

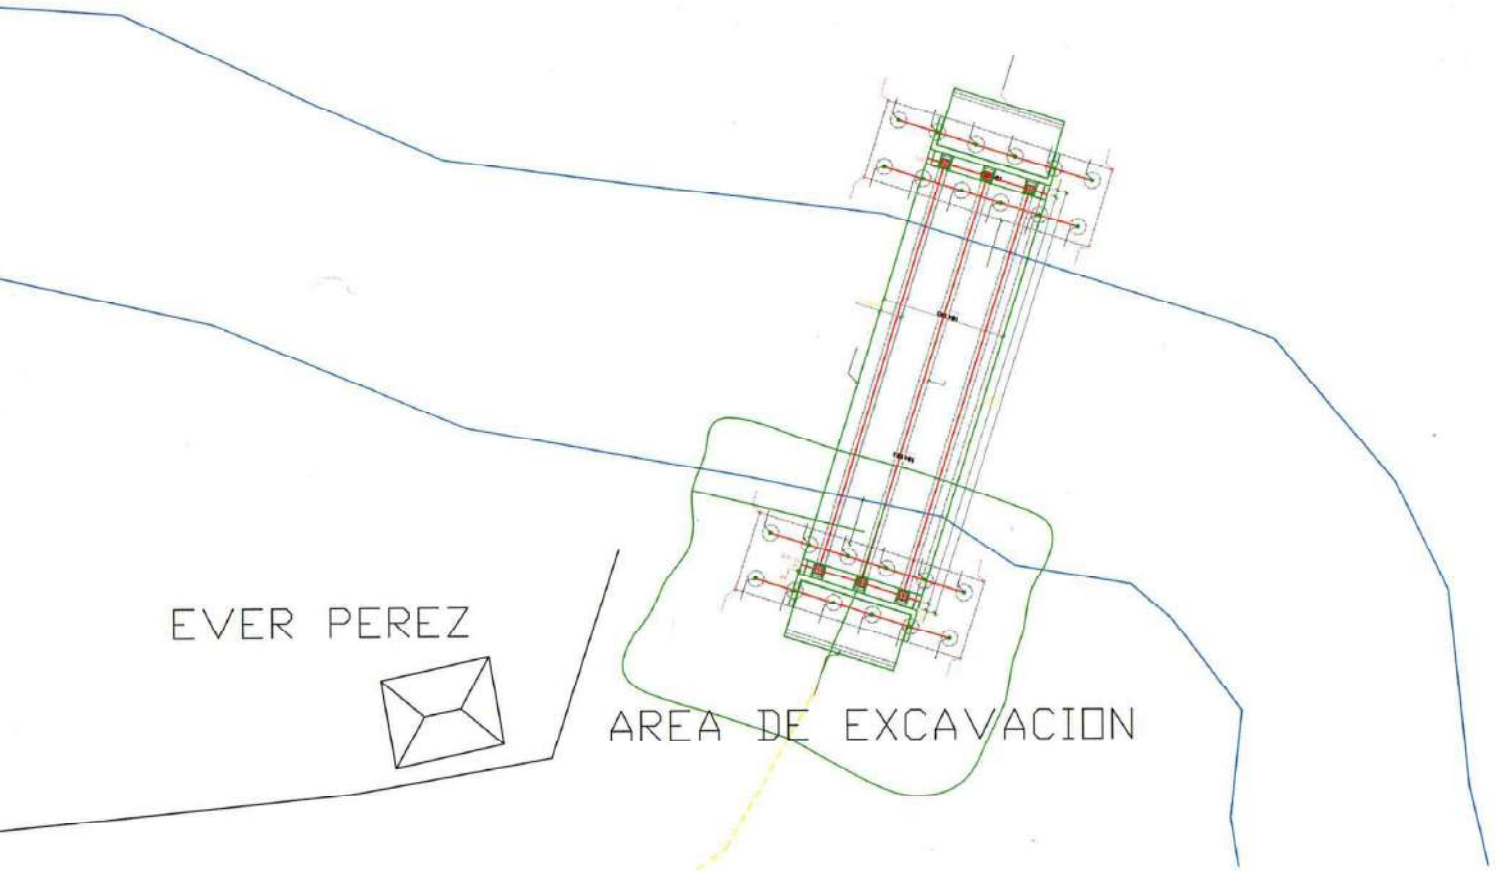
EVER PEREZ
AREA DE EXCAVACION



Resultados de Verificación de Equipos Topográficos

Fecha de Verificación	**Noviembre 5 de 2022**	**Vence**	**Mayo 4 de 2023**

Nombre	**Diego Solano Peña**

Datos del Topógrafo o la Empresa

Cedula	**78.690.199**	**Licencia**	

Datos del Equipo

Equipo	**Estación Total**	**Número de Equipo**	**ZAL132-788 196**
Propietario	**Diego Solano Peña**		

Marca - Modelo	**GEOMAX**
Propietario	**Diego Solano Peña**

Verificación Horizontal	
Corrección Error Angular	**00° 00' 01"**

Verificación Vertical	
Error Actual	**00° 00'01"**

Después de realizadas las verificaciones, se procedió a corregir errores encontrados, haciendo los respectivos ajustes de calibración según parámetros de trabajo utilizados en estas mediciones, realizados sobre patrones pre-establecidos; por lo tanto, este equipo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

ADVERTENCIA: Esta Certificación no exime al operador de realizar controles periódicos en el sitio de desarrollo de proyectos en ejecución.

Cordialmente,

Ref:11-0675-VALIDA HASTA MAYO 4 DE 2023

EMIRO BUSTOS VILLERA
Topógrafo Universidad de Córdoba
L.P. 00-0548 Consejo Profesional Nal. de Topografia - Bogotá
C.C. 6.861.777 de Montería
Radicado: Libro 1 Folio 137-Mayo 19 de 1986 del Consejo Profesional Nal. de Topografia de Bogotá



Resultados de Verificación de Equipos Topográficos

Fecha de Verificación	Noviembre 5 de 2022	Válida hasta	Mayo 4 de 2023

Datos del Topógrafo o la Empresa	
Nombre	DIEGO SOLANO PEÑA
Cedula	78.690.199

Licencia	

Datos del Equipo			
Equipo	Nivel Autom.	Número de Equipo	303721
Marca - Modelo	Geomax ZAL 132		
Propietario	DIEGO SOLANO PEÑA		

Verificación Horizontal	
Corrección Error Angular	----------
Error Actual	0.001 Mts. En lecturas de cambios cerrados, distantes 100 Metros.

Ref. 11106 VALIDA HASTA MAYO 4 DE 2023

Después de realizadas las verificaciones, se procedió a corregir errores verticales encontrados, haciendo los respectivos ajustes de calibración según parámetros de trabajo utilizado en estas mediciones, realizados sobre patrones pre-establecidos; por lo tanto, este equipo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

Advertencia: Esta Certificación no exime al operador de realizar controles periódicos en el sitio de desarrollo de proyectos en ejecución.

Cordialmente,

EMIRO BUSTOS VILLERA
Topógrafo Universidad de Córdoba
L.P. 00-0548 Consejo Profesional Nal. de Topografía - Bogotá
C.C. 6.861.777 de Montería
Radicado: Libro 1 Folio 137-Mayo 19 de 1986 del Consejo Profesional Nal. de Topografía de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 78.690.199
SOLANO PEÑA
APELLIDOS
DIEGO LUIS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1966
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

31-MAY-1984 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1302500-00159588-M-0078690199-20090822 0012759278A 1



República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Licencia No. 01-4550

DIEGO LUIS
SOLANO PEÑA

Documento de Identidad: 78.690.199

Lugar de Expedición: MONTERIA

Resolución: 091/2014 M.C.I: 4545

Certificado
Bancario

Lunes, 30 de Enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA identificado(a) con NIT 901627711, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	569-000038-84	2022/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

INFORME DE OBRA

CONTRATO:

LP-NO.013-2022

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTRODUCCIÓN

El contrato de obra No. LP-NO.013-2022 suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Consorcio Puentes de Cordoba, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, se está ejecutando en la zona rural del municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, específicamente sobre la quebrada Severinera, en la via que comunica el municipio de Tierralta con el municipio de Planeta Rica, por parte del contratista, con un plazo de ejecución de 12,4 meses, contados a partir del 19 de septiembre de 2022, la cual corresponde a la fecha del acta de inicio, y la interventoría técnica, administrativa y financiera realizada por el Consorcio Vial Nacional.

Las obras a ejecutar corresponden a la construcción de un puente vehicular el cual será de 30 metros de longitud, un ancho de vía de 6,5 metros y anden de 1 metro. Este puente contará por una cimentación profunda con sistema de pilotes, su estructura en la que se construirá estribo y aletas y una super estructura la cual esta formada por vigas postensadas, vigas auxiliares y su tablero. Así mismo se contempla la construcción de los accesos al puente en concreto, las obras de protección de la ribera y/o la estabilización de taludes.

El presente informe mensual corresponde al periodo desde el 19 de septiembre de 2023 hasta el 12 de abril del 2023, en el cual se soporta el estado de la ejecución del contrato y sus obras respectivas, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

El desarrollo del informe, comprende los siguientes capítulos y anexos que muestran categóricamente el estado de avance físico de las obras, en ocasión a la aplicación de las especificaciones técnicas de construcción y los estudios y diseños apropiados por el Consorcio Puentes de Córdoba para la ejecución de las obras, las actuaciones administrativas y el estado financiero del contrato.

En el Capítulo 1, se encuentra la información general del proyecto.

En el Capítulo 2, se encuentra el informe Administrativo.

En el Capitulo 3, se encuentra el informe Financiero.

En el capitulo 4, se encuentra el informe Técnico.

En el capítulo 5, se muestran las dificultades, inconvenientes e imprevistos que fueron relevantes para la ejecución de las obras y sus rendimientos que afectaron el cronograma de actividades.

Los anexos de este informe comprenden los soportes de que dan evidencia de lo descrito en cada capítulo, asociados a cada actividad ejecutada física, administrativa y financiera.

Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones que se dieron lugar durante el periodo.

OBJETIVO DEL INFORME.

Describir en forma detallada el estado de la ejecución del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 y las obras establecidas dentro del alcance y meta física del mismo, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA y demás obligaciones contractuales.

ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene como alcance describir las actividades ejecutadas relacionadas con los componentes administrativos, financieros y técnico del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 durante el periodo del 19 de septiembre del 2022 al 12 de abril del 2023 un porcentaje de ejecución del **34,22079204163%** con respecto al valor total del contrato de obra No LP-NO.013-2022 es decir $ 5.384.604.822. El componente técnico incluirá avance de obra e implementación de los ejes de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1. Información básica del contrato de obra.

INFORMACION GENERAL	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
LOCALIZACION DEL PROYECTO	QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TIERRALTA
CONTRATO N°	LP-NO.013-2022
PLAZO INCIAL	3,4 MESES
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PRORROGA N1	9 MESES
FECHA DE SUSPENSION	N.A
FECHA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
VALOR INICIAL	$ 5.384.604.822,10
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	ING. MARIO GUERRA PETRO

1.2. Localización del proyecto.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TIERRALTA
NIT: 800096807:0
CÓDIGO DANE: 23855
GENTILICIO: Tierraltense

Es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería, capital departamental, conocido por tener uno de los parques nacionales naturales más grande del mundo llamado el Nudo de Paramillo, protegido por las Naciones Unidas. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.


EXTENSIÓN Y LÍMITES

Considerando lo consignado tanto en el Plan de Desarrollo, así como lo reportado en el Plan de Ordenamiento Territorial, además, las consultas en el instituto Geográfico Agustín Codazzi; el Municipio de Tierralta tiene una extensión superficial de aproximadamente 4.728 Km2, y sus límites son los siguientes:

- **Norte**: Montería.
- **Oriente**: Planeta Rica.
- **Sur**: Montelíbano y el departamento de Antioquia.
- **Occidente**: Valencia y el departamento de Antioquia.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO DE LA OBRA

Vereda Severinera

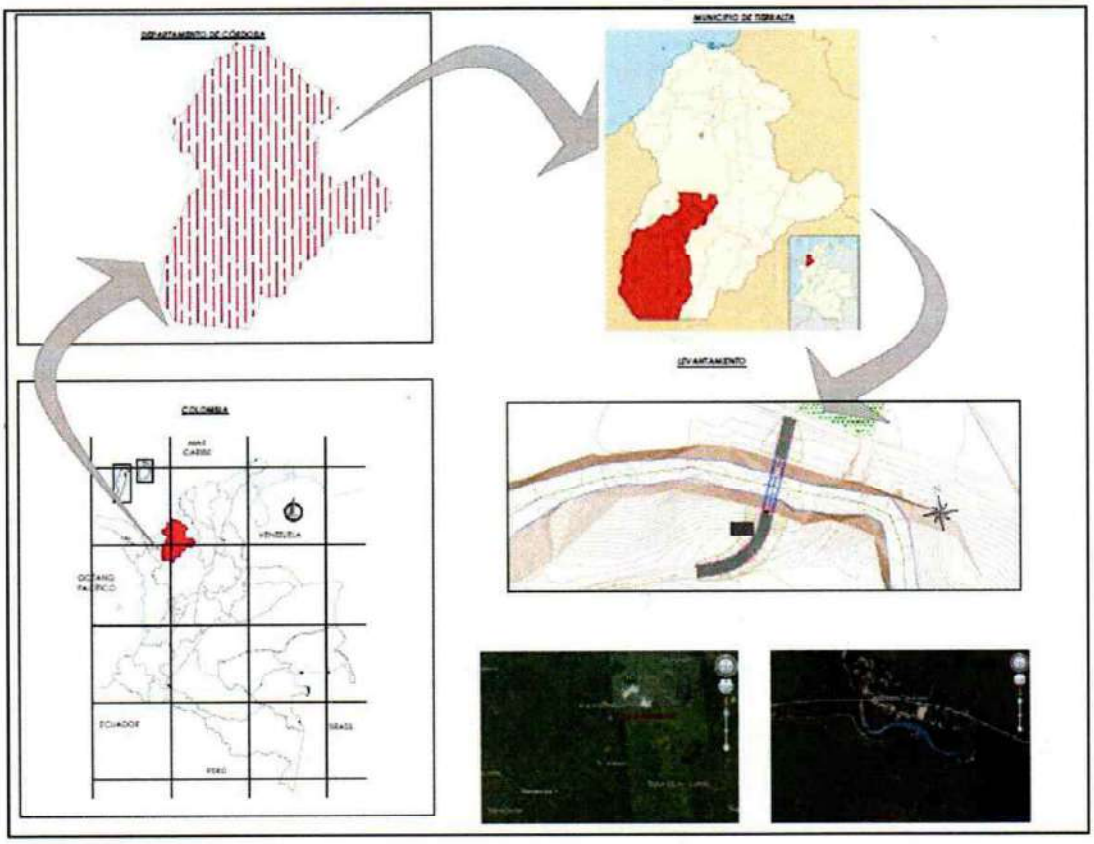

1.3. Descripción de las obras objeto del proyecto.

			I. EXPLANACIONES
1	**210.2.2**	**210**	Excavación en material común de la explaneación y canales
2	**220.1**	**220**	Terraplenes
3	**201.6**	**200**	Demolición de estructuras
			II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M
4	**600.2.4**	**600**	Excavaciones varias en material común bajo agua.
5	**600.2.3**	**600**	Excavaciones varias en material común en seco .
6	**320.3**	**320**	Subbase Granular Clase C.
7	**630.1**	**630**	Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS
8	**630.3**	**630**	Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero
9	**630.4 P**	**630**	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación
10	**630.6**	**630**	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
11	**621.1P**	**621**	Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)
12	**640.1**	**640**	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
13	**641.1**	**641**	Acero de PreEsfuerzo.
14	**642.1**	**642**	Apoyo elastometrico
15	**642.2**	**642**	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)
16	**632.1 P**	**632,1**	Baranda metalica para trafico vehicular
17	**620.3**	**620**	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

			III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.
18	**630.7P**	**630**	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo
19	**682.3**	**682**	Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC
20	**621.1-2P**	**621**	Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)
21	**673.2**	**673**	Material Granular Drenante
22	**673.1.1**	**673**	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
			IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
23	**320.3**	**320**	Subbase Granular Clase C.
24	**311.1**	**311**	Afirmado (Material para mejoramiento)
25	**500.1**	**500**	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
26	**630.4**	**630**	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
27	**640.1**	**640**	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
			V. TRANSPORTE
28	**900.2**	**900**	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).
			VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
29	**700.1**	**700**	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
30	**710.1**	**710**	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
31	**730.1**	**730**	Defensa Metálica
32	**730.2**	**730**	Sección Final
33	**740.1**	**740**	Captafaros

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1. Revisión del contrato y documentos del proyecto. Indicar si se requirió modificatorios u otros sí al contrato, etc.

CONTRATO DE OBRA: fecha de suscripción 2 de septiembre del 2022.

PRORROGA No 1: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 1 de fecha 30 de diciembre del 2022 (Anexa soporte). La prorroga solicitada fue por 9 meses a partir del 31 de diciembre del 2022, fecha de terminación inicial del contrato.

2.2. Pago de impuestos.

A la fecha no se han efectuados descuento de impuesto al consorcio Puentes de Córdoba por parte de la entidad contratante Municipio de Tierralta.

2.3. Suscripción de actas: Acta de inicio, suspensiones, reinicio, etc.

ACTA DE INICIO: de fecha 19 de septiembre del 2022 (anexa soporte).

2.4. Actualización de pólizas y aprobación de las mismas por la entidad. (Anexa soportes)

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ADJUDICACION DEL CONTRATO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	ADJUDICACION	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	ACTA DE INICIO	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	ACTA DE INICIO	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/03/2024	$538.460.483

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/09/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/03/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 30/09/2023	$500.000.000

2.5. Listado de personal contratado y afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y el correspondiente soporte del pago y paz y salvo. (Anexa soportes)

2.6. Descripción del personal profesional del proyecto, según pliego de condiciones y la oferta.

Se envió mediante oficio No CPC-TIERRALTA-006-2022 de fecha 22 de septiembre del 2023 las hojas de vida del personal mínimo exigido de acuerdo al pliego.

Se aprobó mediante oficio CVN-041-2022 de fecha 26 de septiembre del 2023.

PROFESIONAL	CARGO
AYLEN MAUTH CARRASCAL LLORENTE	Directora de obra
JOSE MANUEL DIAZ PINTO	Residente de obra
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	Especialista Ambiental
MARIA INES GONZALES AYUS	Coordinador SST

2.7. Solicitudes de homologaciones de personal, cuando aplique.

Se solicito mediante oficio No CPC-TIERRALTA-059-2023 de fecha 12 de enero de 2023, homologación del residente de obra inicialmente aprobado.

Se avala homologación mediante oficio No CVN-258-2023 de fecha 16 de enero del 2023

PREFESIONAL	DEDICACION	RESIDENTE DE OBRA	HOMOLOGAR
RESIDENTE DE OBRA	100%	JOSE MANUEL DIAZ PINTO - CC. 15.042.131	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS. C.C No 3.482.179

2.8. Manejo de la correspondencia. (Anexa soportes)

3. INFORME FINANCIERO.

Este capítulo deberá incluir como mínimo la siguiente información cuando aplique:

3.1. Organización y presentación de la documentación solicitada por la entidad para la aprobación del Plan de inversión del anticipo y cronograma, o renuncia de anticipo, según el caso. (Anexa soporte)


3.2. Organización y presentación de la documentación requerida para la gestión del trámite de pago de los reembolsos y cobros asociados al manejo de los recursos en calidad de anticipo (Anexa soporte).


3.3. Presentación de actas parciales y resumen del balance.

A la fecha no se han presentado actas parciales. El presente informe es para el cobro del acta parcial No 1

4. INFORME TÉCNICO

4.1. Presupuesto y APUS aprobados por la entidad en la oferta económica. (Anexa soportes)

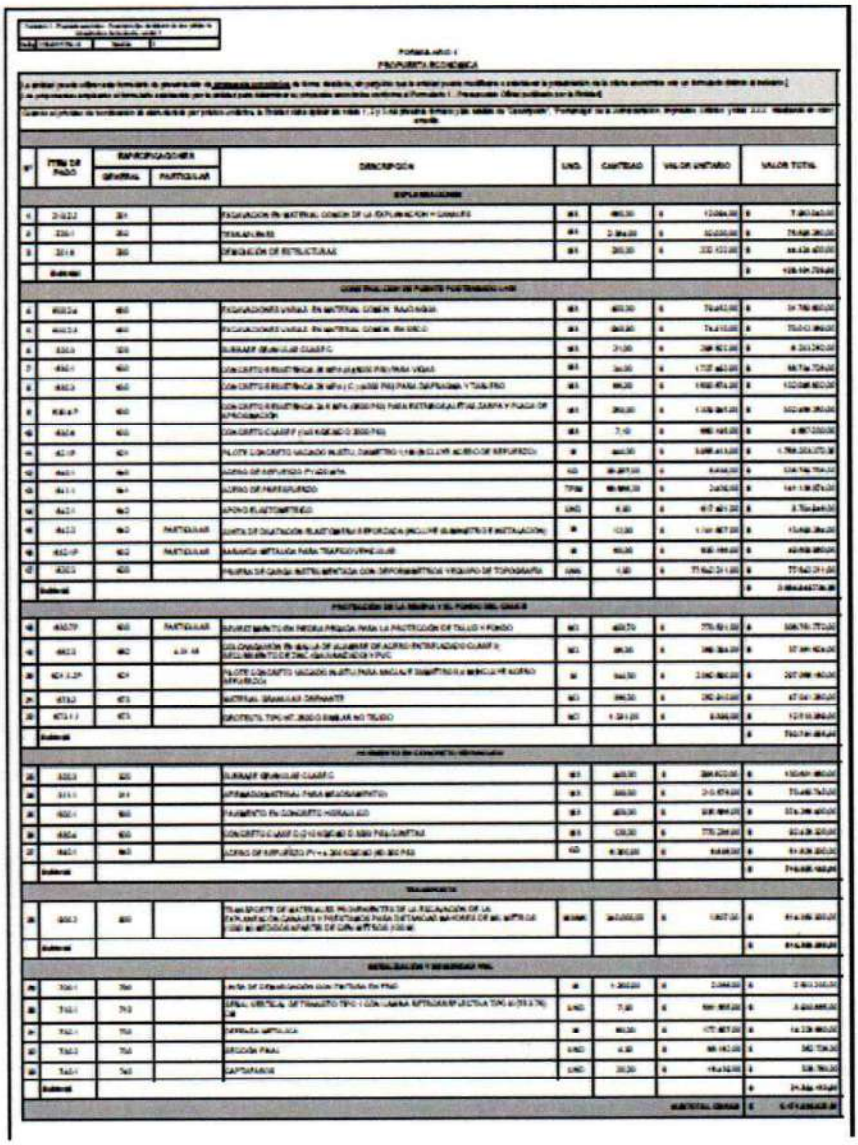

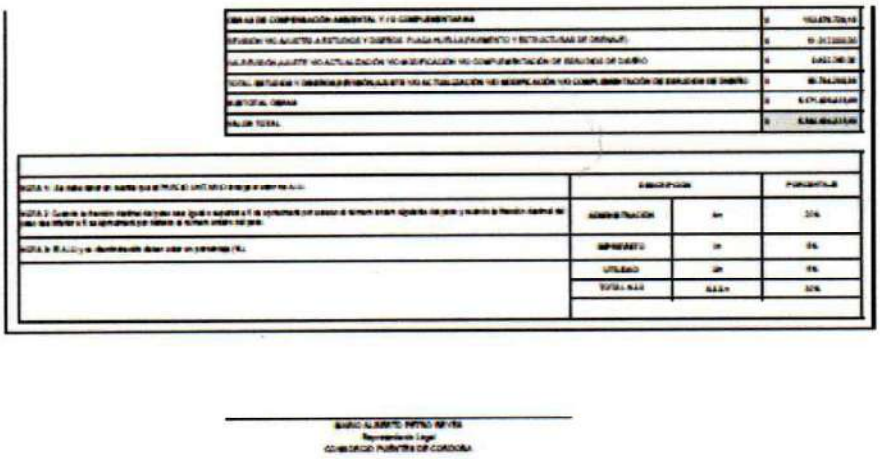

4.2. Solicitudes de revisión y aprobación de la reprogramación de obra y Plan de contingencia. (Anexa soportes)

Se presento reprogramación de obra No 1 mediante oficio No CPC-055-2022 de fecha 29 de diciembre del 2022

4.3. Solicitud de revisión del balance económico del contrato, acta de mayores y menores cantidades.

A la fecha no se ha presentado balance de mayores y menores cantidades. Estamos a la espera de aval por parte de la entidad de alternativa del diseño geométrico del proyecto.

4.4. Solicitud de aprobación de estudios, diseños, especificaciones (Anexar soportes)

Se dio aval por parte de la interventoría de la revisión de los estudios y diseños así:

COMPONENTE	OFICIO APROBACIÓN	FECHA
Hidráulico	CVN-125-2022	1 de noviembre del 2022
Geotécnico	CVN-167-2022	28 de noviembre del 2022
Estructural	CVN-273-2023	26 de enero del 2023
Geométrico	CVN-269-2023	29 de enero del 2023

4.5. Resumen de actividades ejecutadas en el periodo.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre del 2022 y el 12 de abril del 2023, se ejecutaron las siguientes actividades.

Etapa 1: Revisión y ajustes a los estudios y diseños suministrado por la entidad contratante. Esta actividad se desarrollo entre el 19 de septiembre del 2022 y el 29 de enero del 2023.

Se obtuvo el aval de los cuatro componentes revisados y ajustados por parte de la interventoría.

Dentro de la documentación suministrada por la entidad no se evidencio el diseño geométrico del proyecto, por lo tanto el contratista presento dicho diseño de acuerdo a la normatividad vigente.

Etapa 2: ejecución de obras civiles, las actividades de obra ejecutadas a la fecha del presente informe son las siguientes:

- Demolición de estructuras.
- Excavaciones varias en material común bajo agua.
- Excavaciones varias en material común en seco.
- Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI).
- Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo).
- Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo.
- Material Granular Drenante.
- Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido


A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades ejecutadas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**ITEM. 201.6**. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**ITEM. 201.6**. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 201.6** DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 201.6** DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

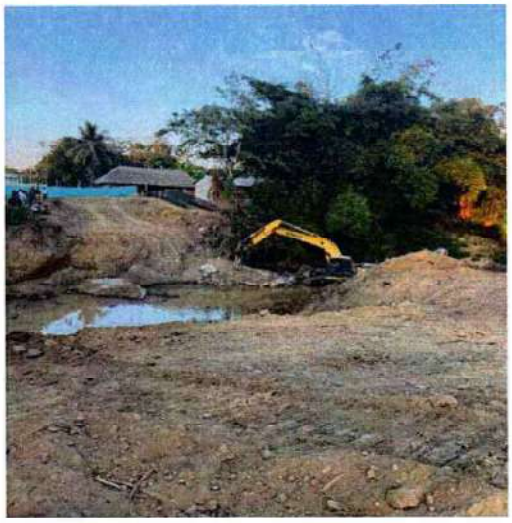
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 201.6** DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 600** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 600** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 600** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

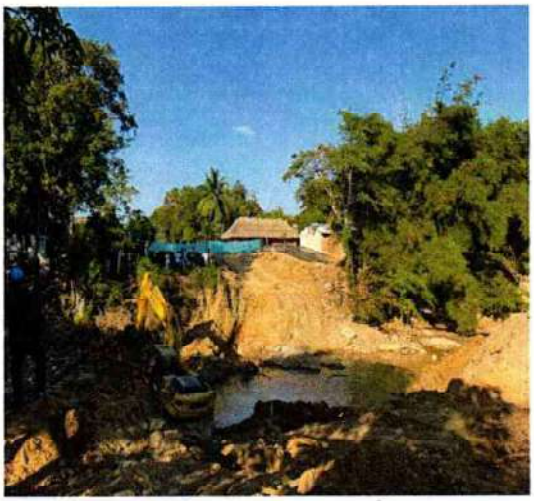CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 600** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item 600.2.4** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item 600.2.4** EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

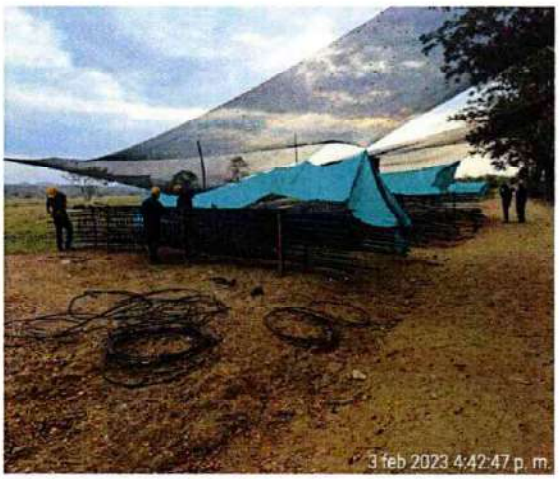CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 621P** PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1 (INCLUYE ACERO DE RESFUERZO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item 630.6** CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**Item: 630.6** CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**ITEM 621.1-2P:** MATERIAL GRANULAR DRENANTE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**673.1.1** GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**630.7P** REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
	**630.7P** REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO

4.6. Cantidades de obras ejecutadas en el periodo y porcentajes de avance físico de la obra.

CANTIDADES ORIGINALES (Corresponde a los items o productos contratados)								ACTA (1)	ACUMULADO TOTAL		
ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	V. TOTAL	CANT.	CANT.	VALOR TOTAL	% DE AVANCE
				I. EXPLANACIONES							
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y	m3	660,00	$ 7.982.040,00	0,00	0,00	$ 0,00	0%
2	220.1	220		Terraplenes	m3	2384,00	$ 75.695.280,00		0,00	$ 0,00	0%
3	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	200,00	$ 44.424.400,00	200,00	200,00	$ 44.424.400,00	100%
						Total EXPLANACIONES	**$ 128.101.720,00**			**$ 44.424.400,00**	
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE							
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	400,00	$ 31.780.800,00	400,00	400,00	$ 31.780.800,00	100%
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .	m3	940,90	$ 70.012.369,00	940,90	940,90	$ 70.012.369,00	100%
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	21,00	$ 6.233.262,00		0,00	$ 0,00	0%
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34,00	$ 58.734.728,00		0,00	$ 0,00	0%
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	68,00	$ 102.045.832,00		0,00	$ 0,00	0%
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	m3	250,00	$ 332.486.250,00		0,00	$ 0,00	0%
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	7,10	$ 4.687.030,00	7,10	7,10	$ 4.687.029,50	100%
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)	m	444,00	$ 1.756.203.372,00	399,00	399,00	$ 1.578.209.787,00	90%
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	38987,00	$ 336.769.706,00		0,00	$ 0,00	0%
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	tf/m	58568,20	$ 141.138.974,00		0,00	$ 0,00	0%
14	642.1	642		Apoyo elastometrico	und	6,00	$ 3.704.946,00		0,00	$ 0,00	0%
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	12,00	$ 13.699.284,00		0,00	$ 0,00	0%
16	632.1 P	632,1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	60,00	$ 49.809.960,00		0,00	$ 0,00	0%
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	1,00	$ 77.542.211,00		0,00	$ 0,00	0%
						Total "CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M	**$ 2.984.848.724,00**			**$ 1.684.689.985,50**	
				III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE							
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	400,70	$ 308.751.772,00	57,40	57,40	$ 44.228.479,40	14%
19	682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	96,00	$ 37.381.824,00		0,00	$ 0,00	0%
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144,00	$ 297.056.160,00		0,00	$ 0,00	0%
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	186,00	$ 47.041.260,00	28,70	28,70	$ 7.258.517,00	15%
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1331,00	$ 12.510.069,00	143,50	143,50	$ 1.348.756,50	11%
						Total PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE	**$ 702.741.085,00**			**$ 52.835.752,90**	
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO							
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	440,00	$ 130.601.680,00		0,00	$ 0,00	0%
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	330,00	$ 70.480.740,00		0,00	$ 0,00	0%
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	400,00	$ 374.266.400,00		0,00	$ 0,00	0%
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	126,00	$ 92.428.320,00		0,00	$ 0,00	0%
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	6000,00	$ 51.828.000,00		0,00	$ 0,00	0%
						Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	**$ 719.605.140,00**			**$ 0,00**	
				V. TRANSPORTE							
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	340000,00	$ 614.380.000,00	0,00	0,00	$ 0,00	0%
						Total SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA	**$ 614.380.000,00**			**$ 0,00**	
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							
29	700.1	700		Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	1200,00	$ 2.503.200,00		0,00	$ 0,00	0%
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	und	7,00	$ 3.930.885,00		0,00	$ 0,00	0%
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	80,00	$ 14.228.560,00		0,00	$ 0,00	0%
32	730.2	730		Sección Final	und	4,00	$ 352.728,00		0,00	$ 0,00	0%
33	740.1	740		Captafaros	und	20,00	$ 326.760,00		0,00	$ 0,00	0%
						Total SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	**$ 21.344.153,00**			**$ 0,00**	
						COSTO TOTAL	**$ 5.171.020.822,00**			**$ 1.781.950.138,40**	
						OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	**$ 152.879.720,00**				
						REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 51.012.000,00			$ 51.012.000,00	
						IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y	$ 9.692.280,00			$ 9.692.280,00	
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 60.704.280,00**			$ 60.704.280,00	
						VALOR TOTAL	**$ 5.384.604.822,00**			**$ 1.842.654.418,40**	
										34,22079204163%	

4.7. Gestión de la calidad en obra (Anexa soportes)

Durante la ejecución de las obras se realizaron ensayos de laboratorios de acuerdo a la normatividad vigente.

Así mismo se solito a los proveedores los certificados de calidad de los productos.

4.8. Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. (Anexar soportes)
4.9. Gestión ambiental. (Anexar soportes)

5. DIFICULTADES, INCONVENIENTES E IMPREVISTOS QUE FUERON RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la etapa 1 correspondiente a la revisión de estudios y diseños, se tuvieron que realizar ajustes a los suministrados inicialmente por la entidad.

En la etapa de revisión de estudios y diseños, el municipio no suministro diseño geométrico, lo que conllevo a que el Consorcio Puentes de Córdoba por solicitud de la interventoría Consorcio Vial Nacional, presentara un diseño geométrico.

Se presento diseño geométrico el cual fue aprobado por la interventoría mediante oficio No CVN-267-2023 de fecha 29 de enero del 2023. Este diseño se realizo teniendo en cuenta la normatividad vigente, pero implantar este diseño implica que se tenga que realizar compra de predios que colindan con la zona del proyecto.

El Consorcio Puentes de Córdoba, de acuerdo a requerimiento solicitado por el Consorcio Vial Nacional, presento dos alternativas de diseños geométricos las cuales no implica compra de predios, pero existiría un incumplimiento de la normatividad vigente. Esto fue notificado al municipio de Tierralta por parte de la interventoría y a la fecha no se a obtenido respuesta del diseño geométrico a implementar en la ejecución del proyecto.

A la fecha no se tiene un balance de mayores y menores cantidades, todo esto motivado ya que a la fecha del presente informe no se a determinado el diseño geométrico a implantar
.

DOCUMENTACION

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1.	DEFINICIONES
CLÁUSULA 2.	OBJETO
CLÁUSULA 3.	ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4.	PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5.	VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6.	ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7.	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8.	FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15.	MULTAS
CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17.	CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18.	GARANTÍAS
CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20.	INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21.	CESIÓN
CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24.	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre el representante legal del MUNICIPIO DE TIERRALTA, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202-152753, (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 0811 de fecha veinticinco (25) de julio de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-013-2022

II. Que mediante Resolución No. 0863 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-013-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.


El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.


CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

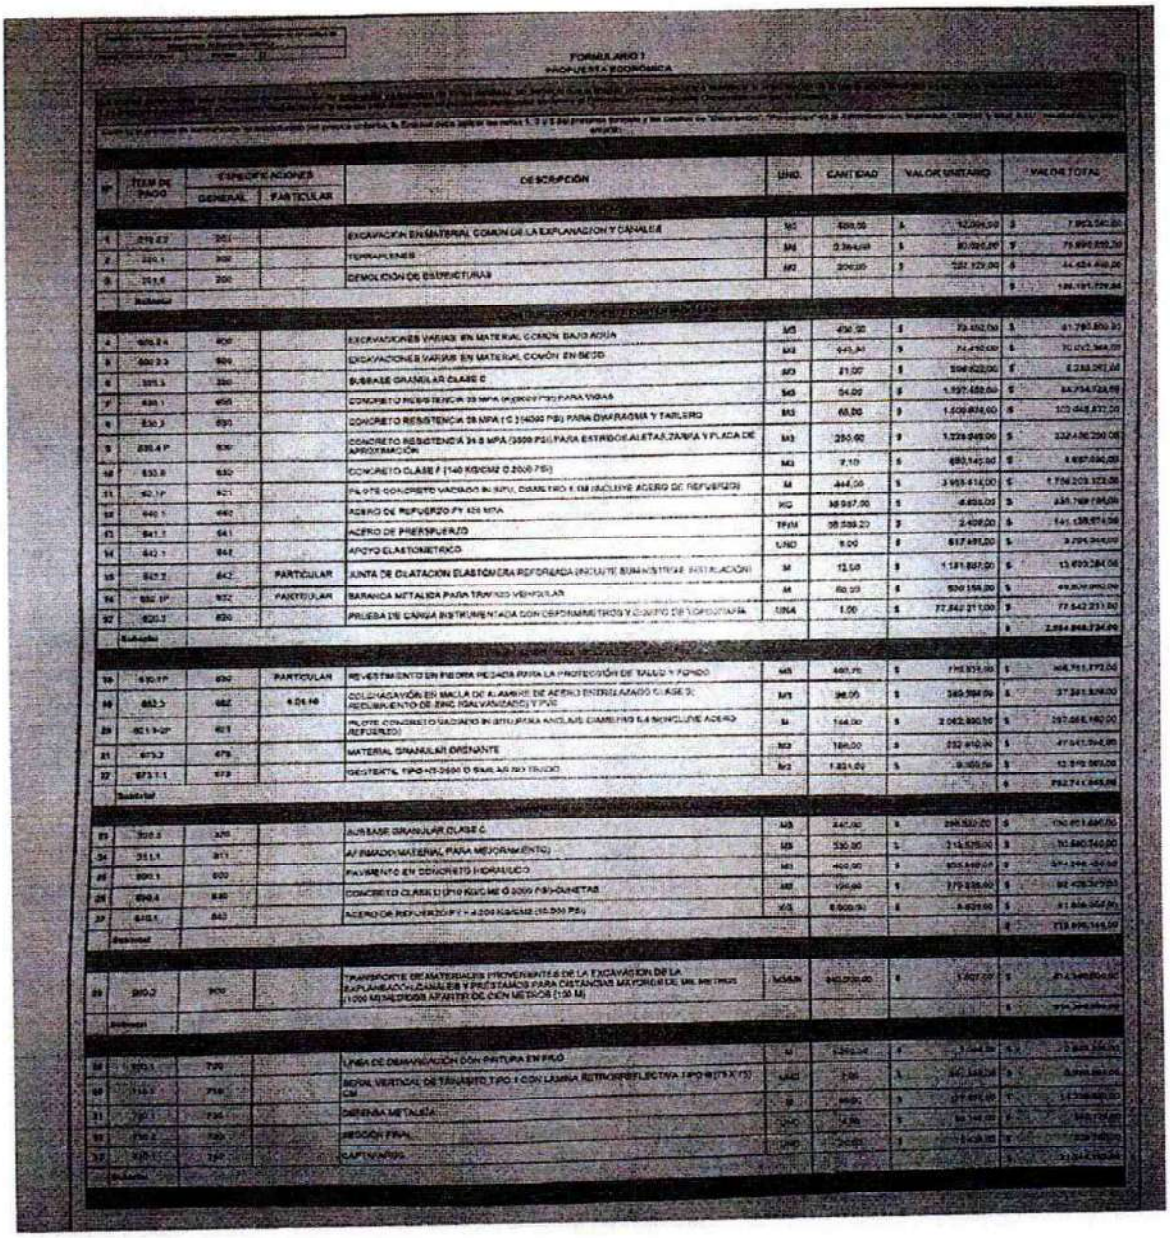

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	210.2.2	201		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	500,00	$ 12.000,00	$ 7.992.000,00
2	220.1	300		TERRAPLENES	M3	2.364,00	$ 80.000,00	$ 79.680.000,00
3	203.6	200		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	200,00	$ 222.120,00	$ 44.424.000,00
	Subtotal							$ 132.101.729,84
4	600.2.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	450,00	$ 73.452,00	$ 33.053.400,00
5	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	943,84	$ 74.450,00	$ 70.272.368,00
6	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	21,00	$ 396.622,00	$ 8.329.062,00
7	630.1	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (4.000 PSI) PARA VIGAS	M3	54,00	$ 1.527.456,00	$ 82.472.624,00
8	630.3	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (4.000 PSI) PARA DIAFRAGMA Y TABLERO	M3	68,00	$ 1.509.804,00	$ 102.666.672,00
9	630.4 P	630		CONCRETO RESISTENCIA 34.5 MPA (5000 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZAPATA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	250,00	$ 1.329.648,00	$ 332.412.000,00
10	630.5	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	7,10	$ 980.140,00	$ 6.957.994,00
11	621.1P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1.0M INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	444,00	$ 3.953.414,00	$ 1.756.215.324,00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38.957,00	$ 4.459,00	$ 173.749.763,00
13	641.1	641		ACERO DE PRESFUERZO	TRVM	38.599,20	$ 2.408,00	$ 141.138.874,56
14	642.1	642		APOYO ELASTOMETRICO	UND	9,00	$ 817.691,00	$ 9.204.949,00
15	643.2	643	PARTICULAR	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M	12,50	$ 1.181.897,00	$ 13.659.284,00
16	652.1P	652	PARTICULAR	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	60,00	$ 500.158,00	$ 29.809.980,00
17	620.2	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y CENTRO DE TOPOGRAFIA	UNA	1,00	$ 77.642.211,00	$ 77.642.211,00
	Subtotal							$ 2.884.868.734,56
18	630.1P	630	PARTICULAR	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO	M3	440,70	$ 716.819,00	$ 315.761.772,00
19	682.5	682	4.06.19	COLCHOGAVIÓN EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	96,00	$ 389.994,00	$ 37.391.424,00
20	621.1-2P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA ANCLAJE DIAMETRO 0.6 INCLUYE ACERO REFUERZO	M	144,00	$ 2.062.930,00	$ 297.058.992,00
21	673.2	673		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	188,00	$ 252.410,00	$ 47.941.394,00
22	673.1.1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	1.831,00	$ 5.100,00	$ 12.910.569,00
	Subtotal							$ 752.741.845,00
23	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	447,00	$ 299.550,00	$ 133.891.650,00
24	311.1	311		AFIRMADO MATERIAL PARA MEJORAMIENTO	M3	530,00	$ 214.575,00	$ 70.840.140,00
25	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	400,00	$ 805.440,00	$ 321.346.464,00
26	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI)-CUNETAS	M3	100,00	$ 979.836,00	$ 98.428.347,00
27	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	6.900,00	$ 4.459,00	$ 31.856.562,00
	Subtotal							$ 719.995.163,00
28	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION,CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 METROS) A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/KM	840.000,00	$ 1.407,00	$ 1.181.880.000,00
	Subtotal							$ 1.181.880.000,00
29	700.1	700		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	1.200,00	$ 1.846,00	$ 2.215.200,00
30	713.1	713		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO II CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	7,00	$ 462.240,00	$ 3.235.680,00
31	720.1	720		DEFENSA METALICA	M	400,00	$ 977.000,00	$ 391.000.000,00
32	700.2	700		DEMOCION FINAL	GLO	1,00	$ 80.744,00	$ 80.744,00
33	630.1	630		CAPTA AGUAS	UND	20,00	$ 1.436,00	$ 28.720,00
	Subtotal							$ 396.560.344,00

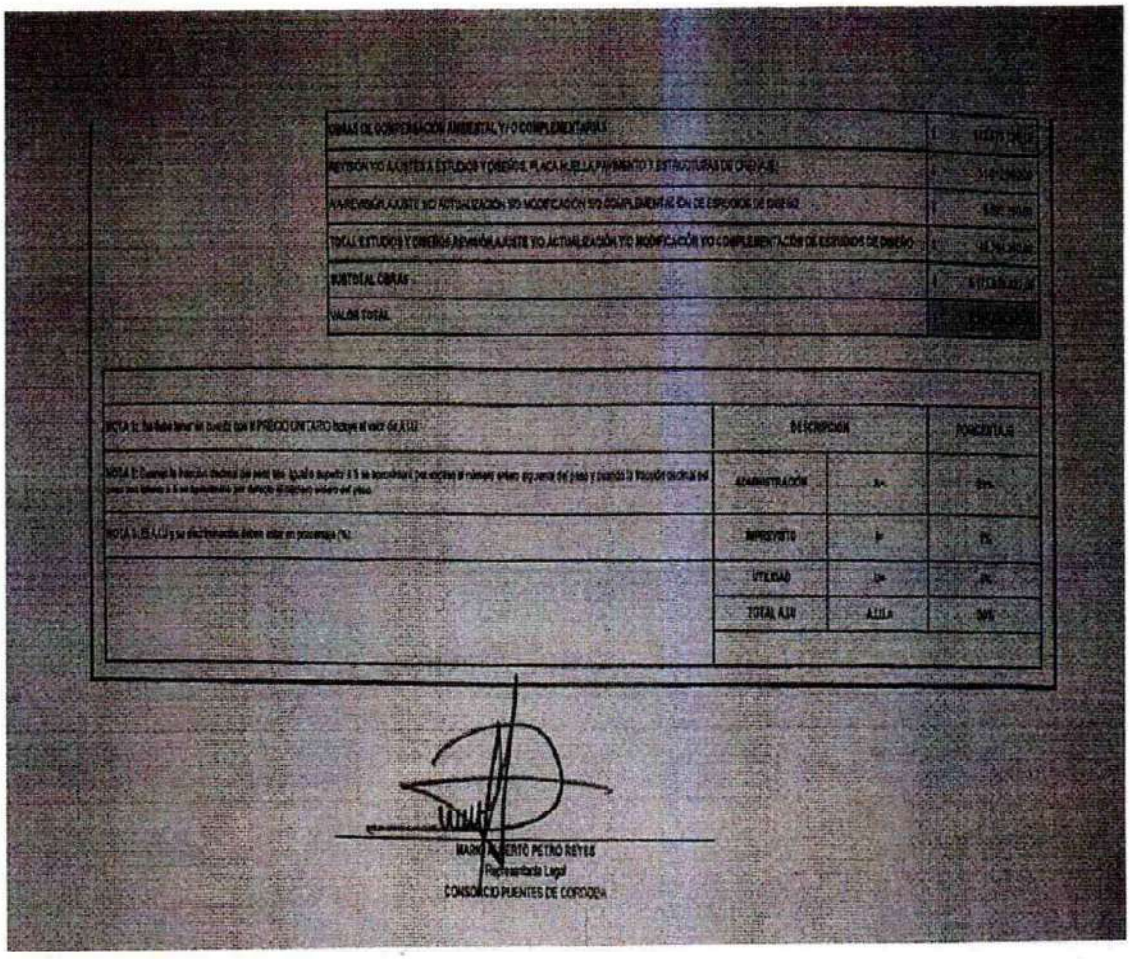

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO.

ANTICIPO. En el presente proceso de contratación, la entidad entregará al contratista a título de Anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del contrato. Este porcentaje se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos.

MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de conformidad con lo previsto en la ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la

comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. **PARÁGRAFO**: Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: **1)** Valla informativa donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas por la entidad. **2)** Póliza debidamente aprobada. **3)** Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor.
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Tierralta, Córdoba, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.


Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.

- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad No 20220423 de fecha 17 de mayo de 2022, por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.400.000.000,00), evidenciado a continuación:

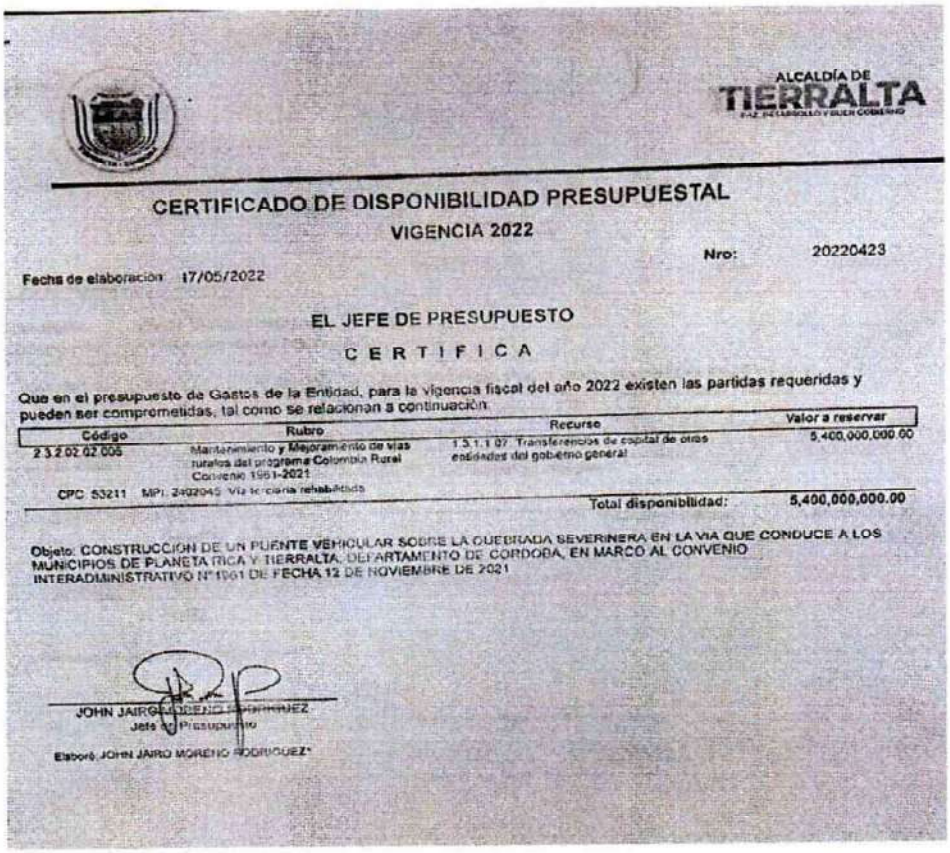

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2022

Nro: 20220423

Fecha de elaboración: 17/05/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	5,400,000,000.00
CPC 53211 MPI: 2402045 Vía terciaria rehabilitada			
		Total disponibilidad:	5,400,000,000.00

Objeto: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES,** de hasta el **90%** del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución con avances superiores al **30%**, la primera acta, no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues estos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará

previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas. **2.- PAGO FINAL**, por valor del 10%, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 51O de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO TERCERO. • El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Instalar una valla informativa de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas por INVIAS.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.
18. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo de este contrato, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993.
19. Las demás obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en los documentos técnicos del proyecto y en el presupuesto oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades y en general las de INVIAS.

Las actividades a realizar son:

a.

ITEMS DE PAGO						
N.°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
EXPLANEACIONES						
1	210.2.2	201		EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	660

2	220.1	202		TERRAPLENES	M3	2364
3	201.6	200		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	200
CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30						
4	600.2.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	400
5	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	940,9
6	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	21
7	630.1	630		CONCRETO RESISTENCIA 35 MPA (A) (5000 PSI) PARA VIGAS	M3	34
8	630.3	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) (4000 PSI) PARA DIAFRAGMA Y TABLERO	M3	68
9	630.4 P	630		CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS, ALETAS, ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	250
10	630.6	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	7,10
11	62.1P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	444,00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38987
13	641.1	641		ACERO DE PREESFUERZO	TF/M	58588,2
14	642.1	642		APOYO ELASTOMETRICO	UND	6
15	642.2	642	PARTICULAR	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	12
16	632.1P	632	PARTICULAR	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	60
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UNA	1
PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE						
18	630.7P	630	PARTICULAR	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO	M3	400,7
19	682.3	682	4.01.16	COLCHAGAVIÓN EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	96
20	621.1-2P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, PARA ANCLAJE DIAMETRO 0,4 M (INCLUYE ACERO REFUERZO)	M	144

21	673.2	673		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	186
22	673.1.1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	1.331
				PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO		
23	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	440,00
24	311.1	311		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	330,00
25	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	400,00
26	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI)-CUNETAS	M3	120,00
27	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	6.000
				TRANSPORTE		
28	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANEACÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) MEDIDOS APARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/MK	340.000
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
29	700.1	700		LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIÓ	M	1.200
30	710.1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRNASITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	7,00
31	730.1	730		DEFENSA METALICA	M	80,00
32	730.2	730		SECCIÓN FINAL	UND	4,00
33	740.1	740		CAPTAFAROS	UND	20,00

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD.

El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa sus actuaciones.

CLÁUSULA 15. MULTAS.

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN salario mínimo legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

Opción 1:
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th colspan="3">Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="3">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">MUNICIPIO DE TIERRALTA - CÓRDOBA identificada con NIT 800096807-0 y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS.</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>10% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo.</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>100% de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>20% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.</td><td>CINCO AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.</td><td>30% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.</td><td>Con una vigencia de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.</td><td>Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos ítems. (Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Característica	Condición
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza

Característica	Condición
Asegurados	MUNICIPIO DE TIERRALTA, identificado con NIT. No. 800096807-0, Instituto Nacional de Vías -INVIAS y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	QUINIENTOS (500) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	MUNICIPIO DE TIERRALTA, identificado con NIT. No. 800096807-0 y el Contratista
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido por la ley.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de TIERRALTA y el domicilio contractual es el Municipio de TIERRALTA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de TIERRALTA, a los Dos (2) días de septiembre de 2022.

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.
Nit No. 901627711-9
R.L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. 73.203.584 DE CARTAGENA.
INGENIERO CIVIL. M.P. No. 22202-152753

DANIEL MONTERO MONTES
Alcalde Municipal.
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyectó Jurídicamente.
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S.
Asesores Externos

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 013 de 2022.

CONTRATO DE OBRA No	013 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIERRALTA
CONTRATISTA	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** Nit 901627711-9 **R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.** C.C. No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**
VALOR	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Entre el representante legal del **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No.013-2022, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES


PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA** y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, celebraron en fecha 2 de septiembre de 2022, el Contrato de Obra Pública No. 013-2021 cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** por un valor de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, y un plazo de ejecución de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDA: Que este contrato se deriva del Convenio Interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de

noviembre de 2021, suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

TERCERA: Que este contrato inició en fecha 19 del mes de Septiembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el acta de inicio debidamente suscrita por el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO**, quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, en calidad de contratista y el señor **SAMIR ASSIAS BERNAL,** como **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.**

CUARTA: Que, el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** en calidad de contratista, mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2022, presentó solicitud de Prorroga al Contrato de Obra Pública No 013- 2022, en el siguiente sentido:

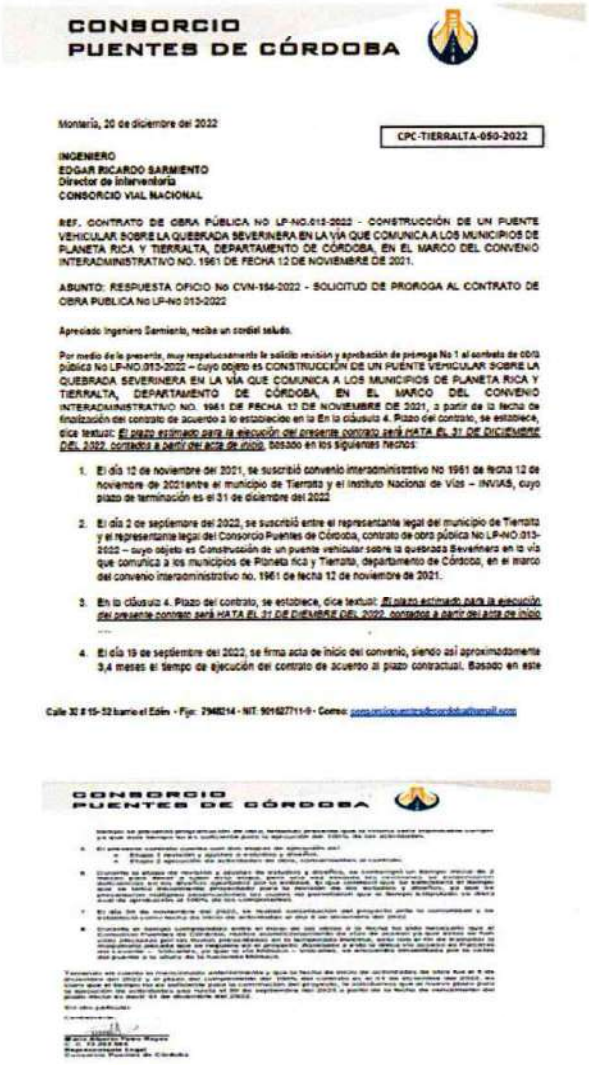

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

Montería, 20 de diciembre del 2022

CPC-TIERRALTA-050-2022

INGENIERO
EDGAR RICARDO SARMIENTO
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO No CVN-154-2022 - SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No 013-2022

Apreciado Ingeniero Sarmiento, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito revisión y aprobación de prorroga No 1 al contrato de obra pública No LP-NO.013-2022 – cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, a partir de la fecha de finalización del contrato de acuerdo a lo establecido en la En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece, dice textual: *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HATA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio*, basado en los siguientes hechos:

1. El día 12 de noviembre del 2021, se suscribió convenio interadministrativo No 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021entre el municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, cuyo plazo de terminación es el 31 de diciembre del 2022
2. El día 2 de septiembre del 2022, se suscribió entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba, contrato de obra pública No LP-NO.013-2022 – cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severinera en la vía que comunica a los municipios de Planeta rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio interadministrativo no. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021.
3. En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece, dice textual: *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HATA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio*
4. El día 19 de septiembre del 2022, se firma acta de inicio del convenio, siendo así aproximadamente 3,4 meses el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo al plazo contractual. Basado en este

Calle 32 # 15-52 barrio el Edén - Fijo: 7948214 - NIT: 901627711-9 - Correo: consorcio.puentescordoba@gmail.com

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

QUINTA: Que mediante Oficio de fecha 29 de diciembre de 2022, el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO**, quien actúa en calidad de Interventor, avala la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No 013-2022, tal como se evidencia a continuación:

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Montelíbano, 29 de diciembre de 2022 CVN-240 -2022

Señor
MARIO ALBERTO PETRO REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
Montería - Córdoba

REFERENCIA: LP-MV- 013-2022- CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: Respuesta a su comunicado No CPO-TIERRALTA-050-2022 y CPC-TIERRALTA-055-2022.

Cordial saludo:

La Interventoría Consorcio Vial Nacional informa que, en cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el contrato de interventoría No 979 de 2022 y el manual de interventoría del INVIAS 2022 y una vez revisado el comunicado del asunto, manifiesta que, AVALA LA SOLICITUD DE PRORROGA del contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA del contrato de obra No LP-013-2022 por los motivos expuestos en su comunicado, toda vez que es claro para esta interventoría, la imposibilidad que tiene el contratista de obras en ejecutar la totalidad de las obras físicas del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y dar cabal cumplimiento al objetivo contractual.

Por lo anteriormente dicho, la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, considera necesario AVALAR la solicitud de prórroga del contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA, con fecha de inicio 29 de diciembre de 2022 hasta el día 30 de septiembre de 2023.

Concomitantemente, se aprueba la reprogramación del programa de Inversiones No 1 presentada por el contratista de obras, presentada mediante comunicado CPC- TIERRALTA-056-2022.

Así las cosas, esta interventoría no encuentra inconvenientes y considera necesario OTORGAR la prórroga solicitada por el contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

Cordialmente,

CONSORCIO VIAL NACIOAL
EDGAR RICARDO SARMIENTO Director de Interventoría

Anexo- - 29-12-2022 MEPI-MNT-IN-5-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV
cc- -Ing. Nestor Lemus – Supervisor del Contrato INVIAS.
-Ing. Marc Guerra- Secretario de Obras Publicas – Alcaldía de Tierralta.

Calle 30 # 26 - 53 Cañaveral Telefax: (7) 6782238 6782236 6566100 Celular: (03311) 4408661
E-mail: cvianacional@gmail.com - gerencia@esaorg.com Floridablanca - Colombia

SEXTA: Que, en atención a la solicitud elevada por el municipio de Tierralta, considerando la necesidad de la prórroga del Contrato de Obra No 013 de 2022, se prorrogó, el Convenio Interadministrativo No 1961 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVAS y el MUNICIPIO DE TIERRALTA, del cual se deriva el presente contrato, por un plazo de contado desde el 31 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, tal como a continuación se evidencia:

INVIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1961 DE 2021
PRÓRROGA NÚMERO UNO [01] DE 2022

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT:800.215.807-2 MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA NIT. 800.096.807-0

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3655 del 15 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 15 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, identificado con cédula de ciudadanía 78.764.751 expedida en Tierralta (Cordoba), en su calidad de **ALCALDE**, posesionado mediante Acta No. 001 del 31 de diciembre de 2019 ante la Notaria Única del Circulo de Tierralta, facultado para la suscripción del presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominara **EL MUNICIPIO**, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Numero 1961 del 16 de noviembre de 2021, hemos convenido suscribir la presente prorroga previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1). Que, mediante oficio fecha 31 de agosto de 2022, EL MUNICIPIO solicita prorroga del Convenio Interadministrativo Numero 1961 de 2021. Así mismo EL MUNICIPIO se compromete a realizar el tramite de reserva presupuestal y la incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2023 del Convenio Numero 1961 de 2021.

2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prorroga del convenio, de fecha 01 de septiembre de 2022, suscrito por el Alcalde, el Directo de Interventoría, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E).

3). Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 73 del 19 de diciembre de 2022.

4). Que con Memorando SVR 108089 del 26 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prorroga del convenio.

INVIAS

5.) Que se evidencia que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 01 de septiembre de 2022, EL INSTITUTO giró al MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1961 de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021 y las siguientes clausulas:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021, desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.


PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

SÉPTIMA: Que, en razón a lo anterior, el Secretario de Obras Publicas del Municipio, mediante Oficio de fecha 29 de Diciembre de 2022, remitió al Alcalde del Municipio de Tierralta, solicitud para la formalización de Prórroga al Contrato de Obras Públicas No 013 – 2022, tal como seguidamente se evidencia:

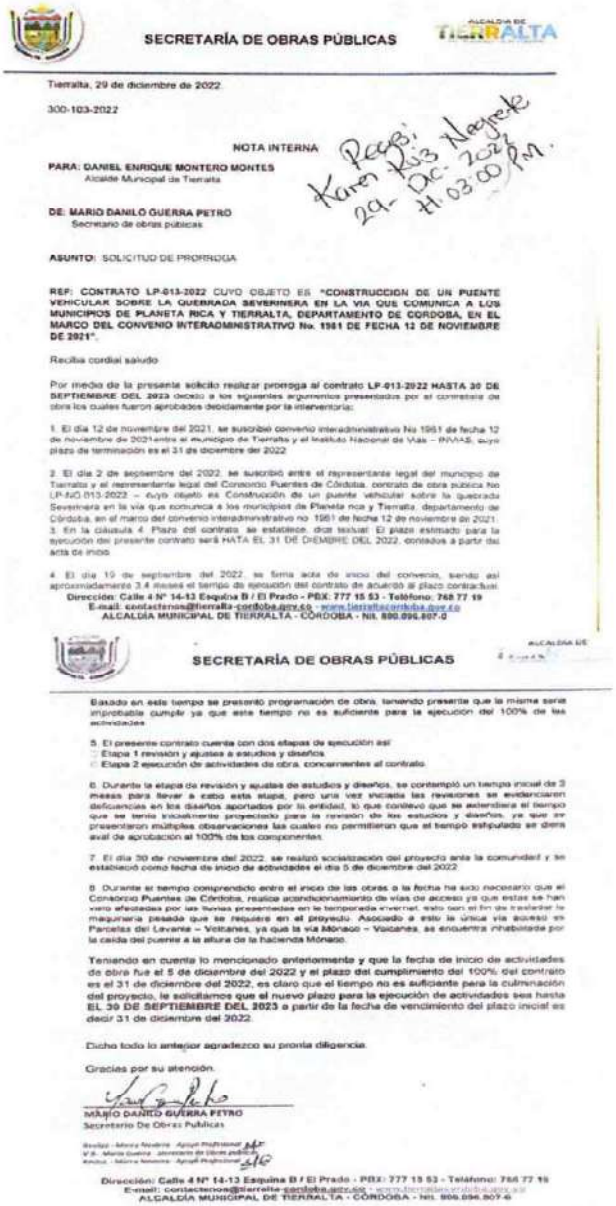

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Tierralta, 29 de diciembre de 2022

300-103-2022

NOTA INTERNA

Recibí; Karen Kiz Negrete 29- Dic- 2022 H: 03:00 PM.

PARA: DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES
Alcalde Municipal de Tierralta

DE: MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario de obras públicas

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

REF: CONTRATO LP-013-2022 CUYO OBJETO ES: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".**

Reciba cordial saludo

Por medio de la presente solicito realizar prorroga al contrato **LP-013-2022 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** debido a los siguientes argumentos presentados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados debidamente por la interventoria:

1. El día 12 de noviembre del 2021, se suscribió convenio interadministrativo No 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021 entre el municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, cuyo plazo de terminación es el 31 de diciembre del 2022

2. El día 2 de septiembre del 2022, se suscribió entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba, contrato de obra pública No LP-NO 013-2022 – cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severinera en la vía que comunica a los municipios de Planeta rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio interadministrativo no 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021.
3. En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece, dice textual: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HATA EL 31 DE DIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio

4. El día 19 de septiembre del 2022, se firma acta de inicio del convenio, siendo así aproximadamente 3.4 meses el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo al plazo contractual.

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierraltacordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Basado en este tiempo se presento programación de obra, teniendo presente que la misma seria improbable cumplir ya que este tiempo no es suficiente para la ejecución del 100% de las actividades

5. El presente contrato cuenta con dos etapas de ejecución así:
- Etapa 1 revisión y ajustes a estudios y diseños.
- Etapa 2 ejecución de actividades de obra, concernientes al contrato.

6. Durante la etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, se contempló un tiempo inicial de 3 meses para llevar a cabo esta etapa, pero una vez iniciada las revisiones se evidenciaron deficiencias en los diseños aportados por la entidad, lo que conllevo que se extendiera el tiempo que se tenia inicialmente proyectado para la revisión de los estudios y diseños, ya que se presentaron múltiples observaciones las cuales no permitieron que el tiempo estipulado se diera aval de aprobación al 100% de los componentes.

7. El día 30 de noviembre del 2022, se realizó socialización del proyecto ante la comunidad y se estableció como fecha de inicio de actividades el día 5 de diciembre del 2022

8. Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las obras a la fecha ha sido necesario que el Consorcio Puentes de Córdoba, realice acondicionamiento de vías de acceso ya que estas se han visto afectadas por las lluvias presentadas en la temporada invernal, esto con el fin de trasladar la maquinaria pesada que se requiere en el proyecto. Asociado a esto la única vía acceso es Parcelas del Levante – Volcanes, ya que la vía Mónaco – Volcanes, se encuentra inhabilitada por la caída del puente a la altura de la hacienda Mónaco.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que la fecha de inicio de actividades de obra fue el 5 de diciembre del 2022 y el plazo del cumplimiento del 100% del contrato es el 31 de diciembre del 2022, es claro que el tiempo no es suficiente para la culminación del proyecto, le solicitamos que el nuevo plazo para la ejecución de actividades sea hasta EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial es decir 31 de diciembre del 2022.

Dicho todo lo anterior agradezco su pronta diligencia.

Gracias por su atención.

MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario De Obras Publicas

Revisó - Mirza Nodarse - Apoyo Profesional
V.B. - Mario Guerra - Secretario de Obras públicas
Anexo: - Mirza Nodarse - Apoyo Profesional

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierraltacordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0

OCTAVA: Considerando lo antes expuesto, esta entidad prorrogará el término de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación.

NOVENA: Con fundamento en las consideraciones que preceden, resulta evidente que es deber del Municipio de Tierralta, previa manifestación de voluntad del señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, en calidad de contratista.

En tal sentido las partes de común acuerdo han decidido:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 007- 2021, **HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"

CLAUSULA SEGUNDA: La presente prórroga no genera pagos adicionales a favor del contratista de los que ya vienen previstos para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el Contrato de Obra No 007-2021, conforme a la presente prórroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato quedarán de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el Municipio de TIERRALTA, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES.
Alcalde.
MUNICIPIO DE TIERRALTA.

ORIGINAL FIRMADO
CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
Nit 901627711-9
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No 73.203.584 de Cartagena.-
Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 32 15 52 BRR EL EDEN

42. Correo electrónico consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 6 3 8 1 0 3	6 0 4 7 9 4 8 2 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 2 0 7 2 5	4 2 9 0	2 0 2 2 0 7 2 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 15 / 11 : 36: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PETRO REYES MARIO ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-09-2022 11:48:51AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 2 3 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 8 3 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 2 0 3 5 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PETRO	REYES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 7 9 2 1 6 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	MURILLO	JULIAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 4 3 4 6 3	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 5	2 0 2 2 0 7 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 0 7 9 5 1	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA TERLUZ S.AS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 7 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 0 2 7 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 7 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 1 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 013 DE 2022, SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 30-SEPTIEMBRE DE 2023 QUEDANDO AJUSTADO COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****897,534.00	$ *******3,000.00	$ *****171,101.00	$ *********1,071,635.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:** 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELEFONO:** 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ZULLYGOMEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****897,534.00	$ *******3,000.00	$ *****171,101.00	$ *********1,071,635.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100710397860 5(3900)000001071635(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710397860-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ZULLYGOMEZ 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL MPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/03/2024	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	30/09/2026	$1,076,920,965.00	$1,076,920,965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/03/2024	$538,460,483.00	$538,460,483.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 1 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 013 DE 2022, SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 30-SEPTIEMBRE DE 2023 QUEDANDO AJUSTADO COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,360,202.00	$ *******8,000.00	$ *****829,958.00	$ *********5,198,160.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,360,202.00	$ *******8,000.00	$ *****829,958.00	$ *********5,198,160.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709938021167(8020)1100710397859 7(3900)000005198160(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710397859-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9	
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0	
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ZULLYGOMEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054903, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de ENERO de 2023

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE.

SE HACE ACTUALIZACION DE POLIZA SEGÚN ANEXO 3 Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CON ACTA PRORROGA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, NUEVA FECHA DE TERMIONACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA CUAL SE AJUSTAN LOS AMPAROS

PÓLIZA N°.	36-44-101054903 ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA INSTITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS	VIGENCIA:	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	02/09/2022 – 30/03/2024	$1.615.381.447,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022 – 30/19/2026	$1.076.920.965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 - 02/09/2027	$10.211.284.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$1.615.381.447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/03/2024	$538.460.483,00

PÓLIZA N°.	36-40-101021458 ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022-30/09/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Diez (10) días del mes de Abril de 2023.

NAIRO JOSE ZAPATA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****394,520.00	$ *******3,000.00	$ ******75,528.00	$ **********473,049.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELEFONO
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9	
DIRECCION: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELEFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELEFONO
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0	
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELEFONO: 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA	ADICIONAL:	

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Efecty · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****394,520.00	$ *******3,000.00	$ ******75,528.00	$ **********473,049.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100710389655 8(3900)000000473049(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710389655-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL MPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/06/2023	$1,615,381,447.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	31/12/2025	$1,076,920,965.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2023	$538,460,483.00	

ACLARACIONES

SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCION: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NEILMATALLANA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE TIERRALTA

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE .

PÓLIZA N°.	**36-44-101054903**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	02/09/2022 – 31/12/2025	$1.076.920.965.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284.00

PÓLIZA N°.	**36-40-101021458**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Nueve (09) días del mes de Septiembre de 2022.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista.

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500.000.000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	

ACLARACIONES

SE HACE CONSTAR QUE SE INCLUYE A LA PRESENTE POLIZA EL ACTA DE INICIO DE FECHA SEPTIEMBRE 19 DE 2022 AL CONTRATO No 013 DE 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCION:	CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:** 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL MPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/06/2023	$1,615,381,447.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	31/12/2025	$1,076,920,965.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,615,381,447.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2023	$538,460,483.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE INCLUYE A LA PRESENTE POLIZA EL ACTA DE INICIO DE FECHA SEPTIEMBRE 19 DE 2022 AL CONTRATO No 013 DE 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NEILMATALLANA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.. equivalentes a 5 384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de HASTA 31 DE DICIEMBRE

SE HACE ACTUALIZACION DE POLIZA SEGÚN **ANEXO 2** Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CON ACTA DE INCIO DE FECHA 19 DE SEPTEIMBRE DE 2022.

PÓLIZA N°.	**36-44-101054903** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA INSTITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022 – 31/12/2025	$1.076.920.965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022-02/09/2027	$10.211.284.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$1.615.381.447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483,00

PÓLIZA N°.	**36-40-101021458** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022-31/12/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta a los Siete (07) días del mes de Octubre de 2022.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista

MUNICIPIO DE TIERRALTA

TIERRALTA -
Tels: +57 4 777 1553
Nit: 800096807-0

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2022

Fecha de elaboración: 02/08/2022 Nro: 20220853
Id.único: 20220853

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Código	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20220423	2.3.2.02.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	5,384,604,822.00
CPC: 53211 MPI: 2402045: Vía terciaria rehabilitada				

SubTotal:	5,384,604,822.00
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	5,384,604,822.00

A favor de: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Identificado con el documento Nro: 901627711-9

Con el siguiente objeto: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RO

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B/ El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierralta-cordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0

www.grupometrods.com

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2022

Nro: 20220423

Fecha de elaboración: 17/05/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	5,400,000,000.00
CPC: 53211	MPI: 2402045: Vía terciaria rehabilitada		
		Total disponibilidad:	**5,400,000,000.00**

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ*

Escaneado con CamScanner

LP-No.013-2022

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE TIERRALTA
Calle 4 Esquina No. 14-13, Palacio Municipal
Tierralta, Córdoba

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-No.013-2022 en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**

Estimados señores:

Los suscritos, **EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA** actuando en nombre y representación legal de **INCON S.A.S.** identificada con NIT 800.043.463-3, **GERMÁN JOSÉ BULA MONTERROZA** actuando en nombre y representación legal de **CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.** identificada con NIT 901.407.951-6 y **JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO** actuando en nombre y representación legal de **IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.** identificada con NIT 901.320.275-1, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
INCON S.A.S.	55%
CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.	5%
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	40%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
3. El objeto del consorcio es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**

Escaneado con CamScanner

4. La duración del consorcio es igual al plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es MARIO ALBERTO PETRO REYES identificado con cédula de ciudanía No. 73.203.584 de Cartagena, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante legal suplente del consorcio es JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO identificado con cédula de ciudanía No. 1.067.921.644 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal principal del Consorcio.
8. El Señor MARIO ALBERTO PETRO REYES acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
9. El Señor JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizarán INCON S.A.S., CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S. e IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.
11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo:	Cl 32 15 52
Dirección electrónica:	iberica_ic@hotmail.com – licitaciones.inconsas@gmail.com
Teléfono:	7948214
Ciudad:	Montería

En constancia, se firma en Montería, a los (25) días del mes de julio de 2022.

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
CC 1.005.240.601 de Barrancabermeja
R.L INCON S.A.S.

GERMÁN JOSÉ BULA MONTERROZA
CC 10.886.799 de San Marcos
R.L CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.

JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO
CC 1.067.921.644 de Montería
R.L IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.

Escaneado con CamScanner

Aceptamos,

MARIO ALBERTO PETRO REYES
CC 73.203.584 de Cartagena
R.L CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO
CC 1.067.921.644 de Montería
R.L (S) CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Escaneado con CamScanner

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA Sistema de Gestión Integrado	CODIGO Código :GJ-M03.F0
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ACTA DE INICIO	FECHA:10-09-2021
		PÁGINA 1 de 2

CONTRATO NO:	013 DE 2022.
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO VIAL NACIONAL**
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	PARA EL PRESENTE CONTRATO LA ENTIDAD ENTREGARÁ AL CONTRATISTA A TÍTULO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO. MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.620.000.000,00)
FECHA ENTREGA ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	20220853 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En el municipio de Tierralta a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los siguientes señores a saber: el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 DE BUCARAMANGA quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202-152753 como contratista y el señor **SAMIR ANTONIO ASSIAS BERNAL,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.073.971.711 de Tierralta, como secretario de obras públicas del Municipio de Tierralta; con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva de las actividades indicadas en el objeto contractual.

Garantía	Póliza No.	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	**36-44-101054903**	02/09/2022	30/06/2023
Prestaciones Sociales	**36-44-101054903**	02/09/2022	31/12//2025
Responsabilidad Civil	**36-40-101021458**	02/09/2022	31/12/2022
Estabilidad / Calidad de la obra	**36-44-101054903**	02/09/2022	02/09/2027

Para constancia se firma la presente acta en original y copia por los que en ella intervinieron.

Secretario de Obras Públicas.

Interventor

Contratista.

PLANILLAS

121

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1721118165	5441784813	E	2022/10/05	2022/10/25	BANCO DAVIVIENDA	20	$757,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 26203317	CARRASCAL AYLEN	25-14	12	$1,540,000	$246,400	EPS005	12	$1,540,000	$61,600	CCF16	12	$1,540,000	$61,600	14-11	12	$1,540,000	$107,200	12	$0	$0
2	CC 1067836657	GONZALEZ MARIA	230301	12	$460,000	$73,600	EPS037	12	$460,000	$18,400	CCF16	12	$460,000	$18,400	14-11	12	$460,000	$32,109	12	$0	$0
3	CC 1073968704	OVIEDO ANDRES	230301	12	$400,000	$64,000	CCFC55	12	$400,000	$16,000	CCF16	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$384,000	$7,500	$0	$391,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,400	$4,800	$0	$251,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$137,600	$2,700	$0	$140,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$167,200	$3,200	$0	$170,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$167,200	$3,200	$0	$170,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$96,000	$1,900	$0	$97,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$96,000	$1,900	$0	$97,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$96,000	$2,000	$0	$98,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$16,000	$400	$0	$16,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$18,400	$400	$0	$18,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,600	$1,200	$0	$62,800
TOTAL				3	$743,200	$14,600	$0	$757,800

2022/10/24 07:28 PM

122

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	94426011538	94426011538	E	2022/11/03	2022/11/11	BANCO BOGOTA	8	$1,883,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	26203317	CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC	1067836457	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
4	CC	1073968704	OVIEDO ANDRES	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$6,033,334**	**$965,400**			**$6,033,334**	**$241,400**			**$6,033,334**	**$241,400**			**$6,033,334**	**$420,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$965,400	$7,900	$0	$973,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$5,000	$0	$621,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$349,400	$2,900	$0	$352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
COMFACOR	CCF16	891.080.005	1	4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$241,400	$2,100	$0	$243,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,600	$0	$195,600
TOTAL				4	$1,868,300	$15,400	$0	$1,883,700

2022/11/10 04:04 PM

123

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9443189822	9443189822	E	2022/12/05	2022/12/05	BANCO BOGOTA	0	$1,857,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	26203317	CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC	1067836657	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					**$6,000,000**	**$960,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**	**$240,000**			**$6,000,000**	**$417,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,000	$0	$0	$960,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$0	$0	$616,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$417,700	$0	$0	$417,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$417,700	$0	$0	$417,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$240,000	$0	$0	$240,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$0	$0	$46,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$0	$0	$194,000
TOTAL				3	$1,857,700	$0	$0	$1,857,700

2022/12/02 04:05 PM

124

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901427711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	10524119471	94452334456	E	2023/01/04	2023/01/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CE	343051347	CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC	1067336457	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,000	$6,600	$0	$966,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$4,200	$0	$620,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$2,400	$0	$346,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$240,000	$1,800	$0	$241,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,400	$0	$195,400
TOTAL				3	$1,857,700	$13,000	$0	$1,870,700

2023/01/06 08:10 PM

Powered by CamScanner

125

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7941214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1905408081	94466048860	E	2023/02/03	2023/02/07	BANCOLOMBIA	4	53,037,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAITH	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$266,000	30	$0	$0
3	CC	1066729219	DIAZ LAMBRAÑO OVER SEGUNDO	230201	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
4	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1003199520	MARQUEZ M SPERLIZA JA DER MANUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
6	CC	15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	231001	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
7	CC	10950737	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230201	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
8	CC	1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230201	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
9	CC	1065014867	MONTOYA GUERRA ERLIN PASCUAL	230201	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC	15674942	MORALES HOYOS JOSE SILVESTRE	231001	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
11	CC	78034211	NEGRETE FUENTES FRANCISCO JAVIER	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
13	CC	1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	4	$154,667	$24,800	CCFC35	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
14	CC	78033723	PEROZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	3482129	SOLORZANO BARROS JUAN GUILLERMO	25-14	11	$916,667	$146,700	EPS037	11	$916,667	$36,700	CCF16	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$61,900	11	$0	$0
16	CC	15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
17	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					$9,754,670	$1,561,100			$9,754,670	$390,700			$9,754,670	$390,700			$9,754,670	$679,400		$0	$0

2023/02/07 12:20 PM

Powered by CamScanner

126

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,561,300	$7,600	$0	$1,568,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$105,300	$500	$0	$105,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$762,700	$3,700	$0	$766,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$557,000	$2,700	$0	$559,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$136,300	$700	$0	$137,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$679,400	$3,300	$0	$682,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$679,400	$3,300	$0	$682,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$390,700	$2,200	$0	$392,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$6,200	$100	$0	$6,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$3,200	$100	$0	$3,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$89,300	$500	$0	$89,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$59,000	$300	$0	$59,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$32,600	$200	$0	$32,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$200,400	$1,000	$0	$201,400
TOTAL				17	$3,022,100	$15,000	$0	$3,037,100

2023/02/07 12:20 PM

Powered by CamScanner

127

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1956864313	9448008183	E	2023/03/03	2023/03/07	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,370,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEH MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	15051799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
4	CC	1133796342	FLOREZ HERNANDEZ DARLEY ANDRES	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC07	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	1067836657	GONZALEZ AVILA MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
7	CC	15679590	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
8	CC	1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003562568	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC07	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC07	27	$1,044,000	$41,800	CCF16	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,900	27	$0	$0
11	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
12	CC	1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
14	CC	15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			**$14,040,002**	**$2,246,900**			**$14,040,002**	**$561,900**			**$14,040,002**	**$561,900**			**$14,040,002**	**$977,900**		**$0**	**$0**

2023/ 07 10:21 AM

128

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,246,900	$11,100	$0	$2,258,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$6,000	$0	$1,231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$934,600	$4,600	$0	$939,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$86,700	$500	$0	$87,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$561,900	$3,100	$0	$565,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$65,100	$400	$0	$65,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$109,300	$600	$0	$109,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$29,500	$200	$0	$29,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$58,800	$300	$0	$59,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$1,000	$0	$207,400
TOTAL				14	$4,348,600	$21,800	$0	$4,370,400

2023. 07 10:21 AM

129

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009277811	9449271224	E	2023/04/05	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$5,859,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1067960563	ARIAS NAVARRO JOEY MIGUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	1003 1799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF16	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
5	CC	1133766343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
6	CC	1073974405	GONZALEZ ACOSTA FAIDER ELIAR	230301	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
7	CC	1067836657	GONZALEZ AYLIE MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1003191520	MARQUEZ HISPERUZA JAIDER MANUEL	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
9	CC	15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
10	CC	10950737	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
11	CC	1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC	1066729226	MONTES SALGADO ALEXIS MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
13	CC	15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
14	CC	6844753	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
15	CC	1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
17	CC	78033729	PEROZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
18	CC	1003562568	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230201	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1073992746	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	230201	8	$309,334	$49,500	CCFC55	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
21	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
22	CC	1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
24	CC	15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
25	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	230301	11	$425,334	$68,100	ESSC07	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
Total			**Afiliados(25)**			**$18,912,009**	**$3,026,500**			**$18,912,009**	**$757,300**			**$18,912,009**	**$757,300**			**$18,912,009**	**$1,318,000**		**$0**	**$0**

2023, 05 11:02 AM

130

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$3,026,500	$0	$0	$3,026,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$136,200	$0	$0	$136,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
PORVENIR	230101	800,224,808	8	15	$1,373,800	$0	$0	$1,373,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$290,900	$0	$0	$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$757,300	$0	$0	$757,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,800	$0	$0	$58,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$94,500	$0	$0	$94,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$191,400	$0	$0	$191,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$93,100	$0	$0	$93,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$100,700	$0	$0	$100,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$0	$0	$206,400
TOTAL				25	$5,859,100	$0	$0	$5,859,100

2023/[illegible] 05 11:02 AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1 de 1 1
		PÁGINA	

FECHA: 24/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-No.013-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES			$ 552.223.905,00		$ 552.223.905,00	34%
2	TRANSPORTE			$ 160.352.755,00		$ 160.352.755,00	10%
3	MANO DE OBRA			$ 902.804.787,00		$ 902.804.787,00	56%
	TOTAL	$ -		$ 1.615.381.447,00		$ 1.615.381.447,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es **responsabilidad de la Interventoría verif**icar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: **MARIO ALBERTO PETRO REYES**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:22202152753 COR

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
			VERSIÓN	1 de 1
			PÁGINA	

FECHA: 07/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. LP-No.013-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 255.654.445,00	$ 217.545.293,00	$ 101.728.378,00			$ 574.928.116,00	40%
2	TRANSPORTE	$ 58.814.687,00	$ 28.499.611,00	$ 98.582.687,00			$ 185.896.985,00	10%
3	MANO DE OBRA	$ 427.278.173,00	$ -	$ 427.278.173,00			$ 854.556.346,00	50%
	TOTAL	$ 741.747.305,00	$ 246.044.904,00	$ 627.589.238,00	$ -		**$ 1.615.381.447,00**	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:22202152753 COR

Firma:
Nombre: **JUAN AMADO ELIZARAZO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: MP 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

133

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEP-MAN-IN-6.TR-1		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: DD (Día) MM (Mes) AAAA (Año)

UNIDAD EJECUTORA: AUDICIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES: X

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (De valor base de Notas cuando se la reprograma)

CONTRATO No.: LP-No 015-2020

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SIN NOMBRE LA CUAL CONECTA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y PEUELTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONTENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1560 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y PEUELTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 078-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL:	5 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO	9,4 MESES (En meses según el último OM o Suspensión)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	15/09/2021 (Indique dia/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	HASTA EL 31/03/2022 (Incluidas las suspensiones, Actas y prórrogas)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo de esta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A (Indique fecha/mes/año)
VALOR INICIAL (excluido IVA) (A):	$ 5.364.004.822,10 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (excluido IVA) (B):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 5.364.004.822,10		

GRUPOS PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 NOVIEMBRE	2 DICIEMBRE	3 ENERO	4 FEBRERO	5 MARZO	6 ABRIL	7 MAYO	8 JUNIO	9 JULIO	10 AGOSTO	11 SEPTIEMBRE
I. EXPLANACIONES	$ 339.161.720	2,48%		% P	2,72%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$27.760.700	$69.200.980	$34.439.440	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%										
II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO Lx 30 M	$ 3.964.948.324	57,72%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE	$702.741.085	10,59%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	$719.800.340	10,80%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
V. TRANSPORTE	$814.300.000	11,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$31.344.153	0,47%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%										
GPP7															
GPP8															
TOTAL OTROS ITEMS															
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 6.671.060.820,00	100%													
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (B)															


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,72%	29,42%	0,00%	10,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR Miles de Pesos	$48.760.700	$1.135.080.982	$0	$690.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,72%	100,00%	0,00%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	100,00%
	VALOR Miles de Pesos	$27.760.700	$1.171.080.822	$282.198.047	$709.054.423	$1.497.000.382	$2.247.982.705	$3.048.982.253	$3.048.982.317	$4.156.979.217	$4.671.081.982
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%								
	VALOR Miles de Pesos	$0	$0								
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%								
	VALOR Miles de Pesos	$0	$0								

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$152.879.720
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, DOMINGOS Y/O LA NOCHE	
PROVISION PARA NA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y NOCHE	
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
NA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$60.154.280
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (No Apl. 10%)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PMGA 6.10%)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (D)	$212.034.000
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (D')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$5.364.004.822
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la programación inicial o aprobada o modificación contractual.

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones) e IVA.
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan discriminar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CURVA S



CONVENCIONES		
VALOR BASICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: LA REPROGRAMACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES No I INICIA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y FINALIZA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Elaboró: Firma
Nombre: MAIKEL ALBERTO PETRO REYES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 20202-152703 CDR

Aprobó: Firma
Nombre: EDGAR RICARDO RAMIENTO PEÑA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No. 25202-0036 CND

Aprobó: Firma
Nombre:
cargo de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó: Firma
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Revisó: Firma
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó: Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Gestor Técnico, Interventor o Supervisor y Contratista

141

INFORMES MENSUALES
FIDUCIA

PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUENTA BANCARIA 220-150-19380-3 POPULAR

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	ORDEN No. 01	ORDEN No. 02	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Materiales	$ 552.223.905,00		$ 255.654.445,00	$ 296.569.460,00
2	Transporte	$ 160.352.755,00	$ 58.814.687,00		$ 101.538.068,00
3	Mano de obra	$ 902.804.787,00	$ 427.278.173,00		$ 475.526.614,00
	Total Plan De Inversion	**$ 1.615.381.447,00**	**$ 486.092.860,00**	**$ 255.654.445,00**	**$ 873.634.142,00**
	RECURSOS A ADMINISTRAR POR ANTICIPO	$ 1.615.381.746,60			
	VALOR GIRADO A LA FIDUCIARIA 13/12/2022	$ 1.615.381.447,00			
	Diferencia Descuento Entidad	$ 299,60			

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202212

25/01/23 12:19 PM

Programa: SCMRSLNA

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
11		EFECTIVO	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
1505		BANCOS NACIONALES	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
150501		CUENTA AHORROS	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL .00	3,233,406,406.44	1,615,494,232.36	1,617,906,174.08
2		PASIVO	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL .00	.00	856,800.00	-856,800.00
3		PATRIMONIO	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,232,430,821.08	-1,617,049,374.08
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,230,912,894.00	-1,615,531,447.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,230,912,894.00	-1,615,531,447.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,230,912,894.00	-1,615,531,447.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,230,912,894.00	-1,615,531,447.00
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL .00	1,615,381,447.00	3,230,912,894.00	-1,615,531,447.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL .00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
3915		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL .00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
391501		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL .00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
39150101		GANANCIAS DEL EJECICIO	NAPL .00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL .00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
410395		OTROS INTERESES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
41039501		OTROS INTERESES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL .00	.00	2,487,512.44	-2,487,512.44
5		GASTOS	NAPL .00	2,487,512.44	.00	2,487,512.44
51		GASTOS OPERACIONALES	NAPL .00	969,585.36	.00	969,585.36
5115		COMISIONES	NAPL .00	969,136.00	.00	969,136.00
511512		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL .00	112,336.00	.00	112,336.00
51151201		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL .00	112,336.00	.00	112,336.00
5115120101		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL .00	112,336.00	.00	112,336.00
518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL .00	856,800.00	.00	856,800.00
51801		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL .00	856,800.00	.00	856,800.00
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL .00	856,800.00	.00	856,800.00
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL .00	449.36	.00	449.36
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL .00	449.36	.00	449.36
51400501		G.M.F.	NAPL .00	449.36	.00	449.36
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL .00	449.36	.00	449.36
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL .00	1,517,927.08	.00	1,517,927.08
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL .00	1,517,927.08	.00	1,517,927.08
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL .00	1,517,927.08	.00	1,517,927.08
59050101		GANANCIAS	NAPL .00	1,517,927.08	.00	1,517,927.08

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202212

25/01/23 12:19 PM

Programa: SCMRSLNA

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5905010101		GANANCIAS	NAPL	.00	1,517,927.08	.00	1,517,927.08
			Total	.00	4,851,269,365.88	4,851,269,365.88	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31320
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	dic-22			Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA BANCARIA N 220-150-19306-3 POPULAR	4.848.850.836,30	3.230.875.679,36	1.917.775.156,94	4.848.850.836,30	3.230.875.679,36	1.917.775.156,94
Saldo periodo anterior						
Aportes Entidad Otorgante	484.529.431,00			484.529.431,00		
Rendimientos Netos	4.364.021.405,30			4.364.021.405,30		
Traslados desde el fondo de reserva				-		
Nota Debito Devolucion		3.230.762.894,00			3.230.762.894,00	
Gastos Bancarios		112.785,36			112.785,36	
Pagos					-	
G.M.F. 4*1000					-	
Pago de Rendimientos a la entidad					-	
GMF pago de Rendimientos					-	
Traslado al fondo de reserva por Cancelacion					-	

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31320
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE				Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 220-150-19309-3	-	-	-	-	-	-
Saldo periodo Inicial						
Aportes Fideicomitente				-		
Rendimientos Netos				-		
G.M.F. 4*1000					-	
Retiros Fideicomitente					-	
Traslado de GMF al Fondo Anticipo					-	
Comision Fiduciaria					-	

popular

SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202301

22/02/23 11:20 AM

Programa: SCMRSLNA

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,617,906,174.08**	**7,856,328.54**	**747,201,806.66**	**878,560,695.96**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**1,617,906,174.08**	**4,635,130.59**	**747,201,806.66**	**875,339,498.01**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**1,617,906,174.08**	**4,635,130.59**	**747,201,806.66**	**875,339,498.01**
1505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**1,617,906,174.08**	**4,635,130.59**	**747,201,806.66**	**875,339,498.01**
150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**1,617,906,174.08**	**4,635,130.59**	**747,201,806.66**	**875,339,498.01**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	1,617,906,174.08	4,635,130.59	747,201,806.66	875,339,498.01
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**.00**	**3,221,197.95**	**.00**	**3,221,197.95**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**3,221,197.95**	**.00**	**3,221,197.95**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**3,221,197.95**	**.00**	**3,221,197.95**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,221,197.95**	**.00**	**3,221,197.95**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	.00	3,221,197.95	.00	3,221,197.95
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-856,800.00**	**744,234,817.44**	**750,526,428.03**	**-7,148,410.59**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-856,800.00**	**744,234,817.44**	**750,526,428.03**	**-7,148,410.59**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-2,513,280.00**
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-2,513,280.00**
25011501		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**-856,800.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-2,513,280.00**
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-856,800.00	.00	1,656,480.00	-2,513,280.00
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**744,234,817.44**	**748,869,948.03**	**-4,635,130.59**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**744,234,817.44**	**748,869,948.03**	**-4,635,130.59**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**744,234,817.44**	**748,869,948.03**	**-4,635,130.59**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	744,234,817.44	748,869,948.03	-4,635,130.59
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-1,617,049,374.08**	**750,342,005.79**	**4,704,917.08**	**-871,412,285.37**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-1,615,531,447.00**	**741,747,305.00**	**3,186,990.00**	**-876,971,132.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,615,531,447.00**	**.00**	**3,186,990.00**	**-1,618,718,437.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,615,531,447.00**	**.00**	**3,186,990.00**	**-1,618,718,437.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,615,531,447.00**	**.00**	**3,186,990.00**	**-1,618,718,437.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,615,531,447.00	.00	3,186,990.00	-1,618,718,437.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**.00**	**741,747,305.00**	**.00**	**741,747,305.00**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**741,747,305.00**	**.00**	**741,747,305.00**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**741,747,305.00**	**.00**	**741,747,305.00**
3510100095		OTROS	NAPL	.00	741,747,305.00	.00	741,747,305.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**8,594,700.79**	**1,517,927.08**	**5,558,846.63**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,517,927.08**	**-1,517,927.08**
390501		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,517,927.08**	**-1,517,927.08**
39050101		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,517,927.08**	**-1,517,927.08**
5010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	.00	.00	1,517,927.08	-1,517,927.08
3		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**1,517,927.08**	**.00**	**.00**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**1,517,927.08**	**.00**	**.00**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-1,517,927.08**	**1,517,927.08**	**.00**	**.00**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-1,517,927.08	1,517,927.08	.00	.00
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,076,773.71**	**.00**	**7,076,773.71**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,076,773.71**	**.00**	**7,076,773.71**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**.00**	**7,076,773.71**	**.00**	**7,076,773.71**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	7,076,773.71	.00	7,076,773.71
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,181,826.10**	**-2,181,826.10**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,181,826.10**	**-2,181,826.10**

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202301

22/02/23 11:20 AM

Programa: SCMRSLNA

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,147,618.15**	**-2,147,618.15**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,147,618.15**	**-2,147,618.15**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,147,618.15**	**-2,147,618.15**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	.00	.00	2,147,618.15	-2,147,618.15
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**34,207.95**	**-34,207.95**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**34,207.95**	**-34,207.95**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**34,207.95**	**-34,207.95**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	.00	.00	34,207.95	-34,207.95
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**9,258,599.81**	**7,076,773.71**	**2,181,826.10**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**9,258,599.81**	**.00**	**9,258,599.81**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**1,656,480.00**	**.00**	**1,656,480.00**
511518		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**1,656,480.00**	**.00**	**1,656,480.00**
51151801		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**1,656,480.00**	**.00**	**1,656,480.00**
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	1,656,480.00	.00	1,656,480.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,966,989.22**	**.00**	**2,966,989.22**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,966,989.22**	**.00**	**2,966,989.22**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**.00**	**2,966,989.22**	**.00**	**2,966,989.22**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	.00	2,966,989.22	.00	2,966,989.22
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**4,635,130.59**	**.00**	**4,635,130.59**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**4,635,130.59**	**.00**	**4,635,130.59**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**4,635,130.59**	**.00**	**4,635,130.59**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	4,635,130.59	.00	4,635,130.59
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**7,076,773.71**	**-7,076,773.71**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**7,076,773.71**	**-7,076,773.71**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**7,076,773.71**	**-7,076,773.71**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**7,076,773.71**	**-7,076,773.71**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	.00	.00	7,076,773.71	-7,076,773.71
			Total	.00	1,511,691,751.58	1,511,691,751.58	.00

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31328
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	dic-22			ene-23			Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA BANCARIA N 220-150-19380-3 POPULAR	**4.848.650.836,36**	**3.230.675.679,36**	**1.617.775.156,94**	**4.776.097,78**	**747.211.756,71**	**875.339.498,01**	**4.853.426.934,08**	**3.978.087.436,07**	**875.339.498,01**
Saldo periodo anterior				1.617.775.156,94					
Aportes Entidad Otorgante	484.629.431,00						484.629.431,00		
Rendimientos Netos	4.364.021.405,36			2.268.585,34			4.366.309.990,64		
Traslado desde el fondo de reserva				2.487.512,44			2.487.512,44		
Nota Débito Devolucion		3.230.762.894,00						3.230.762.894,00	
Gastos Bancarios		112.785,36						112.785,36	
Pagos					741.747.305,00			741.747.305,00	
G.M.F. 4*1000					2.966.989,22			2.966.989,22	
Pago de Rendimientos a la entidad					2.487.512,44			2.487.512,44	
GMF pago de Rendimientos					9.950,05			9.950,05	
Traslado al fondo de reserva por Cancelacion								-	

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31328
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE							Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 220-150-19380-3	-	-	-	**3.221.197,95**	-	**3.221.197,95**	**3.221.197,95**	-	**3.221.197,95**
Saldo periodo Inicial									
Aportes Fideicomitente				3.186.990,00			3.186.990,00		
Rendimientos Netos				34.207,95			34.207,95		
G.M.F. 4*1000								-	
Retiros Fideicomitente								-	
Traslado de GMF al Fondo Anticipo								-	
Comisión Fiduciaria									

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-01-2023 hasta 31-01-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
03/01/2023	EF	2	150193803	900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	7	56900012636	346,048,148.00	0.00	346,048,148.00	PAGADA	-MANO DE OBRA	OTROS CONCEPTOS	03/01/2023	1
03/01/2023	EF	2	150193803	900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	51	15626909619	58,814,687.00	0.00	58,814,687.00	PAGADA	-TRANSPORTE	OTROS CONCEPTOS	03/01/2023	2
03/01/2023	EF	2	150193803	10934763 EDUARD TONY ARCIA NOHAVA	7	16631117132	81,230,025.00	0.00	81,230,025.00	PAGADA	-MANO DE OBRA	OTROS CONCEPTOS	03/01/2023	3
03/01/2023	EF	2	150193803	900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	7	53389624187	255,854,445.00	0.00	255,854,445.00	PAGADA	-MATERIALES	OTROS CONCEPTOS	03/01/2023	4
				Nro. de Operaciones: 4	TOTAL		741,747,305.00		0.00		741,747,305.00			

PAGOS CAUSADOS PENDIENTES DE PAGO

EMPRESA 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banc	Banco Destino Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/01/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	43863461	2,487,512.44	0.00	2,487,512.44	LIQUIDADA	PAGO RENDIMIENTOS DE NOV 2022	DEVOLUCIONES	05/01/2023	5
				Nro. de Operaciones: 1	TOTAL		2,487,512.44		0.00		2,487,512.44			

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	BANCO COMPARTIR S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	7	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BBVA COLOMBIA
14	HELV BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	51	BANCO DAVIVIENDA
52	BANCO AV VILLAS	60	BANCO PICHINCHA
531	FIDUCOLOMBIA	8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	61	BANCO COOMEVA S.A.
63	BANCO FINANDINA S.A.	62	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	53	BANCO WWB S.A..
64	BANCO MULTIBANK S.A	66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA	69	BANCO MUNDO MUJER S.A.
70	LULO BANK S.A.	95	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD

INFORMACION RESTRINGIDA

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202302

27/03/23 12:22 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	878,560,695.96	8,824,290.16	122,378,970.64	765,006,015.48
11		EFECTIVO	NAPL	875,339,498.01	7,800,322.35	118,427,801.81	764,712,018.55
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	875,339,498.01	7,800,322.35	118,427,801.81	764,712,018.55
1505		BANCOS NACIONALES	NAPL	875,339,498.01	7,800,322.35	118,427,801.81	764,712,018.55
.150501		CUENTA AHORROS	NAPL	875,339,498.01	7,800,322.35	118,427,801.81	764,712,018.55
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	875,339,498.01	7,800,322.35	118,427,801.81	764,712,018.55
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	3,221,197.95	1,023,967.81	3,951,168.83	293,996.93
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	3,221,197.95	1,023,967.81	3,951,168.83	293,996.93
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	3,221,197.95	1,023,967.81	3,951,168.83	293,996.93
1302050		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS	NAPL	3,221,197.95	1,023,967.81	3,951,168.83	293,996.93
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	3,221,197.95	1,023,967.81	3,951,168.83	293,996.93
2		PASIVO	NAPL	-7,148,410.59	122,134,294.15	251,550,537.52	-136,564,653.96
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-7,148,410.59	122,134,294.15	251,550,537.52	-136,564,653.96
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	-2,513,280.00	4,169,760.00	1,656,480.00	.00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-2,513,280.00	4,169,760.00	1,656,480.00	.00
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-2,513,280.00	4,169,760.00	1,656,480.00	.00
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-2,513,280.00	4,169,760.00	1,656,480.00	.00
2590		DIVERSOS	NAPL	-4,635,130.59	117,964,534.15	249,894,057.52	-136,564,653.96
259095		OTROS	NAPL	-4,635,130.59	117,964,534.15	249,894,057.52	-136,564,653.96
25909501		DIVERSOS	NAPL	-4,635,130.59	117,964,534.15	249,894,057.52	-136,564,653.96
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	-4,635,130.59	117,964,534.15	249,894,057.52	-136,564,653.96
3		PATRIMONIO	NAPL	-871,412,285.37	249,996,072.83	7,025,148.98	-628,441,361.52
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-876,971,132.00	249,996,072.83	4,935,348.83	-631,910,408.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-1,618,718,437.00	3,951,168.83	4,935,348.83	-1,619,702,617.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,618,718,437.00	3,951,168.83	4,935,348.83	-1,619,702,617.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,618,718,437.00	3,951,168.83	4,935,348.83	-1,619,702,617.00
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,618,718,437.00	3,951,168.83	4,935,348.83	-1,619,702,617.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	741,747,305.00	246,044,904.00	.00	987,792,209.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	741,747,305.00	246,044,904.00	.00	987,792,209.00
35101000		PAGOS A TERCEROS	NAPL	741,747,305.00	246,044,904.00	.00	987,792,209.00
3510100095		OTROS	NAPL	741,747,305.00	246,044,904.00	.00	987,792,209.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	5,558,846.63	.00	2,089,800.15	3,469,046.48
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
390501		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
39050101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
3905010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-1,517,927.08	.00	.00	-1,517,927.08
.15		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	2,089,800.15	-2,089,800.15
391501		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	2,089,800.15	-2,089,800.15
39150101		GANANCIAS DEL EJECICIO	NAPL	.00	.00	2,089,800.15	-2,089,800.15
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	.00	2,089,800.15	-2,089,800.15
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	7,076,773.71	.00	.00	7,076,773.71
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	7,076,773.71	.00	.00	7,076,773.71
39200101		PÉRDIDA DEL EJECICIO	NAPL	7,076,773.71	.00	.00	7,076,773.71
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	7,076,773.71	.00	.00	7,076,773.71
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-2,181,826.10	.00	2,598,123.18	-4,779,949.28
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-2,181,826.10	.00	2,598,123.18	-4,779,949.28

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202302

27/03/23 12:22 PM

Programa: SCMRSLNA

Yerika Mariné Sanchez Sanchez

SIFI

CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-2,147,618.15**	**.00**	**1,701,535.37**	**-3,849,153.52**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-2,147,618.15**	**.00**	**1,701,535.37**	**-3,849,153.52**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-2,147,618.15**	**.00**	**1,701,535.37**	**-3,849,153.52**
03950101		OTROS INTERESES	NAPL	-2,147,618.15	.00	1,701,535.37	-3,849,153.52
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-34,207.95**	**.00**	**39,787.81**	**-73,995.76**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-34,207.95**	**.00**	**39,787.81**	**-73,995.76**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-34,207.95**	**.00**	**39,787.81**	**-73,995.76**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-34,207.95	.00	39,787.81	-73,995.76
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**856,800.00**	**-856,800.00**
419530		**RECOBROS Y RECUPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**856,800.00**	**-856,800.00**
41953001		**RECOBROS Y RECUPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**856,800.00**	**-856,800.00**
4195300101		RECUPERACIONES	NAPL	.00	.00	856,800.00	-856,800.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**2,181,826.10**	**5,911,083.18**	**3,312,960.00**	**4,779,949.28**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**9,258,599.81**	**3,821,283.03**	**3,312,960.00**	**9,766,922.84**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**1,656,480.00**	**1,656,480.00**	**3,312,960.00**	**.00**
511518		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,656,480.00**	**1,656,480.00**	**3,312,960.00**	**.00**
51151801		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,656,480.00**	**1,656,480.00**	**3,312,960.00**	**.00**
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	1,656,480.00	1,656,480.00	3,312,960.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,966,989.22**	**463,267.66**	**.00**	**3,430,256.88**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,966,989.22**	**463,267.66**	**.00**	**3,430,256.88**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**2,966,989.22**	**463,267.66**	**.00**	**3,430,256.88**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	2,966,989.22	463,267.66	.00	3,430,256.88
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,635,130.59**	**1,701,535.37**	**.00**	**6,336,665.96**
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,635,130.59**	**1,701,535.37**	**.00**	**6,336,665.96**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**4,635,130.59**	**1,701,535.37**	**.00**	**6,336,665.96**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	4,635,130.59	1,701,535.37	.00	6,336,665.96
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,076,773.71**	**2,089,800.15**	**.00**	**-4,986,973.56**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,076,773.71**	**2,089,800.15**	**.00**	**-4,986,973.56**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,076,773.71**	**2,089,800.15**	**.00**	**-4,986,973.56**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-7,076,773.71**	**2,089,800.15**	**.00**	**-4,986,973.56**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-7,076,773.71	2,089,800.15	.00	-4,986,973.56
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**4,169,760.00**	**4,169,760.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-1,656,480.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-1,656,480.00**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-1,656,480.00**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,656,480.00**	**-1,656,480.00**
8295010102		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	.00	1,656,480.00	-1,656,480.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**4,169,760.00**	**2,513,280.00**	**1,656,480.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**4,169,760.00**	**2,513,280.00**	**1,656,480.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**4,169,760.00**	**2,513,280.00**	**1,656,480.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**4,169,760.00**	**2,513,280.00**	**1,656,480.00**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	.00	4,169,760.00	2,513,280.00	1,656,480.00
			Total	.00	391,035,500.32	391,035,500.32	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

DIRECTOR CONTABLE

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31328
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	ene-23			feb-23			Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
CUENTA BANCARIA N 220-150-19380-3 POPULAR	**4.276.057,78**	**747.211.756,71**	**875.339.498,01**	**7.808.512,82**	**118.436.392,28**	**764.712.018,55**	**4.861.235.848,90**	**4.096.523.828,35**	**764.712.018,55**
Saldo periodo anterior	1.617.775.156,94			875.339.498,01					
Aportes Entidad Otorgante							484.926.431,00		
Rendimientos Netos	2.288.585,34			1.638.941,65			4.367.948.932,09		
Traslado desde el fondo de reserva	2.487.512,44			3.951.168,83			6.438.681,27		
Reintegro operación				2.218.802,54			2.218.802,54		
Nota Debito Devolucion					2.147.618,15			3.232.910.512,19	
Gastos Bancarios					8.590,47			121.375,83	
Pagos		741.747.305,00			115.818.918,00			857.564.221,00	
G.M.F. 4*1000		2.948.969,22			463.267,66			3.430.366,44	
Pago de Rendimientos a la entidad		2.487.512,44						2.487.512,44	
GMF pago de Rendimientos		9.960,05						9.960,05	
Traslado al fondo de reserva por Cancelacion									

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CODIGO 31328
INFORME DE FUENTES Y USOS

DETALLE	ene-23			feb-23			Acumulado Total		
	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL	FUENTES	USOS	SALDO FINAL
FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA N° 220-150-19380-3	**3.221.197,95**	**-**	**3.221.197,95**	**1.023.967,81**	**3.951.168,83**	**293.996,93**	**4.245.165,76**	**3.951.168,83**	**293.996,93**
Saldo periodo Inicial				3.221.197,95					
Aportes Fideicomitente	3.186.990,00			964.150,00			4.171.179,09		
Rendimientos Netos	34.207,95			39.757,81			73.965,76		
G.M.F. 4*1000									
Retiros Fideicomitente									
Traslado de GMF al Fondo Anticipo					3.951.168,83			3.951.168,83	
Comisión Fiduciaria									

PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUENTA BANCARIA 220-150-19380-3 POPULAR

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	ORDEN No. 01	ORDEN No. 02	ORDEN No. 03	ORDEN No. 04	ORDEN No. 05	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Materiales	$ 552.223.905,00		$ 255.654.445,00	$ 115.816.916,00	$ 101.726.377,00		$ 79.024.167,00
2	Transporte	$ 160.352.755,00	$ 58.814.687,00			$ 28.499.611,00	$ 11.268.387,00	$ 61.770.070,00
3	Mano de obra	$ 902.804.787,00	$ 427.278.173,00					$ 475.526.614,00
	Total Plan De Inversion	**$ 1.615.381.447,00**	**$ 486.092.860,00**	**$ 255.654.445,00**	**$ 115.816.916,00**	**$ 130.227.988,00**	**$ 11.268.387,00**	**$ 616.320.851,00**
	RECURSOS A ADMINISTRAR POR ANTICIPO	**$ 1.615.381.746,60**						
	VALOR GIRADO A LA FIDUCIARIA 13/12/2022	**$ 1.615.381.447,00**						
	Diferencia Descuento Entidad	**$ 299,60**						

PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUENTA BANCARIA 220-150-19380-3 POPULAR

ITEM	PLAN DE INVERSION	VALOR ANTICIPO POR RUBRO	ORDEN No. 01	ORDEN No. 02	ORDEN No. 03	ORDEN No. 04	ORDEN No. 05	SALDO ANTICIPO POR RUBRO
1	Materiales	$ 552.223.905,00		$ 255.654.445,00	$ 115.816.916,00	$ 101.728.377,00		$ 79.024.167,00
2	Transporte	$ 160.352.755,00	$ 58.814.687,00			$ 28.499.611,00	$ 11.268.387,00	$ 61.770.070,00
3	Mano de obra	$ 902.804.787,00	$ 427.278.173,00					$ 475.526.614,00
	Total Plan De Inversion	**$ 1.615.381.447,00**	**$ 486.092.860,00**	**$ 255.654.445,00**	**$ 115.816.916,00**	**$ 130.227.988,00**	**$ 11.268.387,00**	**$ 616.320.851,00**
	RECURSOS A ADMINISTRAR POR ANTICIPO	**$ 1.615.381.746,60**						
	VALOR GIRADO A LA FIDUCIARIA 13/12/2022	**$ 1.615.381.447,00**						
	Diferencia Descuento Entidad	**$ 299,60**						

LABORATORIO

CODIGO: EL-F-S027	ENSAYO CBR MUESTRA ALTERADA INV-E- 148-13	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 24/11/2021		
VERSION: 02		
PAGINA: 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA		
FECHA:	martes, 25 de octubre de 2022	ORDEN DE SERVICIO N°:	615-22
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	TERRAPLEN		
CLASIFICACIÓN AASTHO:	A-1-b (0)	LL:	27,43
CLASIFICACIÓN SUCS:	GRAVA CON ARENA Y LIMO	IP:	7,7

	ENSAYO DE COMPACTACIÓN MAX.				ENSAYO DE CBR		
Número de golpes x capa	56	56	56		56	25	10
Molde N.	35	35	35		57	54	63
P.molde+muestra comp.(gr)	7848	8159	8061		8159	8303	8208
Peso molde (gr)	3764	3764	3764		3764	4173	4369
Peso muestra compac(gr)	4084	4395	4297		4395	4130	3839
Vol.muestra compac(cm3)	2123,1	2123,1	2123,1		2123,1	2123,1	2123,1
Densidad humeda (gr/cm3)	1,92	2,07	2,02		2,07	1,95	1,81
Humedad (%)	5,0	7,3	9,5		7,3	7,5	7,3
Densidad seca (gr/cm3)	1,83	1,93	1,85		1,93	1,81	1,69





DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Tara	ILC 69	ILC 60	ILC 47		ILC 60	ILC 45	ILC 63
P. tara+suelo humedo(gr)	221,5	221,5	234,4		221,5	219,4	312,2
P.tara+suelo seco(gr)	212,8	208,9	217,4		208,9	206,8	294,1
P.tara (gr)	37,3	36,1	38,1		36,1	39,6	44,6
Humedad (%)	5,0	7,3	9,5		7,3	7,5	7,3


DENSIDAD MÁXIMA DE COMPACTACIÓN:	1,93	HUMEDAD ÓPTIMA:	7,3

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DESPUES DE SUMERGIDO

Tara	ILC 22	ILC 04	ILC 27
P. tara+suelo humedo(gr)	338,70	325,70	239,60
P.tara+suelo seco(gr)	306,20	299,30	221,20
P.tara (gr)	50,60	46,50	46,10
Humedad (%)	13%	10%	11%

Molde N.	57	54	63
N. Golpes /capa	56	25	10
Dias de inmersión	4	4	4
Penetración del pistón (mm)	Esfuerzo - PSI		
	0	0	0
0,635	173,83	131,69	110,00
1,27	272,60	203,78	185,55
1,905	385,07	287,46	257,62
2,54	509,08	376,52	335,33
3,175	625,91	463,10	371,01
3,81	739,47	547,52	399,00
4,445	845,21	622,50	424,09
5,08	939,41	691,54	445,27
7,62	1271,40	919,68	502,27
10,16	1557,92	1103,74	553,32
12,7	1834,87	1253,41	593,35
CBR (%) CORR 2,54 mm	50,908	37,652	33,53
CBR (%) CORR 5,08 mm	62,627	46,10	29,684
MÁXIMO CBR	62,63	46,10	33,53
EXPANSIÓN (%)	0,00	0,00	0,00

DENSIDAD SECA MÁXIMA (gr/cm3)	1,93
95% DENSIDAD SECA MÁXIMA (gr/cm3)	1,83
VALOR DE CBR AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO	62,73
VALOR DE CBR AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	49,14

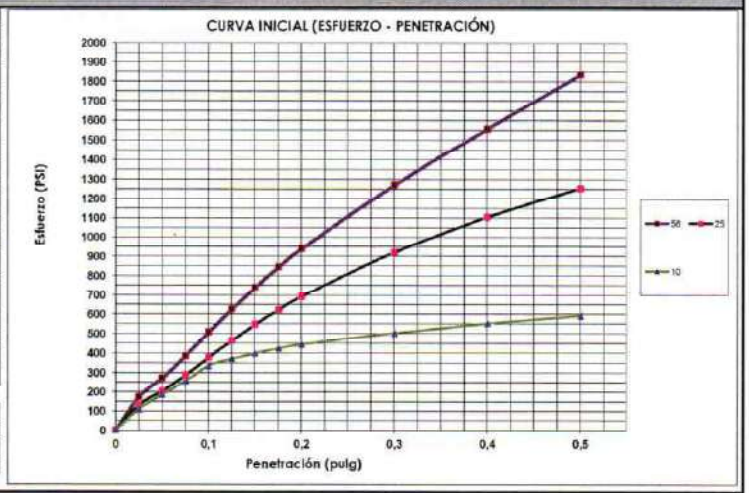

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-S020	CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA POR IGNICIÓN INV E-121- 13	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA:14/07/2021		
VERSIÓN:01		
PAGINA: 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA
FECHA DEL INFORME:	martes, 25 de octubre de 2022
TIPO MATERIAL:	TERRAPLEN
CANTERA:	CHICORAL

MATERIA ORGÁNICA

	ENSAYO N°1	ENSAYO N°2	ENSAYO N°3			PROMEDIO
Suelo seco al horno antes de la ignición. (gr)	70,30	73,22	72,13			
Suelo seco después de la ignición. (gr)	70,29	73,21	72,12			
Peso Recipiente (gr)	14,90	15,12	16,20			
% Materia Orgánica	**0,02**	**0,02**	**0,02**			**0,02**

Observaciones:

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901.124.673-6

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-6
Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

CÓDIGO: EL-F-S019	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 12/08/2019		
VERSIÓN: 00	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO - NORMAS INV E - 157 - 13	
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA
FECHA DE INFORME:	lunes, 24 de octubre de 2022

DESCRIPCIÓN BASICA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	TERRAPLEN		MUESTRA N°:	1
TAMAÑO MAX.NOM PARTICULAS (in):	N°10	COLOR:		

DATOS DE LA MUESTRA	INICIAL	FINAL
Altura muestra (mm)	24,45	24,05
Peso muestra humeda+ molde (g)	265,30	265,47
Peso muestra humeda (g)	160,02	160,19
Peso muestra seca (g)	138,91	135,41
Altura solidos (mm)	16,13	15,72
Humedad	15,2	18,3
Peso especifico (g/cm3)	2,674	2,674
Densidad material (g/cm3)	1,764	1,720


DATOS MOLDE	
Peso molde (g)	105,28
Area molde (mm2)	3220,34
Presión de asentamiento o fijamiento a 5 Kpa (5 minutos)	Lect (mm) 0,000

DATOS MUESTRA SECA

Esfuerzo (Kpa)	H inicial (mm)	Lectura (0,001 mm)	Deformación (mm)	Vacios 2H-2Ho	Relación de vacios e	Deformación %
12,0	24,45	26	0	8,32	0,516	0,00%
25,0	24,39	58	0,058	8,26	0,512	-0,24%
20,0	24,35	96	0,096	8,22	0,510	-0,39%
50,0	24,26	187	0,187	8,13	0,504	-0,76%
100,0	24,19	265	0,265	8,05	0,499	-1,08%
200,0	24,08	374	0,374	7,95	0,493	-1,53%
DATOS MUESTRA INUNDADA						
200,0	24,05	402	0,402	7,92	0,491	-1,64%

Δh = cambio de altura del espécimen por inundación, mm	0,028
ho = altura inicial del espécimen, mm.	24,45
Índice colapso (Ie)	**0,11%**

ESFUERZO VS DEFORMACIÓN

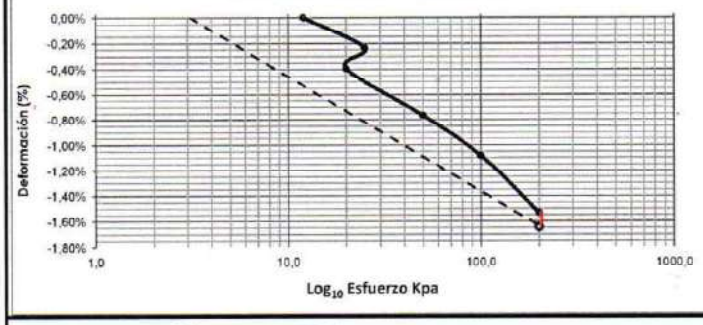

Índice colapso (Ie)	
0,11%	Cumple SI/NO
Valor Máximo	SI
2,0%	

Observaciones: El valor de indice de colapso obtenido indica un buen comportamiento de suelo expuesto a saturación.

INGELABCON S.A.S.

JEISON JAVIER ATENCIA
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CODIGO: EL-F-S020	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA:14/07/2021		
VERSIÓN:01	SALES SOLUBLES	
PAGINA: 1 DE 1	INV E - 158-13	

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
UBICACÍON DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA			
FECHA DE INFORME:	viernes, 21 de octubre de 2022			
DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL				
DESCRIPCIÓN:	TERRAPLEN			
VOLUMEN MUESTRA FRASCO:	500	ml	CANTIDAD DE MUESTRA:	50 gr
VOLUMEN MUESTRA CAPSULA:	100	ml		

MUESTRA	1	2	
PESO INICIAL (gr)	50,05	51,23	
PESO FINAL (gr)	50,06	51,24	
RESIDUO (gr)	0,01	0,01	
RESULTADOS Ss (%)	0,100	0,098	
PROMEDIO:			0,099

VALOR ESPECIFICACIÓN:	≤ 0,2	SI CUMPLE

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124673-8

JEISON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

CÓDIGO: EL-F-S005	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13-07-2021		
VERSIÓN:01	GRANULOMETRÍA DE SUELOS INV-213-13 & INV-214-13	
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
UBICACÍON DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA		
FECHA DE INFORME:	Jueves, 20 de octubre de 2022	ORDEN DE SERVIO N°:	615-22
DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL			
TIPO DE MATERIAL:	TERRAPLEN	MUESTRA N°:	1
PROCEDENCIA:	CANTERA CHICORAL		

ENSAYO HUMEDAD NATURAL P(gr)	
RECIPIENTE:	ILC9
P1	385,6
P2	337,4
P3	37,4

OBSERVACIÓN:

%HUMEDAD NATURAL	16,07%	PESO INICIAL	3769,39	PESO FINAL	3045,20

TAMÍZ	ABERTURA (mm)	PESO RETENIDO (gr)	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
3"	76,2	0,0	0,00	0,00	100,00
2 1/2"	63,5	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50,8	0,00	0,00	0,00	100,00
1 1/2"	38,1	745,60	19,78	19,78	80,22
1"	25,4	469,50	12,46	32,24	67,76
3/4"	19,05	139,90	3,71	35,95	64,05
1/2"	12,7	258,10	6,85	42,79	57,21
3/8"	9,525	147,20	3,91	46,70	53,30
N°4	4,75	283,90	7,53	54,23	45,77
N°10	2,36	323,10	8,57	62,80	37,20
N°40	0,42	425,40	11,29	74,09	25,91
N.200	0,075	252,50	6,70	80,79	19,21
FONDO		724,19	19,21	100,00	0,00



TAMAÑO MAX.	1-1/2"
TAMAÑO MAX. NOM.	1"
MODULO FINURA	3,69
% PASA 200	19,21
D10	N/A
D30	N/A
D60	N/A
Cu	N/A
Cc	N/A

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.


CÓDIGO: EL-F-S003	FORMATOS	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13-07-2021		
VERSIÓN: 00	LIMITES DE PLASTICIDAD INV-125-13 & INV-126-13	
PÁGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
UBICACÍON DEL PROYECTO:	TIERRALTA - CÓRDOBA		
FECHA DE INFORME:	jueves, 20 de octubre de 2022	ORDEN DE SERVIO N°:	615-22
DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL			
TIPO DE MATERIAL:	TERRAPLEN		
PROCEDENCIA:	CANTERA CHICORAL		

LIMITE LÍQUIDO (LL)

PUNTO	TARA	P1	P2	P3	%w	N.G
1	114	27,03	24,31	14,02	26,4	33
2	124	27,19	24,34	14,02	27,6	24
3	11	27,25	24,53	15,02	28,6	15

COEF.	-0,1204	30,441	N.G (LL)	25
LL	27,43			

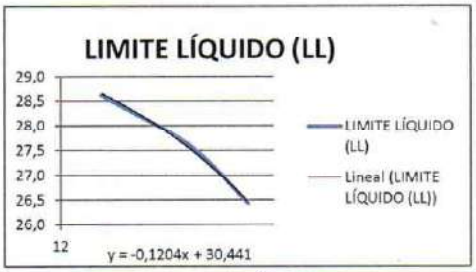

LIMITE PLÁSTICO (LP)

PUNTO	TARA	P1	P2	P3	%w	LP
1	118	13,72	12,92	8,84	19,6	19,76
2	117	13,49	12,67	8,55	19,9	

INDICE DE PLÁSTICIDAD

IP =	7,7

LÍMITE DE NORMA ART 220 INV-13	LÍMITE LÍQUIDO (LL) MÁX (%)	30	CUMPLE
LÍMITE DE NORMA ART 220 INV-13	ÍNDICE DE PLÁSTICIDAD (IP)	10	CUMPLE

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124473-8

JEISON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

CÓDIGO: EL-F-C007	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 02	DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO DOSIFICACIÓN DE MATERIALES POR m³	
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	UBICACIÓN:	TIERRALTA - CÓRDOBA		
CONTACTO:	MARIO PETRO REYES	TEL:	310 3638103	E-MAIL:	consorciopuentesdecordoba2021@gmail.com
FECHA DE INFORME:	miércoles, 1 de marzo de 2023			ORDEN DE SERVICIO Nº:	74-23

TIPO DE MEZCLA:	3000PSI - 210 Kg/cm²				ASENTAMIENTO PLANTA:	N/A	(+- 1 PULG)		(+-25mm)
MANEJABILIDAD:	FLUIDA Y COHESIVA				ASENTAMIENTO OBRA:	5	(+- 1 PULG)	127	(+-25mm)
(X) MEZCLA EVALUADA A:	COMPRESIÓN	X	FLEXIÓN		TAM. MAXIMO AGREGADO:	2,0	PULG	50,8	mm

MATERIA PRIMA (SÓLIDOS)

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	DENSIDAD APARENTE	% ABS	%HUMEDAD
CEMENTANTE	ART	ARGOS	3,11	N.A	N.A
AD. CEMENTANTE			2,01	N.A	N.A
GRAVA 1			1,00	0,00	0,00
GRAVA 2			1,00	0,00	0,00
ARENA 1	MIXTO ALUVIAL	CANTERA CABRERO	2,412	1,110	3,64
ARENA 2			1,00	0,00	0,00

MATERIA PRIMA (LÍQUIDOS)

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	DENSIDAD	cm³/ Kg DE CEMENTO	% PESO DEL CEMENTANTE
AGUA	AGUA POTABLE	ACUEDUCTO	1	N.A	
ADITIVO 1	PLASTOL HR-DM	TOXEMENT	1,09	3,0	0,33%
ADITIVO 2					0,00%
ADITIVO 3					0,00%

PARÁMETROS DE DISEÑO (Kg/M³ CCTO)

AGUA	165	GRAVA 1	0	GRAVA 2	0

DOSIS DE MATERIALES SECOS PARA 1 M³ DE CONCRETO (Kg)

RESISTENCIA	CEMENTANTE	AD. CEMENTANTE	GRAVA 1	GRAVA 2	ARENA 1	ARENA 2	AGUA (Lt)	ADITIVO 1 (Lt)	ADITIVO 2 (Lt)	ADITIVO 3 (Lt)	A/C	Ar/Agr
(Kg/cm2)	ART	0	0	0	MIXTO ALUVIAL	0	AGUA POTABLE	PLASTOL HR-DM	0	0	Peso	Peso
210	318,75	0,0	0	0	1767	0	165	0,96	0,00		0,518	1,000

DOSIS DE MATERIALES PARA PRUEBA DE LABORATORIO (Kg)

		LITROS DE MEZCLA PARA PRUEBA					30	LT	0,03	m3		
RESISTENCIA	CEMENTANTE	AD. CEMENTANTE	GRAVA 1	GRAVA 2	ARENA 1	ARENA 2	AGUA	ADITIVO 1 (ml)	ADITIVO 2 (ml)	ADITIVO 3 (ml)	A/C	Ar/Agr
(Kg/cm2)	ART		0	0	MIXTO ALUVIAL	0	AGUA POTABLE	PLASTOL HR-DM	0	0	Peso	Peso
210	9,56	0,00	0,00	0,00	53,00	0	3,61	29,49	0,00		0,377	1,000

RESULTADOS PRUEBA DE LABORATORIO

RESISTENCIA MINIMA ESPERADA (Kg/cm2)	210	TIPO :	NORMAL
FECHA DE ENSAYO:	miércoles, 1 de marzo de 2023		
HORA DE ENSAYO:	9:00:00 a. m.		
TEMPERATURA AMBIENTE:	28 °C		
ASENTAMIENTO O FLUJO LIBRE (PULG O Cm):	5,5"		
TEMPERATURA DE LA MEZCLA °C:	32 °C		
APARIENCIA:	FLUIDA Y COHESIVA		
CONTENIDO DE AIRE %:	1		
MASA UNITARIA (Kg/m3 ccto):	2250,51		
LITROS DE MEZCLA POR m³	1000		
CODIGO			

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

REALIZÓ:

CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CÓDIGO: EL-F-C007	FORMATO	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 02	DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO DOSIFICACIÓN DE MATERIALES POR m³	
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	UBICACIÓN:	TIERRALTA - CÓRDOBA		
CONTACTO:	MARIO PETRO REYES	TEL:	310 3638103	E-MAIL:	consorciopuentestierraltacordoba2022@gmail.com
FECHA DE INFORME:	miércoles, 1 de marzo de 2023			ORDEN DE SERVICIO Nº:	74-23

TIPO DE MEZCLA:	2000PSI - 140 Kg/cm²			ASENTAMIENTO PLANTA:	N/A	(+- 1 PULG)		(+-25mm)
MANEJABILIDAD:	FLUIDA Y COHESIVA			ASENTAMIENTO OBRA:	5	(+- 1 PULG)	127	(+-25mm)
(X) MEZCLA EVALUADA A:	COMPRESIÓN	X	FLEXIÓN	TAM. MAXIMO AGREGADO:	2,0	PULG	50,8	mm

MATERIA PRIMA (SÓLIDOS)

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	DENSIDAD APARENTE	% ABS	%HUMEDAD
CEMENTANTE	ART	ARGOS	3,11	N.A	N.A
AD. CEMENTANTE			2,01	N.A	N.A
GRAVA 1			1,00	0,00	0,00
GRAVA 2			1,00	0,00	0,00
ARENA 1	MIXTO ALUVIAL	CANTERA CABRERO	2,412	1,110	3,64
ARENA 2			1,00	0,00	0,00

MATERIA PRIMA (LÍQUIDOS)

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA	DENSIDAD	cm³/ Kg DE CEMENTO	% PESO DEL CEMENTANTE
AGUA	AGUA POTABLE	ACUEDUCTO	1	N.A	
ADITIVO 1	PLASTOL HR-DM	TOXEMENT	1,09	3,0	0,33%
ADITIVO 2					0,00%
ADITIVO 3					0,00%

PARÁMETROS DE DISEÑO (Kg/M³ CCTO)

AGUA	165	GRAVA 1	0	GRAVA 2	0

DOSIS DE MATERIALES SECOS PARA 1 M³ DE CONCRETO (Kg)

RESISTENCIA	CEMENTANTE	AD. CEMENTANTE	GRAVA 1	GRAVA 2	ARENA 1	ARENA 2	AGUA (Lt)	ADITIVO 1 (Lt)	ADITIVO 2 (Lt)	ADITIVO 3 (Lt)	A/C	Ar/Agr
(Kg/cm2)	ART	0	0	0	MIXTO ALUVIAL	0	AGUA POTABLE	PLASTOL HR-DM	0	0	Peso	Peso
140	212,5	0,0	0	0	1849	0	165	0,64	0,00		0,776	1,000

DOSIS DE MATERIALES PARA PRUEBA DE LABORATORIO (Kg)

		LITROS DE MEZCLA PARA PRUEBA					30	LT	0,03	m3		
RESISTENCIA	CEMENTANTE	AD. CEMENTANTE	GRAVA 1	GRAVA 2	ARENA 1	ARENA 2	AGUA	ADITIVO 1 (ml)	ADITIVO 2 (ml)	ADITIVO 3 (ml)	A/C	Ar/Agr
(Kg/cm2)	ART		0	0	MIXTO ALUVIAL	0	AGUA POTABLE	PLASTOL HR-DM	0	0	Peso	Peso
140	6,38	0,00	0,00	0,00	57,49	0	3,55	19,13	0,00		0,556	1,000

RESULTADOS PRUEBA DE LABORATORIO

RESISTENCIA MINIMA ESPERADA (Kg/cm2)	140	TIPO :	NORMAL
FECHA DE ENSAYO:	miércoles, 1 de marzo de 2023		
HORA DE ENSAYO:	10:00:00 a. m.		
TEMPERATURA AMBIENTE:	30 °C		
ASENTAMIENTO O FLUJO LIBRE (PULG O Cm):	8"		
TEMPERATURA DE LA MEZCLA °C:	33 °C		
APARIENCIA:	FLUIDA Y COHESIVA		
CONTENIDO DE AIRE %:	1		
MASA UNITARIA (Kg/m3 ccto):	2226,7		
LITROS DE MEZCLA POR m³	1000		
CODIGO			

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S. NIT 901.124.673-6

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

REALIZÓ:

CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio -INGELABCON S.A.S. los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.


INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-6
Oficina: Calle 44 # 1°-60 Barrio Sucre – Montelíbano –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

CÓDIGO: CO-F-I007	FORMATO	
FECHA: 16/06/2021		
VERSIÓN: 00	INFORME DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE MEZCLAS	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
Página 1 de 10		

N° INFORME	**1**	**FECHA INFORME:**	1/MARZO/2023
TIPO DE INFORME:		**CONCRETO ESTRUCTURAL TREMIE**	
PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**		
CLIENTE:	**CLIENTE:**	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	
	DIRECCIÓN:	TIERRALTA - CÓRDOBA	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RUTA DE ATENCIÓN A OBSERVACIONES	FECHA DEL CAMBIO

REVISADO	VERIFICADO	VALIDADO
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA
081037-0502188 COR LIC. PROFESIONAL	081037-0502188 COR LIC. PROFESIONAL	22202-360842 COR LIC. PROFESIONAL
CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ NOMBRE	CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ NOMBRE	JESUS DAVID PIZARRO FERNANDEZ NOMBRE
INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD	INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD	INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS ____ 3

1. INTRODUCCIÓN ____ 4
2. OBJETIVO GENERAL ____ 5
   2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ____ 5
3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ____ 6
4. ESPECIFICACIÓN DE MEZCLA ____ 6
5. MATERIALES PARA EL DISEÑO ____ 7
6. CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PETREOS ____ 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ____ 8
8. LIMITACIONES ____ 9

ANEXOS ____ 10

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisitos especificación de mezcla. 6
Tabla 2. Materiales para ejecución del diseño de mezcla. 7
Tabla 3. Características de los agregados pétreos. 7

INGELABCON S.A.S.
Confiabilidad en nuestros resultados

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Carrera 9a #34-35 Barrio Ospina Pérez – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la dosificación de materiales basada en el diseño de mezcla de concreto hidráulico para el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.** En el documento se consigna la caracterización básica de los agregados pétreos, pruebas de resistencia a muestras de laboratorio y el análisis de los resultados.

INGELABCON S.A.S.
Confiabilidad en nuestros resultados

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar los resultados del diseño de mezcla de concreto correspondiente al requerimiento técnico presentado por el cliente para el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la especificación técnica de la mezcla requerida.
- Determinar y reconocer los materiales agregados pétreos, agua, cementantes, aditivos y/o adiciones con que se trabajará la mezcla solicitada.
- Evaluar la caracterización de los agregados pétreos dispuestos por el cliente para el proyecto relacionado.
- Realizar pruebas de laboratorio hasta obtener el asentamiento y resistencia especificada por el cliente.
- Evaluar que las muestras realizadas cumplan con la resistencia requerida.

INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO

El presente diseño de mezcla, se realizará bajo la metodología establecida en la norma de la American Concrete Institute (ACI 211), cuyo objetivo es determinar la dosificación óptima de cada uno de los materiales que componen la mezcla de concreto para completar mil (1000) litros de mezcla (Un (1) m^3 de concreto).

4. ESPECIFICACIÓN DE MEZCLA

El cliente presenta los siguientes requisitos y especificaciones para la mezcla:

ITEM	ESPECIFICACIÓN			DESCRIPCIÓN
1	RESISTENCIA			3000PSI - 210 Kg/cm² - 2000PSI - 140 Kg/cm²
2	TIPO DE MEZCLA			FLUIDA Y COHESIVA
3	ASENTAMIENTO O FLUJO LIBRE			5" +/- 1"
4	TAMAÑO MAXÍMO AGREGADO			2"
5	USO DE LA MEZCLA			CONCRETO ESTRUCTURAL
6	MÉTODO DE COLOCACIÓN	DIRECTO		
		BOMBEADO		
		TORRE GRÚA		
		BANDAS TRANSPORTADORAS		
		¿OTROS, CUAL?	X	CARMIX

Tabla 1. Requisitos especificación de mezcla.

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

5. MATERIALES PARA EL DISEÑO

La presente tabla contiene la relación de los distintos materiales dispuestos por el cliente para la mezcla especificada.

ITEM	MATERIAL		DESCRIPCIÓN	PROCEDENCIA
1	CEMENTO	X	ESTRUCTURAL ART	ARGOS
2	AGUA	X	POTABLE	OBRA
3	AGREADO GRUESO			
4	AGREGADO FINO			
5	AGREGADO MIXTO	X	MIXTO ALUVIAL	CANTERA CABRERO
6	ADITIVOS	X	PLASTOL HR-DM	TOXEMENT
7	ADICIONES		NO SE USÓ	

Tabla 2. Materiales para ejecución del diseño de mezcla.

6. CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PETREOS

Se tiene para los materiales pétreos evaluados los siguientes resultados:

ITEM	PARÁMETROS	VALOR
1	TAMAÑO MÁXIMO PARTÍCULAS (PULG)	2,0
2	MODULO DE FINURA MATERIAL MIXTO	5,62
3	%PASA TAMIZ N°200 AGREGADO GRUESO	1,2
4	DENSIDAD MATERIAL MIXTO (gr/cm^3)	2,412
8	ABSORCIÓN MATERIAL MIXTO (%)	1,110

Tabla 3. Características de los agregados pétreos.

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DOSIFICACIÓN CONCRETO 3000PSI - 210 Kg/cm²

- Las dosificaciones obtenidas por metro cubico (m^3) de concreto son:
  - 318,75 kilos (Kg) de cemento (Siete bultos y medio (7,5) bultos de cemento Argos Estructural (ART))
  - 165 litros (Lt) de agua potable
  - 1767 kilos (Kg) de agregado mixto Cantera Cabrero
  - 0,96 litros (Lts) de aditivo Plastol HR-DM de Toxement

DOSIFICACIÓN CONCRETO 2000PSI - 140 Kg/cm²

- Las dosificaciones obtenidas por metro cubico (m^3) de concreto son:
  - 212,5 kilos (Kg) de cemento (Cinco (5) bultos de cemento Argos Estructural (ART))
  - 165 litros (Lt) de agua potable
  - 1849 kilos (Kg) de agregado mixto Cantera Cabrero
  - 0,64 litros (Lts) de aditivo Plastol HR-DM de Toxement

- El presente diseño de mezcla es válido para los materiales relacionados y garantiza el cumplimiento de la resistencia, si y solo si, se cumple con la tolerancia del asentamiento especificado y con la dosificación correcta de agua.

- El agua de mezclado depende de las condiciones de humedad de los agregados al momento de mezclar, en todos los casos es importante considerar este factor para llegar al asentamiento de diseño.

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
