CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
NIT 901.627.711-9
calle 32 N° 15-52
Tel: (604) 7948214
Montería - Colombia
consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CPC 3

Señores	MUNICIPIO DE TIERRALTA		
NIT	800.096.807-0	**Teléfono**	(604) 7771853
Dirección	CL 4 14 13	**Ciudad**	Tierralta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2023, 11:17
Expedición	21/12/2023, 11:17
Vencimiento	31/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial #3 Contrato de Obra Publica No LP-NO013-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961	1.00	508,049,672.80

Total items: 1

Total Bruto	508,049,672.80
Total a Pagar	**508,049,672.80**

Valor en Letras:
Quinientos ocho millones cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 508,049,672.80

Observaciones:
Acta Parcial #3 Contrato de Obra Publica No LP-NO013-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1961

AMORTIZACION ANTICIPO $152.414.901,84

Porcentaje de participación de los miembros:

IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S - NIT 90.132.025 - 40%
INCON SAS - NIT 800.043.463 - 55%
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS - NIT 901.407.951 - 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764062330358 aprobado en 20231219 prefijo CPC desde el número 3 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 2bd064dfc43aa73b75ab222d3db07303e34cc3a7568592daeff188d0f6d78e0a67f43aaf9295125e2dfe56468c9f6023e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145 © Hardtex Software Siigo Nube. Firma electrónica con el DIAN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA

Sistema de Gestión Integrado

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA 7B

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LPMC-011-2022-

OBJETO: CONSTRUCCION DE DEPOSITO SEMICERRADO PARA LA COMERCIALIZACION DE LA YUCA QUE COMERCIALICEN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1067 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA NIT. MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO YUCA NACIONAL NIT. JUAN AMATO LIZARAZO

Fecha de corte: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

ITEM				DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ANTERIORMENTE (ACTA 7 CORTE Acta 6 de fecha 20-12-2022)		ACTA PARCIAL NUMERICA No 7 - de 8		ACTA (7)		ACUMULADO TOTAL	
											CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
				1. EXPLANACIONES												
1	210.2.2	210		Excavación y clasificación en la conformación	m3	1000.00	$ 78.760,00	$ 78.760.000	707.41	$ 1.737.363,82	0.00	$ -	292.01	$ 717.363,82	999.42	$ 2.454.727,64
2	240.1	240		Terraplenes	m3	1291.00	$ 37.105,00	$ 79.955.180,00	4.243,17	$ 153.884.333,46	300.00	$ 11.215.500,00	341.80	$ 12.777.000,00	641.80	$ 24.000.500,00
3	221.2	220		Excavación de subsuelos	m3	2000.00	$ 11.000,00	$ 22.000.000,00	427.00	$ 4.697.000,00	227.00	$ 2.497.000,00	0.00	$ -	427.00	$ 4.697.000,00
							Total EXPLANACIONES	$ 224.301.720,00		$ 300.884.813,03		$ 75.954.867,00		$ 143.090.863,03		$ 176.451.780,03
				2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL												
4	680.2.4	680		Excavación en roca con explosivos en vías	m3	800.00	$ 78.760,00	$ 63.008.000,00	781.25	$ 61.523.125,00	781.25	$ 61.523.125,00	0.00	$ 0,00	781.25	$ 61.523.125,00
5	680.2.3	680		Excavación en roca en subsuelo con explosivos	m3	800.00	$ 78.760,00	$ 63.008.000,00	1.913.91	$ 150.731.944,15	1.844.69	$ 145.277.344,20	0.00	$ 0,00	1.844.69	$ 145.277.344,20
6	220.2	220		Subbase Granular Clase C	m3	21.00	$ 28.353,00	$ 595.413,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
7	630.1	630		Concreto Residencial 3000 PSI (f'c=3000 PSI) para cabezal	m3	34.02	$ 1.727.460,00	$ 58.754.749,20	35.00	$ 60.511.100,40	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
8	630.2	630		Concreto Residencial de 4000 psi (f'c=4000 PSI) para Escalinata y tanque	m3	66.01	$ 1.540.673,00	$ 101.685.913,01	75.74	$ 116.676.370,62	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
9	670.4 P	630		Concreto Residencial de 5000 psi (f'c=5000 PSI) para Pantallas, Vigas, Zapata y placa de apoyo en c.a.	m3	353.68	$ 1.900.043,00	$ 672.096.259,04	373.20	$ 709.189.488,60	224.20	$ 426.063.173,40	91.48	$ 173.826.315,20	474.24	$ 901.440.176,12
10	680.2	630		Concreto tipo 1 (f'c 35 kg/cm2 = 4000 PSI)	m3	7.76	$ 800.150,00	$ 6.621.728,00	4.00	$ 3.200.612,16	3.76	$ 3.008.613,76	0.00	$ 0,00	3.76	$ 3.008.613,76
11	631.3P	631		Malla corrugada de refuerzo Grado 60 (fy = 4.200 kg/cm2) de 1/2"	m	410.00	$ 2.800.000,00	$ 1.148.000.000,00	150.20	$ 420.560.000,00	440.00	$ 1.232.000.000,00	0.00	$ 0,00	440.00	$ 1.232.000.000,00
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	28857.00	$ 3.500,00	$ 101.000.000,00	42.726.83	$ 149.494.010,00	31.274.46	$ 109.461.610,00	0.00	$ 0,00	31.274.46	$ 109.461.610,00
13	643.1	643		Acero de Pretensado	Kg	54700.00	$ 2.600,00	$ 142.220.000,00	70.38	$ 182.940,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
14	652.3	652		Apoyo elastomerico	und	0.00	$ 377.801,00	$ 0,00	10.00	$ 3.778.010,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
15	652.3	652	PART	Junta de dilatación elastomerica sin cubrimiento (Incluye accesorios y anclajes)	m	12.27	$ 1.141.647,00	$ 13.999.264,61	17.00	$ 19.407.799,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
16	611.4 P	611.1	PART	Baranda metalica con pasamanos soldados	m	65.00	$ 800.000,00	$ 48.800.000,00	48.80	$ 39.008.000,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
17	624.2	630		PELEA 27 CLARO MULTIMEDIA LOS DIFERENTES ITEMS Y CAMPOS DE TOPOGRAFIA	und	1.00	$ 77.542.211,00	$ 77.542.211,00	1.00	$ 77.542.211,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
				Total Costo Directo Publico Contratado (1+2+3)				$ 2.894.849.734,85		$ 3.271.746.371,70		$ 2.611.189.439,37		$ 3.611.780.809,06		$ 5.506.630.544,03

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA

Sistema de Gestión Integrado

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA (3)

OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VEHICULAR SOBRE LA CARRERA SEPTIMA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MANGUITOS DT PLANETA VIEJA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2021 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA 01, MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL MEDIERO 01, , WALKIRIS GUERRERO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°1-1-1901-21 -

AVANCE Y CONTROL DE OBRA (%)

Fecha del acta: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO No 2 de fecha 30-12-2022		ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No 1 - No 3		OBRA		ACUMULADO TOTAL	
											CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL $	CANT.	VALOR TOTAL
				8. PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO												
22	525.2	530		Subbase granular (SBG)	m3	440.00	$ 205.000,00	$ 90.200.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
23	511.2	511		Concreto hidraulico para pavimentos	m3	330.00	$ 213.000,00	$ 70.290.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
24	552.1	552		Pavimento de concreto reforzado	m3	660.00	$ 277.000.000,00	$ 277.000.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
26	630.8	630		Suministro, tubo 3 (210 kg/cm2 + 3000 PSI+ CAMELIA	m3	330.00	$ 172.000,00	$ 56.760.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
27	640.1	640		Acero de refuerzo de 7/8 f'c 4,200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	60000.00	$ 4.120,00	$ 247.200.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
				TOTAL PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO				$ 779.900.000,00		$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00
				9. TRANSPORTE												
28	900.2	900		Transporte de todos los materiales de la excavación de la explanación, cargas y descargas para el desalojo mayores de 40 metros (1.000 m) medidos a través de las vías (100 m)	m3/km	140000.00	$ 1.681,00	$ 235.340.000,00	107.340,01	$ 180.453.617,00	80.000,00	$ 61.276.000,00	-10667,92	$ -18.177.617,00	0.00	$ 0,00
				TOTAL APIQUES Y CAMPEOS				$ 515.240.000,00		$ 180.453.617,00		$ 61.276.000,00		$ -18.177.617,00		$ 0,00
				10. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												
33	700.1	700		Línea de demarcación longitudinal (TIPO II)	m	1100.00	$ 2.060,00	$ 2.266.000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
34	714.1	714		Valla informativa	und	7.00	$ 350.000,00	$ 2.450.000,00	10.00	$ 3.500.000,00	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
37	705.1	705		Señales Verticales	m	60.00	$ 377.267,00	$ 22.635.780,00	7.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
38	704.1	704		Barrera Tipo	und	6.00	$ 84.782,00	$ 508.692,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
39	706.1	706		Captafaros	und	20.00	$ 13.428,00	$ 268.560,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
				TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				$ 27.129.032,00		$ -		$ -		$ 0,00		$ 0,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

ACTA RECIBO PARCIAL NUMERICA (3)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-MC-011-2022 –

Anexo 4 = cantidad de obra (1)

Fecha del acta: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SIN NOMBRE EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS BARRIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1911 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA NL, MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL SL, Anna Maria Lizarazo

CANTIDADES ORIGINALES (Lo proyectado en esta fecha y conforme a contrato)										ACTA PARCIAL NUMERACION (de 1 - de 3)		ACTUAL		ACUMULADO TOTAL	
ítem				descripción	un	cant.	v. unit.	v. total				cant.	v. total	cant.	valor total
				ALCANCE PROYECTO											
24	601		PART	Plan de todo este item para la entrada	und	1,00	$ 300.143.523,66		1,00	$ 300.400.750,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Total ITEM N° PRIMERO			$ 300.400.750,00		$ -			
										$ 0,00					
				TOTAL CONTRATO				$ 3.774.640.443,00		$ 3.774.640.443,00		$ 1.033.880.672,00		$ 2.286.876.671,00		$ 2.286.876.671,00
				CRÉDITO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL NO CUMPLIMIENTO				$ 103.876.750,00		$ -		$ -		$ -		$ -
				MAYORES Y/O CANTIDADES ADICIONALES (Para Mayor, Favorable y Extraordinario de Obra)				$ 131.210.200,00		$ 103.210.200,00		$ 17.917.200,00		$ 0,00		$ 17.917.200,00
				MENOS CANTIDADES NO EJECUTADAS (Por Mayor, Favorable y Extraordinario de Obra)				$ 9.961.200,00		$ 9.961.200,00		$ 9.961.200,00		$ 0,00		$ 9.961.200,00
				COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + UTILIDAD + IVA SOBRE UTILIDAD + CONTINGENCIAS + COSTOS FINANCIEROS + COSTOS DE CAPITAL DE TRABAJO				$ 10.754.280,00		$ 40.914.880,00		$ 34.740.000,00		$ 0,00		$ 40.754.280,00
				VALOR TOTAL				$ 3.994.604.643,00	100%	$ 3.994.604.643,00	$ 2.894.179.647,00	$ 1.085.795.351,00	0,00000170322%	$ 2.286.876.671,00	57,2473430130%	$ 2.286.876.671,00

La información contenida en la factura cuenta/cuenta del mismo contratista en el acta parcial (7) del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-MC-011-2022 suscrito con el CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA cuyo representante legal es el señor MARIO ALBERTO PETRO REYES identificado con cedula de ciudadanía No 72.205.946.

ANTICIPO	50%	$	1.415.241.187,00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No.			$ 725.776.325,76
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 2			$ 216.600.282,24
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 3			$ 152.240.211,00
ACUMULADO AMORTIZADO			$ 1.314.616.819,00
SALDO AMORTIZACION		$	100.714.368,00

Total presente acta Quinientos cuatro millones, cuatrocientos y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos con cuarenta centavos M/ Cte

$ 0,00

EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
NIT. 901078.711-5
EL MARIO ALBERTO PETRO REYES
CC. 72.205.946

INTERVENTORIA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT. 901078.711-5
ANNA C. VILLALOBOS
CC. 64.581.166

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		HOJA 1 de 1
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.			Elaborado
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		Fecha 20-12-2023

CAPITULO: EXPLANACIONES	Excavación en material común de la explanación y canales	Unidad	Ubicación
Item: 220.1		M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
										0,00
										0,00
TOTAL										556,83

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA: 1 de 1

Elaborado:

Fecha: 20-12-2023

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-MO-013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERMERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: EXPLANACIONES

Item: 220.1

Terraplenes

Unidad: M3

Ubicación:

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
Eje 1 (K00+000 - K00+130)										591,38



MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+000\K0+130\VOLUMEN TERRAPLEN\cn1
27/12/23 4:19pm Pagina 1
VOLUMEN TERRAPLEN K0+000\K0+130

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-2.22	10.00	0.00	-19.66	9,980.34
0+020.00	0.00	-2.67	10.00	0.00	-23.49	9,956.84
0+030.00	0.00	-3.53	10.00	0.00	-31.04	9,925.79
0+040.00	0.00	-3.79	10.00	0.00	-26.38	9,909.41
0+050.00	0.00	-3.95	10.00	0.00	-28.17	9,881.24
0+060.00	0.00	-3.12	10.00	0.00	-30.49	9,850.75
0+070.00	0.00	-3.58	10.00	0.00	-33.73	9,817.03
0+080.00	0.00	-4.29	10.00	0.00	-39.11	9,777.92
0+090.00	0.00	-4.81	10.00	0.00	-45.03	9,732.89
0+100.00	0.00	-5.35	10.00	0.00	-50.83	9,682.07
0+110.00	0.00	-6.00	10.00	0.00	-56.67	9,625.39
0+120.00	0.00	-9.28	10.00	0.00	-87.34	9,538.06
0+130.00	0.00	-15.89	10.00	0.00	-133.95	9,399.01

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -591.38m3

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. 019 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO-013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SIVERNERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1061 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		HOJA 1 de 1
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA			Elaborado
			Fecha 19-12-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
CAPITULO: EXPLANACIONES	Terraplenes	Unidad	Ubicación
Item: 320.1		M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
EJE 1 (K00+130-K00+190,36)										1033,20

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+130ALK0+190 65\VOLUMEN \VOLUMEN
26/SEP/23 12:12am Pagina 1
VOLUMEN PARCIAL

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+130.00	0.00	-16.15	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+140.00	0.00	-17.86	10.00	0.00	-170.02	9,829.98
0+150.00	0.00	-20.34	10.00	0.00	-191.99	9,637.99
0+160.00	0.51	-20.54	10.00	0.00	-205.79	9,432.20
0+170.00	0.00	-17.99	10.00	0.00	-192.61	9,239.59
0+180.00	0.00	-12.11	10.00	0.00	-150.48	9,089.11
0+185.00	0.00	-12.47	5.00	0.00	-61.44	9,028.07
0+188.65	0.01	-12.19	3.65	0.00	-45.00	8,983.07
0+190.36	0.00	-8.86	1.71	0.00	-16.27	8,966.80

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN PARCIAL = -1,033.20m3

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 1

Elaborado

Fecha 10-12-2023

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2023	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: EXPLANACIONES	Terraplenes	Unidad	Ubicación
Item: 230.1		M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
NO CONTEMPADO (K00+170 - K00+190)	MOVIMIENTOS DE TIERRA C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN 170 AL 190.16\VOLUMEN NO CONTEMPLADO 18/SEP/23 3:01pm Pagina 1 volumen no contemplado ESTACION AREAS(M2) CORTE TERRAPLEN DISTANCIA VOLUMENES(M3) CORTE TERRAPLEN ORDENADA CURVA MASA 0+170.00 0.00 -16.51 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0+180.00 0.00 -20.46 10.00 0.00 -184.84 9,815.16 0+185.00 0.00 -31.88 5.00 0.00 -130.85 9,684.32 0+188.65 0.00 -57.97 3.65 0.00 -103.98 9,530.34 0+190.36 0.00 -29.58 1.71 0.00 -74.79 9,465.55 TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -554.43m3									554,43
					TOTAL					2181,03

VO BO RESIDENTE Y/O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

			HOJA	
		1	de	1
			Elaborado	
CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		Fecha	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA			28-11-24	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA			
CAPITULO: EXPLANACIONES Item: 201.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	Unidad: M3		Ubicación





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	LONGITUD	AREA	ESPESOR	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE	GUARDA LLANTAS	M3	0,26	0,27	15,73			1,10	2,00	2,21
	LOSA	M3	4,2	0,19	15,73			12,55	1,00	12,55
	VIGAS	M3	0,3	1,26	15,73			5,95	2,00	11,89
	ALETAS DE ESTRIBOS	M3				11,3515	0,5	15,68	4,00	62,70
	CUERPO DE ESTRIBOS	M3	4,2	6,6	0,5			13,86	2,00	27,72
	VIGAS DE CORONACIÓN	M3	0,3	1,26	3,4			1,36	2,00	2,72
	RIOSTRAS CENTRAL	M3	0,22	1,26	2,4			0,72	1,00	0,72
	ZAPATAS	M3				64,12	1,20	76,94	2,00	153,88
	GAVIONES	M3	1	2	6			12,00	1,00	12,00
	CICLOPEO	M3	1	0,1	6			0,60	2,00	1,20
TOTAL										287,60

VO BO. RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO. RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°:	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-MO-013-2021 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE	HOJA	
013 - 2021	VEHICULAR SOBRE LA CORRIENTE DENOMINADA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE	Nro	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1861 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021	Fecha	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO TIERRALTA		

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO 1-08	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	Unidad	Ubicación
Item: 008.1.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	MI	

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
DADO DE ENTRADA								428,00



MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAY/23 6:24pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE HUMEDO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE HUMEDO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-18.78	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-23.17	5.00	0.00	-104.67	9,895.33
0+195.00	0.00	-25.49	5.00	0.00	-121.65	9,773.69
0+200.00	0.00	-23.28	5.00	0.00	-121.91	9,651.77
0+205.00	0.00	-31.39	5.00	0.00	-136.59	9,515.19

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO = -428.00m3

FONDO, OBRAS DE PROTECCION								333,26



MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN PEDRAPLEN\VOLUMEN CORTE DEL PEDRAPLEN
02/MAY/23 7:58pm Pagina 1
VOL CORTE HUMEDO DEL PEDRAPLEN

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE HUMEDO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE HUMEDO	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-22.50	10.00	0.00	-217.50	9,782.50
0+014.50	0.00	-24.75	4.50	0.00	-115.76	9,666.74

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO DEL PEDRAPLEN = -333.26m3

TOTAL	761,26

VO BO RESIDENTE Y/O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/O INTERVENTOR

40

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

INVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 4

Elaborado

Fecha 20-12-23

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA								
DADO ENTRADA								1101,30

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
03/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE SECO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE SECO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-97.83	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-65.87	5.00	0.00	-407.23	9,592.77
0+195.00	0.07	-53.95	5.00	0.00	-299.53	9,293.23
0+200.00	3.35	-38.63	5.00	0.00	-231.45	9,061.79
0+205.00	10.52	-28.05	5.00	0.00	-166.70	8,895.09

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -1,101.30m3

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-NO.013-2022 – CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA	1 de 4
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Elaborado	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	Fecha	20-12-23

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 600.2.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
DADO SALIDA	MOVIMIENTOS DE TIERRA C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO SALIDA\VOL DADO SALIDA 02/MAY/22 7:43pm Pagina 1 VOL DADO SALIDA							745,65

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+220.00	0.00	-44.91	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+225.00	0.00	-68.66	5.00	0.00	-263.93	9,736.08
0+230.00	0.00	-66.82	5.00	0.00	-316.69	9,419.39
0+235.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-165.04	9,254.35

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -745.65m3

TOTAL								1846,95

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1061 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA	1 de 3
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		Elaborado	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	Fecha	20-12-23

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	Unidad	Ubicación
Item: 630.4P	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	M3	




UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	AREA	CANT	TOTAL PARCIAL
	ALETAS					7,60	2,00	15,20
	ZARPA, VASTAGO, ESPALDAR					130,90	2,00	261,80
	TOPES SISMICO					1,58	1,00	1,58
	MENSULA							
	TOTAL							278,58

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ELEMENTO	No ELEMENTO	LONGITUD	ALTURA	BASE	AREA	VOLUMEN
ZARPA O DADO	1	15,95	1,1	5,5	87,73	96,50
VASTAGO	1	7,9	4,45	0,8	3,56	28,124
	1	7,9	0,5 - 1	0,65	0,4875	3,85125
ESPALDAR	1	7,9	3,29	0,4	0,916	7,2364
MENSULA	1	7,9	0,3	0,6 - 0,3	0,135	1,0665
PLACA DE APROXIMACION	1	7,9	0,27	4	1,08	8,532
ALETA	2	4,45	0,3	3,948	1,0044	8,99316
	2	2,396	0,3	2,298	0,6894	3,3038048
TOPE SISMICO	1	1,05	0,5	1,5	0,75	0,7875
MESETA DE NIVELACION	4	0,16	0,8	0,8	0,64	0,4096
	2	0,16	0,8	0,8	0,64	0,2304

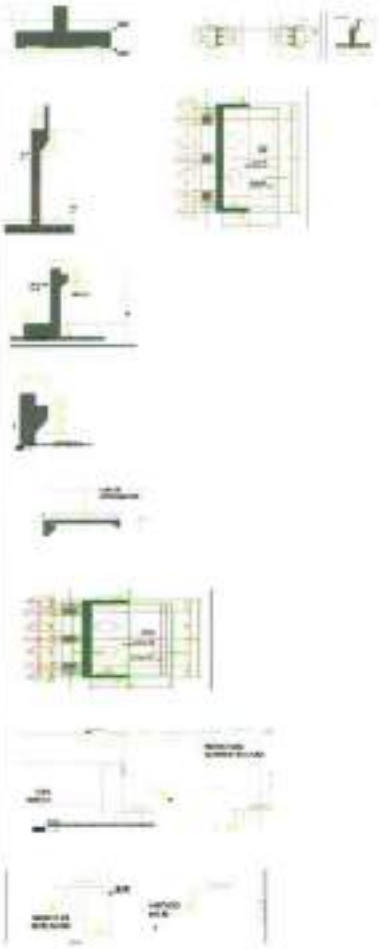

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. 033 - 2022	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO 013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	HOJA 1 de 1	
CONTRATISTA: CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA.		Elaboro: -	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	Fecha: 20-12-21	



CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=80	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	Unidad:	Ubicación:
Item: U30.4P	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	M3	




UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	CANT	TOTAL PARCIAL
	ALETAS	VER DESPIECE				7,60	2,00	15,20
	ZARPA, VASTAGO, ESPALDAR					130,90	2,00	261,80
	TOPES SISMICO					1,58	1,00	1,58
	TOTAL							278,58


V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

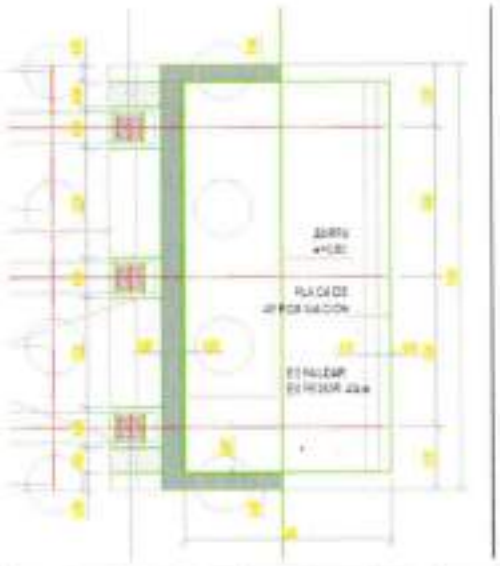ALETA + DESCUENTO	2	4,45	0,35	2,55	11,35	7,60	
		DESCUENTO	0,65	0,75	0,49		
			0,35		10,86		
TOPES SISMICO	2	1,05	1,5	0,5	1,575	1,58	

VASTAGO	1	8,5	2,4	0,8	1,92	16,32
	1	8,5	2,05	0,8	1,64	13,94
	1	8,5	0,65	0,75	0,49	4,14

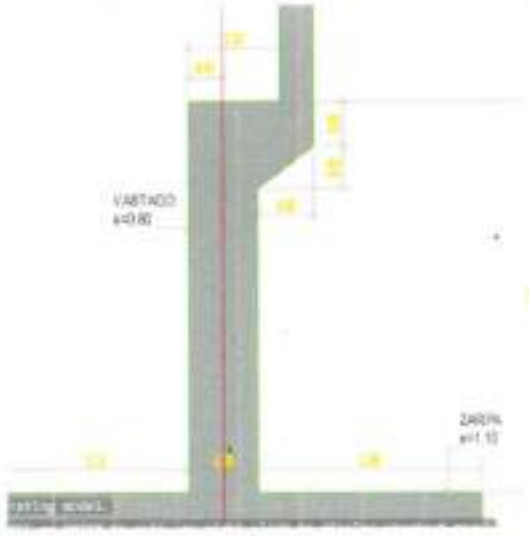

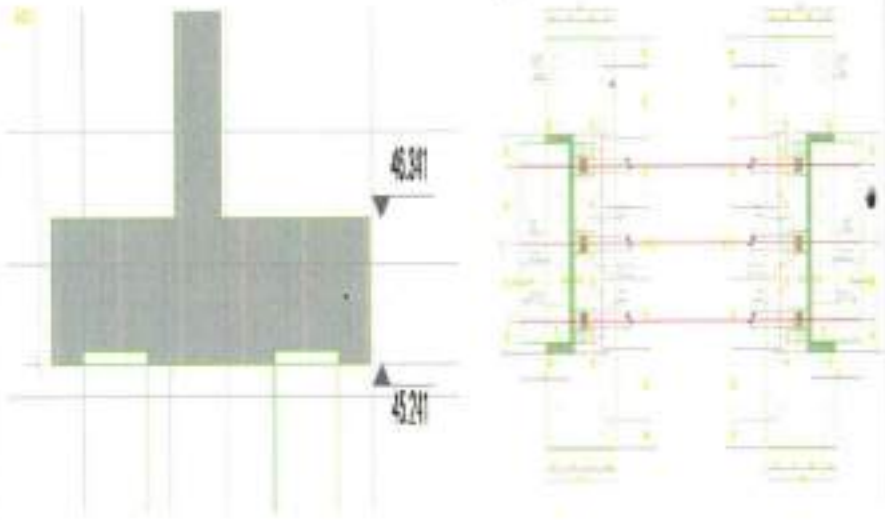ELEMENTO	No ELEMENTO	LONGITUD	ALTURA	BASE	AREA	VOLUMEN	DIAGRAMA
ZARPA O DADO	1	15,95	1,1	5,5	87,73	96,50	

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA: 1 de 1

Elaborado:

Fecha: 20-12-2023

CONTRATO DE OBRA N°.: 013 - 2022

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-MO-013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1963 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30

Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

Unidad: M3

Ubicación:

Item: 630.6

Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)



UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
ESTRUCTURA PUENTE EXISTENTE	LADO A	M3	17,00	6,00	0,05	5,10	1,00	5,10
	AREA PILOTES	M3		0,95	0,05	0,05	12,00	-0,57
	LADO B	M3	17,00	6,00	0,05	5,10	1,00	5,10
	AREA PILOTES	M3		0,95	0,05	0,05	12,00	-0,57
TOTAL								9,06


VO.BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO.BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

		HOJA	
		1 de 1	
		Elaborado	
CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021		
013 - 2022		Fecha	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		20-12-23	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
DIRECTOR DE OBRA:			
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=90		Unidad	Ubicación
Item: 62.1P	PILOTE CONCRETO VACIADO IN SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	

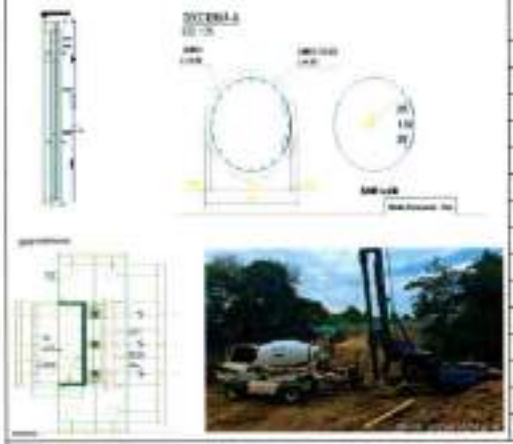

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	DIAMETRO	ALTURA	No DE PILOTES	CANT	TOTAL PARCIAL
	LADO A	ML	19,00	1,10		12,00		228,00
	LADO B	ML	19,00	1,10		12,00		228,00
TOTAL								456,00

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

INVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 1

Elaborado:

Fecha: 30-12-22

CONTRATO DE OBRA N°: 010 - 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. LP-NO.010-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0861 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO: TIERRALTA

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=90

Item: ATL1

Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

Unidad: ML

Elaborado:





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO		PESO ACERO POR METRO LINEAL	CAN	No de ELEMENTO	TOTAL PARCIAL
ZAPPA O DADO LADO 1 Y 2	REFUERZO ACERO TRANSVERSAL 184 #701 C/0.175 L=6.10M	Kg	6.10		3.04	184.00	1.00	6826.19
	REFUERZO ACERO LONGITUDINAL 70 #602 C/0.175 L=5.40M	Kg	5.40		2.26	70.00	1.00	1701.00
	REFUERZO ACERO LONGITUDINAL 70 #602 C/0.175 L=12M	Kg	12.00		2.20	70.00	1.00	1780.00
	GANCHO ESTRUCTURAL 584 #501 C/0.15M L=1.0M	Kg	1.00		1.00	584.00	1.00	1822.08
VASTAGO - MURO LADO 1 Y 2	REFUERZO ACERO TRANSVERSAL MURO 52 #601 C/0.17 L=6.15m	Kg	6.15		2.25	52	1.00	1435.50
	REFUERZO ACERO TRANSVERSAL MURO 84 #502 C/0.25 L=5.95m	Kg	5.95		1.56	84	2.00	651.18
	REFUERZO ACERO LONGITUDINAL MURO 66 #503 C/0.10 L=9.00m	Kg	9		1.56	66	2.00	1347.84
ESPALDAR LADO 1 Y 2	REFUERZO ACERO TRANSVERSAL MURO 43 #504 C/0.18 L=7.80m	Kg	7.8		1.56	43	1.00	1046.45
	REFUERZO ACERO TRANSVERSAL MURO 43 #401 C/0.20 L=9.00m	Kg	9		1.00	24	1.00	612.00
TOPE SISMICO LADO 1 Y 2	REFUERZO ACERO LONGITUDINAL TOPE SISMICO 10 #503 L=2.6m	Kg	2.6		1.56	33	4.00	342.24
	REFUERZO ACERO LONGITUDINAL TOPE SISMICO 10 #401 L=2.6m	Kg	2.6		2.25	33	4.00	494.00
	REFUERZO ESTRIBO TOPE SISMICO 9 #301 C/0.15 L=2.9m	Kg	2.9		0.58	9	4.00	58.46
	REFUERZO GANCHO C TOPE SISMICO 18 #302 C/0.15 L=0.6m	Kg	0.6		0.56	18	4.00	24.19
MESETA DE NIVELACION LADO 1 Y 2	REFUERZO LONGITUDINAL MESETA NIVELACIÓN 7 #401 L=2.30m	Kg	2.3		1.00	7	6.00	96.60
	REFUERZO TRANSVERSAL MESETA NIVELADOR 5 #402 L=2.55m	Kg	2.55		1.00	5	6.00	76.50
ALETAS LADO 1 Y 2	REFUERZO ALETA CARA 1#8E 43 #401 C/0.20m L=1.40m	Kg	9.4		1.00	43	4.00	584.80
	REFUERZO ALETA CARA 1#8E 9 #404 C/0.20m L=8.15m	Kg	8.15		1.00	9	4.00	293.40
	REFUERZO ALETA CARA 1#8E 3 #401 C/0.10m L=5.75m	Kg	5.75		1.00	3	4.00	69.00
	REFUERZO ALETA CARA CONTRA RELLENO 19#501 C/0.20m L=3.45m	Kg	3.45		1.56	33	4.00	409.03
	REFUERZO ALETA CARA CONTRA RELLENO 19#504 C/0.20m L=3.45m	Kg	8.25		1.56	9	4.00	461.31
	REFUERZO ALETA CARA CONTRA RELLENO 19#503 C/0.20m L=3.45m	Kg	5.85		1.56	3	4.00	109.51
	TOTAL							23809.90

VO.BO. RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO.BO. RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

24

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA 1 de 1

Elaborado

Fecha 20-12-23

CONTRATO DE OBRA N°: 013 - 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 – CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO: TIERRALTA


CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30

Item: 630.7P

Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo

Unidad: ML

Ubicación:







UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
	FONDO	M3	30,00	15,00	0,40		1,00	180,00
	TALUD 1	M3	21,90	5,00	0,40		1,00	43,80
	TALUD 2	M3	30,00	5,00	0,40		1,00	60,00
	TOTAL							283,80

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

22

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

MEMORIA DE CANTIDADES

		HOJA	
		1	de 1
		Elaborado	
CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
013 - 2022		Fecha	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		20-12-23	
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA		
CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=38		Unidad	Ubicación
Item: 673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	ML	





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
	FONDO	M3	30.00	15.00	0.20		1.00	90.00
TOTAL								90.00

V0 BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA


MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA		
1	de	1

Elaborado

CONTRATO DE OBRA N°.	PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
013 - 2022		Fecha
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.		20-12-23
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL	MUNICIPIO: TIERRALTA	
DIRECTOR DE OBRA:		

CAPITULO: CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30		Unidad	Ubicación
Item: 673.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	ML	





UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	LARGO	ANCHO	ALTURA		CANT	TOTAL PARCIAL
	FONDO	M3	30.00	15.00			1,00	450,00
	TALUD 1	M3	21.90	5.00			1,00	109,50
	TALUD 2	M3	30.00	5.00			1,00	150,00
TOTAL								709,50

VO BO RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

VO BO RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE

INVIAS

MEMORIA DE CANTIDADES

HOJA: 1 de 1

Elaborado

Fecha: 10-12-23

CONTRATO DE OBRA N°. 013 - 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO: TIERRALTA

Ubicación

CAPITULO: TRANSPORTE

Item: 900.2

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

Unidad: M2

UBICACIÓN	LOCALIZACION	UN	BASE	ALTURA	DISTANCIA	AREA	EXPANSIÓN	TOTAL	CANT	TOTAL PARCIAL
	Excavación en material común de la explaneación y canales		556,83		30,00			16.704,90		16.704,90
	Terraplenes		2.181,03		90,00			196.292,70		196.292,70
								0,00		0,00
TOTAL										212.997,60

V0 B0 RESIDENTE Y/ O CONTRATISTA

V0 B0 RESIDENTE Y/ O INTERVENTOR

25

CONTRATO No.:	LP-013-2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA NIT. 901627711-9 R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES identificado con cédula de ciudadanía No. 73.203.584 de Cartagena.
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL NIT. 901.578.761-6 JUAN AMADO LIZARDO identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR:	ING. MARIO DANILO GUERRA PETRO.
VALOR:	$5.384.604.822.00
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR TOTAL:	$5.384.604.822.00
FECHA DE INICIO:	19- 09-2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No 1	30-09-2023
PRÓRROGA No 2	30-11-2023
PRÓRROGA No 3	31-12-2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En el municipio de Tierralta a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los siguientes señores a saber: **Ing. MARIO DANILO GUERRA PETRO**, identificado con cédula de ciudadanía **N°1.017.247.115 DE MEDELLIN**, Secretario de Obras Públicas, quien actúa en calidad de supervisor en representación de la Alcaldía, el señor **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con **NIT 901627711-9,** representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía **No 73.203.584 DE CARTAGENA**, como contratista de la referencia y el señor **CONSORCIO VIAL NACIONAL** identificado con **NIT 901.578.761-6,** representado por el señor **JUAN E. VILLALOBOS PEREZ** como director de interventoría, con el fin de dejar constancia del recibo parcial de las obras indicadas en el objeto contractual.

El estado financiero se presenta en el siguiente cuadro.

No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR CONTRATO	ANTI CIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTI CIPO X AMOR TIZAR	PAGADO	% EJEC	SALDO
ANTI CIPO		$5.384.604.822,00	$1.615.381.447,00	0	0	0	$1.615.381.447,00	0%	$ 3.769.223.375,00
1	12/04/2023	$5.384.604.822,00	$1.615.381.447,00	$ 1.842.654.418,40	$ 552.796.325,52	$ 1.062.585.121,48	$ 1.289.658.092,88	34,22079204163%	$ 2.479.365.282,12
	24/07/2023	$5.384.604.822,00	$1.615.381.447,00	$ 1.048.130.835,14	$ 314.439.250,54	$ 748.145.870,94	$ 733.691.584,60	19,46532512206%	$ 1.745.673.697,52
3	20/12/2023	$5.384.604.822,00	$1.615.381.447,00	$ 508.049.672,80	$ 152.414.901,84	$ 577.519.676,10	$ 355.634.770,96	9,435226718%	$1.390.038.926,56
TOTAL		$5.384.604.822,00	$1.615.381.447,00	$ 3.398.834.926,34	$ 1.019.650.477,90	$ 595.730.969,10	$ 3.994.565.895,44	63,1213438816%	$1.390.038.926,56

Para constancia se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula Profesional No.22202-152753 COR

Firma: _____
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoria
Interventor CONSORCIO VIAL NACIONAL
Matricula Profesional No.: 08202-80506 ATL

_____
MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario de Obras Publicas

28

Certificado
Bancario

Viernes, 01 de Diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA identificado(a) con NIT 901627711, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	569-000038-84	2022/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 32 15 52 BRR EL EDEN

42. Correo electrónico consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1 3 1 0 3 6 3 8 1 0 3	45. Teléfono 2 6 0 4 7 9 4 8 2 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0 / 2 0 2 2 0 7 2 5	4 2 9 0 / 2 0 2 2 0 7 2 5			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 09 - 15 / 11 : 36: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PETRO REYES MARIO ALBERTO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

[415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y establecimientos	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Régimen	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 2 5	
81. Hasta	2 0 2 3 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: aldia 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 8 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestas y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 3 2 0 3 5 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PETRO	REYES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 7 9 2 1 6 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	MURILLO	JULIAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14864522824

(415)7707212489984(8020) 000001486452282 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 7 1 1	9	Impuestos y Aduanas de Montería	7 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 4 3 4 6 3	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: INCON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 5	2 0 2 2 0 7 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 0 7 9 5 1	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA TERLUZ S.AS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 0 7 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 0 2 7 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES R Y A SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 2 0 7 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 73.203.584
PETRO REYES
APELLIDOS
MARIO ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1983
SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
14-DIC-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el representante legal del MUNICIPIO DE TIERRALTA, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202-152753, (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 0811 de fecha veinticinco (25) de julio de 2022 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LP-013-2022

II. Que mediante Resolución No. 0863 de fecha veintitrés (23) de agosto de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-013-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.


El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

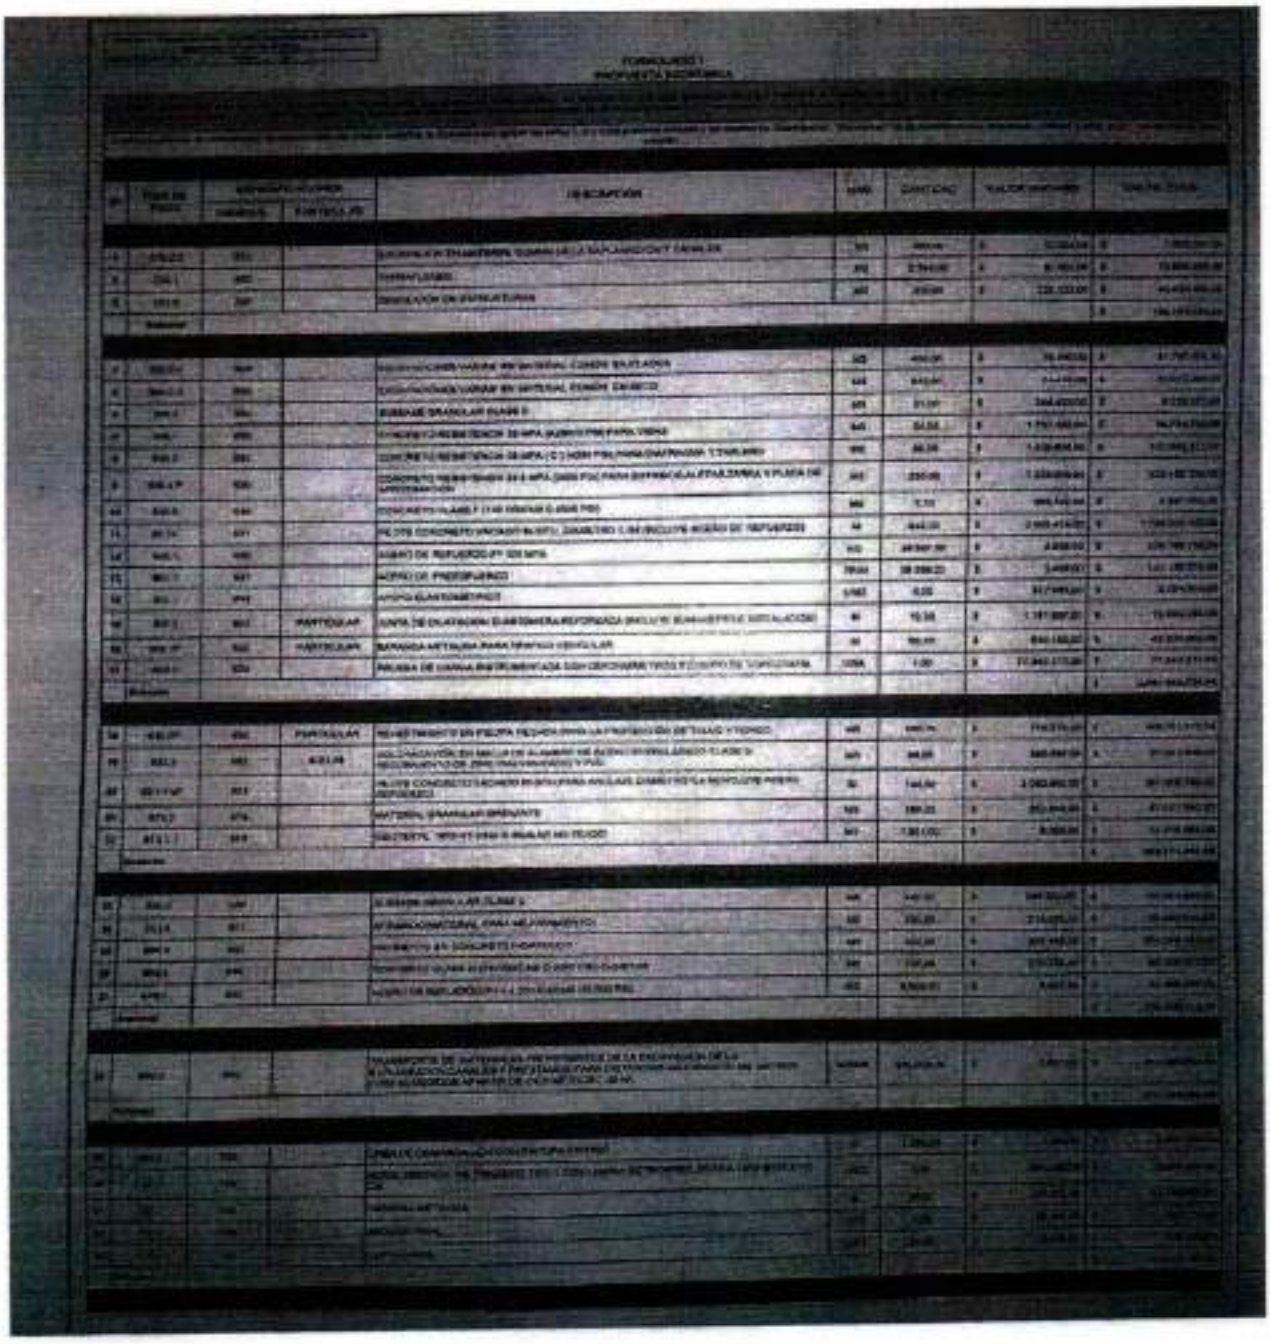

comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. **PARÁGRAFO**: Para la entrega del anticipo debe cumplirse con lo siguiente: **1)** Valla informativa donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas por la entidad. **2)** Póliza debidamente aprobada. **3)** Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor.
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Tierralta, Córdoba, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.
- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.
- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.

- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.
- La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.
- En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.
- La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad No 20220423 de fecha 17 de mayo de 2022, por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.400.000.000,00), evidenciado a continuación:



ALCALDÍA DE TIERRALTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2022

Nro: 20220423

Fecha de elaboración: 17/05/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relaciona a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.07.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales del programa Caminos Rural Comunal 2020-2023	1.3.1.1.21 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	$ 400,000,000.00
CPC 53311	MP: 2422040 Vía terciaria rehabilitada	Total disponibilidad:	$ 5,400,003,000.00

Objeto: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 041 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOHN JAIRO CORDOBA HERNANDEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO ESQUIVEL

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES,** de hasta el **90%** del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución con avances superiores al **30%**, la primera acta, no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues estos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará



ALCALDÍA DE TIERRALTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2022

Nro: 20220423

Fecha de elaboración: 17/05/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, las cuales se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.006	Mantenimiento y Mejoramiento de vías urbanas de cabecera Cabecera Rural Fortaleza SGP-2021	1.3.1.1.0.2.1 Transferencias de calidad de libre destinación los porcentajes generales	$ 400,000,000.00
CPC: 53211	Mpl: 2402045 Vía terciaria rehabilitada		
		Total disponibilidad	$ 5,400,000,000.00

Objeto: CONSTRUCCION DE LA FUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERENITA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1551 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOHN JAIRO CORREA HERNANDEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: **1.- PAGOS PARCIALES,** de hasta el **90%** del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución con avances superiores al **30%**, la primera acta, no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues estos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el Interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el Interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará

previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el período de las actas. **2.- PAGO FINAL**, por valor del 10%, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al Interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO TERCERO. • El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Instalar una valla informativa de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas por INVIAS.
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato Art. 5 numeral 5 Ley 80 de 1993.
18. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo de este contrato, de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993.
19. Las demás obligaciones que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en los documentos técnicos del proyecto y en el presupuesto oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades y en general las de INVIAS.

Las actividades a realizar son:

a.

ITEMS DE PAGO						
N.°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
EXPLANEACIONES						
1	210.2.2	201		EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	660

2	220.1	202		TERRAPLENES	M3	2364
3	201.6	200		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	200
CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30						
4	600.2.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	400
5	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	940,9
6	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	21
7	630.1	630		CONCRETO RESISTENCIA 35 MPA (A) (5000 PSI) PARA VIGAS	M3	34
8	630.3	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) (4000 PSI) PARA DIAFRAGMA Y TABLERO	M3	68
9	630.4 P	630		CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS, ALETAS, ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	250
10	630.6	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	7,10
11	62.1P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	444,00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38987
13	641.1	641		ACERO DE PREESFUERZO	TF/M	58588,2
14	642.1	642		APOYO ELASTOMETRICO	UND	6
15	642.2	642	PARTICULAR	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	12
16	632.1P	632	PARTICULAR	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	60
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UNA	1
PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE						
18	630.7P	630	PARTICULAR	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO	M3	400,7
19	682.3	682	4.01.16	COLCHAGAVIÓN EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	96
20	621.1-2P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, PARA ANCLAJE DIAMETRO 0,4 M (INCLUYE ACERO REFUERZO)	M	144

21	673.2	673		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	186
22	673.1.1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	1.331
				PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO		
23	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	440,00
24	311.1	311		AFIRMADO (MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	330,00
25	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	400,00
26	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI)-CUNETAS	M3	120,00
27	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	6.000
				TRANSPORTE		
28	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANEACÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) MEDIDOS APARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/MK	340.000
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
29	700.1	700		LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIÓ	M	1.200
30	710.1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRNASITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	7,00
31	730.1	730		DEFENSA METALICA	M	80,00
32	730.2	730		SECCIÓN FINAL	UND	4,00
33	740.1	740		CAPTAFAROS	UND	20,00

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD.

El contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa sus actuaciones.

CLÁUSULA 15. MULTAS.

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a UN salario mínimo legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

Opción 1:
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th colspan="3">Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="3">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">MUNICIPIO DE TIERRALTA - CÓRDOBA identificada con NIT 800096807-0 y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS.</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>10% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo.</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>100% de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>20% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.</td><td>CINCO AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.</td><td>30% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.</td><td>Con una vigencia de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras.</td><td>Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de estos ítems. (Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Característica	Condición
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza

Característica	Condición
Asegurados	MUNICIPIO DE TIERRALTA, identificado con NIT. No. 800096807-0, Instituto Nacional de Vías -INVIAS y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	QUINIENTOS (500) SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.
Vigencia	Igual al periodo de ejecución del contrato.
Beneficiarios	MUNICIPIO DE TIERRALTA, identificado con NIT. No. 800096807-0 y el Contratista
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido por la ley.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de TIERRALTA y el domicilio contractual es el Municipio de TIERRALTA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de TIERRALTA, a los Dos (2) días de septiembre de 2022.

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.
Nit No. 901627711-9
R.L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. 73.203.584 DE CARTAGENA.
INGENIERO CIVIL. M.P. No. 22202-152753

DANIEL MONTERO MONTES
Alcalde Municipal.
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyectó Jurídicamente.
ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S.
Asesores Externos

LP-No.013-2022

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE TIERRALTA
Calle 4 Esquina No. 14-13, Palacio Municipal
Tierralta, Córdoba

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP-No.013-2022 en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**

Estimados señores:

Los suscritos, **EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA** actuando en nombre y representación legal de **INCON S.A.S.** identificada con NIT 800.043.463-3, **GERMÁN JOSÉ BULA MONTERROZA** actuando en nombre y representación legal de **CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.** identificada con NIT 901.407.951-6 y **JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO** actuando en nombre y representación legal de **IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.** identificada con NIT 901.320.275-1, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
INCON S.A.S.	55%
CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.	5%
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	40%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
3. El objeto del consorcio es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**

4. La duración del consorcio es igual al plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es MARIO ALBERTO PETRO REYES identificado con cédula de ciudanía No. 73.203.584 de Cartagena, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante legal suplente del consorcio es JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO identificado con cédula de ciudanía No. 1.067.921.644 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal principal del Consorcio.
8. El Señor MARIO ALBERTO PETRO REYES acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
9. El Señor JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizarán INCON S.A.S., CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S. e IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.
11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo:	Cl 32 15 52
Dirección electrónica:	iberica_ic@hotmail.com – licitaciones.inconsas@gmail.com
Teléfono:	7948214
Ciudad:	Montería

En constancia, se firma en Montería, a los (25) días del mes de julio de 2022.

EMELIN JINETH PEREZ BOBADILLA
CC 1.005.240.601 de Barrancabermeja
R.L INCON S.A.S.

German Bula M.

GERMÁN JOSÉ BULA MONTERROZA
CC 10.886.799 de San Marcos
R.L CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.

JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO
CC 1.067.921.644 de Montería
R.L IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-03	Página	3 de 3
Versión No.	3		

Aceptamos,

MARIO ALBERTO PETRO REYES
CC 73.203.584 de Cartagena
R.L CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

JULIAN DAVID GOMEZ MURILLO
CC 1.067.921.644 de Montería
R.L (S) CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

CONTRATO NO:	013 DE 2022.
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO VIAL NACIONAL**
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	PARA EL PRESENTE CONTRATO LA ENTIDAD ENTREGARÁ AL CONTRATISTA A TÍTULO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO. MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.620.000.000,00)
FECHA ENTREGA ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	20220853 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En el municipio de Tierralta a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los siguientes señores a saber: el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.206.554 DE BUCARAMANGA quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202-152753 como contratista y el señor **SAMIR ANTONIO ASSIAS BERNAL,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.073.971.711 de Tierralta, como secretario de obras públicas del Municipio de Tierralta; con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva de las actividades indicadas en el objeto contractual.

Garantía	Póliza No.	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	**36-44-101054903**	02/09/2022	30/06/2023
Prestaciones Sociales	**36-44-101054903**	02/09/2022	31/12//2025
Responsabilidad Civil	**36-40-101021458**	02/09/2022	31/12/2022
Estabilidad / Calidad de la obra	**36-44-101054903**	02/09/2022	02/09/2027

Para constancia se firma la presente acta en original y copia por los que en ella intervinieron.

Secretario de Obras Públicas.

Interventor

Contratista.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

MUNICIPIO DE TIERRALTA
TIERRALTA -
Tels: +57 4 777 1553
Nit: 800096807-0

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2022

Fecha de elaboración: 02/08/2022 Nro: 20220853
Id.único: 20220853

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Código	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20423	2.3.2.02.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vias rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	5,384,604,822.00
CPC: 53211 MPI: 2402045: Via terciaria rehabilitada				

SubTotal:	5,384,604,822.00
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	5,384,604,822.00

A favor de: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Identificado con el documento Nro: 901627711-9

Con el siguiente objeto: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RO

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2022

Nro: 20220423

Fecha de elaboración: 17/05/2022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Mantenimiento y Mejoramiento de vias rurales del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	1.3.1.1.07: Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	5,400,000,000.00
CPC: 53211	MPI: 2402045: Vía terciaria rehabilitada		
		Total disponibilidad:	5,400,000,000.00

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JAIRO MORENO RODRIGUEZ*

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 013 de 2022.

CONTRATO DE OBRA No	013 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIERRALTA
CONTRATISTA	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** Nit 901627711-9 **R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.** C.C. No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**
VALOR	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Entre el representante legal del **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No.013-2022, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA** y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, celebraron en fecha 2 de septiembre de 2022, el Contrato de Obra Pública No. 013-2021 cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** por un valor de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, y un plazo de ejecución de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inició.

SEGUNDA: Que este contrato se deriva del Convenio Interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de

noviembre de 2021, suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

TERCERA: Que este contrato inició en fecha 19 del mes de Septiembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el acta de inicio debidamente suscrita por el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO**, quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, en calidad de contratista y el señor **SAMIR ASSIAS BERNAL,** como **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.**

CUARTA: Que, el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** en calidad de contratista, mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2022, presentó solicitud de Prorroga al Contrato de Obra Pública No 013- 2022, en el siguiente sentido:

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

Montería, 20 de diciembre del 2022

CPC-TIERRALTA-020-2022

INGENIERO
EDGAR RICARDO SARMIENTO
Director de interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO No. CVN-166-2022 - SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No 013-2022

Apreciado Ingeniero Sarmiento, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito revisión y aprobación de prorroga No 1 al contrato de OBRA PÚBLICA No LP-NO.013-2022 – Cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, a partir de la fecha de finalización del contrato de acuerdo a lo establecido en su En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece, cita textual: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio, teniendo en los siguientes hechos:

1. El día 12 de noviembre del 2021, se suscribió convenio interadministrativo No 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021entre el municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, cuyo plazo de terminación es el 31 de diciembre del 2022
2. El día 2 de septiembre de 2022, se suscribió entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba, contrato de obra pública No LP-NO.013-2022 – Cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severinera en la vía que comunica a los municipios de Planeta Rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio interadministrativo no. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021.
3. En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece, cita textual: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio
4. El día 19 de septiembre del 2022, se firma acta de inicio del convenio, siendo así aproximadamente 3,4 meses el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo al plazo contractual. Sobado en esta

Calle 20 # 9-20 Barrio el Edén - Fijo: 7748214 - NIT: 901627711-9 - Correo: consorciopuentesdecordoba@gmail.com

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

ALCALDÍA DE
TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

QUINTA: Que mediante Oficio de fecha 29 de diciembre de 2022, el **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO**, quien actúa en calidad de Interventor, avala la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No 013-2022, tal como se evidencia a continuación:

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Montelíbano, 29 de diciembre de 2022 CVN-340-2022

Señor
MARIO ALBERTO PETRO REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Montería – Córdoba

REFERENCIA: LP-MIA- 013-2022- CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0441 DE FECHA DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: Respuesta a su comunicado No CPC-TIERRALTA-050-2022 y CPC-TIERRALTA-055-2022.

Cordial saludo:

La interventoría Consorcio Vial Nacional informa que, en cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el contrato de interventoría No 079 de 2022 y el manual de interventoría del INVIAS 2022 y una vez revisado el comunicado del asunto, manifiesta que, AVALA LA SOLICITUD DE PRORROGA del contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA del contrato de obra No LP-013-2022 por los motivos expuestos en su comunicado, toda vez que es claro para esta interventoría, la imposibilidad que tiene el contratista de obras en ejecutar la totalidad de las obras físicas del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y dar cabal cumplimiento al objetivo contractual.

Por lo anteriormente dicho, la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, considera necesario AVALAR la solicitud de prórroga del contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA, con fecha de inicio 29 de diciembre de 2022 hasta el día 30 de septiembre de 2023.

Concomitantemente, se aprueba la reprogramación del programa de inversiones No 1 presentado por el contratista de obras, presentado mediante comunicado CPC - TIERRALTA-055-2022.

Así las cosas, esta interventoría no encuentra inconvenientes y considera necesario OTORGAR la prórroga solicitada por el contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

Cordialmente,

CONSORCIO VIAL NACIONAL
EDGAR RICARDO GARMENTO Director de Interventoría

Anexo: • 29-12-2022 MEPI-MN1-Bit-6-PR-1 PROG INVERSIONES PROG INV
cc: Ing. Héctor Lemus – Supervisor de Contrato INVIAS
Ing. Mario Suarez – Secretario de Obras Públicas – Alcaldía de Tierralta

Calle 32 # 29- 63 Cañaveral Teléfono (57-6)7602126 7602124 7606160 Celular 3012116 4629681
E-mail: contactenos@gmail.com - gerencia@vivalnal.com Montelíbano - Colombia

SEXTA: Que, en atención a la solicitud elevada por el municipio de Tierralta, considerando la necesidad de la prórroga del Contrato de Obra No 013 de 2022, se prorrogó, el Convenio Interadministrativo No 1961 de 2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVAS y el MUNICIPIO DE TIERRALTA, del cual se deriva el presente contrato, por un plazo de contado desde el 31 DE DICIEMBRE DE 2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, tal como a continuación se evidencia:

INVIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1961 DE 2021
PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2022

OBJETO:	"UNIR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT:800.215.807-0 MUNICIPIO DE TIERRALTA–CORDOBA NIT. 800.096.807-0

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS**, identificado con cedula de ciudadanía numero 1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3958 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3302 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3329 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, identificado con cedula de ciudadanía 78.764.751 expedida en Tierralta (Cordoba), en su calidad de ALCALDE, posesionado mediante Acta No. 001 del 31 de diciembre de 2019 ante la Notaria Única del Circulo de Tierralta, facultado para la suscripción del presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominara **EL MUNICIPIO**, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Numero 1961 del 16 de noviembre de 2021, hemos convenido suscribir la presente prórroga previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1). Que, mediante oficio fecha 31 de agosto de 2022, EL MUNICIPIO solicita prórroga del Convenio Interadministrativo Numero 1961 de 2021. Así mismo EL MUNICIPIO se compromete a realizar el tramite de reserva presupuestal y la incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2023 del Convenio Numero 1961 de 2021.

2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de fecha 01 de septiembre de 2022, suscrito por el Alcalde, el Director de Interventoría, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E).

3). Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 73 del 19 de diciembre de 2022.

4). Que con Memorando DVR 1050/89 del 26 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de prórroga del convenio.

INVIAS

5.) Que se evidencia que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 01 de septiembre de 2022, EL INSTITUTO giro al MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1961 de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021, desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

SÉPTIMA: Que, en razón a lo anterior, el Secretario de Obras Publicas del Municipio, mediante Oficio de fecha 29 de Diciembre de 2022, remitió al Alcalde del Municipio de Tierralta, solicitud para la formalización de Prórroga al Contrato de Obras Públicas No 013 – 2022, tal como seguidamente se evidencia:



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Tierralta, 29 de diciembre de 2022.

300-103-2022

NOTA INTERNA

Recibí: Karen Luz Navarrete. 29- DIC. 2022 11:03:00 PM.

PARA: DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES
Alcalde Municipal de Tierralta

DE: MARIO DARÍO OSORIA PETRO
Secretario de obras públicas

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA

REF.: CONTRATO LP-013-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CIGARAZA DEVERNIA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

Recibe cordial saludo

Por medio de la presente solicito realizar prorroga al contrato LP-013-2022 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 debido a los siguientes argumentos presentados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados debidamente por la interventoria:

1. El día 12 de noviembre del 2021, se acordó mediante interadministrativo No 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021entre el Municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, dicho plazo de terminación es el 11 de diciembre del 2023

2. El día 2 de septiembre del 2022, se acordó entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba, contrato de obra pública No LP-NO 013-2022 – cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severania en la vía que comunica a los municipios de Planeta rica y Tierralta, Departamento de Córdoba en el marco del convenio interadministrativo no. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021. 3. En la cláusula 4. Plazo del contrato, se establece: dice textual: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, contados a partir del acta de inicio

4. El día 19 de septiembre del 2022, se firma acta de inicio del contrato, dando así aproximadamente 4 a meses el tiempo del ejecución del contrato del proyecto, el plazo contractual

Dirección: Calle 4 Nº 14 -13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierralta-cordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.807-0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Basado en este tiempo se presenta programación de obra, tenemos presente que la misma sera imposible cumplir ya que este tiempo no es suficiente para la ejecución del 100% de las actividades

5. El presente contrato cuenta con dos etapas de ejecución así:
□ Etapa 1 revisión y ajustes a estudios y diseños.
□ Etapa 2 ejecución de actividades de obra, concernientes al contrato.

6. Durante la etapa de revisión y ajustes de estudios y diseños, se contempló un tiempo inicial de 3 meses para llevar a cabo esta etapa, pero una vez iniciada las verificación se evidenciaron deficiencias en los diseños aportados por la entidad, lo que ocasiono que se extendiera el tiempo que se tenia inicialmente presupuesto, para la revisión de los estudios y diseños, ya que se presentaron múltiples observaciones las cuales no permitieron que el tiempo estipulado se diera inicio de ejecución al 100% de los componentes.

7. El día 30 de noviembre del 2022, se realizó acostamiento del proyecto ante la comunidad y en establecimos como fecha de inicio de actividades el día 5 de diciembre del 2022

8. Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las obras a la fecha no sido necesario con el Consorcio Puentes de Córdoba, realice acondicionamiento de vías de acceso ya que estas se han visto afectadas por las lluvias presentadas en la temporada invernal, esto con el fin de trasladar la maquinaria pesada que se requiere en el proyecto. Ubicado a este se cruza via principal de Tierralta del Levante – Montelíbano, ya que la vía Montelíbano – Montería, se encuentra cerrada por la caída del puente a la altura de la hacienda Mirlanda.

Teniendo en cuenta lo relacionado anteriormente y que la fecha de inicio de actividades de obra fue el 5 de diciembre del 2022 y el plazo del cumplimiento del 100% del contrato es el 31 de diciembre del 2022, es claro que el tiempo no es suficiente para la culminación del proyecto, le solicitamos que el nuevo plazo para la ejecución de actividades sea hasta EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial es decir 31 de diciembre del 2022.

Dicho todo lo anterior agradezco su pronta diligencia.

Gracias por su atención.

MARIO DARÍO OSORIA PETRO
Secretario De Obras Públicas

Dirección: Calle 4 Nº 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierralta-cordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.807-0

OCTAVA: Considerando lo antes expuesto, esta entidad prorrogará el término de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación.

NOVENA: Con fundamento en las consideraciones que preceden, resulta evidente que es deber del Municipio de Tierralta, previa manifestación de voluntad del señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, en calidad de contratista.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

En tal sentido las partes de común acuerdo han decidido:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 007- 2021, **HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"

CLAUSULA SEGUNDA: La presente prórroga no genera pagos adicionales a favor del contratista de los que ya vienen previstos para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el Contrato de Obra No 007-2021, conforme a la presente prórroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato quedarán de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el Municipio de TIERRALTA, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES.
Alcalde.
MUNICIPIO DE TIERRALTA.

ORIGINAL FIRMADO
CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
Nit 901627711-9
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No 73.203.584 de Cartagena.-
Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 013 de 2022.

CONTRATO DE OBRA No	013 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIERRALTA
CONTRATISTA	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** Nit 901627711-9 **R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.** C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**
VALOR	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,** contados a partir de la fecha del acta de inicio.
PRORROGA No 1	**HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** contados a partir de la fecha prevista para la finalización.
PLAZO DE LA PRESENTE PRORROGA No 2.	**HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,** contados a partir de la fecha prevista para la finalización.

Entre el representante legal del **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No.013-2022, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA** y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, celebraron en fecha 2 de septiembre de 2022, el Contrato de Obra Pública No. 013-2021 cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** por un valor de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, y un plazo de ejecución de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDA: Que este contrato se deriva del Convenio Interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

TERCERA: Que este Convenio se encuentra vigente hasta el día 31 DE DICIEMBRE DE 2023, conforme a Prórroga No 1, que a continuación se evidencia:

INVIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1961 DE 2021
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT:800.215.807-3 MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA NIT. 800.096.807-0

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 15 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3550 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, identificado con cedula de ciudadanía 78.764.751 expedida en Tierralta (Córdoba), en su calidad de **ALCALDE**, posesionado mediante Acta No. 001 del 31 de diciembre de 2019 ante la Notaria Única del Circulo de Tierralta, facultado para la suscripción del presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominara **EL MUNICIPIO**, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Numero 1961 del 16 de noviembre de 2021, hemos convenido suscribir la presente prorroga previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1). Que, mediante oficio fecha 31 de agosto de 2022, EL MUNICIPIO solicita prorroga del Convenio Interadministrativo Numero 1961 de 2021. Así mismo EL MUNICIPIO se compromete a realizar el trámite de reserva presupuestal y la incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2023 del Convenio Número 1961 de 2021.

2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de fecha 01 de septiembre de 2022, suscrito por el Alcalde, el Director de Interventoría, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E).

3). Que la solicitud de prorroga fue aceptada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 73 del 15 de diciembre de 2022.

4). Que con memorando 2VR 100269 del 28 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del convenio.

INVIAS

5.) Que se evidencia que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 01 de septiembre de 2022, EL INSTITUTO giró al MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1961 de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021, desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

CUARTA: Que este contrato inició en fecha 19 del mes de Septiembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el acta de inicio debidamente suscrita por el **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO**

LIZARDO, quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, en calidad de contratista y el señor **SAMIR ASSIAS BERNAL**, como **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**.

QUINTA: Que en fecha 30 de Diciembre de 2022, se suscribió Prorroga No 1 al presente Contrato de Obra No 013-2022, quedando el plazo de ejecución del mismo HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SEXTA: Que, el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** en calidad de contratista, mediante oficio de fecha 28 de Septiembre de 2023, presentó solicitud de Prorroga al Contrato de Obra Pública No 013- 2022, en el siguiente sentido:

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

Montería, 28 de septiembre del 2023

CPC-TIERRALTA-138-2023

INGENIERO
JUAN E. VILLALOBOS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CVN-614-2022 – SOLICITUD DE PRORROGA No 2

Apreciado Ingeniero Villalobos, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, el Consorcio Puentes de Córdoba, manifiesta con profunda preocupación, las decisiones tomadas por la interventoría en los últimos días, en la que enuncian por medio de oficio No CVN- 614 -2022, dice textual, *Por todo lo anterior, esta Interventoría considera que no es procedente atender la solicitud de prórroga del contrato de obra, NO AVALA dicha solicitud y más bien insta al Contratista para que intensifique los trabajos correspondientes a fin de que cuando concluya el plazo contractual vigente el 30 de septiembre de 2023, se haya cumplido el objetivo pactado y no tengamos necesidad de solicitar la aplicación del Cláusula 16 - Cláusula Penal del contrato referido, la cual establece que: Opción 1 "En caso de incumplimiento por parte del Contratista no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará al la entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato).*

Primero que todo, para el Consorcio Puentes de Córdoba es de gran importancia culminar la obra, como comprenderá, en el lugar de ejecución de la obra, se tiene una logística montada que consta de herramientas, maquinarias, insumos, arriendos y contratos con proveedores. Asociado a esto, en obra hay unas actividades que se han ejecutado y por conciliación entre las partes, a la fecha no se han proyectado en los avances de obra, como es el caso de aproximadamente 3.270 m3 de terraplén instalado, de los cuales solo se han reconocido en la conciliación de cantidades por avance de obra 593.38 m3. También, se ha instalado aproximadamente 29.829 kg de acero que incluye el acero de las tres vigas principales, del mismo modo 58.381 tf/m aproximadamente de acero de preesfuerzo, para las vigas postensadas. Como se puede comprender hay actividades que se han realizado, pero, por motivos de conciliación, no están sumando al porcentaje de avance de obra.

Ingeniero Villalobos, la no aprobación de la prórroga No 2, llevaría al Consorcio Puentes de Cordoba a un colapso financiero, por lo tanto, le solicitamos, con todo respeto se reconsidere prorrogar por un termino de dos meses a partir de la fecha de terminación (30 de septiembre 2023), la prorroga No 2 del contrato, bajo el sustento técnico manifestado en el oficio No CPC-TIERRALTA-136-2023 y CPC-TIERRALTA-135-2023.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

Por último el Consorcio Puentes de Córdoba, teniendo en cuenta todos los riesgos imprevisibles, no ha abandonado en ningún momento la obra y ha realizado todo lo técnico, administrativo y financieramente posible, para velar por el funcionamiento de la obra y evitar cualquier afectación al proyecto.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Mario Alberto Petro Reyes
C. C. 73.203.584
Representante Legal
Consorcio Puentes de Córdoba

SÉPTIMA: Que mediante Oficio de fecha 28 de Septiembre de 2023, el señor **JUAN ELIECER VILLALOBOS,** en calidad de Director de Interventoría del **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, avala la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No 013-2022, tal como se evidencia a continuación:

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Montelíbano, 28 de septiembre de 2023 CVN-631 -2023

Doctor:
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES
ALCALDE MUNICIPAL DE TIERRALTA
Tierralta - Córdoba

REFERENCIA: LP-MIN 013-2022- CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2021".

ASUNTO: APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Apreciado Doctor

El contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba, quienes ejecutan el Contrato No. LP-013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2021", mediante las oficios CPC-TIERRALTA-139-2023, CPC-TIERRALTA-138-2023 y CPC-TIERRALTA-138-2023, ha radicado la solicitud de prorrogar por un término de dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, la nueva fecha de terminación sería el 30 de noviembre de 2023, justificado básicamente en la ola invernal imperante durante la mayoría de los meses de este año en la región y falta de transitabilidad en las vías de acceso a las obras, concluyendo que, el plazo contractual resulta insuficiente para la ejecución de las metas físicas establecidas.

Una vez revisada la documentación anexa, la interventoría Consorcio Vial Nacional informa que, considera conveniente y necesaria la autorización de la prórroga solicitada por el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba, por los motivos expuestos en los comunicados en mención.

Concomitantemente, la interventoría Consorcio Vial Nacional informa que, en cumplimiento de nuestras funciones, dado el atraso presentado con base a la reprogramación del programa de inversiones No 2 vigente, se radico oficio al Municipio de Tierralta "presunto incumplimiento definitivo en contra del contratista de obra CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA", mediante comunicado CVN-616-2022 del 21 de septiembre de 2022, no obstante, en aras de que el contratista de obra tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas del proyecto en beneficio del proyecto y de la comunidad directamente beneficiada, consideramos conveniente recomendar sea autorizada la solicitud de prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023.

No sobra advertir que, si contratista Consorcio Puentes de Córdoba, tiene un atraso en la ejecución de las obras, por lo tanto, el presunto incumplimiento definitivo en contra del contratista de obras que manifestamos mediante nuestro oficio CVN-616-2022 del 21 de septiembre de 2022 continua vigente y el Municipio de Tierralta debe continuar el trámite correspondiente.

Así las cosas, de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obras CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA, las revisiones y consideraciones que se realizaron con esta interventoría, enviamos adjuntos la siguiente documentación, para continuar con el trámite de legalización, por lo que anexamos:

CONSORCIO VIAL NACIONAL

1) CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA
2) MEPLAN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG
3) MEPLAN1-IN-6-FR-1 PROG INVERSION D REPROGRAMACION No 2
4) PROGRAMACIÓN CONTRATO No LP-013-2022
5) DATOS PLUVIOMETRICOS - ESTACION URRA
6) GARANTIAS CONTRACTUALES
7) MEPLAN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Cordialmente,

JUAN ELIECER VILLALOBOS
Director de Interventoría
Consorcio Vial Nacional

cc: Ing. Walter Lamus – Supervisor del Contrato INVIAS
Ing. Mario Petro
Archivo Consorcio Vial Nacional

OCTAVA: Que, en razón a lo anterior, el señor **MARIO DANILO GUERRA PETRO**, en calidad de

Secretario de Obras Públicas del Municipio, mediante Oficio de fecha 28 de Septiembre de 2023, remitió al Alcalde del Municipio de Tierralta, solicitud para la formalización de Prórroga al Contrato de Obras Públicas No 013 – 2022, tal como seguidamente se evidencia:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Tierralta, 28 de septiembre de 2023

300- 196

NOTA INTERNA

PARA: **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**
Alcalde Municipal.

DE: **MARIO DANILO GUERRA PETRO**
Secretario de obras públicas.

REF: CONTRATO DE OBRA **LP-013-2022**.CUYO OBJETO ES: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021","**

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

Reciba cordial saludo.

En calidad de secretario de obras públicas quien actúo como supervisor del contra en referencia, solicito formalmente realizar PRORROGA por un término de dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, la nueva fecha de terminación sería el 30 de noviembre de 2023, cuya justificación dada por el contratista fue la ola invernal imperante presentada durante la mayoría de los meses de este año en la región y falta de transitabilidad en las vías de acceso a las obras; motivos por los cuales la interventoría aprobó debidamente esta solicitud mediante oficio **CVN- 631 -2022** de fecha **28 de septiembre de 2023,** concluyendo que, el plazo contractual resulta insuficiente para la ejecución de las metas físicas establecidas. Dicho todo lo anterior esta supervisión aprueba la solicitud de la interventoría.

Se anexa oficios de solicitud y aprobación emitidos por el contratista e interventoría respectivamente.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario De Obras Publicas

Dirección: Calle 4 N° 14-13 Esquina B / El Prado - PBX: 777 15 53 - Teléfono: 768 77 19
E-mail: contactenos@tierralta-cordoba.gov.co - www.tierraltacordoba.gov.co
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA - CÓRDOBA - Nit. 800.096.807-0

NOVENA: Considerando lo antes expuesto, esta entidad prorrogará el término de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación.

DECIMA: Con fundamento en las consideraciones que preceden, resulta evidente que es deber del Municipio de Tierralta, previa manifestación de voluntad del señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, en calidad de contratista.

En tal sentido las partes de común acuerdo han decidido:

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 013- 2022, **HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".**

CLAUSULA SEGUNDA: La presente prórroga no genera pagos adicionales a favor del contratista de los que ya vienen previstos para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el Contrato de Obra No 013-2022, conforme a la presente prórroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato quedarán de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el Municipio de TIERRALTA, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2023.

DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES.
Alcalde.
MUNICIPIO DE TIERRALTA.

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
Nit 901627711-9
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No 73.203.584 de Cartagena.-
Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ALCALDÍA DE TIERRALTA

NOTA INTERNA

Tierralta, 27 de noviembre de 2023.

Código: 300-235-2023

PARA: **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**
Alcalde Municipal de Tierralta

DE: **MARIO DANILO GUERRA PETRO**
Secretario de obras públicas.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 3

REF: CONTRATO LP-013-2022 CUYO OBJETO ES: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".**

Reciba cordial saludo:

Por medio de la presente solicito realizar prorroga No. 3 al contrato **LP-013-2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** debido a los siguientes argumentos presentados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados debidamente por la interventoría:

1, Durante la ejecución del contrato entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, se han presentado lluvias intensas y moderadas como se relaciona a continuación:

MES PRESENCIA DE LLUVIA	TOTAL DIAS AFECTADOS
SEPTIEMBRE	10
OCTUBRE	7
NOVIEMBRE	6
TOTAL	**23 DIAS**

La presencia de lluvias entre los meses de septiembre y noviembre, han generado una disminución en los rendimientos de obra y como es de su conocimiento, las actividades se realizan sobre el arroyo Severinera, lo cual no permite que se realizan las actividades en presencia de lluvia, por seguridad y salud en el trabajo y la incomunicación en la zona, motivado por la creciente que se genera en el arroyo. Asociado a esto se ha presentado lluvias aguas arriba, generando creciente en el arroyo, impidiendo así la ejecución de las actividades de manera segura.

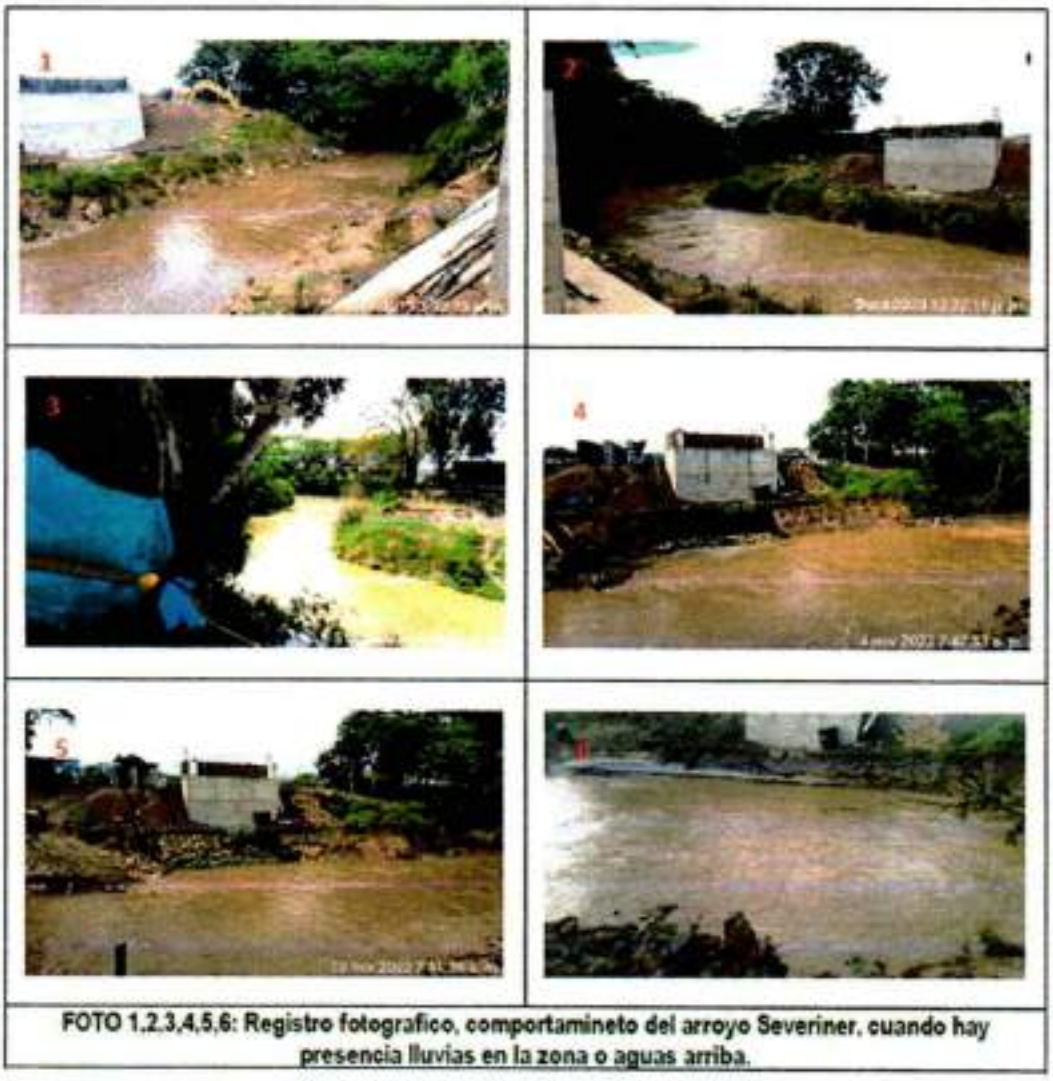


FOTO 1,2,3,4,5,6: Registro fotografico, comportamineto del arroyo Severiner, cuando hay presencia lluvias en la zona o aguas arriba.

2. Se ha presentado incumplimiento en el tiempo de entrega por parte de los proveedore, ya que el acceso a la zona no se encuentra en muy buen estado. Situación que en varias oportunidades los proveedores nos han manifestado que deben esperar que mejore en acceso y las condiciones climáticas lo permita. Se aclara que, por la zona de ejecución del proyecto, es muy limitada la oferta de proveedores, por lo tanto, no ha sido viable realizar cambio de proveedores de insumo al proyecto. A la fecha la fecha de la presente solicitud, en la vía de acceso por Mantagordal, aproximadamente a 2 kilómetros del K0+000 del proyecto, colapso un boxcoulver, el cual no permite el ingreso de maquinaria y/o vehiculos pesados.

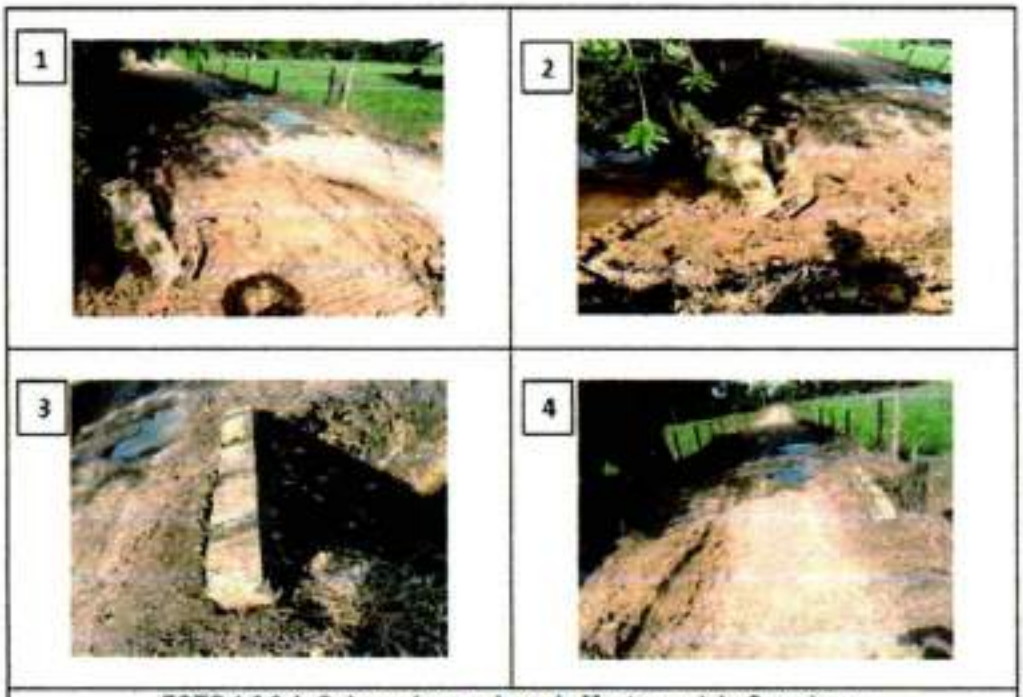


FOTO 1,2,3,4: Colapso boxcoulver via Manta gordal - Severinera

3. El proyecto a corte del 23 de noviembre del 2023, el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución de obras del 64,45%, por situaciones no imputable al contratista, teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, es decir, por bajos rendimientos debido a presencia de lluvias y el incumplimiento por parte de los proveedores por el mal acceso a la zona.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que la fecha de inicio de actividades de obra fue el 5 de diciembre del 2022 y el plazo del cumplimiento del 100% del contrato es el 30 de noviembre del 2023, es claro que el tiempo no es suficiente para la culminación del proyecto, le solicitamos que el nuevo plazo para la ejecución de actividades sea hasta el 31 de diciembre del 2023 a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial es decir 30 de noviembre del 2023.

Dicho todo lo anterior agradezco su pronta diligencia.

Gracias por su atención

MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario De Obras Publicas

Realizó –Marco Navarro - Apoyo Profesional
V.B.- Mario Guerra - secretario de Obras publicas
Revisó. - Marco Navarro - Apoyo Profesional

ALCALDÍA DE
TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 013 de 2022.

CONTRATO DE OBRA No	013 DE 2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIERRALTA
CONTRATISTA	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** Nit 901627711-9 **R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.** C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"**
VALOR	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022,** contados a partir de la fecha del acta de inicio.
PRORROGA No 1	**HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,** contados a partir de la fecha prevista para la finalización.
PRORROGA No 2.	**HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023,** contados a partir de la fecha prevista para la finalización.
PLAZO DE LA PRESENTE PRORROGA	**HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2023,** contados a partir de la fecha prevista para la finalización.

Entre el representante legal del **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de ALCALDE del MUNICIPIO DE TIERRALTA, que para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No.013-2022, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA** y el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, celebraron en fecha 2 de septiembre de 2022, el Contrato de Obra Pública No. 013-2021 cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** por un valor de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, y un plazo de

ejecución de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

SEGUNDA: Que este contrato se deriva del Convenio Interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

TERCERA: Que este Convenio se encuentra vigente hasta el día 31 DE DICIEMBRE DE 2023, conforme a Prórroga No 1, que a continuación se evidencia:

INVIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1361 DE 2021
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL"
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PARTES:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2 MUNICIPIO DE TIERRALTA-CORDOBA NIT. 800.096.807-0

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3683 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificado su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3439 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, identificado con cédula de ciudadanía 78.764.751 expedida en Tierralta (Córdoba), en su calidad de **ALCALDE**, posesionado mediante Acta No. 001 del 31 de diciembre de 2019 ante la Notaria Única del Círculo de Tierralta, facultado para la suscripción del presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominará **EL MUNICIPIO**, se tiene a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Numero 1961 del 16 de noviembre de 2021, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

1). Que, mediante oficio fecha 31 de agosto de 2022, EL MUNICIPIO solicita prórroga del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021. Así mismo EL MUNICIPIO se compromete a realizar el traslado de reserva presupuestal y la incorporación de los recursos al presupuesto de la vigencia 2023 del Convenio Número 1961 de 2021.

2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del convenio, de fecha 01 de septiembre de 2022, suscrito por el Alcalde, el Director de Interventoría, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E).

3). Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien lo aprobó según Acta No. 73 del 19 de diciembre de 2022.

4). Que con Memorando DVR 1055/69 del 26 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la reinicia de prórroga del convenio.

INVIAS

5.) Que se evidencia que en el formato de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 01 de septiembre de 2022, EL INSTITUTO giró al MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula Quinta del Convenio Número 1961 de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo Número 1961 de 2021, desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica indemnización para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente Convenio se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

CUARTA: Que este contrato inició en fecha 19 del mes de Septiembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el acta de inicio debidamente suscrita por el **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO**, quien actúa en calidad de Interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, en calidad de contratista y el señor **SAMIR ASSIAS BERNAL,** como **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.**

Para tales efectos se evidencia el Acta de inicio.

FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NO:	013 DE 2022.
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1561 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	PARA EL PRESENTE CONTRATO LA ENTIDAD ENTREGARÁ AL CONTRATISTA A TÍTULO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO. MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.620.000.000,00)
FECHA ENTREGA ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	3030868 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En el municipio de Tierralta a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2022, se reunieron los siguientes señores a saber: el **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, identificado con Nit No.901.578.761.-6, representado legalmente por el señor **JUAN AMADO LIZARDO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.298.554 DE BUCARAMANGA quien actúa en calidad de interventor; el **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, identificado con Nit 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No 73.303.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202-152753 como contratista y el señor **SAMIR ASSIAS BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía N°

QUINTA: Que a este contrato se le han realizado las siguientes actuaciones:

ACTUACIÒN	FECHA	PLAZO
ACTA DE INCIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRORROGA No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2022	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE2023.
PRORROGA No. 2	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE2023.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

SEXTA: Que este Contrato está vigente hasta el día 30 de Noviembre de 2023.

SÉPTIMA: Que, el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** en calidad de contratista, mediante oficio de fecha 24 de Noviembre de 2023, presentó solicitud de Prorroga al Contrato de Obra Pública No 013- 2022, en el siguiente sentido:

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

Montería, 24 de noviembre del 2023

CPC-TIERRALTA-149-2023

INGENIERO
JUAN E. VILLALOBOS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No 3

Apreciado Ingeniero Villalobos, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito revisión y aprobación de prórroga No 3 al contrato de obra pública No LP-NO.013-2022 – cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, a partir de la fecha de finalización del contrato de acuerdo a lo establecido en la prórroga 2, en la cláusula PRIMERA. Plazo del contrato, se establece, dice textual: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 027- 2021, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, basado en los siguientes hechos:

Avance del proyecto:

A corte del día 23 de noviembre del 2023, y una vez realizada conciliación de cantidades entre el Consorcio Puentes de Córdoba y el Consorcio Vial Nacional, el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución de obras del 84,45% como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	% AVANCE
	EXPLANACIONES	**88,96%**
210.3.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	100,00%
220.1	TERRAPLENES	50,27%
201.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	100,00%

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCIÓN	% AVANCE
	CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30	66,70%
600.2.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	100,00%
600.3.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	76,17%
330.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	0,00%
630.1	CONCRETO RESISTENCIA 35 MPA (A)(5000 PSI) PARA VIGAS	100,00%
630.3	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) (4000 PSI) PARA DIAFRAGMA Y TABLERO	0,00%
630.4 P	CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	87,16%
630.4	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	100,00%
62.1P	PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	100,00%
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	64,30%
641.1	ACERO DE PREESFUERZO	0,00%
643.1	APOYO ELASTOMETRICO	0,00%
643.2	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%
632. 0P	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	0,00%
626.3	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORIMMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	0,00%
	PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE	36,18%
630.7P	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO	48,90%
662.3	COLCHAGAVIÓN EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	0,00%
621.1-2P	PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU,PARA ANCLAJE DIAMETRO 0,4 M(INCLUYE ACERO REFUERZO)	0,00%
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	48,43%
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	53,78%
	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	

ALCALDÍA DE
TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

ITEM	DESCRIPCION	% AVANCE
330.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	
311.1	AFIRMADO(MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	
500.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	
630.4	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)-CUNETAS	
540.1	ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	
	TRANSPORTE	53,20%
666.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACION,CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) MEDIDOS APARTIR DE CIEN METROS (100 M)	53,20%
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	0,00%
700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIÓ	
710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	0,00%
720.1	DEFENSA METALICA	
730.2	SECCIÓN FINAL	
740.1	CAPTAFAROS	
	ITEM NO PREVISTO	0,00%
NP4	PLAN DE IZAJE PARA VIGAS POSTENSADAS	0,00%
	AJUSTE AL PESO	
	TOTAL OBRA EJECUTADA	64,45%

ASPECTO GESTIÓN SOCIAL.

El contrato de obra NO cuenta con provisión para el pago de la GESTION SOCIAL.

ASPECTO GESTIÓN AMBIENTAL.

El contrato de obra NO cuenta con provisión para el pago de la GESTION AMBIENTAL. Este contrato cuenta con un permiso de ocupación de cauce a título del Municipio de Tierralta, el cual fue aprobado mediante resolución No.2-6248 por la Corporación Autónoma de los Valles Sinú y San Jorge – CVS, por lo tanto, las obras de compensación ambiental son de responsabilidad del municipio de Tierralta.

ALCALDÍA DE
TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

ASPECTO FINANCIERO.

La presente solicitud no requiere adición financiera al proyecto. Se mantiene vigente el balance No 2.

ASPECTO JURIDICO

1. El día 12 de noviembre del 2021, se suscribió convenio interadministrativo No 1981 de fecha 12 de noviembre de 2021entre el municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vias – INVIAS, cuyo plazo de terminación es el 31 de diciembre del 2022
2. El día 2 de septiembre del 2022, se suscribió entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba, contrato de obra pública No LP-NO 013-2022 – cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severiana en la vía que comunica a los municipios de Planeta rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio interadministrativo no. 1981 de fecha 12 de noviembre de 2021.
3. En la prorroga No 2, en la cláusula PRIMERA. Plazo del contrato, se establece, dice textual: CLAUSULA PRIMERA. PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No. 007- 2021, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ASPECTO TECNICO

1. Durante la ejecución del contrato entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, se han presentado lluvias intensas y moderadas como se relaciona a continuación:

MES PRESENCIA DE LLUVIA	TOTAL DIAS AFECTADOS
SEPTIEMBRE	10
OCTUBRE	7
NOVIEMBRE	6
TOTAL	23 DIAS

La presencia de lluvias entre los meses de septiembre y noviembre, han generado una disminución en los rendimientos de obra y como es de su conocimiento, las actividades se realizan sobre el arroyo Severiana, lo cual no permite que se realicen las actividades en presencia de lluvia, por seguridad y salud en el trabajo y la incomunicación en la zona, motivado por la creciente que se genera en el arroyo. Asociado a esto se ha

**CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA**

presentado lluvias aguas arriba, generando creciente en el arroyo, impidiendo así la ejecución de las actividades de manera segura.

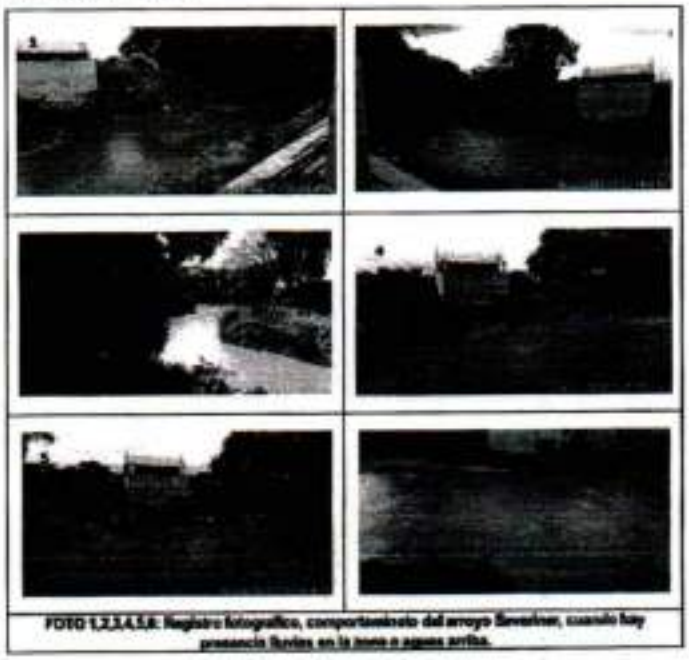


FOTO 1,2,3,4,5,6: Registro fotográfico, comportamiento del arroyo Severino, cuando hay presencia lluvias en la zona o aguas arriba.

**CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA**

2. De he presentado incumplimiento en el tiempo de entrega por parte de los proveedores, ya que el acceso a la zona no se encuentra en muy buen estado. Situación que en varias oportunidades los proveedores nos han manifestado que deben esperar que mejore en acceso y las condiciones climáticas lo permita. De advere que, por la zona de ejecución del proyecto, es muy limitada la oferta de proveedores, por lo tanto, no ha sido viable realizar cambio de proveedores de insumo al proyecto.
A la fecha la fecha de la presente solicitud, en la vía de acceso por Montegordal, aproximadamente a 3 kilómetros del KB+000 del proyecto, colapso un box-culvert, el cual no permite el ingreso de maquinaria y/o vehículos pesados.

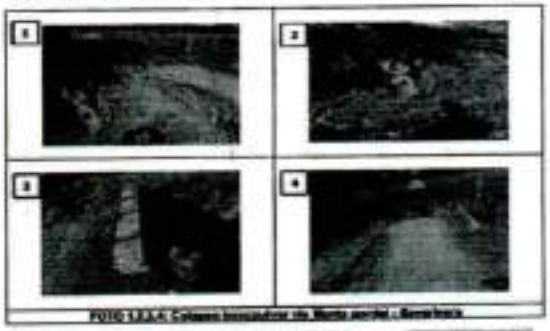


FOTO 1,2,3,4: Colapso box-culvert vía Monte gordal – Buenavista

**CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA**

la ejecución de actividades sea hasta el 31 de diciembre del 2023 a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial es decir 30 de noviembre del 2023.

Sin otro particular

Cordialmente,

Mario Alberto Petro Reyes
C. C. 73.203.584
Representante Legal
Consorcio Puentes de Córdoba

OCTAVA: Que mediante Oficio de fecha 27 de Noviembre de 2023, el señor **JUAN ELIECER VILLALOBOS,** en calidad de Director de Interventoría del **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, avala la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No 013-2022, tal como se evidencia a continuación:



CONSORCIO VIAL NACIONAL

Montelíbano, 27 de noviembre de 2023 CVN-714-2023

Doctor:
RAMÓN ENRIQUE MONTERO MONTES
ALCALDE MUNICIPAL DE TIERRALTA
Tierralta - Córdoba

REFERENCIA: LP-MNL-013-2022- CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERENERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1901 DE FECHA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021".

ASUNTO: AVAL DE SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Apreciado Doctor

El contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba, quienes ejecutan el Contrato No. LP-013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERENERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1901 DE FECHA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021", mediante oficio OPC-TIERRALTA-140-2023, solicita prorrogar el contrato de obras hasta el 31 de diciembre de 2023, justificado básicamente en la alta invernal registrada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023 en la región y falta de trasitabilidad en las vías de acceso a los sitios; concluyendo que, el plazo contractual resulta insuficiente para la ejecución de las metas físicas establecidas.

Con respecto a la solicitud de prórroga, esta interventoría Consorcio Vial Nacional hace la aclaración respecto a que en cumplimiento de nuestras funciones, dado el alcance presentado con base a la reprogramación del programa de inversiones No 3 vigente, se radicaron los oficios al Municipio de Tierralta con asunto "presunto incumplimiento definitivo con cortes del cumplimiento de obra CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA", mediante los comunicados CVN-615-2022 del 21 de septiembre de 2023 , CVN-655-2023 del 17 de octubre de 2023 y CVN-703-2023 del 14 de noviembre de 2023. En dichos oficios se deja constancia de las causales del atraso que presenta el Contratista en la ejecución, que no se pueden sustentar solamente por la ola invernal. Nos atrevemos, en aras de que el contratista de obra tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas del proyecto en beneficio del contratista y de la comunidad directamente beneficiada, consideramos conveniente recomendar dar aceptando la solicitud de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 al CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.

No sobra advertir que, el contratista CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA, tiene un atraso en la ejecución de las obras, por lo tanto, el presunto incumplimiento definitivo en cortes del cumplimiento de obras que manifestamos mediante nuestro oficio CVN-703-2023 del 14 de noviembre de 2023, continua vigente y el Municipio de Tierralta debe continuar el trámite correspondiente.

Una vez revisada la documentación anexa, la interventoría Consorcio Vial Nacional informa que la considera conveniente y recomienda la prórroga solicitada por el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba, por los motivos expuestos anteriormente.

Así las cosas, de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obra CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA, las revisiones y conclusiones que se realizaron con esta interventoría, amablemente solicitamos la siguiente documentación, para continuar con el trámite de legalización de la prórroga al Municipio de Tierralta lo considera



CONSORCIO VIAL NACIONAL

procedemos:

1) CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA
2) MEPLAN1-04-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG
3) MEPLAN1-04-8-FR-1 PROG INVERSION O REPROGRAMACION No 4
4) PROGRAMACION CONTRATO No LP-013-2023
5) GARANTIAS CONTRACTUALES
6) MEPLAN01-04-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TRAMITE

Cordialmente,

JUAN ELIECER VILLALOBOS
Director de Interventoría
Consorcio Vial Nacional

cc: Ing. Sibelis Lastra – Supervisor del Contrato INVIAS
Ing. Alexis Pérez
Archivo Consorcio Vial Nacional

NOVENA: Que, en razón a lo anterior, el señor **MARIO DANILO GUERRA PETRO**, en calidad de Secretario de Obras Públicas del Municipio, mediante Oficio de fecha 27 de Noviembre de 2023, remitió al Alcalde del Municipio de Tierralta, solicitud para la formalización de Prórroga al Contrato de Obras Públicas No 013 – 2022, tal como seguidamente se evidencia



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA INTERNA

Tierralta, 27 de noviembre de 2023.

Código: 300.356.2023

PARA: DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES
Alcalde Municipal de Tierralta

DE: MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario de obras públicas

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 3

REF: CONTRATO LP-016-2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021"

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente solicito prórroga No. 3 al contrato LP-016-2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, a las siguientes actividades relacionadas por el interventor mediante los cuales fueron aprobadas oportunamente por la interventoría:



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dicho esto le anexo agradezco su pronta diligencia.

Cordialmente,

MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario de Obras Públicas

DÉCIMA: Considerando lo antes expuesto, esta entidad prorrogará el término de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación.

DÉCIMA PRIMERA: Con fundamento en las consideraciones que preceden, resulta evidente que es deber del Municipio de Tierralta, previa manifestación de voluntad del señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** representante legal del **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**, en calidad de contratista.

En tal sentido las partes de común acuerdo han decidido:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obras Públicas No.

013- 2022, **HASTA EL 31 DE DICIEMRE DE 2023**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES**, mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.764.751 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y la empresa **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA,** identificado con Nit No 901627711-9, representado legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No 73.203.584 de Cartagena.- Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".**

CLAUSULA SEGUNDA: La presente prórroga no genera pagos adicionales a favor del contratista de los que ya vienen previstos para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el Contrato de Obra No 013-2022, conforme a la presente prórroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato quedarán de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el Municipio de TIERRALTA, a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2023.

DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES.
Alcalde.
MUNICIPIO DE TIERRALTA.

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA
NIT 901627711-9
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No 73.203.584 de Cartagena.
Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACION PUBLICA 013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021" El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar. Con un plazo de ejecución de: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

MEDIANTE EL ANEXO NO.7 y 6 SE HACE APROBACIÓN DE PÓLIZA SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGÚN PRORROGA No.2 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN EN VIGOR.

PÓLIZA N°.	36-44-101054903
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO SA
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Nit 901627711-9 R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2024	$ 538.460.483,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/12/2026	$ 1.076.920.965,00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$ 18.211.284,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2024	$1.615.381.447,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	31/12/2022 – 30/06/2024	$ 1.615.381.447,00

PÓLIZA N°.	36-40-101021456
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO SA
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Nit 901627711-9 R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 31/12/2023	$ 500.000.000

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Revisó: Nairo José Zapa Espitia/secretario de Gobierno
Proyectó: Heidy Vasquez Mora / Contratista

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13 — CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA — TELÉFONO: 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1339-P-04-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1339-P-05-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SALVO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONECTA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NO. 03 SUSCRITO POR LAS PARTES, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******101.917.00	$ *******3,000.00	$ ******19.934.00	$ **********124.852.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXESURO LIMITADA	235588	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3466323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	38-40-101021458	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

BENEFICIARIO 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

38-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavarce S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

REVPRORROGA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9	
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0	
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO:	7771553
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****101,917.00	$ *******3,000.00	$ ******19,934.00	$ **********124,852.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXESURO LIMITADA	235508	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998023347(8020)110071040337 88(3900)0000013 4952(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 110071040337 8-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

a1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C	LAGO	36	36-40-101021458	6

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

BENEFICIARIO 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
INERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

EXPMOD2PRORROGA 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECODICO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1941 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
•CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
• EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
• ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/06/2024	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	31/12/2026	$1,076,920,965.00	$1,076,920,965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,311,384.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2022	31/12/2027	$1,615,381,447.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2024	$538,460,482.00	$538,460,482.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI NO. 03 SUSCRITO POR LAS PARTES, SE ENDOSA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****493,908.00	$ ******8,000.00	$ ******95,362.00	$ **********597,271.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Canastilla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana CA Acertemos

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****493,908.00	$ ******8,000.00	$ ******95,362.00	$ **********597,271.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3456333 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110071940304S2(3900)0000005972 71(96)20220502

REFERENCIA PAGO: 110071940304S-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C	LAGO	36	36-44-101054903	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	12	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771353

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	860043463-1	35.00
INGNICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901497951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavarte B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

AUTORIZACIÓN

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACION PUBLICA 013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021" El valor del Contrato es por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00) incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar. Con un plazo de ejecución de: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

MEDIANTE EL ANEXO NO.4 y 3 SE HACE APROBACIÓN DE PÓLIZA SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGÚN PRORROGA No.2 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN EN VIGOR.

PÓLIZA N°.	36-44-101054903
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO SA
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Nit 901627711-9 R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES. C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/05/2024	$ 538.460.483,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 30/11/2026.	$ 1.076.920.965,00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$ 18.211.284,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/05/2024	$1.615.381.447,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 40.965.696,50

PÓLIZA N°.	36- 40-101021458
COMPAÑIA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO SA
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Nit 901627711-9 R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES. C.C. No 73.203.584 de Cartagena. - Ingeniero Civil. M.P. 22202- 152753.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/11/2023	$ 500.000.000

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta a los Diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Revisó: Nairo José Zapa Espitia/Secretario De Gobierno
Proyectó: Heidy Vasquez Mora / Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIGR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/05/2024	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	30/11/2026	$1,076,920,965.00	$1,076,920,965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS +		$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/05/2024	$538,460,483.00	$538,460,483.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA No. 2 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 013 de 2022 SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA.

Y DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****971,884.00	$ *******8,000.00	$ *****186,178.00	$ *********1,166,062.00	$ ****4,884,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	35	36-44-101054903	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103538103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SUPERMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****971,884.00	$ *******8,000.00	$ *****186,178.00	$ **********1,166,062.00	$ ****4,864,355,625.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	82040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3456322 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110071040268 31(3900)0000116606 2(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710402683-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	11	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-15	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUX SAS	901407951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavaria R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CLAUDIA GNONA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	10	2023	02	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 - 15-05-2020 - 1329-P-GG-GGGDC-E-RCE-002A-DGGI, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

- AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN INTERVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERIBEPA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL ACODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 2 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 013 de 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,547.00	$ *******3,000.00	$ ******38,674.00	$ **********242,222.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	3

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	10	2023	02	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCION: CL 32 NRO 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:** 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCION: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELEFONO:** 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/11/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CLAUDIA GACHA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	10	2023	02	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,547.00	$ *******3,000.00	$ ******38,674.00	$ **********242,222.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456322 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100710402434 2(3900)0000024222 3(96)20230902

REFERENCIA PAGO:
1100710402434-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	10	2023	02	09	2022	00:00	30	11	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 85 - TELEFONO: 3455323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CLAUDIA GACHA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE.

SE HACE ACTUALIZACION DE POLIZA SEGÚN ANEXO 3 Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CON ACTA PRORROGA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, NUEVA FECHA DE TERMIONACION 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA CUAL SE AJUSTAN LOS AMPAROS

PÓLIZA N°.	**36-44-101054903** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA INSTITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	02/09/2022 – 30/03/2024	$1.615.381.447,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022 – 30/19/2026	$1.076.920.965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 - 02/09/2027	$10.211.284.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$1.615.381.447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/03/2024	$538.460.483,00

PÓLIZA N°.	**36-40-101021458** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022-30/09/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Diez (10) días del mes de Abril de 2023.

NAIRO JOSÉ ZAPATA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 860.096.807-6
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN MÁSIEN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 033 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1641 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/03/2024	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	30/09/2026	$1,076,920,965.00	$1,076,920,965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$538,231,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/09/2022	02/09/2027	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/03/2024	$538,460,483.00	$538,460,483.00

EL AMPARA 5 AÑOS, 6 MESES Y 0 DÍAS +

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 1 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 033 DE 2022, SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 30-SEPTIEMBRE DE 2023 QUEDANDO AJUSTADO COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,360,202.00	$ *******8,000.00	$ *****829,858.00	$ *********5,198,160.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553

ADICIONAL:

PSE GUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,360,202.00	$ *******8,000.00	$ *****829,958.00	$ *********5,198,160.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83048	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3458323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998031167(8020)1100710397659?(3900)000005198160(96)20230802

REFERENCIA PAGO: 1100710397659-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9	
DIRECCION: CL 32 NRO. 15 - 62 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0	
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	50.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S Y A S.A.S	901338275-1	45.00
CONSTRUCTORA TERLOS SAS	901407991-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456333 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante G. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULY GOMEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054903, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 03 días del mes de ENERO de 2023

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	09:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A EDDIS 04-09 / E-RCE-011A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA ENVERNIEGA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA No 1 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 013 DE 2022, SE PRORROGA EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 30-SEPTIEMBRE DE 2023 QUEDANDO AJUSTADO COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****897,534.00	$ *******3,000.00	$ *****171,101.00	$ *********1,071,635.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

36-40-101021458
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavaria B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	30/09/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

PIRMA AUTORIZADA: Gabriele A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULYGOMEZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · Diners Club · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****697,534.00	$ *******3,000.00	$ *****171,101.00	$ *********1,071,635.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MEDAS GROUP LTDA	81040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709994031647(8020)110071039760S(3900)0000107143(96)20230802

REFERENCIA PAGO: 1100710397605

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	01	2023	02	09	2022	00:00	30	09	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.627.711-9
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA			
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:**	3103636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.096.807-0
MUNICIPIO DE TIERRALTA			
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S	901130275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUS SAS	901407851-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA; PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3455323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ZULYDONEZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA DE TIERRALTA

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar., equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE .

PÓLIZA N°.	**36-44-101054903**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES.	02/09/2022 – 31/12/2025	$1.076.920.965.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284.00

PÓLIZA N°.	**36-40-101021458**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Nueve (09) días del mes de Septiembre de 2022.

NAIRO JOSE ZARA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOUICOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

"CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINENA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/06/2023	$1,615,381,447.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	31/12/2025	$1,076,920,965.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	*	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2023	$538,460,483.00	

ACLARACIONES

SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUS SAS	901407991-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3455223 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MS.NATALLANA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO:	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUS SAS	901407931-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3455223 - BOGOTA, D.C.

35-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	830843453-2	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****394,520.00	$ *******3,000.00	$ ******75,528.00	$ **********473,049.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELEFONO:** 3160636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELEFONO:** 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3455323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NOLMATALLANA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	09	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA	ADICIONAL:	

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Codensport

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****394,620.00	$ *******3,000.00	$ ******75,526.00	$ **********473,049.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83740	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709808031167(8020)1100710389655(3900)000004730(96)20230903

REFERENCIA PAGO: 1100710389655-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ALCALDÍA DE TIERRALTA
PAZ, DESARROLLO Y BUEN GOBIERNO

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 013 DE 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"** Por valor **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.384.604.822.00)** incluido AIU todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.. equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de HASTA 31 DE DICIEMBRE

SE HACE ACTUALIZACION DE POLIZA SEGÚN **ANEXO 2** Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CON ACTA DE INCIO DE FECHA 19 DE SEPTEIMBRE DE 2022.

PÓLIZA N°.	**36-44-101054903**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA INSTITUTO NACINAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022 – 31/12/2025	$1.076.920.965.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022-02/09/2027	$10.211.284.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMAPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$1.615.381.447.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483,00

PÓLIZA N°.	**36-40-101021458**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR:	**CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA.**
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022-31/12/2022	$500.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta a los Siete (07) días del mes de Octubre de 2022.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto/Elaboro: Julieth Muñoz – abogada contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	38-40-101021458	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

"SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN INTERVENCIULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL «RCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021».

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	

ACLARACIONES

SE HACE CONSTAR QUE SE INCLUYE A LA PRESENTE POLIZA EL ACTA DE INICIO DE FECHA SEPTIEMBRE 19 DE 2022 AL CONTRATO No 013 DE 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	82040	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

38-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3103636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7775553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	31/12/2022	$500,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NEL/MATALLANA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2022	23:59	AÑEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3103636103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7771593

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800083463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES F Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUS SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.79 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NEUMATALLANA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDLOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

"CONTRATO No. 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1861 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	30/06/2023	$1,615,381,447.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	31/12/2025	$1,076,920,965.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	02/09/2027	$18,211,284.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS +		$1,615,381,447.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	30/06/2023	$538,460,483.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE INCLUYE A LA PRESENTE POLIZA EL ACTA DE INICIO DE FECHA SEPTIEMBRE 19 DE 2022 AL CONTRATO No 013 DE 2022.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,864,355,626.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MIDAS GROUP LTDA	83040	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456322 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	02	09	2022	00:00	31	12	2027	23:59	AÑEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELEFONO:	3103838103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO:	7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800143463-3	55.00
INGENIERIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERUEL SAS	901407951-8	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE OBRA

CONTRATO:

- LP-NO.013-2022

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

INTRODUCCIÓN

El contrato de obra No. LP-NO.013-2022 suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Consorcio Puentes de Cordoba, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, se está ejecutando en la zona rural del municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, específicamente sobre la quebrada Severinera, en la vía que comunica el municipio de Tierralta con el municipio de Planeta Rica, por parte del contratista, con un plazo de ejecución de 15,4 meses, contados a partir del 19 de septiembre de 2022, la cual corresponde a la fecha del acta de inicio, y la interventoria técnica, administrativa y financiera realizada por el Consorcio Vial Nacional.

Las obras a ejecutar corresponden a la construcción de un puente vehicular el cual será de 30 metros de longitud, un ancho de vía de 6,5 metros y anden de 1 metro. Este puente contará por una cimentación profunda con sistema de pilotes, su estructura en la que se construirá estribo y aletas y una super estructura la cual está formada por vigas postensadas, vigas auxiliares y su tablero. Asi mismo se contempla la construcción de los accesos al puente en concreto, las obras de protección de la ribera y/o la estabilización de taludes.

El presente informe mensual corresponde al periodo desde el 25 de julio de 2023 hasta el 20 de diciembre del 2023, en el cual se soporta el estado de la ejecución del contrato y sus obras respectivas, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

El desarrollo del informe, comprende los siguientes capítulos y anexos que muestran categóricamente el estado de avance físico de las obras, en ocasión a la aplicación de las especificaciones técnicas de construcción y los estudios y diseños apropiados por el Consorcio Puentes de Córdoba para la ejecución de las obras, las actuaciones administrativas y el estado financiero del contrato.

En el Capítulo 1, se encuentra la información general del proyecto.

En el Capítulo 2, se encuentra el informe Administrativo.

En el Capitulo 3, se encuentra el informe Financiero.

En el capitulo 4, se encuentra el informe Técnico.

En el capítulo 5, se muestran las dificultades, inconvenientes e imprevistos que fueron relevantes para la ejecución de las obras y sus rendimientos que afectaron el cronograma de actividades.

Los anexos de este informe comprenden los soportes de que dan evidencia de lo descrito en cada capítulo, asociados a cada actividad ejecutada física, administrativa y financiera.

Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones que se dieron lugar durante el periodo.

OBJETIVO DEL INFORME.

Describir en forma detallada el estado de la ejecución del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 y las obras establecidas dentro del alcance y meta física del mismo, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA y demás obligaciones contractuales.

ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene como alcance describir las actividades ejecutadas relacionadas con los componentes administrativos, financieros y técnico del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 durante el periodo del 25 de julio del 2023 al 20 de diciembre del 2023 un porcentaje de ejecución del **9,4352267175532%** con respecto al valor total del contrato de obra No LP-NO.013-2022 es decir $ 5.384.604.822. El componente técnico incluirá avance de obra e implementación de los ejes de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1. Información básica del contrato de obra.

INFORMACION GENERAL	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
LOCALIZACION DEL PROYECTO	QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TIERRALTA
CONTRATO N°	LP-NO.013-2022
PLAZO INCIAL	3,4 MESES
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PRORROGA N1	9 MESES
PRORROGA N2	2 MESES
PRORROGA N3	1 MES
FECHA DE SUSPENSION	N.A
FECHA DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICEIMBRE DEL 2023
VALOR INICIAL	$ 5.384.604.822,10
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	ING. MARIO GUERRA PETRO

1.2. Localización del proyecto.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TIERRALTA
NIT: 800096807:0
CÓDIGO DANE: 23855
GENTILICIO: Tierraltense

Es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería, capital departamental, conocido por tener uno de los parques nacionales naturales más grande del mundo llamado el Nudo de Paramillo, protegido por las Naciones Unidas. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.


EXTENSIÓN Y LÍMITES

Considerando lo consignado tanto en el Plan de Desarrollo, así como lo reportado en el Plan de Ordenamiento Territorial, además, las consultas en el instituto Geográfico Agustín Codazzi; el Municipio de Tierralta tiene una extensión superficial de aproximadamente 4.728 Km2, y sus límites son los siguientes:

- **Norte**: Montería.
- **Oriente**: Planeta Rica.
- **Sur**: Montelíbano y el departamento de Antioquia.
- **Occidente**: Valencia y el departamento de Antioquia.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO DE LA OBRA

Vereda Severinera

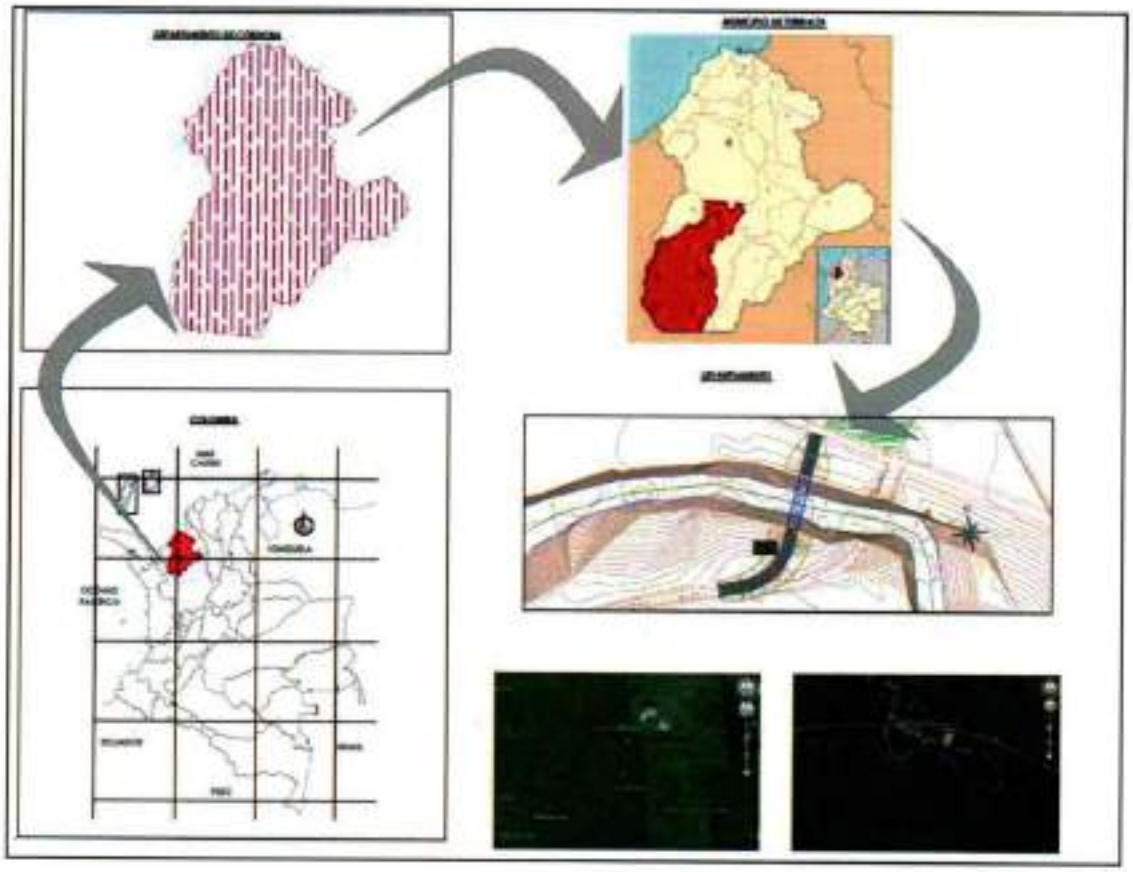

1.3. Descripción de las obras objeto del proyecto – Condiciones iniciales.

			I. EXPLANACIONES
1	**210.2.2**	**210**	Excavación en material común de la explaneación y canales
2	**220.1**	**220**	Terraplenes
3	**201.6**	**200**	Demolición de estructuras
			II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M
4	**600.2.4**	**600**	Excavaciones varias en material común bajo agua.
5	**600.2.3**	**600**	Excavaciones varias en material común en seco .
6	**320.3**	**320**	Subbase Granular Clase C.
7	**630.1**	**630**	Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS
8	**630.3**	**630**	Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero
9	**630.4 P**	**630**	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación
10	**630.6**	**630**	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
11	**621.1P**	**621**	Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)
12	**640.1**	**640**	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
13	**641.1**	**641**	Acero de PreEsfuerzo.
14	**642.1**	**642**	Apoyo elastometrico
15	**642.2**	**642**	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)
16	**632.1 P**	**632,1**	Baranda metalica para trafico vehicular
17	**620.3**	**620**	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

			III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.
18	**630.7P**	**630**	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo
19	**682.3**	**682**	Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC
20	**621.1-2P**	**621**	Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)
21	**673.2**	**673**	Material Granular Drenante
22	**673.1.1**	**673**	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
			IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
23	**320.3**	**320**	Subbase Granular Clase C.
24	**311.1**	**311**	Afirmado (Material para mejoramiento)
25	**500.1**	**500**	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
26	**630.4**	**630**	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
27	**640.1**	**640**	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
			V. TRANSPORTE
28	**900.2**	**900**	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).
			VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
29	**700.1**	**700**	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.
30	**710.1**	**710**	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
31	**730.1**	**730**	Defensa Metálica
32	**730.2**	**730**	Sección Final
33	**740.1**	**740**	Captafaros

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1. Revisión del contrato y documentos del proyecto. Indicar si se requirió modificatorios u otros sí al contrato, etc.

CONTRATO DE OBRA: fecha de suscripción 2 de septiembre del 2022.

PRORROGA No 1: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 1 de fecha 30 de diciembre del 2022 (Anexa soporte). La prorroga solicitada fue por 9 meses a partir del 31 de diciembre del 2022, fecha de terminación inicial del contrato.

PRORROGA No 2: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 2 de fecha 28 de septiembre del 2023 (Anexa soporte). La prorroga solicitada fue por 2 meses a partir del 30 de septiembre del 2022, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 1

PRORROGA No 3: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 3 de fecha 27 de noviembre del 2023 (Anexa soporte). La prorroga solicitada fue por 1 meses a partir del 30 de noviembre del 2022, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 2

2.2. Pago de impuestos.

A la fecha se han efectuados descuento de impuesto al consorcio Puentes de Córdoba por parte de la entidad contratante Municipio de Tierralta.

DESCRIPCION	ACTA PARCIAL No 1
Valor del acta	$ 1.842.654.418,40
Amortización por anticipo (%)	$ 552.796.325,52
ACTA - AMORTIZ =CDO + ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.289.858.092,88
Costos directo de Obra	**$ 1.229.153.812,88**
Descuento impuesto costo directo de obra	
RET. CON.OBRA	$ 35.639.002,77
UNICOR	$ 17.819.501,38
PRO-CULTURA	$ 17.819.501,38
ESTAMPA. PRO	$ 71.278.005,54
PRODEPORTE	$ 26.729.252,08
BOMBERIL	$ 17.819.501,38
FOND. SEG	$ 89.097.506,92
RETE ICA	$ 14.255.601,11
TOTAL DESCUENTO	**$ 290.457.872,56**
Estudio y diseños. Revision ajuste y/o actualizacion modificacion y complementacion de Estudios y Diseños	**$ 60.704.280,00**
Descuentos impuesto estudios y diseños	
RET. CON.OBRA	$ 5.611.320,00
UNICOR	$ 510.120,00
PRO-CULTURA	$ 607.042,80
ESTAMPA. PRO	$ 2.040.480,00
PRODEPORTE	$ 910.564,20
FOND. SEG	$ 485.634,24
RETE ICA	$ 1.453.842,00
TOTAL DESCUENTO	**$ 11.619.003,24**
Total desembolso	**$ 987.781.217,08**

2.3. Suscripción de actas: Acta de inicio, suspensiones, reinicio, etc.

ACTA DE INICIO: de fecha 19 de septiembre del 2022 (anexa soporte).

2.4. Actualización de pólizas y aprobación de las mismas por la entidad. (Anexa soportes)

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ADJUDICACION DEL CONTRATO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ADJUDICACION		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ACTA DE INICIO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ACTA DE INICIO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/03/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/09/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/03/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 30/09/2023	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/05/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 30/11/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/05/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 30/11/2023	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/12/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION. DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
	PRORROGA No 1	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2023	$500.000.000

2.5. Listado de personal contratado y afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y el correspondiente soporte del pago y paz y salvo. (Anexa soportes)

2.6. Descripción del personal profesional del proyecto, según pliego de condiciones y la oferta.

Se envió mediante oficio No CPC-TIERRALTA-006-2022 de fecha 22 de septiembre del 2023 las hojas de vida del personal mínimo exigido de acuerdo al pliego.

Se aprobó mediante oficio CVN-041-2022 de fecha 26 de septiembre del 2023.

PROFESIONAL	**CARGO**
AYLEN MAUTH CARRASCAL LLORENTE	Directora de obra
JOSE MANUEL DIAZ PINTO	Residente de obra
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	Especialista Ambiental
MARIA INES GONZALES AYUS	Coordinador SST

2.7. Solicitudes de homologaciones de personal, cuando aplique.

Se solicito mediante oficio No CPC-TIERRALTA-059-2023 de fecha 12 de enero de 2023, homologación del residente de obra inicialmente aprobado.

Se avala hómologación mediante oficio No CVN-258-2023 de fecha 16 de enero del 2023

PREFESIONAL	DEDICACION	RESIDENTE DE OBRA	HOMOLOGAR
RESIDENTE DE OBRA	100%	JOSE MANUEL DIAZ PINTO - CC. 15.042.131	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS. C.C No 3.482.179

2.8. Manejo de la correspondencia. (Anexa soportes – MEDIO MAGNETICO)

3. INFORME FINANCIERO.

3.1. Organización y presentación de la documentación solicitada por la entidad para la aprobación del Plan de inversión del anticipo y cronograma, o renuncia de anticipo, según el caso: La fiducia se encuentra liquidada

3.2. Organización y presentación de la documentación requerida para la gestión del trámite de pago de los reembolsos y/o cobros asociados al manejo de los recursos en calidad de anticipo: La fiducia se encuentra liquidada

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 574.928.110,00	$ 574.928.110,00	$ -	$ 574.928.110,00	$ -
2	TRANSPORTE	$ 185.896.965,00	$ 185.896.965,00	$ -	$ 185.896.965,00	$ -
3	MANO DE OBRA	$ 854.556.340,00	$ 854.556.340,00	$ -	$ 854.556.340,00	$ -
	TOTALES	$ 1.615.381.447,00	$ 1.615.381.447,00	$ -	$ 1.615.381.447,00	$ -

*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NUMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
1	MATERIAL	FACTURA	SE1723	21-dic-22	STECKERL	$ 139.947.782,40
1	MATERIAL	FACTURA	SE1726	21-dic-22	STECKERL	$ 146.106.662,82
1	MATERIAL	FACTURA	SE1779	16-feb-23	STECKERL	$ 118.919.919,00
1	MATERIAL	FACTURA	FEV-16	24-feb-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 121.726.277,00
1	MATERIAL	FACTURA	FEV-19	15-mar-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 50.864.189,00
1	MATERIAL	FACTURA	FEV-21	27-mar-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 50.864.189,00
					TOTAL	$ 574.909.119,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FE26	19-dic-22	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 68.914.686,97
2	TRANSPORTE	FACTURA	FEV-17	24-feb-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 26.699.671,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FE31	3-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 11.266.387,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FE32	15-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 29.407.343,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FEV-18	15-mar-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 14.249.806,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FE34	27-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 29.407.344,00
2	TRANSPORTE	FACTURA	FEV-20	27-mar-23	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	$ 14.249.807,00
					TOTAL	$ 193.896.960,00
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FEA035	19-dic-22	EDUAR TONY ARCIA	$ 81.220.028,18
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FE30	19-dic-22	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 346.048.148,21
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FE33	15-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 173.024.074,00
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FEA037	15-mar-23	EDUARD TONY ARCIA NOHAYA	$ 40.810.010,00
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FE35	27-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 173.024.074,00
3	MANO DE OBRA	FACTURA	FEA038	27-mar-23	EDUARD TONY ARCIA NOHAYA	$ 40.810.010,00
					TOTAL	$ 854.956.346,00

3.3. Presentación de actas parciales y resumen del balance (Anexa soporte).


A la fecha se han presentado pago de acta parcial No 1 y No 2, se resumen así:

DESCRIPCION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2
Valor del acta	1.842.654.418,40	1.048.130.835,14
Amortizacion por anticipo (%)	552.796.325,00	314.439.250,54
ACTA-AMORTIZ =CDO+ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.289.858.093,40	733.691.584,60
Costos de obra	**1.229.153.812,88**	**733.691.584,60**
Descuento impuesto costos directos de obra		
RET. CON OBRA	35.639.002,77	20.962.617,00
UNICOR	17.819.501,38	10.481.308,00
PRO-CULTURA	17.819.501,38	10.481.308,00
ESTAMPA PRO	71.278.005,54	41.925.233,00
PRODEPORTE	26.729.252,08	15.721.963,00
BONBERIL	17.819.501,38	10.481.308,00
FOND. SEG	89.097.506,92	52.406.542,00
RETE ICA	14.255.601,11	8.385.047,00
TOTAL DESCUENTO	**290.457.872,56**	**170.845.326,00**
Estudio y diseño. Revision ajuste y/o actualizacion modificacion y complementacion de estudio y diseños	**60.704.280,00**	
Descuentos impuestos estudios y diseños		
RET. CON OBRA	5.611.320,00	
UNICOR	510.120,00	
PRO-CULTURA	607.042,80	
ESTAMPA. PRO	2.040.480,00	
PRODEPORTE	910.564,20	
FOND. SEG	485.634,24	
RETE ICA	1.453.842,00	
TOTAL DECUENTO	**11.619.003,24**	
Total desembolso	**987.781.217,08**	**562.846.258,60**

4. INFORME TÉCNICO

4.1. Presupuesto y APUS aprobados por la entidad en là oferta económica. Fueron suministrado a la interventoría.



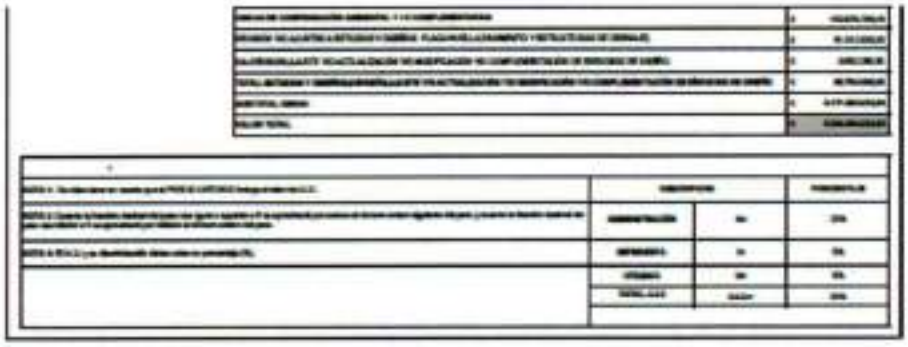

4.2. Solicitudes de revisión y aprobación de la reprogramación de obra y Plan de contingencia. (Anexa soporte)

4.3. Solicitud de revisión del balance económico del contrato, acta de mayores y menores cantidades. (Anexa soporte)

4.4. Solicitud de aprobación de estudios, diseños, especificaciones:

Se dio aval por parte de la interventoría de la revisión de los estudios y diseños así:

COMPONENTE	OFICIO APROBACIÓN	FECHA
Hidráulico	CVN-125-2022	1 de noviembre del 2022
Geotécnico	CVN-167-2022	28 de noviembre del 2022
Estructural	CVN-273-2023	26 de enero del 2023
Geométrico	CVN-269-2023	29 de enero del 2023

4.5. Resumen de actividades ejecutadas en el periodo.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio del 2023 y el 20 de diciembre del 2023, se ejecutaron las siguientes actividades.

Etapa 1: Dentro de la documentación suministrada por la entidad no se evidencio el diseño geométrico del proyecto, por lo tanto el contratista presento dicho diseño de acuerdo a la normatividad vigente.

Se presento aval mediante oficio No CVN-269-2023 de fecha 29 de enero del 2023, estudio y diseño geométrico del proyecto.

El consorcio Puentes de Córdoba mediante los oficios No CPC-TIERRALTA-119-2023 y CPC-TIERRALTA-124-2023, presenta diseño geométrico, de acuerdo a lo aprobado por

la entidad contratante Alcaldia de Tierralta mediante oficio No 300-062 de fecha 19 de abril del 2023, en el que se aprueba y se solicita que se implemente al proyecto al alternativa No 2 de los diseños geométricos presentados, teniendo en cuenta que no se puede implementar el diseño geométrico aprobado inicialmente, el cual cumple con la normatividad vigente, toda vez existe limitante predial, que impide la implementación del mismo.

Etapa 2: ejecución de obras civiles, las actividades en el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2023 hasta el 20 de diciembre del 2023

- Terraplen.
- Explaneacion
- Demolición de estructuras
- Excavaciones varias en material común bajo agua.
- Excavaciones varias en material común en seco.
- 'Concreto Resistencia para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación
- Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI).
- Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo).
- Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
- Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo.
- Material Granular Drenante.
- Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
- 'Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

4.6. Cantidades de obras ejecutadas en el periodo y porcentajes acumulado de avance fisico de la obra

ITEM				DESCRIPCION	UN	CANT.	
				I. EXPLANACIONES			
1	210.2.2	210		Excavación sin material común de la explanación y	m3	556,83	100,00%
2	220.1	220		Terraplenes	m3	1661,03	89,22%
3	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	0,00	100,00%
				Total EXPLANACIONES			66,56%
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE			
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en materal común bajo agua	m3	0,00	100,00%
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco	m3	0,00	76,87%
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	0,00	0,00%
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	0,00	0,00%
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	0,00	0,00%
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	m3	44,36	87,65%
10	630.6	630		Concreto clase P (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	0,00	100,00%
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1.1 m (incluye acero de refuerzo)	m	0,00	100,00%
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	286,41	47,79%
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	tfm	0,00	0,00%
14	642.1	642		Apoyo elastomerico	und	0,00	0,00%
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	0,00	0,00%
16	632.1 P	632,1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	0,00	0,00%
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	0,00	0,00%
				Total CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M			76,02%
				II. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE			
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	103,90	69,46%
19	662.3	662		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	0,00	0,00%
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0.4 m (incluye acero de refuerzo)	m	0,00	0,00%
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	0,00	48,43%
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	259,60	76,36%
				Total PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE			38,81%
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	0,00	
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	0,00	
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	0,00	
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	0,00	
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	0,00	
				Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
				V. TRANSPORTE			
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	167697,60	82,26%
				Total SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA			82,26%
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
29	700.1	700		Lineas de Demarcación con Pintura en Frio	m	0,00	
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina	und	0,00	0,00%
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	0,00	
32	730.2	730		Sección Final	und	0,00	
33	740.1	740		Captaferos	und	0,00	
				Total SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			0,00%
				VII. ITEM NO PREVISTO			
34	NP1		PART	Plan de izaje para viga postensada	und	0,00	0,00%
				Total ITEM NO PREVISTO			0,00%
				VALOR AJUSTE AL PESO			0,00%
				COSTO TOTAL			62,70%
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS			
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de			
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			100,00%
				VALOR TOTAL		9,436226717663 2%	63,13%

4.7. Gestión de la calidad en obra (Anexa soportes)

Durante la ejecución de las obras se realizaron ensayos de laboratorios de acuerdo a la normatividad vigente.

Así mismo se solito a los proveedores los certificados de calidad de los productos.

4.8. Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. (Anexa soporte en medio digital)

4.9. Gestión ambiental. (Anexa soporte en medio digital)

5. DIFICULTADES, INCONVENIENTES E IMPREVISTOS QUE FUERON RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Se solicito mediante oficio No CPC-TIERRALTA-152-2023, solicitud de recurso adicional al contrato, teniendo en cuenta que actualmente el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para llegar a cubrir todas las necesidades del proyecto y llevar a cabo la meta física programada inicialmente en su estructuración ya que, una vez revisado los estudios y diseños, se vio la necesidad de darle prioridad a las obras concerniente a la construcción del puente, movimientos de tierra, protecciones del puente y el plan de izaje

ANTES	DURANTE	DESPUES
ITEM 210.2.2. EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES		
ABSCISAS K0+00-K0+180m.		
		
ITEM 220.1 TERRAPLEN		
ABSCISA K0+130m.		
		

ITEM 201.6. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS		








ITEM 600.2.4. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA		





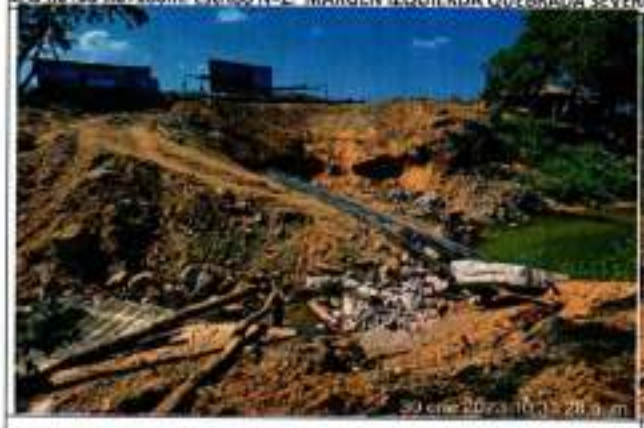

ANTES	DURANTE	DESPUES
ITEM 600.2.4. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO		
SAS K0+00-K0+180m. Estribo Nº2. MARGEN IZQUIERDA QUEBRADA SEVERINERA		
		
ITEM 600.2.4. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO		
Estribo Nº1. MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA		
		

ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o dado N°2. MARGEN IZQUIERDA QUEBRADA SEVERINERA	







ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o dado N°1. MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA	







ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo, ALETAS Nº2. MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA. Nivel +2,40m.	







ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o ALETAS Nº1. MARGEN IZQUIERDA QUEBRADA SEVERINERA. Nivel +2,40m.	







ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o ALETAS Nº2. MARGEN IZQUIERDA QUEBRADA SEVERINERA. Nivel +4,45m.	






ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o ALETAS Nº2. MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA. Nivel +4,45m.	







ITEM 630.4 P. CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	
Estribo o ALETAS Nº2. MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA. Nivel +4,45m.	







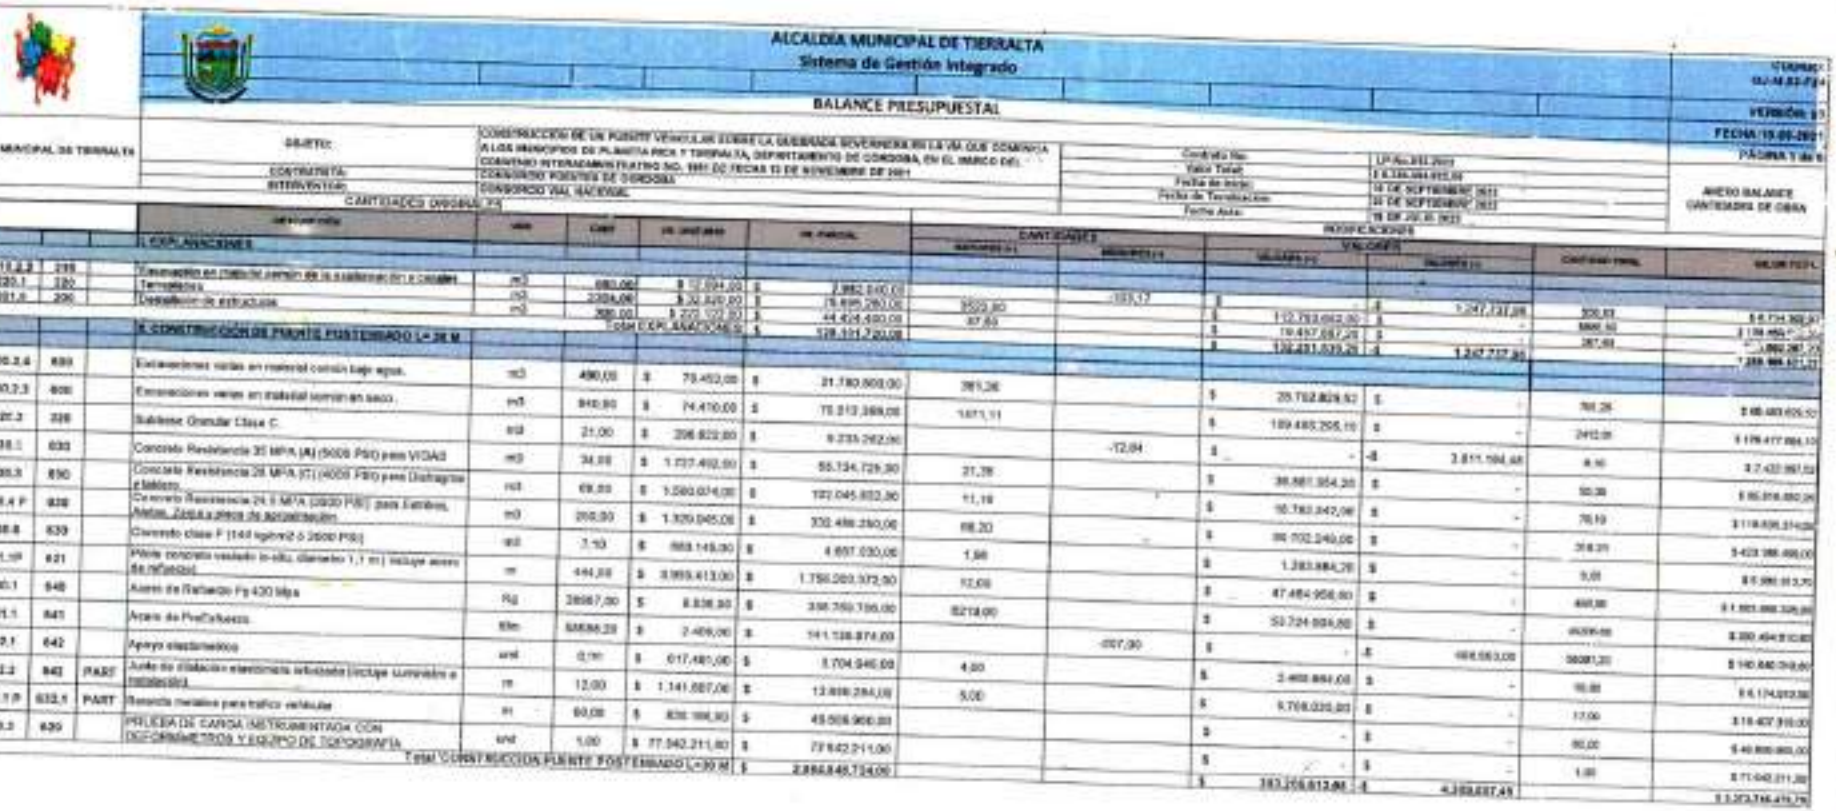

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

BALANCE PRESUPUESTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA

OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0001 DE FECHAS 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

CANTIDADES ORIGINALES

Contrato No: LP-No.002-2021
Valor Total: $ 6.336.984.855,00
Fecha de inicio: 16 DE SEPTIEMBRE 2021
Fecha de Terminación: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Fecha Acta: 15 DE JULIO 2022

ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA

ITEM				DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES MODIFICACIONES	VALORES MODIFICACIONES (+)	VALORES MODIFICACIONES (-)	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
				I. EXPLANACIONES									
1	210.2.2	210		Excavación en material común en la explanación y canales	m3	680,00	$ 12.094,00	$ 2.992.640,00					
2	220.1	220		Terraplenes	m3	2304,00	$ 32.640,00	$ 75.695.280,00	3523,80				$ 115.734.302,40
3	221.3	220		Demolición de estructuras	m3	300,00	$ 200.102,80	$ 44.424.480,00	87,60				$ 17.526.288,00
							SUM E EXPLANACIONES	$ 328.111.720,08					$ 288.988.671,12
				II. CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M									
4	600.3.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	480,00	$ 79.452,00	$ 21.780.800,00	391,36				$ 35.702.829,52
5	600.3.3	600		Excavaciones varias en material común en seco	m3	940,00	$ 74.470,00	$ 70.013.389,00	1871,11				$ 189.485.205,10
6	220.2	220		Subbase Granular Clase C	m3	21,00	$ 296.822,00	$ 6.233.262,00					
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34,00	$ 1.737.402,00	$ 59.134.729,30	21,78	-12,84	$ -	-$ 3.811.184,68	$ 36.681.954,20
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (T) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	69,00	$ 1.260.074,00	$ 102.045.822,90	11,19				$ 16.783.842,06
9	630.4 F	630		Concreto Resistencia 21.1 MPA (3000 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y pisos de aproximación	m3	260,00	$ 1.920.045,00	$ 332.488.260,00	68,20				$ 89.702.340,00
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	7,10	$ 668.149,00	$ 4.657.030,00	1,86				$ 1.283.884,20
11	621.10	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diámetro 1,1 m [incluye acero de refuerzo]	m	444,00	$ 3.959.413,00	$ 1.756.203.372,50	12,00				$ 47.484.956,00
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	39987,00	$ 8.836,00	$ 356.760.786,00	8218,00				$ 93.724.884,80
13	641.1	641		Acero de Preesfuerzo	Kilo	58688,20	$ 2.409,00	$ 141.138.874,00		-007,00	$ -	-$ 466.683,00	
14	642.1	642		Apoyo elastomerico	und	0,00	$ 617.481,00	$ 3.704.946,00	4,00				$ 2.469.964,00
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastomerica sellodada (incluye suministro e instalación)	m	12,00	$ 1.141.667,00	$ 13.699.284,00	5,00				$ 9.708.035,00
16	632.1 P	632.1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	80,00	$ 836.166,80	$ 45.508.900,00					
17	629.3	629		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	und	1,00	$ 77.942.211,80	$ 77.942.211,00					
							Total CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M	$ 2.856.845.734,00			$ 383.216.813,84	-$ 4.288.887,49	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

CÓDIGO: GJ-M.22-F34
VERSIÓN: 03
FECHA: 19-05-2021
PÁGINA: 1 de 5

BALANCE PRESUPUESTAL

ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERENIA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	Contrato No.: LP-No.010-2021
			Valor Total: $ 5.399.464.632,00
			Fecha de Inicio: 19 DE SEPTIEMBRE 2022
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	Fecha de Terminación: 20 DE SEPTIEMBRE 2022
	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	Fecha Acta: 18 DE JULIO 2023

CANTIDADES ORIGINALES — MODIFICACIONES

ITEM				DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
									MAYORES (+)	MENORES (-)	VALORES (+)	VALORES (-)		
				II. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE										
18	630.7P	630	PAR1	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	408,70	$ 779.931,80	$ 308.751.772,00	7,93		$ 6.957.194,93	$ -	408,60	$ 314.696.666,93
19	682.3	682		Colchogavion de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3, modelmesta de (2m) galvanizado y PVC	m3	90,00	$ 369.304,80	$ 37.351.824,00		-31,20	$ -	$ 12.149.082,50	89,80	$ 35.202.736,20
20	631.1.2P	631		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144,00	$ 2.802.800,00	$ 297.696.160,00			$ -	$ -	144,00	$ 297.696.160,00
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	198,00	$ 252.810,00	$ 47.041.200,00		-0,18	$ -	$ 45.532,80	185,82	$ 46.995.736,20
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar en Indio	m2	1331,00	$ 6.368,00	$ 12.516.640,00		-431,64	$ -	$ 3.777.468,10	899,10	$ 8.739.910,90
				Total PROTECCION DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE				$ 709.741.680,00			$ 6.957.194,93	$ 13.971.074,70		$ 693.984.204,93
				IV PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO										
25	329.3	329		Sobrelosa Vivendar Clase C	m3	440,80	$ 306.822,00	$ 135.801.680,00		-440,80	$ -	$ 135.801.680,00	0,00	$ 0,00
26	311.1	311		Armado Refuerzo para mejoramiento	m3	330,00	$ 213.378,00	$ 70.495.740,00		-330,00	$ -	$ 70.495.740,00	0,00	$ 0,00
27	506.1	506		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	400,00	$ 936.806,00	$ 374.296.480,00		-400,00	$ -	$ 374.296.480,00	0,00	$ 0,00
28	638.4	638		Concreto clase D 210 kg/cm2 ó 3000 PSI - CUNETAS	m3	120,00	$ 770.236,00	$ 92.428.320,00		-120,00	$ -	$ 92.428.320,00	0,00	$ 0,00
29	648.1	648		Acero de refuerzo de 4.2 f'c = 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	60000,00	$ 8.638,00	$ 51.828.000,00		-6000,00	$ -	$ 51.828.000,00	0,00	$ 0,00
				Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO				$ 719.855.140,00			$ -	$ 719.855.140,00		$ 0,00
				V. TRANSPORTE										
30	990.2	906		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de cel metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	340000,00	$ 1.807,00	$ 614.388.000,00	205.466,83		$ 373.143.147,21	0,09	546.466,0906	$ 987.529.147,21
				Total SEÑALIZACION Y LIMPIEZA				$ 614.388.000,00			$ 373.143.147,21	$ -		$ 987.529.147,21
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
29	700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío	m	1200,00	$ 7.086,00	$ 3.503.200,00		-1200,00	$ -	$ 3.503.200,00	0,00	$ 0,00
30	710.1	710		Señal Vertical de Tránsito Tipo 1 con lamina retroreflectiva	und	7,00	$ 881.565,00	$ 6.930.960,00	12,00		$ 6.739.968,00	$ -	19,00	$ 13.669.545,00
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	80,00	$ 177.847,00	$ 14.228.560,00		-80,00	$ -	$ 14.228.560,00	0,00	$ 0,00
32	730.3	730		Empalme Final	und	4,00	$ 88.182,00	$ 352.728,00		-4,00	$ -	$ 352.728,00	0,00	$ 0,00
33	740.1	740		Captafaros	und	20,00	$ 16.429,00	$ 328.580,00		-20,00	$ -	$ 328.580,00	0,00	$ 0,00
				Total SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				$ 21.344.153,00			$ 6.739.968,00	$ 17.413.288,00		$ 13.669.545,00
				VALOR TOTAL AJUSTE AL PESO							$ 83,97			$ 4,03
				COSTO TOTAL				$ 1.371.329.833,00			$ 6.911.027.796,16	$ 13.971.074,70		$ 5.320.906.841,54
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 603.474.720,00				$ 13.971.074,70		$ 0,00
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Redes Hidrás, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 91.013.000,00						$ 91.013.000,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 5.692.280,00						$ 5.692.280,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 96.704.280,00						$ 96.704.280,00
				VALOR TOTAL				$ 1.067.794.833,00			$ 6.911.027.796,16	$ 13.971.074,70	$ 0,0000	$ 5.320.906.841,54
														100,00%

Firma:
Nombre: [illegible] PEDRO REYES
Director de obra
Condición
Matrícula Profesional No 23300-152765 CDR

Firma:
Nombre: [illegible]
Director de Interventoría
Interventor
Matrícula Profesional No. [illegible]

Firma:
Nombre: MARIO CANTO IGLESIAS
Secretario de Obras Públicas

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Sistema de Gestión Integrado

BALANCE PRESUPUESTAL No 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA	OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1061 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	ANEXO BALANCE CANTIDADES DE OBRA
	CONTRATISTA:	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	

Contrato No:		CP No 015-2022
Valor Total:		$ 1.364.644.423,00
Fecha de Inicio:		10 DE SEPTIEMBRE 2022
Prorroga No 1		6 MESES
Prorroga No 2		2 MESES
Fecha de Terminacion:		30 DE NOVIEMBRE 2023
Fecha Acta:		19 DE OCTUBRE 2023

ITEM				DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	BALANCE No 1		BALANCE No 1		MODIFICACIONES - BALANCE No 2				CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
									CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDADES		VALORES					
											MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)			
				1 EXPLANACIONES														
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	900,00	$ 12.094,00	$ 7.983.948,00	$ 596,61	$ 6.734.363,63	0,00	0,00	$ -		$ -		596,61	$ 6.734.363,63
2	220.1	220		Terraplenes	m3	2364,00	$ 22.825,00	$ 75.605.280,00	$ 3.596,00	$ 100.489.332,00	0,00	-1540,43	$ -		$ 43.420.828,00		4340,17	$ 139.068.300,40
3	261.6	260		Geotextil de separacion	m2	300,00	$ 222.132,00	$ 44.434.400,00	$ 367,00	$ 81.562.787,20	0,00	0,00	$ -		$ -		367,00	$ 81.562.787,20
							Total EXPLANACIONES	$ 128.591.728,00		$ 289.788.521,33	0,00	0,00	$ -		$ 43.420.828,00			$ 259.999.992,63
				2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L=38 M														
4	500.2.4	500		Excavaciones varias en material comun bajo agua,	m3	400,00	$ 29.402,00	$ 11.760.800,00	$ 791,29	$ 69.463.635,52	0,00	0,00	$ -		$ -		791,29	$ 69.463.635,52
5	500.2.3	500		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	840,00	$ 24.410,00	$ 20.512.800,00	$ 3.412,01	$ 179.477.984,10	0,00	0,00	$ -		$ -		2612,01	$ 179.477.984,10
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	21,00	$ 396.421,00	$ 8.332.282,00	$ 8,16	$ 3.423.067,52	0,00	0,00	$ -		$ -		8,16	$ 3.423.067,52
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34,00	$ 1.727.460,00	$ 58.734.720,00	$ 53,35	$ 90.616.682,20	0,00	0,00	$ -		$ -		53,35	$ 90.616.682,20
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y lateral	m3	60,00	$ 1.560.019,00	$ 102.945.833,00	$ 79,19	$ 119.838.374,06	0,00	0,00	$ -		$ -		79,19	$ 119.838.374,06
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24 5 MPA (3500 PSI) para Pedrales, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	m3	250,00	$ 1.329.945,00	$ 332.486.250,00	$ 318,29	$ 423.188.499,05	0,00	0,00	$ -		$ -		318,29	$ 423.188.499,05
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 o 2000 PSI)	m3	7,10	$ 660.145,00	$ 4.687.030,00	$ 5,86	$ 3.868.611,79	0,00	0,00	$ -		$ -		5,86	$ 3.868.611,79
11	621.1P	621		Pilote excavado vaciado in situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)	m	448,00	$ 2.666.413,00	$ 1.194.393.312,00	$ 458,09	$ 1.663.668.328,69	0,00	0,00	$ -		$ -		458,09	$ 1.663.668.328,69
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	34987,20	$ 8.026,00	$ 328.765.706,00	$ 45.286,80	$ 396.454.315,80	0,00	0,00	$ -		$ -		45286,80	$ 396.454.315,80
13	645.1	645		Acero de PreEsfuerzo	Kg	50688,20	$ 2.409,00	$ 141.130.574,00	$ 56.361,20	$ 340.640.310,80	0,00	0,00	$ -		$ -		56361,20	$ 340.640.310,80
14	642.1	642		Apoyo elastomerico	und	6,00	$ 917.481,00	$ 5.504.940,00	$ 10,00	$ 9.174.810,00	0,00	0,00	$ -		$ -		10,00	$ 9.174.810,00
15	642.3	642	PART	Junta de dilatacion abultonare reforzada Onclaye (armonico o modulares)	m	12,00	$ 1.141.667,00	$ 13.699.284,00	$ 17,00	$ 19.407.339,00	0,00	0,00	$ -		$ -		17,00	$ 19.407.339,00
16	632.1 P	632.1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	99,00	$ 839.166,00	$ 83.089.068,00	$ 99,00	$ 83.089.068,00	0,00	0,00	$ -		$ -		99,00	$ 83.089.068,00
17	630.1	630		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	und	1,00	$ 77.542.211,00	$ 77.542.211,00	$ 1,00	$ 77.542.211,00	0,00	0,00	$ -		$ -		1,00	$ 77.542.211,00
							Total "CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=38 M"	$ 2.994.668.724,00		$ 3.373.745.679,70	0,00	0,00	$ -		$ -			$ 3.373.745.679,70
				3 PROTECCION DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE								0,00						
18	650.5P	650	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud 0.30m	m2	488,70	$ 770.031,00	$ 308.751.772,00	$ 408,00	$ 314.838.960,80	0,00	0,00	$ -		$ -		408,00	$ 314.838.960,80
19	682.1	682		Colchoneta de Malla de Alambre de Acero antitorsión Clase 3, revestimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m2	96,00	$ 369.394,00	$ 37.381.824,00	$ 84,80	$ 26.202.731,20	0,00	0,00	$ -		$ -		84,80	$ 26.202.731,20
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in situ, para enrrejo diametro 0.6 m (incluye acero de refuerzo)	m	144,00	$ 2.662.500,00	$ 257.004.160,00	$ 144,00	$ 397.004.160,00	0,00	0,00	$ -		$ -		144,00	$ 397.004.160,00
21	673.2	673		Material Granular Dimensio	m3	190,00	$ 252.510,00	$ 47.981.390,00	$ 185,62	$ 46.885.736,20	0,00	0,00	$ -		$ -		185,62	$ 46.885.736,20
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1331,00	$ 8.266,00	$ 12.310.959,00	$ 829,10	$ 8.732.810,30	0,00	0,00	$ -		$ -		829,10	$ 8.732.810,30
							Total PROTECCION DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE	$ 742.741.065,00		$ 892.856.364,50	0,00	0,00	$ -		$ -			$ 892.856.364,50
				4 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO														
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	440,00	$ 280.822,00	$ 130.601.680,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		0,00	$ 0,00
24	211.1	211		Rilocado (Material para mejoramiento)	m2	330,00	$ 212.578,00	$ 79.486.740,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		0,00	$ 0,00
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m2	400,00	$ 655.966,00	$ 374.398.400,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		0,00	$ 0,00
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) - CUNETAS	m3	120,00	$ 772.236,00	$ 92.428.320,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		0,00	$ 0,00
27	660.1	660		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	60000,00	$ 6.538,00	$ 51.825.000,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -		$ -		0,00	$ 0,00
							Total PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	$ 718.805.140,00		$ -	0,00	0,00	$ -		$ -			$ 0,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA
Subsecretaría de Gestión Integral

BALANCE PRESUPUESTAL No 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIERRALTA	OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SIYEMBERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1061 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	Contrato No: LP No 013-2022 Valor Total: $ 5.384.604.822,00 Fecha de Inicio: 19 DE SEPTIEMBRE 2022 Prorroga No 1: 1 MES 0 D Prorroga No 2: 2 MES 0 D Fecha de Terminación: 30 DE NOVIEMBRE 2023 Fecha Acta: 19 DE OCTUBRE 2023
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	
	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	

AMPLIACION BALANCE CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES ORIGINALES — BALANCE No 1 — MODIFICACIONES BALANCE No 2

ITEM				DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES (+)	CANTIDADES MENORES (-)	VALORES MAYORES (+)	VALORES MENORES (-)	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
				V. TRANSPORTE												
25	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, cunetas y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de mas metros (100 m)	m3/km	340000,00	$ 1.961,00	$ 674.280.000,00	$ 548.499,63	$ 987.523.747,21	0,00	138.968,79	$ -	$ 251.808.109,32	407.530,21	$ 735.715.637,89
				Total SEÑALIZACION Y LIMPIEZA				$ 674.280.000,00		$ 987.523.747,21	0,00	0,00	$ -	$ 251.808.109,32		$ 735.715.637,89
				M. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL												
26	700.1	700		Linea de Demarcación con Pintura en Frio	m	1200,00	$ 2.980,00	$ 3.563.200,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 0,00
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	7,00	$ 591.555,00	$ 3.630.885,00	15,00	$ 10.669.545,00	0,00	0,00	$ -	$ -	15,00	$ 10.669.545,00
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	80,00	$ 177.957,00	$ 14.236.560,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 0,00
32	730.2	730		Seccion Final	und	4,00	$ 88.182,00	$ 352.728,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 0,00
33	740.1	740		Capitolinos	und	20,00	$ 16.439,00	$ 328.780,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 0,00
				Total SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				$ 21.340.153,00		$ 10.669.545,00	0,00	0,00	$ -	$ -		$ 10.669.545,00
				M. ITEM NO PREVISTO												
34	MP1		PART	Plan de caja para viga postensada	und	3,00	$ 100.142.923,00	$ 300.428.769,00	$ -	$ -	3,00	0,00	$ 300.428.769,00	$ -	3,00	$ 300.428.769,00
													$ 300.428.769,00	$ -		$ 300.428.769,00
				VALOR TOTAL AJUSTE AL PESO						$ 43,57				$ 11,09		$ 32,48
				COSTO TOTAL				$ 5.171.024.433,00		$ 5.123.994.542,00			$ 300.428.769,00	$ 300.428.769,00		$ 5.123.994.542,00
				OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 152.973.730,00		$ -						$ 0,00
				REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pantanero y Estructuras de Drenaje)				$ 51.612.000,00		$ 51.612.000,00						$ 51.612.000,00
				VR. REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 9.682.200,00		$ 9.682.200,00						$ 9.682.200,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 60.794.200,00		$ 60.794.200,00						$ 60.794.200,00
				VALOR TOTAL				$ 5.384.604.822,00	$ -	$ 5.384.604.822,00			$ 300.428.769,00	$ 300.428.769,00	$ 0,0000	$ 5.384.604.822,00
																100,00%

Firma:
Nombre: MARCO ANTONIO PETRO REYES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No 23202-152753 COR

Firma:
Nombre: [illegible] VILLALOBOS PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No. 08202-80556 ATL

Firma:
Nombre: MARIO CARLOS GUERRA PETRO
Secretario de Obras Publicas

BALANCE No 2	
CONTRATO No	LP-No.013-2022
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR	$ 5.384.604.822,00
PLAZO INICIAL	TRES MESES Y 7 DIAS
BALANCE No 2	19 DE OCTUBRE DE 2023
NUEVO PLAZO	N.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA NIT: 901627711-9 R.L. MARIO ALBERTO PETRO REYES. C.C. 73.203.584 DE CARTAGENA.
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR:	ING. MARIO DANILO GUERRA PETRO
VALOR ADICIONAL No. 1:	N.A.
VALOR FINAL:	N.A.
FECHA DE INICIACIÓN:	19- 09 – 2022
PRORROGA No 1:	9 meses
PRORROGA No 3:	2 meses
FECHA DETERMINACIÓN:	30-11-2023

En el municipio de Tierralta a los veintitrés (19) días del mes de octubre del 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron los señores a saber **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA** identificado con el **NIT. No. 901627711-9,** representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 73.203.584 DE CARTAGENA**, contratista en el contrato de la referencia, **CONSORCIO VIAL NACIONAL** identificado con NIT. No 901.578.761.-6, representado por el apoderado el señor **JUAN ELIECER VILLALOBOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No

92.228.199 DE TOLÚ y **MARIO DANILO GUERRA PETRO**, secretario de Obras Públicas; con el fin de dejar constancia de lo detallado a continuación:

Las cantidades originalmente pactadas son:

ITEM				DESCRIPCIÓN	UND	CANT
				I. EXPLANACIONES		
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y canales	m3	660.00
2	220.1	220		Terraplenes	m3	2364.00
3	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	200.00
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M		
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	400.00
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .	m3	940.90
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	21.00
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34.00
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	68.00
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos. Aletas. Zarpa y placa de aproximación	m3	250.00
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	7.10
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ. diametro 1.1 m (incluye acero de refuerzo)	m	444.00
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	38987.00
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	tf/m	58588.20
14	642.1	642		Apoyo elastometrico	und	6.00
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	12.00

ITEM				DESCRIPCIÓN	UNO	CANT
16	632.1 P	632.1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	60.00
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	1.00
				III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.		
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	400.70
19	682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	96.00
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0.4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144.00
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	186.00
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1331.00
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO		
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	440.00
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	330.00
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	400.00
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	120.00
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	5000.00
				V. TRANSPORTE		
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	340000.00
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
29	700.1	700		Linea de Demarcación con Pintura en Frio	m	1200.00
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo I con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	7.00
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	80.00
32	730.2	730		Sección Final	und	4.00
33	740.1	740		Captafaros	und	20.00

Las cantidades necesarias para la normal ejecución de la obra son:

ITEM				DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD FINAL
				I. EXPLANACIONES		
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y canales	m3	556.83
2	220.1	220		Terraplenes	m3	4343.17
3	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	287.60
				Total EXPLANACIONES		
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M		
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	761.26
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .	m3	2412.01
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	8.16
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	55.35
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	79.19
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos. Aletas. Zarpa y placa de aproximación	m3	318.20
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 o 2000 PSI)	m3	9.06
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ. diametro 1.1 m (incluye acero de refuerzo)	m	456.00
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	45206.60
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	tf/m	58381.20
14	642.1	642		Apoyo elastometrico	und	10.00
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	17.00

16	632.1 P	632.1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	m	60.00
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	1.00
				Total 'CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M		
				III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.		
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	408.60
19	682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	64.80
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ. para anclaje diametro 0.4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144.00
21	673.2	673		Material Granular Drenante	m3	185.82
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	929.10
				Total PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE		
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO		
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	0.00
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	0.00
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	0.00
26	630.4	630		Concreto clase 0 (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	0.00
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	0.00
				Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO		
				V. TRANSPORTE		
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	407.590.27
				Total SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA		
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
29	700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	m	0.00
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo I con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	19.00
31	730.1	730		Defensa Metálica	m	0.00
32	730.2	730		Sección Final	und	0.00

33	740.1	740		Captafaros	und	0.00
					Total SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
				VII. ITEM NO PREVISTO		
34	NPI		PART	Plan de izaje para viga postensada	und	3.00

Para constancia se firma en original y dos copias por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de octubre del 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal
Contratista
Matricula Profesional No.22202-152753 COR

Firma:
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Interventor
Matricula Profesional No.: 08202-80506 ATL

MARIO DANILO GUERRA PETRO
Secretario de Obras Publicas
Municipio de Tierralta

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL DESCAPOTE SEVERINERA\VOLUMEN DESCAPOTE SEVERINERA
27/ENE/23 8:48pm Pagina 1
VOL DESCAPOTE SEVERINERA

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	DESCAPOTE		CORTE	DESCAPOTE	CURVA MASA
0+000.00	0.00	-1.98	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-2.20	10.00	0.00	-20.90	9,979.10
0+020.00	0.00	-1.78	10.00	0.00	-19.90	9,959.20
0+030.00	0.00	-2.20	10.00	0.00	-19.90	9,939.30
0+040.00	0.00	-1.78	10.00	0.00	-19.90	9,919.40
0+050.00	0.00	-2.40	10.00	0.00	-20.90	9,898.50
0+060.00	0.00	-2.30	10.00	0.00	-23.50	9,875.00
0+070.00	0.00	-2.38	10.00	0.00	-23.40	9,851.60
0+080.00	0.00	-2.48	10.00	0.00	-24.30	9,827.30
0+090.00	0.00	-2.40	10.00	0.00	-24.40	9,802.90
0+100.00	0.70	-2.20	10.00	0.00	-23.02	9,779.88
0+110.00	0.00	-3.20	10.00	0.00	-27.04	9,752.84
0+120.00	0.00	-3.25	10.00	0.00	-32.25	9,720.59
0+130.00	0.00	-3.75	10.00	0.00	-34.99	9,685.60
0+140.00	0.00	-4.51	10.00	0.00	-41.33	9,644.27
0+150.00	0.00	-4.40	10.00	0.00	-44.55	9,599.71
0+160.00	0.00	-4.77	10.00	0.00	-45.81	9,553.90
0+170.00	0.00	-5.27	10.00	0.00	-50.18	9,503.72
0+180.00	0.00	-6.84	10.00	0.00	-60.55	9,443.17

TOTAL VOLUMEN DESCAPOTE = -556.83m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL DESCAPOTE SEVERINERA\VOLUMEN DESCAPOTE SEVERINERA
27/ENE/23 8:48pm Pagina 1
VOL DESCAPOTE SEVERINERA

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	COTA DESCAPOTE	SUBRASANTE	CORTE	DESCAPOTE
0+000.00	48.82	49.04	----	0.22
0+010.00	48.80	49.04	----	0.24
0+020.00	48.82	49.04	----	0.22
0+030.00	48.70	49.03	----	0.33
0+040.00	48.85	49.03	----	0.18



0+050.00	48.73	49.03	----	0.30
0+060.00	48.78	49.03	----	0.25
0+070.00	48.72	49.03	----	0.31
0+080.00	48.71	49.03	----	0.32
0+090.00	48.73	49.03	----	0.30
0+100.00	48.75	49.03	----	0.28
0+110.00	48.74	49.03	----	0.29
0+120.00	48.75	49.04	----	0.29
0+130.00	48.73	49.03	----	0.30
0+140.00	48.74	49.01	----	0.27
0+150.00	48.73	49.05	----	0.32
0+160.00	48.90	49.13	----	0.23
0+170.00	49.02	49.26	----	0.24
0+180.00	49.48	49.78	----	0.30

COEA TERRENO

00+00	
0	49.04
4	48.78
-4	49.00
00+010	
0	49.04
4	48.82
-4	48.90
00+020	
00	49.04
4	48.95
-4	49.00
00+030	
00	49.03
4	48.73
-4	49.19
00+040	
00	49.03
4	48.78
-4	49.18
00+050	
00	49.03
4	48.90
-4	49.10
00+060	
00	49.03
4	48.91
-4	49.06
00+070	
00	49.03
4	48.87
-4	49.00
00+080	
00	49.03
4	48.79
-4	48.88
00+090	
00	49.03
4	48.72
-4	48.81
00+100	
00	49.03
4.43	48.8
-3.7	49.04
-6.09	49.05
00+110	
00	49.03
5.03	48.85
-3.7	49.1



-6.57	49.18
00+120	
00	49.04
5.48	49.11
-3.7	49.20
-7.28	49.27
00+130	
00	49.03
6.26	49.14
-3.7	49.22
-7.86	49.44
00+140	
00	49.01
7.07	49.16
-3.7	49.15
-8.89	49.30
00+150	
00	49.05
8.05	49.16
-3.7	49.20
-9.58	49.41
00+160	
00	49.13
9.01	49.21
-3.7	49.30
-10.11	49.52
00+170	
00	49.26
9.56	49.27
-3.7	49.5
-10.6	49.60
00+180	
00	49.78
9.56	48.98
-3.7	49.50
-11.51	49.23

COTA DE	CORTE
00+00	
0	48.82
4	48.48
-4	48.75
00+010	
0	48.80
4	48.50
-4	48.60
00+020	
00	48.82
4	48.70
-4	48.80
00+030	
00	48.70
4	48.48
-4	49.00
00+040	
00	48.85
4	48.48
-4	48.95
00+050	
00	48.73
4	48.60
-4	48.80
00+060	
00	48.78
4	48.61
-4	48.71
00+070	
00	48.72
4	48.57
-4	48.73
00+080	
00	48.71
4	48.49
-4	48.58
00+090	
00	48.73
4	48.42
-4	48.51
00+100	
00	48.75
4.43	48.55
-3.7	48.8
-6.09	49.82
00+110	
00	48.74
5.03	48.55
-3.7	48.84

Diego Soares
78670199

-6.57	48.95
00+120	
00	48.75
5.48	48.88
-3.7	48.98
-7.28	49.00
00+130	
00	48.73
6.26	48.90
-3.7	48.99
-7.86	49.15
00+140	
00	48.74
7.07	48.94
-3.7	48.80
-8.89	49.02
00+150	
00	48.73
8.05	48.94
-3.7	48.97
-9.58	49.23
00+160	
00	48.90
9.01	49.00
-3.7	49.03
-10.11	49.21
00+170	
00	49.02
9.56	49.02
-3.7	49.22
-10.6	49.31
00+180	
00	49.48
9.56	48.68
-3.7	49.30
-11.51	48.65

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+00ALK0+130\VOLUMEN TERRAPLEN\vol
27/JUL/23 4:10pm Pagina 1
VOLUMEN TERRAPLEN K0+00ALK0+130

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+000.00	0.00	-1.75	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-2.22	10.00	0.00	-19.88	9,980.12
0+020.00	0.00	-2.07	10.00	0.00	-21.49	9,958.64
0+030.00	0.00	-2.53	10.00	0.00	-23.04	9,935.59
0+040.00	0.00	-2.70	10.00	0.00	-26.18	9,909.41
0+050.00	0.00	-2.93	10.00	0.00	-28.17	9,881.24
0+060.00	0.00	-3.12	10.00	0.00	-30.49	9,850.75
0+070.00	0.00	-3.58	10.00	0.00	-33.72	9,817.03
0+080.00	0.00	-4.25	10.00	0.00	-39.11	9,777.92
0+090.00	0.00	-4.81	10.00	0.00	-45.53	9,732.40
0+100.00	0.00	-5.31	10.00	0.00	-50.83	9,681.57
0+110.00	0.00	-6.80	10.00	0.00	-60.67	9,620.90
0+120.00	0.00	-9.20	10.00	0.00	-87.34	9,533.56
0+130.00	0.00	-15.89	10.00	0.00	-133.95	9,399.61

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -593.38m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+00ALK0+130\VOLUMEN TERRAPLEN\vol
27/JUL/23 4:10pm Pagina 1
VOLUMEN TERRAPLEN K0+00ALK0+130

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	48.87	49.13	----	0.26
0+010.00	48.87	49.22	----	0.35
0+020.00	48.89	49.19	----	0.30
0+030.00	48.88	49.22	----	0.34
0+040.00	48.87	49.25	----	0.38
0+050.00	48.89	49.28	----	0.38
0+060.00	48.90	49.31	----	0.41
0+070.00	48.90	49.34	----	0.44
0+080.00	48.90	49.37	----	0.47
0+090.00	48.87	49.40	----	0.53

Diego Sau
78650199

0+100.00	48.86	49.58	----	0.72
0+110.00	48.84	49.78	----	0.94
0+120.00	48.91	50.34	----	1.42
0+130.00	48.90	50.89	----	1.99

00+00	
0	48.873
2	48.794
4	48.633
-2	48.943
-3.2	48.963
-4	48.723
00+010	
0	48.873
2	48.803
4	48.683
-2	48.973
-4	48.733
00+020	
0	48.893
2	48.863
4	48.803
-2	48.863
-4	48.873
00+030	
0	48.883
2	48.683
4	48.593
-2	48.973
-4	49.053
00+040	
0	48.873
2	48.743
4	48.653
-2	48.923
-4	49.053
00+050	
0	48.893
2	48.763
4	48.773
-2	48.853
-4	48.973
00+060	
0	48.903
2	48.723
4	48.783
-2	48.883
-4	48.953
00+070	
0	48.903
2	48.713
4	48.743
-2	48.843
-4	48.913
00+080	

Diego Sousa
78650179

0	48.903
2	48.683
5	48.663
-2	48.753
-5	48.813
00+090	
0	48.873
2	48.623
4	48.593
6	48.533
-2	48.753
-4	48.713
-6	48.683
00+100	
0	48.863
2	48.793
4	48.723
6	48.783
-2	48.873
-4	49.053
-6	49.023
00+110	
0	48.843
2	48.823
4	48.743
6	48.753
-2	48.903
-4	49.083
-6	49.043
00+120	
0	48.913
2	48.893
4	48.973
-2	48.983
-4	49.143
-6	49.053
00+130	
0	48.903
2	48.893
4	49.013
6	48.963
-2	48.963
-4	49.313
-6	49.263

00+00	
0	49.128
3.5	49.058
-3.5	49.058
00+010	
0	49.221
3.5	49.088
-3.5	49.088
00+020	
0	49.188
3.5	49.118
-3.5	49.118
00+030	
0	49.218
3.5	49.148
-3.5	49.148
00+040	
0	49.248
3.5	49.178
-3.5	49.179
00+050	
0	49.278
3.5	49.208
-3.5	49.208
00+060	
0	49.308
3.5	49.238
-3.5	49.238
00+070	
0	49.338
3.5	49.268
-3.5	49.268
00+080	
0	49.368
3.5	49.298
-3.5	49.298
00+090	
0	49.399
3.5	49.329
-3.5	49.329
00+100	
0	49.583
3.5	49.513
-3.5	49.513
00+110	
0	49.78
3.5	49.71
-3.5	49.71
00+120	
0	50.337

Diogo Sousa
7865019-9

3.5	50.267
-3.5	50.267
00+130	
0	50.894
3.5	50.824
-3.5	50.824

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+130ALK0+190.65\VOLUMEN \VOLUMEN
26/SEP/23 12:12am Pagina 1
VOLUMEN PARCIAL

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+130.00	0.00	-16.15	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+140.00	0.00	-17.86	10.00	0.00	-170.02	9,829.98
0+150.00	0.00	-20.54	10.00	0.00	-191.99	9,637.99
0+160.00	0.51	-20.54	10.00	0.00	-205.39	9,432.60
0+170.00	0.00	-17.99	10.00	0.00	-192.61	9,239.99
0+180.00	0.00	-12.11	10.00	0.00	-150.48	9,089.51
0+185.00	0.00	-12.47	5.00	0.00	-61.44	9,028.07
0+188.65	0.03	-12.19	3.65	0.00	-45.00	8,983.07
0+190.36	0.00	-6.84	1.71	0.00	-16.27	8,966.80

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN PARCIAL = -1,033.20m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOL Y DES K0+130 ALK0+190.65\VOLUMEN \VOLUMEN
26/SEP/23 12:12am Pagina 1
VOLUMEN PARCIAL

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+130.00	48.90	50.89	----	1.99
0+140.00	49.01	50.86	----	1.85
0+150.00	49.05	50.89	----	1.84
0+160.00	49.13	50.98	----	1.85
0+170.00	49.26	50.83	----	1.57
0+180.00	49.78	50.69	----	0.91
0+185.00	50.15	50.70	----	0.55
0+188.65	50.26	50.75	----	0.49
0+190.36	50.30	50.70	----	0.40

Jorge Salazar
78650455

00+130	
0	48.903
2	48.893
4	49.013
6	48.963
-2	48.963
-4	49.313
-6	49.263
00+140	
0	49.01
3	49.00
7.5	49.16
-3	49.21
-9	49.31
00+150	
0	49.05
4	49.06
8.5	49.16
-4	49.19
-10	49.41
00+160	
0	49.13
4	49.16
9	49.21
-4	49.3
-10.6	49.51
00+170	
0	49.26
5	49.23
9.6	49.26
-5	49.53
-11.5	49.56
00+180	
0	49.78
5	49.47
10	48.98
-2	49.9
-4	49.85
-7	49.75
-8.5	49.15
-11.7	49.24
00+185	
0	50.15
2	49.98
4	49.44
6	49.25
10.5	48.65
-5	49.76
-8	49.02
-11	48.78

Diogo Sfarra
78 690199

00+188.65	
0	50.26
2	50.21
4	49.6
6	49.13
10.5	48.53
-3	49.9
-6	49.09
-12	49.6
00+190.36	
0	50.3
1.7	50.35
7	48.95
10.5	48.51
12	48.31
-1	50.25
-6	48.9
-8	48.71
-10.6	48.01
-12	47.94

00+130	
0	50.894
3.5	50.824
-3.5	50.824
00+140	
0	50.86
3	50.81
5.6	49.42
7	49.4
-4	50.9
-6.3	49.36
-8	49.36
00+150	
0	50.89
3.2	50.79
5.5	49.34
6	49.35
-5.3	50.98
-7.7	49.64
-9	49.65
00+160	
0	50.98
3.16	50.88
6.4	49.25
8	49.2
-5.5	51
-7.7	49.8
-9	48.79
00+170	
0	50.83
1.4	50.85
3.8	49.57
5	49.6
7	49.6
-5.1	50.96
-9.2	50
-11	49.88
00+180	
0	50.69
1.2	50.55
4.4	49.49
8	49.5
-4.4	50.72
-7.8	50.11
-13.3	49.85
00+185	
0	50.7
2.6	50.51
5.5	49.43

Diego Sousa
7865019-

8	49.4
-4	50.63
-13.3	49.26
00+188.65	
0	50.75
2	50.55
5	49.45
9	49.45
-4	50.65
-14	49.2
00+190.36	
0	50.7
4	50.7
-4	50.7

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN 170 AL 190.36\VOLUMEN NO CONTEMPLADO
18/SEP/23 3:01pm Pagina 1
volumen no contemplado

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+170.00	0.00	-16.51	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+180.00	0.00	-20.46	10.00	0.00	-184.84	9,815.16
0+185.00	0.00	-31.88	5.00	0.00	-130.85	9,684.32
0+188.65	0.00	-57.97	3.65	0.00	-163.98	9,520.34
0+190.36	0.00	-29.50	1.71	0.00	-74.79	9,445.55

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -554.45m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN 170 AL 190.36\VOLUMEN NO CONTEMPLADO
18/SEP/23 3:01pm Pagina 1
volumen no contemplado

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+170.00	48.62	49.26	----	0.64
0+180.00	48.49	49.78	----	1.29
0+185.00	47.27	50.15	----	2.88
0+188.65	46.50	50.26	----	3.76
0+190.36	46.33	50.30	----	3.97

Diego Salas
78650199

00+170	
0	49.26
5	49.23
9.6	49.26
-5	49.53
-11.5	49.56
00+180	
0	49.78
5	49.47
10	48.98
-2	49.9
-4	49.85
-7	49.75
-8.5	49.15
-11.7	49.24
00+185	
0	50.15
2	49.98
4	49.44
6	48.65
10.5	48.65
-5	49.76
-8	49.02
-11	48.78
00+188.65	
0	50.26
2	50.21
4	49.6
6	49.13
10.5	48.40
-3	49.9
-6	49.09
-12	49.6
00+190.36	
0	50.3
1.7	50.35
7	48.95
10.5	48.51
12	48.31
-1	50.25
-6	48.9
-8	48.71
-10.6	48.01
-12	47.94

Diego Sousa
78690199

00+170	
0	48.62
11	48.49
-11	48.76
-13	48.76
00+180	
0	48.49
1	48.54
5	48.54
13	48.39
-1	48.5
-10	48.82
-13	48.82
00+185	
0	47.27
4	47.47
6	48.00
10	48.6
13	48.6
-5	47.97
-14	48.52
00+188.65	
0	46.5
3.6	46.52
13	48.57
-6	46.58
-14	48.52
0+190.36	
0	46.33
3.95	46.33
-3.95	46.33

Diego Silva
78650179

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN PIEDRAPLEN\VOLUMEN CORTE DEL PIEDRAPLEN
02/MAY/23 7:58pm Pagina 1
VOL CORTE HUMEDO DEL PIEDRAPLEN

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	CORTE HUMEDO		CORTE	CORTE HUMEDO	CURVA MASA
0+000.00	0.00	-21.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-22.50	10.00	0.00	-217.50	9,782.50
0+014.90	0.00	-24.75	4.90	0.00	-115.76	9,666.74

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO DEL PIEDRAPLEN = -333.26m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN PIEDRAPLEN\VOLUMEN CORTE DEL PIEDRAPLEN
02/MAY/23 7:58pm Pagina 1
VOL CORTE HUMEDO DEL PIEDRAPLEN

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	CORTE HUMEDO
0+000.00	23.30	23.95	----	0.65
0+010.00	23.30	23.98	----	0.68
0+014.90	23.30	24.23	----	0.93

Diego Sotomayor
78690199

00+00	
0	23.3
15	23.3
-15	23.3
00+010	
0	23.3
15	23.3
-15	23.3
00+014.9	
0	23.3
15	23.3
-15	23.3



00+00	
0	23.95
15	24.06
-15	24.04
00+010	
0	23.98
15	24.15
-15	24.09
00+014.9	
0	24.23
15	24.04
-15	24.00

Diego Sloan
18650179

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAR/23 6:34pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	CORTE HUMEDO	CORTE	CORTE HUMEDO	CURVA MASA	
0+185.00	0.00	-18.70	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-23.17	5.00	0.00	-104.67	9,895.33
0+195.00	0.00	-25.49	5.00	0.00	-121.65	9,773.69
0+200.00	0.00	-23.28	5.00	0.00	-121.91	9,651.77
0+205.00	0.00	-31.20	5.00	0.00	-136.19	9,515.59

TOTAL VOLUMEN CORTE HUMEDO = -428.00m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE HUMEDO
01/MAR/23 6:34pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN HUMEDO

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	COTE SECO	COTA HUMEDO	CORTE	CORTE HUMEDO
0+185.00	43.00	44.40	----	1.40
0+190.00	43.40	44.37	----	0.97
0+195.00	42.88	44.39	----	1.51
0+200.00	43.21	44.36	----	1.15
0+205.00	42.64	44.27	----	1.63

Diego Flores
78650197

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
01/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO


ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) CORTE SECO	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) CORTE SECO	ORDENADA CURVA MASA
0+185.00	0.00	-97.03	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+190.00	0.00	-65.87	5.00	0.00	-407.23	9,592.77
0+195.00	0.07	-53.95	5.00	0.00	-299.53	9,293.23
0+200.00	3.35	-38.63	5.00	0.00	-231.45	9,061.79
0+205.00	10.52	-28.05	5.00	0.00	-166.70	8,895.09

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -1,101.30m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO\VOLUMEN CORTE SECO
01/MAR/23 6:27pm Pagina 1
VOLUMEN CORTE EN SECO

ESTACION	ELEVACIONES SUBRASANTE	ELEVACIONES TERRENO	ESPESORES CORTE	ESPESORES CORTE SECO
0+185.00	44.40	50.15	----	5.75
0+190.00	44.37	50.30	----	5.93
0+195.00	44.39	50.22	----	5.83
0+200.00	44.36	50.03	----	5.67
0+205.00	44.27	49.85	----	5.58



cota	corte
00+185	
0	43
4.6	43.3
9	43.4
-6.5	43.5
-9	43.75
00+190	
0	43.4
5	43
9	43.2
-5.8	42.76
-9	42.9
00+195	
0	42.88
7	42.5
9	43.22
-5	43.5
-9	43.2
00+200	
0	43.21
6	42.8
9	43.33
-4	43
-9	43.48
00+205	
0	42.64
6	42.33
9	43.04
-7	42.5
-9	42.8



cota terreno

00+185	
0	50.15
2	49.9
10.5	48.58
-3	50.3
-12.2	48.83
00+190	
0	50.3
2	50.3
10.43	48.51
12.5	48.31
00+195	
0	50.22
2	50.4
4	49.85
5	46.2
9	44.2
12	44.85
-1	50.1
-1.5	49.2
-7	45
-11	44.07
00+200	
0	50.03
2.5	50
4	44.25
12	43.19
-9	43.1
-12	43.17
00+205	
0	49.85
2	49.2
2.5	43.20
12	43.15
-2	49.3
-3	46.35
-6.8	43.2
-12	43.17



MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO SALIDA\VOL DADO SALIDA
02/MAY/23 7:43pm Pagina 1
VOL DADO SALIDA

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+220.00	0.00	-44.91	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+225.00	0.00	-60.66	5.00	0.00	-263.93	9,736.08
0+230.00	0.00	-66.02	5.00	0.00	-316.69	9,419.39
0+235.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-165.04	9,254.35

TOTAL VOLUMEN CORTE SECO = -745.65m3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\USER\Desktop\VOLUMEN DADO SALIDA\VOL DADO SALIDA
02/MAY/23 7:43pm Pagina 1
VOL DADO SALIDA

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	CORTE SECO
0+220.00	45.13	47.61	----	2.48
0+225.00	45.13	48.40	----	3.27
0+230.00	45.13	48.77	----	3.64
0+235.00	48.70	48.70	----	0.00



COTA TERRENO	
00+220	
0	47.61
9	46.84
-9	48.44
00+225	
0	48.40
9	48.5
-9	48.7
00+230	
0	48.77
9	48.85
-9	48.8
00+235	
0	48.7
9	48.65
-9	48.6

Jorge Sfaer
78650199

COTA	CORTE
00+220	
0	45.13
9	45.13
-9	45.13
00+225	
0	45.13
9	45.13
-9	45.13
00+230	
0	45.13
9	45.13
-9	45.13
00+235	
0	48.7
9	48.65
-9	48.6



CODIGO: EI-F-C801	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	
PAGINA 1 DE 1	NTC-673	

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 26 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBO	2000	NORMAL	29/03/2023	5/04/2023	7	15.1	179.1	202.37	113.0	11.1	1614	81	81	E	
2	C2	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBO	2000	NORMAL	29/03/2023	12/04/2023	14	15.1	179.1	253.92	141.8	13.9	2024	101	101	E	
3	C3	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBO	2000	NORMAL	29/03/2023	26/04/2023	28	15.1	179.1	261.58	146.1	14.3	2087	104	104	D	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
	

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JTP

ING. CAMILO ERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por los ensayos aquí relacionados son válidos únicamente para las muestras entregadas al laboratorio. Este informe no puede ser reproducido, modificado o usado en campañas de divulgación, propaganda o publicidad sin autorización escrita de ingelabcon.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN :**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	310 3638103
FECHA DE INFORME:	jueves, 22 de junio de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°1, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	25/05/2023	1/06/2023	7	15.1	179.1	410.28	229.0	22.5	3274	82	82	E	
2	C2	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°1, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	25/05/2023	8/06/2023	14	15.1	179.1	499.05	278.7	27.3	3981	100	100		
3	C3	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°1, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	25/05/2023	22/06/2023	28	15.1	179.1	541.03	302.1	29.6	4316	108	108	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERMESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes solo pertenecen a los ítems ensayados. Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio.

CODIGO: GL-F-C001	FORMATOS	INGELABCCION S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO FUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3639103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 14 de junio de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°2, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	17/05/2023	24/05/2023	7	15,1	179,1	395,18	220,7	21,6	3152	79	79	3	
2	C2	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°2, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	17/05/2023	31/05/2023	14	15,1	179,1	487,33	272,1	26,7	3880	97	97	3	
3	C3	FUNDIDA DEL DADO ESTRIBO N°2, MARGEN DERECHA QUEBRADA SEVERINERA.	4000	NORMAL	17/05/2023	14/06/2023	28	15,1	179,1	537,64	300,2	29,4	4281	107	107	3	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
	

JEYSON JAVIER ATENCIA ADAMES
LABORATORISTA JDE

ING. CARLOS HERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados a través de esta plataforma son exclusivos para el cliente al cual se le entregan y no podrán ser reproducidos sin autorización. Los resultados aquí consignados corresponden únicamente a las muestras ensayadas.

INGELABCCION S.A.S
NIT. 901.127.711-9
Oficina: Carrera 7 N° 43-43 Barrio Caujaral Planeta Rica – Departamento de Córdoba
Cel: 3146007415 – Email: ingelabccion@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 03	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	172-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	3106638103
FECHA DE INFORME:	Jueves, 23 de marzo de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL.	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	24/02/2023	3	10,1	80,1	332,19	289,8	28,4	4140	104	94	E	
2	C2	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	24/02/2023	3	15,1	179,1	426,61	238,2	23,3	3403	85		C	
3	C3	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	2/03/2023	7	10,1	80,1	268,87	335,6	32,9	4794	120	104	E	
4	C4	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	2/03/2023	7	15,1	179,1	441,8	246,7	24,2	3524	88		C	
5	C5	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	23/03/2023	28	10,1	80,1	278,6	347,7	34,1	4968	124	111	E	
6	C6	PILOTE #1	4000	TREMIE	23/02/2023	23/03/2023	28	15,1	179,1	490,03	273,8	26,8	3911	98		D	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
JEYSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA (ES)

ING. CAMILO HERNESTO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes solo serán emitidos a la organización con indicación. Con base en los numerales siguientes del Reglamento INGELABCON S.A.S. Los medios no podrán ser reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita del generador.

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELARCON S.A.S
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	172-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentedecordoba2023@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 24 de marzo de 2023	**CONSECUTIVO:**	002		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	27/02/2023	3	10.1	80.1	293.27	344.0	33.9	5229	131	112	E	
2	C2	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	27/02/2023	3	15.1	179.1	462.75	258.4	25.3	3691	92		C	
3	C3	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	3/03/2023	7	10.1	80.1	307.37	383.6	37.6	5481	137	119	E	
4	C4	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	3/03/2023	7	15.1	179.1	305.96	282.5	27.7	4036	101		C	
5	C5	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	24/03/2023	28	10.1	80.1	302.6	377.7	37.0	5396	135	121	E	
6	C6	PILOTE #2	4000	TREMIE	24/02/2023	24/03/2023	28	15.1	179.1	339.69	301.4	29.5	4306	108		D	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA EIT

ING. CAMILO HERNESTO ROYCO ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son propiedad exclusiva de INGELARCON S.A.S. Su reproducción total o parcial sin autorización escrita de la gerencia está prohibida.

INGELARCON S.A.S
NIT. 901.134.479-8
Oficina: Carrera 9a #34-05 Barrio Capilla Fátima – Montería – Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelarcon@gmail.com

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	172-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	Sábado, 25 de marzo de 2023	CONSECUTIVO:	003		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	28/02/2023	3	10.1	80.1	239.40	298.8	29.3	4249	107	88	E	
2	C2	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	28/02/2023	3	15.1	179.1	343.77	192.0	18.8	2732	69		C	
3	C3	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	4/03/2023	7	10.1	80.1	319.21	398.4	39.0	5692	142	119	C	
4	C4	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	4/03/2023	7	15.1	179.1	481.50	268.9	26.4	3841	96		E	
5	C5	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	25/03/2023	28	10.1	80.1	332.23	414.7	40.6	5924	148	135	D	
6	C6	PILOTE #3	4000	TREMIE	25/02/2023	25/03/2023	28	15.1	179.1	506.98	283.1	27.7	4044	101		E	

TIPOS DE FALLA:

1	2	3	4	5	6
		X			

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes generados por la organización no son modificados, cumplen con los requisitos de integridad establecidos. INGELABCON S.A.S. No autoriza la publicación reproducción o copias en cualquier tipo de información técnica sin autorización escrita del generante.

CODIGO: EI-F-C007	FORMATOS	INGELABCON S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	172-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentedecordoba2023@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	Lunes, 27 de marzo de 2023	**CONSECUTIVO:**	004		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	2/03/2023	5	10,1	80,1	257,47	321,3	31,5	4590	115	93	E	
2	C2	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	2/03/2023	5	15,1	179,1	379,09	211,7	20,7	3024	76		E	
3	C3	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	6/03/2023	7	10,1	80,1	264,71	330,4	32,4	4720	118	99	E	
4	C4	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	6/03/2023	7	15,1	179,1	400,32	223,5	21,9	3193	80		E	
5	C5	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	27/03/2023	28	10,1	80,1	289,54	361,4	35,4	5163	129	114	E	
6	C6	PILOTE #4	4000	TREMIE	27/02/2023	27/03/2023	28	15,1	179,1	418,23	278,2	27,3	3975	99		D	

TIPOS DE FALLA:

TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	TIPO F
		X			

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA AIP

ING. CAMILO HERNESTO ROTOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son de responsabilidad exclusiva de INGELABCON S.A.S. No pueden ser publicados sin autorización escrita de la misma.

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	172-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERENERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	martes, 28 de marzo de 2023	CONSECUTIVO:	005		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	3/03/2023	3	10,1	80,1	241,67	301,6	29,6	4309	108	95	E	
2	C2	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	3/03/2023	3	15,1	179,1	382,71	219,3	21,5	3133	78		E	
3	C3	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	7/03/2023	7	10,1	80,1	253,62	316,6	31,0	4522	113	97	E	
4	C4	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	7/03/2023	7	15,1	179,1	438,40	239,2	23,4	3418	85		C	
5	C5	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	28/03/2023	28	10,1	80,1	269,78	336,7	33,0	4810	120	118	E	
6	CA	PILOTE #6	4000	TREMIE	28/02/2023	28/03/2023	28	15,1	179,1	499,58	279,0	27,3	3985	100		C	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA 2019

ING. CAMILO HENRIQUE HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes aquí emitidos por los laboratorios son realizados con base en las muestras entregadas del producto. INGELABCON S.A.S. no se hace responsable del uso indebido, reproducción o cambio en cualquier tipo de información técnica sin autorización escrita de la misma.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S.
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901.627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y BERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y BERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3108438705
FECHA DE INFORME:	miércoles, 29 de marzo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL.	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°7 ESTRIBOS N°1 ,PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	1/03/2023	8/03/2023	7	15,1	179,1	458,11	255,8	25,1	3634	91	91	3	
2	C2	PILOTE N°7 ESTRIBOS N°1 ,PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	1/03/2023	15/03/2023	14	15,1	179,1	532,84	368,7	36,3	4410	110	110	1	
3	C3	PILOTE N°7 ESTRIBOS N°1 ,PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	1/03/2023	29/03/2023	28	15,1	179,1	593,84	301,6	32,5	4737	118	118	C	

TIPOS DE FALLA

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
JEFFSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CARLOS HERNANDO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por los laboratorios son resultados con base en las muestras entregadas al laboratorio. No nos hacemos responsables de utilización, interpretación o conclusiones fuera de contexto de los resultados aquí presentados.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEITRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103636103
FECHA DE INFORME:	jueves, 30 de marzo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE H°B ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	2/03/2023	9/03/2023	7	15.1	179.1	489.53	278.4	26.8	3958	99	99	E	
2	C2	PILOTE H°B ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	2/03/2023	16/03/2023	14	15.1	179.1	525.98	299.0	29.3	4254	107	107	E	
3	C3	PILOTE H°B ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	2/03/2023	30/03/2023	28	15.1	179.1	580.97	328.9	32.3	4698	117	117	E	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901.134.473-9
JEISON JAVIER RESTREPO AGUIRRE
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERNANDO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por los organismos de inspección son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a sus clientes. Ni el organismo de inspección ni ninguna parte de este informe puede ser publicada, reproducida o usada en la publicidad, folletos o material de carácter comercial sin el consentimiento escrito de ingelabcon.

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901.134.473-9
Oficina: Cuarta Vía Km 12 Barrio Castillo Perez - Montería - Córdoba
Cel. 314 2179411 - Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	345-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	Viernes, 31 de marzo de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTES N°9 N°10 ESTRIBOS N°1, PLANO LOA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	3/03/2023	10/03/2023	7	15,1	179,1	457,12	355,0	35,0	5047	91	91	E	
2	C2	PILOTES N°9 N°10 ESTRIBOS N°1, PLANO LOA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	3/03/2023	17/03/2023	14	15,1	179,1	530,6	296,3	29,0	4208	106	106	E	
3	C3	PILOTES N°9 N°10 ESTRIBOS N°1, PLANO LOA GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	4000	NORMAL	3/03/2023	31/03/2023	28	15,1	179,1	597,44	333,6	32,7	4744	119	119	E	

TIPOS DE FALLA	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S.
JESSICA DAVID ARROYO ALVAREZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CARLOS HERNEDIO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son de exclusividad del cliente a quien va dirigido el informe y el laboratorio no se hace responsable de su mal uso por parte de terceros, reproducción o copias en cualquier tipo de comprobante. Prohibida su reproducción sin autorización escrita de ingelabcon.

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901.104.673-9
Oficina: Carrera 6 # 30-12 Barrio Urbanización Planeta – Montería – Córdoba
Cel. 314.671.7170 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 15/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S.
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEIRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3106638103
FECHA DE INFORME:	sábado, 1 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°11 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	4/03/2023	11/03/2023	7	15,1	179,1	442,69	247,2	24,2	3531	88	88	E	
2	C2	PILOTE N°11 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	4/03/2023	18/03/2023	14	15,1	179,1	521,94	291,5	28,6	4164	104	104	E	
3	C3	PILOTE N°11 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	4/03/2023	1/04/2023	28	15,1	179,1	558,47	311,9	30,6	4455	111	111	E	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

DIVER JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERIBERTO NOVOA ALVAREZ
COORDINADOR DE PROYECTOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas por el solicitante. No se asume responsabilidad sobre información suministrada por el cliente que afecte los resultados.

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901.126.673-9
Oficina: Cabecera Km 3 Vía Cerro Largo Puerto Escondido – Montería – Córdoba
Cel: 314.511.1411 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901.627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEREO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	lunes, 3 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°12 ESTRIBOS N°1. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	13/03/2023	7	15,1	179,1	418,92	238,9	22,9	3342	84	84	E	
2	C2	PILOTE N°12 ESTRIBOS N°1. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	20/03/2023	14	15,1	179,1	510,64	285,1	27,9	4074	102	102	E	
3	C3	PILOTE N°12 ESTRIBOS N°1. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	3/04/2023	28	15,1	179,1	540,75	303,0	29,4	4314	108	108	E	

TIPOS DE FALLA	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S.
YESSICA JAVIER MENDOZA AGUILAR
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO NOVOA ALVAREZ
COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD DE LABORATORIO


Los informes presentados por los organismos de inspección no deberán ser reproducidos parcialmente sin la aprobación escrita del laboratorio. Los resultados contenidos en este informe se refieren exclusivamente a la muestra recibida en el laboratorio y no deben ser utilizados para certificar la calidad de ningún lote.

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901.139.473-9
Oficina: Calle 41 No. 6-21 Barrio Laguna Pinillos – Montería – Colombia
Cel: 314 2 74 13 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: 01-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 18/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEPO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3106638103
FECHA DE INFORME:	martes, 4 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°13 ESTRIBOS N°2. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	7/03/2023	14/03/2023	7	15.1	179.1	452.13	252.3	24.7	3587	90	90	E	
2	C2	PILOTE N°13 ESTRIBOS N°2. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	7/03/2023	21/03/2023	14	15.1	179.1	523.25	293.2	28.4	4174	104	104	E	
3	C3	PILOTE N°13 ESTRIBOS N°1. PLANO E.04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	7/03/2023	4/04/2023	28	15.1	179.1	556.39	310.7	30.4	4408	111	111	E	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

INGELABCON S.A.S.
STEVEN JAVIER ATENCIA ADAMES
LABORATORISTA - ICT

ING. CAMILO HERMES ROPOS ALVARE
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización con resultados con tiempo de muestra entre guiones (Ejemplo: 7/03/2023 - 14/03/2023) los resultados pueden ser diferentes, esto debido a que el tiempo de muestra no cumple con el tiempo de muestra establecido en la norma NTC 673 de 2010 por lo tanto no se garantiza el resultado.

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901.134.473-9
Oficina: Cuarenta N° 8-34 El Bosque Cereté/Planeta Rica - Montería - Colombia
Cel: 314 615 74 71 - Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901.627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEDRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103658103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 5 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°1-4 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	13/03/2023	7	15.1	179.1	403.53	336.1	33.2	4801	84	84	C	
2	C2	PILOTE N°1-4 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	20/03/2023	14	15.1	179.1	503.51	292.3	28.4	4174	104	104	E	
3	C3	PILOTE N°1-4 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	6/03/2023	5/04/2023	28	15.1	179.1	556.99	311.8	30.5	4443	111	111	E	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	



EDWIN JAVIER ARANCIA ALVAREZ
LABORATORISTA JEFE



ING. CAMILO HERNESTO ROPOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes generados por la organización son validados únicamente en las muestras entregadas al laboratorio. No se realizan cambios en informes ya emitidos, cualquier duda o cambio en el informe debe ser solicitado dentro de los primeros 5 días de generado.

INGELABCON S.A.S
NIT: 901.627711-9
Oficina: Cuarta Vía Km 12 Sector Cabañas Perez – Montería – Córdoba
Cel: 314.617.9111 – Email: ingelabcon1@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901 627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°:	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERNERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3100638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 7 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°15 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	10/03/2023	17/03/2023	7	15.1	179.1	404.34	230.0	23.2	3280	81	80	E	
2	C2	PILOTE N°15 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	10/03/2023	24/03/2023	14	15.1	179.1	526.36	293.9	28.8	4179	104	105	C	
3	C3	PILOTE N°15 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	10/03/2023	7/04/2023	28	15.1	179.1	564.99	316.6	31.0	4523	113	113	E	

TIPO DE FALLA:

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA SST

ING. CAMILO ROBERTO ROYCA ALVAREZ
COORDINADOR DE INGENIERIA DE LABORATORIO

Los datos aquí presentados son de responsabilidad del solicitante, con base en la información suministrada. El laboratorio no asume responsabilidad por el muestreo. Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin autorización escrita del laboratorio.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.474-8
Dirección: Carrera 5a #14-02 Barrio Cabrera Parte Alta – Montería – Córdoba
Cel. 3146317411 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901427711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3106638103
FECHA DE INFORME:	sábado, 8 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°1 o ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	11/03/2023	18/03/2023	7	15,1	179,1	427,60	338,9	33,4	3413	85	88	C	
2	C2	PILOTE N°1 o ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	11/03/2023	25/03/2023	14	15,1	179,1	527,64	294,6	28,9	4209	103	105	E	
3	C3	PILOTE N°1 o ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	11/03/2023	8/04/2023	28	15,1	179,1	598,36	334,1	32,7	4773	119	119	D	

TIPOS DE FALLA



OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S.
BYRON JAVIER ARENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA SST

ING. CAMILO HERNESTO HORTA ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes generados por los ensayos son realizados con muestras entregadas al laboratorio [illegible]. Los cuales no podrán ser alterados, reproducidos o usados en campañas de información técnica de cualquier tipo de proyecto.

INGELABCON S.A.S
NIT 901.127.711-9
Dirección: Carrera 6a N°4-42 Barrio Capilla Perez – Montería – Córdoba
Cel: 3146137411 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 15/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO Nº**	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEYRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	lunes, 10 de abril de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO VACIADO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE Nº1.7 ESTRIBOS Nº2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	13/03/2023	20/03/2023	7	15,1	179,1	406,21	243,6	23,9	3480	87	87	E	
2	C2	PILOTE Nº1.7 ESTRIBOS Nº2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	13/03/2023	27/03/2023	14	15,1	179,1	538,51	300,7	29,5	4296	107	107	E	
3	C3	PILOTE Nº1.7 ESTRIBOS Nº2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	13/03/2023	10/04/2023	28	15,1	179,1	587,2	327,9	32,1	4684	117	117	D	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

INGELABCON S.A.S.
BRYAN JAVIER ARRIETA ADAMES
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HENRIQUEZ HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD (CMC)

Los ensayos relacionados con la presente no están cubiertos por el alcance de la acreditación otorgada por el IDEAM. Se prohíbe la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita del laboratorio.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3106638103
FECHA DE INFORME:	martes, 11 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°18 ESTRIBOS N°2, PLANO E-24 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	14/03/2023	21/03/2023	7	15.1	179.1	415.6	232.1	22.7	3313	83	82	F	
2	C2	PILOTE N°18 ESTRIBOS N°2, PLANO E-24 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	14/03/2023	28/03/2023	14	15.1	179.1	512.54	286.3	28.1	4089	102	102	F	
3	C3	PILOTE N°18 ESTRIBOS N°2, PLANO E-24 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	14/03/2023	11/04/2023	28	15.1	179.1	548.4	306.3	30.1	4374	109	109	F	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S

INGELABCON S.A.S

CODIGO: EI-F-C007	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	martes, 11 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO VACIADO	RESIS. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS KP1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	3000	NORMAL	14/03/2023	21/03/2023	7	15,1	179,1	167,84	534,7	52,3	1496	75	78	E	
2	C2	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS KP1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	3000	NORMAL	14/03/2023	28/03/2023	14	15,1	179,1	252,25	140,9	13,8	2012	101	103	D	
3	C3	SOLADO DE LIMPIEZA ESTRIBOS KP1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS	3000	NORMAL	14/03/2023	11/04/2023	28	15,1	179,1	297,94	163,8	15,8	2297	115	113	C	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	





CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 18/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3106638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 12 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	D. (cm)	A (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°19 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	15/03/2023	22/03/2023	7	15,1	179,1	415,59	236,1	23,2	3358	83	83	D	
2	C2	PILOTE N°19 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	15/03/2023	29/03/2023	14	15,1	179,1	515,26	287,7	28,2	4116	103	103	E	
3	C3	PILOTE N°19 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	15/03/2023	11/04/2023	28	15,1	179,1	547,69	305,7	30,0	4348	109	109	C	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

INGELABCON S.A.S.
JESSICA JAVIER ATENCIA AGUILAR
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE PUNTOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por los organismos con ensayos acreditados corresponden únicamente a los ítems ensayados. INGELABCON S.A.S. no asume responsabilidad sobre información suministrada por el cliente que pueda influir en los resultados. Reproducción o copia de este informe sólo total con autorización escrita del laboratorio.

INGELABCON S.A.S
NIT: 901.126.477-9
Oficina: Carrera 6a # 34-42 Barrio Urapanal Perico - Montería - Colombia
Cel: 314 623 7433 - Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 18/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO N°**	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	jueves, 13 de abril de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°20 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	16/03/2023	23/03/2023	7	15,1	179,1	399,70	227,3	21,9	3189	80	80	E	
2	C2	PILOTE N°20 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	16/03/2023	30/03/2023	14	15,1	179,1	511,40	285,4	28,0	4080	102	102	E	
3	C3	PILOTE N°20 ESTRIBOS N°2. PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	16/03/2023	13/04/2023	28	15,1	179,1	562,4	314,4	30,8	4494	112	112	E	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

INGELABCON S.A.S.
ARTEAGA JAVIER ARTEAGA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Los informes generados por la organización son confidenciales y solo serán enviados a las personas autorizadas. No se podrán reproducir parcialmente sin autorización escrita de ingelabcon.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.134.473-8
Dirección: Cultura Nº 834-02 Barrio Urbanización Porvenir – Montería – Córdoba
Cel. 314 617 6731 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 18/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

INGELABCON S.A.S.

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901427711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3108638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 14 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°21 ESTRIBOS N°3, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	17/03/2023	24/03/2023	7	15.1	179.1	414.48	231.3	22.7	3304	83	83	E	
2	C2	PILOTE N°21 ESTRIBOS N°3, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	17/03/2023	31/03/2023	14	15.1	179.1	516.53	288.4	28.4	4116	103	103	E	
3	C3	PILOTE N°21 ESTRIBOS N°3, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	17/03/2023	14/04/2023	28	15.1	179.1	546.20	305.0	29.9	4357	109	109	E	

TIPOS DE FALLA	OBSERVACIONES

INGELABCON S.A.S.
BYRON JAVIER MENDOZA ADAMES
LABORATORISTA - ITI

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por los laboratorios son validados únicamente en las muestras entregadas directamente por el solicitante. No se realizan ensayos de validación. Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra tal como se recibió en el laboratorio. Este documento no autoriza el uso de garantía.

INGELABCON S.A.S
NIT: 901.134.471-9
Dirección: Calle 62 N° 6-34 El Barrio Diagonal Parque - Montería - Córdoba
Cel: 314 613 7411 - Email: ingelabcon@gmail.com

245

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901527711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEIRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3100638105
FECHA DE INFORME:	sábado, 15 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	EDAD	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTE N°22 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	18/03/2023	25/03/2023	7	15,1	179,1	486,60	277,8	26,6	3962	97	97	E	
2	C2	PILOTE N°22 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	18/03/2023	1/04/2023	14	15,1	179,1	531,14	296,4	29,1	4227	106	106	E	
3	C3	PILOTE N°22 ESTRIBOS N°2, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	18/03/2023	15/04/2023	28	15,1	179,1	574,75	320,1	31,4	4401	110	110	E	

TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
	

ERICA JAVIER ARRIETA ADAMES
LABORATORISTA JEFE

ING. CARLOS HERNESTO ROPOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes de ensayos son fiel reproducción de los realizados en el laboratorio y se emiten en el momento de la entrega al interesado. No se emiten copias de informes de ensayos realizados con anterioridad. Los informes de ensayos no podrán ser utilizados parcialmente o alterados en su contenido sin autorización escrita de quien los emite.

INGELABCON S.A.S.
NIT. 901.134.473-8
Oficina: Calle 41 N° 6-34 El Rubí - Montería - Córdoba
Cel: 314 [illegible] - Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	245-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEIRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 19 de abril de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	DIAS	D. (cm)	A. (cm2)	CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
1	C1	PILOTES N°23 N°24 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	22/03/2023	29/03/2023	7	15,1	179,1	436,69	244,6	23,9	3480	87	87	E	
2	C2	PILOTES N°23 N°24 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	22/03/2023	5/04/2023	14	15,1	179,1	547,12	306,5	29,9	4344	109	109	C	
3	C3	PILOTES N°22 N°24 ESTRIBOS N°1, PLANO E-04 GEOMETRIA DE LOS ESTRIBOS.	4000	NORMAL	22/03/2023	19/04/2023	28	15,1	179,1	565,96	316,0	31,0	4520	113	113	E	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
ING. CAMILO HERNEDO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes solo se refieren a los especímenes ensayados y no deben ser reproducidos sin la aprobación escrita del laboratorio. Este informe no puede ser utilizado, reproducido o usado en forma total o parcial en campañas de publicidad sin el consentimiento escrito del laboratorio.

247

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	521-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	domingo, 10 de septiembre de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 1	4000	TREMIE	13/06/2023	20/06/2023	7	10.1	80.1	187.83	234.4	23.0	3349	84	84	D	
2	C2	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 1	4000	TREMIE	13/06/2023	27/06/2023	14	10.1	80.1	211.36	263.8	25.9	3769	94	94	C	
3	C3	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 1	4000	TREMIE	13/06/2023	10/09/2023	28	10.1	80.1	236.69	295.4	29.0	4220	106	106	D	

TIPOS DE FALLA:

TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	TIPO F

OBSERVACIONES:

JEISON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA (ITI)

ING. CAMILO HERNEYD ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son de exclusividad del cliente y/o a quien el mismo autorice. INGELABCON S.A.S. no puede ni podrá ser utilizados para publicidad o medios de comunicación masiva sin autorización escrita de la misma.

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	480-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PEIRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3100638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 16 de agosto de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VÁSTAGO Y ALETA LADO 1	4000	TREMIE	19/07/2023	26/07/2023	7	15,1	179,1	334,36	186,7	18,3	2667	67	67	E	
2	C2	VÁSTAGO Y ALETA LADO 1	4000	TREMIE	19/07/2023	2/08/2023	14	15,1	179,1	456,23	254,8	25,0	3640	91	91	D	
3	C3	VÁSTAGO Y ALETA LADO 1	4000	TREMIE	19/07/2023	16/08/2023	28	15,1	179,1	518,36	289,5	28,4	4136	103	103	C	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

JEFFSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA (E)

ING. CAMILO HERMESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio [illegible]. Se prohíbe su copia, reproducción o publicación total o parcial sin autorización escrita de la gerencia.

CODIGO: BI-F-C001 FECHA: 13/07/2021 VERSION: 02 PAGINA 1 DE 1	FORMATOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	443-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 4 de agosto de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VASTAGO Y ALETA LADO 2	4000	TREMIE	7/07/2023	14/07/2023	7	15.1	179.1	409.56	228.7	22.4	3267	82	82	C	
2	C2	VASTAGO Y ALETA LADO 2	4000	TREMIE	7/07/2023	21/07/2023	14	15.1	179.1	474.63	265.0	26.0	3786	95	95	C	
3	C3	VASTAGO Y ALETA LADO 2	4000	TREMIE	7/07/2023	4/08/2023	28	15.1	179.1	520.1	290.4	28.5	4149	104	104	D	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S

JEYSON JAVIER ATENCIA ADAME
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes relacionados con los ensayos son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio. INGELABCON S.A.S. no puede ni se hace responsable de cualquier uso inadecuado o mala interpretación de la información contenida en este reporte sin autorización escrita de quien lo genera.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.126.673-6
Oficina: Carrera 9a # 6A-35 Barrio Chapinero Primero – Montería – Córdoba
Cel. 3103638103 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9	**ORDEN DE SERVICIO Nº**	508-23
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN:**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	3103638103
FECHA DE INFORME:	sábado, 9 de septiembre de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 2	4000	TREMIE	12/08/2023	19/08/2023	7	15.1	179.1	415.48	232.0	22.7	3314	83	83	E	
2	C2	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 2	4000	TREMIE	12/08/2023	26/08/2023	14	15.1	179.1	464.20	259.2	25.4	3702	93	93	C	
3	C3	VASTAGO Y ALETA ESTRIBO LADO 2	4000	TREMIE	12/08/2023	9/09/2023	28	15.1	179.1	522.63	291.8	28.6	4169	104	104	D	

TIPOS DE FALLA						OBSERVACIONES:
TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	TIPO F	
		X				

JEYSON JAVIER ATENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA 001

ING. CAMILO ROBERTO MOTOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización no podrán ser total o parcialmente reproducidos sin la autorización escrita de INGELABCON S.A.S. En caso de requerir copias adicionales, reproducirlos o usarlos en cualquier tipo de campaña de información técnica en publicación avisar de antemano.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.125.673-8
Oficina: Carrera 9a #34-08 Barrio Ospina Pérez – Montería – Córdoba
Cel: (314)3774151 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S.
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN :**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	**CEL:**	310 3636105
FECHA DE INFORME:	viernes, 28 de abril de 2023	**CONSECUTIVO:**	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO TALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	31/03/2023	7/04/2023	7	15,1	179,1	325,96	182,0	17,8	2490	87	87	E	
2	C2	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	31/03/2023	14/04/2023	14	15,1	179,1	363,65	203,1	19,9	2901	97	97	E	
3	C3	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	31/03/2023	28/04/2023	28	15,1	179,1	400,92	223,9	21,9	3198	107	107	E	

TIPOS DE TALLA:	OBSERVACIONES:
TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E | TIPO F	

INGELABCON S.A.S.

JEYSON JAVIER ARENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO ROYOS AGAMEZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son de responsabilidad con exclusividad con base en los ensayos correspondientes solicitados [illegible] no podrán ser alterados, reproducidos o puestos en conocimiento de terceros sin autorización escrita de quien corresponda.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.154.671-9
Montería Cuerpo Fijo: KRA 20 Barrio Capital Pekes – Montería-Córdoba
Cel. 3146317490 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: IE-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	martes, 2 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL.	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	4/04/2023	11/04/2023	7	15.1	179.1	342.56	191.3	18.7	2733	91	89	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	4/04/2023	18/04/2023	14	15.1	179.1	375.68	209.8	20.6	2997	100	100	D	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	4/04/2023	2/05/2023	28	15.1	179.1	402.56	224.7	22.0	3210	107	107	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6	

JEYSON JAVIER ARENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA IDPE

ING. CAMILO ERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados con la interpretación son realizados con base en los requisitos entregados [illegible] No nos hacemos responsables sobre los usos en cualquier tipo de proyecto de información suministrada, solamente avalamos los resultados.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.134.473-8
Oficina: Cuarta Vía #38-80 Barrio Cayena Poblado – Montería – Colombia
Cel: 3146317555 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELARCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	comercial.puentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	martes, 9 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	11/04/2023	18/04/2023	7	15,1	179,1	336,28	187,8	18,4	2683	89	89	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	11/04/2023	25/04/2023	14	15,1	179,1	370,87	207,1	20,3	2959	99	99	D	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	11/04/2023	9/05/2023	28	15,1	179,1	406,34	226,9	22,2	3242	108	108	E	

TIPOS DE FALLA:

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6

OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JPP

ING. CARLOS HERNESTO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados a través de esta comunicación son confidenciales y solo deben ser utilizados o entregados al destinatario o a [illegible] que tenga responsabilidad en el proyecto. Ingelarcon S.A.S. no asume responsabilidad por el uso indebido de la información contenida en este documento por parte de personas diferentes a las mencionadas.

INGELARCON S.A.S.
NIT. 901.627.711-9
Oficina: Cuerpo Pj. #34-03 Barrio Laureles Parte I - Montería – Córdoba
Cel: 3146707470 – Email: ingelarcon@gmail.com

224

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELABCON S.A.S
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638100
FECHA DE INFORME:	miércoles, 10 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	12/04/2023	19/04/2023	7	15.1	179.1	336.65	188.0	18.4	2666	89	90	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	12/04/2023	26/04/2023	14	15.1	179.1	362.16	202.2	19.8	2869	96	96	E	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	12/04/2023	10/05/2023	28	15.1	179.1	405.3	226.3	22.2	3233	108	108	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CARLO HERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos presentados con los cilindros con resultados con notas de los fuentes enlargados de la norma [illegible] no poseen no poseen acreditación, reproducción o copia sin autorización escrita de ingelabcon.

INGELABCON S.A.S
NIT 901.133.677-8
Mz 6 Lote 3 Barrio Cayena Polo - Montería - Córdoba
Cel. 3136017615 - Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 03	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	INGELARCON S.A.S
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com / CEL: 310 3638105
FECHA DE INFORME:	jueves, 11 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	13/04/2023	20/04/2023	7	15.1	179.1	341,90	191,0	18,7	2728	91	91	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	13/04/2023	27/04/2023	14	15.1	179.1	382,34	213,5	20,9	3050	102	102	C	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	13/04/2023	11/05/2023	28	15.1	179.1	409,85	228,9	22,4	3270	109	109	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:

INGELARCON S.A.S.
JEISON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR SISTEMA DE LABORATORIO

Los informes presentados son de exclusivo uso del solicitante y no deben ser duplicados o entregados a terceros sin la autorización escrita de INGELARCON S.A.S., excepto en aquellos casos donde la ley obligue a la presentación de la información. En caso de necesidad acuda al gerente.

226

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 12 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	EFO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	14/04/2023	21/04/2023	7	15.1	179.1	327.64	183.0	17.9	2614	87	87	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	14/04/2023	28/04/2023	14	15.1	179.1	375.18	209.5	20.5	2993	100	100	E	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	14/04/2023	12/05/2023	28	15.1	179.1	396.74	221.5	21.7	3165	105	105	D	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES

JEFSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados con la firma autorizada en la base de los requisitos establecidos en [illegible] de nuestra no podrán ser exhibidos, expuestos sobre o usados en cualquier tipo de campaña de información, ilustración o de cualquier medio de publicidad.

CODIGO: IS-F-C001	FORMATOS	INGELABCION S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	martes, 16 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	18/04/2023	25/04/2023	7	15.1	179.1	331.03	170.7	17.0	2481	83	83	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	18/04/2023	2/05/2023	14	15.1	179.1	359.05	200.5	19.6	2864	95	95	E	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	18/04/2023	16/05/2023	28	15.1	179.1	391.46	218.6	21.4	3123	104	104	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
	

INGELABCION S.A.S.
(ENGR) JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JTP

ING. CAMILO HERNESTO ROTOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DEL LABORATORIO

Los informes presentados con los compromisos son realizados con todo rigor técnico científico de ingeniería [illegible] no se debe reproducir en su totalidad, parcialmente o ajustes sin autorización [illegible] de la información técnica de la empresa sin autorización escrita de [illegible]

INGELABCION S.A.S
NIT. 901.627.711-9
Oficina: Cuarto Piso #34-33 Barrio Cayena Nueva - Montería - Córdoba
Cel: 3104637615 - Email: ingelab.sas@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com / CEL: 310 3638103
FECHA DE INFORME:	jueves, 18 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	20/04/2023	27/04/2023	7	15.1	179.1	321.81	179.7	17.6	2547	91	86	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	20/04/2023	4/05/2023	14	15.1	179.1	351.71	196.4	19.2	2836	94	94	E	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	20/04/2023	18/05/2023	28	15.1	179.1	400.24	223.5	21.9	3193	106	106	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:

JEYSON JAVIER AVENDIA AGAMEZ
LABORATORISTA ITP

ING. CAMILO HERNESTO REYES ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	viernes, 19 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	21/04/2023	28/04/2023	7	15,1	179,1	336,38	187,8	18,4	2683	89	89	E	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	21/04/2023	5/05/2023	14	15,1	179,1	370,57	207,1	20,3	2959	99	99	D	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	21/04/2023	19/05/2023	28	15,1	179,1	394,36	220,3	21,7	3162	105	105	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
	

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por el Laboratorio son exclusivos para el uso de quien los solicita y Registrados ante la Cámara de Comercio. No se pueden reproducir parcialmente sin autorización escrita del laboratorio.

INGELABCOM S.A.S
NIT. 901.126.677-9
Oficina: Cumbre Mz 4 Lte 20 Barrio Cayena Falda – Montería – Córdoba
Cel: 3146317455 – Email: ingelabcom@gmail.com

CODIGO: EI-F-C001	FORMATOS	INGELAB CON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	**NIT:**	901427711-9
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**UBICACIÓN :**	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	**EMAIL:**	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com **CEL:** 310 3638103
FECHA DE INFORME:	martes, 23 de mayo de 2023	**CONSECUTIVO:**	001

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	25/04/2023	2/05/2023	7	15,1	179,1	336,66	188,0	18,4	2666	90	90	C	
2	C2	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	25/04/2023	9/05/2023	14	15,1	179,1	362,16	202,2	19,8	2881	96	96	E	
3	C3	REVESTIMENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	25/04/2023	23/05/2023	28	15,1	179,1	405,30	226,3	22,2	3223	108	108	E	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:
TIPO A / TIPO B / TIPO C / TIPO D / TIPO E / TIPO F	

INGELAB CON S.A.S.

JEISON JAVIER ATENCIA ADAME
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados son de exclusivo uso del cliente a quien van dirigidos y no podrán ser reproducidos parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio.

INGELAB CON S.A.S
NIT. 901.120.612-9
Montería Carrera 9c #34-81 Barrio Cayena Patios – Montería – Córdoba
Cel: 3146317455 – Email: ingelabcon@gmail.com

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELARCOM S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN :	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentesdecordoba2022@gmail.com	CEL:	310 3638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 24 de mayo de 2023	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (Kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	26/04/2023	3/05/2023	7	15,1	179,1	241,98	191,0	18,7	2728	91	91	C	
2	C2	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	26/04/2023	10/05/2023	14	15,1	179,1	382,24	213,5	20,9	3050	102	102	E	
3	C3	REVESTIMIENTO EN PIEDRA FONDO CANAL QUEBRADA SEVERINERA	3000	NORMAL	26/04/2023	24/05/2023	28	15,1	179,1	409,65	228,9	22,4	3270	109	109	D	

TIPOS DE FALLA:	OBSERVACIONES:

JEYSON JAFFER ARENCIA ALVAREZ
LABORATORISTA_IDE

ING. CAMILO HERNEDYO ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio. [illegible] no podrán ser alterados, reproducidos o usados en cualquier tipo de información diferente al contenido propio del mismo.

INGELARCOM S.A.S.
NIT. 901.139.477-8
Oficina: Carrera 6 No. 41A-22 Barrio Cayena Patios - Montería - Córdoba
Cel. 3146317455 - Email: ingelarcom@gmail.com

Informe de Resultados **F-ED-DNS-005**

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 610.5.2.2.1

Contratista: **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA**

Proyecto: **PUENTE VEREDA SEVERINERA**

Ubicación del Proyecto: **MUNICIPIO DE TIERRALTA, DPTO. DE CÓRDOBA**

Fecha: **viernes, 8 de septiembre de 2023**

Tipo de Material: **Material de Terraplén, Cantera Chicoral, Cabeza del Puente y Vía.**

Item(s) de Ensayo		Unid	Km 0+170, Capa 1	Km 0+170, Capa 2	Km 0+170, Capa 3	Km 0+170, Capa 4	Km 0+170, Capa 5	-	Especificación	
N° de Prueba		#	1	2	3	4	5	-		
Profundidad de la Prueba		cm	15	15	15	15	15	-	**SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90**	
Peso Frasco y Arena Inicial		cm	**6908**	**6901**	**6838**	**6835**	**6834**	-		
Peso Frasco y Arena Restante		cm	**2567**	**2750**	**2780**	**2606**	**2606**	-		
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1	g	4341	4151	4058	4229	4228	-		
Constante del Cono	**M2**	cm			1662					
Densidad de la Arena	**p1**	g/cm³			1,375					
Volumen del Hueco (M1-M2/p1)	V	cm³	1948	1810	1743	1867	1866	-		
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	**MDG**	g	**434**	**309**	**318**	**317**	**366**	-	-	
Peso Material Fino	MDF	g	3962	3690	3698	3877	3813	-		
Gravedad Específica Bulk (g/cm3)	GM	g/cm³	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	-		
Humedad de la Fracción Gruesa	HG	%	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	-	-	
Peso Material Extraído Humedo	**M3**	g	**4396**	**3999**	**4008**	**4194**	**4179**	-	GCm=	96,0
Peso Material Extraído Seco	M4	g	4052	3703	3694	3865	3852	-		
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG	%	10,6	8,3	8,3	8,1	9,4	-		
Porcentaje Partículas Finas	PFE	%	89,4	91,7	91,7	91,9	90,6	-		
Humedad Total (Finos y Gruesos)	**w**	%	**8,5**	**8,0**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	-	S=	0,03
Contenido de Humedad de la Fraccion Fina	WF	%	9,3	8,5	9,1	9,1	9,2	-	n=	4
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm	g/cm³	2,256	2,209	2,203	2,246	2,239	-	k=	0,819
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd	g/cm³	2,079	2,046	2,120	2,071	2,064	-		
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd	lb/pie³	129,8	127,7	132,3	129,3	128,8	-	GCI(90),%	**96,82**
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	g/cm³	**2,027**	**2,004**	**2,082**	**2,031**	**2,017**	-		
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	lb/pie³	126,6	125,1	130,0	126,8	125,9	-	-	
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γdm	g/cm³			2,120				-	
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt	%			8,20					
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)		%	**96**	**95**	**98**	**96**	**95**	-	**SE ACEPTA LOTE**	

OBSERVACIONES: **Corrección por Sobretamaños ret. 3/4" de Campo. (INV.E-143-13, 3.2, Pag. 5)**

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Informe de Resultados F-ED-DNS-005

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 610.5.2.2.1

Contratista: CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

Proyecto: PUENTE VEREDA SEVERINERA

Ubicación del Proyecto: MUNICIPIO DE TIERRALTA, DPTO. DE CÓRDOBA

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2023

Tipo de Material: Material de Terraplén, Cantera Chiocal, Cabeza del Puente y Via.

Item(s) de Ensayo		Unid	Volumen No Contemplado, Capa 1	Volumen No Contemplado, Capa 2	Volumen No Contemplado, Capa 3	Volumen No Contemplado, Capa 4	Volumen No Contemplado, Capa 5	Volumen No Contemplado, Capa 6	Especificación	
N° de Prueba		#	1	2	3	4	5	6		
Profundidad de la Prueba		cm	15	15	15	15	15	15	SI : GCm - (R(p)*5) ≥ 0,90	
Peso Frasco y Arena Inicial		cm	6804	6803	6800	6792	6785	6780		
Peso Frasco y Arena Restante		cm	2575	2485	2355	2354	2433	2501		
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1	g	4229	4318	4445	4438	4352	4279		
Constante del Cono	M2	cm				1662				
Densidad de la Arena	ρ1	g/cm³				1,375				
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V	cm³	1867	1932	2024	2019	1956	1903		
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDG	g	425	930	517	341	298	389		
Peso Material Fino	MDF	g	3797	3460	4008	4110	4100	3904		
Gravedad Específica Bulk (g/cm3)	GM	g/cm³	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655		
Humedad de la Fracción Gruesa	WG	%	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15		
Peso Material Extraido Humedo	M3	g	4222	4390	4525	4451	4398	4273	GCm=	95,6
Peso Material Extraido Seco	M4	g	3927	4103	4221	4156	4106	3986		
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG	%	10,7	22,4	12,1	8,1	7,2	9,2		
Porcentaje Particulas Finas	PFF	%	89,3	77,6	87,9	91,9	92,8	90,8		
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w	%	7,5	7,0	7,2	7,1	7,1	7,2	S=	0,02
Contenido de Humedad de la Fraccion Fina	WF	%	8,1	8,4	7,9	7,5	7,5	7,7	n=	4
Densidad Humeda In situ del Mat. Ensayado	ρm	g/cm³	2,261	2,273	2,236	2,205	2,248	2,245	ko	0,819
Densidad Seca In situ del Mat. Ensayado	ρd	g/cm³	2,104	2,124	2,086	2,059	2,099	2,094		
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd	lbf/pie³	131,3	132,6	130,2	128,5	131,0	130,7	GCI(90),%	95,56
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	g/cm³	2,053	2,008	2,026	2,018	2,066	2,051		
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	lbf/pie³	128,1	125,3	126,5	126,0	129,0	128,0		
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	ρLm	g/cm³				2,120				
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt	%				8,20				
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)		%	97	95	96	98	97	97	**SE ACEPTA LOTE**	

OBSERVACIONES: **Corrección por Sobretamaños ret. 3/4" de Campo. (INV.E-143-13, 3.2, Pag. 5)**

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

Informe de Resultados F-ED-DRS-005

Resultados de los Ensayos

Densidad o Masa Unitaria del Suelo en el Terreno Método del Cono y Arena

Norma de Ensayo: INV E-161-13

Especificación: INV Art. 610.5.2.2.1

Contratista: CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

Proyecto: PUENTE VEREDA SEVERINERA

Ubicación del Proyecto: MUNICIPIO DE TIERRALTA, DPTO. DE CÓRDOBA

Fecha: lunes, 25 de septiembre de 2023

Tipo de Material: Material de Terraplén, Cantera Chicotal, Cabeza del Puente y Via.

Item(s) De Ensayo		Unid	Volumen No Contemplado, Capa 7	Volumen No Contemplado, Capa 8	Volumen No Contemplado, Capa 9	-	-	-	Especificación	
N° de Prueba		#	1	2	3	-	-	-		
Profundidad de la Prueba		cm	15	15	15	-	-	-	SI : GCm - (K(p)*S) ≥ 0,90	
Peso Frasco y Arena Inicial		cm	6773	6765	6760	-	-	-		
Peso Frasco y Arena Restante		cm	2443	2370	2299	-	-	-		
Peso Arena Total Usada (A-B)	M1	g	4330	4395	4461	-	-	-		
Constante del Cono	M2	cm		1662						
Densidad de la Arena	ρ1	g/cm³		1,375						
Volumen del Hueco (M1-M2/ρ1)	V	cm³	1940	1988	2036	-	-	-		
Peso Material Grueso Ret. 3/4"	MDG	g	469	521	312	-	-	-	-	
Peso Material Fino	MDF	g	3849	3950	4170	-	-	-		
Gravedad Especifica Bulk (g/cm3)	GM	g/cm³	2,655	2,655	2,655	-	-	-		
Humedad de la Fracción Gruesa	WG	%	2,15	2,15	2,15	-	-	-		
Peso Material Extraido Humedo	M3	g	4318	4471	4482	-	-	-	GCm=	95,3
Peso Material Extraido Seco	M4	g	4024	4163	4173	-	-	-		
Porcentaje Retenido Grueso (Ret. 3/4")	PFG	%	11,5	12,4	7,4	-	-	-		
Porcentaje Particulas Finas	PFE	%	88,5	87,6	92,6	-	-	-		
Humedad Total (Finos y Gruesos)	w	%	7,3	7,4	7,4	-	-	-	S=	0,01
Contenido de Humedad de la Fraccion Fina	WF	%	8,0	8,1	7,8	-	-	-	n=	3
Densidad Humeda in situ del Mat. Ensayado	ρm	g/cm³	2,225	2,249	2,202	-	-	-	k=	0,906
Densidad Seca in situ del Mat. Ensayado	ρd	g/cm³	2,074	2,094	2,050	-	-	-		
Peso Unitario Seco en el Sitio	γd	lbf/pie³	129,5	130,8	128,0	-	-	-	GCI(90),%	95,33
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	g/cm³	2,016	2,034	2,013	-	-	-		
Peso Unitario Seco de la Fraccion Fina de la Muestra de Campo	γF	lbf/pie³	125,9	127,0	125,7	-	-	-	-	
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO	γd,m	g/cm³		2,120						
CONTENIDO OPTIMO DE AGUA (Humedad)	wopt	%		8,20						
COMPACTACION DEL TERRENO (GCI)		%	95	96	95	-	-	-	SE ACEPTA LOTE	

OBSERVACIONES: **Corrección por Sobretamaños ret. 3/4" de Campo. (INV.E-143-13, 3.2, Pag. 5)**

ADVERTENCIA: Las conclusiones registradas en este documento, Resultados de ensayos, corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de la representatividad del material. Cualquier alteración, del mismo, lo invalida completamente.

operador, laborero, Maestro, obreros,
Actividades en obra.
se continúa con la construcción de formaleta metálica, e instalación de la misma, para las vigas postensadas corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para los pasantes, de la viga, con el fin de llevar a cabo el izaje de la misma.
Aplicación de soldadura en el acero de refuerzo, de los pasantes. Se realiza comité de obra, en el sitio de obra

Residente de obra

Residente Interventoría

Sábado, Septiembre 30 de 2023
Estado Tiempo: seco.
Equipos en obra: Pescante, Equipo oxicorte, Equipo soldadura, varo, Herramientas menores (pulidora, pistola, guias, etc)
Personal en obra: Residente de Interventoría, Director Interventoría, Insp. Interventoría, Laborero, Maestro, obreros, oficiales, Almacenista, Sisa,
Actividades de obra.
Se continúa con la instalación y construcción de formaleta metálica para las vigas postensadas
corte, figurado, armado, e instalación del acero de refuerzo, para los pasantes de las vigas postensadas. Incluye Aplicación de soldadura

Residente de obra

Residente Interventoría

Domingo, Octubre 01 de 2023
No se ejecutan actividades por ser el día de descanso obligatorio

Residente de obra.

Residente Interventoría

Lunes, octubre 02 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado-Nublado
Equipos en obra: Pajarita, Equipo oxicorte, Equipo soldadura, Herramientas Menores (Pichiroquis, Martillo, pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, siso, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, soldador, obreros, operador, Almacenista
Actividades en obra.
Continúa el armado e instalación del acero de refuerzo, formaleta metalica, para las vigas postensadas.
Instalación del acero de refuerzo, para los pasantes del izaje de la viga. Incluye aplicación de puntos de soldadura.

Residente de obra.

Residente de interv.

Martes, octubre 03 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Rana, planta eléctrica, motobomba, Equipo oxicorte, Equipo soldadura, Herramientas Menores (Hoja, pichirogua, barras, pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Siso, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, Operador.
Actividades en obra.
Se avanza en la instalación de formaleta metálica, en la primera Viga postensada. Incluye nivelación y refuerzo de la misma.
Aplicación de punto de soldadura en el acero de refuerzo, en los pasantes del Izaje de la misma.

Residente de obra

Residente interventoría

Miercoles, octubre 04 de 2023.
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia en la madrugada
Equipos en obra: Pajarita, vibro, planta eléctrica, Equipo soldadura, Herramientas Menores (Pichirogua, martillo, pulidora, etc)
Personal de obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Siso, Almacenista, Maestro, oficiales, obreros, operador, soldador.
Actividades en obra.
Se avanza en la la instalación de formaleta metalica, para

la viga postensada.
Aplicación de soldadura en las formaletas metalicas.
Construcción de formaleta metalica para la viga postensada, según diseño.

Residente de obra

Residente interventoría

Jueves, octubre 05 de 2023.
Estado Tiempo: Se presenta una intensa lluvia desde la noche anterior, la cual aumentó el nivel de la quebrada Severinera
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, siso, Maestro, oficiales, obreros, soldador, operador.
Equipos en obra: Retro-cargador, Equipo soldadura, planta eléctrica, Motobomba, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (pulidora, martillos, pisón)
Actividades en obra.
Se presenta dificultad con el paso del personal operativo, por el aumento del nivel de la quebrada, por motivos de las intensas lluvias.
Se avanza en el armado e instalación de formaleta metálica, para la viga postensada. Incluye, nivelación y apuntalamiento de la misma

Residente de obra.

Residente interventoría

Viernes, octubre 06 de 2023.
Estado Tiempo: parcialmente nublado.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Equipo soldadura, planta eléctrica, Equipo oxicorte, Mezcladora, Herramientas Menores (pulidora, martillos, motosierra)
Personal en obra: Residente de obra, Residente interventoría, siso, Maestro Oficiales, obreros, soldador, operador, Almacenista.
Actividades en obra:
Nivelación y apuntalamiento de la formaleta metalica, para la viga postensada #1.
Corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para la viga postensada #1.
Armado e instalación de formaleta metalica para la viga postensada #1.

Aplicación de puntos de soldadura, en la formaleta metalica.
Se realizan la capacitación del personal operativo de la obra.

Residente de obra

Sabado, octubre 07 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Retro-cargador, Vibro, Equipo soldadura, Equipo oxiacetileno, planta eléctrica, Motobomba, Rana, Mezcladora, Herramientas Menores (polidora, martillos, Pichiroques, caretas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp. Interventoría, Siso, Maestro, oficiales, obreros, Soldador, Operador.
Actividades en obra.
Se continúa con el armado, instalación, nivelación, Apuntalamiento, en la formaleta metálica, para la viga postensada #3, Long: 30m

Residente de obra

Domingo, octubre 08 de 2023.
No se ejecutan actividades por ser el día de descanso dominical obligatorio.

Lunes octubre 09 de 2023
Estado Tiempo: parcialmente nublado
Equipos en obra: Retro Cargador, Vibro, Equipo soldadura, Equipo oxiacetileno, planta eléctrica, Motobomba, Mezcladora, Rana, Herramientas Menores (martillo, Pichiroque)
Personal en obra: Rep. Legal C.P.C, Residente de obra, Residente Interventoría, Siso, Maestro, Oficiales, Obreros, Soldador, Operador, Almacenista.
Actividades en obra.
Avance en la nivelación, Apuntalamiento, armado e instalación de formaleta metálica, para la viga postensada #3.
Armado e instalación de acero de refuerzo, según diseño, en

la viga postensada.
Aplicación de punto de soldadura e instalación de Nivendores. en la formaleta metalica, para la viga postensada #2.

Residente de obra.

Residente interventoria.

Martes, octubre 10 de 2023.
Estado tiempo: Se presenta una lluvia desde las 3:00p.m - 4:00p.m
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Equipo soldadura, planta eléctrica, Equipo oxicorte, Herramientas menores (Carretas, Mona, martillos, polidra)
Personal en obra: Rep. legal consorcio P.C. Residente de obra, Residente interventoria, Siso, Insp. Interventoria, Maestros, oficiales, soldador, Almacenista, Operador.
Actividades en obra:
Se realizan todos los detalles por logistica, para la fundición de la viga postensada
Se realiza la capacitación del personal responsable de la obra, donde se recomienda el curado, uso de polisombra, por parte de concretera, encargada del suministro del material premezclado, para la viga postensada.
Avance en la nivelación, Alineación, Apuntalamiento, para la viga postensada #1.
Se suspenden las actividades de 3:00 - 4:00p.m, por motivos de lluvia.
Se tenia programado realizar la fundida en el dia de hoy, pero no fue posible debido a que, se presentó un inconveniente en la planta de concreto, localizada en la ciudad de Montería
Se realizan los ultimos ajustes, en la nivelación, e instalación de formaleta.
Se posterga la fundición de la viga para el dia de mañana, 11 de octubre 2023.

Residente de obra.

Residente interventoria.

Miercoles, octubre 11 de 2023.
Estado Tiempos: Se presenta una lluvia en horas de la mañana.
Equipos en obra: Equipos de Topografía, bomba para concreto, 3 Mixer, Vibrador de concreto, Retro-Cargador, Vibro, Motobomba, planta electrica, Herramientas Menores (Carretas, Almadanas, barras, etc)
Personal en obra: Comisión de topografía - Interventoria - Obra, Rep. legal C.P.C, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoría, Operadores, Ing. Calidad, Concretobarbas, Maestro, Oficiales, obreros, SISO, Almacenistas.
Actividades en obra:
Se verifica el adosado del terraplén, instalado en obra
Se realiza el levantamiento planimetrico y Altimetrico, del terraplén, por parte de la comisión de topografía de la interventoría, conforme a la cartera, presentada por el contratista de obra.
Se inicia la fundición de la viga postensada de 5000psi, #13.
En el dia de hoy cuando se ~~estaba~~ terminando el segundo mixer con el concreto premezclado suministrado por concreto montoria, la formaleta empezo a presentar problemas en los alineadores por lo cual se empezó a evidenciar sobre ancho en la formaleta, en el tercer carro toca fundir casi a bulde porque la bomba concretora tenia mucha presion y esta facilitando la deformidad en la formaleta, esto conllevó a que el concreto se empezo airar y empezo su fraguado inicial, cabe resaltar que es un concreto acelerado a 7 dias. por lo que cuando faltaban 2 m³ aproximadamente, esto ya estaba no se dejaban coger por lo cual la interventoria no lo deja instalar, el contratista con el concreto faltante decide bajo su responsabilidad hacerlo en obra.
El contratista de obra manifiesta que en virtud al problema presentado en la formaleta, el concreto suministrado no alcanzaba, para terminar la fundida, se optó con terminar el vaciado de la viga,

con el concreto elaborado en obra, cabe resaltar que por la hora en que empezó a fraguar el concreto premezclado, al que estaba por 4horas Aprox y la distancia de acarreo desde la concretadora, que se está ubicando en la ciudad de Montería, el contratista asume la responsabilidad, con el fin de evitar juntas frías. El contratista toma muestras del concreto elaborado en obra, conforme al diseño de mezcla. Se termina la actividad de fundida a las 10:30 p.m.

Residente de obra

Jueves, octubre 12 de 2023.
Estado tiempo: soleado. parcialmente nublado.
Equipos en obra: Motobomba, Retro-Cargador, vibro, planta eléctrica, Herramientas menores (pulidora, barras, martillo), rotulado Indostrial.
Personal en obra: Rep. legal C. P. C, Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, siso, oficiales, obreros, Almacenista, operador.
Actividades en obra.
Se le aplica antisol a la viga fundida.
Se realiza el curado a la viga postensada.
Desencofrado de una formaleta de la viga.

Residente de obra

Viernes, octubre 13 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: planta eléctrica, Motobomba, Retro-Cargador, vibro, Herramientas menores (pulidora, Bichiruguis, mona, Martillos)
personal en obra. Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, operador, Almacenista
Actividades en obra.
Se inicia el desencofrado de la formaleta metalica de la viga

Se le aplicó un adhesivo epoxídico (EPOXID), para un mejor sellado del concreto.
Aplicación del Mapegrout 430, el cual es mortero tixotrópico, para el saneamiento del hormigón
limpieza y refuerzo con soldadura a la formaleta metálica.
Se continúa con el curado del asentado de la viga y se protege del sol, con polisombra

Residente de obra

Residente interventoría.

Sábado, octubre 14 de 2023
Estado tiempo: Nublado
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, almacenista, Operador.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Motobomba, Vibro, planta eléctrica, Herramientas Menores (Pala, Carretas, Martillos, etc)
Actividades en obra,
Se continúa con el curado del concreto puesto en la viga postesada
Se continúa con la aplicación de los productos, en la viga postesada #1
El personal de obra en el día de hoy, salió antes temprano de la hora laboral, debido a que el día de la fundición, por los inconvenientes presentados, se trabajó hasta las 10:30p.m. una jornada laboral de más de 12horas, las cuales se compensarán en éste día

Residente de obra.

Residente interventoría.

Domingo, octubre 15 de 2023
" No se ejecutaran actividades en obra, por ser el día de descanso obligatoria."

Lunes, octubre 16 de 2023
Estado tiempo: soleado.
Equipos en obra: Retro-Oruga, Equipo soldadura, Equipo oxicorte, Equipo soldadura, Vibro, Herramientas Menores (Mona, Martillos, barras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista.
Actividades en obra.
se continúa con la limpieza y refuerzo de la formaleta metalica.
Continúa el curado y resane de la viga postensada
Continúa el desencofrado de la formaleta metalica.

Residente de obra

Residente interventoria

Martes, octubre 17 de 2023.
Estado Tiempo: parcialmente Nublado
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Motobomba, planta electrica, Herramientas Menores (Mona, Martillos, cametas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, almacenista.
Actividades en obra.
se inicia armar e instalar la formaleta metalica, para la Segunda viga postensada.
Limpieza y refuerzo de formaleta metalicas, para vigas postensada
Curado del concreto de la viga postensadas.

Residente de obra

Residente interventoria

Miercoles, octubre 18 de 2023
Estado Tiempo: parcialmente nublado.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, planta eléctrica, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (Martillo, Mona, barras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista.

Actividades en obra.
Se continúa con el armado e instalación de formaleta metalica, para la viga postensada #2.
Nivelación e instalación de alineadores, para formaleta metalica, long: 30m.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, octubre 19 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Equipo oxicorte, Motobomba, planta electrica, Herramientas Menores (palas, barras, martillo, Mona, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, Almacenista.
Actividades en obra.
Avance en la instalación y nivelación de formaleta metalica, para la viga postensada #2
Instalación de listones laterales en madera, con el fin de reforzar el patín de la formaleta.

Residente de obra.

Residente Interventoría

Viernes, octubre 20 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia, la madrugada anterior.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Equipo oxicorte, Motobomba, planta eléctrica, Herramientas Menores (martillo, barras, Mona, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, Almacenista.
Actividades en obra.
Se avanza en la nivelación e instalación de formaleta metalica, para la viga postensada #2.

Residente de obra

Residente Interventoría

Sabado, octubre 21 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, Equipo oxicorte, Motobomba, planta eelectricas, Herramientas Menores (palas, Mona, Martillo, etc)
personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista.
Actividades de obra.
Se continua con la instalación y nivelación de formaleta metalica, para la viga postensada #2.

Residente de obra

Residente interventoria

Domingo, octubre 22 de 2023.
No se ejecutaron actividades por ser el dia de descanso dominical obligatorio.

Lunes octubre 23 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una llovizna la noche anterior.
Equipos en obra: Retro-cargador, Vibro, planta eléctricas, Herramientas Menores (Mona, barras, polidora, etc).
personal en obra: Residente de obra, Residente Interventorso, Inspector Interventoría Maestro, oficiales, obreros, almacenista.
Actividades en obra.
Se termina de instalar y nivelar, la formaleta metalica para la viga postensada #2.
Apuntalamiento y refuerzo lateral con listón 2"x4", a lo largo de viga postensada
Se realiza la logistica para la fundición de la viga #2, con concreto premezclado, proveniente de la ciudad de Montería

Residente de obra.

Residente interventoria.

Martes, octubre 24 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia por la mañana.

Equipos en obra: Retro-Cargador, Tres (3) mixer, Bomba para concreto, Motobomba, Vibrador electrico, planta electrica, Herramientas Menores (pala, Carretas, Almadana, etc)
Personal en obra: Rep. legal C.P.C, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestros, oficiales, obreros, operadores, conductores, Almacen
Actividades en obra
Se funde la viga postensada #2, en concreto premezclado de 5 ampsi.
Se toman muestras de cilindros, para el control de calidad del Concreto
Se funden los dos (2) topes sismicos en el estribo #2, localizado en la margen izquierda, de la quebrada Severinera.
En el dia de hoy se presento una falla en la Soldadura de la formaleta en el costado izquierdo generando un sobrancho a una distancia de 7m - 10m y 17m - 21m en la longitudinal de la Viga, se vacio tambien los topes sismico del estribo 2 con el sobrante del concreto.
El contratista logro controlar el inconveniente presentado en la formaleta, en el desarrollo de la fundición. la vol se termino en completa normalidad.

Residente de obra

Residente interventoria

Miercoles, Octubre 25 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Retro-cargador, Motobomba, vibro, Herramientas Menores (barras, Muñillos, Mona, etc).
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestro, Oficiales, Obreros, Almacenistas.
Actividades en obra
Se realizo el curado de la viga y se le aplico antisol.
Se le coloca el polisombra a la viga postensada, de acuerdo a la recomendación dada por la Concretera.
Se inicia el descimbrado de la viga postensada #2.
Se retiran gatos y alineadores de la misma.

Se desencofran los cilindros de concretos y depositan en agua.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, octubre 26 de 2023.
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Retro-cargador, vibro, planta eléctrica, Herramientas Menores (barras, pona, martillo, etc).
personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoria, Maestro, Oficiales, obreros, Almacenista, operadores.
Actividades en obra.
Se inicia el armado e instalación del acero de refuerzo, para la viga postensada nº3, en los intersecciones, donde este faltaba
Se continúa con el curado de la viga postensada.
Se inician la instalación de la formaleta metalica, para la viga postensada nº3.
Se inician el perfilado del talud, para el revestimiento del talud, en la quebrada Severinera
Se realiza limpieza de la formaleta metalica de la viga postensada.

Residente de obra

Residente Interventoría

Viernes, octubre 27 de 2023
Estado Tiempo: se presenta una llovizna en horas de la mañana.
Equipos en obra: Retro-Cargador, vibro, motobomba, planta eléctrica,
Herramientas Menores (pona, barras, Maso, etc)
Personal en obra: Director Interventoría, Residente de obra, Residente Interventoría, Ing. Ambiental Int. Insp. Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, Almacenista.
Actividades en obra.
Se continúa con la instalación de formaleta metalica, para la viga nº3.
Avance en el curado y aplicación del antisol, para la viga

postensada N02.
Se realiza comité de obra, conjuntamente entre contratista e interventor. para el control y seguimiento a la ejecución de la obra.

Residente de obra

Residente interventoría

Sabado, octubre 28 de 2023.
Estado Tiempo: soleado
personal en obra: 1 obrero.
No se ejecutarán actividades en obra, debido a que el personal calificado, se trasladó a sus ciudades de origen, por motivos del proceso electoral que se lleva a cabo el próximo domingo 29 de octubre de 2023
Solo se realizó labores de la maquinaria amarilla. Cabe resaltar que el personal encargado de la viga, en el transcurso de la semana, el avance o el rendimiento fué significativo. Avance en el curado de la viga.

Residente de obra

Residente interventoría

"Domingo, octubre 2 de 2023.
No se ejecutan actividades en obra, por motivos de ser el día de descanso dominical obligatorio, según el código sustantivo del trabajo.

Lunes, octubre 30 de 2023
Estado Tiempo: Nublado
personal en obra: Residente obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría Maestro, oficiales, obreros, almacenista, soldador
Equipos en obra: Retro-Cargador, Vibro, planta eléctrica, Motobomba, Rana
Herramientas Manuales: Mona, Martillo, tichirogüa, etc), Equipo. soldadura
Actividades en obra.
Se continúa con la instalación, nivelación, Apuntalamiento de la viga postensada con la formaleta metalica.
Se aplicaron puntos de soldadura en la formaleta metalica, para

La viga postensada no 3.
Armado e instalación de acero de refuerzo, para la viga postensada no3.
Se le realiza un refuerzo con madera, para evitar inconvenientes, con la formaleta al momento de la fundición
Instalación de corbatas en la base o patín de la viga.

Residente de obra

Residente interventoría

Martes, octubre 31 de 2023.
Estado Tiempo: Parcialmente Nublado, llovizna en la noche anterior.
Equipos en obra: Retro-cargador, Vibro, Equipo soldadura, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (Moto, polidora, Martillo, etc)
Personal en obra: Director Interventoría, Residente de obra, Residente de Interventoría, Maestros, oficiales, Obreros, Soldador, Top. Int.
Actividades en obra.
La comisión de topografía realiza un levantamiento planimetrico y altimetrico, en la primera viga postensada y segunda. con el fin de chequear el estado actual, dado al inconveniente presentado, durante el vaciado de la misma, por motivos de la formaleta
Avance en la nivelación e instalación de la formaleta metalica para la tercera viga postensada incluye, Alineadores, listón en madera 2"x4", Apuntalamiento.
Instalación del acero de refuerzo en la viga postensada no3, en los tramos faltantes
Se refuerzan las formaletas metalicas, con puntos de soldadura.

Residente de obra.

Residente Interventoría

La viga postensada no 3
Armado e instalación de acero de refuerzo, para la viga postensada no 3
Se la realiza un refuerzo con madera, para evitar inconvenientes, con la formaleta al momento de la fundida
Instalación de carbonta en la base o patín de la viga.

Residente de obra

Residente interventoría

Martes, octubre 31 de 2023
Estado Tiempo: Parcialmente nublado, llovizna en la noche anterior.
Equipos en obra: Retro-cargador, Vibro, Equipo soldadura, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (Mora, polidora, Martillo, etc)
Personal en obra: Director Interventoría, Residente de obra, Residente de Interventoría, Maestros, oficiales, Obreros, Soldador, Top. Int.
Actividades en obra.
La comisión de topografía realiza un levantamiento planimetrico y altimetrico, en la primera viga postensada y segunda. Con el fin de chequear el estado actual, dado al inconveniente presentado, durante el vaciado de la misma, por motivos de la formaleta
Avance en la nivelación e instalación de la formaleta metalica para la tercera viga postensada incluye, Alindadores, listón en madera 2"x2", Atiesamiento.
Instalación del acero de refuerzo en la viga postensada no3, en los tramos faltantes
Se refuerzan las formaletas metalicas, con puntos de soldadura.

Residente de obra.

Residente interventoría

Miercoles, noviembre 01 de 2023
Estado Tiempo: Nublado. llovizna la madrugada
Equipos en obra: pajarita, Mezcladora, Herramientas Menores (carretas, Martillo
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp.

de Interventoría, Maestros, obreros, Operador, Almacenista
Actividades en obra:
Se inicia la perfilación del talud, para el revestimiento lateral, lado izquierdo o margen izquierda quebrada Saravinera
Se inicia la instalación del geotextil no tejido y la Piedra en el revestimiento con piedra pegada.
Avance en la instalación de formaleta metálica, para la tercera Viga postensada. Incluye Apuntalamiento y nivelación

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, Noviembre 02 de 2023
Estado Tiempo: Muy soleado.
Equipos en obra: Retro Cargador, Mezcladora, Motobomba, Herramientas menores (Carretas, palas, Cadenas)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, Operador, Almacenista
Actividades en obra:
Se instalan el geotextil para el revestimiento en piedra pegada
Acarreo interno de material granular (Arenas - Gravas)
Se inicia la instalación de la piedra pegada y fundición del revestimiento en talud.
Se revisan la instalación de formaleta metálica para la viga N°3.
Se avanza en la instalación de formaleta metálica, en el estribo N°2 en Aletas y Vastago a nivel +4.45-5.45m
Se realiza la logística para el día de mañana para la fundición de la viga postensada N°3.

Residente de obra.

Residente Interventoría

Viernes, Noviembre 03 de 2023
Estado Tiempo: Soleado

Domingo, Noviembre, 05 de 2023.
" No se ejecutan actividades por ser día de descanso dominical obligatorio

Lunes, Noviembre 06 de 2023
No se trabajó por ser día festivo, pero el gran motivo de que no se realizaron labores en obra, es porque el nivel de la quebrada se encuentra alto por motivos de lluvias

Residente de obra.

Residente Interventoría

Martes, Noviembre 07 de 2023
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: Retrocargador, Mezcladora, Vibro, Motobomba, Herramienta Menores (Carretas, palas, Martillos, etc), Taladro.
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Maestros, Oficiales, obreros operador, Almacenista
Actividades en obra.
Avance en el desencofrado de formaleta metálica, para la viga N03.
Se continúa con el revestimiento en piedra pegada en el talud. Incluye, instalación del geotextil no tejido y piedra pegada localizado en la Margen izquierda de la Quebrada Severinera
Avance en la instalación de formaleta metálica, en el estribo N2. en el Vástago y Aletas. Nivel 4A- 5.65m

Residente de obra.

Residente Interventoría

Miercoles, Noviembre 08 de 2023
Estado Tiempo: llovió por la madrugada
Personal de obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, operador, Almacenista.
Equipos en obra: Retro-Cargador, Mezcladora, Vibro, motobomba, planta

eléctrica, talado, Herramientas menores (carretas palas, martillos, etc)
Actividades en obra.
Acarreo interno del material granular.
Solo se realiza remoción del material en la piedra pegada, debido a que por motivos de lluvia, causó sedimento al mismo.
, debido al aumento del nivel de la Quebrada
Avance en la instalación de formaleta metalica en el estribo N02
Incluye, Vastago y aletas. Nivel 44,5 ± 5,65m

Residente de obra.

Residente Interventoría.

Jueves, Noviembre 09 de 2023
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: Retrocargador, Mezcladora, Vibro, Herramientas menores Carretas, palas, Martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp. Interventoria, maestros, Oficiales, obreros, Operador, Cadenta, Almuerzo
Actividades en obra
Avance en el revestimiento con piedra pegada en talud.
Se continúa con la instalación y nivelación de formaleta metalica, Según diseño, en el estribo N2. localizado en la margen Izquierda de la Quebrada Sureñinera
Fundición de concreto en la piedra pegada sobre talud.
Acarreo interno del Material granular (Gravas - Arenas)
No se ejecutan actividades posteriores a la viga postensada, debido a que estas se encuentran en revisión, por parte de la interventoría

Residente de obra.

Residente Interventoría.

Viernes Noviembre 10 de 2023.
Estado Tiempo: lluvia intensa por la madrugada.
No se realizaron actividades en obra, debido a que el nivel que se encuentra muy alto, debido a la intensa lluvia la madrugada

de hoy. la cual impidió realizar actividades en el revestimiento en la piedra pegada y el tránsito de los trabajadores.

Residente de obra

Residente interventoría

Sábado, Noviembre 11 de 2023.
Estado Tiempo: Soleada
Equipos en obra: Retrocargador, Mezcladora, Herramientas Menores (palas, Carretas, Martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Ing. Interventoría, Maestros, oficiales, operador, Almacenista.
Actividades
Remoción y limpieza del material sedimentado en el talud.
Avance en el revestimiento del material, con piedra pegada sobre el talud.
Avance con la instalación del geotextil, piedra pegada y fundida del concreto

Residente de obra

Residente interventoría.

Domingo, noviembre 12 de 2023
No se ejecutaron actividades en obra, por ser día de descanso dominical obligatorio

Lunes, Noviembre 13 de 2023
No se ejecutaron actividades por ser día festivo.

Martes, Noviembre 14 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obras: Retrocargador, Mezcladora, Herramientas Menores(Carretas, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría,

Herramientas Menores (Carretas, palas, Martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Ing Interventoría, Maestros oficiales, obreros, operador, Almacenista.
Actividades de obra.
Se continúa con el revestimiento en piedra pegada, sobre talud. Incluye, Instalación de geotextil no tejido, piedra pegada, fundida de concreto.
Se inicia la instalación de formaleta metálica, en el estribo N1, localizado en la Margen derecha de la Quebrada, en el vástago y aletas.
Acarreo interno de material granular. (Gravas y arenas)

Residente de obra

Viernes, Noviembre 17 de 2023
Estado Tiempo: Nublado
Equipos en obra: Retrocargador, vibro, planta eléctrica, Mezcladora, Herramientas Menores (Carretas, palas, Martillos, etc), Taladro
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Ing Interventoría, Maestros, Oficiales, obreros, Almacenista, Operador.
Actividades en obra.
Se continúa avanzando en la instalación de formaleta metálica, en el estribo N°1, en vástago y aletas
Avance en la fundición del revestimiento en piedra pegada, sobre talud. Incluye, instalación geotextil no tejido y piedra pegada.
Se adelanta la instalación de formaleta metálica, en el estribo N°1, localizado en la Margen derecha Quebrada Severinera.

Residente de obra

Sabado, Noviembre 18 de 2023
Estado Tiempo: Nublado
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Inspector Interventoria, Maestros, Oficiales, obreros, Almacenista,
Equipos en obra: Retro, cargador, Retro Oruga, Mezcladora, Herramientas Menores (Palas, Carretas, Codal, etc)
Actividades en obra.
Se continua con el perfilado del talud.
Avance en el revestimiento con piedra pegada, en talud. localizado en la margen izquierda, de la Quebrada Guarinas
Instalación de geotextil no tejido
Instalación o suministro de piedra pegada
Fundición en concreto en el revestimiento
Se adelanta el encofrado de formaleta metálica, en el estribo vol

Residente de obra

Residente Interventoria

Domingo, noviembre 19 de 2023
Estado Tiempo: nublado
No se realizaron actividades en obra, debido a que es el dia de descanso dominical obligatorio

Residente de Obra

Residente Interventoria

Lunes, noviembre 20 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Minicargadora, vibro, planta electrica, Motobomba
Herramientas Menores (carretas, palas, Martillo, taladro etc..
Personal en Obra.: Oficiales, Ayudantes, Operador, Almacenista

Actividad en obra
En el día de hoy, se realizo actividad de la protección del talud con el revestimiento de piedra. Pegue donde el estribo #1 solo se realizo esta actividad, la cuadrilla que esta en el estribo 2 encargado no llego hoy.

Residente Interventoría

Martes 21 Noviembre de 2023
Estado del tiempo: Nublado.
No se realizo actividades el día de hoy por lluvias en la noche y la madrugada la quebrada se encuentra con un nivel alto y es imposible trabajar en la actividad de revestimiento en piedra.

Residente Interventoría

Miercoles 22 Noviembre de 2023
Estado del tiempo: Soleado.
Equipo en obra: Minicargador, Vibro, Planta eléctrica, Herramienta Menor: Carretas, palas Martillo, Etc.
Personal en obra: oficiales, Ayudante, Operador, Almacenista Residente Interventoría, Inspector Interventoría)
Actividad en obra.
En el día de hoy se realizo actividad de empradizamiento del talud en el estribo #2, esta actividad se realizo con la minicargador y un ayudante.

Residente Interventoría

Jueves, 23 de Noviembre de 2023
Estado del tiempo: Soleado.
Equipo en obra: Minicargador, Vibro, Planta electrica, Mezcla-
Herramienta Menor: Carretilla, Palas, Martillo Etc.
Personal en obra: oficiales, Ayudantes, Operador, Almace-
nista, Residente e inspector de interventoria.
Actividad En Obra.
En el dia de hoy se trabajo en el perfila-
miento del talud del estribo #2 y acopio
de piedra rajon para realizar el revestimiento
en piedra pegada.

Residente Interventoria.

Viernes, 24 de Noviembre de 2023.
Estado del tiempo: soleado.
Equipo en obra: Minicargador, vibro, planta electrica, Mezcladora
Herramienta Menor: Carretilla, Palas, Martillo, Etc..
Personal en obra. oficiales, Ayudante, operador, Almacenista
Residente e Inspector de interventoria.
Actividad en obra.
En el dia de hoy se realizo la actividad del
revestimiento en piedra pegada para la proteccion
del estribo #2, se adelanto en la colocacion
de la primera capa.

Residente de Interventoria.

Sabado, 25 de Noviembre de 2023
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Minicargador, vibro, Planta electr.)
Equipo en Obra: Minicargadora, Vibro, Planta electrica.
Herramienta menor: operador, Ayudante, Residente e inspector
de interventoria.

Actividad en obra.
No se realiza actividad, ya que la actividad del empredado para la proteccion del talud del estribo #2, no se pudo realizar por falta de la piedra rajon.

Residente residente.

Domingo, 26 Noviembre 26 de 2023

No se realizan actividad por descanso.

Residente Interventor

Lunes, 27 Noviembre de 2023.
Estado del tiempo: Soleado.
Personal en obra: Almacenista, Residente e inspector de interventoria.
En el dia de hoy no se realizo actividad por falta de material en obra "Piedra rajon" no se puede continuar con la proteccion del talud. en el estribo #2 se cayo un box culvert de 2m y es imposible ingresar material a la obra.

Residente Interventor.

Martes, 28 Noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Almacenista, Residente e inspector de interventoria.

Actividad en obra.
No se realiza actividad en obra por falta de material "piedra rajon" y aun el ~~pedido~~ box culvert de 2mx. no esta habilitado.

Residente Interventoria

Miercoles, 29 Noviembre de 2023.
Estado de tiempo: Soleado.
Personal en obra: operador, Almacenista, Residente o inspector de interventoria.
Actividad en obra.
No se realiza actividad en obra por falta de material "piedra rajón"

Residente Interventoria.

Jueves, 30 Noviembre 2023.
Estado Tiempo: Muy soleado
Equipos en obra: Retro Oruga, Retro Cargador, Mezcladora, Herramientas Menores (Mezcladora, palas, etc)
Personal a obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Operador: Almacenista.
Actividades en obra
No se ejecutan actividades en obra, por falta de material piedra Rajón,
El contratista manifiesta que el acceso a la vía, que comunica a Severinera, por la vía trenalta, se encuentra incomunicada, debido a que un box coulvert se encuentra averiado producto de las fuertes lluvias. El contratista hace las gestiones para solucionar el ingreso de material
El contratista solicitó un prórroga del contrato, debido a que el plazo contractual vence hoy 30 de noviembre del corriente año, la cual se encuentra en estudio.

Residente de obra

Residente Interventoria

Avance en el corte, figurado, para el refuerzo de la viga postensada
Extendido del material granular en el costado del puente.
del estribo #1, Para la ubicacion y Posicionamiento
de la grua. (este material es el utilizado en el
terraplen y luego se realiza la maniobra de izaje
se recuperara y se conformaran los llenos en los
cabezales de los estribos.)

Residente de obra

Residente Interventoria.

Viernes, Septiembre 01 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Pajarita, vibro, Equipo oxicorte, Volquetas planta
electrica, Motobomba, Herramientas Menores (pulidoras, Martillos barras)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria,
Insp. Interventoria, SISO, Maestro, oficiales, obreros operadores, conductor
almacenista.
Actividades en obra.
Se continua con el corte, figurado, armado del acero de refuerzo,
para las vigas postensadas, segun diseño.
Suministro de material granular para terraplen.
Se continua el armado del acero para una Viga, longitud de 30m.

Residente Interventoria.

Sabado, septiembre 02 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia en horas de la mañana.
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Equipo oxicorte, motobomba, Herramientas
Menores (palustre, pulidora, Martillo, etc) Mezcladora.
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp.
Interventoria, SISO, Maestro, Oficiales, obreros operadores, Conductores, Almacenista
Actividades en obra.
Se presenta una lluvia que afecto la programacion de las actividades

Se termina de fundir la plantilla para el soporte de la tercera viga postensada.
Avance en el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, para las vigas postensadas.

Residente de obra

"Domingo, Septiembre 03 de 2023."
No se ejecutaron actividades por ser el día de descanso obligatorio.

Lunes, Septiembre 04 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Motobomba, Equipo oxicorte, volqueta, planta eléctrica, Mezcladora, Herramientas Menores (Martillos, Pulidora, Pachinquis)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría) Siso, Maestro, oficiales, Obreros, Operadores, Conductores, almacenista.
Actividades de obra.
Avance en la conformación, Suministro de material granular para terraplen.
Se continúa avanzando en el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, Según diseño, para las vigas postensadas.

Residente de obra

Martes, Septiembre 05 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Pajarita, Volquetas, Mezcladora, Equipo oxicorte, planta eléctrica, Vibro, Herramientas Menores (Pulidora, Pachinquis, Martillos, etc)
Personal en obra:
Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Siso, Maestro, oficiales, obreros, Conductores, almacenista, Operadores.
Actividades de obra

se continúa con el suministro de material granular para terraplén.
Avance en el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, para las vigas postensadas, según diseño.

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles Septiembre 06 de 2023
Estado Tiempo: PARCIALMENTE NUBLADO
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp Interventoría, Siso, Maestro, Oficiales, obreros, operadores, conductores, almacenista
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Mezcladora, volquetas, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (pulidora, Bichiroquis, martillos, etc)
Actividades en obra
se continúa avanzando en el suministro de material granular, para terraplén.
Se adelanta el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, según diseño, para las vigas postensadas.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, Septiembre 07 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia moderada en la madrugada
Equipos en obra: pajarita, Vibro, Canguro, Rana, Equipos de topografía, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (Pulidora, Bichiroquis, barras, etc)
Personal en obra: Rep Legal Consorcio P.C, Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Topógrafo, Maestro, Oficiales, obreros, Siso, Operadores, Almacenista
Actividades en obra.
Se avanza en el armado de la tercera viga postensadas, según diseño.
Conformación y compactación mecánica del terraplén, para la plataforma de las gruas, al momento del izaje
Continúa el corte figurado del acero de refuerzo, según diseño.
Se realiza un control planimetrico y Altimetrico, en los estribos del puente.

vigas postensadas.
No se ejecutan actividades en la compactación del material granular, debido a que se encuentra saturado por motivos de la lluvia.

Residente de obra.

Domingo, Septiembre 10 de 2023
"No se realizan actividades debido a que es el día de descanso obligatorio"

Lunes, Septiembre 11 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Pasarita, Vibro, Rana, Herramientas Menores (barras, pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp. Interventoria, Siso, Maestro, oficiales, obreros, operadores.
Actividades de obra.
Se avanza el relleno con material granular, en el estribo NO2.
Compactación mecánica del material granular en el terraplén.
Se continua con la instalación de los ductos para el cableado de las vigas postensadas.

Residente de obra

Martes, Septiembre 12 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Pasarita, Vibro, Rana, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (Pichirogüa, pulidora, barras, etc).
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Siso, Maestros, oficiales, obreros, operadores, Almacenista.
Actividades en obra.
se termina la compactación mecanica en el terraplén, para la ubicación de la grua.
continúa el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, en las tres (3) vigas postensadas.

Avance en la instalación de los ductos en la segunda Viga postensada.
Acarreo interno del material granular para terraplén.

Residente de Obra

Miercoles, Septiembre 13 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Rana, Equipo oxicorte, Volquetas, planta eléctrica
Herramientas Menores (Pichingueis, Martillos, polidora, etc), y
personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, SISO, Inspector Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, conductores, operadores, Almacenista.
Actividades en obra.
Instalación de ductos para el cableado de las Vigas postensadas. Incluye accesorios.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, según diseño, para las Vigas postensadas.
Se inicia a se continúa con la instalación de formaletas metálicas, en el estribo N°2, a nivel de Intrados= 7.94m.
Suministro de material granular para terraplén.

Residente de Obra

Jueves, Septiembre 14 de 2023.
Estado Tiempo. Se presenta una lluvia de 1/2 hora, Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Volquetas, Herramientas Menores (Pichingueis, polidora, barra, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, SISO, Maestros, oficiales, Obreros, operadores, Conductores, Almacenista.
Actividades en obra.
Se continúa con la instalación de ductos para el cableado, de las vigas postensadas.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero

de refuerzo, para las vigas postensadas.
Suministro de material granular para terraplén.
Avance en la instalación de formaleta metalica, para el estribo
Nº2. localizado en la margen izquierda quebrada Severinari

Residente de obra

Viernes, Septiembre 15 de 2023
Estado tiempo: Se presenta una lluvia por la noche
Equipos en obra: Pajarita, volqueta, vibro, Equipo oxicorte, planta eléctrica
Herramientas Menores (pulidora, Pichirogüis, Martillo).
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector
Interventoría, SISO, Almacenista, Maestros, oficiales, obreros, Conductor, Operadores.
Actividades en obra.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación de ductos, para el cableado eléctrico.
Se continúa con la instalación de ductos para el cableado de los vigas postensadas.
Conformación y extendido de material granular para terraplén.
Suministro de material granular de terraplén.

Residente de obra

Sabado, Septiembre 16 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Pajarita, vibro, Volqueta, Equipo oxicorte, planta eléctrica,
Herramientas Menores (barras, Pulidora, Pichirogüis, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector
Interventoría, SISO, Almacenista, Maestros, oficiales, obreros, operadores
Actividades en obra
Se continúa con la instalación de ductos para el cableado, de las
vigas postensadas.

Se avanza en el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para las vigas postensadas.

Residente de obra

Domingo, Septiembre 17 de 2023.
"No se realizan actividades por ser el día de descanso dominical obligatorio."

Lunes, Septiembre 18 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: pegurita, vibro, Equipo oxicorte, planta eléctrica, Volqueta sencilla, Herramientas Menores (polidora, Pichiroquis, martillo, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Siso, Maestros, obreros tec. electos, oficiales, Almacenista,
Actividades en obra.
Se inicia la instalación del cableado, por los ductos. Incluye corte del cable.
Continúa el corte, figurado armado e instalación del acero de refuerzo, para las Vigas postensadas.

Residente de obra

Martes, Septiembre 19 de 2023.
Estado Tiempo. Muy soleado.
Equipos en obra, pegurita, Volqueta, Equipo oxicorte, Tablestacas, Vibro, Herramientas Menores (Pichiroquis, barras, polidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Rep. legal C.P.C, Siso, Tec. electos, Maestros oficiales, obreros, Almacenista
Actividades en obra
Se continúa con el corte e instalación del cableado, por los ductos de las Vigas postensadas
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero

de refuerzo, para las vigas postensadas.

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles, Septiembre 20 de 2023.
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: pajarita, vibro, Mezcladora, Rana, Herramientas Menores (pulidora, Bichiroques, Martillos, etc)
Personal en obra: Director Interventoría, Residente de obra, Residente Interventoría, Profesional Ambiental Int, Inspector Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, Almacenista, SISO, operador.
Actividades en obra.
Se termina el cableado en las tres (3) vigas postensadas del puente.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero, de refuerzo, para las tres(3), vigas postensadas.
Excavación, mecanica en el estribo N°3, localizado en la margen derecha de la quebrada.
Se realiza el comité de obra en el campamento de la obra, entre Interventoría y Contratista, donde se verifico avance de obra, Compromisos y temas varios.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, Septiembre 21 de 2023.
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: pajarita, Rana, vibro, Mezcladora, Herramientas menores (cortadoras, Bichiroques, pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, SISO, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista, Operador. Rep legal Consorcio, laboratorista de suelos.
Actividades de obra.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero

de refuerzo, Según diseño, para las vigas postensadas
Conformación, compactación del material granular, postterraplén en los accesos del puente. estribo nº3. localizado Margen izquierda de la quebrada.
Se toman muestras del material de terraplé, por parte de la interventoría, para el control de calidad del mismo.
Se realizan las densidades de campo, en las capas del material granular.

Residente de obra.

Residente Interventoría.

Viernes, Septiembre 22 de 2023.
Estado Tiempo: Nublado
Equipos en obra: Retroexcavadora, Rana, Vibro, Herramientas Menores (Pulidora, Cortadora) planta eléctrica, motobomba.
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, operador.
Actividades en obra.
Avance en el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para las tres vigas postensadas
Avance en la conformación de terraplén en los estribos nº3 y nº4 y accesos del puente
Compactación mecánica para material de terraplén.

Residente de obra.

Residente Interventoría.

Sabado, Septiembre 23 de 2023.
Estado Tiempo, Nublado
Se realiza limpieza y lavado de maquinarias en la obra

Residente de obra

Residente Interventoría.

Domingo, Septiembre 24 de 2023
"NO se ejecutan actividades en obra, por ser el día de descanso dominical obligado.

Lunes, Septiembre 25 de 2023
Estado Tiempo: Lluvia desde la noche anterior hasta las 8:00 AM
El contratista manifiesta que no se ejecutaron actividades en obra, por el aumento del nivel de la quebrada, ocasionado por la fuerte lluvia, dificultando el paso del personal operativo de la obra.

Residente de obra

Residente Interventoría

Martes, Septiembre 26 de 2023
Estado tiempo: 6 horas de lluvias moderadas
Equipos en obra: pajarita, vibro, Rana, Mezcladora, planta eléctrica, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (pulidora, Pichiruguis, burros, etc)
Actividades en obra.
Corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para los pasantes y izajes de las vigas postensadas
Llega a la obra las formaletas metálicas para las vigas postensadas
Se presenta dificultad con el paso del personal operativo por la quebrada, debido al aumento del nivel de la quebrada, por motivos de lluvias.

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles, Septiembre 27 de 2023.
Estado Tiempo: El nivel de la quebrada se encuentra alto, por motivos de lluvia. El personal, llueve en horas de la noche
Equipos en obra: pajarita, vibro, Rana, Mezcladora, planta eléctrica, Equipos oxicorte, Herramientas Menores (pulidora, Pichiruguis, Caretas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector, Interventoría, Siso, Maestros, Oficiales, Obreros, Almacenista,

LCC

Operador,
Actividades en obra
Corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para pasante de viga, para llevar a cabo el izaje de la misma.
Aplicación de soldadura en el acero de refuerzo en los pasantes.
Se inicia a instalar la formaleta metalica, para la viga postensada.
El nivel de la quebrada se encuentra alto, por motivos de lluvias.
Aunque, el personal de la obra, pudo pasar, para realizar las actividades programadas.

Residente de obra

Jueves, Septiembre 28 de 2023
Estado Tiempo: seco. nublado.
Equipos en obra: pajarita, Rana, Vibro, planta eléctrica, Herramientas Menores (Polidoras, Carretas, Pichirogos,) equipo de soldadura
Personal en obra: Rep. legal Consorcio Puentes de Caldas, Residente de obra, Residente de Interventoria, SISO, Latanero, Maestros, Oficiales, obreros, Insp. Interventoria, operador, Almacenista.
Actividades en obra.
Avance en la instalación y Construcción de formaleta metalica, para las vigas postensadas, según diseño.
Corte, figurado, armado e instalación de acero de refuerzo, Aplicación de soldadura en pasantes, para las vigas postensadas

Residente de obra

Viernes Septiembre 29 de 2023
Estado Tiempo: llovizna de 1hora, la noche anterior.
Equipos en obra: Pajarita, Rana, vibro, planta electrica, Herramientas Menores (polidoras, Carretas, Pichirogos, etc) Equipo de soldadura.
Personal en obra: Director de Interventoria, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, SISO, Almacenista,

Operador, latonero, Maestro, obreros,
Actividades en obra.
se continua con la construcción de formaleta metalica, e instalación de la misma, para las vigas postensadas
Corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, para los pasantes, de la viga, con el fin de llevar a cabo el izaje de la misma.
Aplicación de soldadura en el acero de refuerzo, de los pasantes. Se realiza cumbre de obra, en el sitio de obra

Residente de obra

Residente Interventoría.

Sabado, Septiembre 30 de 2023
Estado Tiempo: Seco.
Equipos en obra: Pescante, Equipo oxicorte, Equipo soldadura, varu, Herramientas Menores (Pulidora, Pichiruguis, Cuerdas, EPC)
Personal en obra: Residente de Interventoria, Director Interventoria, Insp. Interventoria, Latonero, Maestro, obreros ayudas, Almacenista, Siso,
Actividades de obra.
Se continua con la instalación y construcción de formaleta metalica para las vigas postensadas
Corte, figurado, armado e instación del acero de refuerzo, para los pasantes de las vigas postensadas. Incluye Aplicación de soldadura

Residente de obra

Residente Interventoría.

Avance en la instalación de Alineadores metalicos, corbatas, en el estribo nº2.

Residente interventoría.

Viernes, Junio 30 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Retro, Pajarito, Volqueta sencilla, Vibro, Andamios, formaletas Metálicas, Herramientas menores (polidora, cortadora, Martillos, etc).
Personal en obra: Residente de obra, Recidente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Siso, Oficiales, obreros, Almacenista, Operadores, T. social.
Actividades en obra.
Se continúa avanzando en la instalación de los alineadores, Corbatas, en el estribo nº2
Avance en el corte, figurado, del acero de refuerzo, para las ménsulas, espaldar de los estribos
Se realiza la capacitación al personal de la obra

Residente interventoría.

Residente de obra

Sabado, Julio 01 de 2023
Estado Tiempo: nublado.
Equipos en obra: Formaletas Metálicas, Andamios, Cerchas, Alineadores, Herramientas Menores (martillos, polidoras), Pajarito,
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, siso, Maestro, Almacenista, obreros, operadores.
Actividades en obra.
Avance en la instalación de formaleta Metalica, Alineadores, Cerchas, Corbatas, en las Aletas y Muro, del estribo nº2, localizado en la margen izquierda, Quebrada Severinera.
Adecuación de la rampa acceso al estribo nº2.

se terminan las actividades en completa normalidad a las 12:00 P.M.

Residente de Obra.

Residente de interventoría

"Domingo, Julio 02 de 2023". NO se ejecutaron actividades en obra, por ser el día de descanso obligatorio".

Lunes, Julio 03 de 2023
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: Andamios, Pegaritas, Cerchas, Formaletas metálicas, gatos, Herramientas Menores (barras, martillos, puliduras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro (2), oficiales, obreros, Operadores, Conductor.
Actividades en obra
Avance en la instalación de formaletas metálicas, Carteles, Cerchas, Alineadores, en el estribo N02, localizado en la margen Izquierda, Quebrada Severinera.

Residente de obra

Residente interventoría

Martes Julio 04 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Andamios, Cerchas, formaletas, gatos, Herramientas Menores (barras, Martillos, puliduras etc)
personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, Obreros, Sisa, Almacenista, operadores.
Actividades en obra.
Se continúa con la instalación de formaletas metálicas, gatos, Cerchas, en el Muro y Aletas en el estribo N02
Se realizan las charlas diarias al personal obrero de la obra

se terminan las actividades en completa normalidad a las 5:00 p.m.

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles, Julio 05 de 2023
Estado Tiempo: nublado
Equipos en obra: Andamios, Cerchas, formaletas metálicas, gatos pegasita, Autohormigueras, Herramientas Menores (Taladro, Martillos, etc).
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de Interventoría, Maestro, obreros, SISO, Almacenista, operadores
Actividades en obra.
Avance en la instalación de formaleta metalica, Incluye Alineados, Cerchas, Carbantas, Alineados, en el estribo N02. a una altura de h=2.40m.

Residente de obra.

Residente Interventoría

Jueves, Julio 06 de 2023
Estado Tiempo: nublado soleado
Equipos en obra: Andamios, PEGASITA, Autohormigueras, formaletas Metálicas, gatos, cerchas, Herramientas Menores (Martillos, Taladros, bural)
Personal en obra. Residente de obra, Residente interventoría, Inspector Interventoría, Maestros, Oficiales, obreros, Almacenista, conductor, operadores
Actividades en obra.
Se termina de ajustar el encofrado en el estribo N02.
Se realiza la logistica para la fundición del estribo N02 para el dia de mañana.

Residente de obra

Residente Interventoría.

Viernes, Julio 07 de 2023
Estado tiempo: Muy soleada
Equipos en obra: Autohormiguera, Pajarito, Volqueta, Vibrador eléctrico, Herramientas Menores (carretas, tubos, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, Operadores, Almacenista.
Actividades en obra.
Se funde el estribo nº2, en concreto de 4000psi a una altura de h=2,40m.
Se toman muestras de concretos, para el control de calidad del mismo.
Se terminan las actividades de fundición a las 4:30p.m, en completa normalidad.

Residente de obra

Sabado, Julio 08 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, maestro, obreros, Operadores, Almacenista.
Equipos en obra: Herramientas Menores (palas, carretas, picos, el
Actividades en obra
se le aplica el antisol al muro s aletas, del estribo nº2
Se sumergen los cilindros de concretos
se deja quieto el estribo nº2, hasta que se termine el curado del mismo.

Residente de obra

"Domingo Julio 09 de 2023"
No se desarrollaron actividades por ser el dia de descanso obligatorio

Lunes, Julio 10 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajaritas Volqueta, Herramientas Menores (palas, barras, martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista, operadores.
Actividades en obra.
Se arregla o se instalan dos (2) alcantarilla, en la vía de acceso a la obra.
Se retiran dos tubos y Andamios, utilizados en la fundida del estribo N02
Se espera que llegue el resto de la formaleta, para armar el estribo N03.

Residente de obra

Residente Interventoría

Martes, Julio 11 de 2023
Estado Tiempo: soleado, se presenta una lluvia por la noche: 8:00-10:00
Equipos en obra: Pajarita, Volqueta, Autohormigurera, Herramientas menores (Taladro, martillos, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista, Sisa, operadores.
Llega a la obra la formaleta metalica, para armar el estribo N03
Se empieza a retirar la formaleta del estribo N02.

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles, Julio 12 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado. el nivel de la quebrada aumentó debido a la fuerte lluvia.
Equipos en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp.

Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, operadores, almacenista, Siso.
Actividads en obra.
Se inicia armar la formaleta metalica, para el más tago del estribo NO1
Se empieza el relleno o se realiza la plataforma, parc la ubicación de la autohormiguera, al momento de Fundir.
Se tiene difultad con el acarreo interno de la obra, debido a que el nivél de la Quebrada Severinera, se encuentra alto, por motivos de lluvias.
Transporte de meteriel para la plataforma, en el estribo NO1. Inclage extendido del mismo.

Residente de obra

Jueves, Julio 13 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Volqueta, Autohormiguera, Herramientas Menores(Martillos, Taladro, barras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, Siso, Almacenista, Operadores.
Actividades en obra.
Se continúa con el retiro de la formaleta metalica, Carchos, en el estribo NO2
Se continúa con el armado de la formaleta metalica, en el muro y Aletas, del estribo NO1

Residente de obra

Viernes, Julio 14 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Volqueta, Autohormiguera, Herramientas Menores(Taladro, Martillos, barras, etc)

personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, siso, Almacenista, Operadores, conductor.
Actividades en obra.
Avance en el retiro de alineadores, cerchas, gatos, formaleta, en el estribo N°2, Margen izquierda, quebrada Severinera se continúa con el armado de la formaleta metálica, en el estribo N°2, Localizado en la margen derecha de la quebrada Severinera.

Residente de obra

Residente Interventoría

Sabado, Julio 15 de 2023.
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Perforito, volqueta, Autohormigurera, Herramientas Menores (Taladro, Martillos, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, siso, almacenista, operadores, conductor.
Actividades en obra.
Avance en el desmonte de formaleta metálica, en el estribo N°2.
Se continúa con la montura de formaleta metalica en el Vástago y Aletas, en el estribo N°2.

Residente de obra

Residente Interventoría

"Domingo, Julio 16 de 2023"
No se ejecutaron actividades en obra por ser el día de descanso dominical obligatorio, segun el codigo de trabajo Colombiano.

Res. de obra

Residente Interventoría

JU

Lunes, Julio 17 de 2023
Estado Tiempo: Nublado; Se presenta una lluvia de noche anterior.
Equipos en obra: Pajarita, Autohormiguera, Volqueta, Herramienta Menores (Taladro, martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, Oficiales, Obreros, Conductor, Siso, Almacenista
Actividades en obra
Se continúa con la montura de la formaleta metálica en el estribo N°1. Incluye Cerchas, Alineadores, estructura en madera para soporte del tubo.

Residente de obra

Martes, Julio 18 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una intensa lluvia la noche anterior, que aumentó el nivel de la Quebrada
Equipos en obra: Pajarita, Autohormiguera, Volqueta, Herramientas Menores (Taladro, martillos, barras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, Siso, Almacenista, Operador, Conductor.
Actividades en obra.
Se mide conjuntamente entre los residentes de interventoría y obra, la distancia de acarreo, desde la cantera chicoral. Montaña. hasta el sitio de obra. distancia Aprox. 90km, para el material de terraplen.
Avance en el armado de la formaleta metálica, para el estribo N°1. Incluye Cerchas, alineadores, cabezales, gatos, estructura de soporte en listones de 2"x2".
Se realiza toda la logística, para proceder la fundición del estribo N°1, para el día de mañana.

Residente de obra.

Miercoles, Julio 19 de 2023
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: Autohormiguera, Pajarita, volqueta, planta Eléctrica, Motobombas, Vibro eléctrico, Herramientas menores (palas, tubos barras, etc).
personal en obra: Rep legal Consorcio, Residente de Obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestros, Oficiales, Obreros, Siso, Almacenista, operadores, Conductor.
Actividades en obra.
Se termina de Adecuar la plataforma, para la ubicación de la autohormiguera.
Se funde el Vastago y Aletas, en concreto de 4.000PSI, en el estribo NO1
Se toman muestras del concreto fundido in situ, para el control de calidad del mismo
Se Fundan 22m3 de Concreto de 4000PSI.
Se terminan las actividades a las 5:20 pm, en completa normalidad

Residente de Obra

Residente Interventoria

Festivo, Jueves 20 de Julio de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, operadores, conductor Siso, Almacenista.
Equipos en obra: Herramientas Menores (barras, Martillos, Palidoros)
Actividades en obra.
Se aplica el antisol al concreto fundido en el estribo NO1
Se retoma el desmonte de los formaletas en el estribo NO2
Se sumerge los cilindros de concretos tomados in situ.

Res. de obra

Residente Interventoria

OC

Viernes, Julio 21 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: pegarita, volqueta, Autohormigurera, Herramientas Menores (Taladro, Martillos, barras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp Interventoria, SSO, maestro, oficiales, obreros, Almacenista, Conductor
Actividades en obra.
Se continua avanzando en el desmonte de formaleta y aplicación del Antisol, en el estribo N°2.
Se hace la logistica para el permiso del suministro del material granular, para el terraplén.

Residente de obra

Sabado, Julio 22 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: pegarita, volqueta, vibro, Autohormigueras, Herramientas Menores (Taladro, martillos, etc)
personal en obra: Almacenistas Operadores, Conductor, Residente de Obra.
Se inicia con el arreglo principalmente en el acceso a la via, dado a que esa fue la condicion, para el suministro de material de terraplén.
No se ejecutan actividades en obra, debido a que la jornada laboral del dia Sabado, se adelanto para el dia 29 Julio de 2023, el cual fué un dia festivo.

Residente de obra

Domingo, Julio 23 de 2023:
" NO se realizaron actividades en obra, por ser el dia de descanso laboral obligatorio."

Lunes Julio 2d de 2023.
Estado Tiempo: soleado.
Equipos en obra: pajarita, Autohormigonera, Volqueta, Herramientas Menores (Martillo, taladro, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficiales, obreros, sisa, Almacenista, Operadores, Conductores.
Actividades en obra.
Se desmonta la formaleta en el estribo N°3. Incluye cerchas, gatos, Alineadores, etc.
Se Aplica antisol al vértego y Aletas, en el estribo N°3. Localizado en la margen derecha de la quebrada Severinera

Residente de Obra

Residente de interventoria

Martes Agosto 01 de 2023.
Estado Tiempo: Muy soleada llovio la noche anterior
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Autohormigueta, planta eléctrica,
Herramientas Menores (Polidora, taladro, martillos, etc)
Personal en obra: Rep legal Consorcio, Residente de obra, Residente
interventoría, Insp Interventoría, SISO, Almacenista, obreros, Operadores,
Actividades en obra.
Suministro, transporte y extendido del material granular, para
el acceso en el estribo N°2, Margen derecha Quebrada sevenera.
llego un maestro, obreros, para el avance de las actividades, en
los estribos del puente con el fin de acelerar, la fundida en los
mismos.
Se presenta una lluvia la noche anterior.
Se continúa avanzando en la instalación de formaleta metalica,
en el estribo N°2
Se instala el acero de refuerzo del espaldar, según diseño en el
estribo N°2,
Suministro y transporte de material granular, para el acceso del puente, en
en el estribo N°2.
Se realizan las escalas peatonales, para el paso del Personal de la
obra. Se va el fluido eléctrica, todo el día en la obra.

Residente de obra.

Residente Interv.

Miercoles, Agosto 02 de 2023
Estado Tiempo; soleado, se presenta una lluvia la noche anterior,
lluvia desde 9:00PM - 10:00PM
Equipos en obra: pajarita, Volquetas Doble 1, Sencilla 1, planta
Eléctrica, Autohormigueta, Vibro, Herramientas Menores (Taladro, Martillos,
polidoras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp.
Interventoria, SISO, Almacenista, Maestro, oficiales, obreros, operadores conductores,
Actividades en obra.
Se inicia el descapote, relleno de material, en el predio contigua a
la obra, con el fin de iniciar la construcción de las vigas. se pinta

con 169m², del terreno de la finca, que se requieren para el fraguado de las vigas del puente.
Se continúa avanzando en la instalación del acero de refuerzo, para el espaldar en el estribo N°2
Se inicia la instalación de formaleta metalica en el estribo N°1.
NO hay fluido eléctrico en la zona objeto del proyecto, lo cual dificulta el trabajo de soldadura fijación de formaleta, El contratista adelanta los trabajos que requieren para la ejecución de la obra, con una planta eléctrica.
retiro del material producto del descapote del terreno

Residente de obra.

Jueves, Agosto 03 de 2023.
Estado tiempo Se presenta una intensa lluvia la madrugada de hoy desde las 2:30A.M - 8:00A.M, Que aumento el nivel de la Quebrada
Equipos en obra: Volquetas, Payasita, Vibro, Autohormigurera, planta Eléctrica, Herramientas Menores (martillos, Taladro, Pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoria, Maestros(2) topografo, Sisa, oficiales, obreros, Almacenista, operadores, Conductores.
Actividades de obra.
Se continúa con la instalación de formaleta metalicas en los estribos N°1 y N°2.
Se verifica y se realiza un control topográfico, en el estribo N°1
Se presenta inconvenientes con el suministro del material granular por el mal estado de la vía, ocasionada por la fuerte lluvia en la madrugada de hoy. Aumentando el nivel de la quebrada Severinera.

Residente de obra

Viernes, Agosto 04 de 2023.
Estado Tiempo: soleado.
Equipos: Pajarita, Autohormiguera, planta electrica, formaletas metalicas, Herramientas Menores (Gafas, Andamios, Martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Siso, Maestro, Insp. Interventoria, oficiales, Obreros, Operadores, Almacenista.
Actividades en obra.
Se continúa con la instalación de formaletas metálicas, en los estribos N°1 y N°2, respectivamente. Incluye alineadores, cortecho, Cerchas.
Se realizan pausas activas en la jornada laboral.
Instalación del acero de refuerzo en las ménsulas, vastago en los estribos.

Residente de obra

Sabado, Agosto 05 de 2023
Estado Tiempo: Nublado
Equipos en obra: PAJARITA, Autohormiguera, Planta Eléctricas, formaletas metálicas, Herramientas Menores (Cerchas, Andamios, martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Siso, Maestro, obreros, operadores, Almacenista.
Actividades en obra
Se continúa aventando en la instalación de formaletas metalicas en el vastago, Aletas, espaldar, en los estribos N°1 y N°2, respectivamente. Suministro de material granular.

Residente de obra

Domingo, Agosto 06 de 2023.
"No se ejecutaron actividades por ser el dia de descanso dominical obligatorio"

Lunes, Agosto 07 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Equipo oxicorte, Autohormigurera, planta Electrica,
Herramientas Menores (Martillos, barras, cerchas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp
Interventoria, Siso, Maestro, Obreros, oficiales, operadores, conductores
Actividades en obra.
Se continua avanzando en la instalación de acero para estribos
Corte, figurado, armado de acero de refuerzo, para Vástagos, aletas, en
los estribos N°1 y N°2, respectivamente.
Avance en la instalación de formaletas metalicas, para vástago,
aletas, Inicio de espaldar.

Residente de obra

Martes, Agosto 08 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: pajarita, Equipo oxicorte, Autohormigurera, planta electricas,
Motobombas, Herramientas Menores (barras Andamios, gatos, etc)
Personal en obra. Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector
Interventoria, Siso, Almacenista, Maestro, oficiales, Obreros, Operadores
Actividades en obra
Se continúa avanzando en la instalación de formaletas metalicas,
en Vastagos, aletas, en los estribos N°1 y N°2.
Avance el corte, figurado, armado e instalación del acero de
refuerzo, en vastago, aletas, inicio espaldar, topes sismicos, Meseta
nivelación
Suministro de material granular para terraplén
Construcción de formaleta metalica, lamina Super T, en

Residente de obra

Miercoles, Agosto 09 de 2023
Estado Tiempo: se presenta lluvia la mayor parte

Equipos en obra: Pegantes, Autohormiguera, planta eléctrica, Motobomba, Cortadora, Andamios, Herramientas Menores (Martillos, Pulidoras, Polidoras) equipo oxicorte

personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de Interventoría, SISO, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista, Operadores, conductores

Actividades en obra.

Instalación de acero de refuerzo, Instalación de formaleta en Super T en Vástago, en el estribo N°2

Extendido, conformación del material granular para terraplén

Corte, figurado, armado e instalación de acero refuerzo, según diseño, en los estribos N°1 y N°2.

Residente de obra.

Jueves, Agosto 10 de 2023

Estado Tiempo: Muy soleado

Equipos en obra: Volquetas, Autohormiguera, planta eléctrica, equipo oxicorte, Herramientas Menores (Martillos, pulidoras, barras, etc).

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, SISO, Maestro, oficiales, obreros, Almacenista, Conductores, Operador.

Actividades en obra

Adecuación de plataforma con material granular, para la ubicación de la Autohormiguera al momento de fundir.

Suministro y transporte de material granular para terraplén.

Se continúa con el corte, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo, según diseño, para los elementos de los estribos; que son: Vástago, Aletas, topes sísmicos, Meseta nivelación inicio espaldar, a una Altura de h: 4,45m, en los estribos N°1 y N°2.

Avance en la instalación de formaletas, metálicas, en madera y Super T, en los estribos N°1 y N°2.

Residente de obra

se toman muestras de cilindros del concreto, fundido in situ
se continúa avanzando en la instalación de formaletas, acero
de refuerzo, en el estribo nor.
Se termina la fundida del estribo nor, en completa normalidad.

Residente de obra

Domingo, Agosto 13 de 2023.
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Autohormiguera, pagaritas, motobombas, planta eléctrica,
Herramientas Menores (martillos, andamios, pulidora, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector
Interventoría, Topógrafo, Maestros, oficiales, obreros, operadores, conductores, SISO,
Almacenista.
Actividades de obra.
Se funde el estribo nor, Incluye vastago, Aletas, inicio espaldar, a cargo
de Abocpas. Localizado en la margen derecha de la quebrada Serevinera
Se toman muestras de concreto, para el control de calidad del mismo,
de conformidad al diseño de mezcla.
La fundición del estribo se realizó a una altura h= 4,45m.
Se le aplica antisol al estribo nor. localizado en la margen
izquierda de la quebrada Serevinera
Se termina de fundir el estribo nor, en completa normalidad,
a las 4:00 p.m
Se retira la Autohormiguera del sitio de obra.

Residente de obra

Lunes, Agosto 14 de 2023.
No se ejecutaron actividades actividades en obra, por ser el día
compensado, debido a que se trabajó el día anterior (domingo) Dado
a que se realizó la actividad de fundida.

Martes, Agosto 15 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una intensa lluvia, en la madrugada, la cual ocasionó el aumento del nivel de la Quebrada.
Equipos en obra: pegarita, Vibro, Herramientas Menores (carretas, barras, Polidora, etc).
personal en obra: Rep. legal C.P.C, Directó Interventoría, Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, operador, Siso, Almacenista.
No se ejecutaron actividades en obra por motivos de la fuerte lluvia la cual aumentó el nivel de la quebrada Severinera, debido a que no permitio el traslado del personal Igualmente la vía de acceso a la obra se encuentra en mal estado por el aumento de las lluvias

Residente de obra

Miercoles, Agosto 16 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Volquetas doble, sencilla, Pegarita, planta electrica, Herramienta Menores (palas, barras, martillos, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente interventoría, Inspector Interventoría, Operadores, siso, Conductores
Actividad en obra
Suministro y transporte de material para terraplen.
Extendido de material granular en los accesos de los estribos N°3 y N°2

Residente de obra

Jueves, Agosto 17 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: pegarita, volqueta doble y sencilla, vibro, planta eléctrica, Equipo oxicorte, Herramientas Menores (barras, polidoras, martillos, etc)

personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficiales, obreros, operadores, Conductores, Siso, Almacenista,
Actividades en obra
Se inicia a descofrar las formaletas metalicas en el estribo Nor Margen Izquierda Quebra Salvajina Estribo Nº3 Margen Derecha.
Se continúa con el suministro de material granular para conformación de terraplén. Incluye compactación del mismo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes, Agosto 18 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: pajarita, vibro, planta eléctrica, Herramientas Menores (barras, pulidoras, etc)
personal en obra: Residente de Interventoría, Residente de obra, Siso, Inspector Interventoria, Maestro, Siso, Almacenista, Maestro, oficiales, obreros, operadores.
Actividades en obra
Se continúa avanzando en el retiro de las formaletas en los estribos Nº2 y Nº3 Incluye gatos, Cerchas Alineadores.
Acarreo Interno de formaletas Metalicas, Cerchas, Alineadores
Aplicación de Antisol en los elementos de los estribos

Residente de obra

Residente de Interventoría

Sabado, Agosto 19 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia de 2horas
Equipos en obra: pajarita, Volqueta, Vibro, Herramientas Menores (barras, pulidora, Martillos etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp Interventoría, Siso, Almacenista, Maestro, obreros, oficiales
Actividades en obra:
Retiro de Material filtrante de la obra

106

Se continúa con el desencofrado de formaletas, en los estribos NO1 y NO2, respectivamente.
Conformación de material de terraplén.
Se realiza limpieza y aseo en la obra

Residente de obra

"Domingo, Agosto 20 de 2023"
No se ejecutaron actividades por ser el día de descanso obligato

Lunes, Agosto 21 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
No se trabajó por ser día festivo

Martes, Agosto 22 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una lluvia desde las 5:00 a 6:00 pm
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, planta eléctrica, Andamios, Herramientas Menores (Martillos, barras, pulidoras, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, SISO, Inspector Interventoría, Maestro, Oficiales, obreros, operadores, Conductor, Almacenista.
Actividades en obra.
Suministro, conformación del material granular para terraplén.
Corte, figurado, armado, e instalación del acero, en el espaldar, Vigas.
Se avanza en el desencofrado de formaleta en los estribos NO1 y NO2 se termina el desencofrado en los estribos.
Se suspenden las actividades por motivos de lluvias.

Residente de Obra

Miercoles, Agosto 23 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, planta eléctrica, Vibrador eléctrico, Andamios, Herramientas Menores (pulidoras, barras, cunetas, martillos, etc)

Personal en Obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría SISO, Almacenista, Maestro, oficiales soldador, obreros, conductores, operadores.
Actividades en obra:
Avance en el corte, figurado, armado del acero del espaldar de los estribos.
Corte, figurado del acero para las vigas postensadas, según diseño.
Instalación del acero de refuerzo en el estribo N°2, según diseño
Se entrega E.P.P. al personal de la obra
Jornada de limpieza y aseo en la obra

Residente de obra

Jueves, Agosto 24 de 2023
Estado Tiempo soleado → se presenta lluvia a horas de la noche (3 horas).
Equipos en obra. Equipo soldador, Equipo oxicorte, Pajarita, Vibro, planta eléctrica, Motobombas, Herramientas Menores (barras, Polidoras, Martillos)
Personal en obra Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, SISO, Almacenista, Maestro, oficiales, obreros, operadores.
Actividades en obra
Se adelanta el corte, figurado del acero de refuerzo, para las Vigas postensadas
Se avanza en la instalación del acero de refuerzo, según diseño en el espaldar de los dos estribos N°1 y N°2
Se realizan las pausas activas al personal de la obra.
Se realiza la adecuación del Cerramiento perimetral de la obra

Residente de obra

Viernes Agosto 25 de 2023
Estado Tiempo Lluvia en la madrugada toda (3 horas)
Equipos en obra Pajarita, Vibro, planta eléctrica, Andamios, Motobombas, Herramientas Menores (bonas, polidoras, Martillos etc), Equipo oxicorte.

Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventorra, Sigo, Almacenista, Maestro, Obreros, Oficiales y operadores.
Actividades en obra.
Se presenta un aumento en el nivel de la quebrada, dificultad el paso del personal. Ocasionado por la Intensa lluvia.
Para el día de hoy se tiene programado, iniciar la plataforma para la plantilla de las Vigas postensadas. Esta actividad no fue posible en la mañana, dado a que el material granular se encuentra saturado, por la lluvia.
Avance en el corte, figurado del acero de refuerzo para las Vigas postensadas
Instalación del acero de refuerzo en el espaldar, del estribo N°1. Ubicado en la Margen derecha de la Quebrada.
Se inicia en la jornada de la tarde la adecuación del terreno, para el soporte de las Vigas. Dado a que su construcción sera tipo prefabricada

Residente de obra

Sabado, Agosto 26 de 2023.
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, Equipo oxicorte, Andamios, Herramient. Menores (Martillos, Pulidoras, barras, etc), planta eléctrica.
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestros, Sso, oficiales, obreros, operadores.
Actividades en obra.
Se realiza la extendida, conformación, Compactación mecanica (Vibro), para la plataforma que requieren las vigas para su construcción, en un área de 152M2.
Nivelación de terreno para la plataforma de las vigas.
Se termina de instalar el acero de refuerzo en el espaldar de los estribos.
Continúa el corte, figurado del acero de refuerzo, para las vigas.
Se termina la actividad de compactación a las 5:00PM

Residente Interventoría

Domingo, Agosto 27 de 2023.
No se desarrollaron actividades por ser el día de descanso dominical obligatorio.

Lunes, Agosto 28 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Pajarita, Vibro, planta eléctrica, Equipo oxicorte
Herramientas Menores (palas, palín, martillos, nivel etc).
Personal en obra: Residente de obra, Residente interventoría, Siso, Almacenista, Maestro, Insp interventoría, obreros, oficiales, operadores
Actividades en obra
Localización, trazado y nivelación, para la plantilla en concreto, para el soporte de viga.
Continúa el corte, figurado del acero de refuerzo, para las vigas postensadas

Residente de Obra.

Martes, Agosto 29 de 2023
Estado Tiempo: soleado. se presenta una lluvia a horas de la noche.
Equipos en obra: pajarita, Vibro, Mezcladora, planta eléctrica, Motobomba
Herramientas menores (cadal, Palustre, nivel manguera, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Int. Siso, Maestro, oficiales, obreros, almacenista, operadores Rep. legal consorcio
Actividades en obra.
se inicia la fundición de la plantilla para el soporte de las vigas postensadas, dimensión 80x30,5cm.
Suministro de concreto grueso.
Se adelanta el corte, figurado del acero de refuerzo, para las vigas, según diseño
Llega a la obra el cableado, ductos para las vigas postensadas

Residente de obra

Miercoles, Agosto 30 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Personal en obra: Director Interventoria, Ing. Ambiental Int, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestros, Siso, Oficiales, Obreros, Operadores, Almacenista.
Equipos en obra: Volqueta, Pajarita, Vibro, Mezcladora, Herramientas Menores (palas, martillos, barras), equipo oxicorte
Actividades en obra
Se le instala el triple a la plantilla de soporte, para viga
Se inicia armado e instalación del acero de refuerzo, para las vigas, segun diseño
Continúa el corte, figurado del acero de refuerzo, para las vigas.
Se realiza comité de obra, conjuntamente entre interventoria y contratista, donde se trataron temas del avance de la obra, PGA, Cierre fiducia entre varios temas.

Residente de obra

Jueves, Agosto 31 de 2023
Estado Tiempo: Se presenta una llovizna en horas de la madrugada
Equipos en obra: Volquetas, pajarita, Vibro, planta eléctrica, Equipo Oxicorte, Motobomba, Mezcladora, Herramientas menores (bichiraquis, hilos, plomadas, etc)
Personal en obra: Rep legal Consorcio, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, Oficiales, obreros, Conductores, Operadores
Actividades en obra.
Se retoma el suministro de material de terraplén, aunque al inicio de la Jornada, no le permitieron el ingreso de las Maquinarias, debido a que la vía se encontraba mojada, por motivos de la lluvia.
Se avanza en la instalación del acero de refuerzo, a las vigas Según diseño.

Avance en el corte, figurado, para el reparto de la viga postensada
Extendido del material granular en el costado del puente.
del estribo #1, Para la ubicacion y posicionamiento
de la grua. (Este material es el utilizado en el
terraplen y luego se realiza la mampostería de viaje
se recuperara y se conformaran los llenos en los
cabezales de los estribos.)

Residente Interventor.

Residente de obra

Viernes, 01 de Diciembre /2022.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, operador, Almacenista, Ayudante.
Equipo en obra; Miniexcavadora, Vibro, Retroexcavadora Mezcladora, Planta electrica. Etc. Herramienta Menor.
Actividad en obra.
No se han realizado actividad alguna el dia de hoy ya que no hay material "piedra rajón".

Residente interventoria.

Residente de obra

Sabado, 02 Diciembre /2023.
Estado del tiempo: soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Residente e inspector de interventoria, operador, Almacenista y Ayudante
Equipo en obra: Miniexcavadora, Vibro, Retroexcavadora Mezcladora, Planta electrica, Herramienta Menor Etc.
Actividad en obra.
En el dia de hoy no se realizaron actividades Por falta de material "piedra rajón"

Residente Interventoria.

Residente de obra

Domingo, 03 Diciembre /2023
Descanso por ley Dia festivo.

Residente interventoria.

Residente de obra.

Lunes, 04 Diciembre /2023
Estado del Tiempo: Soleado.
Personal en obra: Residente e inspector de interventoria. operador, Almacenista, y Ayudante.
Equipo en obra: Miniexcavadora, vibro, Retroexcavadora, Mezcladora, Planta electrica, Herramienta Menor Etc.

Actividad en obra:
En el dia de hoy en horas de la mañana, llego a la obra una volqueta doble troque, cargada con "Piedra rajon", y luego se fue y regreso con un viaje de material mixto.
No se realiza actividad de protección del talud. estamos a la espera por parte de la interventoria que regrese el personal del contratista que esta realizando la actividad.

Residente Interventoria

Residente de obra

Martes, diciembre 05 de 2023
Estado del tiempo: soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Vibro, mezcladora, planta eléctrica, Herramientas Menores (carretas, palas, Baldes, etc), volqueta
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector Interventoría, Maestro, operador, Almacenista.
Se avanza en la perfilación del talud, localizado en la margen derecha, Quebrada Severinera
Acopio de piedra rajón, para revestimiento del talud.

Residente de obra

Residente Interventoria

Miercoles, diciembre 06 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Vibro, Mezcladora planta eléctrica, Motobomba, Herramientas Menores (Carretas, Palas, Baldes, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficial, obreros, operador, Almacenista.
Actividades en obra
Instalación de geotextil no tejido.

Suministro de piedra rajón,
Suministro de concreto para el revestimiento con piedra pegada, para la protección del talud. Localizado en la margen derecha o estribo N°1, Quebrada Severinera

Residente de obra.

Residente Interventoría

Jueves, diciembre 07 de 2023
Estado Tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Vibro, Mezcladora, Planta eléctrica, motobombas, Herramientas menores (palas, Carretas, Baldes, etc)
Personal en obra: Residente de obra Residente de Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficial, obreros, operador, Almacenista,
Actividades en obra.
Se continúa avanzando en la perfilado del talud
Instalación de geotextil no tejido
Suministro de piedra rajón para el revestimiento.
Suministro de concreto para el revestimiento con piedra pegada, para la protección del talud, desde del estribo N°1, localizado en la margen derecha de la Quebrada Severinera

Residente de obra

Residente Interventoría

Viernes, diciembre 08 de 2023 (festivo)
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Mezcladora, Planta eléctrica, Motobomba, Herramientas menores (palas, carretas, Baldes, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficial, obrero, operador, Almacenista.
Actividades de obra
Se continua con la perfilado de talud.
Suministro e instalación de geotextil no tejido, para el revestimiento
Suministro e instalación de piedra rajón

Fundición de concreto para el revestimiento con piedra pegada para la protección del talud.

Residente de obra

Residente Interventoría

Sabado, diciembre 09 de 2023
Estado Tiempo: soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, mezcladora planta eléctrica, motobomba, Herramientas Menores (barras, Carretas, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Maestro oficial, obreros, operador, Almacenista
Actividades en obra.
Se continúa con el revestimiento con piedra pegada, para la protección del talud, en el estribo nº1. localizado en la margen derecha, quebrada Saverinera. Incluye instalación del geotextil no tejido y piedra pegada.

Residente de obra

Residente Interventoría

"Domingo, diciembre 10 de 2023"
No se ejecutaron actividades por ser el dia de descanso dominical obligatorio."

Lunes, diciembre 11 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Mezcladora, planta eléctrica, Motobomba, Herramientas Menores (baldes, Carretas, palas, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestro, oficial, obreros, operador, Almacenista.
Actividades en obra.
Se avanza con el revestimiento con piedra pegada, para la protección del talud, en el estribo nº1 localizado en la Margen derecha quebrada

Severinera. Incluye Instalación de geotextil no tejido, Suministro e instalación piedra rajón, fundición de concreto, para la protección del talud.
No se ejecutan actividades posteriores a la viga postensada, debido a que estas se encuentran en revisión técnica por parte de la interventoria y contratista.

Residente de obra.

Martes, diciembre 12 de 2023.
Estado del Tiempo: Muy soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Vibro, Mezcladora, Planta eléctrica, Motobomba, Herramientas menores (palas, carretas, baldes, et
Personal en obra: Rep. legal C.P.C, Residente de obra, Residente de interventoria, Inspector Interventoria, Maestro, oficial, obreros, operad Almacenista.
Actividades en obra.
Se continúa con el revestimiento con piedra pegada, para la protecció del talud, en el estribo 103, Localizado en la Margen derecha, Quebrad Severinera.
Se realiza una prueba piloto para el inicio de la construcción del pilote para el colchagavión, en el fondo del cauce.

Residente de obra.

Miercoles diciembre 13 de 2023.
Estado Tiempo: Muy soleada
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, vibro, Mezcladora, planta eléctrica, Motobomba, Herramientas Menores (Baldes, Carretas, palas, etc)
Personal en obra; Residente de obra, Residente Interventoria, Insp Interventoria, Maestro, oficial, Obreros, Operador, Almacenista
Actividades en obra
Avance en la construcción del revestimiento en concreto,

para la protección del talud lateral, en el extremo aguas. Incluye, instalación de geotextil no tejido.
perfilada del talud.
Se le realizó una inclinación al Revestimiento, con el fin de disminuir, la velocidad del cauce o el caudal, con el fin de mitigar el impacto del proceso erosivo, aguas abajo.
Instalación de piedra rajón.
Fundición de concreto, para la protección del talud.

Residente de obra

Residente Interventoría

Jueves, diciembre 14 de 2023
Estado Tiempo: Soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, planta electrica, Mezcladora, motobombas Herramientas menores (palas, baldes, palas, carretas, etc)
personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro oficial, Operador, Obreros, Almacenista
Actividades en obra.
Descargue de materiales (Aceros y Cemento), para el inicio de los pilotes, para el colchagavión.
Se continúa o se termina el revestimiento con piedra pegada, en el talud lateral, Localizado en la margen derecha de la Quebrada Severnera. Incluye, Instalación de geotextil no tejido, Instalación de piedra rajón, Suministro de concreto.

Residente de obra

Residente Interventoría


Viernes, diciembre 15 de 2023
Estado tiempo: soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, planta eléctrica, Mezcladora, motobomba, Herramientas menores (palas, baldes, carretas etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría Inspector Interventoría, Maestro, oficial, obreros, operador, Almacenista

Actividades en obra.
Se inicia el corte, figurado, armado del acero de refuerzos, según diseño para los pilotes de los colchagarizones.
Se arma 1 canastra para un pilote



Residente de obra.

Sabado, diciembre 16 de 2023.
Estado del Tiempo: Soleado, se presenta una lluvia desde las 3:00 p.m
Equipos en obra: Miniexcavadora, Estación, Trípode, prisma, Retroexcavadora Mezcladora, Motobomba, Herramientas Menores (plomada, palas, carretas, etc)
Personal en obra: Rep. legal consorcio P.C, Residente de obra, Residente Interventoria, Insp. Interventoria, Maestro, oficial, Topógrafo, obreros, operador, almacenista.
Actividades en obra
se continúa con el corte, figurado y armado de las canastas, para los pilotes, de los colchagarizones.
Se realiza la localización de los pilotes, con equipo de precisión
Se suspenden las actividades a las 3:00 p.m por motivos de lluvia.
Se replantearon los pilotes aguas abajo, debido a que el eje se encuentra dentro del revestimiento del talud. Llega el personal que va a realizar la excavación de los pilotes



Residente de obra

Domingo, diciembre 17 de 2023
Estado Tiempo: Muy soleado
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Equipos de Pilotes, (Perforación) Mezcladora, Motobomba, Herramientas Menores (Pichingues, trozadores, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Maestro, oficial, operador, Almacenista
Actividades en obra
Se avanza en el corte, figurado, armado del acero de los pilotes, para los colchagarizones.

Se suspenden las actividades del acero a la 1:30 p.m

Residente de obra

Residente Interventoría

Lunes, diciembre 18 de 2023
Estado Tiempo: Muy soleado.
Equipos en obra: Equipos para Exc. pilotes, Miniexcavadora, Retroexcavadora Motobomba, Mezcladora, motobomba, Herramientas Menores (Pachiroquis, palas, baldes, etc)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector Interventoría, Maestro, oficial, obreros, operador, Almacenista
Actividades en obra.
Se continúa con el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, para los pilotes de los colchogaviones
No se ha iniciado la excavación de los pilotes, porque se requiere una tubería de un diametro mayor o una camisa..

Residente de obra

Residente Interventoría

Martes, diciembre 19 de 2023
Estado Tiempo: Muy soleado
Equipos en obra: Trípode, Motobomba, Equipo para Exc. pilotes, Miniexcavadora, Retroexcavadora, Mezcladora, Herramientas Menores (Pachiroquis, Trozadora, palas)
Personal en obra: Residente de obra, Residente Interventoría, Insp. Interventoría, Maestros, oficiales, obreros, operador, Almacenista.
Actividades en obra.
se avanza en el corte, figurado, armado del acero de refuerzo, para los pilotes de los colchogaviones.
Se inicia la excavación del primer pilote, Aprox. 7m, se presenta dificultad para avanzar en la excavación en el estrato limo-Arenoso lo cual se requiere cambiar el equipo, para esta actividad

Residente de obra

Residente Interventoría

Miercoles, diciembre 20 de 2023
Estado tiempo: soleado, se presenta una lluvia desde la 1:10 pm. Ma
Equipos en obra: Miniexcavadora, Retroexcavadora, Equipos para pilotes
Mezcladora, motobomba, Herramientas Menores (pacheiqueis, Troxadora, Plan
Personal en obra: Rep. legal consorcio P.C, Residente de obra, Residente
Interventoria, Insp Interventoria, Maestros, ayudas, obreros, operador, Almacen
Actividades en obra.
Se continua avanzando en el corte, figurado, armado del acero de refuerzo
para los pilotes de los colchagaviones
se retoma la actividad de excavacion de los pilotes, pero se
suspende por la ineficiencia del equipo.
El contratista solicita un equipo de mayor capacidad, para continuar
con la excavación de los pilotes
Se presenta una lluvia de aproximadamente 1 hora

la interventoria no dejara realizar la actividad de pilotes para colchagaviones si no esta presente el residente de obra.

Residente de obra

Residente Interventor.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8014237111	9	CONSORCIO PLANTEL DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 52 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	548087701	548159508	E	2023/12/05	2023/12/19	BANCOLOMBIA	14	$5,305,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	[illegible]	230301	1	$193,334	$23,000	EP0301	1	$193,334	$7,800	CCF14	1	$193,334	$7,800	14-11	1	$193,334	$13,500	1	$0	$0
2	CC	[illegible]	05-14	30	$4,000,000	$480,000	EP0301	30	$4,000,000	$160,000	CCF14	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
4	CC	[illegible]	230301	1	$193,334	$23,000	EP0301	1	$193,334	$7,800	CCF14	1	$193,334	$7,800	14-11	1	$193,334	$13,500	1	$0	$0
5	CC	[illegible]	230301	30	$1,160,000	$485,400	EP0301	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
7	CC	[illegible]	230301	1	$38,667	$4,300	EP0301	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
8	CC	[illegible]	230301	1	$193,334	$23,000	EP0301	1	$193,334	$7,800	CCF14	1	$193,334	$7,800	14-11	1	$193,334	$13,500	1	$0	$0
9	CC	[illegible]	230301	30	$1,160,000	$480,400	EP0301	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
11	CC	[illegible]	05-14	1	$38,667	$4,300	EP0301	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	[illegible]	230301	1	$38,667	$4,300	EP0301	1	$38,667	$1,600	CCF14	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	CCF01	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
14	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
15	CC	[illegible]	05-14	30	$2,500,000	$400,000	EP0301	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	[illegible]	230301	1	$193,334	$23,000	EP0301	1	$193,334	$7,800	CCF14	1	$193,334	$7,800	14-11	1	$193,334	$13,500	1	$0	$0
17	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
18	CC	[illegible]	230301	1	$116,000	$13,800	EP0301	1	$116,000	$4,700	CCF14	1	$116,000	$4,700	14-11	1	$116,000	$8,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(18)**				**$10,321,337**	**$1,444,800**			**$10,321,337**	**$421,700**			**$10,321,337**	**$421,700**			**$10,321,337**	**$732,800**		**$0**	**$0**

2023/12/19 10:52 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,684,000	$23,100	$0	$1,707,100
COLFONDOS	23101	800,227,940	6	1	$18,600	$300	$0	$18,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,046,200	$14,300	$0	$1,060,500
PORVENIR	23301	800,224,808	8	11	$551,000	$7,500	$0	$558,500
PROTECCION	23201	800,229,739	0	3	$68,200	$1,000	$0	$69,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$732,800	$10,000	$0	$742,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$732,800	$10,000	$0	$742,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$421,700	$5,800	$0	$427,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	$421,700	$5,800	$0	$427,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$421,700	$6,000	$0	$427,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
MUTUAL SER	ESSC67	806,008,394	7	6	$73,000	$1,000	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$111,000	$1,600	$0	$112,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$12,500	$200	$0	$12,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$6,300	$100	$0	$6,400
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	2	$167,800	$2,300	$0	$170,100
TOTAL				18	$3,260,200	$44,900	$0	$3,305,100

2023/1?/19 10:52 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901437311	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	523759531	9458748886	E	2023/11/03	2023/12/07	BANCO DAVIVIENDA	34	$4,814,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067	ALVAREZ GARCES MARIA CAMILA	23020	30	$1,160,000	$185,600	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
2	CC	1003046257	CARDENAS FLOREZ LIZETH PAOLA	23020	12	$464,000	$74,500	ESCO1	12	$464,000	$18,600	CCF04	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,200	12	$0	$0
3	CC	34551117	CARRASCAL LLORENTE JAVIER MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ DALEY JAIDER	23020	30	$1,160,000	$185,600	ESCO1	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
5	CC	1067834457	GONZALEZ ARUZ MARIA INES	23020	30	$1,160,000	$185,600	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
6	CC	1070967704	PARDO MERCADO ARMIRO ALFONSO	23020	1	$38,667	$6,200	CCF04	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1003049191	PAVARES APAIZ MIGUEL ENRIQUE	23020	7	$270,667	$43,400	CCF04	7	$270,667	$10,900	CCF04	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
8	CC	1003122749	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	23020	30	$1,160,000	$185,600	ESCO1	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
9	CC	1067	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	23020	30	$1,160,000	$185,600	ESCO1	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
10	CC	1067	SALGADO TIRADO JUAN FRANCISCO	25-14	7	$270,667	$43,400	ESCO1	7	$270,667	$10,900	CCF04	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
11	CC	1067	SALGADO TIRADO LORENA FRANCISCO	23020	7	$270,667	$43,400	ESCO1	7	$270,667	$10,900	CCF04	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
12	CC	1067	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	ESCO1	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$400,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
13	CC	1067	TORO AGUILAR DENIS ANDRES	23020	30	$1,160,000	$185,600	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
14	CC	1067	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	23020	7	$270,667	$43,400	ESCO1	7	$270,667	$10,900	CCF04	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$15,049,335	$2,407,700			$15,049,335	$602,300			$15,049,335	$602,300			$15,049,335	$1,047,800		$0	$0

2023/12/07 09:50 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,407,700	$81,000	$0	$2,488,700
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$43,400	$1,500	$0	$44,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,083,400	$36,400	$0	$1,119,800
PORVENIR	23E001	800,224,808	8	8	$1,021,000	$34,300	$0	$1,055,300
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	2	$259,900	$8,800	$0	$268,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,047,800	$35,200	$0	$1,083,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,047,800	$35,200	$0	$1,083,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$602,200	$20,300	$0	$622,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$602,200	$20,300	$0	$622,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$602,200	$20,500	$0	$622,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
MUTUAL SER	ESS007	806,008,394	7	6	$179,600	$6,100	$0	$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$112,500	$3,800	$0	$116,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$10,900	$400	$0	$11,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$7,000	$0	$213,400
TOTAL				14	$4,659,900	$157,000	$0	$4,816,900

2023/12/07 09:50 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900627351	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	4 - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 CR 32	MONTERIA-CORDOBA	7948034	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240523670	6457439819	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO BBVA		$7,896,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC																				
2	CC																				
3	CC																				
4	CC																				
5	CC																				
6	CC																				
7	CC																				
8	CC																				
9	CC																				
10	CC																				
11	CC																				
12	CC																				
13	CC																				
14	CC																				
15	CC																				
16	CC																				
17	CC																				
18	CC																				
19	CC																				
20	CC																				
21	CC																				
22	CC																				
23	CC																				
24	CC																				
25	CC																				
Total	Afiliados(25)				$18,486,670	$2,958,800			$18,486,670	$740,300			$18,486,670	$740,300			$18,486,670	$1,287,300		$0	$0

2023/ /26 03:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$2,958,300	$0	$3,025,700
COLFONDOS	23501	800,227,940	6	2	$12,400	$0	$12,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,114,300	$0	$1,139,700
PORVENIR	23001	800,224,808	8	14	$1,435,600	$0	$1,468,300
PROTECCION	23001	800,229,739	0	6	$396,000	$0	$405,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,287,300	$0	$1,316,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,287,300	$0	$1,316,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$740,200	$0	$757,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$740,200	$0	$757,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$740,200	$0	$757,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$37,200	$0	$38,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$48,000	$0	$49,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$205,800	$0	$210,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$168,200	$0	$172,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$51,100	$0	$52,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$20,200	$0	$20,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$209,600	$0	$214,400
TOTAL				25	$5,726,000	$0	$5,856,700

2023/ /26 03:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

322

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ecoreverado SENA e ICBF
NIT 900627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1/0-025476	96960881/1	E	2023/09/05	2023/09/20	BANCO DAVIVIENDA	15	$5,294,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960841	ACUART GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP608	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC 1059910...	ACUNTAR CIRTON A JAIR HUMBERTO	211301	9	$348,000	$55,700	ESP214	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
3	CC 1066...	ALVAREZ ARTEAGA WENSEL ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	ESP201	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
4	CC 1003066217	CARDENAS FLOREZ EDITH PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP207	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC 1065...	CARRASQUILLA LIZARAZO AYLIN MARTH	23-14	30	$4,000,000	$640,000	ESP608	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
6	CC 1090...	DIAZ HERRAN ALBERTO	230301	9	$348,000	$55,700	ESP201	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
7	CC 1003...	ESPITIA LIZARAZO ANDRES FELIPE	230301	9	$348,000	$55,700	ESP201	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
8	CC 1122...	FLOREZ HERNANDEZ EMILY ANDREA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP207	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC 1067...	GONZALEZ ARIZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP610	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC 1073...	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP207	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC 1003...	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	9	$348,000	$55,700	ESP201	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
12	CC 1003...	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP207	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC 1067...	ROJAS RODRIGUEZ JOSE EMORE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP207	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC 1063...	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	ESP207	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
15	CC 1067...	SALGADO ROYCO JORGE LUIS	230301	15	$580,667	$61,900	ESP214	15	$580,667	$15,500	CCF16	15	$580,667	$23,200	14-11	15	$580,667	$37,800	15	$0	$0
16	CC 1067...	SALGADO TRUJILLO JUAN FRANCISCO	23-14	9	$348,000	$55,700	ESP207	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
17	CC 1067...	SALGADO TRUJILLO LINGUER FRANCISCO	230301	9	$348,000	$55,700	ESP201	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
18	CC 1063...	VERGARA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	ESP214	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
19	CC 1082...	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	23-14	30	$2,500,000	$400,000	ESP201	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
20	CC 1067...	TORO MORALES JESUS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP244	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
21	CC 1067...	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	230301	15	$386,667	$61,900	ESP202	15	$386,667	$15,500	CCF16	15	$386,667	$15,500	14-11	15	$386,667	$27,000	15	$0	$0
22	CC 1063...	ZABALA ALVIS HECTOR ANDRES	230301	7	$270,667	$43,300	ESP244	7	$270,667	$10,800	CCF16	7	$270,667	$10,800	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
Total	**Afiliados(22)**				$19,956,001	$3,193,300			$19,956,001	$799,100			$19,956,001	$799,100			$19,956,001	$1,390,400		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$3,193,300	$52,600	$0	$3,245,900
COLFONDOS	23001	800,227,940	6	2	$117,600	$2,000	$0	$119,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,095,700	$18,000	$0	$1,113,700
PORVENIR	23001	800,224,808	8	15	$1,608,800	$26,500	$0	$1,635,300
PROTECCIÓN	23001	800,229,739	0	2	$371,200	$6,100	$0	$377,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,390,400	$22,900	$0	$1,413,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,390,400	$22,900	$0	$1,413,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$799,100	$13,200	$0	$812,300
COMFACOR	CCF16	891,280,005	1	22	$799,100	$13,200	$0	$812,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$799,100	$13,500	$0	$812,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$43,500	$800	$0	$44,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$800	$0	$47,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$215,100	$3,600	$0	$218,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	1	4	$174,400	$2,900	$0	$177,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300	$1,200	$0	$72,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$28,000	$500	$0	$28,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,400	$3,700	$0	$224,100
TOTAL				22	$6,181,900	$102,200	$0	$6,284,100

2023/09/20 04:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627211	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7940354	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	91687962	9054388888	E	2023/08/05	2023/08/11	BANCO BANCOLOMBIA	0	56,467,708

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS009	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	78045084	AGREDOT ESTELA JAIR HUMBERTO	231001	19	$425,334	$68,000	EPSC34	19	$425,334	$17,000	CCF16	19	$425,334	$17,000	14-01	19	$425,334	$29,700	19	$0	$0
3	CC	78680951	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	230301	19	$425,334	$68,000	EPS009	19	$425,334	$17,000	CCF16	19	$425,334	$17,000	14-01	19	$425,334	$29,700	19	$0	$0
4	TI	1003662757	CARMONA PUENCE LIBETH PAOLA	230301	26	$1,085,334	$160,900	EPS037	26	$1,085,334	$46,900	CCF16	26	$1,085,334	$46,900	14-01	26	$1,085,334	$70,000	26	$0	$0
5	CC	26293117	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-01	30	$4,000,000	$270,400	30	$0	$0
6	CC	6998589	DIAZ BERNAL ALBERTO	230301	11	$425,334	$68,000	EPS041	11	$425,334	$17,000	CCF16	11	$425,334	$17,000	14-01	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
7	CC	1005568851	ESPITIA LIZARAZO ANDRES FELIPE	230301	14	$560,447	$89,600	EPS002	13	$503,447	$20,100	CCF16	13	$503,447	$20,100	14-01	13	$503,447	$35,000	13	$0	$0
8	CC	1112796242	FLOREZ HERNANDEZ DIEGO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1067964457	GONZALEZ AYLE MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1073867874	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1003845101	PAYARES AYAZO MIKAEL ENRIQUE	230301	13	$542,447	$80,500	EPS002	13	$503,447	$20,100	CCF16	13	$503,447	$20,100	14-01	13	$503,447	$35,000	13	$0	$0
12	CC	1003563760	PERENZ ALVAREZ RONAL JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1067976160	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	1063080388	SALGADO OVIEDO SAIR ANTONIO	230301	11	$425,334	$68,000	EPS037	11	$425,334	$17,000	CCF16	11	$425,334	$17,000	14-01	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
15	CC	1067914993	SALGADO REYES JORGE LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	1067974149	SALGADO TIRADO LENNIS FRANCISCO	230301	11	$425,334	$68,000	EPS037	11	$425,334	$17,000	CCF16	11	$425,334	$17,000	14-01	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
17	CC	1063080108	SIERRA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	11	$425,334	$68,000	EPSC34	11	$425,334	$17,000	CCF16	11	$425,334	$17,000	14-01	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
18	CC	3482179	SOTO ZUÑIGA ENRIQUE JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-01	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
19	CC	1067168911	TORO MORALES DEIBIS ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-01	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1067504[illegible]	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-01	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
Total	**Afiliados(20)**					$20,690,672	$3,311,800			$20,690,672	$828,500			$20,690,672	$828,500			$20,690,672	$1,441,300		$0	$0

2023/08/11 02:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$3,111,000	$30,000	$0	$3,141,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	3	$123,800	$1,200	$0	$125,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,040,000	$9,400	$0	$1,049,400
PORVENIR	23I001	800,224,808	8	14	$1,800,700	$16,200	$0	$1,816,900
PROTECCION	23I001	800,229,739	0	2	$346,500	$3,200	$0	$349,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,441,300	$13,000	$0	$1,454,300
ARL SURA	14-11	860,903,790	5	20	$1,441,300	$13,000	$0	$1,454,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$828,500	$7,500	$0	$836,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$828,500	$7,500	$0	$836,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$828,500	$7,900	$0	$836,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$80,600	$800	$0	$81,400
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$500	$0	$46,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$193,500	$1,800	$0	$195,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$180,600	$1,700	$0	$182,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$63,500	$600	$0	$64,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$40,400	$400	$0	$40,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$213,500	$2,100	$0	$215,600
TOTAL				20	$6,409,300	$58,400	$0	$6,467,700

2023/08/11 02:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

326

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Ecomerado SENA e ICBF
NIT 900627701	5	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 59 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840019	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	51487929	5453347725	E	2023/07/06	2023/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,344,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$139,200	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	16	$618,667	$99,200	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$37,100	16	$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	15	$580,000	$92,800	[illegible]	15	$580,000	$21,300	[illegible]	15	$580,000	$21,300	[illegible]	15	$580,000	$34,800	15	$0	$0
4	CC	[illegible]	21-14	30	$4,300,000	$688,000	[illegible]	30	$4,300,000	$160,000	[illegible]	30	$4,000,000	$160,000	[illegible]	30	$4,000,000	$276,000	30	$0	$0
5	CC	[illegible]	[illegible]	16	$618,667	$99,000	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$37,100	16	$0	$0
6	CC	[illegible]	[illegible]	25	$966,667	$154,700	[illegible]	25	$966,667	$38,700	[illegible]	25	$966,667	$38,700	[illegible]	25	$966,667	$67,100	25	$0	$0
7	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
8	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
9	CC	[illegible]	[illegible]	25	$966,667	$154,700	[illegible]	25	$966,667	$38,700	[illegible]	25	$966,667	$38,700	[illegible]	25	$966,667	$67,100	25	$0	$0
10	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
11	CC	[illegible]	[illegible]	16	$618,667	$99,000	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$42,700	16	$0	$0
12	CC	[illegible]	[illegible]	5	$193,334	$31,000	[illegible]	5	$193,334	$7,800	[illegible]	5	$193,334	$7,800	[illegible]	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
13	CC	[illegible]	[illegible]	16	$618,667	$99,000	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
14	CC	[illegible]	[illegible]	16	$618,667	$99,000	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$24,800	[illegible]	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
15	CC	[illegible]	21-14	30	$2,500,000	$400,000	[illegible]	30	$2,500,000	$100,000	[illegible]	30	$2,500,000	$100,000	[illegible]	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	[illegible]	21-14	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**				$19,260,003	$3,081,800			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$1,341,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/07/06 05:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,081,800	$0	$0	$3,081,800
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	1	$99,800	$0	$0	$99,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,335,600	$0	$0	$1,335,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,602,500	$0	$0	$1,602,500
PROTECCION	230501	800,229,739	0	1	$154,700	$0	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$770,800	$0	$0	$770,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$57,400	$0	$0	$57,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$196,000	$0	$0	$196,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$71,200	$0	$0	$71,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$229,600	$0	$0	$229,600
TOTAL				17	$5,964,600	$0	$0	$5,964,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/07/06 05:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Enviarado SENA e ICBF
NIT 900627791	6	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	4 - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-11	MONTERIA-CORDOBA	7940374	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	232161 4568	94019551658	E	2023/06/05	2023/06/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,661,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	MUANET GARCES MARIA CAMILA	23030	30	$1,160,000	$185,600	CCF005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1140869581	ALVAREZ PEREZ CARLOS ANTONIO	23030	5	$193,334	$31,000	CCF005	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
3	CC	1067960963	ARIAS NAVARRO JOSE MANUEL	23030	1	$38,667	$6,200	CCF041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	26243337	CARRASCAL LLORENTE AYDEE MAUTE	23-14	30	$4,000,000	$640,000	CCF005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$234,400	30	$0	$0
5	CC	15031799	DE LOS REYES AGUAS MARIANO	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
6	CC	1064739179	DIAZ CABRERA CHERI ESTEFANIA	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
7	CC	1152796941	FLOREZ HERNANDEZ DALEY ANDRES	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
8	CC	1037914685	GONZALEZ MORELO FAVIER ELIAS	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
9	CC	1067836437	GONZALEZ AYOZ MARIA ISABEL	23030	30	$1,160,000	$185,600	CCF005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1002191500	MARQUEZ MARQUEZ LUCAS MANUEL	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
11	CC	1067	MARTINEZ RAMOS KELTUR DAVID	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC	1095	MARTINEZ CARVALLO JAVIER DARIO	23030	9	$348,000	$55,700	CCF005	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
13	CC	1023974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
14	CC	1066729226	MONTES SALGADO ALEXIS MANUEL	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	6444652	MORALES MARTINEZ HECTOR FABIAN	23030	9	$348,000	$55,700	CCF005	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
16	CC	1067911	MOLINETT PERSITH FRANCISCO JAVIER	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
17	CC	1067	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
18	CC	6644253	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC	1037966704	OVIEDO MENCANO ANDRES ALFONSO	23030	30	$1,160,000	$185,600	CCF005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1003065101	PAYARES AYUSO MIGUEL ENRIQUE	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
21	CC	1003065101	PAYARES AYUSO MIGUEL ENRIQUE	23030	4	$154,667	$24,800	CCF005	4	$154,667	$6,300	CCF16	4	$154,667	$6,300	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
22	CC	78013729	PEREZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	23030	9	$348,000	$55,700	CCF005	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
23	CC	1003562368	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
24	CC	1067	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	23030	30	$1,160,000	$185,600	CCF005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	1073	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	23030	1	$38,667	$6,200	CCF005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
26	CC	6432	SOLORZANO BARRIOS JUAN CARLITOS	23-14	30	$2,500,000	$400,000	CCF005	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
27	CC	1067913867	TIRADO MARTINEZ MARELVIS MARIA	23-14	30	$1,160,000	$185,600	CCF005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
28	CC	1067	TORO MORALES EMMANUEL	23030	10	$386,667	$61,900	CCF005	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

29	CC	1067435	[illegible]	230001	16	$386,667		$61,900	FPS041	10	$386,667		$15,500	CCF16	10	$386,667		$15,500	14-11	10	$386,667		$27,800	13		$0	$0
30	CC	1067942	[illegible]	230001	16	$386,667		$61,900	ESSC07	10	$386,667		$15,500	CCF16	10	$386,667		$15,500	14-11	10	$386,667		$27,800	13		$0	$0
Total	**Afiliados(29)**					$18,316,007		$2,915,200			$18,316,007		$729,700			$18,316,007		$729,700			$18,316,007		$1,269,500			$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$2,915,200	$3,600	$0	$2,918,800
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	2	$123,800	$200	$0	$124,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$1,500	$0	$1,227,100
PORVENIR	230001	800,224,808	8	16	$1,250,100	$1,500	$0	$1,251,600
PROTECCION	230001	800,229,739	0	8	$315,700	$400	$0	$316,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,269,500	$1,500	$0	$1,271,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,269,500	$1,500	$0	$1,271,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$729,700	$900	$0	$730,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	$729,700	$900	$0	$730,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$729,700	$1,400	$0	$731,100
CAJACOPS	ECFC55	901,541,211	6	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$48,000	$100	$0	$48,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$100,700	$200	$0	$100,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$180,600	$300	$0	$180,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$90,100	$200	$0	$90,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$55,900	$100	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$300	$0	$206,700
TOTAL				29	$5,644,100	$7,400	$0	$5,651,500

2023/[illegible]6 09:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

330

2023/08/08 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562721	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 100 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 15-57	MONTERIA-CORDOBA	7948134	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	70448211739	94106064756	E	2023/05/04	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	4	$9,778,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	ALVAREZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$139,600	ESP009	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
2	CC	1067960041	ARIAS NAVARRO JOSE MIGUEL	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC	26833317	CARDONGAL ELORDUY ANGELA AUSTIN	25-14	30	$4,000,000	$640,000	ESP005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	15031709	DE LOS REYES ARGUELLES ANDRANO	230301	8	$309,334	$49,500	ESP005	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
5	CC	1064705015	DIAZ LARRIARD OMER GUILLERMO	230301	4	$210,000	$17,200	ESP005	4	$210,000	$8,400	CCF16	4	$210,000	$8,400	14-11	4	$210,000	$14,400	4	$0	$0
6	CC	1110796341	FLOREZ HERNANDEZ DALEY ANDRES	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
7	CC	1070974485	GONTALEZ MONTA FABER ELIAR	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
8	CC	1067894457	GONTALEZ AYAZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003191520	MARQUEZ APARICIO JABER MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	ESP005	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC	1067878784	MARTINEZ RANOS HECTOR DAVID	231301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
11	CC	1095823?	MARTINEZ CARRASCO JAVIER DAVID	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
12	CC	1070994079	MARTINEZ ARRIETA MANUEL ALEJANDRO	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
13	CC	1066779034	MONTES VALDIRIO ALVERO MARIO	230301	8	$309,334	$49,500	ESP010	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
14	CC	1069448	MORALES MARTINEZ HECTOR FABIAN	230301	4	$210,000	$17,200	ESP041	4	$210,000	$8,400	CCF16	4	$210,000	$8,400	14-11	4	$210,000	$14,400	4	$0	$0
15	CC	1002921?	MOLANTE FUENTES FRANCISCO JAVIER	230301	4	$210,000	$17,200	ESP037	4	$210,000	$8,400	CCF16	4	$210,000	$8,400	14-11	4	$210,000	$14,400	4	$0	$0
16	CC	1067878?	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO FABIAN	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
17	CC	1064753	ORTEGA MARTINEZ JORGE ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
18	CC	1073982?04	OYUELO MENDOZA ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	1002845?	PAYARES AYALO MIGUEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
20	CC	1065?529	PERSTA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
21	CC	1003562568	RIVERA ALVAREZ STEVEN JOSE	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
22	CC	1067?998	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESP037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	1067890748	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	230301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
24	CC	1003179	SALDARRIAGA RAMOS JUAN CARLOS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	ESP037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
25	CC	1067?17037	TRIADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESP041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
26	CC	1067?1691	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
27	CC	1067?4301	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	ESP041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
28	CC	1067894?	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231301	8	$309,334	$49,500	ESP037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**					$18,564,012	$2,970,600			$18,564,012	$743,100			$18,564,012	$743,100			$18,564,012	$1,213,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$2,970,600	$14,400	$0	$2,985,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$99,800	$500	$0	$99,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$5,900	$0	$1,231,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,286,900	$6,200	$0	$1,293,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$359,100	$1,800	$0	$360,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,293,800	$6,200	$0	$1,300,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$1,293,800	$6,200	$0	$1,300,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$743,100	$3,600	$0	$746,700
COMFACOR	CCF16	891,080,008	1	28	$743,100	$3,600	$0	$746,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$743,100	$3,700	$0	$746,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$12,400	$100	$0	$12,500
EPS SURA (ANTES SURAMIS)	EPS010	800,088,702	2	3	$558,800	$300	$0	$559,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$83,600	$400	$0	$84,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	3	6	$196,800	$1,000	$0	$197,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS941	900,156,264	3	7	$83,700	$400	$0	$84,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$102,200	$500	$0	$102,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$206,400	$1,000	$0	$207,400
TOTAL				28	$5,750,600	$27,900	$0	$5,778,500

2023/02/08 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800627211	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 100 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840234	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-04	0809277811	94492712214	E	2023/05/05	2023/04/29	BANCOLOMBIA	0	$5,859,165

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960881	ACUAÑ GARCIA MARIA CAMILA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
2	CC	1067960962	ARIAS NAVARRO JOSE MIGUEL	23030	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC	34233317	CARRASCAL FLORENTIN JAVIER MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS009	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	11001799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	23030	13	$360,667	$82,500	EPS002	13	$360,667	$28,200	CCF16	13	$360,667	$28,200	14-11	13	$360,667	$25,000	13	$0	$0
5	CC	1123796343	FLOREZ FERNANDEZ DIELEY ANDRES	23030 +	30	$386,667	$61,900	ESS037	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
6	CC	1078974403	GONZALEZ ACOSTA FABIAN ELIAS	23030	8	$309,334	$49,500	EPS032	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
7	CC	1067884657	GONZALEZ AYOZ MARIA INES	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
8	CC	1003999720	MARQUEZ HERCULES ENDER MANUEL	23030	6	$232,000	$37,100	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
9	CC	15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	23030	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
10	CC	1095035767	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	23030	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
11	CC	1067999999	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	23030	30	$386,667	$61,900	EPS010	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
12	CC	1067772234	MENDEZ SALGADO ALEXIS MANUEL	23030	8	$309,334	$49,500	EPS018	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
13	CC	15675079	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	23030	30	$386,667	$61,900	EPS041	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
14	CC	1044974	ORTEGA MARTINEZ HUGO ENRIQUE	23030	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
15	CC	1078968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
16	CC	1003040103	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	23030	8	$309,334	$49,500	EPS065	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
17	CC	2883729	PERTUZ DE PAREJO CARLOS GUSTAVO	23030	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
18	CC	1003562068	RIVERA ALVAREZ KEVIN JOSE	23030	30	$386,667	$61,900	ESS037	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
19	CC	15675048	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	23030	30	$1,160,000	$185,600	ESS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
20	CC	1073990746	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	23030	8	$309,334	$49,500	CCF059	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
21	CC	1482579	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
22	CC	1067915852	TEJADA MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
23	CC	15671409	TORO MORALES JAIME MARIO	23030	30	$386,667	$61,900	EPS041	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
24	CC	1067365	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	23030	30	$386,667	$61,900	EPS041	30	$386,667	$15,500	CCF16	30	$386,667	$15,500	14-11	30	$386,667	$27,000	30	$0	$0
25	CC	15671041	TORO MORALES LUIS ALBERTO	23030	11	$425,334	$68,100	ESS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$18,912,009	$3,026,500			$18,912,009	$757,300			$18,912,009	$757,300			$18,912,009	$1,318,000		$0	$0

2023/05/05 11:02 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$3,026,500	$0	$0	$3,026,500
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	2	$136,200	$0	$0	$136,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
PORVENIR	23000I	800,224,808	8	15	$1,373,800	$0	$0	$1,373,800
PROTECCION	23000I	800,229,739	0	5	$290,900	$0	$0	$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$757,300	$0	$0	$757,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,251	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,800	$0	$0	$58,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$94,500	$0	$0	$94,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$191,400	$0	$0	$191,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$93,100	$0	$0	$93,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$100,700	$0	$0	$100,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$0	$0	$206,400
TOTAL				25	$5,859,100	$0	$0	$5,859,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900627701	9	CONSORCIO PEONES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5F 13-11	MONTERIA-CORDOBA	7840214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1950864513	9440808183	E	2023/03/13	2023/03/07	BANCO BANVENEZUELA	0	$4,370,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	30	$4,000,000	$640,000	[illegible]	30	$4,000,000	$160,000	[illegible]	30	$4,000,000	$160,000	[illegible]	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	8	$309,334	$49,500	[illegible]	8	$309,334	$12,400	[illegible]	8	$309,334	$12,400	[illegible]	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
4	CC	[illegible]	[illegible]	7	$270,667	$43,400	[illegible]	7	$270,667	$10,900	[illegible]	7	$270,667	$10,900	[illegible]	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	[illegible]	[illegible]	6	$232,000	$37,200	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
7	CC	[illegible]	[illegible]	6	$232,000	$37,200	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
8	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	[illegible]	[illegible]	8	$309,334	$49,500	[illegible]	8	$309,334	$12,400	[illegible]	8	$309,334	$12,400	[illegible]	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC	[illegible]	[illegible]	27	$1,044,000	$167,100	[illegible]	27	$1,044,000	$41,800	[illegible]	27	$1,044,000	$41,800	[illegible]	27	$1,044,000	$72,900	27	$0	$0
11	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,500,000	$400,000	[illegible]	30	$1,500,000	$406,800	[illegible]	30	$1,500,000	$406,800	[illegible]	30	$1,500,000	$104,000	30	$0	$0
12	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	[illegible]	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	[illegible]	[illegible]	7	$270,667	$43,400	[illegible]	7	$270,667	$10,900	[illegible]	7	$270,667	$10,900	[illegible]	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
14	CC	[illegible]	[illegible]	6	$232,000	$37,200	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$9,300	[illegible]	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
Total	Afiliados(14)				$14,040,002	$2,246,900			$14,040,002	$561,900			$14,040,002	$561,900			$14,040,002	$977,900		$0	$0

2023/[illegible]7 10:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,246,900	$11,100	$0	$2,258,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$6,000	$0	$1,231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$934,600	$4,600	$0	$939,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$86,700	$500	$0	$87,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$561,900	$3,100	$0	$565,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,218	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$65,100	$400	$0	$65,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$109,300	$600	$0	$109,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$29,500	$200	$0	$29,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$58,800	$300	$0	$59,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$1,000	$0	$207,400
TOTAL				14	$4,348,600	$21,800	$0	$4,370,400

2023/[illegible]7 10:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

336

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8014277[illegible]	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7940214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Lanzo	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	[illegible]	[illegible]	E	2023/02/03	2023/02/07	BANCOLOMBIA	4	$3,037,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC [illegible]	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	23009	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
2	CC 36[illegible]377	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MARTH	25-14	30	$3,890,000	$466,200	[illegible]	30	$3,890,000	$154,000	CCF16	30	$3,890,000	$154,000	14-11	30	$3,890,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC [illegible]9	DIAZ LAMBRANO JAVIER SEGUNDO	23009	4	$154,667	$24,800	[illegible]	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
4	CC [illegible]	GONZALEZ AYAZ MARIA INES	23009	30	$1,160,000	$185,600	[illegible]	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
5	CC [illegible]	MARQUEZ [illegible]	23009	12	$464,000	$74,300	[illegible]	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
6	CC 11679028	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	23009	12	$464,000	$74,300	[illegible]	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
7	CC [illegible]	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	23009	12	$464,000	$74,300	[illegible]	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
8	CC [illegible]	MARTINEZ ARRAIGA MARIEL ALEJANDRO	23009	4	$154,667	$24,800	[illegible]	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
9	CC [illegible]	MONTOYA GUERRA CARLOS PASCUAL	23009	1	$38,667	$6,200	[illegible]	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC [illegible]	MORALES HOYOS JOSE SILVESTRE	23009	4	$154,667	$24,800	[illegible]	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
11	CC [illegible]	MEDRETE FUENTES FRANCISCO JAVIER	23009	1	$38,667	$6,200	[illegible]	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC [illegible]	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	23009	12	$464,000	$74,300	[illegible]	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
13	CC [illegible]	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	23009	4	$154,667	$24,800	CCFC15	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
14	CC [illegible]	PEREZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	23009	1	$38,667	$6,200	[illegible]	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC [illegible]	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	11	$916,667	$146,700	[illegible]	11	$916,667	$36,700	CCF16	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$63,800	11	$0	$0
16	CC [illegible]	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	23009	1	$38,667	$6,200	[illegible]	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
17	CC [illegible]	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	23009	1	$38,667	$6,200	[illegible]	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**				$9,754,670	$1,561,500			$9,754,670	$390,700			$9,754,670	$390,700			$9,754,670	$679,400		$0	$0

2023/02/07 12:20 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,561,300	$7,600	$0	$1,568,900
COLFONDOS	23-01	800,227,940	6	3	$105,300	$500	$0	$105,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$762,700	$3,700	$0	$766,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$557,000	$2,700	$0	$559,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$136,300	$700	$0	$137,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$679,400	$3,300	$0	$682,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$679,400	$3,300	$0	$682,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$390,700	$2,200	$0	$392,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$6,200	$100	$0	$6,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$3,200	$100	$0	$3,300
NUEVA E.P.S.	EPSC37	900,156,264	2	3	$89,300	$500	$0	$89,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$59,000	$300	$0	$59,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$32,600	$200	$0	$32,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$200,400	$1,000	$0	$201,400
TOTAL				17	$3,022,100	$15,000	$0	$3,037,100

2023/02/07 12:20 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805627211	9	CONSORCIO PUERTAS DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 73-32	MONTERIA-CORDOBA	7840214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1721159165	84417848123	E	2022/10/05	2022/10/21	BANCO DAVIVIENDA	19	$757,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1020[illegible]17	CARNAVAL AYLEN	25-14	12	$1,540,000	$246,400	EPS037	12	$1,540,000	$61,600	CCF16	12	$1,540,000	$61,600	14-11	12	$1,540,000	$107,800	12	$0	$0
2	CC 1067[illegible]657	DENCUN EDI MARIA	230301	12	$460,000	$73,600	EPS037	12	$460,000	$18,400	CCF16	12	$460,000	$18,400	14-11	12	$460,000	$32,200	12	$0	$0
3	CC 1073[illegible]976	OVIEDO AMBER	230301	12	$480,000	$84,000	CCFC55	12	$480,000	$16,000	CCF16	12	$480,000	$16,000	14-11	12	$480,000	$27,400	12	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$2,480,000	$384,000			$2,480,000	$96,000			$2,480,000	$96,000			$2,480,000	$167,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$384,000	$7,500	$0	$391,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,400	$4,800	$0	$251,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$137,600	$2,700	$0	$140,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,200	$3,200	$0	$170,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$167,200	$3,200	$0	$170,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,000	$1,900	$0	$97,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$96,000	$1,900	$0	$97,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				1	$96,000	$2,000	$0	$98,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$16,000	$400	$0	$16,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$18,400	$400	$0	$18,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,600	$1,200	$0	$62,800
TOTAL				3	$743,200	$14,600	$0	$757,800

2022/10/24 07:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806617311	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7940214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442681538	9442681538	E	2022/11/03	2022/11/11	BANCO BOGOTA	8	$1,883,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067900841	ADAMET MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC 1068	CARRASCAL AVILA	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC 1067856457	ROMERO [illegible]	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
4	CC 1072665704	DIEGO [illegible]	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				$6,033,334	$965,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$420,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$965,400	$7,900	$0	$973,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$5,000	$0	$621,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$349,400	$2,900	$0	$352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$241,400	$2,100	$0	$243,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	4	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,600	$0	$195,600
TOTAL				4	$1,868,300	$15,400	$0	$1,883,700

2022/1 04:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 13-52	MONTERIA-CORDOBA	7948194	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9401189822	9401189822	E	2022/12/05	2022/12/05	BANCO BOGOTA	0	$1,857,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960941	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$80,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1067931157	TORRADO DE AVILA	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC	1067884437	GOMEZ DE AVILA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$960,000	$0	$0	$960,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$0	$0	$616,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$417,700	$0	$0	$417,700
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	1	$417,700	$0	$0	$417,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$240,000	$0	$0	$240,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$0	$0	$46,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$0	$0	$194,000
TOTAL				3	$1,857,700	$0	$0	$1,857,700

2022/12/02 04:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901427711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-52	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-01	105241947	94453334566	E	2023/01/04	2023/01/10	BANCO DAVIVIENDA	6	$1,870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067926854	ADAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS006	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1063551917	CARRASCAL NELSON	25-14	30	$1,850,000	$444,000	EPS005	30	$1,850,000	$154,000	CCF16	30	$1,850,000	$154,000	14-11	30	$1,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC	1067926857	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
Total	Afiliados(3)					$4,000,000	$960,000			$4,000,000	$240,000			$4,000,000	$240,000			$4,000,000	$417,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,000	$6,600	$0	$966,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$4,200	$0	$620,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$2,400	$0	$346,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$240,000	$1,800	$0	$241,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,400	$0	$195,400
TOTAL				3	$1,857,700	$13,000	$0	$1,870,700

2023/01/[illegible] 08:10 PM

Powered by CamScanner
