	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2-dic-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP 013 - 2022
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL: $ 5.384.604.822,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR ACUMULADO: $ 7.384.604.822,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR CONSORCIO VIAL NACIONAL

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
LP 013-2022	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2022	$ 5.384.604.822,00	$ 5.384.604.822,00
PRORROGA No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2022	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBREDE 2023		$ 5.384.604.822,00
PRORROGA No. 2	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		$ 5.384.604.822,00
PRORROGA No. 3	22 DE NOVIEMBRE DE 2023	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ 5.384.604.822,00
PRÓRROGA No. 4	28 DE DICIEMBRE DE 2023	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 5.384.604.822,00
ADICION No 1 Y PRORROGA No. 5	02 DE ABRIL DE 2024	HASTA 31 DE JULIO DE 2024	$ 2.000.000.000,00	$ 7.384.604.822,00
PRORROGA No. 6	30 DE JUNIO DE 2024	HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 7.384.604.822,00
PRORROGA No. 7	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HASTA 5 DE OCTUBRE DE 2024		$ 7.384.604.822,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
SUSPENSION No. 1	N/A	26 DE FEBRERO DE 2024	26 DE FEBRERO DE 2024	26 DE MARZO DE 2024	26 DE MARZO DE 2024
	AMPLIACION No 1	02 DE ABRIL DE 2024	22 DE MARZO DE 2024	01 DE ABRIL DE 2024	02 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION No. 2	N/A	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24 DE OCTUBRE DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024
	AMPLIACION No 2	25 DE OCTUBRE DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	02 DE DICIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FISICA EJECUTADA (Indicar PR):

LOCALIZACION: QUEBRADA SEVERINERA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

1. CONSTRUCCION DE PUENTE VIAL 30 ML
2. PROTECCION RIBERA DE QUEBRADA Y LA CIMENTACION DEL PUENTE
3. PAVIMENTO RIGIDO HIDRAULICO MR40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)


CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30 ML


1. Longitud del puente: 30ml
2. Cimentacion profunda: 24 pilotes de 19ml de longitud, diametro 1,1 m
3. Dados y Vastago: Vaciados en concreto de 24,5 Mpa 4000 psi
4. Vigas postensadas: 3 und


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2-dic-24 (Dia / Mes / Año)

5. Tablero y Diafragmas: Vaciados en concretos de 24.5 Mpa 4000 psi, dimensiones del tablero 8,5ml x 30 ml
6. Anden y Barrera new jersey: 30 ml, vaciados en concretos de 24.5 Mpa 4000 psi
7. Baranda metalica peatonal: 30 ml
8. Losas de aproximacion: 2 und de medidas 4.0m x 7.9m

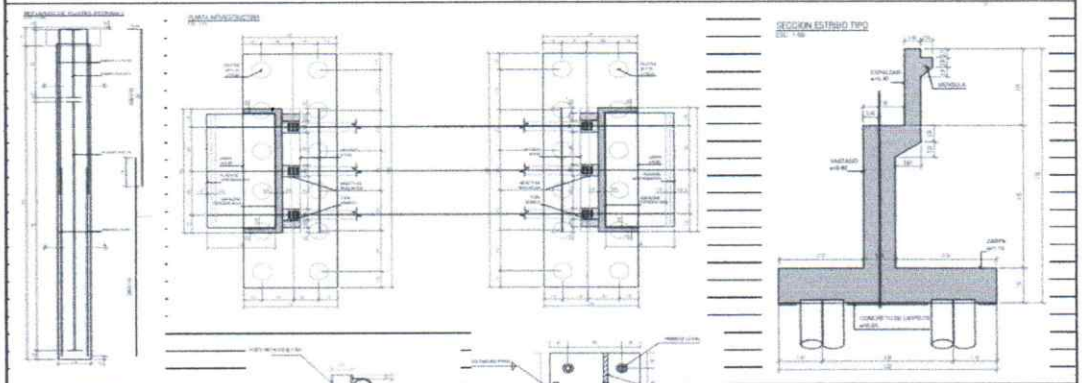





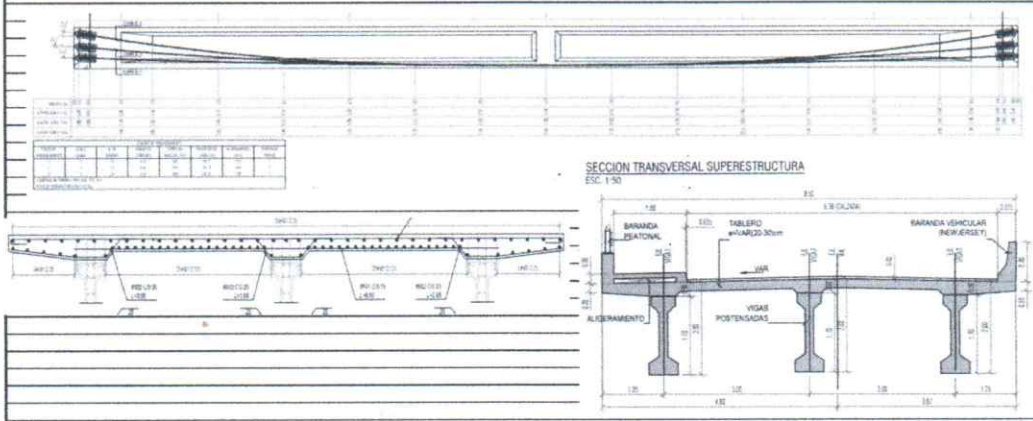

PROTECCION RIBERA DE QUEBRADA Y LA CIMENTACION DEL PUENTE

1. Longitud de tubo geotexil hydrotube ensamblado con geotextil hydrotex 150 = 320 m, lineas de 4 unidades
Abscisas: Costado Derecho K0+345 - K0+385, Costado Izquierdo K0+280 - K0+320
2. Area de manto antisocavación en hydrotex 95 = 3196m2, con anchos variables
Abscisas: Costado Derecho K0+280 - K0+390, Costado Izquierdo K0+280 - K0+325
3. Area de formaleta textil colchacreto articulado 1300 = 3016m2, con anchos promedio de 20,8 m
Abscisas: Costado Derecho K0+280 - K0+390, Costado Izquierdo K0+280 - K0+325
4. Construccion de colchagaviones para proteccion del fondo 0,4m de profundidad = 2 und de 13,5mide largo x 4.5 ml de ancho, en cada costado de la losa de fondo
5. Revestimiento en piedra pegada para protección de talud 0,4m de profundidad x 30m de largo x 5m de ancho y fondo de 0,6 m, area de proteccion de losa de fondo 30m x 15m

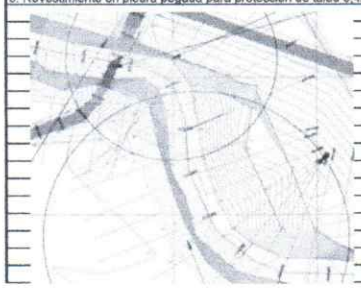





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2-dic-24 (Día / Mes / Año)

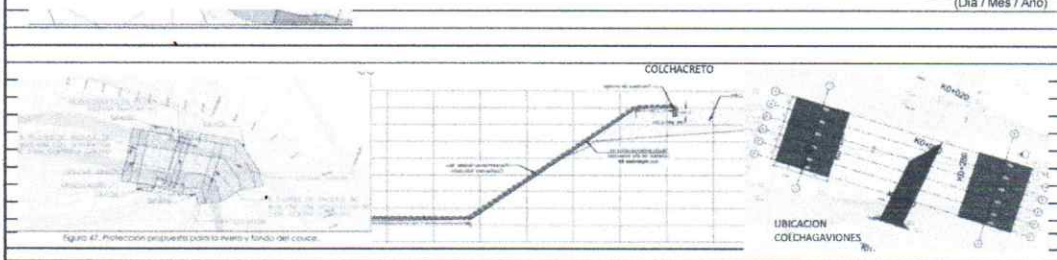



Figura 47. Protección propuesta para la pata y fondo del cauce.

PAVIMENTO RIGIDO HIDRAULICO MR40

1. Longitud de la via pavimento rígido Mr 40: 171,25 m, Abscisa K0+090 - K0+261,25 EJE 2 del diseño geometrico aprobado por el Municipio de Tierralta
2. Clasificación: Corredor vial terciario
3. Velocidad de diseño: 30 Km/h
4. Ancho de carril: 2,5 m
5. Cantidad de carriles: 2
6. Longitud de placa: 3m
7. bordillos dimension 0,15m x 0,4m longitud: 357,5m
8. Bombeo: 2%
9. Losa de concreto hidráulico MR 40, Espesor: 16 cm
10. Subbase Granular: 15 cm
11. Mejoramiento de la subrasante con terraplen: 15 cm
12. Señales Verticales:16 und

NOTA: EL DISEÑO GEOMETRICO QUE SE EJECUTO, FUE ESCOGIDO POR LA ALCALDIA DE TIERRALTA, ESTE NO TIENE EL AVAL DE LA INTERVENTORIA. EL APROBADO POR INTERVENTORIA REQUERIA LA ADQUISICION DE PREDIOS, Y LA ALCALDIA NO CONTABA CON RECURSOS PARA LA COMPRA.





RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	7.369.413.229,90
Valor IVA:	$	15.191.592,10
Valor total ejecutado del contrato:	$	7.384.604.822,00

AIU: 30 % **A:** 20 % **I:** 5 % **U:** 5 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2-dic-24 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. de Orden	CANTIDADES ORIGINALES (Corresponde a los ítems o productos contratados)					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INICIAL	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL FINAL
1.00	**EXPLANACIONES**						
1,01	Excavación en material común de la explaneación y canales	m3	660.00	$ 12,094.00	$ 7,982,040.00	556.83	$ 6,734,302.02
1,02	Terraplenes	m3	2364.00	$ 32,020.00	$ 75,695,280.00	6644.14	$ 212,745,362.80
1,03	Demolición de estructuras	m3	200.00	$ 222,122.00	$ 44,424,400.00	287.60	$ 63,882,287.20
	SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 128,101,720.00**		**$ 283,361,952.02**
2,00	**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M**						
2,01	Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	400.00	$ 79,452.00	$ 31,780,800.00	761.26	$ 60,483,829.52
2,02	Excavaciones varias en material común en seco .	m3	940.90	$ 74,410.00	$ 70,012,369.00	3819.71	$ 269,342,621.10
2,03	Subbase Granular Clase C.	m3	21.00	$ 296,822.00	$ 6,233,262.00	9.48	$ 2,813,872.56
2,04	Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	m3	34.00	$ 1,727,492.00	$ 58,734,728.00	56.37	$ 97,378,724.04
2,05	Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	m3	68.00	$ 1,500,674.00	$ 102,045,832.00	77.57	$ 116,407,282.18
2,06	Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	m3	250.00	$ 1,329,945.00	$ 332,486,250.00	327.35	$ 435,357,495.75
2,07	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	7.10	$ 660,145.00	$ 4,687,030.00	10.09	$ 6,660,863.05
2,08	Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)	m	444.00	$ 3,955,413.00	$ 1,756,203,372.00	456.00	$ 1,803,668,328.00
2,09	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	38987.00	$ 8,638.00	$ 336,769,706.00	44555.28	$ 384,868,508.64
2,10	Acero de PreEsfuerzo.	tf/m	58588.20	$ 2,409.00	$ 141,139,974.00	56381.20	$ 140,640,310.80
2,11	Apoyo elastometrico	und	6.00	$ 617,491.00	$ 3,704,946.00	10.00	$ 6,174,910.00
2,12	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	m	12.00	$ 1,141,807.00	$ 13,699,284.00	13.50	$ 15,411,694.50
2,13	Baranda metalica para trafico vehicular	m	60.00	$ 830,166.00	$ 49,809,960.00	30.00	$ 24,904,980.00
2,14	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	und	1.00	$ 77,542,211.00	$ 77,542,211.00	1.00	$ 77,542,211.00
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M				**$ 2,984,848,724.00**		**$ 3,441,655,431.14**
3,00	**PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.**						
3,01	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	m3	400.70	$ 770,531.00	$ 308,751,772.00	300.00	$ 231,159,300.00
3,02	Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	96.00	$ 389,394.00	$ 37,381,824.00	48.60	$ 18,924,548.40
3,03	Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)	m	144.00	$ 2,062,890.00	$ 297,056,160.00	134.60	$ 277,664,994.00
3,04	Material Granular Drenante	m3	186.00	$ 252,910.00	$ 47,041,260.00	90.00	$ 22,761,900.00
3,05	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1331.00	$ 9,399.00	$ 12,510,069.00	750.00	$ 7,049,250.00
	SUBTOTAL PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE				**$ 702,741,085.00**		**$ 557,559,992.40**
4,00	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**						
4,01	Subbase Granular Clase C.	m3	440.00	$ 296,822.00	$ 130,601,680.00	151.65	$ 45,013,056.30
4,02	Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	330.00	$ 213,578.00	$ 70,480,740.00	0.00	$ 0.00
4,03	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	400.00	$ 935,666.00	$ 374,266,400.00	0.00	$ 0.00
4,04	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	120.00	$ 770,236.00	$ 92,428,320.00	21.46	$ 16,529,264.56
4,05	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	6000.00	$ 8,638.00	$ 51,828,000.00	2893.02	$ 24,989,906.76
	SUBTOTAL PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO				**$ 719,605,140.00**		**$ 86,532,227.62**
5,00	**TRANSPORTE**						
5,01	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	340000.00	$ 1,807.00	$ 614,380,000.00	790,069.50	$ 1,427,655,586.50
	SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ 614,380,000.00**		**$ 1,427,655,586.50**
6,00	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**						
6,01	Linea de Demarcación con Pintura en Frio.	m	1200.00	$ 2,086.00	$ 2,503,200.00	0.00	$ 0.00
6,02	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75)cm	und	7.00	$ 561,555.00	$ 3,930,885.00	16.00	$ 8,984,880.00
6,03	Defensa Metálica	m	80.00	$ 177,857.00	$ 14,228,560.00	80.00	$ 14,228,560.00
6,04	Sección Final	und	4.00	$ 88,182.00	$ 352,728.00	0.00	$ 0.00
6,05	Captafaros	und	20.00	$ 16,439.00	$ 328,780.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				**$ 21,344,153.00**		**$ 23,213,440.00**
	ITEM NO PREVISTO						
NP1	Plan de izaje para viga postensada	und		$ 100,142,923.00		3.00	$ 300,428,769.00
NP2	Suministro e instalación de tubo geotextil hydrotube ensamblado con geotextil hydrotex 150, perimetro 9,0 m, altura máxima 1,60 m	m		$ 675,678.00		320.00	$ 216,216,960.00
NP3	Suministro e instalación de formaleta textil colchacreto articulado 1300	m2		$ 202,935.00		3016.00	$ 612,051,960.00
NP4	Suministro e instalación de manto antisocavación en hydrotex 95	m2		$ 41,734.00		3196.00	$ 133,381,864.00
NP5	Pavimento de concreto hidraulico MR 40	m3		$ 1,326,412.00		156.36	$ 207,398,374.55
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTO						**$ 1,469,477,927.55**
	AJUSTE AL PESO						**$ 924.77**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 5,171,020,822.00**		**$ 7,289,457,482.00**
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 152,879,720.00**		
	REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 51,012,000.00		$ 79,955,747.90
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 9,692,280.00		$ 15,191,592.10
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 60,704,280.00**		**$ 95,147,340.00**
	VALOR TOTAL				**$ 5,384,604,822.00**		**$ 7,384,604,822.00**

ANTICIPO

Valor total concedido:	$	1.615.381.446,60
Valor total amortizado:	$	1.615.381.446,60
Saldo por amortizar:	$	-

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	1.615.381.446,60
Valor total legalizado:	$	1.615.381.446,60
Saldo por legalizar:	$	-

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2-dic-24 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	abr-23	$ 1.832.972.138,40	$ 9.682.280,00	$ 1.842.654.418,40
2	jul-23	$ 1.048.130.835,14		$ 1.048.130.835,14
3	dic-23	$ 508.049.672,80		$ 508.049.672,80
4	abr-24	$ 281.273.139,07		$ 281.273.139,07
5	ago-24	$ 1.022.674.024,50		$ 1.022.674.024,50
6	sep-24	$ 1.299.929.205,72	$ 5.499.312,10	$ 1.305.428.517,82
7	dic-24	$ 1.376.394.214,27		$ 1.376.394.214,27
TOTALES		**$ 7.369.423.229,90**	**$ 15.181.592,10**	**$ 7.384.604.822,00**
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$ 7.384.604.822,00**		

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$ 7.369.423.230**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$ 15.181.592**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 7.384.604.822**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: [illegible] PETRO PETRO REYES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-128936 COR

Firma
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SALUM SEJIN
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.08202-57018 ATL

Firma
Nombre: JEISON STIVEN PACHECO ACOSTA
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202216600 COR

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
