Montelíbano, 21 de julio de 2023 CVN-517-2022

Doctora:
VANESSA LUCIA PATERNINA
SECRETARIA DE PLANEACION DE LOS CORDOBAS
Los Córdobas - Córdoba

REFERENCIA: LP- 007-2022 -CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL ".

ASUNTO: APROBACION SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS.

Apreciada Doctora Vanessa:

El contratista de obra Consorcio Mejoramiento Los Córdobas, quienes ejecutan el Contrato No. LP-007-2022 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021", mediante los oficios CMC-OBR-147-2023 y CMC-OBR-157-2023, ha presentado solicitud de prórroga por un término de dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, la nueva fecha de terminación sería el 30 de octubre de 2023, justificado básicamente en la ola invernal imperante durante la mayoría de los meses de este año en la región, falta de transitabilidad en las vías de acceso a las obras y a las fuentes de explotación de los materiales granulares (canteras); concluyendo que el plazo contractual resulta insuficiente para la ejecución de las metas físicas establecidas.

Una vez revisada la documentación anexa, la interventoría Consorcio Vial Nacional informa que considera conveniente y necesaria la autorización de la prórroga presentada por el contratista de obra Consorcio Mejoramiento Los Córdobas por los motivos expuestos en el comunicado CMC-OBR-157- 2023.

Concomitantemente, la interventora Consorcio Vial Nacional informa que, en cumplimiento de nuestras funciones, dado el atraso presentado con base a la reprogramación del programa de inversiones No 1, se solicitó al Municipio de Los Córdobas iniciar proceso sancionatorio en contra del contratista de obra CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS, mediante los comunicados CVN-358-2022 del 31 de marzo de 2023 y CVN-386-2022 del 17 de abril de 2023; no obstante, en aras de que el contratista de obra tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas del proyecto en beneficio del proyecto y de la comunidad directamente beneficiada, consideramos conveniente recomendar sea autorizada la solicitud de prórroga hasta el 30 de octubre de 2023.

No sobra advertir que el contratista Consorcio Mejoramiento los Córdobas tiene un atraso en la ejecución de las obras, por lo tanto, la solicitud de inicio de proceso sancionatorio que manifestamos mediante nuestros oficios CVN-358-2022 del 31 de marzo de 2023 y CVN-386-2022 del 17 de abril de 2023 continua vigente y el Municipio de los Córdobas debe continuar el trámite correspondiente.

Así las cosas, de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista de obras CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS, las revisiones y conciliaciones que se realizaron con esta interventoría, enviamos validados la siguiente documentación, para continuar con el trámite de legalización, por lo que anexamos:

1) CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA
2) MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG
3) MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERSION O REPROGRAMACIÓN No 3
4) Programación Contrato N° LP-007-2023_(Modificatorio N° 1)
5) DATOS PLUVIOMETRICOS MAYO Y JUNIO DE 2023 - ESTACION ARBOLETES
6) BITÁCORA
7) GARANTIAS CONTRACTUALES
8) ANEXO IDEAM DATOS PLUVIOMETRO

Cordialmente,

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

cc- - Ing. Néstor Lemus – Supervisor del Contrato INVIA
- Ing. Oscar Carrascal– Consorcio Mejoramiento los Córdobas.

CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

Montería, 12 de julio de 2023

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN ELIECER VILLALOBOS
Director de Interventoría

CMC-OBR-157-2023

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mejoramiento Los Córdobas, en vista de que el contrato de obra tiene fecha de finalización del 30 de agosto de 2023, y teniendo en cuenta los impedimentos que han incidido directamente en la correcta ejecución de los plazos contractuales, solicitamos valorar la aprobación de prórroga al contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

1. Que se celebró el contrato de obra N°LP-007-2022 entre el municipio Los Córdobas – Córdoba y Consorcio Mejoramiento Los Córdobas NIT 901608115-8 de objeto ""MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

2. Que en el comité realizado el día 01 de junio del 2023, la interventoría y la Secretaria De Planeación Municipal, manifiestan su preocupación por el atraso de las actividades en obra, por lo que este consorcio informó mediante oficio N° CMC-OBR-137-2023 del 07 de junio de 2023, que se ha venido presentando un incremento en la lluvias a partir del día 10 de mayo de 2023, principalmente en las horas de la tarde – noche, las cuales han afectado significativamente y han retrasado la programación y correcta ejecución de las actividades de obra, y que continúan siendo una constante a partir de la fecha mencionada hasta la fecha de la presente solicitud de prórroga (Ver anexo de bitácora). Como resumen se tiene un total de 19 días no laborados o medianamente laborados por las fuertes precipitaciones en el corredor vial del proyecto.

3. Que otro factor que continúa generando atrasos en las actividades del proyecto, ha sido el acceso de las volquetas a la obra, teniendo en cuenta que las lluvias han deteriorado algunos tramos de vía entre La Salada y Nuevo Nariño, retrasando hasta 3 días el acceso de los materiales granulares a la obra. Sumado a esto, se ha venido presentando retraso en la entrega de materiales por parte de las canteras autorizadas, por la alta demanda de


suministro de material granular, generando así múltiples impedimentos no sólo en la disposición de material en obra, sino también, la cantidad de viajes de material despachados. Sin embargo, el consorcio contratista en aras de optimizar los tiempos, el suministro de material y mejorar el acceso a la obra, ha venido realizando acopios de material, como también arreglos en los puntos críticos de la vía, mientras se ha tenido la disponibilidad de la maquinaria, sin generarse mayores atrasos a las actividades propias del contrato de obra; como también, ha realizado suministros de material granular de canteras como JOMEVE, que se encuentra ubicada en la vía que conduce de Montería a Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba, aproximadamente a 108 kilómetros de distancia del punto de acopio de materiales del proyecto en mención; incrementando así en un 43% la actividad de Transporte de material, por el aumento significativo en la unidad M3/KM de cada viaje; Dado que dicho incremento no sería reconocido por parte de la interventoría o ente territorial, este está siendo asumido en su totalidad por el contratista de obra.

4. Que todas estas circunstancias se colocan en manifiesto, en busca de generar el contexto general en el cual se lleva a cabo en la actualidad la ejecución del contrato; validando los atrasos representativos que se están presentado no imputables en su totalidad al contratista, a su vez para el pleno conocimiento de la Interventoría y la entidad contratante de dichas condiciones; que si bien se han generado mejoramientos sobre algunos puntos críticos, realizados estos a nuestra costas, y se ha realizado suministro de material de canteras retiradas a más de 108 kilómetros del proyecto, las lluvias que se han presentado desde la fecha citada continúan impidiendo el acceso a la zona, al mismo tiempo retrasan en la misma proporción la ejecución de actividades sobre el tramo de intervención y del contrato en su totalidad.

5. Que es menester señalar que, como contratistas de obra, hemos aprovechado al máximo todo el tiempo seco que hemos tenido, incluso, extendiendo la jornada laboral hasta el día domingo, con el fin de cumplir con la programación de obra (Ver anexo de bitácora de obra), y se mantenga un buen desarrollo de las actividades del proyecto. Adicionalmente, se tiene por motivo de temporada de lluvias un total de 19 días no laborados y medianamente laborados, constituyendo un atraso significativo por lluvias a partir del 10 de mayo de 2023.

6. Que a corte del 29 de junio de 2023, según programación del contrato de obra, tiene un porcentaje ejecutado acumulado del 30,94%, un porcentaje programado del 77,51%, por ende, un atraso del 46,57%, sin embargo, teniendo en cuenta el manual de interventoría de INVIAS en el instructivo para programa de obra, programa de inversiones, reprogramación y seguimiento al programa de inversiones, en el numeral 11. Expresa: *"Cuando se va a estudiar una solicitud de reprogramación y existe un atraso en el Programa de Inversiones, el Interventor con base en el desarrollo de las obras y los documentos de ejecución del contrato, determina la imputabilidad de cada una de las partes, que se pueden enmarcar en alguna de las siguientes situaciones: (…) B. Responsabilidad compartida. En este caso, el punto de partida de la nueva curva se define teniendo en cuenta el porcentaje de*

responsabilidad de cada una de las partes, tal como se ilustra en el siguiente esquema"

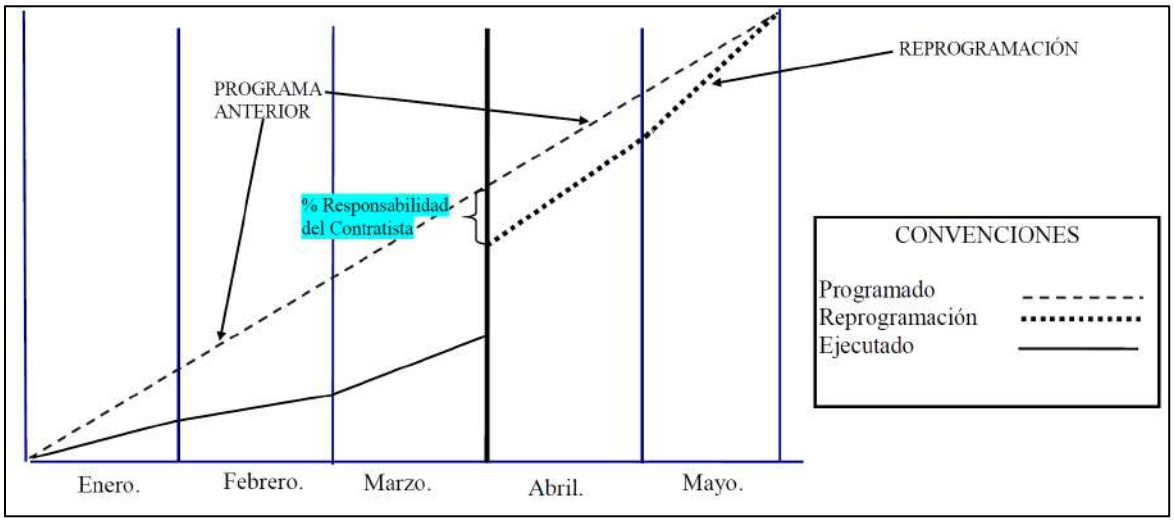

Fuente: manual de interventoría obra pública (INVIAS)

Donde se argumenta que: los atrasos presentados no son en su totalidad atribuibles al contratista de obra, con base en lo expuesto en la presente solicitud de prórroga y lo consignado en el comité de obra N°16 donde la interventoría manifiesta que la reprogramación del programa de inversión iniciará con un 10% menos del programado acumulado de la fecha de presentación del formato. Es decir, que la nueva reprogramación iniciaría con un 36,57% aproximadamente de atraso a partir del 01 de julio de 2023 (Ver reprogramación y formato de inversiones y flujo de obra).

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Que la presente solicitud de prórroga, no constituye requerimiento de mayores recursos ni modificaciones al alcance actual del proyecto, ya que actualmente el proyecto cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutar a cabalidad las metas físicas del proyecto sin requerir una adición.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Que la presente solicitud de prórroga es viable de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia y la normatividad vigente sobre la materia, y de llegar a aprobarse, esta no concurre ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas, la entidad contratante podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 9 ibídem, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Que para la ejecución de las actividades del contrato de obra, la entidad contratante dispuso la suma de $8.995.701.673,00, para ejecución presupuestal del proyecto. Y la presente solicitud de prórroga no representa modificaciones al presupuesto ni a las cantidades de obra.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Que la presente solicitud de prórroga continúa cumpliendo con los parámetros sociales que exige la entidad contratante y la norma técnica que lo regule, no viéndose afectada la premisa de lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad perteneciente al área de fluencia del proyecto, de los campesinos y demás personas que utilizan esta vía para desplazarse, dinamizando la economía rural, agilizando la distribución de los productos, incrementando la competitividad en los mercados regionales, facilitando el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos, promoviendo de igual manera la equidad social, cuidando la seguridad vial, disminuyendo los tiempos de desplazamiento hacia el caso urbano y viceversa, y además, disminuyendo los costos de transporte.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo a las actividades que proporcionan el alcance de este contrato, no requiere licenciamiento ambiental, en este sentido y atendiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y las obligaciones contractuales se continuarán implementando medidas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas con base a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial (2011). el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS continuará implementando el instrumento de planificación ambiental denominado PAGA, de acuerdo a lo que establece INVIAS en su guía ambiental para este tipo de proyectos; teniendo en cuenta la naturaleza; el área de construcción y la zona de influencia del proyecto; la normatividad existente y vigente que aplica para este tipo de proyectos.
El alcance de este instrumento de planificación es aplicable a todas las actividades que se desencadenen durante la ejecución de obra y que estén contenidos en el objeto contractual, contiene la descripción del proyecto, las actividades u obras a acometer, los recursos a demandar, la descripción del área de influencia directa (caracterización física, biótica y socioeconómica), la identificación de los impactos ambientales, descripción los programas socio-ambientales que determinarán las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra, enfocados al manejo, seguimiento, prevención y contingencia de los mismos, sin afectar ni alterar de forma invasiva o destructiva el medio ambiente a lo largo y ancho del corredor vial a construir, priorizando la conservación de fauna y flora existentes.

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

Por tal motivo, teniendo en cuenta que el 30 de agosto del 2023 vence el plazo para ejecutar al 100% el contrato de obra, siendo este actualmente físicamente imposible de alcanzar dentro de los tiempos contractuales, adicionalmente, que los atrasos significativos del proyecto no son atribuibles en su totalidad a la voluntad del contratista, y demás argumentos que acompañan la presente solicitud, nos permitimos solicitarle muy amablemente se realice una prórroga por dos (02) meses adicionales al contrato de obra, contados a partir de la fecha actual de finalización del contrato.

A continuación, se anexa:

- Copia de la bitácora firmada por las partes.
- Tabla relacionando días y horario de lluvia y días no laborados producto de las precipitaciones.
- Registro fotográfico del estado de la vía en los días de lluvia y días posteriores a las precipitaciones por mal estado de la vía de acceso.
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 - Programa de obra actualizado.
- Formato Estado General del Tiempo (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10), anexando el Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2023, de la Estación más cercana y en funcionamiento al corredor vial del proyecto (ARBOLETES [12045010])
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento garantías contractuales contrato de obra
- Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado ajustados hasta el 30 de octubre de 2023.

Cordialmente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Consorcio Mejoramiento Los córdobas
Representante Legal

Con copia a:

Secretaría de Planeación municipal – Alcaldía de Los Córdobas, Córdoba.

Supervisor Convenio Interadministrativo – INVIAS.

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

ANEXO TABLA DE PRECIPITACIONES

ESTADO DEL TIEMPO (PRECIPITACIONES) Y AFECTACIONES POR ESTAS			
FECHA	HORA		OBSERVACIÓN
	DESDE	HASTA	
10 de mayo de 2023	5:30 a.m	9:30 m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
15 de mayo de 2023	3:30 a.m	9:30 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
22 de mayo de 2023	-	-	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias en la madrugada
23 de mayo de 2023	-	-	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias del día anterior (terreno saturado)
24 de mayo de 2023	-	-	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias en la madrugada y en la tarde
25 de mayo de 2023	-	-	No se realizaron actividades de avance físico de obra en la mañana debido a las fuertes lluvias del día anterior (terreno saturado)
26 de mayo de 2023	1:00 p.m	-	Se realizaron actividades sólo en horas de la mañana debido a las fuertes lluvias en la tarde.
27 de mayo de 2023	-	-	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias del día anterior (terreno saturado)
29 de mayo de 2023	1:00 p.m	-	Se realizaron actividades sólo en horas de la mañana debido a las fuertes lluvias en la tarde.
30 de mayo de 2023	3:30 p.m	-	Se realizaron actividades desde las 10:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., debido a las fuertes lluvias del día anterior y del presente día en la tarde.
31 de mayo de 2023	-	-	Se realizaron actividades desde las 11:00 a.m debido a mañana debido a las fuertes lluvias del día anterior
07 de junio de 2023	10:00 a.m	11:00 a.m	Se realizaron actividades desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., debido a las fuertes lluvias.
07 de junio de 2023	2:30 a.m	4:00 p.m	
08 de junio de 2023	11:00 a.m	12:30 p.m	Se realizaron actividades desde las 7:00

			a.m. hasta las 11:00 a.m., se suspendió debido a las lluvias. Se retomó nuevamente a las 2:30 p.m
12 de junio de 2023	11:30 a.m	2:00 a.m	Se realizaron actividades desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., se suspendió debido a las lluvias.
13 de junio de 2023	-	-	Se realizaron actividades a partir de las 9:30 a.m debido a lluvias del día anterior.
15 de junio de 2023	11:30 p.m	4:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias desde la noche anterior hasta horas en la madrugada
16 de junio de 2023	1:00 p.m	1:30 p.m	
16 de junio de 2023	7:00 p.m	12:00 p.m	
17 de junio de 2023	12:00 a.m	4:30 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias desde la noche anterior hasta horas en la madrugada
23 de junio de 2023	2:00 a.m	5:00 a.m	Se realizaron actividades a partir de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la madrugada

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8









Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba


29/05/2023 2:42:44 p. m.
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS


30/05/2023 8:08:13 a. m.
8°48'19,19646"N -76°18'41,8044"W
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS


12/06/2023 12:41:29 p. m.
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS
TRAMO 6 (K2+298 - K2+320)


12/06/2023 11:46:40 a. m.
8°48'4,33224"N -76°19'44,1729"W
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS
TRAMO 6 (K2+298 - K2+320)

MEPI-MN1-IN-12-FR-1
SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORROGA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-jun-23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. LP 007-2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2022 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/04/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA N° 1

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	6/01/2023	31/12/2022	30/08/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/08/2023 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 8.995.701.673,00 **50% EN SMMLV:** 3877,5 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.995.701.673,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 1 de fecha 30 de junio de 2023, el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Solicitud de adicion en tiempo de dos (2) meses, es decir, hasta el 30 de octubre de 2023

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-jun-23
(Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Construcción de pavimento flexible entre las abscisas k0+00 al K0+273 , K0+470 al K0+598, K0+669 al K1+040, K1+450 al k1+540, K1+648 al k2+208, K2+298 al K3+435, K4+335 al K4+951, K5+150 al K5+415, del K5+535 al K6+019, para un promediol de 3,6 kilómetros aproximadamente en pavimento flexible, 218 metros lineales de placa huella, 9 obras hidráulicas

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 30,94% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 77,51%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 6.889.071.000,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 2.749.813.633,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 2.768.768.429,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 3.598.280.669,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 3.598.280.669,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 6.226.933.244,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La presente solicitud de prórroga se justifica en que:
1. Que en el comité realizado el día 01 de junio del 2023, la interventoría y la Secretaria De Planeación Municipal, manifestaron su preocupación por el atraso de las actividades en obra, por lo que este consorcio informó mediante oficio N° CMC-OBR-137-2023 del 07 de junio de 2023, que se ha venido presentando un incremento en la lluvias a partir del día 12 de mayo de 2023, principalmente en las horas de la tarde – noche, las cuales han afectado significativamente y han retrasado la programación y correcta ejecución de las actividades de obra, y que continúan siendo una constante a partir de la fecha mencionada hasta la fecha de la presente solicitud de prórroga (Ver anexo de bitácora). Como resumen se tiene un total de 19 días no laborados o medianamente laborados por las fuertes precipitaciones en el corredor vial del proyecto.

2. Que otro factor que continúa generando atrasos en las actividades del proyecto, ha sido el acceso de las volquetas a la obra, teniendo en cuenta que las lluvias han deteriorado algunos tramos de vía entre La Salada y Nuevo Nariño, retrasando hasta 3 días el acceso de los materiales granulares a la obra. Sumado a esto, se ha venido presentando retraso en la entrega de materiales por parte de las canteras autorizadas, por la alta demanda de suministro de material granular, generando así múltiples impedimentos no sólo en la disposición de material en obra, sino también, la cantidad de viajes de material despachados. Sin embargo, el consorcio contratista en aras de optimizar los tiempos, el suministro de material y mejorar el acceso a la obra, ha venido realizando acopios de material, como también arreglos en los puntos críticos de la vía, mientras se ha tenido la disponibilidad de la maquinaria, sin generarse mayores atrasos a las actividades propias del contrato de obra; como también, ha realizado suministros de material granular de canteras como JOMEVE, que se encuentra ubicada en la vía que conduce de Montería a Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba, aproximadamente a 108 kilómetros de distancia del punto de acopio de materiales del proyecto en mención; incrementando así en un 43% la actividad de Transporte de material, por el aumento significativo en la unidad M3/KM de cada viaje; Dado que dicho incremento no sería reconocido por parte de la interventoría o ente territorial, este está siendo asumido en su totalidad por el contratista de obra.

3. Que todas estas circunstancias se colocan en manifiesto, en busca de generar el contexto general en el cual se lleva a cabo en la actualidad la ejecución del contrato; validando los atrasos representativos que se están presentado no imputables en su totalidad al contratista, a su vez para el pleno conocimiento de la Interventoría y la entidad contratante de dichas condiciones; que si bien se han generado mejoramientos sobre algunos puntos críticos, realizados estos a nuestra costas, y se ha realizado suministro de material de canteras retiradas a más de 108 kilómetros del proyecto, las lluvias que se han presentado desde la fecha citada continúan impidiendo el acceso a la zona, al mismo tiempo retrasan en la misma proporción la ejecución de actividades sobre el tramo de intervención y del contrato en su totalidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30-jun-23
	(Día / Mes / Año)

JURÍDICA:

Que la presente solicitud de prórroga es viable de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia y la normatividad vigente sobre la materia, y esta no concurre ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas la entidad contratante podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 9 ibídem, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

la presente solicitud de prórroga, no constituye requerimiento de mayores recursos ni modificaciones al alcance actual del proyecto, ya que actualmente el proyecto cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutar a cabalidad las metas físicas del proyecto sin requerir una adición.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Que para la ejecución de actividades la entidad contratante dispuso la suma de $8.995.701.673,00, para ejecución presupuestal del proyecto.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

La presente solicitud de prórroga continúa cumpliendo con los parámetros ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad que exige la entidad contratante y la norma técnica que lo regule, no viéndose afectada la premisa de lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad perteneciente al área de fluencia del proyecto, de los campesinos y demás personas que utilizan esta vía para desplazarse, dinamizando la economía rural, agilizando la distribución de los productos, incrementando la competitividad en los mercados regionales, facilitando el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos, promoviendo de igual manera la equidad social, cuidando la seguridad vial, disminuyendo los tiempos de desplazamiento hacia el caso urbano y viceversa, y además, disminuyendo los costos de transporte.

También de acuerdo a las actividades que proporcionan el alcance de este contrato, no requiere licenciamiento ambiental, en este sentido y atendiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y las obligaciones contractuales se continuarán implementando medidas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas con base a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial (2011). el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS continuará implementando el instrumento de planificación ambiental denominado PAGA, de acuerdo a lo que establece INVIAS en su guía ambiental para este tipo de proyectos; teniendo en cuenta la naturaleza; el área de construcción y la zona de influencia del proyecto; la normatividad existente y vigente que aplica para este tipo de proyectos.

El alcance de este instrumento de planificación es aplicable a todas las actividades que se desencadenen durante la ejecución de obra y que estén contenidos en el objeto contractual, contiene la descripción del proyecto, las actividades u obras a acometer, los recursos a demandar, la descripción del área de influencia directa (caracterización física, biótica y socioeconómica), la identificación de los impactos ambientales, descripción los programas socio-ambientales que determinarán las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra, enfocados al manejo, seguimiento, prevención y contingencia de los mismos, sin afectar ni alterar de forma invasiva o destructiva el medio ambiente a lo largo y ancho del corredor vial a construir, priorizando la conservación de fauna y flora existentes.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

•Copia de la bitácora firmada por las partes.
•Tabla relacionando días y horario de lluvia y días no laborados producto de las precipitaciones.
•Registro fotográfico del estado de la vía en los días de lluvia y días posteriores a las precipitaciones por mal estado de la vía de acceso.
•Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 - Programa de obra actualizado.
•Formato Estado General del Tiempo (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10), anexando el Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2023, de la Estación más cercana y en funcionamiento al corredor vial del proyecto (ARBOLETES [12045010])

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: **ANDRES FELIPE RACERO YANCE**
ALCALDE
Municipio de Los Córdobas

Firma
Nombre: **VANESSA LUCIA PATERNINA GONZÁLEZ**
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Municipio de Los Córdobas

Firma
Nombre: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio mejoramiento Los Córdobas
CONTRATISTA

Firma
Nombre: **JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Consorcio Vial Nacional

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

MEPI-MN1-IN-6-FR-1
REPROGRAMACIÓN No 3

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30 / 6 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☒

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No: 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-007-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.995.701.673,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.995.701.673,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Noviembre de 2022	2 Diciembre de 2022	3 Enero de 2023	4 Febrero de 2023	5 Marzo de 2023	6 Abril de 2023	7 Mayo de 2023	8 Junio de 2023	9 Julio de 2023	10 Agosto de 2023	11 Septiembre de 2023	12 Octubre de 2023
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos													
EXPLANACIONES	$ 190.942	2,15%	1,66%	% P	0,18%	0,20%	0,20%	0,19%	0,21%	0,17%	0,35%	0,37%	0,13%	0,23%	0,05%	0,02%
	$ 205.353	2,31%	$ 147.877	$ P	$ 15.788	$ 17.922	$ 17.922	$ 17.069	$ 18.775	$ 15.362	$ 31.077	$ 33.078	$ 11.925	$ 20.456	$ 4.405	$ 1.473
				$ E	$0	$0	$6.211	$30.757	$33.599	$48.199	$14.434	$14.678	$0	$0	$0	$0
				% E												
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	$ 4.202.053	47,28%	18,26%	% P	1,79%	2,57%	2,57%	2,45%	4,38%	6,14%	$ 0,07	6,28%	1,22%	1,44%	2,34%	1,31%
	$ 3.540.025	39,83%	$ 1.623.260	$ P	$ 159.002	$ 228.308	$ 228.308	$ 217.436	$ 389.102	$ 545.693	$ 653.404	$ 558.041	$ 108.139	$ 127.943	$ 207.943	$ 116.628
				$ E	$0	$0	$0	$287.406	$164.073	$254.335	$490.904	$426.543	$0	$0	$0	$0
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 2.563.766	28,85%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	4,21%	2,79%	3,85%	3,85%	3,78%
	$ 2.107.197	23,71%	$0	$ P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.111	$ 374.151	$ 336.443	$ 341.858	$ 341.858	$ 336.775
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 1.496.866	16,84%	0,89%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,42%	5,15%	1,53%	1,58%	0,34%	3,05%
	$ 1.339.221	15,07%	$ 79.254	$ P							$ 303.603	$ 458.004	$ 135.604	$ 140.404	$ 30.404	$ 271.203
				$ E	$0	$0		$107.366	$73.768		-$101.880	$0				
				% E												
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$ 82.030	0,92%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%
	$ 69.965	0,79%	$0	$ P	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.965
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E												
TRANSPORTE	$ 352.227	3,96%	8,05%	% P	0,96%	1,15%	1,15%	1,09%	1,20%	0,99%	1,35%	2,47%	0,98%	0,84%	0,50%	0,25%
	$ 1.148.588	12,92%	$ 715.719	$ P	$ 85.131	$ 102.157	$ 102.157	$ 97.292	$ 107.021	$ 87.563	$ 120.286	$ 219.875	$ 84.881	$ 74.969	$ 44.969	$ 22.472
				$ E	$0	$0	$0	$146.892	$133.506	$294.420	$69.858	$71.042				
				% E												
ITEMS NP	$ -	0,00%	1,85%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,48%	2,25%	0,00%	0,00%	0,57%	0,07%
	$ 477.536	5,37%	$ 164.749	$ P							$ 220.000	$ 200.000			$ 51.013	$ 6.624
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148.885	$15.864	$0	$0	$0	$0
				% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 8.887.884**															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 8.887.884**															

100% / 50% / 0%

Reprogramación No.1 — Reprogramación No. 2 — Reprogramación No. 3

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,92%	3,92%	3,92%	3,73%	5,79%	7,30%	19,19%	20,74%	7,62%	7,94%	7,66%	9,27%
	VALOR (Miles de Pesos)	$259.921	$348.387	$348.387	$331.797	$514.976	$648.617	$1.705.497	$1.843.150	$676.992	$705.530	$680.492	$824.138
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,92%	6,84%	10,76%	14,50%	20,29%	27,59%	46,78%	67,52%	75,13%	83,07%	90,73%	100,00000%
	VALOR (Miles de Pesos)	$259.921	$608.307	$956.694	$1.288.491	$1.803.467	$2.452.085	$4.157.582	$6.000.731	$6.677.723	$7.383.254	$8.063.746	$8.887.884
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,07%	6,44%	4,56%	6,72%	7,00%	5,94%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$6.211	$572.421	$404.945	$596.954	$622.200	$528.127				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	1,25%	6,51%	11,07%	17,78%	24,78%	30,73%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$6.211	$578.632	$983.577	$1.580.531	$2.202.732	$2.730.859				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS:	$ 85.579,54	$ -	%
	$ -		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.954,80	$ 18.954,80	100%
	$ 18.954,80		
CARACTERIZACIÓN VIAL :	$ 3.283,00	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 107.817,34	$ 18.954,80	17,58%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 107.817,34		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.995.701,67**	**$ 2.730.858,84**	**30,73%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 8.995.701,67**		

NOTAS :

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

La presente reprogramación No. 3 se realiza bajo la consideración de la solicitud de prórroga N°2 al contrato de obra por dos meses adicionales, La reprogramacion del programa de inversion N° 3 inicia el dia 01 de julio de 2023 y finaliza el 30 de octubre de 2023.

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202 -183036 COR

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Revisó Firma:
Nombre: VANESSA LUCIA PATERNINA GONZALEZ
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA - ENTE TERRITORIAL
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


PROGRAMACIÓN OBRA
CONTRATO N°LP-007-2023

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialrural2022@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Contrato N° LP-007-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2022
1		**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y**	**$8.887.884.333,00**	**247,63 días**	**jue 25/08/22**	**mié 30/08/23**		
2		INICIO	$0,00	0 días	jue 25/08/22	jue 25/08/22		
3		**EXPLANACIONES**	**$205.352.598,00**	**169 días**	**mié 2/11/22**	**jue 13/07/23**		
4		Excavación en material común de	$186.474.490,00	139 días	mié 2/11/22	mar 4/07/23	37FC+1 día	
5		Terraplenes	$18.878.108,00	139 días	jue 10/11/22	jue 13/07/23	4CC+5 días	
6		**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**	**$3.560.025.065,00**	**194,63 días**	**mar 8/11/22**	**lun 28/08/23**		
7		Afirmado (Material para	$789.858.125,00	140 días	mar 8/11/22	vie 25/08/23	4CC+3 días	
8		Subbase Granular Clase B.	$1.412.048.484,00	140 días	mié 9/11/22	lun 28/08/23	7CC+1 día	
9		Base Granular Clase B	$1.158.976.416,00	140 días	jue 17/11/22	mié 23/08/23	8CC+5 días	
10		Geotextil para separación de	$199.142.040,00	170 días	mar 15/11/22	vie 25/08/23	8CC+3 días	
11		**PAVIMENTOS ASFALTICOS**	**$2.107.196.895,00**	**185 días**	**jue 24/11/22**	**mar 29/08/23**		
12		Riego de imprimación con	$79.492.962,00	144 días	jue 24/11/22	mar 29/08/23	9CC+5 días	
13		Mezcla denza en caliente tipo	$2.027.703.933,00	144 días	vie 25/11/22	mar 29/08/23	12CC+1 día	
14		**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**$1.339.221.102,00**	**114,63 días**	**lun 6/03/23**	**mar 29/08/23**		
15		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó	$825.168.654,00	90 días	lun 6/03/23	mar 29/08/23	12CC+70 días	
16		ACERO DE REFUERZO FY = 4.200	$514.052.448,00	88 días	lun 6/03/23	lun 28/08/23	12CC+70 días	
17		**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**$69.964.571,00**	**44,63 días**	**jue 22/06/23**	**mié 30/08/23**		
18		Línea de Demarcación con Pintura	$29.974.176,00	36 días	jue 22/06/23	mié 30/08/23	13CC+140 días	

CONTRATO N°: LP-007-2022
Fecha: ABRIL 20 DE 2022
REPROGAMACIÓN MODIF. N° 1

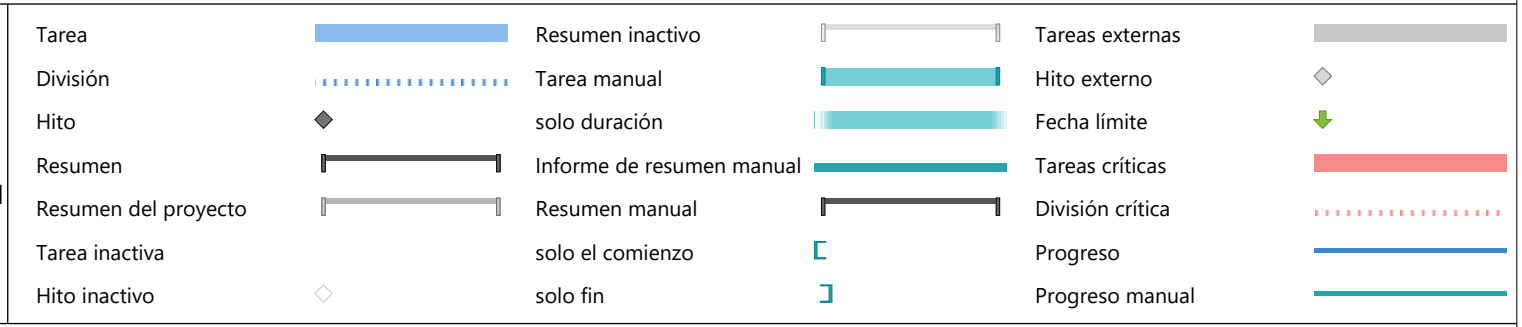


CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBA
LUIS F. MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA - CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

Contrato N° LP-007-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 1, 2022
19		Señal Vertical de Transito tipo 1	$39.990.395,00	36 días	jue 22/06/23	mar 29/08/23	13CC+140 días	
20		**TRANSPORTE**	**$1.128.588.047,00**	**181,63 días**	**jue 3/11/22**	**jue 3/08/23**		
21		Transporte de materiales	$1.128.588.047,00	155 días	jue 3/11/22	jue 3/08/23	4CC+1 día	
22		**ITEMS NP**	**$477.536.055,00**	**75 días**	**mar 25/04/23**	**jue 17/08/23**		
23		GEOTEXTIL TIPO NT 2000 PARA	$18.062.429,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
24		EXCAVACIONES VARIAS EN	$60.722.025,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
25		TUBERIA PVC PERFORADA DE 4"	$17.503.506,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
26		MATERIAL GRANUELAR DRENATE	$80.189.040,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
27		CONCRETO SIMPLE F´C 2.000 PSI	$6.907.186,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
28		DEMOLICION DE ESTRUCTURA	$1.667.864,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
29		MEJORAMIENTO CON PIEDRA	$5.389.952,40	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
30		MATERIAL DE COBERTURA	$110.115.711,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
31		CONCRETO CICLOPEO DE FC 2000	$30.160.092,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
32		CONCRETO DE RESISTENCIA F´c=	$13.358.320,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
33		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa	$94.223.193,60	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
34		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa	$39.236.736,00	75 días	mar 25/04/23	jue 17/08/23	10CC+110 días	
35		**OTROS COMPONENTES**	**$0,00**	**247 días**	**jue 25/08/22**	**mar 29/08/23**		
39		FIN	$0,00	0 días	mié 30/08/23	mié 30/08/23	13;18;19;38;15;16;	


CONTRATO N°: LP-007-2022
Fecha: ABRIL 20 DE 2022
REPROGAMACIÓN MODIF. N° 1

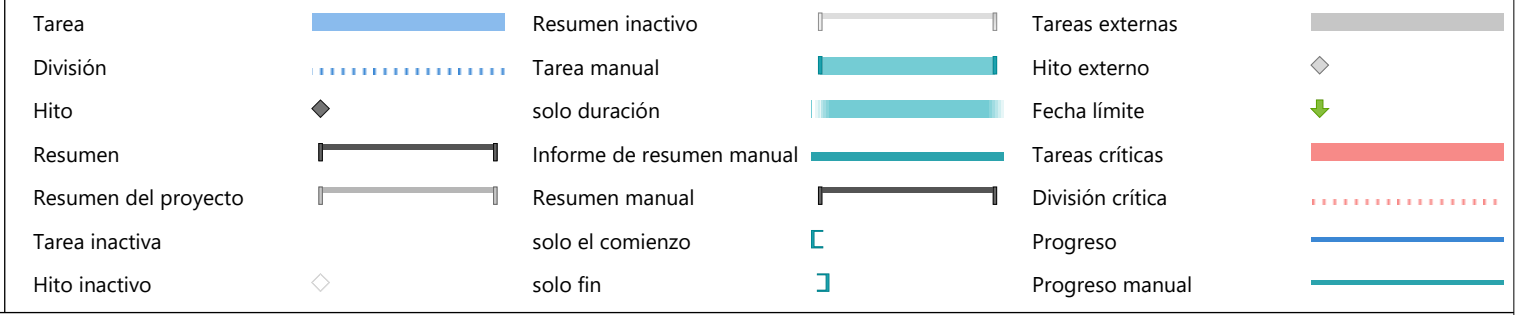

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBA
LUIS F. MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA - CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

Contrato N° LP-007-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

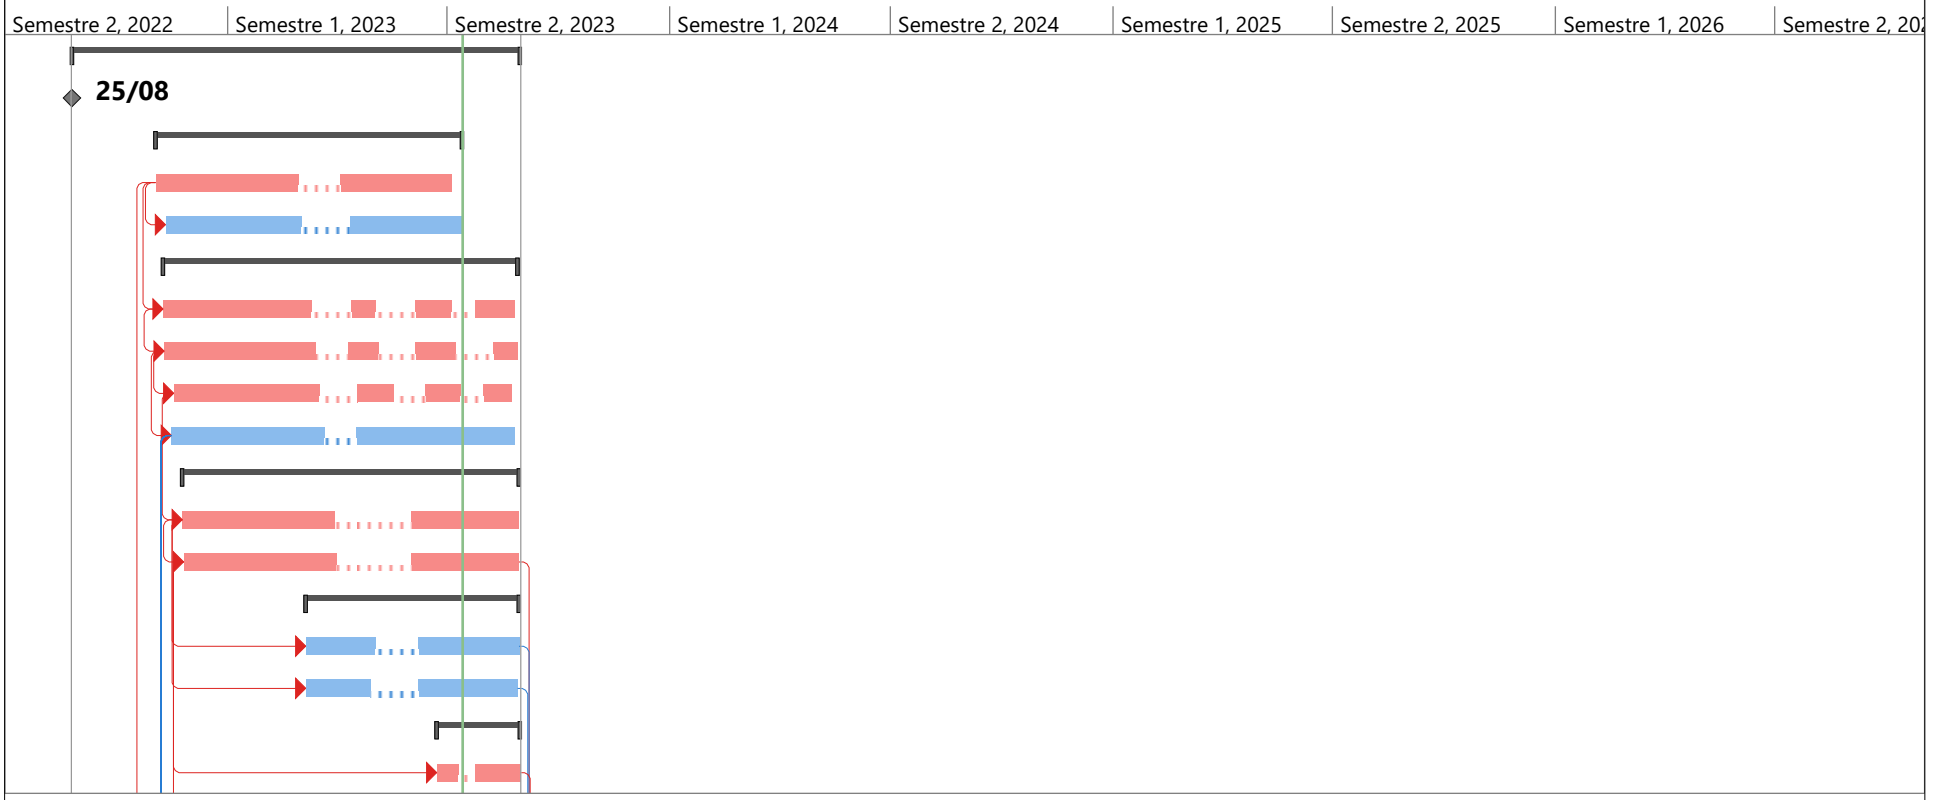


CONTRATO N°: LP-007-2022
Fecha: ABRIL 20 DE 2022
REPROGAMACIÓN MODIF. N° 1

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBA
LUIS F. MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA - CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

Contrato N° LP-007-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

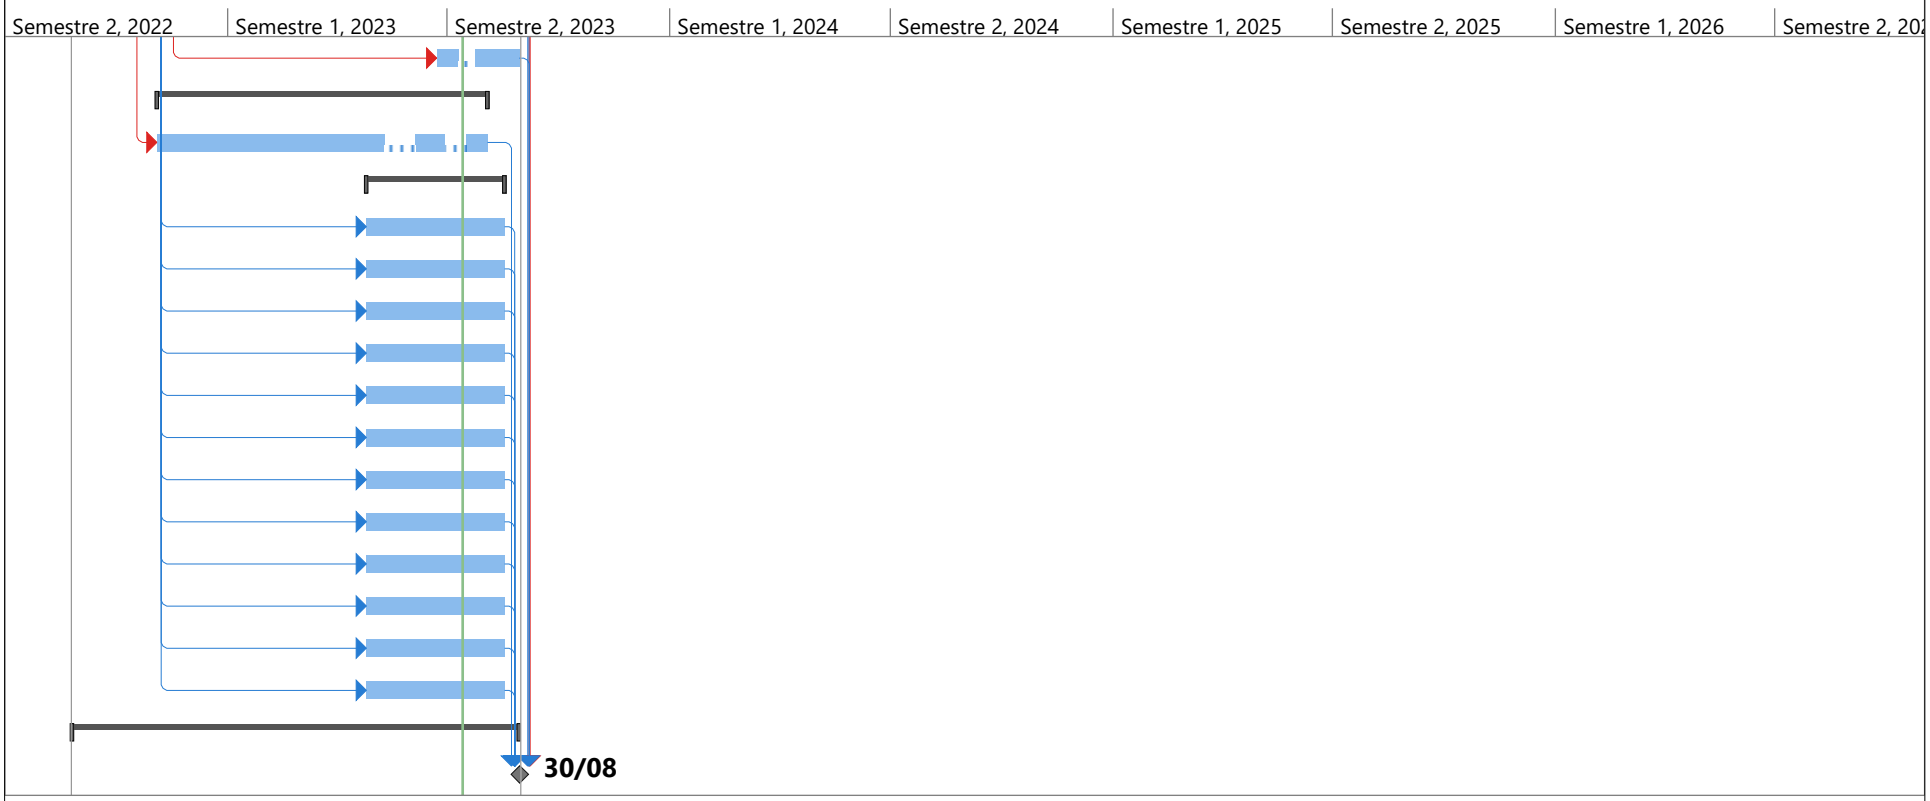

CONTRATO N°: LP-007-2022
Fecha: ABRIL 20 DE 2022
REPROGAMACIÓN MODIF. N° 1

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBA
LUIS F. MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA - CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-12
SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

LP-MM-007-2022
MUNICIPIO DE LOS CORDOBA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP 007 2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

FECHA DE INICIO: 25/08/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/08/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.995.701.673,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.995.701.673,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.954.796,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 899.570.167,30	25	8	2022	30	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 3.598.280.669,20	25	8	2022	30	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 899.570.167,30	25	8	2022	30	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2.698.710.501,00	31	12	2022	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.698.710.501,00	24	2	2023	24	2	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264620

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA			VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Predios, labores y operaciones	10%	$ 500.000.000,00	28	8	2022	30	8	2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 500.000.000,00	28	8	2022	30	8	2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 500.000.000,00	25	8	2022	30	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40-101079887 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

(POLIZA DE SEGUROS)

En el Municipio de Los Córdobas, el día dieciséis (16) del mes de enero de 2023 se procede a aprobar la póliza de cumplimiento No. 15-44-101264620 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 15-40-101079887 vigencia actualizada por SEGUROS DEL ESTADO S.A., el once (11) del mes de enero de 2023 a favor de **ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS**, con Nit No. 800096761-0 y/o INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS Nit No.800.215.807-2 para garantizar el cumplimiento del Contrato de licitación Pública No. 007 - 2022 suscrito el veintiocho (28) del mes de junio de 2022. Entre la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** y **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS** NIT. 9016081158, R.L OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ C.C. 1.007.801.563 DE SAHAGÚN, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021**"

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad civil	$ 500.000.000	Desde 25/08/2022 Hasta 31/12/2022
Cumplimiento del contrato	$ 899.570.167,30	Desde 25/08/2022 Hasta 30/08/2023
Correcta inversión del anticipo	$ 3.598.280.669,20	Desde 28/05/2022 Hasta 30/08/2023
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.799.140.334,60	Desde 25/08/2022 Hasta 30/08/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 2.698.710.501,90	Desde 24/02/2023 Hasta 24/02/2028
Calidad del Servicio	$ 2.698.710.501,90	Desde 31/12/2022 Hasta 31/12/2027

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$899,570,167.30**	**$899,570,167.30**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$3,598,280,669.20**	**$3,598,280,669.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/08/2022**	**30/08/2026**	**$1,799,140,334.60**	**$1,799,140,334.60**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**24/02/2023**	**24/02/2028**	**$2,698,710,501.90**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2022**	**31/12/2027**	**$2,698,710,501.90**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ADICIONAL AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N L.P 007 - 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101079887**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
11	**01**	**2023**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**30**	**08**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		**NIT: 901.608.115-8**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		**NIT: 800.096.761-0**
DIRECCIÓN: FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD: LOS CORDOBAS, CORDOBA	TELÉFONO 7603002
BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ADICIONAL AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N L.P 007 - 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA





Se aprueban las garantías por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por la entidad - ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VANESSA LUCIA PATERNINA GONZÁLEZ
Secretaria de Planeación Municipal

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101079887**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**30**	**08**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	**NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	**NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$500,000,000.00**	**$500,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ADICIONAL AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N L.P 007 - 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****828,767.00	$ *******3,000.00	$ *****158,035.00	$ **********989,802.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101079887
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Dsca Carrascal S.
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	01	2023	25	08	2022	00:00	30	08	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN: FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL — **CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/08/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/08/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/08/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/08/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/08/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101079887

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Dsca Carrascal S

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101079887**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**30**	**08**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	**NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	**NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****828,767.00	$ *******3,000.00	$ *****158,035.00	$ **********989,802.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002612501955 (3900) 000000989802 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100261250195-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	01	2023	25	08	2022	00:00	30	08	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN: FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL — **CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.	901078052-7	50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR	15679252	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101079887

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Osca Carrascal S

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101264620**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**24**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	**NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	**NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$899,570,167.30**	**$899,570,167.30**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**25/08/2022**	**30/08/2023**	**$3,598,280,669.20**	**$3,598,280,669.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**25/08/2022**	**30/08/2026**	**$1,799,140,334.60**	**$1,799,140,334.60**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**24/02/2023**	**24/02/2028**	**$2,698,710,501.90**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**31/12/2022**	**31/12/2027**	**$2,698,710,501.90**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ADICIONAL AL CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N L.P 007 - 2022 SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,853,242.00	$ *******8,000.00	$ *****923,636.00	$ *********5,784,878.00	$ ***11,694,412,174.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264620

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101264620**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**25**	**08**	**2022**	**00:00**	**24**	**02**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	**NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	**NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,853,242.00	$ *******8,000.00	$ *****923,636.00	$ *********5,784,878.00	$ ***11,694,412,174.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002612502131 (3900) 000005784878 (96) 20230825

REFERENCIA PAGO:

1100261250213-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264620	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	01	2023	25	08	2022	00:00	24	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		**NIT: 901.608.115-8**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		**NIT: 800.096.761-0**
DIRECCIÓN: FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL	**CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7603002

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.	901078052-7	50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR	15679252	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264620

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Osca Carrascal S

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de ENERO de 2023

15-44-101264620

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

BITACORA DE OBRA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Mayo 01 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) siso(1), Operadores(8), Paleteros(2), oficios varios(3), comisión topografica(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Actividas Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de geotextil y afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(3), carrotanque(1)

Se reporta humedad en el costado derecho de la via entre el tramo de via que va del box 3 a boxculvert 4



Residente interventoria


Mayo 02 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Almacenista (1), Comisión topografica (1), Operadores (10), Paletero (1), Oficios Varios (5), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1) Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavación y Explanación de la vía en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de geotextil y afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Mejoramiento en piedra para estabilización de rasante en el tramo (K2+298 - K2+386)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (3), Carrotanque (1)



Residente interventoría

Powered by CamScanner

Mayo 03 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Siso (1), Profesional social (1), Almacenista (1), comisión topografica (1), Operadores (10), Paletero (4), oficios varios (5), Laboratorista (1).

Personal de interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (3), Carrotanque (1)

* Se realiza toma de densidades al afirmado entre K0+669 a K1+040 con los siguientes resultados
0+720 centro : 105 %
0+820 derecha : 96.61 %
0+920 izquierda : 95.2 %
1+020 centro : 96.96 %
* Se aprueba colocacion de subbase para el tramo 3
* Se realiza densidad al afirmado entre 2+840 al 3+000 con los siguientes resultados : 2+840 izquierda con 95.91 % y 2+940 centro con 97.25 %. Se aprueba el tramo desde K2+800 a K3+000

Residente interventoria

D.R. obra.

Mayo 04 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operador(10), Paletero(4), oficios varios(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Excavación y explanación de la via en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactadores(2), Volquetas(3), carrotanque(1)

Se realiza visita por parte del especialista en pavimentos de interventoría y se recomienda la aplicacion de cal en tramo entre Box culvert 3 y 4 para estabilizar el material instalado y se requiere al contratista para que presente la documentacion faltante del material de afirmado de Lomagrande



Residente interventoría


Mayo 05 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(10), Paletero(1), oficios varios(5) laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de geotextil en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+609 - K1+040)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(3) carrotanque(1)



Residente interventoría


Mayo 06 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12 pm
Estado del tiempo: seco

Personal de obra: Director (1), Residende (1), Inspector (1), siso (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), operador (9), Oficios varios (5), Paletero (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
-Replanteo de la via en el tramo (K_{0+669} - K_{1+040})
-Instalación de subbase en el tramo (K_{0+669} - K_{1+040})
-Instalación de geotextil en el tramo (K_{2+295} - K_{4+720})
-Instalación de afirmado en el tramo (K_{2+298} - K_{4+720})

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), carrotanque (1)



D.P. obra.

Powered by CamScanner

Mayo 08 del 2023 (lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Profesional social (1), operador (9), oficios varios (4), Paletero (1), Laboratorista (1).

Personal de interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (2), Carrotanque (1)

Se reporta motoniveladora cat en reparacion
Se realizará reubicacion de cuatro postes de energia el dia de Mayor 14



Residente interventoría

Mayo 09 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operador (9), oficios varios (4), Paletero (4), laboratorista (1)

Personal de interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografico (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K0+669 - K1+040)

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) Carrotanque (1)

Motoniveladora cat en reparacion

Residente interventoría

D.T. obra

Mayo 10 del 2023 (Miercoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5 pm
Estado del tiempo: se presentaron lluvias desde la madrugada hasta aproximadamente las 9:30 am y estuvo nublado el resto del día


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1) Profesional social (1) comisión topografica (1), Almacenista (1), Operador (5), Oficios varios (4), Paletero (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladera (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (1), Carrotanque (1)

* No se realizaron actividades que conlleven al avance del proyecto debido a las lluvias

Motoniveladora cat continua en reparacion



OBR. OBRA.

Residente interventoría

Mayo 11 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operador(9), oficios varios(4), Paletero(4), Laboratorista(1).

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de Subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(1), Volquetas(1) Carrotanque(1).

Residente interventoría



Mayo 12 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9) oficios varios (4), Paleteros (4), Laboratorista (1)

Personal de interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de afirmado en el tramo (K1+648 - K2+208)

Maquinarios y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) Carrotanque (1)

La motoniveladora ha sido reparada
Se reporta que hay arboles antes de llegar a la zona de la reserva que se encuentran cerca a la via y que comprometen su estabilidad a partir del K 3 + 390 hacia mayores



Residente interventoría

Dig. obra.

Mayo 13 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Siso (1), comisión topografica (1), Almacenista (1), operador (9), oficios varios (4), Paletero (4), Laboratorista (1).

Personal de Interventoría: Director (1), Resindente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1) Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (2) Carrotanque (1)

Residente interventoría



D.O. obra

Mayo 14 del 2023 (Domingo)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Operador(1), Paletero(2), Electricista(4)

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspertor(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Rehubicación de postes de energía que se encontraban dentro de la vía segun el diseño

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1)

Residente interventoría



D.O. obra.

Mayo 15 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 3:30 am hasta las 9:30 am y el resto del dia estuvo nublado


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Almacenista (1), Comisión topografica (1), oficios varios (2), Paletero (3).

Personal de Interventoria: Director (1), Inspector (1), Residente (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: El personal de las maquinas no se presentó en la obra, debido a las lluvias

* No se realizaron actividades que conlleven al avance del proyecto, debido a las lluvias

Residente interventoría



Mayo 16 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), comisión topografica(1), Operadores(8), Oficios varios(4), Paletero(4). Laboratorista(1).


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motonweladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K4+720)
- Instacion de subbase en el tramo (K2+298 - K4+720)

Se presentaron lluvias de intensidad leve en horas de la noche (2 horas)

Residente interventoría



Mayo 17 del 2023 (Miércoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Parcialmente nublado


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), Almacenista (1), Comisión topografica (1), Oficios Varios (3), Paletero (1) Laboratorista (1), operadores (9)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavacion y explanación de la vía en el tramo (K2+298 - K3+435)

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadera (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1)

Se reporta pajarita en reparacion
Se toma densidad en tramo de afirmado K2+630 al K2+800 con resultados de K2+690 con 99.8% y K2+790 con 95.9% y se aprueba el tramo
Tramo del 2+560 al 2+630 con resultado de K2+590 con 99.8% tambien es aprobado



Residente interventoría

DP. obra.

Mayo 18 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9) Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de geotextil en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Inspección del programa de orden y limpieza, parte A frentes de obra

Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Carrotaque(1).

En reunion de obra realizada el dia de hoy se establece que el tramo de la reserva comprendido entre K3+435 al K4+335 pasa a ser competencia del municipio, el cual se encargara de instalar un mejoramiento en este tramo, esto debido a que no se llega a un acuerdo con el propietario de los arboles



Residente interventoria

D.T. obra.

Mayo 19 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topografía (1), Almacenista (1), Operadores (9), Oficios Varios (3), Paletero (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase tramo (K2+298 - K3+435)
- levantamiento topografico del nuevo tramo a intervenir

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1)

Se inicia levantamiento topografico de la zona despues de la reserva (K4+335 hacia mayores) con el fin de identificar el nuevo alcance que tendrá el proyecto
Llega a obra un minicargador



Powered by CamScanner

Mayo 20 del 2023 (Sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Paleteros(4), Comisión topográfica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Laboratorista(1)


Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de geotextil en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Se reporta minicargador dañado

Residente interventoría



D.I. Obra.

Mayo 22 del 2023 (lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias durante la madrugada del lunes y durante el dia estuvo nublado

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1) siso (1), Comision topografica (1), Almacenista (1), Oficios varios (3), Paletero (2), Laboratorista (1)

Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Payarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) carrotanque (1)

* Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada del lunes el terreno de la vía estaba bastante saturado y no permite realizar ningun tipo de actividades

dg
Residente interventoria

D.R obra.

Mayo 23 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 -12pm y 1-5pm
Estado del tiempo: Mañana nublada y tarde soleada

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1) Almacenista(1), Operadores(9), Oficios varios(3), Paletero(1), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1) Volquetas(1), Carrotanque(1)

* Debido al las fuertes lluvias presentadas el día anterior el terreno aun se encuentra bastante saturado lo que impide el desarrollo de las actividades en la jornada de hoy.

Residente interventoría

D.M. 0580.

Mayo 24 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias fuertes durante la mañana y siguió la tarde con una lluvia leve


Personal de obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), siso (1), Profesional social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), oficios varios (3) Paletero (4), Laboratorista (1).

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

* Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (1), Minicargador (1), Carrotanque (1)

* No se realizan actividades debido a las lluvias todo el día

Residente, interventoría



D.O. obra.

Mayo 25 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 -12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Soleado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9) Oficios Varios(3), Paletero(1), Laboratorista(1)


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1) comision topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetas(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de geotextil en el tramo (KA+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (KA+335 a Mayores)

*En la jornada de la mañana no fue posible realizar ningun tipo de actividades debido a que el terreno se encontraba bastante saturado por las lluvias del dia anterior

Residente, Interventoría



Powered by CamScanner

Mayo 26 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: durante la mañana soleado y a partir de la 1:00pm se presentaron fuertes lluvias.


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(1), Minicargador(1), Volquetas(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Replanteo de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

*En la jornada de la tarde no se pudo realizar ningun tipo de actividades debido a las fuertes lluvias



Residente interventoria

DER. Obra.


Mayo 27 del 2023 (Sábado)
Horario laboral: 7 - 12 pm
Estado del tiempo: Nublado

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), operadores (9), Oficios Varios (3), Paletero (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1) Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Minicargador (1), Volquetas (1), Carrotanque (1)

* No se realiza ningun tipo de actividades debido a que el terreno se encuentra bastante saturado por las lluvias del dia anterior.



Residente interventoria

D.P. Obra.

Powered by CamScanner

Mayo 29 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7- 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: mañana soleada y en la tarde se presentan fuertes lluvias desde la 1:00pm


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(5), Oficios varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volqueta(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)

* En la jornada de la tarde no se realizó ningun tipo de actividades debido a las fuertes lluvias que se presentaron



Residente interventoría

Dif. obra.

Mayo 30 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: mañana soleada, tarde nublada y a partir de las 3:30pm se presentan lluvias


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector (1), SISO(1), Profesional social(1), comisión topografica (1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios varios (3), Paletero (4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volqueta(1), carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Replanteo de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

* Debido a las lluvias presentadas el día anterior las actividades se [illegible] a las 10:00am y se sospendieron nuevamente a las 3:30pm debido a las lluvias presentadas en esa hora.





D.O. Obra.

Mayo 31 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: mañana nublado y tarde soleada

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Almacenista(1), Comisión topografica(1), Operadores(9), Paletero(4) oficios varios(3), Laboratorista(1)


Personal de interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Minicargador(1), carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayor
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayor
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)

*Debido a las lluvias presentadas el día anterior las actividades se iniciaron a partir de las 11:00 am porque el terreno estaba muy saturado

Residente interventoría



Dir. Obra.

Junio 01 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 -12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Almacenista(1), Operadores(9), Comision topografica(1), Paletero(1), Oficios varios(3), Laboratorista(1)

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Paparita(1) Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Minicargador(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavación y Explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de geotextil en el tram (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)

El contratista realiza manejo de aguas en tramo 1 ya que el material entre K0+000 y K0+100 se encuentra saturado por lluvias

Residente de Interventoría

Dir. obra.

Junio 02 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social, Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(9), Paletero(4) oficios varios(3), Laboratorista(1).

Personal de interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Minicargador(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K8+230)

Se reporta averia de volqueta que realiza transportes internos



Residente interventoria

DR. Obra

Junio 03 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operador(9), Paletero(4), Laboratorista(1) Oficios Varios(3).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de Sobbase en el tramo (K2+298 - K3+230)

Se reporta daño en vibrocompactador, minicargador aun no ha sido reparado
Se recibe pista en primera capa de material de subbase (aguas vivas, con los sigtes resultados: 2+920 (Der) con 95.5 %.
2+820 (eje) con 98.3 %.
3+000 (Izq) con 96.7 %
3+100 (eje) con 95.0 %.
La segunda capa se hara con material de cantera JOMEVE, la cual ya habia sido aprobada en los inicios del proyecto

Residente interventoría

Dib. Obra.

Junio 05 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Paletero (1), laboratorista(1), Oficios Varios(3).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1) Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecotadas Obra:
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de subbase tramo (K2+298 - K3+435)

Se reportan varios equipos en reparación: motoniveladora gafion vibrocompactador y minicargador, se requiere su pronta reparación



Residente interventoría

Dep. obra.

Junio 06 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comision topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Paletero(1), Laboratorista(1), oficios Varios(3)

Personal de interventoria: Director(1), Residente(1)
Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(1), Volquetas(2) Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

Se reportan lluvias moderadas entre 12:00 pm a 2:00 pm
El vibrocompactador ha sido reparado
Se reporta avería en la pajarita

Residente interventoria

Dir obra.

Junio 07 del 2023 (Miercoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 10:00am hasta 11:00am y nuevamente desde las 2:30pm hasta las 4:00pm

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Minicargador(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K_{2+298} - K_{3+435})
- Excavación y explaneación de la vía en el tramo (K1+235 a Mayores)

* Debido a las lluvias las actividades se suspendieron a las 10:00am y se retomaron nuevamente a las 2:00pm, pero volvió a llover a las 2:30pm y ya no se pudo continuar con las actividades de la obra.
Motoniveladora, minicargador y pajarita en reparacion

Residente interventoría



R.A. Obra.

Junio 08 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana soleada hasta las 11:00 am; de 11:00am a 12:10pm se presentaron lluvias y la jornada de la tarde estuvo parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residende(1), Inspector(1), siso(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios varios(8), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comision topografica

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajaritá(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Excavación y Explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)

* las actividades fueron suspendidas a las 11:00 am y se retomaron nuevamente a las 2:30pm

la motoniveladora, el minicargador y pajarita continuan en reparación esta situacion fue manifestada en el comite de obra realizada el dia de hoy y se requiere su pronta solucion

Residente interventoría

Rte. obra.

Junio 09 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), Comisión topografica (1) Almacenista (1), Operadores (10), Oficios Varios (3), Paletero (4), Laboratorista (1).

Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2) Minicargador (1), Volquetas (2), Carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Explaneación de la via en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de geotextil en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)

Se reporta que el minicargador ya fue reparado.
Las dos motoniveladoras presentan fallas mecanicas y la pajarita tambien

Residente Interventoria

DD. JJMM.

Junio 10 del 2023 (Sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de afirmado en el tramo (K4+335 a Mayores)
- Instalación de sobbase en el tramo (K1+648 - K2+208)

Las 2 motoniveladoras y la pajarita varadas



Residente interventoría

D.O. obra.

Junio 12 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 11:30am hasta las 2:00pm, resto del día estuvo nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(10), Oficios Varios(3), Paletero(1), Laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Mejoramiento en piedra en el tramo(K2+298 - K2+387)

* Se iniciaron las actividades pero debido a las lluvias las actividades fueron suspendidas a partir de las 11:30am

Las motoniveladoras y pajarita en reparación

Residente interventoría

Ing. Obra.

Powered by CamScanner

Junio 13 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana soleada; se presentaron lluvias leves desde las 2:00pm hasta las 2:30pm, resto del dia nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(10), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Minicargador(1), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Mejoramiento en piedra en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Construcción de filtro en el tramo (K0+000 - K0+096)

* Debido a las lluvias el dia anterior las actividades se iniciaron a partir de las 9:30am porque el terreno estaba saturado.

* las actividades se suspendieron durante las lluvias

las motoniveladoras y pajarita dañadas



Residente interventoría

D.T. obra

Powered by CamScanner

Junio 14 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topograficos(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1), Maestro(1), Ayudantes(2)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora(1), Pajarita(1), Retroexcavadora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Minicargador(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Construcción de filtros en el tramo (K0+000 - K0+096)

Maquinas varadas: 2 motoniveladoras, pajarita
El minicargador se encuentra funcionando



Residente interventoría

Junio 15 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 11:30pm de la noche del miercoles 14 hasta las 4:00am del jueves: mañana nublada y resto del día soleado.


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1) Maestro(1), Ayudante(3).

Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Motoniveladora(1), Pajarita(1), Retroexcavadora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Minicargador(1)

* Debido a las fuertes lluvias no se pudo realizar ningun tipo de actividades

Se arregla motoniveladora CAT
La motoniveladora Galion continua varada
Se adelantan actividades de instalacion de filtros



Residente interventoría

Junio 16 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana soleada; se presentaron lluvias desde la 1:00pm hasta la 1:30pm resto del dia parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) siso(1), Comisión topografica(1), Profesional social(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1), Maestro(1), Ayudantes(3)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de sobbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Mejoramiento en piedra tramo (K2+298 - K2+387)

*las actividades fueron suspendidas debido a las lluvias y se retomaron nuevamente a las 2:00pm

Motoniveladora galion varada



Residente Interventoría

Junio 17 del 2023 (sabado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Se prentaron lluvias desde las 7:00pm del viernes 16 hasta las 4:30am de hoy; mañana nublada

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operadores(9), oficios varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), carrotangue(1)

* Debido a las fuertes lluvias no se realizó ningún tipo de actividades

Se varó el minicargador, motoniv Galion varada



Residente interventoría

Junio 20 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 -12pm y 1-5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios varios(2), Paletero(1), Laboratorista(1), Maestro(1), Ayudantes(3).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(1), Volqueta(2), Carrotanque(1), Minicargador(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
-Construcción de filtros en el tramo (K2+298 - K2+387)
-Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)

Motoniveladora Gation y minicargador varados



Residente interventoria

D.E Obra

Junio 21 del 2023 (Miercoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista, operadores(9), Oficios varios(2), Paletero(1), Laboratorista(1), Maestro(1), Ayudantes(3)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1) Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volqueta(2) Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de filtro en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)

Minicargador y motoniveladora varadas



Residente interventoria

Junio 22 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1) Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)

El minicargador y motoniveladora se encuentran varados se realiza llamado de atencion a esta situacion en comite ya que debe aprovecharse el tiempo seco que se presente

Residente interventoria

D.R. de obra.

Junio 23 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 2:00 am hasta las 5:00 am; Resto del día nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paleteros(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Minicargador(1), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Excavación para organizar taludes del lateral de la vía.

* Debido a las fuertes lluvias en la madrugada las actividades se iniciaron despues de la 1:00pm

Motoniveladora danada, el minicargador fue retirado de la obra



Dir. obra

Residente Interventoría

Junio 24 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comision topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+387 - K2+793)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Carrotanque(1), Minicargador(1)

La motoniveladora galion continúa varada

Residente interventoría

Residente obra.

Junio 26 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1), Maestro(1), Ayudante(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Carrotanque(1),

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Perforación de tubos para filtros

Se realiza toma de densidad a subbase instalada en tramo 3, Los resultados son los siguientes
K0+715 (Izq) con 103.04 %.
K0+815 (Eje) con 94.43 %.
K0+915 (Der) con 102.28 %.
K1+015 (Eje con 95,87 %.
Se aprueba tramo por topografia y densidades
La motoniveladora galion se encuentra en reparacion

Residente Interventoría

D.T. de obra

Junio 27 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Maestro(1), Ayudantes(1), Oficios Varios(3), Paletero(4), laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de filtro en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)

Se realiza toma de densidad en afirmado entre K1+648 y K1+848, los resultados obtenidos son los siguientes:

K1+710 (Eje) 95.8%
K1+800 (13g) 95.18%
Se aprueba tramo por topografia y densidades para colocación subbase
Se reporta que la motoniveladora galvin fue reparada

Residente interventoría

Ing. de Obra

Junio 28 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Maestro(1), Ayudantes(2) Oficios Varios(3), Paletero(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de filtro en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de subbase en el tramo (K0+000 - K0+273)

Se reporta la pajarita varada

Residente interventoría



Dq. de obra.

Powered by CamScanner

Junio 29 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comision topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Maestro(1), Ayudantes(1) Paletero(1), Oficios varios(0), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Payarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+203)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Perforación de tubería para filtros. Longitudinales

Se realiza toma de densidad a subbase en tramo 1
los resultados son los siguientes
K0+040 95.7 %
K0+120 (Der) 95.2 %
K0+200 (137) 96 %
Se aprueba tramo de K0+000 al K0+274 para instalacion de base
La pajanta fue reparada

Residente interventoría



Del de obra.

Junio 30 del 2023 (Viernes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1-5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Maestro(1), Ayudantes(1) Oficios varios(3), Paletero(1), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1),

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Perforación de tubería para filtros Longitudinales

Se inicia instalacion de base en tramo 3, se le recuerda al contratista presentar toda la documentacion del material de base y este se extendera bajo su cuenta y riesgo.

Residente interventoría

D.T. obra.
