Montelíbano, 30 de octubre de 2023 CVN- 679-2022

Doctor:
ANDRES FELIPE RACERO YANCES
ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
Palacio Municipal
alcaldia@loscordobas-cordoba.gov.co
Los córdobas – Córdoba

REFERENCIA: LP- 007-2022 -CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL ".

ASUNTO: AVAL DE SOLICITUD DE PRORROGA HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2023 - CMC.

El contratista de obra Consorcio Mejoramiento Los córdobas, quienes ejecutan el Contrato No. LP-007-2022 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021", mediante comunicado OFICIO_CMC-OBR-193-2023, ha presentado solicitud de PRORROGA por un término de dos (2) meses, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2023, justificado básicamente en la ola invernal imperante durante la mayoría de los meses de este año en la región, falta de transitabilidad en las vías de acceso a las obras y a las fuentes de explotación de los materiales granulares (canteras); concluyendo que, el plazo contractual resulta insuficiente para la ejecución de las metas físicas establecidas.

Concomitantemente, la interventora Consorcio Vial Nacional informa que, en cumplimiento de nuestras funciones, dado el atraso presentado con base a la reprogramación del programa de inversiones No 3 vigente, se radico oficio al Municipio de Los Córdobas con asunto "presunto incumplimiento definitivo en contra del contratista de obra CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS", mediante los comunicados CVN-358-2022 del 31 de marzo de 2023 ,CVN-386-2022 del 17 de abril de 2023 y CVN-648-2022 del 11 de octubre de 2023; no obstante, en aras de que el contratista de obra tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas del proyecto en beneficio del proyecto y de la comunidad directamente beneficiada, se considera conveniente AVALAR la prorroga solicitada hasta el 30 de diciembre de 2023.

No sobra advertir que, el contratista Consorcio Mejoramiento Los córdobas, tiene un atraso en la ejecución de las obras, por lo tanto, el presunto incumplimiento en contra del contratista de obras que manifestamos mediante nuestro oficio CVN-648-2022 del 11 de octubre de 2023 continua vigente y el Municipio de Los córdobas debe continuar el trámite correspondiente.

Así las cosas, una vez revisada la documentación anexa, la interventoría Consorcio Vial Nacional informa que, AVALA la SOLICITUD DE PRORROGA presentada por el contratista de obras Consorcio Mejoramiento Los córdobas, por los motivos expuestos en el OFICIO CMC-OBR-193- 2023.

Así las cosas, de acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obras CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS, las revisiones y conciliaciones que se realizaron con esta interventoría, enviamos validados la siguiente documentación, para continuar con el trámite de legalización, por lo que anexamos:

1) CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA
2) MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG
3) MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERSION O REPROGRAMACIÓN No 4
4) MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
5) BITÁCORA
6) GARANTIAS CONTRACTUALES

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Consorcio Vial Nacional

cc- - Ing. Néstor Lemus – Supervisor del Contrato INVIAS.
- Ing. Álvaro Galvis – Gestor Técnico INVIAS

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

Montería, 30 de octubre de 2023

CONSORCIO VIAL NACIONAL
JUAN ELIECER VILLALOBOS
Director de Interventoría

CMC-OBR-193-2023

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mejoramiento Los córdobas, en vista de que el contrato de obra tiene fecha de finalización del 30 de octubre de 2023, y teniendo en cuenta los impedimentos que han incidido directamente en la correcta ejecución de los plazos contractuales, solicitamos valorar la aprobación de prórroga al contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

1. Que se celebró el contrato de obra N°LP-007-2022 entre el municipio Los Córdobas – Córdoba y Consorcio Mejoramiento Los Córdobas NIT 901608115-8 de objeto ""MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA".

2. Que en los diferentes comités realizados durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, la interventoría manifiesta su preocupación por el atraso de las actividades en obra, por lo que este consorcio ha informado, que se ha venido presentando un incremento en la lluvias a partir del día 06 de julio de 2023, principalmente en las horas de la tarde – noche, las cuales han afectado significativamente y han retrasado la programación y correcta ejecución de las actividades de obra, y que continúan siendo una constante a partir de la fecha mencionada hasta la fecha de la presente solicitud de prórroga. Como resumen se tiene un total de 42 días no laborados o medianamente laborados por las fuertes precipitaciones en el corredor vial del proyecto (Ver anexo de bitácora y datos de estación hidrometeorológica)

3. Que otro factor que continúa generando atrasos en las actividades del proyecto, ha sido el acceso de las volquetas a la obra, teniendo en cuenta que las lluvias han deteriorado algunos tramos de vía entre La Salada y Nuevo Nariño, retrasando hasta 3 días el acceso de los materiales granulares a la obra. Sumado a esto, se ha venido presentando retraso en la entrega de materiales por parte de las canteras autorizadas, por la alta demanda de

suministro de material granular, generando así múltiples impedimentos no sólo en la disposición de material en obra, sino también, la cantidad de viajes de material despachados. Sin embargo, el consorcio contratista en aras de optimizar los tiempos, el suministro de material y mejorar el acceso a la obra, ha venido realizando acopios de material, como también arreglos en los puntos críticos de la vía, mientras se ha tenido la disponibilidad de la maquinaria, sin generarse mayores atrasos a las actividades propias del contrato de obra; como también, ha realizado suministros de material granular de canteras como JOMEVE, que se encuentra ubicada en la vía que conduce de Montería a Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba, aproximadamente a 108 kilómetros de distancia del punto de acopio de materiales del proyecto en mención; incrementando así en un 43% la actividad de Transporte de material, por el aumento significativo en la unidad M3/KM de cada viaje; Dado que dicho incremento no sería reconocido por parte de la interventoría o ente territorial, este está siendo asumido en su totalidad por el contratista de obra.


4. Que todas estas circunstancias se colocan en manifiesto, en busca de generar el contexto general en el cual se continúa llevando a cabo en la actualidad la ejecución del contrato; validando los atrasos representativos que se están presentado no imputables en su totalidad al contratista, a su vez para el pleno conocimiento de la Interventoría y la entidad contratante de dichas condiciones; que si bien se han generado mejoramientos sobre algunos puntos críticos, realizados estos a nuestra costas, y se ha realizado suministro de material de canteras retiradas a más de 108 kilómetros del proyecto, las lluvias que se han presentado desde la fecha citada continúan impidiendo el acceso a la zona, al mismo tiempo retrasan la ejecución de actividades sobre los tramos en intervención y del contrato en su totalidad.

5. Que es menester señalar que, como contratistas de obra, hemos aprovechado al máximo todo el tiempo seco que hemos tenido, incluso, extendiendo la jornada laboral hasta el día domingo, con el fin de cumplir con la programación de obra (Ver anexo de bitácora de obra), y se mantenga un buen desarrollo de las actividades del proyecto. Adicionalmente, se tiene por motivo de temporada de lluvias un total de 42 días no laborados y medianamente laborados, constituyendo un atraso significativo por lluvias a partir del 06 de julio de 2023 hasta la fecha de la presente solicitud.

6. Que otro factor a tener en cuenta, es el tiempo requerido por el contratista de obra para la ejecución de las actividades no contempladas, generadas a partir del balance de obra N°2, producto del traslado de la ejecución de actividades del tramo conocido como “Reserva forestal”, comprendido entre las abscisas PR 3+435 al PR 4+335, para el nuevo tramo comprendido entre el PR 4+720 hasta el PR 5+414. Dicha modificación en la ejecución de este tramo, ajena a la voluntad del contratista, contempla en sus diseños la ejecución de una estructura hidráulica adicional de gran envergadura, como lo es un Boxculvert de sección= 3m X 2m, entre otras actividades, siendo la construcción de dicha estructura, la mayor preocupación para el contratista de obra, toda vez que la temporada de lluvias no ha cesado en el corredor vial del proyecto, sumado a que la única vía de acceso para volquetas

al proyecto es por medio del mismo corredor vial donde se encuentra ubicada, y que tampoco existe a los costados de esta, un paso que permita el libre tránsito de volquetas, personal de la zona y demás transeúntes, mientras se realiza la construcción de esta. Por tales motivos, se estima que es requerido un plazo no menor a dos (02) meses para realizar estas actividades adicionales.

7. Que a corte del 19 de octubre de 2023, según programación del contrato de obra, tiene un porcentaje ejecutado acumulado del 49.2%, un porcentaje programado del 96.6%, por ende, un atraso del 47.4%, sin embargo, teniendo en cuenta el manual de interventoría de INVIAS en el instructivo para programa de obra, programa de inversiones, reprogramación y seguimiento al programa de inversiones, en el numeral 11. Expresa: *"Cuando se va a estudiar una solicitud de reprogramación y existe un atraso en el Programa de Inversiones, el Interventor con base en el desarrollo de las obras y los documentos de ejecución del contrato, determina la imputabilidad de cada una de las partes, que se pueden enmarcar en alguna de las siguientes situaciones: (…) B. Responsabilidad compartida. En este caso, el punto de partida de la nueva curva se define teniendo en cuenta el porcentaje de responsabilidad de cada una de las partes, tal como se ilustra en el siguiente esquema"*

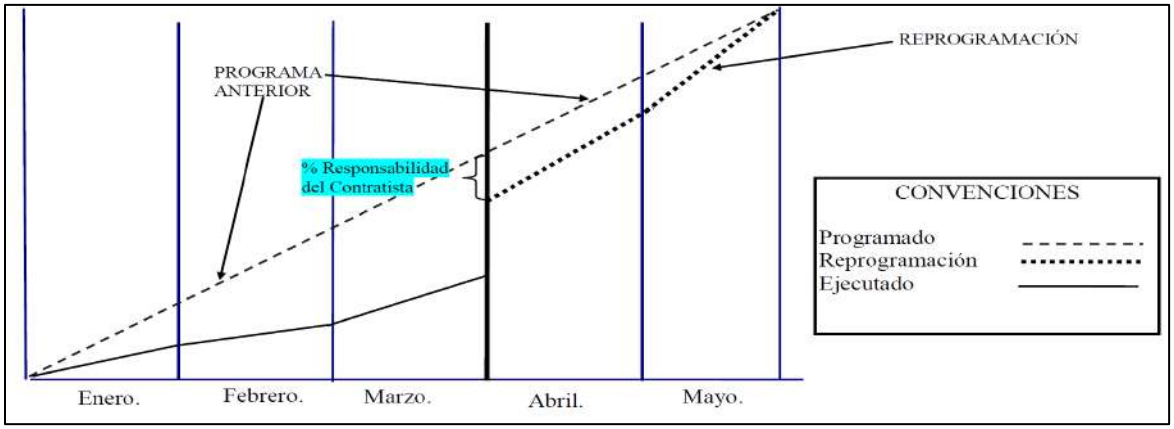

Fuente: manual de interventoría obra pública (INVIAS)

Donde se argumenta que: los atrasos presentados no son en su totalidad atribuibles al contratista de obra, con base en lo expuesto en la presente solicitud de prórroga, donde la interventoría manifiesta que la reprogramación del programa de inversión iniciará con un 13% menos del programado acumulado de la fecha de presentación del formato. Es decir, que la nueva reprogramación iniciaría con un 34% aproximadamente de atraso a partir del 01 de noviembre de 2023 (Ver reprogramación y formato de inversiones y flujo de obra).

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Que la presente solicitud de prórroga, no constituye requerimiento de mayores recursos ni modificaciones al alcance actual del proyecto, ya que actualmente el proyecto cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutar a cabalidad las metas físicas del proyecto sin

requerir una adición.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Que la presente solicitud de prórroga es viable de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia y la normatividad vigente sobre la materia, y de llegar a aprobarse, esta no concurre ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas, la entidad contratante podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 9 ibídem, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Que para la ejecución de las actividades del contrato de obra, la entidad contratante dispuso la suma de $8.995.701.673,00, para ejecución presupuestal del proyecto. Y la presente solicitud de prórroga no representa modificaciones al presupuesto.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Que la presente solicitud de prórroga continúa cumpliendo con los parámetros sociales que exige la entidad contratante y la norma técnica que lo regule, no viéndose afectada la premisa de lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad perteneciente al área de fluencia del proyecto, de los campesinos y demás personas que utilizan esta vía para desplazarse, dinamizando la economía rural, agilizando la distribución de los productos, incrementando la competitividad en los mercados regionales, facilitando el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos, promoviendo de igual manera la equidad social, cuidando la seguridad vial, disminuyendo los tiempos de desplazamiento hacia el caso urbano y viceversa, y además, disminuyendo los costos de transporte.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo a las actividades que proporcionan el alcance de este contrato, no requiere licenciamiento ambiental, en este sentido y atendiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y las obligaciones contractuales se continuarán implementando medidas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas con base a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial (2011). el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS continuará implementando el instrumento de planificación ambiental denominado PAGA, de acuerdo a lo que establece INVIAS en su guía ambiental para este tipo de proyectos; teniendo en cuenta la naturaleza; el área de construcción y la zona de influencia del proyecto; la normatividad existente y vigente que aplica para este tipo de proyectos.
El alcance de este instrumento de planificación es aplicable a todas las actividades que se desencadenen durante la ejecución de obra y que estén contenidos en el objeto contractual, contiene la descripción del proyecto, las actividades u obras a acometer, los recursos a demandar,

la descripción del área de influencia directa (caracterización física, biótica y socioeconómica), la identificación de los impactos ambientales, descripción los programas socio-ambientales que determinarán las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra, enfocados al manejo, seguimiento, prevención y contingencia de los mismos, sin afectar ni alterar de forma invasiva o destructiva el medio ambiente a lo largo y ancho del corredor vial a construir, priorizando la conservación de fauna y flora existentes.

Por tal motivo, teniendo en cuenta que **el 30 de octubre del 2023** vence el plazo para ejecutar al 100% el contrato de obra, siendo este actualmente físicamente imposible de alcanzar dentro de los tiempos contractuales, adicionalmente, que los atrasos significativos del proyecto no son atribuibles en su totalidad a la voluntad del contratista, y demás argumentos que acompañan la presente solicitud, nos permitimos solicitarle muy amablemente se realice una **prórroga por dos (02) meses** adicionales al contrato de obra, contados a partir de la fecha actual de finalización del contrato.

A continuación, se anexa:

- Copia de la bitácora firmada por las partes.
- Tabla relacionando días y horario de lluvia y días no laborados producto de las precipitaciones.
- Registro fotográfico del estado de la vía en los días de lluvia y días posteriores a las precipitaciones por mal estado de la vía de acceso.
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 - Programa de obra actualizado.
- Formato Estado General del Tiempo (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10), anexando el Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y hasta el 12 de octubre de 2023, de la Estación más cercana y en funcionamiento al corredor vial del proyecto (ARBOLETES [12045010])
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento garantías contractuales contrato de obra
- Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado ajustados hasta el 30 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

Oscar Carrascal S.

OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Consorcio Mejoramiento Los córdobas
Representante Legal

Con copia a:

Secretaría de Planeación municipal – Alcaldía de Los Córdobas, Córdoba.

Supervisor Convenio Interadministrativo – INVIAS.

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

ANEXO TABLA DE PRECIPITACIONES

ESTADO DEL TIEMPO (PRECIPITACIONES) Y AFECTACIONES EN LA VIA			
FECHA	HORA		OBSERVACIÓN
	DESDE	HASTA	
06 de julio de 2023	2:00 a.m	9:30 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
10 de julio de 2023	11:00 p.m	12.00 a.m	
11 de julio de 2023	12:00 a.m	5:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la madrugada y noche anterior
12 de julio de 2023	1:00 a.m	5:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido debido a las fuertes lluvias de la madrugada
14 de julio de 2023	2:00 a.m 7:00 a.m	4:00 a.m 10:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
17 de julio de 2023	5:00 p.m	7:00 p.m	
18 de julio de 2023	6:00 a.m	8:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la mañana y noche anterior
22 de julio de 2023	7:00 a.m	10:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
24 de julio de 2023	1:20 p.m	3:00 p.m	No se realizaron actividades en horas de la tarde debido a las fuertes lluvias
25 de julio de 2023	7:00 a.m	8:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la mañana y noche anterior
28 de julio de 2023	12:30 p.m	2:30 p.m	Se realizaron actividades en horas de la tarde debido a las fuertes lluvias
31 de julio de 2023	12:30 a.m	5:00 a.m	No se realizaron actividades en horas de la tarde debido a las fuertes lluvias
01 de agosto de 2023	11:30 p.m	12:00 a.m	
02 de agosto de 2023	12:00 p.m	2:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la madrugada y noche anterior
03 de agosto de 2023	12:00 a.m 5:00 a.m	1:00 a.m 6:30 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la madrugada
04 de agosto de 2023	3:00 p.m	4:30 p.m	No se realizaron actividades en horas de la tarde después de 3:00 pm debido a las fuertes lluvias

09 de agosto de 2023	8:00 a.m	10:00 a.m	Se realizaron actividades después de la 1:00 p.m debido a las fuertes lluvias de la mañana
12 de agosto de 2023	5:00 a.m	8:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
13 de agosto de 2023			No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias, se presentaron afectaciones también al día siguiente
16 de agosto de 2023	3:30 a.m	5:30 a.m	Debido a las fuertes lluvias se canceló la programación de asfalto
31 de agosto de 2023	2:00 a.m	7:00 a.m	Debido a las fuertes lluvias se canceló la programación de asfalto
02 de septiembre de 2023	7:00 a.m	10:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
07 de septiembre de 2023	4:00 a.m	7:30 a.m	Debido a las fuertes lluvias se canceló la programación de asfalto, y no realizaron actividades de avance físico de obra
09 de septiembre de 2023	8:00 a.m	11:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
12 de septiembre de 2023	8:30 a.m 2:30 p.m	9:00 a.m 3:00 p.m	Actividades se vieron afectadas por las lluvias leves
15 de septiembre de 2023	1:30 a.m	11:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
16 de septiembre de 2023			No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias del día anterior (no hubo entrada de materiales)
23 de septiembre de 2023	8:00 a.m	11:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
24 de septiembre de 2023	11:00 p.m	12:00 p.m	
25 de septiembre de 2023	12:00 a.m	5:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias de la madrugada y de la noche anterior
26 de septiembre de 2023	5:00 a.m	11:30 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias
30 de septiembre de 2023	5:00 a.m	8:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias y mal estado de la vía
04 de octubre de 2023	12:30 p.m	4:00 p.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra en horas de la tarde debido a

			las fuertes lluvias
06 de octubre de 2023	12:30 p.m	4:20 p.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra en horas de la tarde debido a las fuertes lluvias, generando afectaciones en días posteriores
09 de octubre de 2023	2:30 p.m	4:30 p.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra en horas de la tarde debido a las fuertes lluvias, generando afectaciones en días posteriores
11 de octubre de 2023	8:00 a.m	11:30 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias.
12 de octubre de 2023	9:30 a.m 2:00 p.m	11:00 a.m 3:00 p.m	Actividades de obra suspendidas a partir de las 9:30 a.m debido a las fuertes lluvias.
14 de octubre de 2023	6:10 a.m	11:50 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias.
16 de octubre de 2023	12:50 p.m	2:40 p.m	Actividades de obra suspendidas a partir de las 12:00 p.m debido a las fuertes lluvias.
20 de octubre de 2023	5:00 a.m	10:50 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias.
24 de octubre de 2023	5:10 a.m	11:00 a.m	No se realizaron actividades de avance físico de obra debido a las fuertes lluvias.
25 de octubre de 2023	6:10 a.m	10:20 a.m	Se realizaron actividades de avance físico de obra después de 2:00 pm debido a las fuertes lluvias
TOTAL	**42 DÍAS NO LABORADOS O MEDIANAMENTE LABORADOS POR FUERTES PRECIPITACIONES**		

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO










Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8



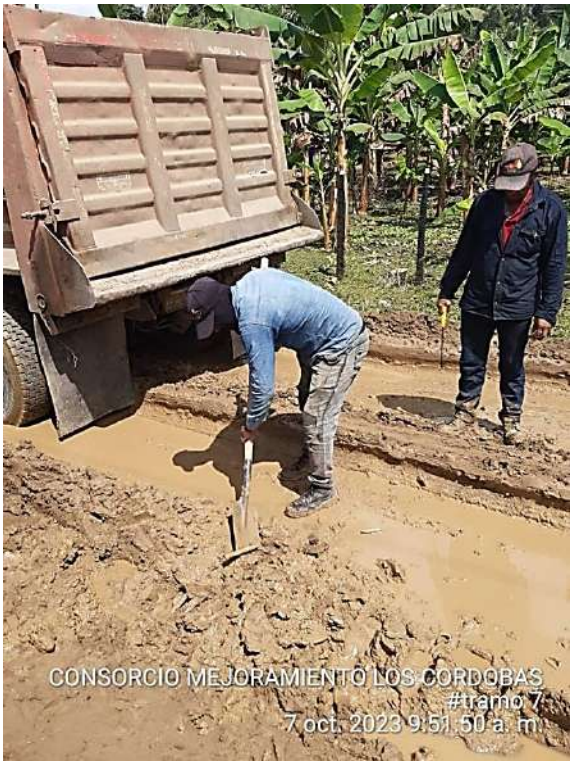





Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba




6 oct 2023 12:31:42 p. m.
8.8032N 76.3246W
Los Córdobas
Córdoba
Mejoramiento Los Córdobas
Vía Santa Rosa - Nuevo Nariño


CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
4 oct. 2023 3:27:17 p. m.


05/10/2023 07:13

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8









Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8









Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8









Carrera 6 No 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gmail.com
Montería – Córdoba

MEPI-MN1-IN-12-FR-1

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-oct-23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. LP 007-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2022
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/04/2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA N° 1

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	30/12/2023	31/12/2022	30/08/2023
2	27/06/2023	31/08/2023	30/10/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 8.995.701.673,00 **50% EN SMMLV:** 3877,5
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.995.701.673,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.CMC-OBR-193-2023 de fecha 30 de octubre de 2023 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Solicitud de adicion en tiempo de dos (2) meses, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2023

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-oct-23
(Día / Mes / Año)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Conformacion de la estructura de pavimemtos entre los k0+00 al K0+273 , K0+470 al K0+598, K0+669 al K1+040, K1+450 al k1+540, K1+648 al k2+208, K2+298 al K3+435, K4+335 al K4+951, K5+150 al K5+415 para un total de 3,4 kilómetros aproximadamente de pavimento asfáltico, 272 metros lineales de placa huella, 8 obras hidráulicas tipo boxculvert.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de septiembre de 2023 la obra presenta un avance físico ejecutado del 43,62%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 90.22 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 8.115.922.049,38
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 3.923.925.069,76
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 3.923.925.069,76
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 3.598.280.669,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 1.475.698.761,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 2.122.581.908,00
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) agosto de 2023 $ 3.689.246.901,70
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: 1/09/2023
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 5.306.454.771,30
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La presente solicitud de prórroga se justifica en que:

1. Que en los diferentes comités realizados durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, la interventoría manifiesta su preocupación por el atraso de las actividades en obra, por lo que el consorcioMejoramiento Los Cordobas ha informado, que se ha venido presentando un incremento en la lluvias a partir del día 06 de julio de 2023, principalmente en las horas de la tarde – noche, las cuales han afectado significativamente y han retrasado la programación y correcta ejecución de las actividades de obra, y que continúan siendo una constante a partir de la fecha mencionada hasta la fecha de la presente solicitud de prórroga. Como resumen se tiene un total de 42 días no laborados o medianamente laborados por las fuertes precipitaciones en el corredor vial del proyecto (Ver anexo de bitácora y datos de estación hidrometeorológica)

2. Que otro factor que continúa generando atrasos en las actividades del proyecto, ha sido el acceso de las volquetas a la obra, teniendo en cuenta que las lluvias han deteriorado algunos tramos de vía entre La Salada y Nuevo Nariño, retrasando hasta 3 días el acceso de los materiales granulares a la obra. Sumado a esto, se ha venido presentando retraso en la entrega de materiales por parte de las canteras autorizadas, por la alta demanda de suministro de material granular, generando así múltiples impedimentos no sólo en la disposición de material en obra, sino también, la cantidad de viajes de material despachados

3. Que el tiempo requerido por el contratista de obra para la ejecución de las actividades no contempladas, generadas a partir del balance de obra N°2, producto del traslado de la ejecución de actividades del tramo conocido como “Reserva forestal”, comprendido entre las abscisas PR 3+435 al PR 4+335, para el nuevo tramo comprendido entre el PR 4+720 hasta el PR 5+414. Dicha modificación en la ejecución de este tramo, ajena a la voluntad del contratista, contempla en sus diseños la ejecución de una estructura hidráulica adicional de gran envergadura, como lo es un Boxculvert de sección= 3m X 2m, entre otras actividades, siendo la construcción de dicha estructura, la mayor preocupación para el contratista de obra, toda vez que la temporada de lluvias no ha cesado en el corredor vial del proyecto, sumado a que la única vía de acceso para volquetas al proyecto es por medio del mismo corredor vial donde se encuentra ubicada, y que tampoco existe a los costados de esta, un paso que permita el libre tránsito de volquetas, personal de la zona y demás transeúntes, mientras se realiza la construcción de esta. Por tales motivos, se estima que es requerido un plazo no menor a dos (02) meses para realizar estas actividades adicionales..

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30-oct-23
	(Día / Mes / Año)

JURÍDICA:

Que la presente solicitud de prórroga es viable de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia y la normatividad vigente sobre la materia, y esta no concurre ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a la que se refiere el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas la entidad contratante podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 9 ibídem, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La presente solicitud de prórroga, no constituye requerimiento de mayores recursos ni modificaciones al alcance actual del proyecto, ya que actualmente el proyecto cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutar a cabalidad las metas físicas del proyecto sin requerir una adición.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Que para la ejecución de actividades la entidad contratante dispuso la suma de $8.995.701.673,00, para ejecución presupuestal del proyecto.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

La presente solicitud de prórroga continúa cumpliendo con los parámetros ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad que exige la entidad contratante y la norma técnica que lo regule, no viéndose afectada la premisa de lograr mejorar la calidad de vida de la comunidad perteneciente al área de fluencia del proyecto, de los campesinos y demás personas que utilizan esta vía para desplazarse, dinamizando la economía rural, agilizando la distribución de los productos, incrementando la competitividad en los mercados regionales, facilitando el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos, promoviendo de igual manera la equidad social, cuidando la seguridad vial, disminuyendo los tiempos de desplazamiento hacia el caso urbano y viceversa, y además, disminuyendo los costos de transporte.

También de acuerdo a las actividades que proporcionan el alcance de este contrato, no requiere licenciamiento ambiental, en este sentido y atendiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y las obligaciones contractuales se continuarán implementando medidas de manejo ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas con base a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial (2011). el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS continuará implementando el instrumento de planificación ambiental denominado PAGA, de acuerdo a lo que establece INVIAS en su guía ambiental para este tipo de proyectos; teniendo en cuenta la naturaleza; el área de construcción y la zona de influencia del proyecto; la normatividad existente y vigente que aplica para este tipo de proyectos.

El alcance de este instrumento de planificación es aplicable a todas las actividades que se desencadenen durante la ejecución de obra y que estén contenidos en el objeto contractual, contiene la descripción del proyecto, las actividades u obras a acometer, los recursos a demandar, la descripción del área de influencia directa (caracterización física, biótica y socioeconómica), la identificación de los impactos ambientales, descripción los programas socio-ambientales que determinarán las acciones y/o procedimientos a implementar en la obra, enfocados al manejo, seguimiento, prevención y contingencia de los mismos, sin afectar ni alterar de forma invasiva o destructiva el medio ambiente a lo largo y ancho del corredor vial a construir, priorizando la conservación de fauna y flora existentes.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

- Copia de la bitácora firmada por las partes.
- Tabla relacionando días y horario de lluvia y días no laborados producto de las precipitaciones.
- Registro fotográfico del estado de la vía en los días de lluvia y días posteriores a las precipitaciones por mal estado de la vía de acceso.
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 - Programa de obra actualizado.
- Formato Estado General del Tiempo (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10), anexando el Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a los meses de Julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, de la Estación más cercana y en funcionamiento al corredor vial del proyecto (ARBOLETES [12045010])

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: **ANDRES FELIPE RACERO YANCE**
ALCALDE
Municipio de Los Córdobas

Firma

Nombre: **VANESSA LUCIA PATERNINA GONZÁLEZ**
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Municipio de Los Córdobas

Firma

Nombre: **OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio mejoramiento Los Córdobas
CONTRATISTA

Firma

Nombre: **JUAN ELIECER VILLALOBOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Consorcio Vial Nacional

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

MEPI-MN1-IN-6-FR-1
PROG INVERS O REPROG PROG INV

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO PROG INVERSIONES

LP- 007-2022
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

MEPI-MN1-IN-15-FR-12
SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

LP-MM-007-2022
MUNICIPIO DE LOS CORDOBA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP 007 2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

FECHA DE INICIO: 25/08/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8,995,701,673.00

VALOR ACUMULADO: $ 8,995,701,673.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18,954,796.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18,954,796.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 899,570,167.30	25	8	2022	30	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	$ 3,598,280,669.20	25	8	2022	30	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 899,570,167.30	25	8	2022	30	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2,698,710,501.00	31	12	2022	24	2	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2,698,710,501.00	24	2	2023	24	2	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101264620

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA			VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Predios, labores y operaciones	10%	$ 500,000,000.00	25	8	2022	30	10	2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 500,000,000.00	25	8	2022	30	10	2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 500,000,000.00	25	8	2022	30	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40-101079887 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264620	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	25	08	2022	00:00	24	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT: 901.608.115-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	NIT: 800.096.761-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2022	30/10/2023	$899,570,167.30	$899,570,167.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/08/2022	30/10/2023	$3,598,280,669.20	$3,598,280,669.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2022	30/10/2026	$1,799,140,334.60	$1,799,140,334.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/02/2023	24/02/2028	$2,698,710,501.90	$2,698,710,501.90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022	31/12/2027	$2,698,710,501.90	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 2, SE PRORROGA HASTA EL 30/10/2023 CONTRATO No LP 007-2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,894,272.00	$ *******8,000.00	$ *****361,431.00	$ *********2,263,704.00	$ ***11,694,412,174.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101264620

Oscar Carrascal S.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264620	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	25	08	2022	00:00	24	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		NIT: 901.608.115-8	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		NIT: 800.096.761-0	
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD: LOS CORDOBAS, CORDOBA	TELÉFONO	7603002
ADICIONAL:			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,894,272.00	$ *******8,000.00	$ *****361,431.00	$ *********2,263,704.00	$ ***11,694,412,174.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002613108230(3900)000002263704(96)20230825

REFERENCIA PAGO: 1100261310823-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264620	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	25	08	2022	00:00	24	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		NIT:	901.608.115-8
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		NIT:	800.096.761-0
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL	**CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7603002

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.	901078052-7	50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR	15679252	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de JULIO de 2023

15-44-101264620

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2023	25	08	2022	00:00	30	10	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT: 901.608.115-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	NIT: 800.096.761-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA PARA INCLUIR COMO TERCEROS BENEFICIARIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. No. 800.215.807-2, ASI:

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CON NIT 800.096.761-0. Y EL CONTRATISTA

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - NIT 800.096.761-0 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. No. 800.215.807-2

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2023	25	08	2022	00:00	30	10	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	**NIT: 901.608.115-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	**NIT: 800.096.761-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2023	25	08	2022	00:00	30	10	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		NIT: 901.608.115-8
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		NIT: 800.096.761-0
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL	**CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7503002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.	901078052-7	50.00
SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR	15679252	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2023	25	08	2022	00:00	30	10	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT: 901.608.115-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	MONTERIA, CORDOBA	3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	NIT: 800.096.761-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PARQUE PRINCIPAL	LOS CORDOBAS, CORDOBA	7603002

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana coopcentral

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA	194904	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

(POLIZA DE SEGUROS)

En el Municipio de Los Córdobas, el día ocho (08) del mes de agosto de 2023 se procede a aprobar la póliza de cumplimiento No. 15-44-101264620 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 15-40-101079887 vigencia actualizada para La Prorroga N° 2 por SEGUROS DEL ESTADO S.A., el treinta y uno (31) del mes de julio de 2023 a favor de **ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS**, con Nit No. 800096761-0 y/o INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Nit No.800.215.807-2 para garantizar el cumplimiento del afianzado en desarrollo a través de la prorroga N° 2 con fecha de 27 de julio de 2023 derivado del Contrato de licitación Pública No. 007 - 2022 suscrito el veintiocho (28) del mes de junio de 2022. Entre la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DELOS CÓRDOBAS** y **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS** NIT. 9016081158, R.L OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ C.C. 1.007.801.563 DE SAHAGÚN, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021**"

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Responsabilidad civil	$ 500.000.000	Desde 25/08/2022 Hasta 30/10/2023
Cumplimiento del contrato	$ 899.570.167,30	Desde 25/08/2022 Hasta 30/10/2023
Correcta inversión del anticipo	$ 3.598.280.669,20	Desde 28/05/2022 Hasta 30/10/2023
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.799.140.334,60	Desde 25/08/2022 Hasta 30/10/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 2.698.710.501,90	Desde 24/02/2023 Hasta 24/02/2028
Calidad del Servicio	$ 2.698.710.501,90	Desde 31/12/2022 Hasta 31/12/2027

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101264520	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2023	25	08	2022	00:00	24	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		NIT: 901.608.116-8
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS		NIT: 800.096.761-0
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL	CIUDAD: LOS CORDOBAS, CORDOBA	TELÉFONO 7603002
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU01D, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPAROS


RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2022	30/10/2023	$899,570,167.30	$899,570,167.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/08/2022	30/10/2023	$3,598,280,669.20	$3,598,280,669.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2022	30/10/2026	$1,799,140,334.60	$1,799,140,334.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/02/2023	24/02/2028	$2,698,710,501.90	$2,698,710,501.90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022	31/12/2027	$2,698,710,501.90	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 2, SE PRORROGA HASTA EL 30/10/2023 CONTRATO No LP 007-2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

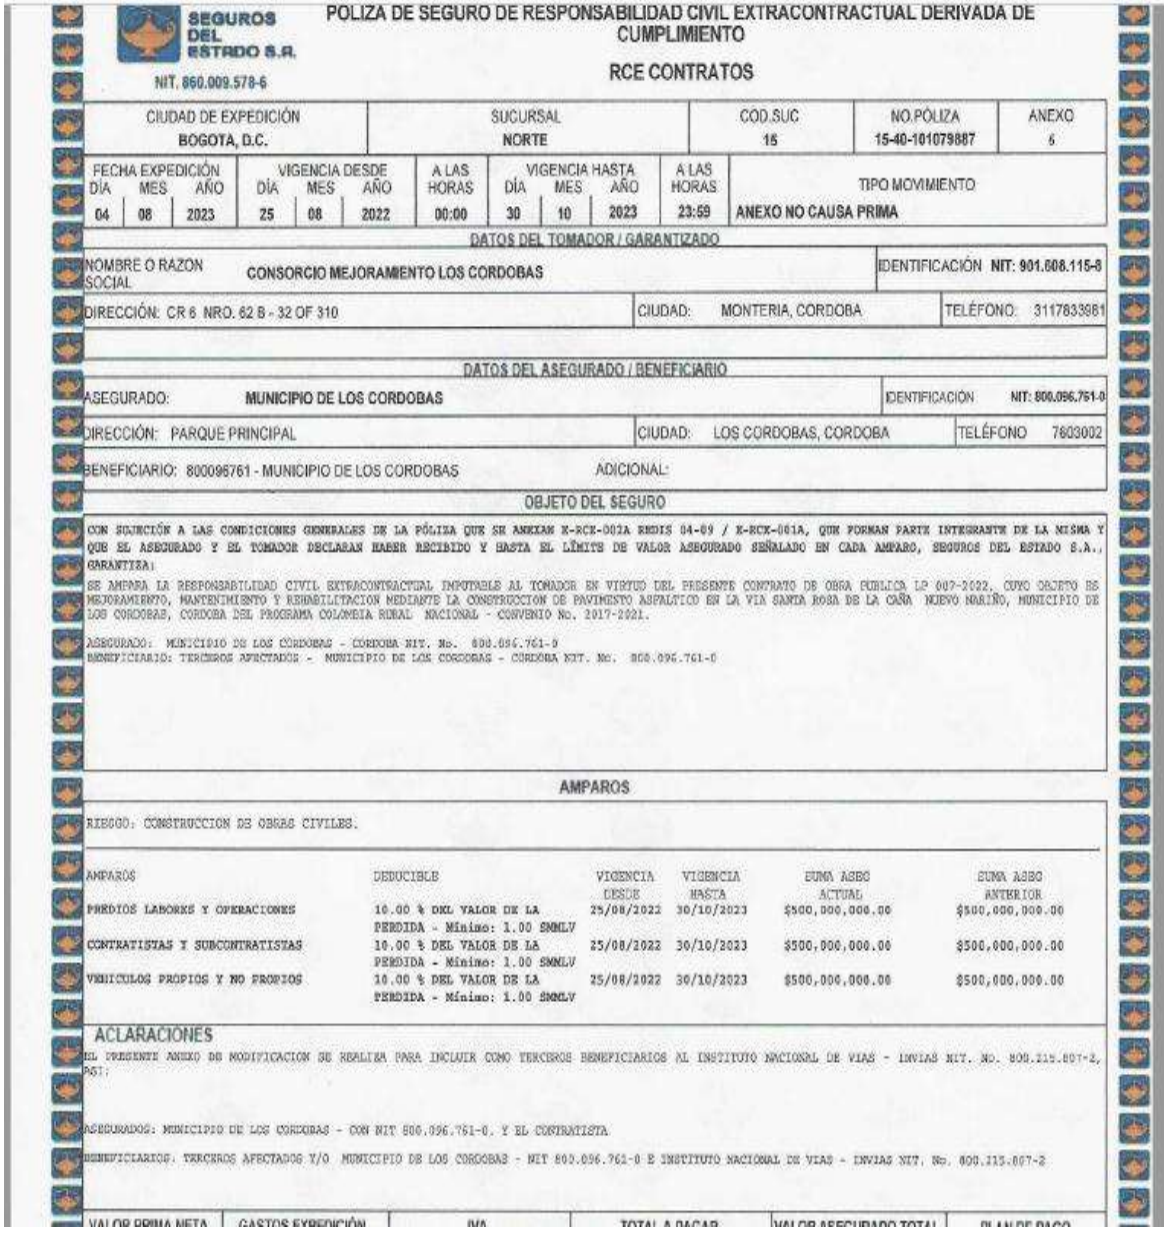

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101079887	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2023	25	08	2022	00:00	30	10	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.608.115-8

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3117833981

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.761-0

DIRECCIÓN: PARQUE PRINCIPAL — CIUDAD: LOS CORDOBAS, CORDOBA — TELÉFONO 7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-001A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2022	30/10/2023	$500,000,000.00	$500,000,000.00

ACLARACIONES

EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE REALIZA PARA INCLUIR COMO TERCEROS BENEFICIARIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. No. 800.215.807-2, PGI:

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CON NIT 800.096.761-0. Y EL CONTRATISTA

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - NIT 800.096.761-0 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT. No. 800.215.807-2

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO

VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA



Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
15-40-101079887

Número de anexo:
6

Fecha de expedición:
viernes, 4 de agosto de 2023

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL


Asegurado:
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Tomador:
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

Inicio de vigencia:
jueves, 25 de agosto de 2022

Fin vigencia:
lunes, 30 de octubre de 2023

Valor total asegurado:
$ 500.000.000

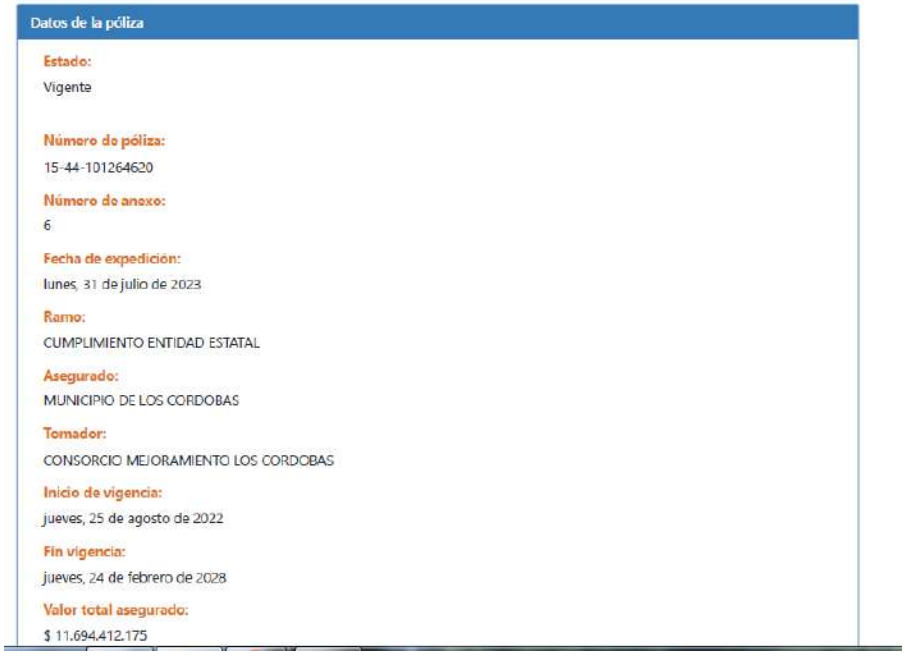

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
15-44-101264620

Número de anexo:
6

Fecha de expedición:
lunes, 31 de julio de 2023

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Tomador:
CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

Inicio de vigencia:
jueves, 25 de agosto de 2022

Fin vigencia:
jueves, 24 de febrero de 2028

Valor total asegurado:
$ 11.694.412.175

Se aprueban las garantías por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por la entidad - ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VANESSA LUCIA PATERNINA GONZÁLEZ
Secretaria de Planeación Municipal

MEPI-MN1-IN-15-FR-10
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

LP-007-2022
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-007-2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES JULIO DE 2023**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24		24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	22	23	24	24	22	24	24	24	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas						7,5					5											3		2	1			2				20,5
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS LLUVIAS HAN RETRAZADO EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES

Oscar Carrascal S.
Firma
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Oscar Hernandez
Firma
Nombre: OSCAR CARRASCAL C.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 222022132936 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-007-2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-23 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES AGOSTO DE 2023**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	22	22	23	24	24	24	24	22	24	19	21	24	24	21	22	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	19	715.5
Lluvias moderadas									2							2															5	9
Lluvias intensas	1.5	2	2.5	1.5							5	3			3																	18.5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se anexa el registro del IDEAM de la estación hidrometeorológica más cercana y en funcionamiento al proyecto (estación Arboletes)

Firma
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Firma
Nombre: OSCAR HERNANDEZ C.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202132936 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-007-2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-23 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DE 2023**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	21	21.5	24	24	24	21	24	21	24	19	22.5	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	21	24	24	17.5	24	24	24	20	685.5
Lluvias moderadas																2										6.5					8.5
Lluvias intensas		3	2.5				3		3		5	1.5			1								3							4	26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se anexa el registro del IDEAM de la estación hidrometeorológica más cercana y en funcionamiento al proyecto (estación Arboletes)

Firma
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Firma
Nombre: OSCAR HERNANDEZ C
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202132936 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-007-2022 **CONTRATISTA:** Consorcio Mejoramiento los Córdobas

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-23 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES AGOSTO DE 2023**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	24	24	21	24	20	24	24	22	24	21	22	24	19	24	22	24	24	24	18	24	24	21	24	20	18	24	24	24	20	673,1
Lluvias moderadas																															0
Lluvias intensas				3,5		3,9			2		3,5	2,5		5,5		2,5				5,9					4,1						33,4
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	18	24	24	24	20	706,5

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se anexa el registro del IDEAM de la estación hidrometeorológica más cercana y en funcionamiento al proyecto (estación Arboletes)

Firma
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Firma
Nombre: OSCAR HERNANDEZ C
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202132936 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Gmail **OSCAR CARRASCAL <mejoramientoloscordobas1@gmail.com>**

SOLICITUD DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

2 mensajes

OSCAR CARRASCAL <mejoramientoloscordobas1@gmail.com> 14 de octubre de 2023, 13:24
Para: contacto@ideam.gov.co

Buenas tardes, cordial saludo.

En vista de que la página del IDEAM se encuentra caída hace varias semanas (no permite ingresar parámetros ni información del departamento y municipio a consultar) , no ha sido posible realizar la consulta y descarga de datos hidrometeorológicos correspondientes para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Por lo tanto, le solicito de manera muy respetuosa, nos envíen por este medio dicha información, con los parámetros descritos a continuación:

Datos Estación hidrometeorológica
Periodo requerido: Desde el 06 de julio de 2023 hasta el 14 de octubre de 2023(O hasta la fecha en la que sea respondida la solicitud).
Parámetro: Precipitación
Variable: Dia Pluviométrico Convencional
Departamento: Antioquia
Municipio: Arboletes
Estación: ARBOLETES [12045010]

De antemano agradeciendo la atención prestada y la pronta respuesta,
Atentamente,


OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Consorcio Mejoramiento Los córdobas


OSCAR CARRASCAL <mejoramientoloscordobas1@gmail.com> 26 de octubre de 2023, 11:49
Para: ing.olblanco@gmail.com


Inicio del mensaje reenviado:


De: OSCAR CARRASCAL <mejoramientoloscordobas1@gmail.com>
Fecha: 24 de octubre de 2023, 1:24:33 p. m. COT
Para: contacto@ideam.gov.co
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

[El texto citado está oculto]

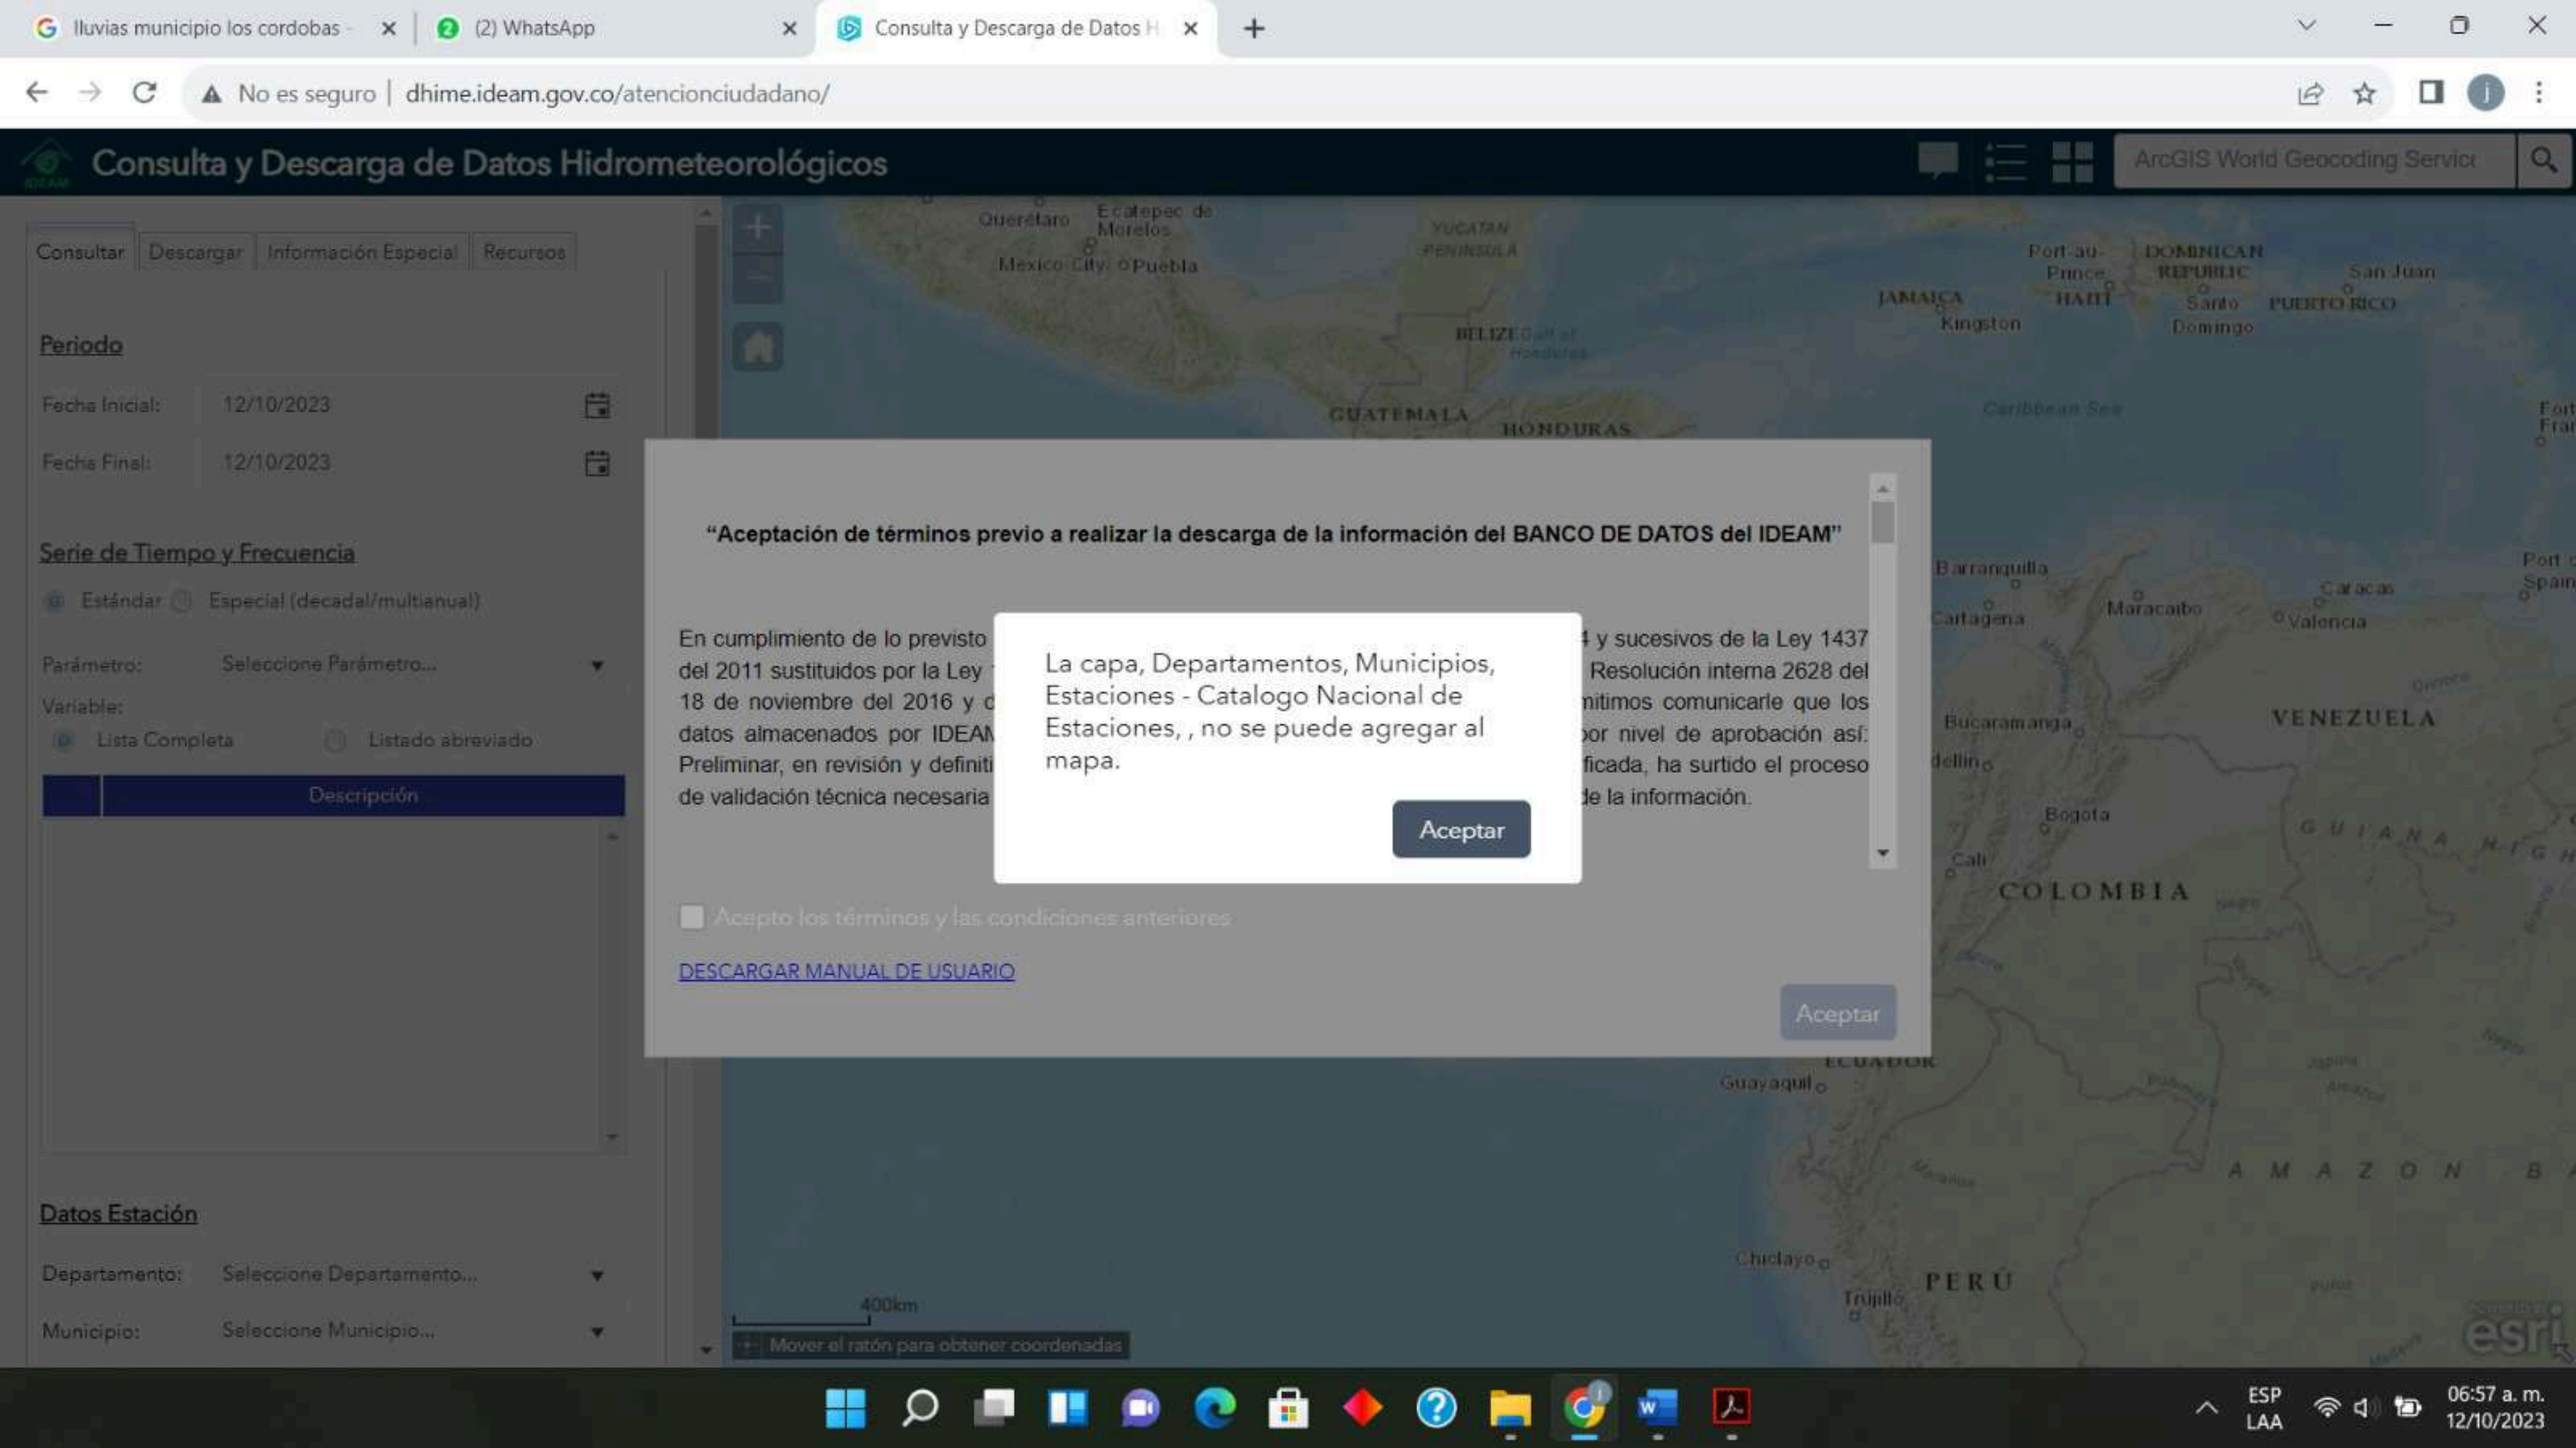
Iluvias municipio los cordobas
(2) WhatsApp
Consulta y Descarga de Datos H
No es seguro | dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
ArcGIS World Geocoding Servic
Consultar
Descargar
Información Especial
Recursos
Periodo
Fecha Inicial: 12/10/2023
Fecha Final: 12/10/2023
Serie de Tiempo y Frecuencia
Estándar
Especial (decadal/multianual)
Parámetro: Seleccione Parámetro...
Variable:
Lista Completa
Listado abreviado
Descripción
Datos Estación
Departamento: Seleccione Departamento...
Municipio: Seleccione Municipio...
"Aceptación de términos previo a realizar la descarga de la información del BANCO DE DATOS del IDEAM"
En cumplimiento de lo previsto
y sucesivos de la Ley 1437
del 2011 sustituidos por la Ley
Resolución interna 2628 del
18 de noviembre del 2016 y c
nitimos comunicarle que los
datos almacenados por IDEAM
or nivel de aprobación así:
Preliminar, en revisión y definiti
ficada, ha surtido el proceso
de validación técnica necesaria
de la información.
La capa, Departamentos, Municipios, Estaciones - Catalogo Nacional de Estaciones, , no se puede agregar al mapa.
Aceptar
Acepto los términos y las condiciones anteriores
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO
Aceptar
Querétaro
Ecatepec de Morelos
Mexico City
Puebla
YUCATAN PENINSULA
JAMAICA
Kingston
Port-au-Prince
HAITI
DOMINICAN REPUBLIC
Santo Domingo
PUERTO RICO
San Juan
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
Caribbean Sea
Barranquilla
Cartagena
Maracaibo
Caracas
Valencia
Bucaramanga
VENEZUELA
Bogota
Cali
COLOMBIA
GUIANA HIGH
ECUADOR
Guayaquil
AMAZON
Chiclayo
Trujillo
PERÚ
400km
Mover el ratón para obtener coordenadas
esri
ESP
LAA
06:57 a. m.
12/10/2023

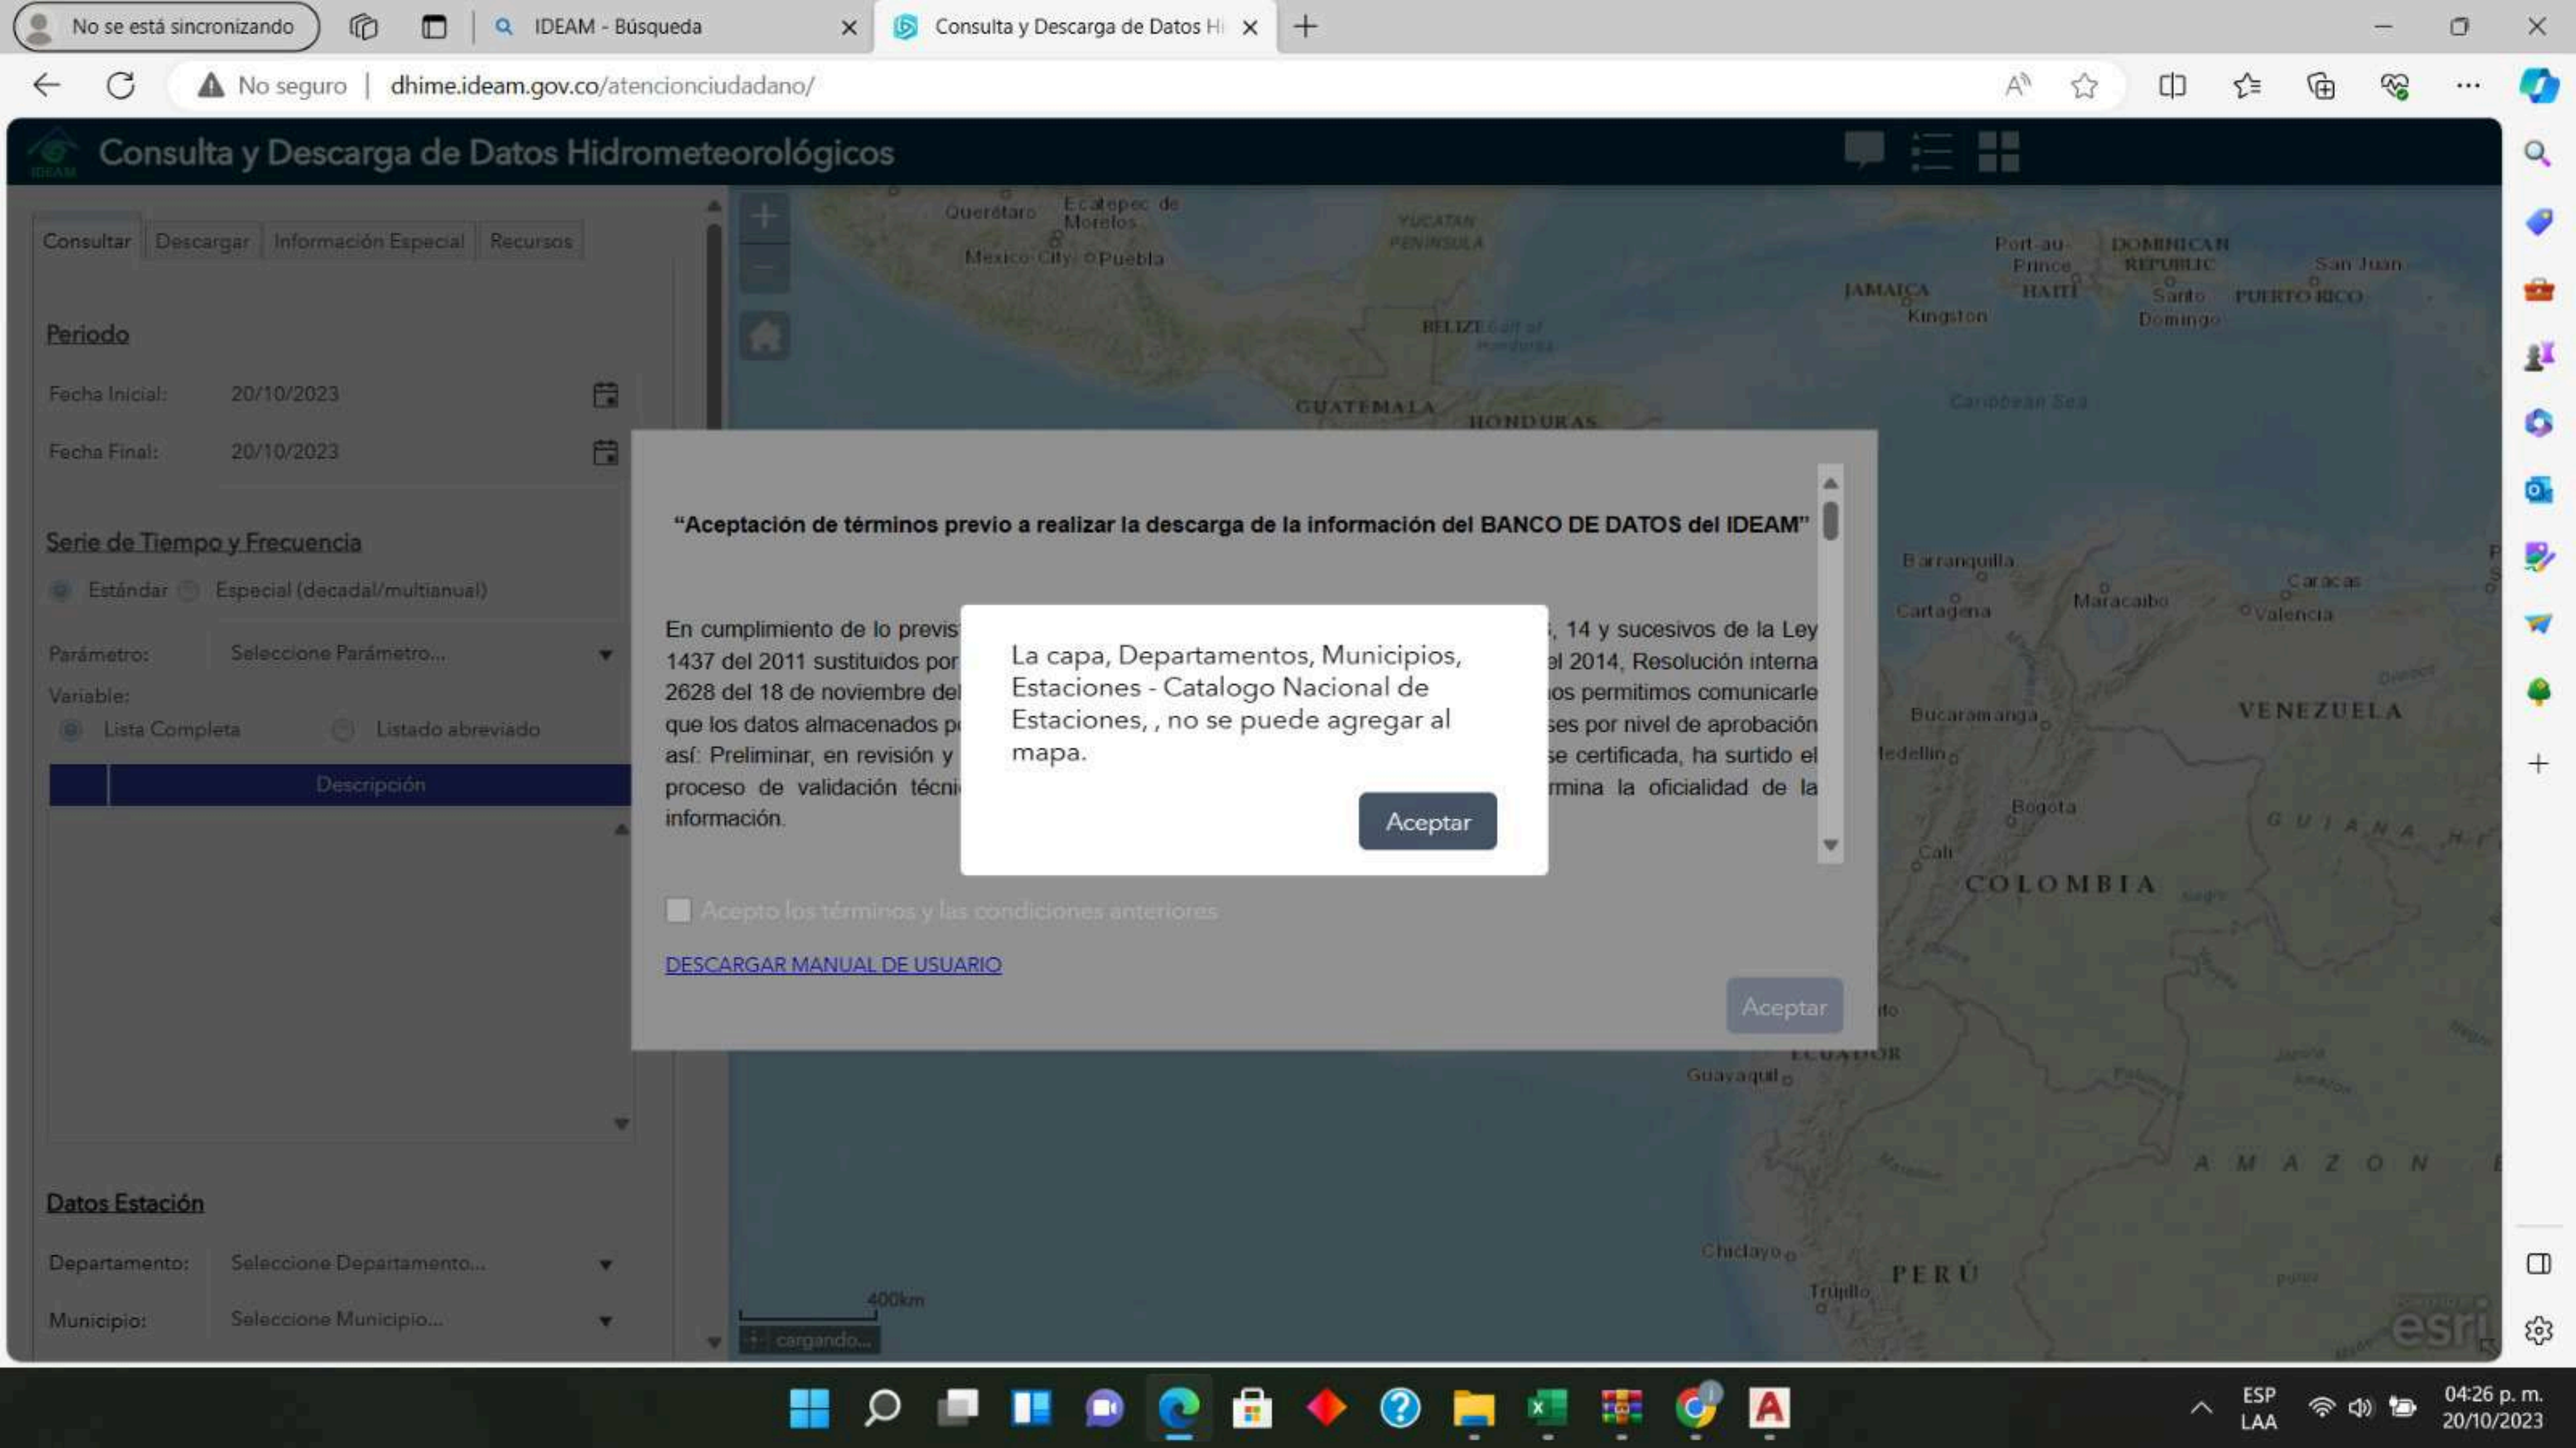
No se está sincronizando
IDEAM - Búsqueda
Consulta y Descarga de Datos Hi
No seguro | dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
Consultar
Descargar
Información Especial
Recursos
Periodo
Fecha Inicial: 20/10/2023
Fecha Final: 20/10/2023
Serie de Tiempo y Frecuencia
Estándar
Especial (decadal/multianual)
Parámetro: Seleccione Parámetro...
Variable:
Lista Completa
Listado abreviado
Descripción
Datos Estación
Departamento: Seleccione Departamento...
Municipio: Seleccione Municipio...
"Aceptación de términos previo a realizar la descarga de la información del BANCO DE DATOS del IDEAM"
En cumplimiento de lo previs
, 14 y sucesivos de la Ley
1437 del 2011 sustituidos por
el 2014, Resolución interna
2628 del 18 de noviembre del
os permitimos comunicarle
que los datos almacenados p
ses por nivel de aprobación
así: Preliminar, en revisión y
se certificada, ha surtido el
proceso de validación técni
rmina la oficialidad de la
información.
La capa, Departamentos, Municipios, Estaciones - Catalogo Nacional de Estaciones, , no se puede agregar al mapa.
Aceptar
Acepto los términos y las condiciones anteriores
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO
Aceptar
Querétaro
Ecatepec de Morelos
Mexico City
Puebla
YUCATAN PENINSULA
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Kingston
Port-au-Prince
HAITI
DOMINICAN REPUBLIC
Santo Domingo
PUERTO RICO
San Juan
Caribbean Sea
Barranquilla
Cartagena
Maracaibo
Caracas
Valencia
Bucaramanga
Medellín
Bogotá
Cali
VENEZUELA
COLOMBIA
GUIANA
ECUADOR
Guayaquil
AMAZON
Chiclayo
Trujillo
PERÚ
400km
cargando...
esri
ESP
LAA
04:26 p. m.
20/10/2023

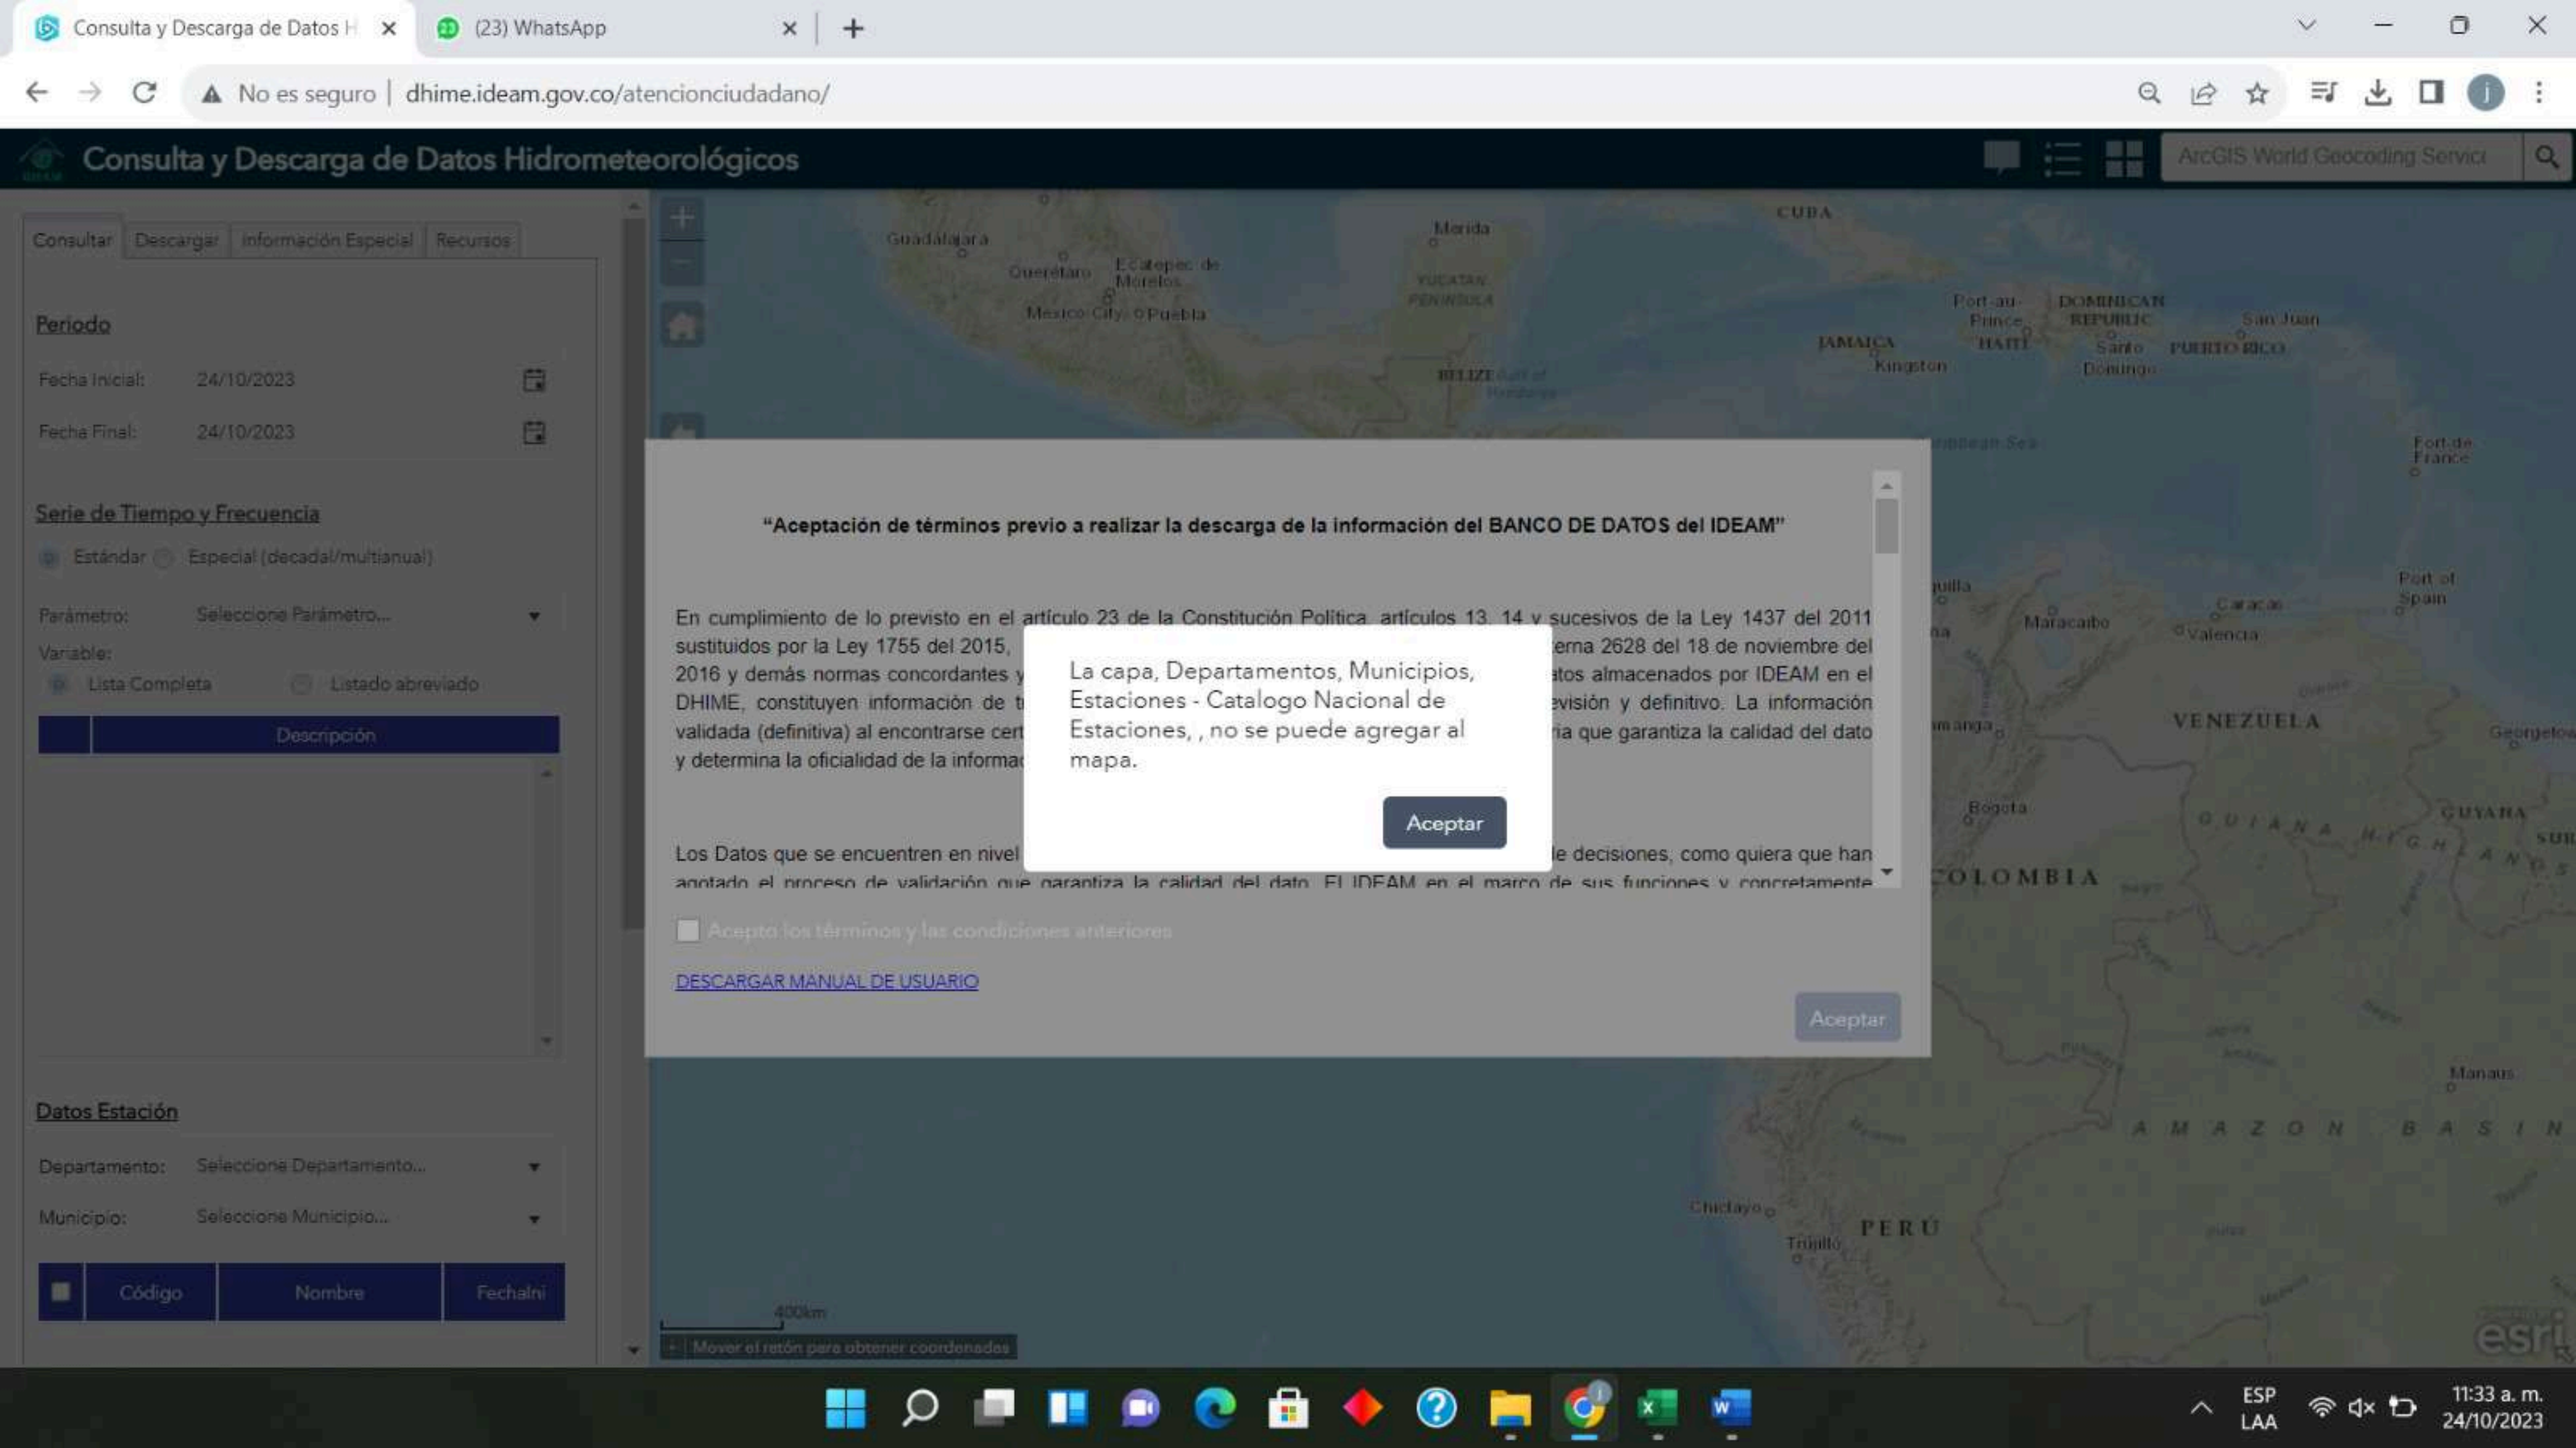
Consulta y Descarga de Datos H
(23) WhatsApp
No es seguro | dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
ArcGIS World Geocoding Servic
Consultar
Descargar
Información Especial
Recursos
Periodo
Fecha Inicial: 24/10/2023
Fecha Final: 24/10/2023
Serie de Tiempo y Frecuencia
Estándar
Especial (decadal/multianual)
Parámetro: Seleccione Parámetro...
Variable:
Lista Completa
Listado abreviado
Descripción
Datos Estación
Departamento: Seleccione Departamento...
Municipio: Seleccione Municipio...
Código
Nombre
FechaIni
"Aceptación de términos previo a realizar la descarga de la información del BANCO DE DATOS del IDEAM"
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, artículos 13, 14 y sucesivos de la Ley 1437 del 2011 sustituidos por la Ley 1755 del 2015,
erna 2628 del 18 de noviembre del 2016 y demás normas concordantes y
atos almacenados por IDEAM en el DHIME, constituyen información de t
evisión y definitivo. La información validada (definitiva) al encontrarse cert
ria que garantiza la calidad del dato y determina la oficialidad de la informa
Los Datos que se encuentren en nivel
e decisiones, como quiera que han agotado el proceso de validación que garantiza la calidad del dato. El IDEAM en el marco de sus funciones y concretamente
Acepto los términos y las condiciones anteriores
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO
Aceptar
La capa, Departamentos, Municipios, Estaciones - Catalogo Nacional de Estaciones, , no se puede agregar al mapa.
Aceptar
CUBA
Guadalajara
Querétaro
Ecatepec de Morelos
Mexico City
Puebla
Merida
YUCATAN PENINSULA
BELIZE
JAMAICA
Kingston
Port-au-Prince
HAITI
DOMINICAN REPUBLIC
Santo Domingo
PUERTO RICO
San Juan
Fort-de-France
Port of Spain
Caracas
Valencia
Maracaibo
VENEZUELA
Bogotá
COLOMBIA
GUYANA
SURINAME
AMAZON BASIN
Manaus
Chiclayo
Trujillo
PERÚ
400km
Mover el retón para obtener coordenadas
esri
ESP
LAA
11:33 a. m.
24/10/2023

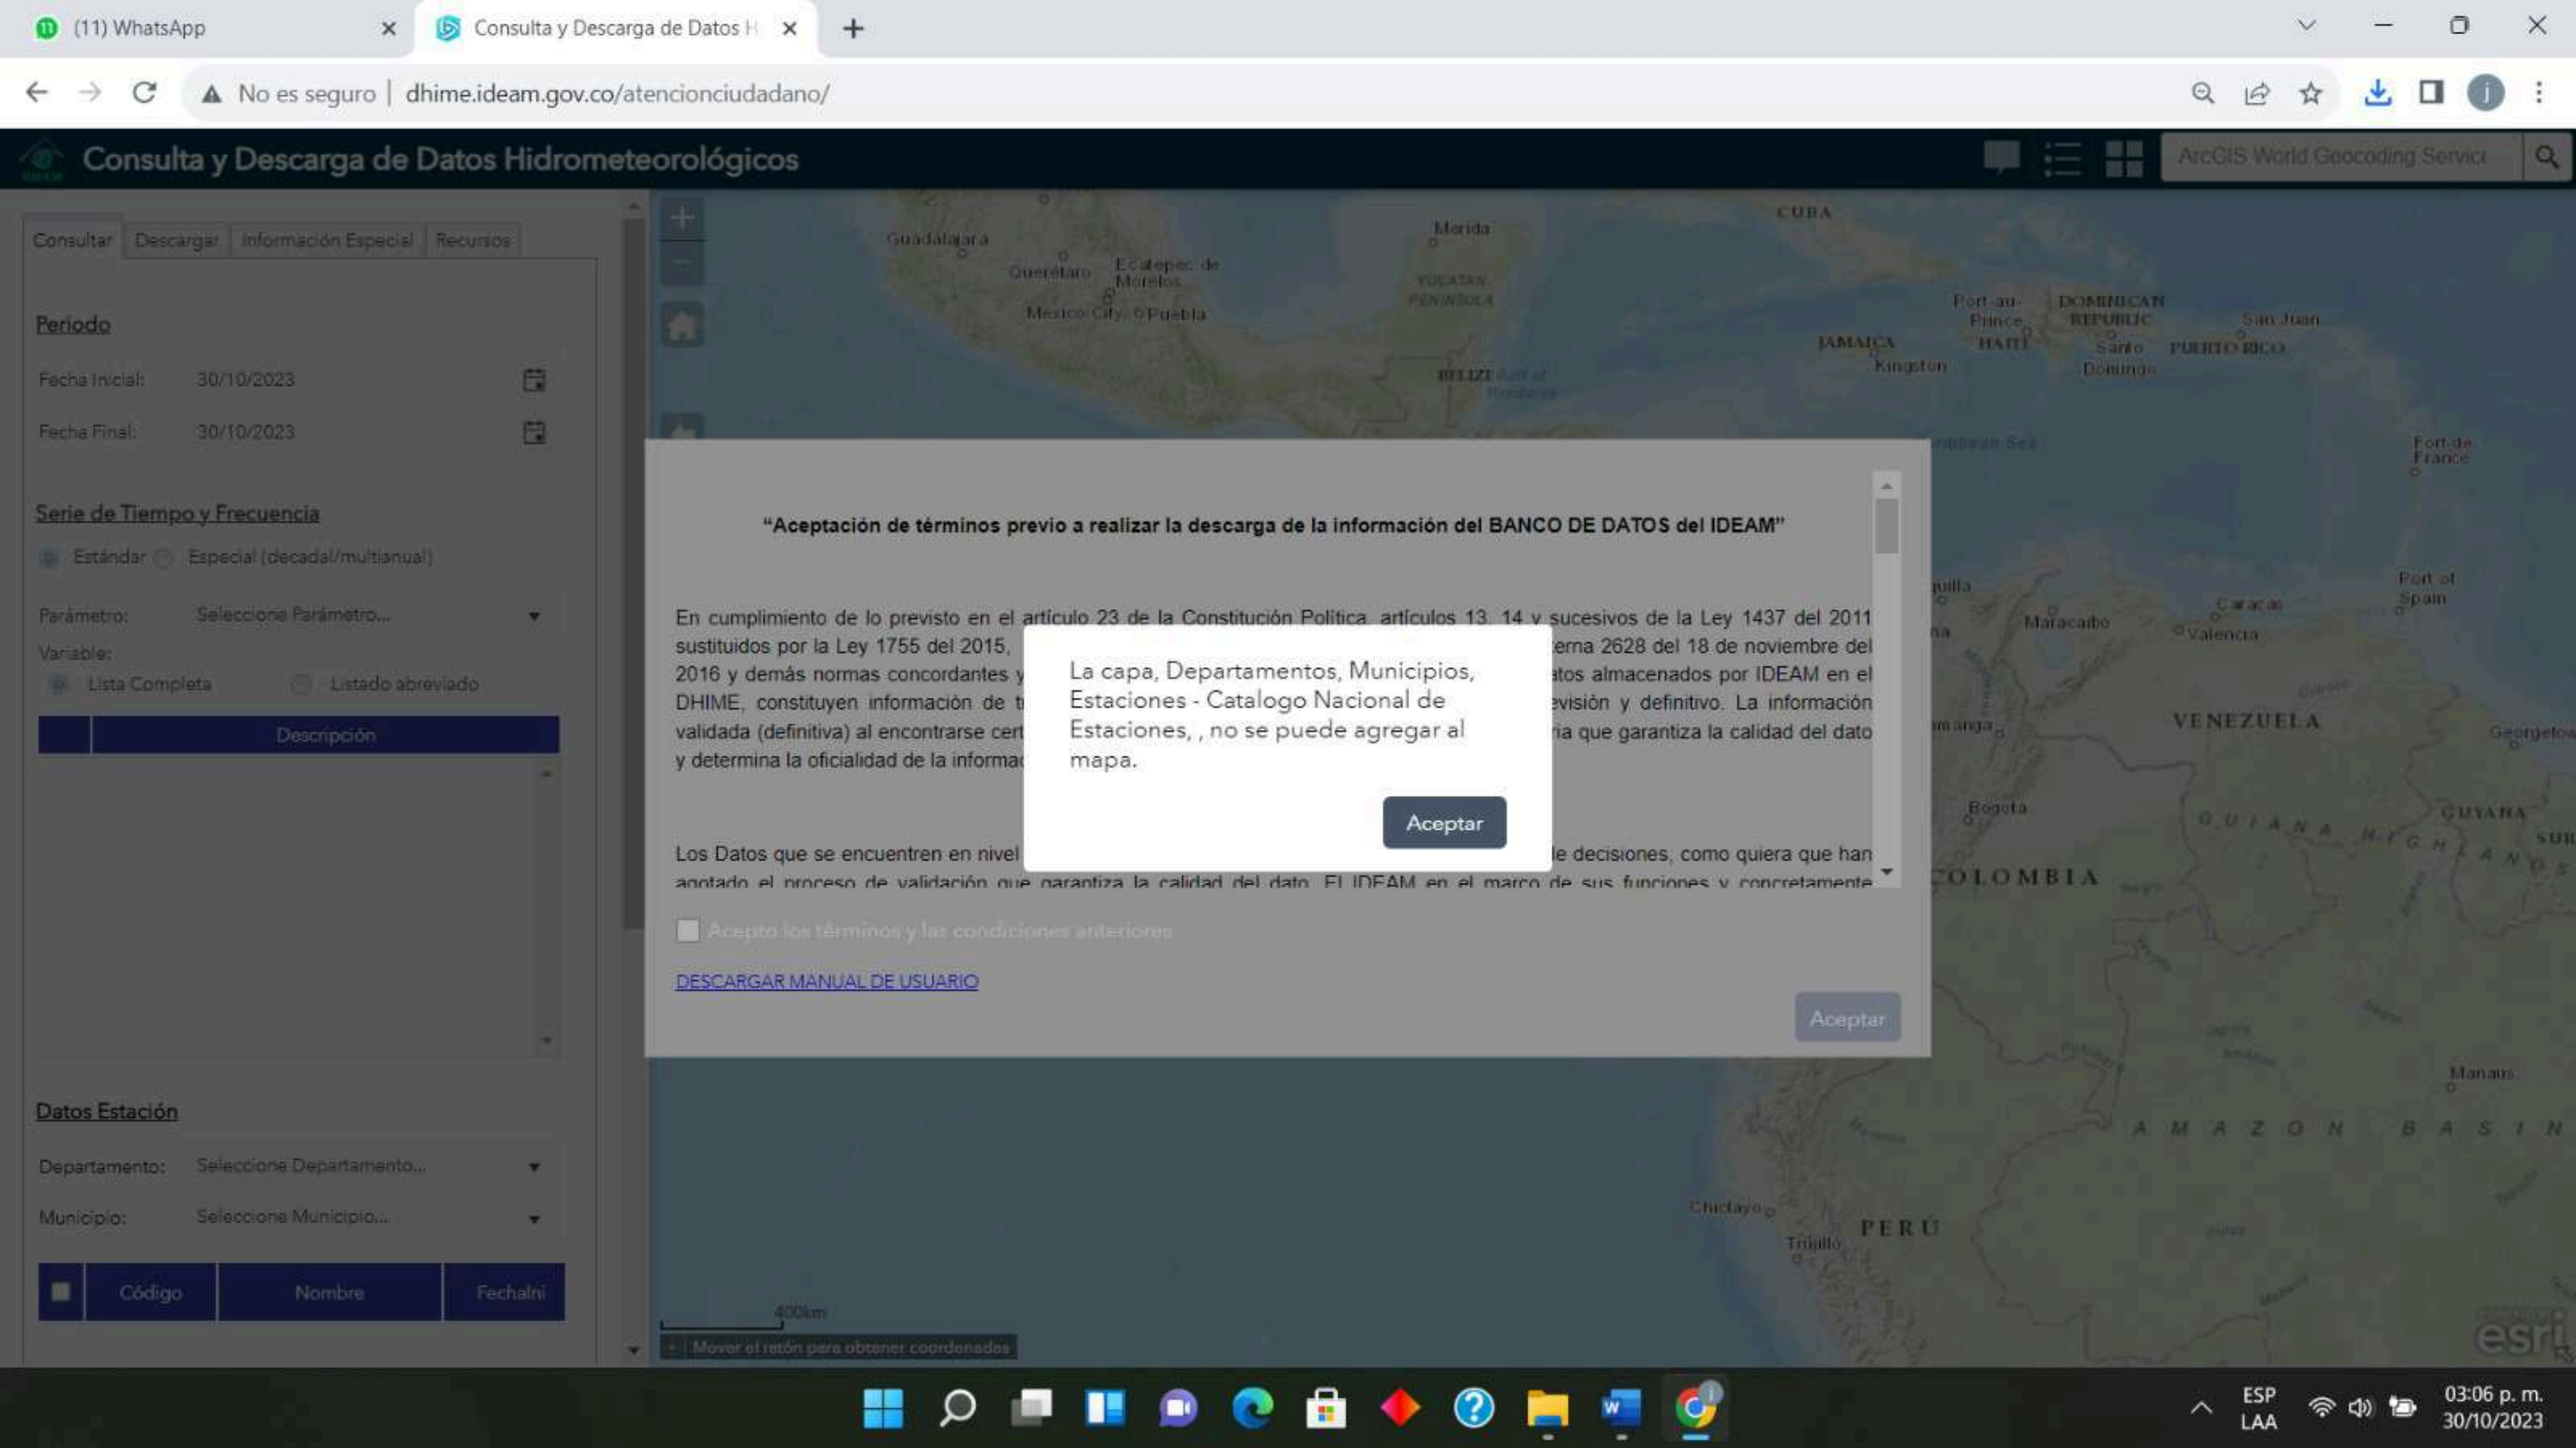
(11) WhatsApp
Consulta y Descarga de Datos H
No es seguro | dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos
ArcGIS World Geocoding Servic
Consultar
Descargar
Información Especial
Recursos
Periodo
Fecha Inicial: 30/10/2023
Fecha Final: 30/10/2023
Serie de Tiempo y Frecuencia
Estándar
Especial (decadal/multianual)
Parámetro: Seleccione Parámetro...
Variable:
Lista Completa
Listado abreviado
Descripción
Datos Estación
Departamento: Seleccione Departamento...
Municipio: Seleccione Municipio...
Código
Nombre
FechaIni
"Aceptación de términos previo a realizar la descarga de la información del BANCO DE DATOS del IDEAM"
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, artículos 13, 14 y sucesivos de la Ley 1437 del 2011 sustituidos por la Ley 1755 del 2015,
erna 2628 del 18 de noviembre del 2016 y demás normas concordantes y
atos almacenados por IDEAM en el DHIME, constituyen información de t
evisión y definitivo. La información validada (definitiva) al encontrarse cert
ria que garantiza la calidad del dato y determina la oficialidad de la informa
Los Datos que se encuentren en nivel
e decisiones, como quiera que han agotado el proceso de validación que garantiza la calidad del dato. El IDEAM en el marco de sus funciones y concretamente
Acepto los términos y las condiciones anteriores
DESCARGAR MANUAL DE USUARIO
Aceptar
La capa, Departamentos, Municipios, Estaciones - Catalogo Nacional de Estaciones, , no se puede agregar al mapa.
Aceptar
Guadalajara
Querétaro
Ecatepec de Morelos
Mexico City
Puebla
Merida
YUCATAN PENINSULA
BELIZE
CUBA
JAMAICA
Kingston
Port-au-Prince
HAITI
DOMINICAN REPUBLIC
Santo Domingo
San Juan
PUERTO RICO
Fort-de-France
Port of Spain
Maracaibo
Caracas
Valencia
VENEZUELA
Bogotá
COLOMBIA
GUYANA
SURINAME
Manaus
AMAZON BASIN
Chiclayo
Trujillo
PERÚ
400km
Mover el retón para obtener coordenadas
esri
ESP
LAA
03:06 p. m.
30/10/2023

BITACORA DE OBRA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

Julio 01 del 2023 (Sabado)
Horario Laboral: 7 - 12 pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Operadores (9) Almacenista (1), Oficios Varios (4), Paleteros (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pgarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de ~~sub~~base en el tramo (K1+648 - K2+208)

Se realiza cambio de motoniveladora galion por champion



Residente interventoría

D°9. obra.

Julio 04 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Operadores(9), Almacenista(1), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1) Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de base en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Retiro de material proveniente de la excavación

Se le recuerda al contratista realizar retiros de material de escombro presentes a lo largo de la vía

Residente interventoría

Dir. obra.

Julio 05 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12 pm y 1 - 5 pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Oficios Varios (4), Paleteros (4), Operadores (9), Laboratorista (1).

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retro excavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) Carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de base en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de base en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Retiro de material proveniente de la excavación

Residente Interventoría



Of. obra.


Julio 06 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7-12pm y 1-5pm
Estado del tiempo: Se presentaro fuertes lluvias desde las 2:00am hasta las 9:30am y el resto del dia estuvo nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

* Debido a las fuertes lluvias no fue posible ejecutar actividades en la obra



Residente interventoría

Dpto. obra.

Julio 07 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) Siso(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pasanta(1) Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de base en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Adecuación de desvío provisional en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)

* Debido a las fuertes lluvias del día anterior las actividades del dia de hoy se iniciaron a partir de las 11:00am porque el terreno estaba muy saturado

En horas de la tarde se toma densidad a subbase en tramo del 1+850 al 2+070 con los sgts. resultados
1+918 (izq) con 111.4 %, 1+970 (ESE) con 104.2 % y 2+030 (Der) con 112.85 %. se aprueba tramo por niveles y densidad

Residente interventoría

Dir. obra

Julio 08 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comision topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1) Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2). Volquetas(2) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de subbase en el tramo (K_{2+298} - K_{3+435})
- Replanteo de la vía en el tramo (K_{2+298} - K_{3+435})

Residente interventoría



Dir obra.

Julio 10 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspectos(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1) Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1),

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1),

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Replanteo de la vía en el tramo (K2+298 - K3+435)

Residente interventoría



del obra

Julio 11 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 11:00pm del dia anterior hasta las 5:00am del presente dia; resto del dia, nublado en la mañana, y soleado en la tarde.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K3+435)
- Replanteo de la vía en el tramo (K2+298 - K3+435)

*Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la noche y madrugada, las actividades de la obra se iniciaron despues de la 1:00pm y solo pudo entrar un doble cargado de base porque la via de acceso estaba muy saturada.

Residente interventoría

D.R obra.

Julio 12 del 2023 (Miercoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde la 1:00 am hasta las 5:00 am; resto del día soleado


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), Maestro (1), Oficios Varios (4) Paletero (4), Laboratorista (1).

Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1) Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de filtro Longitudinal en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K2+298 - K3+435)

*Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada las actividades se iniciaron despues de la 1:00pm y solo pudo entrar una volqueta doble cargada con base porque el acceso estaba muy saturado



Residente interventoria

Dra obra.


Julio 13 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1),

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Mejoramiento en piedra en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K2+387)



Residente interventoría

Ope Obra.

Julio 14 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: se presentaron lluvias de intensidad baja desde las 2:00am hasta las 4:00am y nuevamente se presentaron lluvias de alta intensidad desde las 7:00am hasta las 10:00am y el resto del día estuvo nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operadores(9), Oficios Varios(4), Paletero(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2) Volquetas(2), Carrotanque(2).

* Debido a las fuertes lluvias no se pudo realizar ningún tipo de actividades.

Residente interventoría

OP2 obra

Julio 15 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12 pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), Oficios Varios (4), Paletero (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de afirmado en el tramo (K2+298 - K2+387)
-



Residente interventoría

Dpe obra.

Julio 17 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topográfica (1) Almacenista (1), Oficios varios (4), Operadores (9), Paleteros (4), Laboratorista (1),


Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Payanta (1), Motoniveladoras (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) Carrotanque (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo ($K_{0+000} - K_{0+273}$)
- Instalación de Base en el tramo ($K_{0+669} - K_{1+040}$)
- Instalación de afirmado en el tramo ($K_{2+298} - K_{2+387}$)

Se presentan lluvias moderadas de 5:00 pm a 7:00 pm

Residente interventoría



DP2 obra.

Julio 18 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), siso(1), Profesional Social(1) Comision topografica(1), Almacenista(1), Oficios Varios(4), Operadores(9), Paleteros(4), laboratorista(1).


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comision topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carro tanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalacion de Base en el tramo (K0+669 - K1+040)

* Debido a las lluvias presentadas en la noche desde las 6:00pm hasta las 8:00pm las actividades se iniciaron a partir de la 1:00pm

En el dia de hoy amanece lloviendo de 6 am a 8 am
Se reporta un vibrocompactador averiado



Residente interventoria

Del dobo.

Julio 19 del 2023 (Miercoles)
Horario laboral: 7-12pm y 1-5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(9), oficios Varios(4), Paletero(4), laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Habilitación de desvio debido a cierre de la vía

Vibrocompactador reparado



Residente interventoria

Dif. obra


Julio 20 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operador(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Mejoramiento a puntos criticos sobre la vía de acceso



Residente interventoría

Julio 21 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Operadores(9), Almacenista(1), oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Viprocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la via en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Mejoramiento de puntos criticos sobre la via de acceso

Falla mecanica en motoniveladora Champion, se realiza cunetas para manejo de aguas



Residente interventoría

OBRA.

Julio 22 del 2023 (sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: se presentaron lluvias desde las 7:00 am hasta las 10:00pm

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Comisión topografica(1), Inspector(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

* Debido a las lluvias presentadas no fué posible realizar ningun tipo de actividades.

La motoniveladora champion continua varada

Residente interventoría



DPP - 2022.

Julio 24 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Jornada de la mañana soleada; Se presentaron lluvias fuertes desde las 1:20pm hasta las 3:00pm

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), Oficios Varios (4), Paleteros (4), Laboratorista (1)


Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2). Carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)

* Debido a las lluvias no se pudo seguir con las actividades en la jornada de la tarde

Se recibe tramo en subbase del tramo 2+060 al 2+208 con los siguientes resultados 2+100 con 99.9 % y 2+180 con 96.79 %



DD - obra.

Residente interventoría

Julio 25 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana bastante nublada con una Leve lluvia de 7:00am a 9:00am; Tarde soleada

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4) Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K2+793 - K3+435)
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)

* Debido a las fuertes lluvias presentadas en la tarde del día anterior la vía se encontraba bastante saturada por lo que no fue posible iniciar actividades si no después de 1:00pm

Ja motoniveladora champion continua varada

Residente interventoría

Obra.

Julio 26 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de base en el tramo (K1+648 - K2+208)

La motoniveladora CAT presento falla en horas de la tarde pero fué solucionado el problema, La motoniveladora champion continua varada

Residente interventoría



Julio 27 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9) Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2) Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)

Se realiza cerramiento con malla en acopios

La motoniveladora champion continua varada



ab. obra.

Residente interventoría

Julio 28 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana Soleada; Se presentaron fuertes lluvias desde las 12:30pm hasta la 2:30pm; Resto del dia nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comision topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comision topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K1+618 - K2+208)

* Debido a las fuertes lluvias no se realizó ningún tipo de actividades en la jornada de la tarde

La motoniveladora champion continua varada

Residente interventoría

D.R - 0600.

Julio 29 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), Oficios varios (4), Paleteros (4), Laboratorista (1).

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volquetas (2) Carrotanque (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la via en el tramo (K0+000 - K0+273)

* Debido a mantenimiento de las maquinas no se pudo realizar otro tipo de actividades

Ingresa el dia de hoy a obra el compactador de neumaticos

Residente Interventoría

Dir. obra.

Julio 31 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: se presentaron fuertes lluvias desde las 12:30 am hasta las 5:00 am; mañana nublada y tarde soleada.


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Almacenista(1), Comisión topografica(1), Operadores(9), Paleteros(4), Oficios Varios(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(2), Carrotanque(1).

* Debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la madrugada no se realizó ningun tipo de materiales.

Residente Interventoría



Dir obra.

Agosto 01 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Almacenista(1), Comisión topografica(1), Operadores(9), Paleteros(4), Oficios Varios(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volqueta(2) Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la intersección en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de afirmado en la intersección del tramo (K0+000 - K0+273)

Novizna de 1 hora en la mañana de hoy
Se reporta motoniveladora champan varada



Residente interventoría D.P. obra.

Agosto 02 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 11:30pm del día anterior hasta las 2:00am del presente día; mañana parcialmente nublada y tarde soleada

Personal de Obra: Director; Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la intersección en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de afirmado en la intersección (K0+220)
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)

*Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada las actividades de la obra iniciaron despues de la 1:00pm
La motoniveladora champion continúa varada

Residente Interventoría



Agosto 03 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias entre las 12:00am y la 1:00am y nuevamente de 5:00am a 6:30am; mañana parcialmente nublada y tarde soleada.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventaría: Residente(1), Director(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2) Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+669 - K0+040)

*Debido a las fuertes lluvias presentadas durante la madrugada las actividades de la obra se iniciaron despues de la 1:00pm

La motoniveladora champion continúa varada



Residente Interventoría

Agosto 04 del 2023 (Viernes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Mañana soleada; En la tarde se presento una fuerte lluvia de 3:00pm a 4:30pm

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (9), Oficios Varios (5), Paleteros (4), Laboratorista (1).


Personal de Interventoria: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora (1), Pajarita (1), Motoniveladora (2), Vibrocompactador (2), Volqueta (2) carrotanque (1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)

* Debido a las lluvias no se pudo continuar con las actividades de la obra.

Se realizan trabajos con maquinaria para retirar fallos en la base lado derecho en K0 + 230 a K0 + 250
Motoniveladora champion varada



Residente Interventoría

Por obra.

Agosto 05 del 2023 (Sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Replanteo de la vía en el tramo (K1+648 - K2+208)

Motoniveladora champion varata

Residente interventoría



Agosto 07 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) Comisión topografica(1), SISO(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)

Se recibe tramo a base del K0+000 + K0+270 con los sgtes resultados: 0+050 (Izq) con 100 % de compactacion
0+150 (Eje) con 101.1 % de compactacion
0+250 (Der) con 100.5 % de compactacion



Residente interventoria

DPR. Obra.

Agosto 08 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Oficios Varios(5), Operadores(9), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1)


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1),

Actividades Ejecutadas Obra:
- Replanteo de la vía en el tramo (Ko+000 - Ko+273)
- Instalación de imprimación en el tramo (Ko+000 - Ko+273)

Se reporta Motoniveladora champion y vibro #2 varados

Residente interventoría



Agosto 09 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias de intensidad moderada desde las 8:00 am hasta las 10:00pm; resto del día nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(
Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteras(4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

* Debido a las lluvias las actividades en obra iniciaron despues de 1:00pm; Se tuvo que volver a conformar el tramo 1 y volver a imprimar debido a que las lluvias dañó lo que se había hecho el día anterior

Se debe esperar 24 horas mínimo para la rotura de la emulsión

Residente interventoría



DSM - Obra

Agosto 10 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comision topografica(1) Almacenista(1), Operadores(9), Oficios Varios(4), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+669 - K1+040)

Se reporta la no conformidad de la interventoria con la extendida de mezcla asfaltica al no esperar el tiempo para el rompimiento de la emulsion instalada en consecuencia de esto el material instalado debera ser puesto a observacion y sus posibles daños seran responsabilidad del contratista
Se reporta la no conformidad de la interventoria pour no contar con luminarias para trabajo nocturno, toda vez que se presentaron inconvenientes mecanicos de los vehiculos que surministran la mezcla y la jornada se extendio hasta las 9:00 pm se hace llamado de atencion y no se permitira que en puturas ocasiones se repita este incidente



Residente interventoria

Jefe obra.

Agosto 11 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12 y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) S.S.O(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(9), oficios Varios(4) Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2) Volquetas(2), Carrotanque(2)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construccion de losa de aproximación en el K0+000
- Instalación de emulsion asfaltica en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+669 - K1+040)

Residente interventoría



Dpt obra.

Agosto 12 del 2023 (Sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 5:00am hasta las 8:00am; resto del dia nublado


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), operadores(9), oficios Varios(4), Paleteras(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(2)

* Debido a las fuertes lluvias no se realizó ningun tipo de actividades

Residente interventoría



Dir. obra.

Agosto 14 del 2023 (lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente, Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1) Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios (4), Paleteras (4), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(1) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de losa de aproximación en el K0+000
- Instalación de Base en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de Base en el tramo (K0+669 - K1+040)

Se realiza toma de densidades al tramo 3 entre el 0+670 el 0+900 con los siguetes resultados: 0+720 con 102.7%, 0+790 con 105.8% y 0+870 con 100.9%.

Vibro compactador varado y motoniveladora champion



Residente interventoría

DEL OBRA

Agosto 15 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(4), Paleteros(4) Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(1) Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de emulsión asfaltica en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de emulsión asfaltica en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)

* Debido a las lluvias del dia domingo 13. la imprimación del tramo 1 (K0+000 - K0+273) se vió bastante afectada por lo que fue necesario volver a imprimar.

Se recibe base en tramo 3 del K0+900 al K1+040 con los sgtes resultados: K0+940 con 102.2% y K1+000 con 104.26%.



Residente interventoría

DPP. 0880.

Agosto 16 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: se presentaron lluvias de baja intesidad desde las 3:30am hasta las 5:30 am; mañana nublada y tarde soleada.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), siso(1), Profesional Social (1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores (9), Oficios Varios (4), Paleteros (4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Desagüe de aguas lluvias estancadas
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)

* Debido a las lluvias se canceló la programación que se tenía para instalar asfalto

La motoniveladora cat esta en reparacion, la champion varada y vibro varado



Residente interventoría

Agosto 17 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Sisso(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(4), Paleteros(4) Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora(1), Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), carrotanque(1), Finisher(1), Compactador de neumaticos(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de asfalto en el tramo (K0+669 - K1+040

Residente interventoria



DIE obra.

Agosto 18 del 2023 (Viernes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Paleteros(4), oficios Varios(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador de neomatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de emolsión asfaltica en el tramo (K0+669 - K1+040)



Residente Interventoría

D.2 Obra.


Agosto 19 del 2023 (Sabado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1) Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1) Almacenista(1), Operadores (8), Oficios varios (5), Paleteros (4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topográfica (1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador de neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)



Residente interventoría

Dpt obra

Agosto 22 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1) Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo ($K1+648 - K2+208$)

Vibrocompactador dañado



Residente interventoría

DRP Obra.

Agosto 23 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volqueta(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumaticos(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Imprimación en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Imprimación en el tramo (K1+648 - K2+208)

Se libera tramo en base del 1+648 al 1+848 con los sgtes resultados 1+680 con 109.4 %, 1+750 (Izq) con 105.6 % y 1+820 (Eje) 96.9 %.



DPE - 0080.

Residente interventoría


Agosto 24 del 2023 (Jueves)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)



Der obra.

Residente interventoría

Agosto 25 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), siso(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo (K0+669 - K1+040)
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)

Liberación por densidad afirmado entre 2+298 al 2+400 con los siguientes resultados 2+320 (DER) con 110.1 % y 2+368 (IZQ) con 96.8 %.

Vibro compactador averiado

Residente interventoría

D.O. obra.

Agosto 26 del 2023 (Sabado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director (1), Residente(1), Inspector(1), siso(1), Comisión topografica(1), Almacenista (1), Operadores (8), Oficios Varios (5), Paleteros (4), Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita (1), Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Volquetas (1), Carrotanque (1), Finisher (1), ... compactador Neumatico (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo ($K_{1+648} - K_{2+208}$)
- Instalación de Subbase en el tramo ($K_{2+298} - K_{2+387}$)
- Instalación de asfalto en el tramo ($K_{0+669} - K_{1+040}$)

Vibrocompactador 2 varado

Residente Interventoría



Agosto 28 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita, Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Excavación para Losa de empalme en el K0+273

Liberacion tramo 1+848 al 2+208 con los sgtes resultados 1+880 (Der) 99.24 %, 1+980 (Izq) con 95.83 %, 2+080 con 106.06 %, 2+180 (Izq) con 101.22 %.



Residente Interventoría

Agosto 29 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topografica (1) Almacenista (1), Operadores (8), Oficios Varios (5), Paleteros (4), laboratorista (1).

Personal de Interventoría: Director (1), Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita (1), Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Volquetas (1), Carrotanque (1), Finisher (1), Compactador Neumatico (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo ($K_{1+648} - K_{2+208}$)
- Imprimación en el tramo ($K_{1+648} - K_{2+208}$)
- Construcción de losa de empalme lado izquierdo K_{0+273}
- Construcción de filtro entre ($K_{2+390} - K_{2+500}$)

dz
Residente interventoría



Dra 0680.

Agosto 30 del 2023 (Miércoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores (8), Oficios Varios (5), Paleteros (4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas (1), Carrotanque (1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de filtro en el tramo (K2+390 - K2+500)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+298 - K2+387)

Residente interventoría



Dir obra.

Agosto 31 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias de intensidad moderada desde las 2:00am hasta las 7:00am; Resto del día soleado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Siso(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1)


Personal de interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1),

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Excavación para losa de empalme en el (K0+669)
- Construcción de filtro entre (K2+390 - K2+500)

* Se cancela instalación de asfalto programado para hoy, por las lluvias presentadas durante la madrugada.

Residente interventoría



Dos obras.

Septiembre 01 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de asfalto en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de Subbase en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Construcción de losa de empalme en el K0+669

Se recibe material de subbase entre 2+298 al 2+398 con los siguientes resultados: K2+320 (IZQ) con 102.1% y K2+370 con 101.2%



Residente Interventoría

Vo Bo.

Septiembre 02 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 7:00am hasta las 10:00am


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1), SISO(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios (5), Paleteras(3), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

* Debido a las lluvias no se pudo ejecutar ningun tipo de actividades

Las lluvias no permiten el ingreso de vehiculos a la obra



Residente interventoría

Residente de obra

Septiembre 04 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1), SISO(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutados Obra:
- Construcción de Losa de empalme en el K0+669
- Instalación de Base en el tramo (K2+298 - K2+387)

Residente interventoría



Dos dos.

Septiembre 05 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), oficios Varios(5). Paleteros(3), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1). Inspector(1). Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1) Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas: Obra:
- Imprimación en el tramo (K1+648 - K2+208)
- Instalación de Base en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Construcción de losa de empalme en el K0+273

Se recibe tramo en subbase entre K2+398 al K2+480 con los sgtes resultados: K2+410 (IZQ) 99.18%, K2+480 (DER) con 95.13 %.

Se recibe tramo en base del K2+298 al K 2+440 con los sgtes resultados: 2+320 (DER) 107.8 %, 2+380 (IZQ) 106.15 % 2+430 (EJE) 102.82 %



Dir. obra

Residente interventoria

Septiembre 06 del 2023 (Miércoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director (1), Residente (1), Inspector (1), SISO (1), Profesional Social (1), Comisión topografica (1), Almacenista (1), Operadores (8), Oficios Varios (5), Paleteros (3), Laboratorista (1).

Personal de Interventoria: Director (1) Residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita (1), Motoniveladora (1), Vibrocompactador (2), Volquetas (2), Carrotanque (1), Finisher (1), Compactador Neumatico (1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Imprimación en el tramo (K2+298 - K2+387)
- Instalación de Base en el tramo (K2+357 - K2+793)
- Instalación de asfalto en el tramo (K1+645 - K2+208)
- Instalación de asfalto en el tramo (K2+298 - K2+357)

Se recibe tramo en subbase de 2+500 a 2+600 con los sgtes resultados 2+520 (EJE) 98.06%, 2+580 (12m) 95.2%



Residente interventoría

Of. de obra.


Septiembre 07 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 4:00am hasta las 7:30am; mañana nublado y tarde soleada

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comision topografica; Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3) Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1) Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

* Debido a las fuertes lluvias se canceló la programación que se tenia de instalación de asfalto y a demás no se pudo realizar ningun tipo de actividades



Dpp. obra.

Residente interventoría

Powered by CamScanner

Septiembre 08 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1) Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1) Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carretanque(1) Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas. Obra:
- Riego de liga para instalación de segunda capa de asfalto en el tramo (K0+000 - K0+273)
- Instalación de segunda capa de asfalto en el tramo (K0+000 - K0+273)

Se suspende la actividad de extendida de asfalto por daño en la maquina extendedora

Residente interventoría

DR. Obra.

Septiembre 09 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Se presentaro fuertes lluvias desde las 8:00am hasta las 11:00am

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Almacenista(1), Comisión topografica(1), Operadores (8), Oficios Varios(5), Paleteros (3) Laboratorista (1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1) Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

* Debido a las fuertes lluvias no se realizó ningun tipo de actividades.



Residente Interventoria

DR. OBRA

Septiembre 11 del 2023 (Lunes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5) Paleteros(3), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1) Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K2+387 - K2+793)

La finsher continua varada

Residente interventoría

Of. Obra.

Septiembre 12 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron leves lluvias desde las 8:30am hasta las 9:00am y nuevamente desde las 2:30pm hasta las 3:00pm

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1), Comisión topografica(1), Inspector(1).


Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K2+387 - K2+793)
- Construcción de losa de empalme en el K0+273
- Construcción de filtro en el tramo (K1+900 - K2+010)

Se recibe prista en subbase entre 2+600 y 2+793 con las siguientes resultados: 2+615 (DER) 98.3, 2+680 (IZQ) 97.7 % y 2+750 (DER) con 96.0 %.

La finisher continua varada

Residente interventoría



D.P. 0000.

Powered by CamScanner

Septiembre 13 del 2023 (Miércoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)


Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1) Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de losa de empalme en el K0+669
- Construcción de filtro en el tramo (K1+900 - K2+010)
- Instalación de Base en el tramo (K2+387 - K2+793)

La finisher continua varada



Residente Interventoria



Dir obra

Septiembre 14 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de losa de empalme en el K0+669
- Construcción de filtro en el tramo (K3+080 - K3+230)
- Instalación de subbase en el tramo (K2+793 - K3+230)

La maquina finisher aun se encuentra varada



Dra Obra.

Septiembre 15 del 2023 (Viernes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias desde las 1:30am hasta las 11:00am; Resto del dia nublado.

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Carrotanque(1), Volquetas(1) Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

*Debido a las fuertes lluvias no se realizaron Actividades el dia de hoy

Residente Interventoría

Dir Obra

Septiembre 16 del 2023 (Sábado)
Horario Laboral: 7 - 12 pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1)
SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1)
Operadores(5) Oficios Varios(5), Paleteros(5)
Laboratorista(1)

Personal de Interventoria: Director(1), Residente(1)
Inspector(1), comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1),
Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1),
Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de losa de empalme en el K0+669

Por lluvias del dia anterior el terreno no se encuentra en condiciones para realizar trabajos internas ni se puede ingresar con volquetas a la zona

Residente Interventoria

DT Obra.

Septiembre 18 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comisión topografica(1), Profesional Social(1), Almacenista(1), Operadores(8), oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1).


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Demolición de placa huella existente para construcción de Losa de empalme en el K1+648

La maquina finisher continua varada, se mantra en reparacio

Residente interventoría



Septiembre 19 del 2023 (Martes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Comision topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), Oficios Varios(5), Paleteros(3) Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K2+387 - K2+793)

Se recibe tramo en subbase del K2+800 al K3+130, se realizan chequeo por niveles con topografia y luego se realizan densidades. Los resultados son los siguientes
2+800 (DER) 97.38%, 2+900 (IZQ) 101.61%, 2+980 (EJE) 105.14% y 3+000 (DER) 97.9%



Residente interventoria

D.D - 0bb.

Septiembre 20 del 2023 (Miércoles)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(8), oficios Varios (5), Paleteros(3), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topográfica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(1), Vibrocompactador(2), Volquetas(1), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K27387 - K27793)

Se evidencia cambio en la coloracion del material enviado a cantera, se le recuerda al contratista que su colocacion en la via se encuentra condicionada a los resultados que den los ensayos

Llega a la obra un compactador Dynapac

La finisher continua en reparacion

Residente interventoría

DRO. dos

Septiembre 21 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) sisso(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5), Paleteros(3) Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladoras(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el frama (K2+793 - K3+130)
- Instalación de subbase en el tramo (K3+130 - K3+320)

Llegan a la obra mecanicos a reparar la finisher pero esta aun no ha quedado operativa

Ingresa maquina motoniveladora CAT

Se recibe base granular entre 2+430 al 2+800 con los sgtes resultados: 2+470 (DER): 103.4%, 2+540 (EJ): 100.31%, 2+610 (IZQ): 105.1%, 2+680: 99.2% y 2+750: 100.04%,



Residente interventoría

D.O 0880

Septiembre 22 del 2023 (Viernes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) SISO(1), Profesional Social(1), comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios (5), Paleteros(3), Laboratorista(1)

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Instalación de Base en el tramo (K2+793 - K3+130)
- Instalación de Subbase en el tramo (K3+130 - K3+230)
- Explaneación de la vía en el frame (K4+835 a Mayores)

Residente interventoría

D.R Obra

Septiembre 23 del 2023 (sábado)
Horario laboral: 7 - 12pm
Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias desde las 8:00 am hasta las 11:00 am

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5), Paleteros(3), Laboratorista(1),


Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:

* No se realizó ningun tipo de actividades debido a las fuertes lluvias

No es posible el ingreso de material granular a la zona del proyecto



Residente interventoría

Dir obra

Septiembre 25 del 2023 (Lunes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Parcialmente nublado

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5) Paleteros(3), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1),

* Debido a las lluvias presentadas durante las 11:00pm del domingo 24 de septiembre y las 5:00am del Lunes 25 de septiembre. No se realizó ningun tipo de actividades debido a que la vía se encontraba muy saturada

Contratista afirma que la finisher fue reparada el dia de ayer, se esta a la espera de la programacion de asfalto

Residente interventoría

DIR - OBRA

Septiembre 26 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias de intensidad moderada desde las 5:00am hasta las 11:30 am; resto del dia nublado.


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social (1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5) Paleteros(4), Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2) Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

* Debido a las lluvias no se realizó ningun tipo de actividades.

No es posible el ingreso de vehiculos con material granular a la zona del proyecto



D.R. dddd

Residente interventoría

Septiembre 26 del 2023 (Martes)
Horario laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias de intensidad moderada desde las 5:00am hasta las 11:30 am; resto del dia nublado.


Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social (1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5) Paleteros(4). Laboratorista(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2) Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

* Debido a las lluvias no se realizó ningun tipo de actividades.

No es posible el ingreso de vehiculos con material granular a la zona del proyecto



Residente interventoría

P.P. dos

Septiembre 27 del 2023 (Miercoles)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1), SISO(1), Profesional Social(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5), Paleteros(4), Laboratorista(1), Maestro(1), oficial(1), Ayudante(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Construcción de losa de empalme en el K2+208
- Instalación de Base en el tramo (K2+800 - K3+000)
- Construcción de filtro entre (K3+080 - K3+230)
- Figuración de acero para Boxcoulvert K4+780

Residente interventoría

Dir obra

Septiembre 28 del 2023 (Jueves)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(12), SISO(1), Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10) Oficios Varios (5), Paleteros(4), Laboratorista(1), Maestro(2), Oficial(1), Ayudante(1).

Personal de Interventoría: Director(1), Residente(1) Inspector(1), Comisión topografica(1)

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2) Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1).

Actividades Ejecutadas Obra:
- Explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores)
- figuración de acero para Boxcoulvert K4+780
- Figuración de acero para Boxcoulvert K5+545
- Instalación de Base en el tramo (K2+800 - K3+130)

Resid. Interventoría

Dir. Obra.

Septiembre 29 del 2023 (Viernes)
Horario Laboral: 7 - 12pm y 1 - 5pm
Estado del tiempo: Seco

Personal de Obra: Director(1), Residente(1), Inspector(1) siso(1), Profesional Social(1) Comisión topografica(1), Almacenista(1), Operadores(10), Oficios Varios(5), Paleteros(4) Laboratorista(1), Maestro(1), Oficial(1), Ayudante(1).

Personal de Interventería: Director(1), Residente(1), Inspector(1), Comisión topografica(1).

Maquinaria y Equipos: Pajarita(1), Motoniveladora(2), Vibrocompactador(2), Volquetas(2), Carrotanque(1), Finisher(1), Compactador Neumatico(1)

Actividades Ejecutadas Obra:
- Explaneación de la vía en el tramo (K4+335 a Mayores
- Figuración de acera para Boxcoulvert K5+545

La programacion de asfalto fue cancelada por fallas en la finisher, al parecer no quedó bien reparada se solicita al contratista su urgente reparacion o su reemplazo

Resid interventoría

Dpo obra.

Septiembre 30 del 2023 (Sabado).
Horario laboral 7 - 12 PM
Estado tiempo : lluvia. de 5:00 am - 8:00 am.

Personal en obra: cuadrilla de dados (1). residente (1) inspector (1) almacenista (1) Profesional social (1). Comision topografica (1). operadores (10). oficios varios (5) Peones (4). Cabezalista (1). Maestro (1). oficial (1).

Personal de interventoria: Director (1)., Residente (1). inspector (1), comision topografica (1).

Maquinaria y equipos : retroexcavadora (1), motoniveladoras (2) volco compactador (2). Vibroapisonador (1). cargador (1) Excavadora (1). compactador neumatico (1).

Actividades ejecutadas en obra.
No se realizan actividades por el mal estado de la via de acceso, las lluvias impiden el movimiento de las maquinas.
se presentan lluvias en horas de la madrugada a partir de la 1:00 am hasta las 2:00 am.

Residente de interventoría



del obra.

octubre 2 - 2023 (lunes)
Horario laboral 7 - 12 ; 1 - 5
Estado del tiempo: seco.

Personal en obra: director (1), Residente (1) Inspector (1) SISO (1), Prof. social (1), Topografos.
almacenista (1), operadores (10) oficios varios (5).
Polictia (4), Coronel topografo (1), Medico (1) oficial (1), Ayudante (1).

Personal de interventoria: Director (1), Residente (1) Inspector (1) Topografo. (1).

Maquinaria y Equipo: Rodillo (1) Motoniveladora (2) Vibrocompactador (2) Volquetas (2) Cargador (1) Compactador neumatico (1)

Actividades.
- Exploracion de via en el tramo del K4+335 a Mokoa
- Fijacion de acero para box.
- Instalacion de alcantarillado.

Se libera tramo en subbase desde K3+130 al K3+230 con los siguientes resultados K3+150 con 102.1% y K3+200 con 103.8%



Residente interventoria

Del obra.


octubre 3 - 2023 (martes).
Horario laboral 7 - 12 y 1 - 5
Estado tiempo : Sol.

Personal en obra: Director obra (1) Residente (1)
Inspector (1) SISO (1), Social (1) Cons. topográfico (1).
Electricista (1) Operadores (5). Oficios varios (3).
Peones (4) Colaborador (1) Maestro (1). Oficial (1).
Ayudante (1)


Personal en obra interv: Director (1) Residente (1).
Inspector (1) Consultor topográfico. (1).

Maquinaria: equipos: Retro (1), motoniveladora (2)
Vibrocompactador (2). Volquetes (2) Retroexcavadora (1).
Compactador neumático. (1).

Actividades:
- Sacado del terreno a nivel de base
- Instalación de alambrado



Residente de interventoría



DAP dado.

Powered by CamScanner

4 octubre 2023 - (Miércoles)
Horario laboral: 7-12 - 1-5
estado tiempo: nublado en horas de la mañana
: lluvia: 12:30 PM - 4:00 PM.

Personal en obra: Director (1), Residente (1), inspector (1)
SISO (1). Prof-social (1). comisión topográfica (1).
almacenista (1) operadores (10), oficios varios (5),
polichos (4), laboratorista (1) Maestro (1) oficial (1)
Ayudantes (2).
personal ausente: director (1). Residente (1). inspector (1)
comisión topografía (1)

Maquinaria Equipos: Bajarito (1). motoniveladora (2)
vibrocompactadores (2) compactador neumático (1).

Actividades:
Retiro de subbase
instalación de alcantarilla K4+435 aproximado

Se presentan lluvias fuertes a mediodía se suspenden las actividades

Residente interventoría



Pie de obra.

Powered by CamScanner

octubre 5- 2023 - C (jueves).
Horario laboral: 7-12 - 1-5
estado tiempo: nublado.

Personal en obra: director (1). residente (1) inspector (1). SISO (1). Prof. social (1). comisión topográfica (1). almacenista (1) operadores (10). oficios varios (5). Celador (4). albañilería (1). Portero (1). Auxiliar (2)

Personal interventoría: director (1) Residente (1) inspector (1). comisión topográfica (1).

Maquinaria equipos: retroexcavadora (1). motoniveladora (2) Volco compactador (2). compactador neumático (1)

Actividades:
instalación de oficinas en la V.O.
se trabaja en la adecuación de las vías de acceso.
obs: por las lluvias del día anterior se dificulta las actividades en obra.
el acceso de las volquetas se dificulta.

Residente interventoría

Residente obra

octubre 6 - 2023 - (VIERNES).
Horario laboral : 7 - 12 - 1 - 5 -
Estado tiempo: lluvioso : 1230 PM - 4:20 PM.

Personal en obra: Director (1) Residente (1) inspector (1) SSO (1) Prof. social (1) comisión topográfica (1) almacenista (1) operadores (10) otros varios (5) palleros (4) maestro (1).

personal interventoría: Director (1) Residente (1) inspector (1) comisión topográfica (1).

Maquinaria y equipos: Bajarito (1) motoniveladora (2) Volco compactador (2), Volquetas (2), compactador neumático (1).

Actividades:
instalación de alcantarillado K4+530 a manhole

Se suspen actividades por lluvias en horas de la tarde

Residente interventoría

Director obra.

octubre 7 - 2023 (Sábado).
Horario laboral - 7 - 12
Estado tiempo : nublado

Personal en obra: director (1). residente (1).
inspector (1). sisso (1). Psic-social (1). comisión sst. (1).
al mecanista (1). operadores (10). oficios varios (5).
polifuncionales (4). motorista (1)

Personal intermitente: director (1). residente (1)
inspector (1). comisión topográfica (1).

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora (2). volqueta compactadora (2)
volquetas (2).
compactadora neumática. (1).

Actividades:
se extienden afirmado del K4+500 a mayores.

se dificulta el acceso de los carros por el mal estado de la vía de acceso por las lluvias de los días anteriores.

Residente interventoría

Bip obra.

Domingo 8-2023- No se labora.

Octubre 9 - 2023 lunes
Horario laboral: 7-12 - 1-5
Estado tiempo: lluvias 2:30 - 4:30 PM.

Personal en obra: Director (1) Residente (1), inspector SSO (1). Trab. social (1). Cuadrilla topografía (1), almacenista (1) operadores (10). Oficiales varios (5) patilleros (4). Laboratorista (1), maestro (1) excavador (1).

Personal interventoría: Director (1). Residente (1) inspector (1). Resi-topografía (1).

Maquinaria y equipos: Retro (1) Motoniveladora (2), Vibros (2) Volqueta (2). Compactador neumático (1).

Actividades:
Se instala cerramiento del K4+335 a mayores perforación de vía tramo 7.

Se presentan lluvias fuertes desde - se suspenden actividades.

Residente interventoría

Dpr obra.

octubre 10- 2023 - Martes.
Horario laboral: 7-12- 7-5.
Estado tiempo: nublado.-

Personal en obra: Director (1), Residente (1).
inspector (1), SISO (1), topografico, almacenista (1)
operadores (10), Oficios Varios (5)
Peones (4), laboratorista (1) maestro (1).
excavador (1).

Personal interventoria: Director (1), Residente (1)
inspector (1) topografo (1).

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora (1)
Rodillos vibratorios (2)- Vibros (2)
Volquetes (2), compactador manotico (1).

Actividades.
Se extiende base granular del K3+170 en adelante
Se extiende material de afirmado en tramo 7-

Se dificulta el acceso de los volquetes
por mal estado de las vias

Se finaliza que debia llegar el dia de hoy no hace presencia en obra
segun lo establecido en el plan de contingencias.

Residente de Interventoria

DIR obra.

Octubre 11-2023. - Horario 7-12 - 1-5
Estado tiempo: lluvia : 8:00 - 11:30 am.

Personal en obra: Director (1) Residente (1) inspector (1) almacenista (1) SSO (1), Inds. Social (1). Comisión topográfica (1) operadores (8), oficios varios (5) peones (4), laboratorista (1), maestro (1).

Personal intervenido: Director (1), Residente (1), inspector (1) Comisión topográfica (1)

Maquinaria y equipos: Rodillo (1). Vibros (2) retroexcavadora (2), Volquetes (2). Compactador neumático (1).

Actividades: no se realizan actividades por fuerte lluvias desde las 8:00 am. hasta las 11:30 am.

Se notifica al contratista de los ensayos realizados por la interventoría al material de afirmado en tramo 7 del K4+350 al 4+530 donde los resultados no cumplen con las especificaciones y por tanto no se recibirá la capa hasta tanto se hagan las correcciones pertinentes

Residente Interventoría

Dir. obra.

octubre 12 - 2023 Horario (7-12) (1-5).
Estado tiempo: Nuevo: 1:30 - PM - 3:30 PM.

Personal enobra: director 1 - residente 1 - inspector 1
almacenista (1). SISO (1). trabajadora social,
comision topografica (1). operadores (8). oficiales (5).
ayudantes (4). Laboratorista (1).

Personal interventoria: director 1, residente 1,
inspector 1, comision topografica, (1).

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora (1). Volquetes (2).
motoniveladora (2),
Volqueta (2).
compactador neumatico (1).

Actividades:
instalacion de afirmado
Excavacion para concreto.

Se toma una muestra del material de afirmado para analisis

Residente interventoria

D.T. obra.

octubre 13-2023 - Viernes:
Estado tiempo: Soleado.

Personal en obra: operador (1). Residente (1).
inspector (1), SSO 1, trab. social (1).
topografía (1). operadores (8).
oficios varios (5). pulidor (1). electricista (1)
mecánico (1).

Personal interventoría: operador (1). Residente (1)
inspector (1). topografía. (1).

maquinaria y equipos: Retroexcavadora (1). motoniveladora (1)
rodillos (2). volquetas (2). compactador neumático (2)
FEA.

Actividades:
Perfilado de talud
instalación de cerramiento y geotextil.

Residente interventoría

Dir obra.

Powered by CamScanner

Octubre 14 - 2023 - Sabado.
Estado tiempo: lluvia: 6:10 am - 11:35 am.

Personal en obra: director (1). residente (1)
inspector (1). SISO (1). trab. social. (1).
comision topografico (1). operadores. (1),
palleteros (4), cobobatarista. (1), motorista (1),

Personal inventario: director (1)., residente (1),
inspector. comision topografico (1).

maquinaria y equipos: rapisto (1). motoniveladora (2),
vibros (2), volquetes (2), comp. neumatico (1).

Actividades:
Se suspenden actividades por lluvia
desde los 6:50 am - hasta los 11:50 am.

Sale de la obra la motoniveladora y vibro, solo queda el otro par de equipos disponibles

Residente interventoría

Dir. obra

Domingo - 15 - 23 -
No se laboro.

Dir. obra.

Octubre 16 - 2023 : lunes - festivo.
Horario : 7 - 12 - 1 - 5
Estado tiempo: lluvia - 12:30 - 2:40 - PM.

Personal en obra: director (1) residente (1)
inspector (1) SISO (1), hab social (1)
topografía (1), operadores (8).
laboratorista (1) maestro (1) oficios varios (1)

Personal interventoría: director. (1)
residente. (1), inspector (1) topografía.

Maq. pala y equipos: pajarito (1).
moto niveladora (2) rodillos (2). volquetas (2).

Actividades:
Perfilado de vía para instalar asfalto.
extensión con el fresado para concreto.
observ. llega a obra - vibrocompactador
neumático y finisher.

Hace ingreso a la obra la maquina asfaltadora y vibrocompactador mixto el dia de hoy

Residente interventoría

DD- obra.

octubre 17 - 2023 - Hoja 10

Horario: 7-12 ; 1-5 .

Estado del tiempo: Seco.

Personal en Obra: Director (1), residente (1) Inspector (1), Siso (1), trabajadora Social (1), Comisión topografica (1), Operadores (8), Laboratorista (1), Maestro (1) Oficios Varios (5).

personal Interventoria: Director (1), residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1).

Maquinarias y equipos: pajarita (1), motoniveladora (2), vibrocompactador (1), Volquetas (2), finisher (1), vibrocompactador neumatico (2)

Actividades:
adecuacion de terreno para fundir cunetas

La motoniveladora presento fallas mecanicas y no se pudo adelantar trabajos de extendida de asfalto, la maquina fue reparada al finalizar la tarde

Residente interventoría

Dir obra.

Octubre 18 - 2023 - Miercoles

Horarios: 7:00 p.m - 12:00 p.m. ; 1:00 p.m - 5:00 p.m.

Estado del tiempo: Seco

Personal en Obra: Director (1), residente (1), Inspector (1), Siso (1), trabajadora Social (1), Comisión topografica (1) Operadores (8), laboratorista (1), maestro (1), Oficios varios (5)

personal Interventoría: Director (1), residente (1), Inspector (1), Comisión topografica (1)

Maquinarias y equipos: pajarita (1), Motoniveladora (1), vibrocompactador (1), Volquetas (2)

Actividades:
Se realiza limpieza de vía.
colocación de tensino para concreto.
instalación de formaleta.

Se recibe tramo de base entre 2+800 al 3+070 con los siguientes resultados 2+840 (IZQ) con 106.3 %, 2+930 (DER) con 109.6 % y 3+020 (EJE) con 101.4 %

Residente interventoría



Dir obra

octubre 19- 2023 - Jueves.

Horarios: 7:00 A.M.- 12:00 p.M : 1:00 p.M - 7:00 p.M.

Estado del tiempo: Seco

personal en Obra: Director (1), residente (1), Inspector (1), Siso (1), trabajadora social (1), Comisión topografica (1), Operadores (8), laboratorista (1), maestro (1), Oficios Varios (5)


personal Interventoria: Director (1), residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

Maquinarias y equipos: pajarita (1), motoniveladora (1), Vibrocompactador (1), Volquetas (2), finisher (1), Vibrocompactador neumatico (2).

Actividades
Instalacion de asfalto.
Fondido de concreto.

Se realiza extendida de asfalto entre K2+410 al 2+630; proveedor viascon

Residente de interventoria



Dir obra.

Octubre 20 - 2023 - Viernes.
Horario: 7-12- 1-5
Estado tiempo: lluvia - 500 am - 10:30 am.

personal en Obra: Director (1), residente (1), Inspector (1), Siso (1), trabajadora Social (1), Comisión topografica (1), Operadores (8), laboratorista (1), maestro (1), Oficios varios (5)


personal Interventoria: Director (1), residente (1), Inspector (1), comisión topografica (1)

Maquinarias y equipos: payanta (1), motoniveladora (1), Vibro compactador (1), volquetas (2), finisher (1), Vibrocompactador neumático (2).

Actividades:
Ficados Hidráulicos para concretos.
Todos pueden actividades en la vía por lluvia.

Terreno no apto para actividades por lluvias presentadas en la mañana de hoy

Residente Interventoría



Diz obra.

octubre 21 - 2023 - sabado
Horario : 7 - 12 - 1 - 5 -
Estado tiempo: soleado


Personal en obra: ingeniero (1). residente (1).
inspector (1). SISO (1). trabajador social (1).
topografia topografico (1) cadeneros (3),
carpintero (1). maestro (1). oficios varios (1).

Personal intercambio: ingeniero (1), residente (1)
inspector (1). topografia topografico (1).

maquinaria y equipos: retroexcavadora (1)
retroexcavadora (1). volquetes (1). fresadora (1).
rodillo compactador neumatico (1)

Actividades:
- imprimacion de via
- instalacion de carpeta asfaltica.

la extendida de mezcla asfaltica es del K2+630 a 2+514
proveedor condor



Residente

DR dano.

Domingo 22-2023-

Actividad: instalacion de conectos.

octubre 23- 2023 - lunes.
Horario 7-12- 2-5
Estado tiempo: soleado.

Personal en obra: director (1). residente (1)
inspector (2). SISO (1), tecn. social (1)
administrativo (1), comisión topográfica (1), operadores (8)
laboratorista (1). maestro (1). oficios varios (5)

personal de laboratorio. director (1). residente (1)
inspector (1). topografo (1)

Maquinaria y equipos: volqueta (1)
motoniveladora (1), rodillo (1). Vibrocompactador (1).
finisher (1) vibrocomp. neumatico (2).

Actividades.
instalacion de asfalto.
fundido de concreto
Extendida de MDC 19 (condor) 2+854 al 2+947
Extendida de MDC 19 (viascon) 2+947 al 3+005
Extendida de MDC 19 (condor) 3+005 al 3+023
Extendida de MDC 19 (viascon 3+023 al 3+050

Residente interventoría

D:2 obra.

octubre 24 - 2023 - martes
Horario: 12 - 2-5
Estado tiempo: lloviendo de 5:10 am - 11:00 am.
toda nublado.

Personal en obra: director (1), Residente (1), inspector (1), SISO (1), trab social. (1), electricista (1), cadenero topografico (1), operador (8), cabo de acero (1), maestro (1), ofic. varios (5).

Personal inventario: director (1), Residente (1), inspector (1), topografo (1).

Actividades:
- Fundido muro pozo cuartos
- Fundido de cuartos.

observacion: se presentan fuertes lluvias en horas de la madrugada. 5:00 am - 10:30 am.

Residente Interventoría

N

Dir. Obra.

octubre 25 - 2023 - Miércoles
Horario: 7-12 - 1-5 -
Estado tiempo: lluvia 6:10 am - 10:20 am.

Personal en obra: Director (1), Residente (1)
Inspector (1) SISO (1) Trab. Social (1),
electricista (1), albañil (1), operadores (4)
maestro (1). Of. Varios (4)

Personal de interventoría: Director (1) Residente (1)
Inspector (1), topógrafo (1).

Maquinaria y equipos: motoniveladora (1).
Vibro (1) volqueta (1), fresher (1).
Vibro asfalto (2).

Actividades:
Sellado de base, tramo 6.
Fundida cunetas.



Residente interventoría

DP obra.

Powered by CamScanner
