CÓDIGO: EL-F-S003	**FORMATOS**	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13-07-2021		
VERSIÓN: 00	**EL-F-S010 LIMITES DE PLASTICIDAD INV-125-13 & INV-126-13**	
PÁGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
UBICACÍON DEL PROYECTO:	VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
FECHA DE INFORME:	miércoles, 18 de octubre de 2023	**ORDEN DE SERVIO N°:**	652-23


DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

TIPO DE MATERIAL:	AFIRMADO
PROCEDENCIA:	CANTERA LOMA GRANDE

LIMITE LÍQUIDO (LL)

PUNTO	TARA	P1	P2	P3	%w	N.G
1	**C71**	27,27	24,43	15,16	30,64	37
2	**I81**	29,08	25,72	15,46	32,75	25
3	**I3**	29,36	24,50	10,96	35,89	17

COEF.	**-0,256**	**39,834**	N.G (LL)	25
LL	**33,43**			

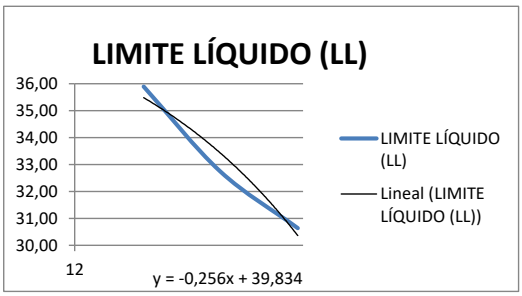

LIMITE PLÁSTICO (LP)

PUNTO	TARA	P1	P2	P3	%w	**LP**
1	**I7**	13,24	11,88	6,64	25,95	**25,92**
2	**P2**	14,44	12,84	6,66	25,89	

INDICE DE PLÁSTICIDAD

IP =	**7,51**

OBSERVACIÓN:

LIMITE DE NORMA ART. 311-22 AFIRMADO	**LÍMITE LÍQUIDO (LL) MÁX (%)**	**35**	**CUMPLE**
LIMITE DE NORMA ART. 311-22 AFIRMADO	**ÍNDICE DE PLÁSTICIDAD (IP)**	**4-9**	**CUMPLE**

INGELABCON S.A.S. NIT: 901124673-8

JEISON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Carrera 9a #34-35 Barrio Ospina Perez – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com
