CÓDIGO: EL-F-S005	FORMATO	
FECHA: 13-07-2021		
VERSIÓN:01	GRANULOMETRÍA DE SUELOS INV-213-13 & INV-214-13	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
UBICACÍON DEL PROYECTO:	NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
FECHA DE INFORME:	miércoles, 18 de octubre de 2023	**ORDEN DE SERVIO N°:**	652-23
TIPO DE MATERIAL:	AFIRMADO	**MUESTRA N°:**	1
PROCEDENCIA:	CANTERA LOMA GRANDE		


ENSAYO HUMEDAD NATURAL P(gr)	
RECIPIENTE:	**ILC17**
P1	**5000,0**
P2	**4616,0**
P3	**294,0**

OBSERVACIÓN:

%HUMEDAD NATURAL	**8,88%**	**PESO INICIAL SECO**	**4616,00**	**PESO FINAL LAVADO SECO**	**3940,00**

TAMÍZ	ABERTURA (mm)	PESO RETENIDO (gr)	% RETENIDO	% ACUMULADO	% PASA
3"	76,2	0,0	0,00	0,00	**100,00**
2 1/2"	63,50	0,00	0,00	0,00	**100,00**
2"	50,80	0,00	0,00	0,00	**100,00**
1 1/2"	38,10	194,00	4,20	4,20	**95,80**
1"	25,40	458,00	9,92	14,12	**85,88**
3/4"	19,05	466,00	10,10	24,22	**75,78**
1/2"	12,70	482,00	10,44	34,66	**65,34**
3/8"	9,53	306,00	6,63	41,29	**58,71**
N°4	4,75	678,00	14,69	55,98	**44,02**
N°10	2,36	624,00	13,52	69,50	**30,50**
N°40	0,42	466,00	10,10	79,59	**20,41**
N.200	0,08	266,00	5,76	85,36	**14,64**
FONDO		676,00	14,64	100,00	**0,00**

CURVA DE GRADACIÓN



TAMAÑO MAX.	2"
TAMAÑO MAX. NOM.	1"
% PASA 200	14,64
D10	N/A
D30	N/A
D60	N/A
Cu	N/A
Cc	N/A

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124673-8


JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Carrera 9a #34-35 Barrio Ospina Perez – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

CURVA DE GRANULOMETRÍA & LÍMITES TEÓRICOS AFIRMADO A-38

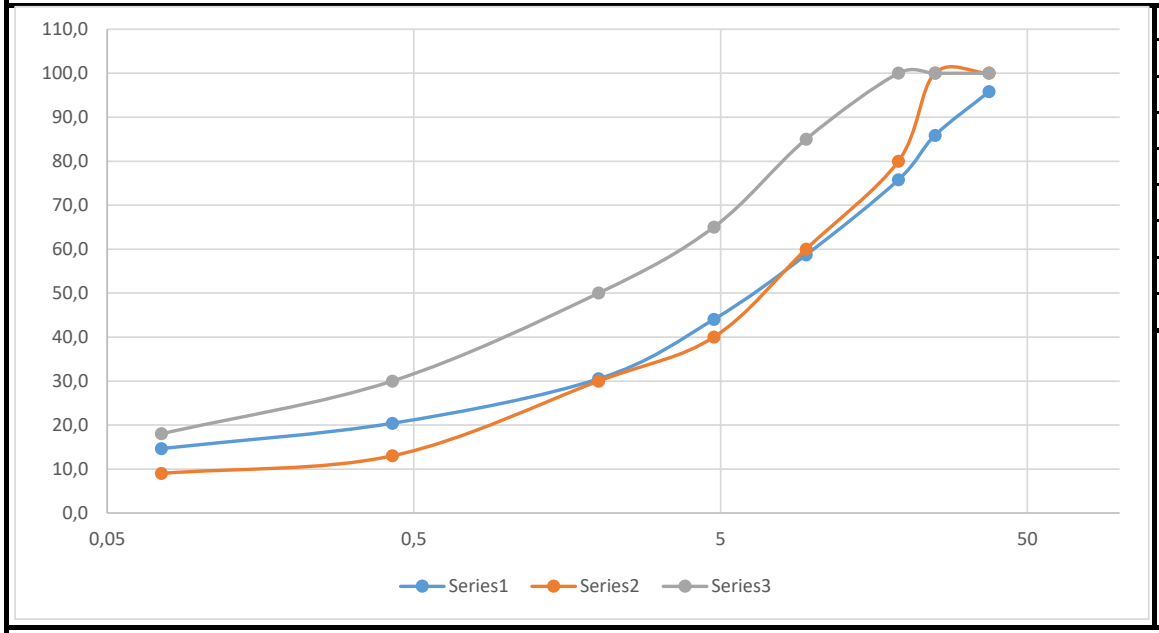


TAMIZ	TAMIZ (mm)	%PASA	LIM INF. (%)	LIM. SUP (%)
1-1/2"	37,5	95,8	100	100
1"	25	85,9	100	100
3/4"	19,0	75,8	80	100
3/8"	9,5	58,7	60	85
N°4	4,75	44,0	40	65
N°10	2,00	30,5	30	50
N°40	0,425	20,4	13	30
N°200	0,075	14,6	9	18

OBSERVACIONES:

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

CURVA DE GRANULOMETRÍA & LÍMITES TEÓRICOS AFIRMADO A-25

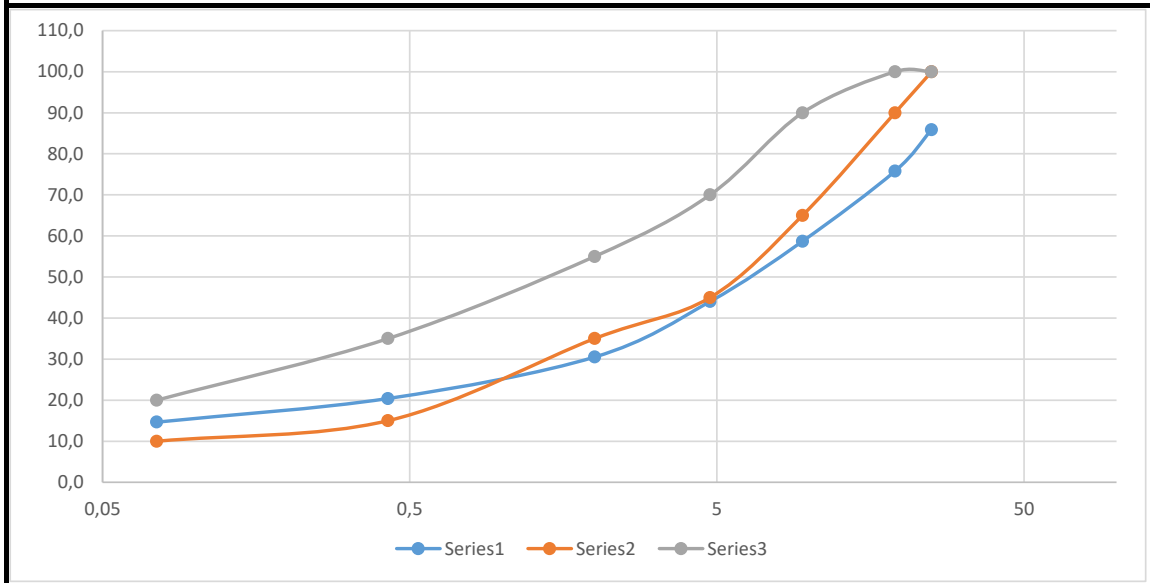

TAMIZ	TAMIZ (mm)	%PASA	LIM INF. (%)	LIM. SUP (%)
1''	25	85,9	100	100
3/4''	19,0	75,8	90	100
3/8''	9,5	58,7	65	90
N°4	4,75	44,0	45	70
N°10	2,00	30,5	35	55
N°40	0,425	20,4	15	35
N°200	0,075	14,6	10	20

OBSERVACIONES:

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
