Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AJV INGENIEROS SAS.

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

| AJV INGENIEROS SAS<br>NIT: 900948826-0 | I.N.V. E. – 410 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO<br>AJV INGENIEROS S.A.S.<br>CONTROL DE CALIDAD MATERIALES DE OBRAS | **Código:** F-CC-02<br>**Fecha:** 01-07-2022<br>**Versión:** 01<br>**Página** 1 **de** 2 |
|---|---|---|
| **ELABORÓ / ACTUALIZÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Director Operativo | Líder Proceso Control de Calidad Materiales de Obras | Director General |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. PROYECTO:** | **240** | **ORDENADO POR:** | **CONSORCIO VIAL NACIONAL** |
| **OBJETO:** | **CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO - LOS CORDOBA** | **FECHA DE EJECUCION:** | **10/02/2024** |

| EQUIPOS UTILIZADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL EQUIPO** | **CODIGO** | **CERTIFICADO** | **FECHA CALIBRACION** |
| PRENSA A COMPRENSION | AJV 011 | F-29569-003 R0 | 26/07/2023 |
| PRENSA A COMPRENSION | AJV 012 | F-29569-004 R0 | 26/07/2023 |
| | | | |

| SLUMP |
|---|
| |

| CONDICIONES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| TEMPERATURA °C | INICIAL | 29 |
| | FINAL | 29 |
| HUMEDAD % | INICIAL | 72 |
| | FINAL | 73 |

| CILINDRO | LOCALIZACIÓN | FECHA DE TOMA | FECHA DE FALLA | EDAD | CARGA (KN) | DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | ÁREA (mm) | FACTOR DE AJUSTE | RESISTENCIA OBTENIDA (Mpa) | RESISTENCIA OBTENIDA (PSI) | RESISTENCIA DISEÑO (Mpa) | RESISTENCIA DISEÑO (PSI) | RESISTENCIA OBTENIDA (%) | FORMA DE FALLA | PERPENDICULARIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA HUELLA LOSA IZQ K0+550 - K0+580 | 10/01/2024 | 10/02/2024 | 31 | 129.5 | 150 | 300 | 17671.5 | 1.0 | 7.3 | 1046.9 | 20.7 | 3000 | 35% | 3 | ☑ SI ☐ NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ SI ☐ NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ SI ☐ NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ ☐ |

| TIPO DE FALLA | OBSERVACIONES | ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|
|  | | YOVANY PEÑATE<br>LABORATORISTA | ANDRÉS HOYOS<br>JEFE OPERATIVO | ASAEL JAIMES V<br>DIRECTOR OPERATIVO |


Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Este informe no es válido sin las firmas originales.

Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la autorización de AJV INGENIEROS SAS.

El laboratorio no brinda opiniones e interpretaciones en sus informes.

| AJV INGENIEROS SAS | I.N.V. E – 410 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO | **Código:** F-CC-02 |
|---|---|---|
| | **AJV INGENIEROS S.A.S.** | **Fecha:** 01-07-2022 |
| | **CONTROL DE CALIDAD MATERIALES DE OBRAS** | **Versión:** 01 |
| **NIT: 900948826-0** | | **Página** 2 **de** 2 |
| **ELABORÓ / ACTUALIZÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| Director Operativo | Líder Proceso Control de Calidad Materiales de Obras | Director General |

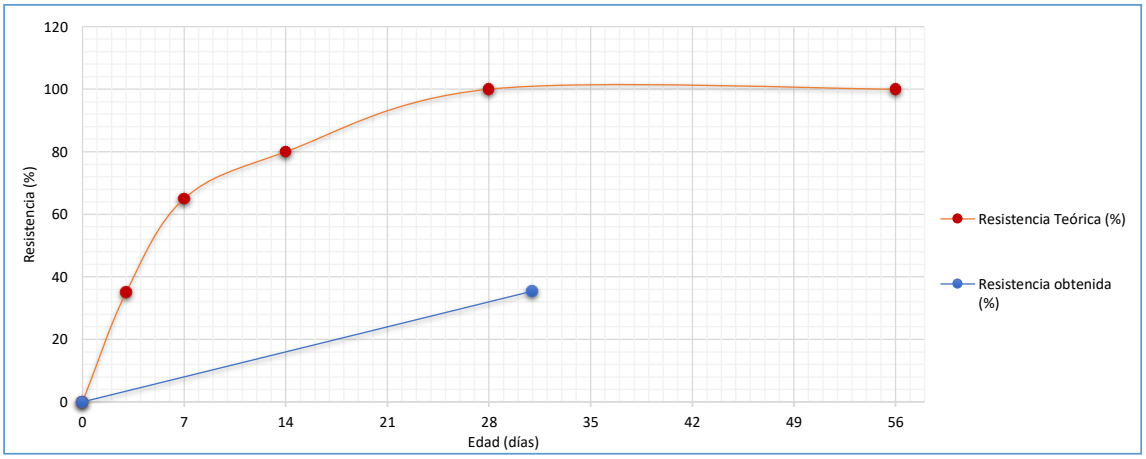


Los resultados obtenidos en este informe corresponden exclusivamente a la muestra ensayada.

Este informe no es válido sin las firmas originales.
