Fecha (DD/MM/AAAA)	Municipio	Nombre del Proyecto
13/11/2025	TARAZÁ	ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato	COP-003-2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA
Contratista	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE COLOMBIA - FUNDSECOL
ID Contratista	900137690-6

INFORMACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN			
Nombre del profesional que realiza la visita		GUSTAVO EMILIO ARANGO ROMERO	
Objetivo visita		INSPECCION TECNICA	
Hora inicio	11:00 AM	**Hora finalización**	3:00 PM

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA VISITA

En fecha **13 de noviembre de 2025**, se realizó visita técnica a los frentes de obra ubicados en los corregimientos **El Doce** y **La Caucana**, con el fin de verificar el avance físico, la calidad de las ejecuciones y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

1. **Corregimiento El Doce:**

Durante la visita se verificaron avances significativos en el proceso constructivo. Se evidenciaron las siguientes actividades finalizadas:

- Pañete de todos los muros, aplicando mortero 1:4 en la totalidad del cerramiento interior y la fachada.
- Relleno con material seleccionado compactado, completando la nivelación del área para recibir la superficie final.
- Colocación de plantilla en concreto 3000 PSI (espesor 0,08 m) en toda el área del centro de acopio, ejecutada con acabado uniforme.
- Vaciado de la columna estructural para el tanque elevado.
- Fundición de la placa superior donde se ubicará el tanque elevado de 1.000 litros.

Se observa un avance organizado y acorde a la programación establecida, sin novedades que afecten la continuidad del proceso constructivo.

2. Corregimiento La Caucana:

En este frente de obra se evidenció un progreso notable en actividades de acabados, instalaciones y adecuaciones generales. Se verificó lo siguiente:

- Aplicación de pintura base tipo 3 en todos los muros interiores y exteriores.
- Suministro y aplicación de pintura epóxica con catalizador en paredes y pisos del área destinada al recibimiento lechero, garantizando resistencia y facilidad de limpieza.
- Instalación del tanque de almacenamiento de agua potable de 1000 litros, incluyendo la red hidráulica completa para su correcto funcionamiento.
- Suministro e instalación de válvula de 1/2" para control del sistema de acueducto interno.
- Instalación de dos puertas en lámina galvanizada calibre 18 (0,80 x 2,00 m), cada una con su respectivo anticorrosivo y pintura.
- Sistema de iluminación interior instalado, incluyendo luminarias y toma corrientes operativos.
- Suministro y colocación de tablero de distribución marca "Tercol", con protección de 125 A, 2 circuitos monofásicos, instalado conforme a la normatividad eléctrica vigente.

El frente de obra presenta orden, continuidad y ejecución técnica adecuada para iniciar las siguientes fases de acabados finales y suministro de Dotación.

CONCEPTO TÉCNICO DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
Los dos frentes de obra visitados muestran **avances sólidos y técnicamente correctos**, cumpliendo con los estándares constructivos y las especificaciones del proyecto. Las actividades se ejecutan de manera organizada y secuencial, sin identificarse irregularidades que afecten el desarrollo del proyecto. Las condiciones actuales permiten continuar con los procesos constructivos programados para las siguientes etapas.


REGISTRO FOTOGRAFICO.



Descripción: Estructura de soporte para tanque elevado en el corregimiento El Doce.



Descripción: Vista del interior del centro de acopio, donde se observa la cubierta metálica instalada, los muros pañetados y la plantilla en concreto ejecutada en el corregimiento El Doce.

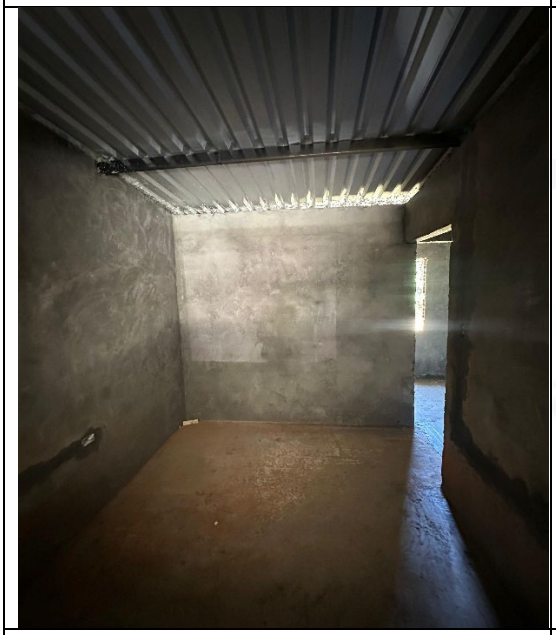


Descripción: Vista del interior del centro de acopio, donde se observa la cubierta metálica instalada, los muros pañetados y la plantilla en concreto ejecutada en el corregimiento El Doce.



Descripción: Vista del interior del centro de acopio, donde se observa la cubierta metálica instalada, los muros pañetados y la plantilla en concreto ejecutada en el corregimiento El Doce.

	
Descripción: Vista interior de centro de acopio con pintura epoxica aplicada en paredes y piso, toma corrientes e iluminación led en funcionamiento en el Corregimiento La Caucana.	Descripción: Suministro e instalación de Tanques de almacenamiento de agua potable en el Corregimiento La Caucana.
	
Descripción: Suministro e instalación de Puertas metálicas en el Corregimiento La Caucana.	Descripción: Suministro e instalación de toma corrientes en corregimiento La Caucana.

PARTICIPANTES DE LA VISITA			
Nombre completo	**No. Documento**	**Tipo de actor**	**Firma**
Gustavo Emilio Arango Romero	1.007.338.464	Apoyo a la supervisión (RPG–BC)	
Hernán Gregorio Durango Novoa	1.067.907.849	Contratista (FUNDSECOL)	

	Funcionario o Contratista	Firma	Fecha
Elaboró	Gustavo Emilio Arango Romero – Apoyo a la supervisión		13/11/2025
Aprobó	Julián Ángel Rincón – Supervisor		13/11/2025
El arriba firmante declara que ha revisado el documento y lo ha encontrado ajustado a las nomas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad, se presenta para la firma.			
