PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	0,97%	2,60%	Obra Física Ejecutada (%)	1,74%	2,56%
Valor de la Obra programada:	$ 23.837.931,53	$ 63.858.308,27	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 42.686.063,54	$ 62.819.013,80

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,63%	0,82%	
Durante el periodo	1,67%	1,74%	-0,74%
Acumulado actual	3,30%	2,56%	

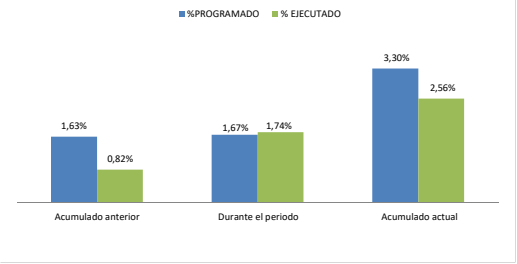

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	2,20%	2,98%	-0,78%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	3,50%	2,70%	0,80%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	1,48%	1,48%	0,00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	2,80%	3,31%	-0,51%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	1,70%	1,70%	0,00%
			1,67%	1,74%	-0,07%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,00
VALOR PARCIAL 1		
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 2.455.237.837,00	$ 2.455.237.837,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 0,00	$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	3,30%	2,56%	-0,74%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	51	0

CURVA S

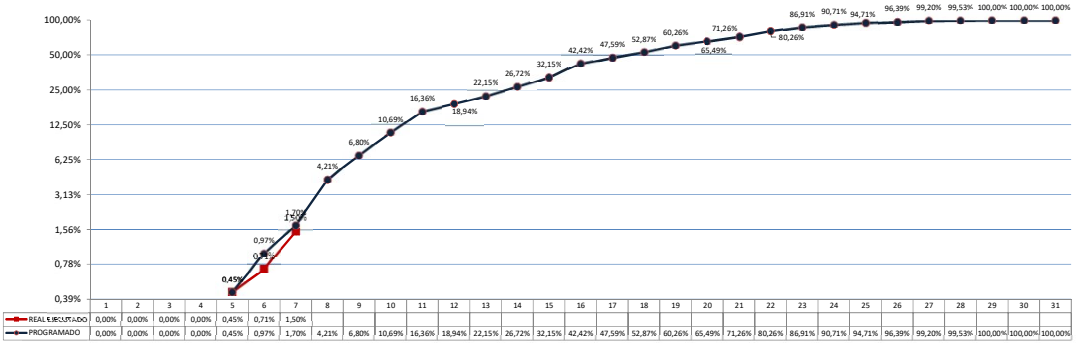

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,71%	1,50%																								
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,97%	1,70%	4,21%	6,80%	10,69%	16,36%	18,94%	22,15%	26,72%	32,15%	42,42%	47,59%	52,87%	60,26%	65,49%	71,26%	80,26%	86,91%	90,71%	94,71%	96,39%	99,20%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°1: Se lleva a cabo el comité de obra N.1 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: debido a la falta de autorización del personal para trabajo en alturas, el contratista informó que no fue posible adelantar actividades durante los dos primeros días de la semana. Una vez superado este pendiente, se realizó el armado del andamio correspondiente a las actividades en la casona, con el fin de iniciar los trabajos de revisión y reparación de la cubierta.
El día 21 de noviembre se llevó a cabo la visita de los especialistas, realizada por la Arq. Lorena Rodríguez (Directora de Interventoría) y el Ing. Frank Cock (Director de Obra), en la cual se abordaron y aclararon los temas pendientes relacionados con la intervención, se realiza verificación del estado actual de la edificación identificada como "la casona", se realizan planteamientos en sitio con el fin de dar cumplimiento al alcance del diagnóstico. La propuesta de intervención será plasmada y remitida por el contratista de obra con el fin de que sea evaluada y verificada por parte de la interventoría. Se espera que el documento se remita la próxima semana.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe, así como la validación de los certificados del curso de trabajo en alturas correspondientes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: El día 18 de noviembre se realizó la revisión de la sala CRIL, la cual no fue desocupada por parte del Rector, a pesar del compromiso previamente establecido para su liberación. Durante la visita realizada por la OTIC, el Rector tampoco autorizó el retiro del RACK ubicado en esta área. En consecuencia, y conforme a lo indicado por el Supervisor durante el comité de obra, se definió que el ingreso a la sala CRIL se efectuará durante la primera semana de diciembre, teniendo en cuenta que no se cuenta con la autorización para intervenir el espacio con el equipo actualmente instalado.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se dio inicio a las actividades relacionadas con el cerramiento de las áreas a intervenir, las cuales fueron finalizadas en su totalidad. Asimismo, se avanzó en la demolición correspondiente al módulo de baños, ejecutando las acciones previstas para esta zona.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe, así como a los permisos de trabajo asociados a las actividades ejecutadas

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: Se iniciaron las actividades conforme a lo acordado el día 18 de noviembre. Se reporta una reunión con la OTIC, durante la cual se realizó el retiro de ciertos elementos; sin embargo, se evidenció que en el área de la biblioteca y en la sala de sistemas permanecen enseres que no pueden ser retirados, dado que se encuentran vinculados a equipos de la OTIC. De acuerdo con lo establecido en el comité de obra, dichos elementos deben ser protegidos para garantizar su integridad durante la ejecución de las actividades.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizó durante la semana la ejecución de actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, así:
- Batería de baños de bachillerato: A la fecha se realizó la demolición en su totalidad del enchape de la batería de baños de hombres y mujeres de bachillerato y se está realizando la demolición del sobre piso.
- Batería de baños de primaria: Se finalizó en su totalidad el cerramiento y se realiza el retiro de aparatos hidráulicos y eléctricos.
- Cerramiento del aula múltiple: Se desarrolló el cerramiento en su totalidad, quedando pendiente la instalación del broche de apertura y cierre, dado que la institución aún no ha completado el traslado de enseres correspondiente a este espacio lo cual a la fecha sigue en el mismo estado.
- Demolición de piso en aulas infantiles: A la fecha se ha realizado la demolición de 02 salones, el ultimo está pendiente teniendo en cuenta que se encuentra en uso por parte de la institución.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría ha realizado el seguimiento a las afiliaciones del personal operativo y administrativo que ingresó en la semana reportada en el presente informe y se realiza seguimiento a la señalización SST instalada en el frente de obra de la Sede.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: Se programa visita por parte de la residente del contratista con el proveedor Vinisol para la revisión del estado del piso en las aulas infantiles, con el fin de evaluar las condiciones para la futura instalación del nuevo acabado.
La visita se llevó a cabo el día 22 de noviembre, siendo atendida por la residente del contratista. Durante la inspección, el proveedor informó que el piso presenta fisuras y áreas deterioradas ocasionadas durante el retiro del material previamente instalado. Debido a estas condiciones, se requiere realizar un proceso de reparación previo a la instalación del nuevo piso Vinisol, queda pendiente por parte del contratista la definición del procedimiento de reparación y la especificación del material a utilizar, para lo cual se espera su comunicación formal.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Dentro del periodo estipulado NO se adelantaron labores en la sede.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: De acuerdo a la solicitud realizada por el Ing. Hernan durante el comité de obra N°1 se debe dar incio de actividades en la semana del 24 al 29 de Noviembre de 2025, esto quedo consignado en acta de comité como compromiso.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Por parte del equipo operativo se realiza el resane y la pintura de la bodega en su totalidad. Asimismo, se procede con la instalación de la puerta, con el fin de finalizar los trabajos y realizar la entrega de este espacio a la institución a partir del jueves 20 de noviembre.
El 21 de noviembre, por parte de la Arq. Lorena Rodríguez y Frans Cock, se lleva a cabo una visita con especialistas para la revisión de las áreas intervenidas y la verificación de las condiciones técnicas correspondientes, se realiza recorrido de obra en la sede con el fin de verificar que estado actual de las estructuras de la cubierta, atendiendo los lineamientos establecidos por el calculista de las SED se trabajará con la estructura existente, solo se incluirán correas en los traslapos; el esquema será remitido por el contratista con el fin de que se realice la respectiva revisión, se aclara que esto NO modifica las pendientes de las cubiertas.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: Durante la visita realizada por parte de la coordinación y la rectoría, se informa que, debido a la salida de estudiantes los días 27 y 28 de noviembre y al trasiego de enseres, las áreas actualmente ocupadas serán liberadas el 01 de diciembre de 2025.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se ingresa a la institución para el inicio del desarrollo de actividades el jueves 20 de noviembre sobre el mediodía. Durante el transcurso de los días restantes de la semana se ejecutan actividades de cerramiento en lámina de teja de zinc, complementadas con el instalado de polisombra, conforme a lo acordado.
Al interior del área de intervención se realiza el desmonte de los muros y divisiones existentes, avanzando con las labores de adecuación y demolición previstas en esta etapa del proyecto.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe, así como la validación del cerramiento perimetral y la instalación de cinta de peligro en el área de intervención.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: Se solicita a la residente del contratista la presentación del esquema de distribución del área de intervención. Quedamos a la espera de la definición de una fecha de compromiso para su entrega, con el fin de avanzar en la revisión y validación correspondiente.

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

1. Actividades Tecnicas: Se inició la limpieza de muros de los módulos 01 al 03, en donde se evidenció que el módulo N.° 3 presenta una capa de pintura adicional y una cenefa, lo cual implica un mayor nivel de complejidad en la ejecución de la actividad.
De acuerdo con lo anterior, en los módulos 01 y 02 se realizó el sellado de juntas tanto en el interior como en el exterior, y se llevó a cabo la instalación de malla de gallinero como parte del proceso constructivo.

2. Seguridad Social y SST: La interventoría realizó el seguimiento a las afiliaciones del personal que ingresó durante la semana reportada en el presente informe

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: No se han ejecutado actividades de obra dentro de este periodo.

5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se da la aprobación Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) mediante oficio PROBINTEC-LOTE6-078

FIRMAS

ARQ. LOREMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 9.601.726,62	0,45%	0,45%	$ 9.601.726,62	$ -	0,45%	$ 9.601.726,62	0,45%	$9.601.726,62
6	sem 6	10-nov-25	$ 11.024.142,20	0,52%	0,26%	$ 5.559.474,91	$ 5.464.667,29	0,97%	$ 20.625.868,82	0,71%	$15.161.201,53
7	sem 7	17-nov-25	$ 15.589.694,76	0,73%	0,79%	$ 16.785.003,00	$ (1.195.308,24)	1,70%	$ 36.215.563,58	1,50%	$31.946.204,53
8	sem 8	24-nov-25	$ 53.248.516,35	2,51%	0,00%	$ -	$ 53.248.516,35	4,21%	$ 89.464.079,93		$31.946.204,53
9	sem 9	01-dic-25	$ 55.008.756,91	2,59%	0,00%	$ -	$ 55.008.756,91	6,80%	$ 144.472.836,84		$31.946.204,53
10	sem 10	08-dic-25	$ 82.552.615,16	3,89%	0,00%	$ -	$ 82.552.615,16	10,69%	$ 227.025.452,00		$31.946.204,53
11	sem 11	15-dic-25	$ 120.524.716,58	5,67%	0,00%	$ -	$ 120.524.716,58	16,36%	$ 347.550.168,58		$31.946.204,53
12	sem 12	22-dic-25	$ 54.910.130,15	2,58%	0,00%	$ -	$ 54.910.130,15	18,94%	$ 402.460.298,73		$31.946.204,53
13	sem 13	29-dic-25	$ 68.067.177,84	3,20%	0,00%	$ -	$ 68.067.177,84	22,15%	$ 470.527.476,57		$31.946.204,53
14	sem 14	05-ene-26	$ 97.010.984,05	4,57%	0,00%	$ -	$ 97.010.984,05	26,72%	$ 567.538.460,62		$31.946.204,53
15	sem 15	12-ene-26	$ 115.496.712,37	5,44%	0,00%	$ -	$ 115.496.712,37	32,15%	$ 683.035.172,99		$31.946.204,53
16	sem 16	19-ene-26	$ 218.222.928,43	10,27%	0,00%	$ -	$ 218.222.928,43	42,42%	$ 901.258.101,42		$31.946.204,53
17	sem 17	26-ene-26	$ 109.706.519,98	5,16%	0,00%	$ -	$ 109.706.519,98	47,59%	$ 1.010.964.621,40		$31.946.204,53
18	sem 18	02-feb-26	$ 112.227.399,90	5,28%	0,00%	$ -	$ 112.227.399,90	52,87%	$ 1.123.192.021,30		$31.946.204,53
19	sem 19	09-feb-26	$ 156.965.499,28	7,39%	0,00%	$ -	$ 156.965.499,28	60,26%	$ 1.280.157.520,58		$31.946.204,53
20	sem 20	16-feb-26	$ 111.190.203,76	5,23%	0,00%	$ -	$ 111.190.203,76	65,49%	$ 1.391.347.724,34		$31.946.204,53
21	sem 21	23-feb-26	$ 122.544.142,77	5,77%	0,00%	$ -	$ 122.544.142,77	71,26%	$ 1.513.891.867,11		$31.946.204,53
22	sem 22	02-mar-26	$ 191.239.023,23	9,00%	0,00%	$ -	$ 191.239.023,23	80,26%	$ 1.705.130.890,34		$31.946.204,53
23	sem 23	09-mar-26	$ 141.207.655,75	6,65%	0,00%	$ -	$ 141.207.655,75	86,91%	$ 1.846.338.546,09		$31.946.204,53
24	sem 24	16-mar-26	$ 80.606.165,90	3,79%	0,00%	$ -	$ 80.606.165,90	90,71%	$ 1.926.944.711,99		$31.946.204,53
25	sem 25	23-mar-26	$ 85.093.055,42	4,01%	0,00%	$ -	$ 85.093.055,42	94,71%	$ 2.012.037.767,41		$31.946.204,53
26	sem 26	30-mar-26	$ 35.573.294,99	1,67%	0,00%	$ -	$ 35.573.294,99	96,39%	$ 2.047.611.062,40		$31.946.204,53
27	sem 27	06-abr-26	$ 59.888.351,91	2,82%	0,00%	$ -	$ 59.888.351,91	99,20%	$ 2.107.499.414,31		$31.946.204,53
28	sem 28	13-abr-26	$ 6.892.593,38	0,32%	0,00%	$ -	$ 6.892.593,38	99,53%	$ 2.114.392.007,69		$31.946.204,53
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.124.404.690,53		$31.946.204,53
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.124.404.690,53		$31.946.204,53
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.124.404.690,53		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.124.404.690,53		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			**100,00%**	**$ 2.124.404.690,53**		
			$ 2.124.404.690,53	**100,00%**	**1,50%**						

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se dio inicio a la revisión de la cubierta correspondiente a la casona, verificando su estado actual para proceder con las actividades de intervención y reparación programadas.



El dia 18 de noviembre se realiza la revisión de la sala CRIL, la cual no fue desocupada por parte del Rector, se había asumido el compromiso de liberacio para el 19 de Noviembre. Igualmente se realiza visita por parte de la OTIC y se por parte del rector no permite el retiro del RACK ubicado en esta, de acuerdo a esto durante el comité de obra por parte del supervisor se informa que se ingresara a la sala CRIL durante la 01 semana de Diciembre teniendo encuenta que NO se autoriza ingresar con el equipo en esta área.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se ejecutan las actividades de instalación de las varas soporte para el montaje del cerramiento en teja de zinc, dejando la estructura lista para la colocación del material



Se ejecutan las actividades de instalación de las varas soporte para el montaje del cerramiento en teja de zinc, dejando la estructura lista para la colocación del material



Se dio inicio a la desinstalación de los aparatos eléctricos e hidrosanitarios existentes, así como al proceso de demolición de los muros en mampostería correspondientes al área de intervención.



Se dio inicio a la desinstalación de los aparatos eléctricos e hidrosanitarios existentes, así como al proceso de demolición de los muros en mampostería correspondientes al área de intervención.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realizó la instalación de la lámina de teja de zinc en el área correspondiente. De acuerdo con el compromiso adquirido durante el comité de obra, se deberá ejecutar el recubrimiento de esta superficie con polisombra, garantizando las condiciones de cerramiento establecidas.



Se realizó la instalación de la lámina de teja de zinc en el área correspondiente. De acuerdo con el compromiso adquirido durante el comité de obra, se deberá ejecutar el recubrimiento de esta superficie con polisombra, garantizando las condiciones de cerramiento establecidas.



Se ejecuta el proceso de demolición de los muros en mampostería correspondientes al área de intervención



Se ejecuta el proceso de demolición de los muros en mampostería correspondientes al área de intervención

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)




Se continúa con el proceso de demolición de los enchapes instalados en muros y pisos



Se continúa con el proceso de demolición de los enchapes instalados en muros y pisos



Se está realizando el levantamiento del sobrepiso en la batería de baños de hombres y mujeres

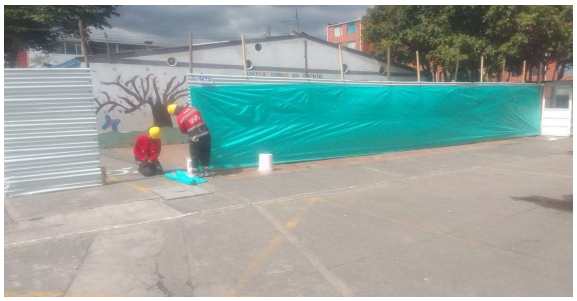

Se realiza la protección del cerramiento en lámina de teja de zinc con polisombra, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Comité de Obra N.° 1.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realizan actividades de resane en el exterior e interior de la bodega



Se realizan actividades de resane en el exterior e interior de la bodega



Se realizan actividades de resane en el exterior e interior de la bodega



Se realizan actividades de pintura en el exterior e interior de la bodega



Se finalizan actividades de pintura externa e interna



Se realiza la instalacion de la puerta

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la instalación de las varas y el cerramiento en lámina de teja de zinc. Asimismo, se ejecuta el recubrimiento con polisombra, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Comité de Obra N.° 1.



Se realiza la instalación de las varas y el cerramiento en lámina de teja de zinc. Asimismo, se ejecuta el recubrimiento con polisombra, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Comité de Obra N.° 1.



Se realiza la instalación de las varas y el cerramiento en lámina de teja de zinc. Asimismo, se ejecuta el recubrimiento con polisombra, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Comité de Obra N.° 1.



Se inicia el retiro de los muros y divisiones correspondientes al área de intervención, dando continuidad a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la instalación de las varas y el cerramiento en lámina de teja de zinc. Asimismo, se ejecuta el recubrimiento con polisombra, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el Comité de Obra N.° 1.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el avance de las actividades de limpieza de muros en el área de intervención, así como la instalación de malla de gallinero

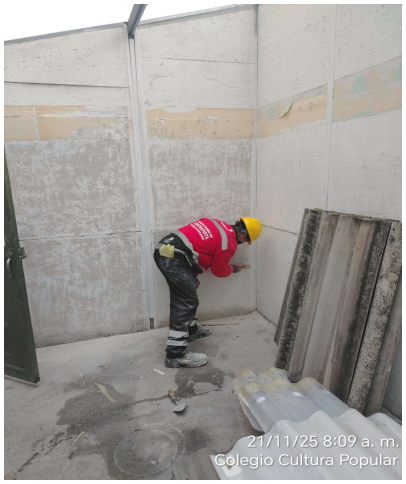

Se evidencia el avance de las actividades de limpieza de muros en el área de intervención, así como la instalación de malla de gallinero

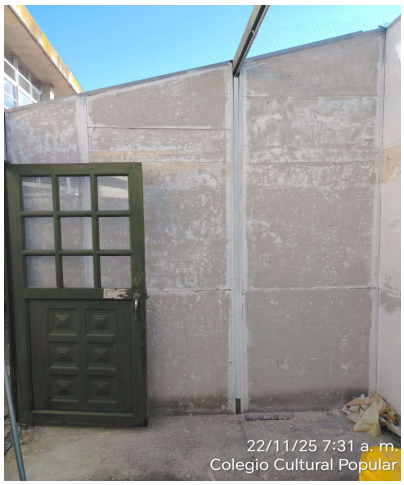

Se evidencia el avance de las actividades de limpieza de muros en el área de intervención, así como la instalación de malla de gallinero



a el avance de las actividades de limpieza de muros en el área de intervención, así como la instalación de malla

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 7 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 7 (Consecutivo) **DEL** 17/11/2025 (dd-mm-aa) **AL** 23/11/2025 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 51 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el avance de las actividades de limpieza de muros en el área de intervención, así como la instalación de malla de gallinero
