REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 644 - 2024	
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clae G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULLUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 644 - 2024
CAP	-	**ITEM**	FINALIZACIÓN PLACA HUELLA	**LUGAR**	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

1300

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 644 - 2024

CAP	-	**ITEM**	INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA	**LUGAR**	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra instalación de valla informativa del contrato, placa huella terminada

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA BOLE

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

50

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU 708-2024

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realizan excavaciones menores a mano

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP 2	**ITEM** CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	3	

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S


REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP	7	**ITEM**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



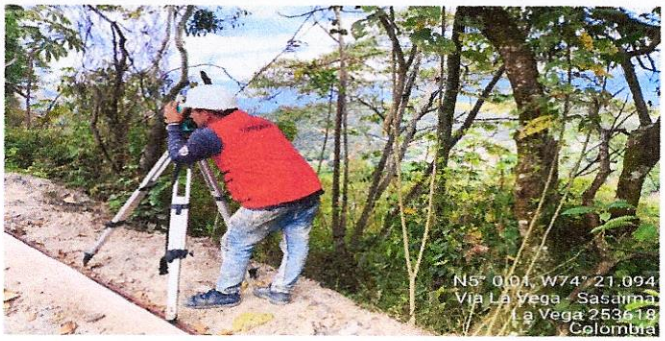





DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra levantamiento topográfico con elementos de precisión

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024	
CAP	-	**ITEM**	PLACA HUELLA FINALIZADA	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra la finalización de actividades constructivas para el tramo en la vereda ucrania sector la torre

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 708 - 2024
CAP	2	**ITEM**	PLACA HUELLA FINALIZADA	**LUGAR**	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra la finalización de actividades constructivas para el tramo en la vereda ucrania sector la torre

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO ICCU 755-2024

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024
CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza estabilización de la subbase granular previa al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024	
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024
CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO			MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA			PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
						CONVENIO	CONVENIO ICCU 755 - 2024
CAP	10	**ITEM**	SUBBASE GRANULAR	**LUGAR**	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza estabilización de la subbase granular previa al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

Carlos Andres Pinzon López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA


305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	1	**ITEM**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

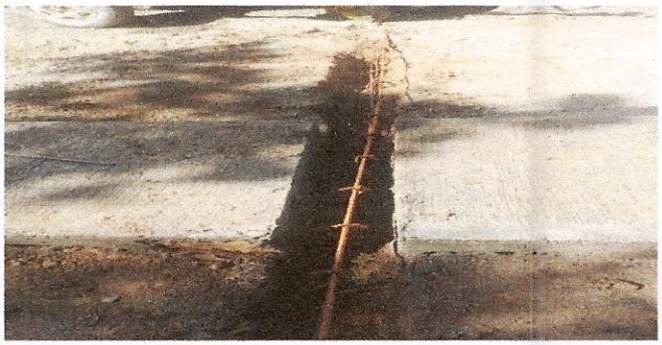

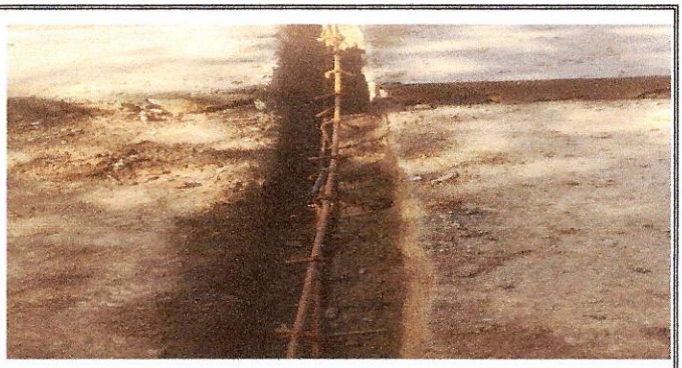





DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registran excavaciones menores a mano

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA		
CAP	6	**ITEM**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se realiza conformación de la calzada existente previo al inicio de las actividades constructivas

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LAVEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	

CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	

CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, actividad que se ejecuta de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025		
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA		
CAP	5	**ITEM**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa el corte y figurado del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA				
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

CAP	-	**ITEM**	IMPLEMENTACIÓN PMT	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA





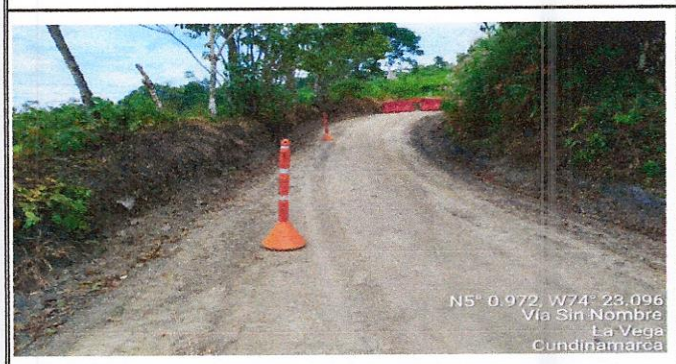



DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra implementación PMT planteado

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRÉS PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	

CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO Nº**	154 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	2	**ITEM**	CONCRETOS CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA DE LA VEGA

ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA						
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA
CAP	4	**ITEM**	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	3

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de concretos clase D, f'c = 3000 psi, para conformación de bases, e instalación del acero de refuerzo de 60.000 psi en las huellas vehiculares, y cunetas actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA


OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA







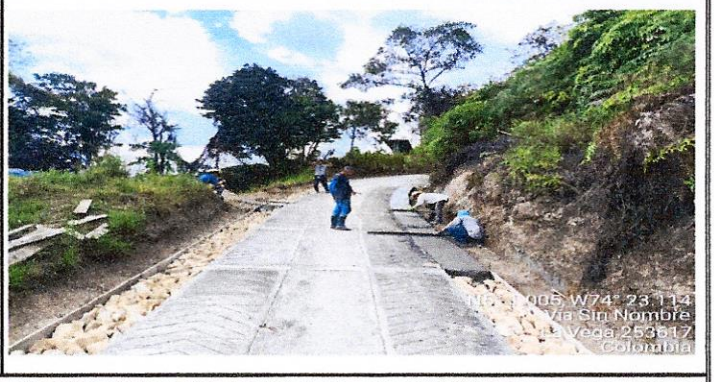

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **ALCALDIA DE LA VEGA**	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S		**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025
					CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA
CAP	3	**ITEM**	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA









DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Continúa la colocación de Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases actividad que se desarrolla conforme a los planos estructurales del proyecto.

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S


REGISTRO FOTOGRAFICO

AASING S.A.S.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ALCALDIA DE LA VEGA	ALCALDÍA DE LA VEGA

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	**NIT**	900.976.357-7	**CONTRATO N°**	154 DE 2025	
				CONVENIO	ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
CAP	7	**ITEM**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	**LUGAR**	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	**INFORME**	**3**

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR CONTRATO	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



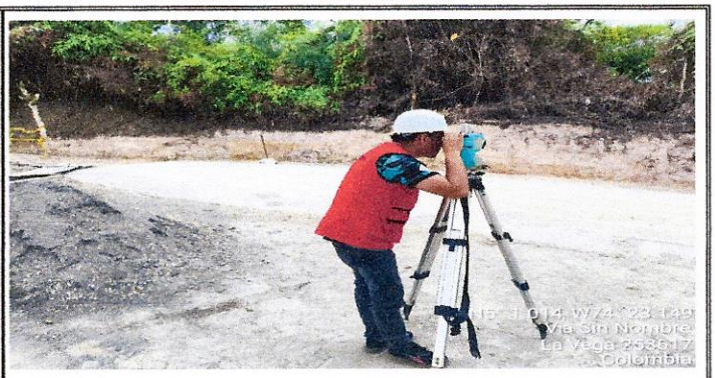





DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:	Se registra localización y replanteo con elementos de presición

ELABORO:	**Residente de obra**
UBICACIÓN:	LA VEGA CUNDINAMARCA
	VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

Carlos Andres Pinzon Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

ANEXO 6. BITÁCORA DE OBRA 644-2024

305 3678028
aasing.phlavega25@gmail.com

16/08/25 C. Obra 154-2025 / Conv ICCU 644-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. San Antonio S. Bole: Actividades de encofrado y fundida de cunetas y sobre anchos.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo
R. Interventoria

Sebastian R

Soliana D

19/08/25 C. Obra 154-2025 / Conv ICCU 644-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente.
Actividades
- V. San Antonio S. Bole: Se realizan actividades de limpieza y entrega de placa huella terminada.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo
R. Interventoria

Sebastian R

Soliana D

ANEXO 7. BITÁCORA DE OBRA 708-2024

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

1339

16/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 708-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Ucrania S. La Torre : Actividades de fundida de cunetas.

Sebastian R
William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo
R. Interventoria

Suliana D

19/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 708-2024 Inicio 7:00am
Clima : Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Ucrania S. La Torre : Actividades de fundida de cunetas y reparacion de cunetas dañadas por el clima durante el fin de semana.

Sebastian R
William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo
R. Interventoria

Suliana D

1340

20/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 708-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Ucrania S. La Torre: Actividades de excavacion encofrado y acomodado de hierro para cunetas.

Laura Golindo
R. Interventoria

Sebastian R
Aux. Residente Obra

William O.T

21/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 708-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Ucrania S. La Torre: Actividades de encofrado y acomodado de hierro para cuneta con bordillo y sobre anchos.

Sebastian R
Aux. Residente Obra

William O.T

Laura Golindo
R. Interventoria

ANEXO 8. BITÁCORA DE OBRA 755-2024

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

22/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de confor-
-macion de la via existente.

William O.T
Laura Galindo Sebastian K Aux. Residente Obra

Sebastian K

Juliana D.

23/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de excavaciones y conformacion de la via.

William O.T
Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

25/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de suministro de materiales, actividades de corte, figurado y amarrado de hierro.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Sebastian R

26/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00
Clima: Dia sin lluvias, sol todo el dia
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro.

William O.T
Aux. Residente Obra

Laura Galindo Sebastian R

27/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de corte figurado y amarre de hierro para parrillas de carriles, conetas y vigas.

William O.T
Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

Zegd

Juliana D.

28/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00 am
Clima: Dia soleado, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
- V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de corte, figurado y amarre de hierro.

William O.T
Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

29/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de corte figurado y amarre de hierro para carriles.

William O.T

Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

30/08/25 C.Obra 154-2025 / Conv ICCU 755-2024 Inicio 7:00am
Clima: Dia seco, sin lluvias
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Alianza S. Buenos Aires: Actividades de armado de cajones para encofrado.

William O.T

Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

1346

5

01/09/2025	C. Obra: 154-2025 / Conv. IDCV 755-2024 INICIO: 7:00 a.m clima: mañana nublada, dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades: • V. Alianza S. Buenos Aires: Corte, figurado y amarre de hierro para cunetas y carriles, armado de cajones para encofrado Laura Galindo Sebastian R William O.T Aux. Residente Obra
02/09/2025	C. Obra 154-2025 / Conv. IDCV 755-2024 INICIO: 7:00 a.m Clima: dia soleado Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra Actividades • V. Alianza S. Buenos Aires: Corte, figurado y amarre de hierro para cunetas y carriles, armado de cajones para encofrado Laura Galindo Sebastian R William O.T Aux. Residente Obra

6

03/04/2025 C. Obra: 154-2025 / Conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

V. Alianza S. Buenos Aires: Corte, figurado y amarrado de hierro, armado de cajones para encofrado

Laura Galindo

Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

Juliana D

04/04/2025 C. Obra: 154-2025 / Conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades:

- V. Alianza S Buenos Aires: Corte, figurado y amarrado de hierro

Laura Galindo

Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

05/04/2025 C.Obra: 154-2025/ conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Solecido

Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V. Alianza S.Buenos Aires: Corte, figurado y amarrado de hierro

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

Juliana D

06/04/2025 C. Obra: 154-2025 / conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V. Alianza S. Buenos Aires: Suministro de materiales agregados y partida de patria

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

8

08/09/2025 C. Obra: 154-2025/conv. IECU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente de obra

Actividades:

•V. Alianza S. Buenos Aires: Partida de piedra rajón para ciclópeo y suministro de materiales

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

09/09/2025 C. Obra: 154-2025/conv. IECU 755-2024 INICIO 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

•V. Alianza S. Buenos Aires: Partida de piedra rajón para ciclópeo y suministro de materiales.

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

1350

9

10/09/2025 C. Obra: 154-2025 / conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V. Alianza S. Buenos Aires: Suministro de materiales agregados y particla de piedra

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

Zeyd

Juliana D

11/09/2025 C. Obra: 154-2025 / conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

clima: mañana nublada, dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V. Alianza S. Buenos Aires: Suministro de materiales agregados

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

Zeyd

100

10

12/08/2025 C. Obra: 154-2025/ conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades:

• V. Alianza - S. Buenos Aires: Suministro de materiales agregados

Laura Galindo Sebastian R William O. T
Aux. Residente Obra

13/08/2025 C. Obra: 154-2025 / conv. ICCU 755-2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

• V. Alianza S. Buenos Aires: Suministro de materiales y partida de piedra

Laura Galindo Sebastian R William O. T
Aux. Residente Obra

15/04/2025 C. Obra: 154 - 2025 / Conv. ICCU 755 - 2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades:

- V. Alianza S. Buenos Aires: encofrado y acomodado de cajones para carriles y vigas

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

16/04/2025 C. Obra: 154 - 2025 / Conv. ICCU 755 - 2024 INICIO: 7:00 a.m

Clima: Dia Soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente de obra

Actividades

- V. Alianza S. Buenos Aires: encofrado y acomodado de cajones y de hierro para carriles y cunetas

Laura Galindo Sebastian R William O.T
Aux. Residente Obra

ANEXO 9. BITÁCORA DE OBRA ADICIÓN VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

305 3678028

aasing phlavega25@gmail com

1354

1

18/08/25 C.Obra 154-2025 / Adicion Inicio 7:00 am

Clima : Dia soleado

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades

- V. Huerta S. La Mina: Inicio de actividades de corte, figurado de hierro.

William O.T

Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

19/08/25 C.Obra 154-2025 / Adicion Inicio 7:00 am

Clima : Dia soleado sin lluvias

Personal: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes y 1 residente

Actividades

- V. Huerta S. La Mina: Actividades de amarrado, figurado y corte de hierro.

William O.T

Aux. Residente Obra

Laura Galindo Sebastian R

104

1355

20/08/25 C.Obra 154-2025 / Adicion Inicio 7:00 am
Clima : Dia soleado sin lluvia
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Huerta S.La Mina: Actividades de amarrado de parrillas para carriles y vigas.

William O.T
Laura Galindo Sebastian R Aux. Residente Obra

21/08/25 C.Obra 154-2025 / Adicion Inicio 7:00 am
Clima : Dia soleado
Personal: 1 maestro, 1oficial, 2 ayudantes y 1 residente
Actividades
• V. Huerta S.La Mina: Actividades de encofrado y fundida de carriles, partida de piedra rajon.

William O.T
Aux. Residente Obra
Sebastian R

105

ANEXO 10. CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

1357

AASING S.A.S.	CONTROL ESTADO DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA - DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO																															
FEBRERO																															
MARZO																															
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																DS	DN	DS	DS	DS	DS	NL	NL	DS	DS	DN	LLA	DS	NL	NL	
JULIO	DS	DN	DS	DS	DN	NL	LLM	LLF	DN	DS	DN	LLM	NL	LLM	DN	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DN	LLM	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS
AGOSTO	DS	DS	NL	DS	DN	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DN	DS	DS	DS	NL	NL	DS	DS	DS	DS	DS	NL	DS	DS	DS	DS	DS	DS	NL
SEPTIEMBRE	DS	DS	DS	DN	DS	DS	NL	DS	DS	DN	DS	DS	DS	NL	DS																
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	16 JUN 25	HASTA	15 SEP 25

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	51	60,00%	DIAS SOLEADOS	DS	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	12	14,12%	DIAS NUBLADOS	DN	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	1	1,18%	LLUVIAS FUERTES	LLF	
	4	4,71%	LLUVIAS MODERADAS	LLM	
	1	1,18%	LLUVIAS AISLADAS	LLA	
DÍAS NO LABORADOS	16	18,82%	NO LABORADOS	NL	
TOTAL	**85**	**100,00%**			

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
16 JUN 2025	15 SEP 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
DÍAS SECOS	63	74,12%
DÍAS LLUVIOSOS	6	7,06%
NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	16	18,82%
TOTAL	**85**	**100,00%**

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO		
DESDE	HASTA	
16 AGO 2024	15 SEP 25	
RESUMEN	**DÍAS**	**% LLUVIA PROYECTO**
TOTAL DÍAS SECOS	25	80,65%
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	0	0,00%
TOTAL DÍAS NO LABORADOS (DOMINGOS Y FESTIVOS)	6	19,35%
TOTAL	**31**	100,00%

OBSERVACIONES :

-
-
-
-
-
-
-

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	16/09/25
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón	


ELABORO: PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)

69


AASING S.A.S.	CONTROL DEL TIEMPO	VERSIÓN 01
		Página 1 de 1
		Elaboró: Residente de obra

OBJETO CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU-644-2024, MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORREO SEGÚN CONVENIO ICCU 708-2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 - 2024. Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (AASING S.A.S)
SUPERVISOR	ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

CONTROL DEL TIEMPO GENERAL PROYECTO

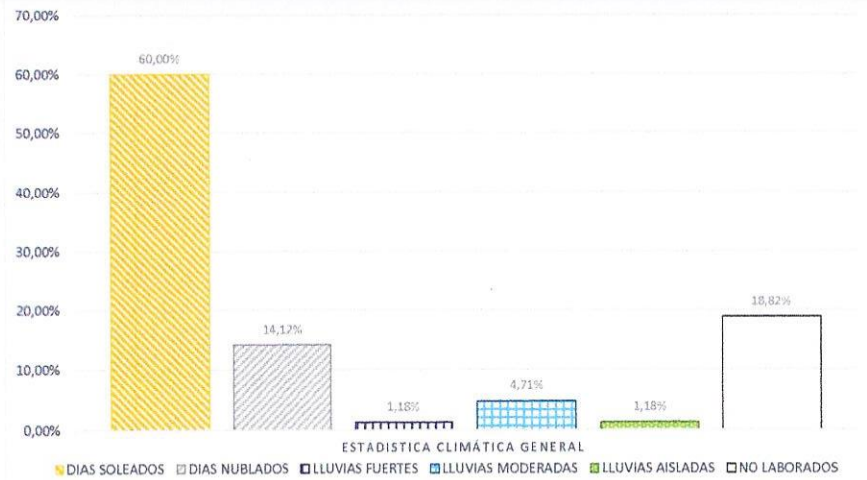

CONTROL DEL TIEMPO PERIODO ACTUAL

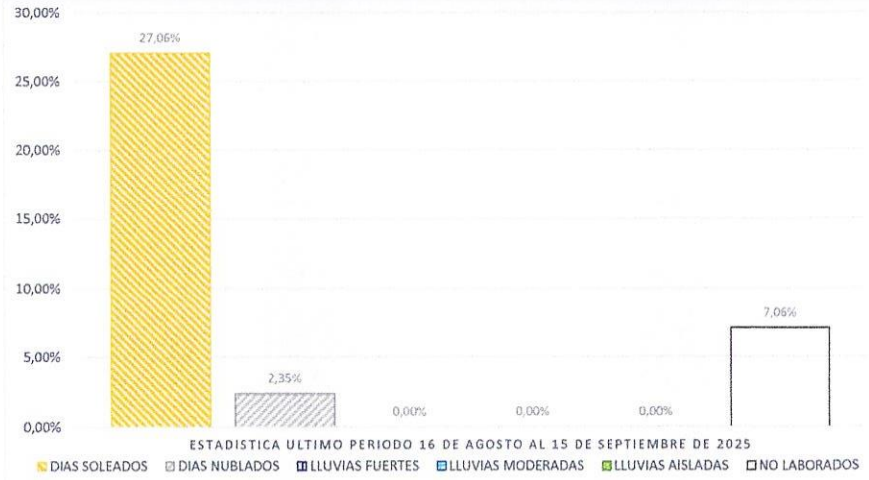

RESPONSABLE		FECHA:
NOMBRE:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ	16/09/25
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:	Carlos Andres Pinzón López	

ELABORO: AASING S.A.S

ANEXO 11. CORRESPONDENCIA ORIGINAL ENVIADA

305 3678028
aasing phlavega25@gmail.com

1360

La Vega, 19 de agosto de 2025

CTO 154-2025-009

LA VEGA 22/08/2025 09:39
Al Contestar cite este No.: 20251104779
Origen:AASING S.A.S.
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:9 folios Fol:1

Señores
Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Carrera 3 No 19-71
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor de apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
La Vega- Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.154-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA PÓLIZAS ACTUALIZADAS A MODIFICATORIO No. 1 CONTRATO C-OBRA-154-2025**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 154 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega de las pólizas actualizadas al modificatorio No.1 para su respectiva verificación, aprobación y trámite correspondiente:

SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Cumplimiento	11-44-101251794	Anexo 3 y 4
RCE	11-40-101076178	Anexo 3

Lo anterior mencionado en nueve (9) folios.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andrés Pinzón Lopez

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

110

1361

La Vega, 20 de agosto de 2025

OFI 154-2025-009.1

Señores

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.154-2025

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 154 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen y atendiendo la solicitud realizada por parte de la interventoría como contratista de obra hacemos entrega formal del informe mensual de obra No. 2 comprendido entre el 16 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025, el cual contiene:

- Informe mensual No.2
- Registro fotográfico Convenio ICCU 644-2024
- Registro fotográfico Convenio ICCU 708-2024
- Bitácora de obra 644-2024
- Bitácora de obra 708-2024
- Control estado del tiempo
- Correspondencia original enviada
- Correspondencia original recibida

Total, folios: ciento catorce (114) folios

Lo anterior, se entrega para revisión, aprobación y trámites correspondientes.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

La Vega, 20 de agosto de 2025

CTO 154-2025-009.2

Señores
Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.154-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO AL MODIFICATORIO No. 1**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de Obra No. 154 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del cronograma de obra actualizado al Modificatorio No.1.

Lo anterior se remite de acuerdo con la solicitud en dos (02) folios.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzon Lopez
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

La Vega, 27 de agosto de 2025

CTO 154-2025-010

Señores

Agroambiental Interventorías Y Obras Civiles S.A.S.
NIT: 900.446.649-9
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante Legal
agroambiental.interlavega@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra No.154-2025

OBJETO: " MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

ASUNTO: **ENTREGA ACTA PARCIAL No. 01 DE OBRA SOLICITUD DE PAGO**

Estimados señores;

En cumplimiento al contrato de obra No. 154 de 2025 y a las obligaciones contractuales que nos competen, como contratista de obra hacemos entrega del acta parcial No. 01 del contrato de obra.

En el acta parcial No. 01 en mención se adjunta toda la documentación en la cual se detalla el avance de las actividades de obra realizadas, todo lo anterior conforme a los términos contractuales establecidos.

A continuación, se detallan los documentos anexos:

RECIBIDO
INTERVENTORIA
DEL PROYECTO
Lorena Gomez
27-AGOSTO 2025

- Factura
- RUT
- Certificación bancaria
- Resolución de facturación
- Cédula representante legal
- Documentos contador
- Certificación pago de parafiscales
- Planillas de seguridad social
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-644
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-708
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-755
- Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda La Huerta sector La Mina
- Registro fotográfico convenio ICCU-644
- Registro fotográfico convenio ICCU-708
- Registro fotográfico convenio ICCU-755
- Registro fotográfico adición vereda La Huerta sector La Mina

113

- Acta parcial No.01
- Radicados informes mensuales

Se anexan ochenta y ocho (88) folios

Lo anterior, se entrega para revisión, aprobación y trámite correspondiente por parte de la supervisión del proyecto, con el fin de que se otorgue el pago correspondiente.

La aprobación y cualquier observación y demás información que se genere, se solicita sea enviada al correo electrónico aasing.phlavega25@gmail.com

Cordialmente,

Carlos Andres Pinzón López

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

ANEXO 12. CORRESPONDENCIA ORIGINAL RECIBIDA

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

1366

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900116619-9

La Vega – 16 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-014

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingenieria – Diseños, Construcciones y Consultorias (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Recibi Correo electronico
Carlos Andres Pinzón
18 Agosto 10:52am

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: ENTREGA DE ACTA Y COMPROMISOS DE COMITÉ DE OBRA No. 08 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025 Y CITACIÓN AL PROXIMO COMITÉ DE OBRA No. 09 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS en calidad de interventoria, se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 08 para el contrato No. 154-2025 con fecha del dia 13 de agosto de 2025.

ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 08:

En el comité técnico celebrado el día 13 de agosto de 2025, Se presento un informe sobre las actividades realizadas durante la semana:

Como resultado del presente comité se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900166019-9

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 13 de agosto de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Seguimiento Convenios 708	13/08/2025	Contratista Interventoria Supervisión
2	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	20/08/2025	Contratista Interventoria Supervisión
3	Subir información a Drive en cuanto a Actas Comité	13/08/2025	Interventoria

Fuente: Acta de comité de obra No. 08 del 13 de agosto de 2025

CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA:

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 09, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 01. Detalle de citación a comité de Obra No. 08

Dia	Miércoles, 20 de agosto de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 08 de fecha 13 agosto de 2025

Total, de folios (4)

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

IngridLorenaGomez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1368

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

La Vega Cundinamarca 25 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-014.1

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Pinzón
25. Agosto. 2025

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 2 C-OBRA-154-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.2 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025 mediante el comunicado OFI 154-2025-009.1 de fecha 20 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0. Informe mensual obra No. 2
Anexo 1. Registro fotográfico Convenio ICCU 644-2024
Anexo 2. Registro fotográfico Convenio ICCU 708-2024
Anexo 3. Bitácora de obra 644-2024
Anexo 4. Bitácora de obra 708-2024
Anexo 5. Control estado del tiempo

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

Anexo 6. Correspondencia original enviada
Anexo 7. Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta informe mensual de avance No. 2 en ciento catorce (114) folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez.

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1370

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900410610-0

La Vega – 25 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-014.2

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí
Carlos Andres Pinzón
25 ago

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoria No. 179-2025
Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto: AVAL Y ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO A MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO DE OBRA C-OBRA-154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra mediante el comunicado CTO 154-2025-009.2 de fecha 20 de agosto de 2025 referente al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1, esta interventoría informa:

- Una vez revisada la información entregada por el contratista de obra en referencia al cronograma de obra actualizado al modificatorio No.1 este se avala.

Por lo anterior, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación, aprobación y trámite correspondiente. Se adjunta:

- Cronograma de obra actualizado en dos (02) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez
INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1371

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

La Vega Cundinamarca 27 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-015

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Pinzon
27. Agosto 2025

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: **AVAL Y ENTREGA ACTA PARCIAL No. 1 C-OBRA-154-2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del acta parcial No,1 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025 mediante el comunicado CTO 154-2025-010 de fecha de 27 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0. Factura
Anexo 1.RUT
Anexo 2. Certificación bancaria
Anexo 3. Resolución de facturación
Anexo 4. Cédula representante legal
Anexo 5. Documentos contador
Anexo 6. Certificación pago de parafiscales
Anexo 7. Planillas de seguridad social
Anexo 8. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-644

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900446649-9

Anexo 9. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU 708
Anexo 10. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 convenio ICCU-755
Anexo 11. Memorias de cantidades acta parcial No. 01 adición vereda La Huerta sector La Mina
Anexo 12. Registro fotográfico convenio ICCU 644
Anexo 13. Registro fotográfico convenio ICCU 708
Anexo 14. Registro fotográfico convenio ICCU 755
Anexo 15. Registro fotográfico adición vereda La Huerta sector La Mina
Anexo 16. Acta parcial No.01
Anexo 17. Radicados informes mensuales

Total, folios noventa (90)

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1373

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900170601-9

La Vega Cundinamarca 01 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-154-016

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibi correo electronico
Carlos Andres Pinzón
01 sep de 2025

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: ENTREGA DE ACTA COMITÉ DE OBRA No. 09 DE FECHA DE 20 DE AGOSTO DE 2025, ENTREGA ACTA COMITÉ DE OBRA No. 10 Y COMPROMISOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, Y CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 11 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra:

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 09**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 09 con fecha del día 20 de agosto de 2025.

2. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 10**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 10 con fecha del día 27 de agosto de 2025

3. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 10**

Como resultado del comité llevado a cabo el 27 de agosto de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901116618-9

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 27 de agosto de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	27/08/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	Semanal	Contratista de Obra e interventoría
3	Instalacion de valla informativa convenio 708-2024	5/09/2025	Contratista

Fuente: *Acta de comité de obra No.10 del 27 de agosto de 2025*

4. CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 11

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 11, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Día	Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 09 de fecha 20 de agosto de 2025
- Acta de comité de obra No. 10 de fecha 27 de agosto de 2025

Total, de folios diez (10) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1375

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901116619-9

La Vega Cundinamarca 08 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-154-017

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Recibí correo electrónico
Carlos Andres Pinzon
08 sep

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: ENTREGA ACTA COMITÉ DE OBRA No. 11 Y COMPROMISOS DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y CITACIÓN AL PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 12 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, se realiza entrega de la siguiente documentación al contratista de obra:

1. **ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 11**

Se realiza entrega del acta correspondiente al comité de obra No. 11 con fecha del día 03 de septiembre de 2025

2. **ENTREGA DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 11**

Como resultado del comité llevado a cabo el 03 de septiembre de 2025 se establecieron compromisos para seguir logrando avances en el frente de obra, los compromisos pactados son presentados a continuación:

Imagen 1. Compromisos Actas de Comité de fecha 03 de septiembre de 2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	17/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	Semanal	Contratista de Obra e Interventoría
3	Instalacion de valla informativa convenio 708-2024	5/09/2025	Contratista
4	Realizar visita frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina	6/09/2025	Contratista de Obra, interventoria y supervision
5	Instalacion de valla informativa convenio 644-2024	3/09/2025	Contratista

Fuente: *Acta de comité de obra No.11 del 03 de septiembre de 2025*

3. CITACIÓN A PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA No. 12

Así mismo, se procede a realizar la citación al próximo comité de obra No. 12, para mantener un control en los avances y que los compromisos pactados se cumplan en las fechas establecidas, quedando de la siguiente manera:

Día	Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Lugar:	Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de La Vega, Cundinamarca
Hora:	09:00 am

Anexos al presente comunicado:

- Acta de comité de obra No. 11 de fecha 03 de septiembre de 2025

Total, de folios cinco (5) folios

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1377

INFORME ACTA DE TERMINACIÓN

305 3678028

aasing.phlavega25@gmail.com

INFORME MENSUAL No. 4 - TERMINACIÓN

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 – 2024, Y OTRAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"



CONTRATO DE OBRA No. 154 DE 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	PERIODO	OBJETO	ELABORADO	REVISADO POR	APROBADO POR
01	16/09/2025 25/09/2025	Informe No. - 4 Terminación	Residente de obra	Director Obra	Supervisión Municipal

19

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 9
5 ASPECTOS JURÍDICOS 10
5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO 10
5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 11
6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 12
6.1 FORMA DE PAGO 12
6.2 CORTES DE OBRA 12
7 ASPECTOS TÉCNICOS 13
7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO 13
7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 14
7.2.1 Vía que comunica La Vereda Bulucaima con La Vereda San Antonio Sector Bole según convenio ICCU 644 – 2024 14
7.2.2 Vía que comunica el casco urbano con la vereda Ucrania sector La Torre según convenio ICCU 708-2024 17
7.2.3 Vía que comunica la Vereda Centro con La Vereda La Alianza sector Buenos Aires según Convenio ICCU 755-2024 20
7.2.4 Vía que comunica la Vereda La Huerta sector La Mina 24
7.3 ESTADO DEL TIEMPO 26
8 ASPECTOS SOCIALES 27
8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 27
8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS 27
9 ASPECTOS SG SST 28
9.1 PERSONAL DE OBRA 28
9.2 SEGURIDAD SOCIAL 28
9.3 DOTACIONES Y (EPP) 28
10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 29
10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO 29
10.1.1 Control de correspondencia 29
10.1.2 Control comités 32
11 CONCLUSIONES 33
11.1 ASPECTOS TÉCNICOS 33
11.2 ASPECTOS SG-SST 34
11.3 ASPECTOS AMBIENTALES 34

20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S 9
Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S. 10
Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S 10
Tabla 4 Pólizas actualizadas modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S 10
Tabla 4 Pólizas actualizadas acta de recibo final de cantidades contrato de obra AASING S.A.S 11
Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S. 11
Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S 12
Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S. 12
Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S 13
Tabla 9 Actividades Vereda San Antonio Sector la Bole 14
Tabla 10 Actividades Vereda Ucrania - sector La Torre 18
Tabla 11 Actividades Vereda La Alianza sector Buenos Aires 21
Tabla 12 Actividades Vereda La Huerta sector La Mina 24
Tabla 13.Control del clima periodo actual 26
Tabla 14.Plan de acompañamiento a actividades técnicas 27
Tabla 15. Relación de personal de obra 28
Tabla 16 Relación - Correspondencia enviada 29
Tabla 17 Relación - Correspondencia recibida 30
Tabla 18 Relación – Comités de obra 32
Tabla 19 Avance de obra en sitios de intervención 33

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 6
Ilustración 2 Localización general de la vía que comunica la vereda San Antonio sector Bole 7
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda Ucrania sector La Torre 7
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda la Alianza sector Buenos Aires 8
Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S 13

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la empresa AASING S.A.S, en el periodo comprendido del **16 de septiembre de 2025 al 25 de septiembre de 2025**, para el contrato cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 – 2024, Y OTRAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA" de acuerdo con la propuesta presentada y con los respectivos términos de referencia con base al contrato No. 154 de 2025.

Siendo una de las obligaciones del contratista suministrar información sobre el proyecto con base al avance de este, en el presente documento se muestra el control de las actividades que se realizan durante el período especificado anteriormente, durante la ejecución de todas las actividades de desarrollo, enfatizando en la calidad, estudios técnicos y especificaciones del desempeño de las operaciones actuales.

Al final, se realiza conclusiones y observaciones sobre las actividades ejecutadas hasta el periodo mencionado y se realiza entrega del presente informe a la interventoría del proyecto, para su revisión y aprobación.

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S 10
Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S. 11
Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S 11
Tabla 4 Pólizas actualizadas modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S 11
Tabla 4 Pólizas actualizadas acta de recibo final de cantidades contrato de obra AASING S.A.S 12
Tabla 5 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S. 12
Tabla 6 Forma de pago del contrato AASING S.A.S 13
Tabla 7 Cortes de obra AASING S.A.S. 13
Tabla 8 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S 14
Tabla 9 Actividades Vereda San Antonio Sector la Bole 15
Tabla 10 Actividades Vereda Ucrania - sector La Torre 19
Tabla 11 Actividades Vereda La Alianza sector Buenos Aires 22
Tabla 12 Actividades Vereda La Huerta sector La Mina 25
Tabla 13.Control del clima periodo actual 27
Tabla 14.Plan de acompañamiento a actividades técnicas 28
Tabla 15. Relación de personal de obra 29
Tabla 16 Relación - Correspondencia enviada 30
Tabla 17 Relación - Correspondencia recibida 31
Tabla 18 Relación – Comités de obra 33
Tabla 19 Avance de obra en sitios de intervención 34

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega 7
Ilustración 2 Localización general de la vía que comunica la vereda San Antonio sector Bole 8
Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda Ucrania sector La Torre 8
Ilustración 4 Localización general de la vía vereda la Alianza sector Buenos Aires 9
Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S 14

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de La Vega Cundinamarca, ha identificado la necesidad para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de vías del sector rural, las cuales, a pesar de contar con un bajo volumen de tránsito, principalmente de vehículos livianos como los automóviles, camperos o motocicletas, son esenciales para la conectividad de las comunidades. En este contexto, considerando la prioridad de mejorar la infraestructura vial para el bienestar de los habitantes rurales, se destinarán recursos para la construcción de pavimentos de placa huella de concreto reforzado.

Este proyecto se justifica a partir de la previa la evaluación técnica que ha determinado la urgencia y la viabilidad de intervenir las siguientes vías, en búsqueda de mejorar las condiciones de accesibilidad de la población rural hacia el casco urbano del municipio y, a su vez, facilitar la conexión con otras regiones del país.

La intervención contempla el mejoramiento de aproximadamente 303 metros de placa huella, distribuidos en tres tramos:

a) Vía que comunica La Vereda Bulucaima con La Vereda San Antonio Sector Bole según convenio ICCU 644 – 2024
b) Vía que comunica El Casco Urbano con La Vereda Ucrania sector La Torre según Convenio ICCU 708–2024
c) Vía que comunica La Vereda Centro Con La Vereda La Alianza Sector Buenos Aires Según Convenio ICCU 755
d) Adición vía que comunica la Vereda La Huerta sector La Mina


El desarrollo del proyecto busca mejorar la conectividad y accesibilidad vial en el sector rural, lo cual impactará positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los vínculos entre la zona rural y el resto del municipio y la región.

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

3LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Vega es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, que se caracteriza por su entorno rural y su riqueza natural, se encuentra en la región central de Colombia.

Ilustración 1 Localización Municipio de La Vega

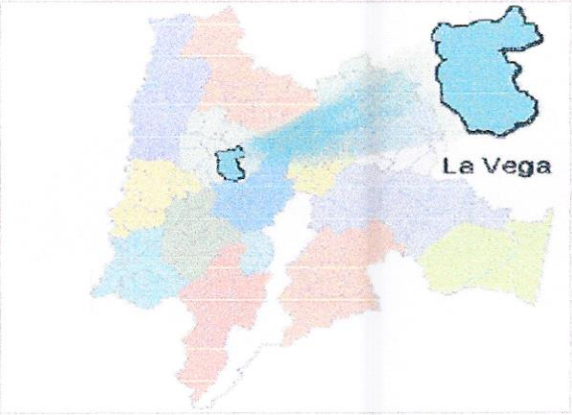

Características:

- Extensión total: 146 km²
- Altitud de la cabecera municipal:1510 m.s.n.m
- Temperatura media: 19 °C
- Habitantes: 7361 hab


Fuente: Alcaldía de la Vega

Las zonas por intervenir son parte del área rural del municipio de la vega son vías que comunican veredas entre sí y con la zona urbana, el proyecto tiene como objetivo brindar mejoramiento a las condiciones de circulación por las veredas que comunica esta vía, facilitando la comunicación y movilización de productos del sector campesino del municipio.

a. Vía que conduce de la vereda San Antonio sector Bole

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com


Ilustración 2 Localización general de la vía que comunica la vereda San Antonio sector Bole

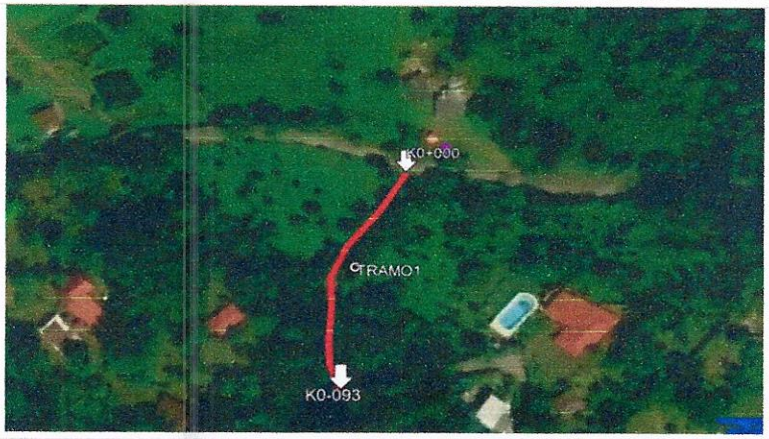

Fuente: Alcaldía de la Vega

b. Vía de la vereda Ucrania sector La Torre

Ilustración 3 Localización general de la Vía vereda Ucrania sector La Torre

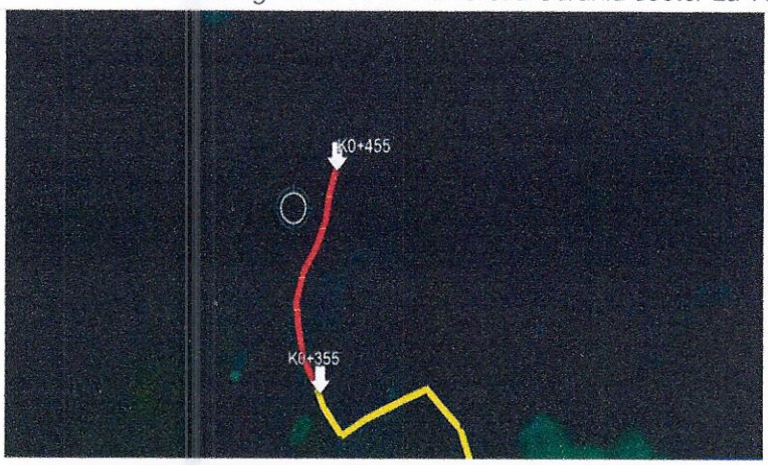

Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

c. Vía de la vereda La Alianza sector Buenos Aires

Ilustración 4 Localización general de la vía vereda la Alianza sector Buenos Aires



Fuente: Alcaldía de la Vega

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

4 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra del proyecto. Se describen a continuación los datos del contrato de obra indicando los tiempos y valores contractuales y el personal solicitado en el pliego de condiciones.

Tabla 1 Datos contrato de obra AASING S.A.S

CONTRATISTA	
Número de contrato	C-OBRA-No. 154 DE 2025
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO INCCU 644 – 2024; MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 – 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755 – 2024, Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"
Contratista	Proyectos de Ingeniería Diseños Construcciones y Consultorías S.A.S (AASING S.A.S)
Nit	900.976.357-7
Representante legal	Carlos Andrés Pinzón López
Valor inicial del contrato	$ 402.006.307,20
Adición No.1	$ 200.866.496,00
Valor final del contrato	$ 602.872.803,02
Plazo de ejecución inicial	Cuatro (04) Meses
Prórroga No. 1	Dos (02) Meses
Plazo de ejecución final	Seis (06) Meses
Fecha inicio	16 de junio de 2025
Terminación inicial	15 de octubre de 2025
Terminación final	15 de diciembre de 2025
Fecha de suscripción acta de terminacion	25 de septiembre de 2025
Supervisor	Laura Viviana Ortiz Robayo

Fuente: AASING S.A.S

5ASPECTOS JURÍDICOS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra expedidas por Seguros del Estado, con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones:

5.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 2 Pólizas iniciales contrato de obra AASING S.A.S.

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251794	Cumplimiento	25/03/2025	25/11/2025	$ 40.200.630,72
11-44-101251794	Prestaciones	25/03/2025	25/07/2028	$ 20.100.315,36
11-44-101251794	Estabilidad	25/03/2025	25/07/2030	$ 80.401.261,44
11-40-101071234	RCE	25/03/2025	27/05/2025	$ 284.700.000,00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 3 Pólizas acta de inicio contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251794	Cumplimiento	16/06/2025	16/02/2026	$ 40.200.630,72
11-44-101251794	Prestaciones	16/06/2025	16/10/2026	$ 20.100.315,36
11-44-101251794	Estabilidad	16/10/2025	16/10/2030	$ 80.401.261,44
11-40-101071234	RCE	16/06/2025	16/10/2025	$ 284.700.000,00

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 4 Pólizas actualizadas modificatorio No. 1 contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251794	Cumplimiento	16/06/2025	16/04/2026	$ 60.287.280,32
11-44-101251794	Prestaciones	16/06/2025	16/12/2028	$ 30.143.640,16
11-44-101251794	Estabilidad	16/10/2025	16/10/2030	$ 120.574.560,64
11-40-101071234	RCE	16/06/2025	16/12/2025	$ 284.700.000,00

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

Tabla 5 Pólizas actualizadas acta de recibo final de cantidades contrato de obra AASING S.A.S

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
11-44-101251794	Cumplimiento	16/06/2025	16/04/2026	$ 60.287.280,32
11-44-101251794	Prestaciones	16/06/2025	16/12/2028	$ 30.143.640,16
11-44-101251794	Estabilidad	16/10/2025	25/09/2030	$ 120.574.560,64

Fuente: AASING S.A.S

5.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra tales como actas de inicio:

Tabla 6 Documentos legales contrato de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Fecha de Firma
1	Contrato	27/03/2025
2	Acta de inicio	16/06/2025
3	Modificatorio, Prórroga y Adición No. 01	16/08/2025
4	Acta de recibo final de cantidades	25/09/2025

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

6 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

6.1 FORMA DE PAGO

Para el presente contrato de obra No. 154 de 2025, se establecieron, los siguientes parámetros de forma de pago, con su respectiva documentación de formalización de pago:

Tabla 7 Forma de pago del contrato AASING S.A.S

No. Pago	Forma de pago	Documentación general para pagos
1	0-90%	El municipio cancelara al contratista actas parciales correspondientes al avance de obra hasta alcanzar el 90%
2	10%	Una vez se finalicen los trabajos y se reciban a satisfacción por parte de la administración Municipal a través de la supervisión y/o interventoría, previa presentación del informe de actividades al superviso y/o interventor del contrato, el cual expedirá un informe de recibo a satisfacción.

Fuente: AASING S.A.S.

6.2 CORTES DE OBRA

Los cortes de obra se realizarán de acuerdo con el avance de las actividades ejecutadas, actividades que deben corresponder con los diseños, ítems aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, previo recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. A la fecha no se han presentado cortes de obra.

Tabla 8 Cortes de obra AASING S.A.S.

No.	Objeto	Valor
1	Contrato	$402.006.307,20
2	Adición No. 1	$ 200.866.496,00
3	Acta parcial No.1	$ 503.198.040,00
4	Acta de recibo final de cantidades – 90%	$ 39.387.483,00
5	Acta de recibo final de cantidades – 100%	$ 60.287.280,02
4	Saldo por cobrar	$ 99.674.763,20

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


7 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades contractuales en obra:

7.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se evidencia el avance de ejecución de obra de las actividades realizadas hasta la fecha:

Ilustración 5. Programado Vs Ejecutado AASING S.A.S

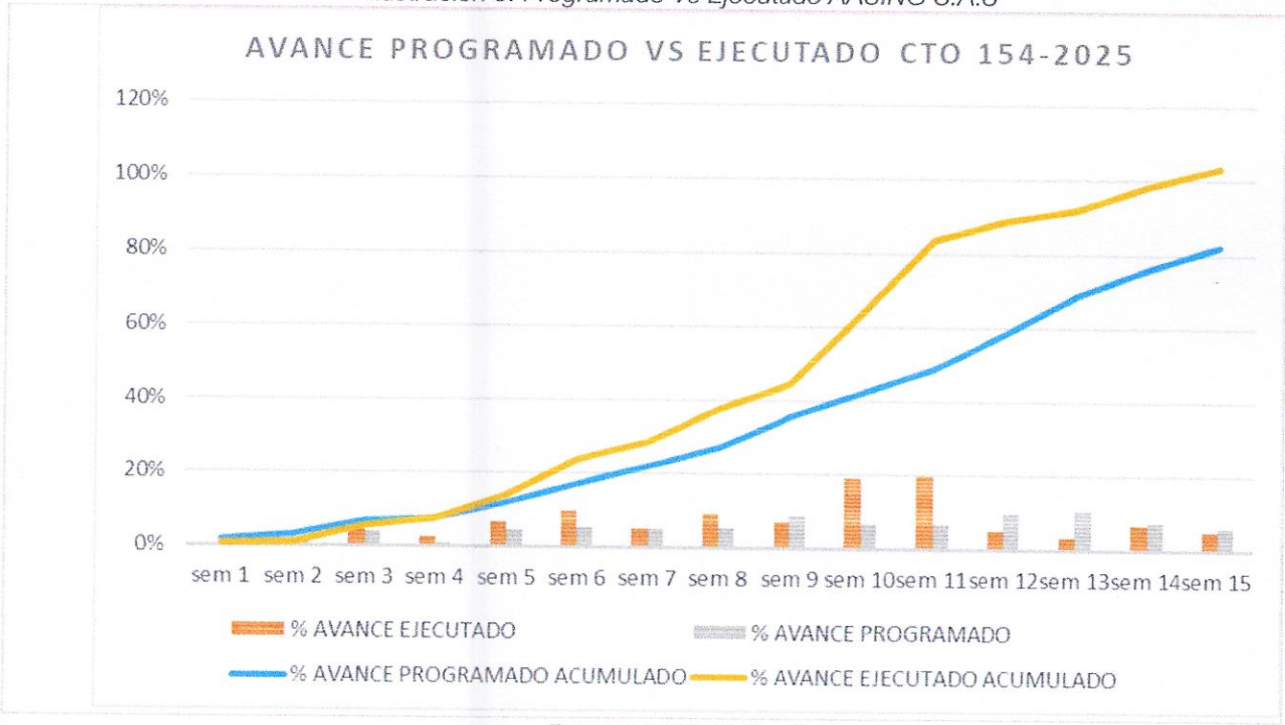

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 9 Programado VS Ejecutado AASING S.A.S

FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
16 de agosto de 2025 al 25 de septiembre de 2025	82.24%	100%

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A la fecha del presente informe se han desarrollado las actividades contractuales del contrato de obra, según la programación de obra establecida y aprobada para el proyecto.

7.2.1 Vía que comunica La Vereda Bulucaima con La Vereda San Antonio Sector Bole según convenio ICCU 644 – 2024

Durante el periodo, se finalizaron las actividades en este frente de trabajo, conforme a la programación de obra establecida. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con la ejecución de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se encuentra alineado al cronograma, finalizando así, las labores constructivas para el tramo en mención en la vereda San Antonio Sector Bole.

Tabla 10 Actividades Vereda San Antonio Sector la Bole

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO Y FIGURADO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com


REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
TOPOGRAFÍA CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	
FINALIZACIÓN PLACA HUELLA	

Fuente: AASING S.A.S

7.2.2 Vía que comunica el casco urbano con la vereda Ucrania sector La Torre según convenio ICCU 708-2024

Durante el periodo, se finalizaron las actividades en este frente de trabajo, conforme a la programación de obra establecida. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con la ejecución de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se encuentra alineado al cronograma, finalizando así, las labores constructivas para el tramo en la vereda Ucrania sector La Torre.

Tabla 11 Actividades Vereda Ucrania - sector La Torre

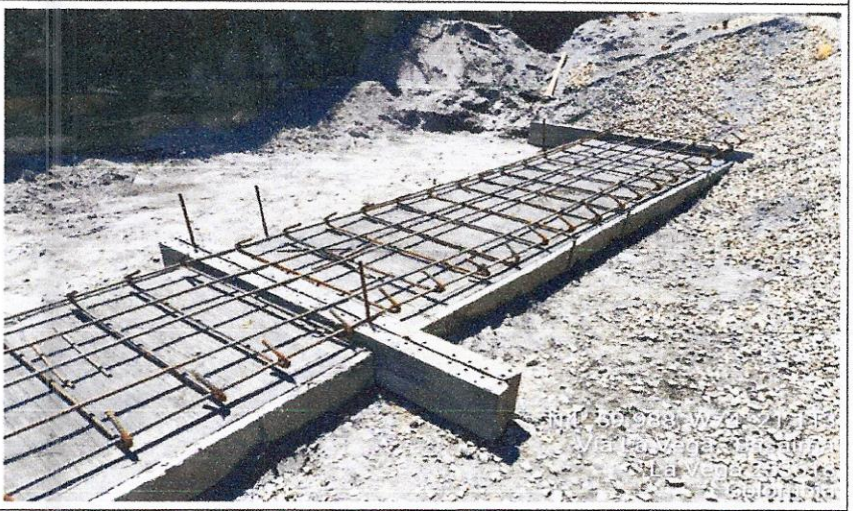REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	
