REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
PLACA HUELLA FINALIZADA	


Fuente: AASING S.A.S

7.2.3 Vía que comunica la Vereda Centro con La Vereda La Alianza sector Buenos Aires según Convenio ICCU 755-2024


Durante el periodo, se iniciaron las actividades en este frente de trabajo, conforme a la programación de obra establecida. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, para las actividades de armado y figurado de acero de refuerzo de 60.000 PSI, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se encuentra alineado al cronograma, finalizando así, las labores constructivas para en la vereda La Alianza sector Buenos Aires, finalizaron satisfactoriamente.

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

Tabla 12 Actividades Vereda La Alianza sector Buenos Aires

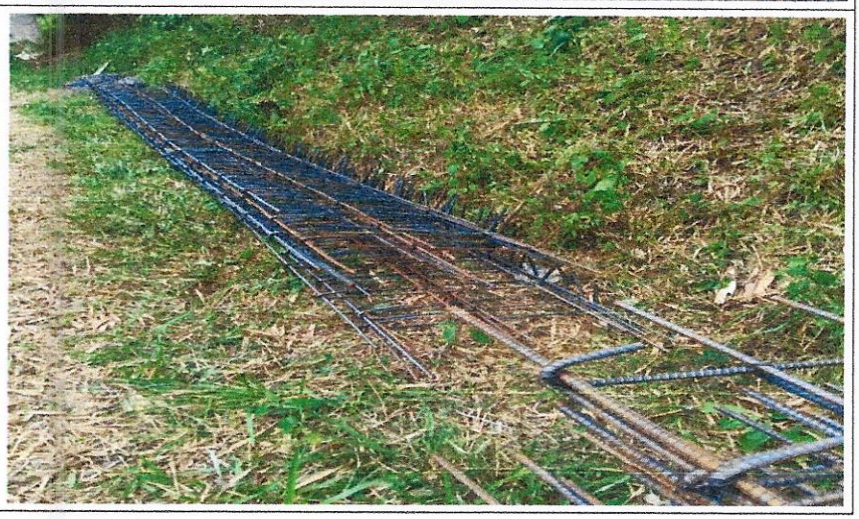REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	

305 3678028 aasing phlavega25@gmail.com

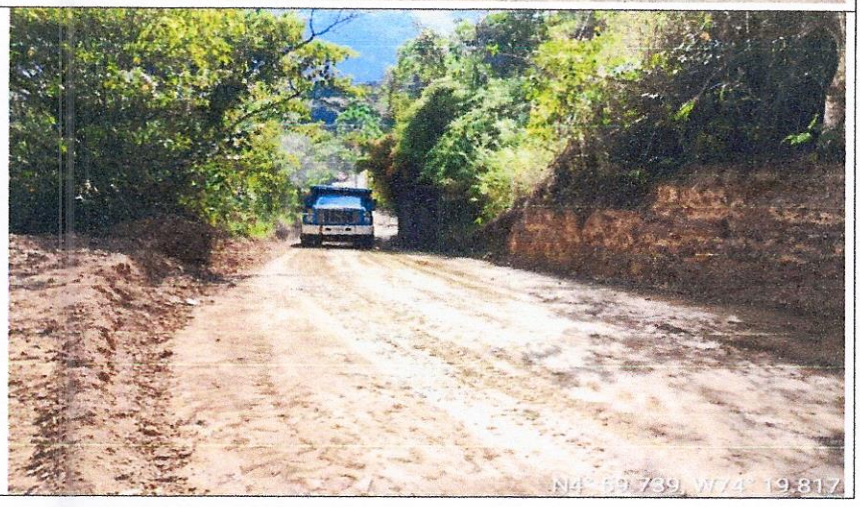REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	

Fuente: AASING S.A.S


42

7.2.4 Vía que comunica la Vereda La Huerta sector La Mina

Durante el periodo, se finalizaron las actividades en este frente de trabajo, conforme a la programación de obra establecida. Para ello, se dispuso en el sitio el material necesario para la ejecución incluyendo el acero de refuerzo, cemento y demás insumos requeridos. Con la disponibilidad total de los recursos, se procedió con la ejecución de las obras, las cuales fueron desarrolladas de acuerdo con lo previsto en la planeación. Estas actividades se ejecutaron de manera continua. El avance físico y administrativo se encuentra alineado al cronograma, finalizando así, las labores constructivas para el tramo en la vereda La Huerta sector La Mina

Tabla 13 Actividades Vereda La Huerta sector La Mina

REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	

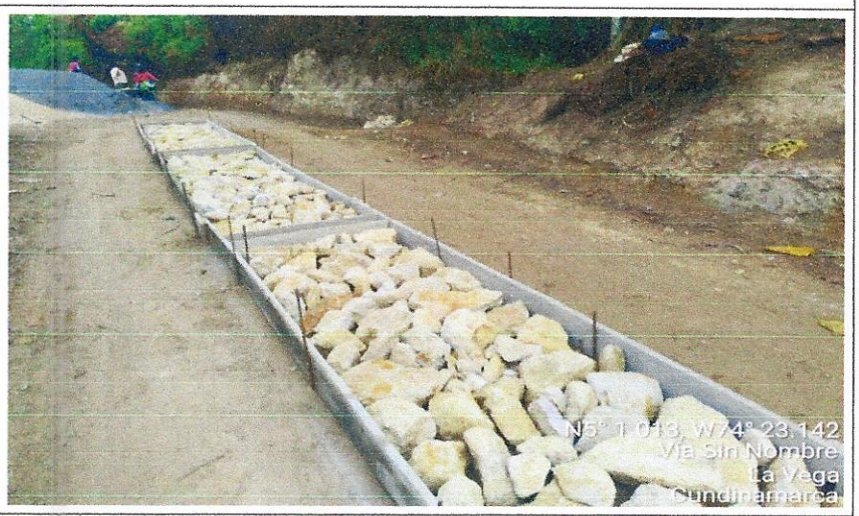REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	
CONCRETO CLASE D, F'C=3000 PSI (BASES)	
CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	

A4


REGISTRO FOTOGRÁFICO VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
PLACA HUELLA FINALIZADA	

Fuente: AASING S.A.S

7.3 ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se han presentado lluvias que han impedido el trabajo en algunos días, pero se han evidenciado en pocas ocasiones como se detalla en la bitácora y en el control del tiempo.

Tabla 14.Control del clima periodo actual

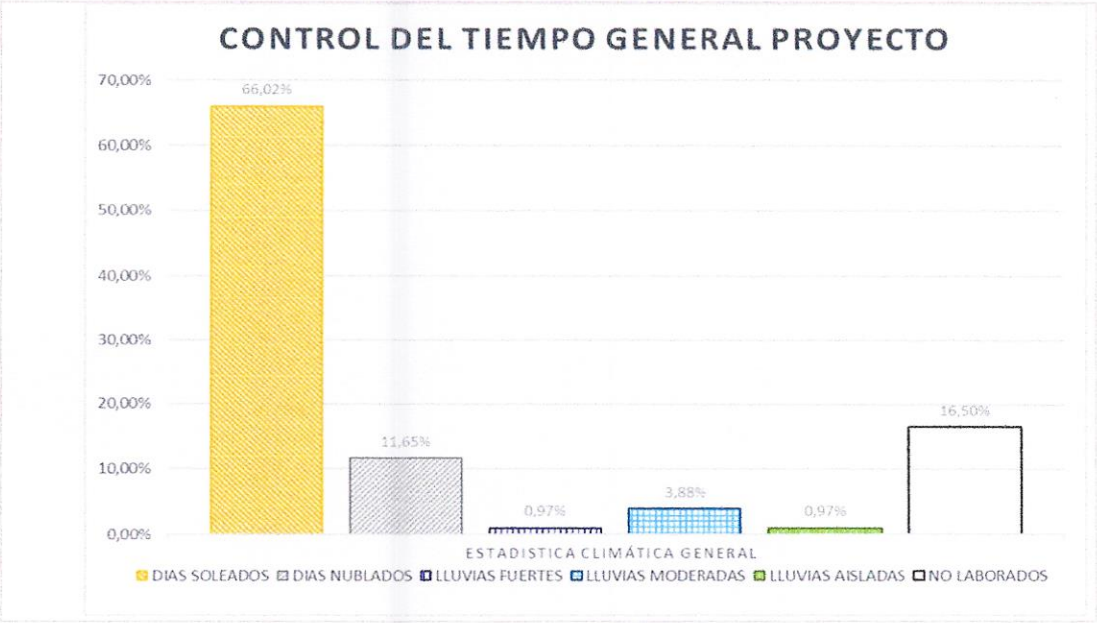

Fuente: AASING S.A.S

8ASPECTOS SOCIALES

8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de brindar atención y participación a la comunidad en el proyecto que se está ejecutando, se encuentra disponibilidad en la obra para recibir cualquier petición, queja y/o reclamos (PQR'S) con relación a la obra en ejecución. Este programa se implementa dado que, para AASING S.A.S., es muy importante la participación de la comunidad para la cual se está ejecutando el proyecto.

Dentro de la gestión social realizada por el contratista de obra se resalta la vinculación laboral de personas habitantes del municipio de la Vega.

Previo al inicio de las actividades constructivas, se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad, la cual manifestó una recepción favorable ante las obras a ejecutar.

8.2 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el periodo correspondiente a este informe se realiza apoyo a actividades técnicas de obra.

Tabla 15.Plan de acompañamiento a actividades técnicas

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	OBSERVACIONES
• Realizar acompañamiento en temas de conflictos con propietarios. • Brindar apoyo en el momento de que se generen imprevistos en obra por parte de la comunidad. • Dar información al residente de obra con respecto a propietarios directamente implicados con el proyecto. • Ser partícipe y dar apoyo de las capacitaciones que se brinden al personal de obra en los diferentes temas. Apoyo en la socialización y recepción de firmas de actas de aprovechamiento forestal.	Realizar acompañamiento social en obra en las actividades técnicas, para que así se genere de la mejor manera y sin afectar a la comunidad ni al contratista	Se realiza acompañamiento al residente de obra al momento de resolver dudas e inquietudes con los propietarios. Se apoyo en las capacitaciones de obra en temas referentes a SG-SST Se realiza acompañamiento a viviendas que sufrieron afectaciones debido a la ejecución de la obra.

Fuente: AASING S.A.S

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

9ASPECTOS SG SST

Aspectos de sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto:

9.1 PERSONAL DE OBRA

Para el inicio de las obras, se realizó la presentación de las hojas de vida del personal profesional de obra, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato. Dicho personal realizo presencia en el sitio de la obra y se relaciona a continuación.

Tabla 16. Relación de personal de obra

PROFESIONAL
Director de obra
Residente de Obra
Ingeniero en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: AASING S.A.S

9.2 SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo del presente informe el contratista entrego a la interventoría los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, es de aclarar que no se permitió el ingreso a la obra de ninguna persona sin la documentación antes mencionada.

9.3 DOTACIONES Y (EPP)

Al inicio de la obra el contratista entrega dotación y elementos de protección personal (EPP) a todo el personal que ingresó a trabajar en la obra; de igual manera a medida que nuevo personal ingresa a trabajar, se hará entrega de todos sus elementos de protección. En momento, los trabajadores cuentas con los siguientes elementos de protección personal: Casco amarillo, Botas de seguridad, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción, tapabocas, guantes de carnaza.

47

10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente capítulo se relaciona las actas administrativas realizadas durante el desarrollo del contrato, al igual, las decisiones tomadas y los diferentes requerimientos realizados de la interventoría al contratista, al igual que las respuestas dadas por ellos, de igual forma se relacionan la correspondencia generada.

10.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTO

Se relaciona el seguimiento del proyecto durante la ejecución de la obra en los siguientes aspectos:

10.1.1 Control de correspondencia

La correspondencia que a continuación se relaciona es la que se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la supervisión u otra entidad.

Tabla 17 Relación - Correspondencia enviada

INFORME No 1			
No.	Fecha	Asunto	Destinatario
1	17-06-2025	Entrega cronograma, apu, hojas de vida personal mínimo requerido, pmt y soportes de maquinaria	Supervisión, interventoría
2	17-06-2025	Entrega pólizas acta de inicio contrato c-obra-161-2025	Supervisión,
3	17-06-2025	Entrega plan de seguridad y salud en el trabajo sst	Supervisión,
4	24-06-2025	Solicitud de aclaración de inclusión de iva en el valor del contrato de obra no. C-obra-154-2025	Supervisión,
5	24-06-2025	Subsanación de observaciones al plan del sg-sst del contrato de obra no. C-obra-161-2025	interventoría
6	11-07-2025	Solicitud aprobación modificatoria por adición en el valor, adición en tiempo e inclusión de ítems no previstos al contrato de obra no 154 - 2025	Supervisión, interventoría
INFORME No 2			
7	23-07-2025	No aplicación protocolos de bioseguridad	Supervisión, Interventoría
8	23-07-2025	Entrega informe mensual No. 1	Interventoría
INFORME No 3			

48

9	19-08-2025	Entrega pólizas actualizadas a modificatorio no. 1 contrato c-obra-154-2025	Supervisión
9.1	20-08-2025	Entrega informe mensual de obra no. 2	Interventoría
9.2	20-08-2025	Entrega cronograma de obra actualizado al modificatorio no. 1	Interventoría
10	27-08-2025	Entrega acta parcial No. 01 de obra solicitud de pago	Interventoría
		INFORME No 4 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES	
11	19-09-2025	Entrega informe mensual de obra No. 3	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

Tabla 18 Relación - Correspondencia recibida

INFORME No.1			
No.	Fecha	Asunto	Remitente
1	17-06-2025	Solicitud de información inicial para el desarrollo del contrato de obra no. 161-2025 (placa huella vereda Naguy Alto y vereda La Alianza)	Interventoría
2	18-06-2025	Val y entrega de hojas de vida, programación de obra, análisis de precios unitarios y PMT contrato de obra c-obra-154-2025	Interventoría
3	18-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 01 de fecha 11 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 02 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
4	24-06-2025	Respuesta al oficio CTO 161-2025-004 del 24 de junio de 2025 solicitud de aclaración de IVA en el valor del contrato de obra no. C-obra-161-2025	Interventoría
5	25-06-2025	Aval y entrega de plan SG SST para el contrato de obra c-obra-161-2025	Interventoría
6	18-06-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 02 de fecha 18 de junio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 03 para el contrato de obra no. 161-2025	Interventoría
		INFORME No. 2	
7	16-07-2025	Aval-solicitud de inclusión ítems no previstos y adición No. 1	Interventoría
9	18-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 04 de fecha 16 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 05 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
10	24-07-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 05 de fecha 23 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 06 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11	02-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 06 de fecha 30 de julio de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 07 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
11.1	04-08-2025	Aval y entrega informe mensual de avance no.1 c-obra-154-2025	Interventoría
12	06-08-2025	Aval no aplicación protocolos de bioseguridad	Interventoría
13	08-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 07 de fecha 06 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 08 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
INFORME No 3			
14	16-08-2025	Entrega de acta y compromisos de comité de obra no. 08 de fecha 13 de agosto de 2025 y citación al próximo comité de obra no. 09 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
14.1	25-08-2025	Aval y entrega informe mensual de avance no. 2 c-obra-154-2025	Interventoría
14.2	25-08-2025	Aval y entrega cronograma de obra actualizado a modificatorio no.1 del contrato de obra c-obra-154-2025	Interventoría
15	27-08-2025	Aval y entrega acta parcial no. 1 c-obra-154-2025	Interventoría
16	01-09-2025	Entrega de acta comité de obra no. 09 de fecha de 20 de agosto de 2025, entrega acta comité de obra no. 10 y compromisos de fecha 27 de agosto de 2025, y citación al próximo comité de obra no. 11 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
17	08-09-2025	Entrega acta comité de obra no. 11 y compromisos de fecha 03 de septiembre de 2025, y citación al próximo comité de obra no. 12 para el contrato de obra no. 154-2025	Interventoría
INFORME No 4 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES			
18	24-09-2025	Aval y entrega informe mensual de avance No.3 C-Obra 154-2025	Interventoría

Fuente: AASING S.A.S

10.1.2 Control comités

Durante el periodo se llevaron a cabo los siguientes comités de obra.

Tabla 19 Relación – Comités de obra

No.	Fecha	Asunto
INFORME MENSUAL No. 1		
01	18-06-2025	Comité de seguimiento de las actividades
02	25-06-2025	Comité de seguimiento de las actividades
03	09-07-2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME MENSUAL No. 2		
04	16-07-2025	Comité de seguimiento de las actividades
05	23-07-2025	Comité de seguimiento de las actividades
06	30-07-2025	Comité de seguimiento de las actividades
07	06-08-2025	Comité de seguimiento de las actividades
08	13-08-2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME MENSUAL No. 3		
09	20-08-2025	Comité de seguimiento de las actividades
10	27-08-2025	Comité de seguimiento de las actividades
11	03-09-2025	Comité de seguimiento de las actividades
INFORME MENSUAL No. 4 ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES		
12	10-09-2025	Comité de seguimiento de las actividades
13	24-09-2025	Comité de seguimiento de las actividades

Fuente: AASING S.A.S

51

11 CONCLUSIONES

11.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- A la fecha el avance general de obra es de un 100% ejecutado frente al 82.24% programado representado en la ejecución de actividades contractuales.

- Para cada uno de los sectores de intervención se cuenta con el siguiente avance de obra:

Tabla 20 Avance de obra en sitios de intervención

SITIO DE INTERVENCIÓN	AVANCE DE OBRA
Vereda San Antonio Sector Bole Convenio ICCU 644-2024	100,00%
Vereda Ucrania Sector La Torre Convenio ICCU 708-2024	100,00%
Vereda la Alianza sector Buenos Aires Convenio ICCU 755-2024	100,00%
Vereda la Huerta sector La Mina	100,00%

Fuente: AASING S.A.S

- A la fecha se han finalizados los procesos constructivos en el convenio 644-2024, convenio ICCU 708 -2024, convenio ICCU 755 -2024 y la adición en la vereda la Huerta sector La Mina correspondientes a el suministro, figurado y armado de acero de refuerzo, conformación de calzada, localización y replanteo, instalación de subbsae, demoliciones, la fundida de concretos clase D, concretos ciclópeos en 2500 psi, excavaciones manuales, concretos de cunetas y transporte de materiales Por lo cual se finalizaron las labores constructivas en los frentes de trabajo en mención

- El clima presentado en el transcurso del proyecto fue favorable para la ejecución de las actividades, lo que aporto a que las actividades se finalizaran antes de lo previsto.

- Durante el periodo del presente informe de terminación se suscribió el acta de recibo final de cantidades teniendo en cuenta que las actividades finalizaron.

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

11.2 ASPECTOS SG-SST

- Durante este periodo de ejecución de actividades se mantuvo el personal afiliado al sistema de seguridad (ARL, EPS y pensión), de igual modo el personal contó con su respectiva dotación de elementos de protección personal.

11.3 ASPECTOS AMBIENTALES

- Se supervisaron las actividades diarias, con el fin de generar el menor impacto de contaminación posible, control de desechos orgánicos e inorgánicos y contaminación visual, además de mitigar del impacto frente a los vecinos colindantes a cada uno de los proyectos

305 3678028 aasing.phlavega25@gmail.com

1413

AVAL INFORMES MENSUALES PRESENTADOS

54

305 3678028

aasing phlavega25@gmail.com

1414

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901116015-9

La Vega – 04 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-011.1

LA VEGA 15/08/2025 11:45
Al Contestar cite este No.: 20251104666
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:82 Folios Fol:1

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Recibi
Carlos Andres Pinzon
04-Agosto-2025

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

Asunto AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No.1 C-OBRA-154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.1 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025 mediante el comunicado OFI 154-2025-008 de fecha 23 de julio de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0 informe mensual No.1
Anexo 1 . Registro fotográfico convenio 644-2024
Anexo 2 . Registro fotográfico convenio 708-2024
Anexo 3 . Registro fotográfico convenio 755-2024
Anexo 4 .Bitácora de obra
Anexo 5. Control estado del tiempo
Anexo 6 . Registro fotográfico socializaciones convenios
Anexo 7. Correspondencia original enviada
Anexo 8. Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta Informe mensual de avance No. 1 en ochenta y dos (82) Folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

55

1415

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900176619-9

La Vega Cundinamarca 25 de agosto de 2025

CTO.179-2025-154-014.1

LA VEGA 05/09/2025 12:37
Al Contestar cite este No.: 20251105104
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:114 Folios Fol:2

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Señores
Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 2 C-OBRA-154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.2 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025 mediante el comunicado OFI 154-2025-009.1 de fecha 20 de agosto de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0. Informe mensual obra No. 2
Anexo 1. Registro fotográfico Convenio ICCU 644-2024
Anexo 2. Registro fotográfico Convenio ICCU 708-2024
Anexo 3. Bitácora de obra 644-2024
Anexo 4. Bitácora de obra 708-2024
Anexo 5. Control estado del tiempo

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901144643-9

Anexo 6. Correspondencia original enviada
Anexo 7. Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoría realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta informe mensual de avance No. 2 en ciento catorce (114) folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1417

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 900176618-9

La Vega Cundinamarca 24 de septiembre de 2025

CTO.179-2025-154-018

LA VEGA 24/09/2025 15:34
Al Contestar cite este No.: 20251105497
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos:126 FOLIOS Fol:2

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Dayron Alexis Celis Triana
Supervisor De Apoyo
ingenieriadactlavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Proyectos de Ingeniería – Diseños, Construcciones y Consultorías (AASING)
NIT: 900.976.357-7
Carlos Andrés Pinzón López
Representante Legal
aasing.phlavega25@gmail.com
La Vega, Cundinamarca

Recibí
Carlos Andres Pinzón
25-Sep-2025

Referencia: Contrato de interventoría No. 179-2025
Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca".

Asunto: AVAL Y ENTREGA INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 3 C-OBRA-154-2025

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, y una vez recibida y verificada la información entregada por el contratista de obra referente a la entrega del informe mensual de avance No.3 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025 mediante el comunicado OFI 154-2025-0011de fecha 19 de septiembre de 2025, esta interventoría informa que se avala.

Por lo anterior, se remite a la supervisión del proyecto y se otorga aval al contratista de obra, junto con la siguiente documentación de soporte:

Anexo 0. Informe mensual No.3
Anexo 1. Pólizas actualizadas a modificatorio No.1 Cto obra 154
Anexo 2. Registro fotográfico Convenio ICCU 644-2024
Anexo 3. Registro fotográfico Convenio ICCU 708-2024Anexo 4. Bitácora de obra 708-2024
Anexo 4. Registro fotográfico Convenio ICCU 755-2024
Anexo 5. Registro fotográfico Adición vereda La Huerta sector La Mina

58

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901176818-9

Anexo 6. Bitácora de obra 644-2024
Anexo 7. Bitácora de obra 708-2024
Anexo 8. Bitácora de obra 755-2025
Anexo 9. Bitácora de obra adición vereda La Huerta Sector La Mina
Anexo 10. Control estado del tiempo
Anexo 11. Correspondencia original enviada
Anexo 12. Correspondencia original recibida

En consecuencia, esta interventoria realiza el traslado correspondiente al Municipio de La Vega, de los documentos para su verificación y aprobación.

Se adjunta informe mensual de avance No. 3 en ciento veintiséis (126) folios.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

Atentamente,

Lorena Gómez

INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

1419

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 01	**FECHA: 18/06/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Socialización Parametros Comunicaciones y varios Desarrollo Contrato
2) Documentación Inicial (Hojas de Vida - Documentación Maquinaria - Programación de Obra - Pólizas Iniciales, etc)
3) Socialización de avance en la solicitud de Vallas Informativas al ICCU por parte de la Supervisión
4) Ejecución Actividades de Obra
5) Socialización de Posible Adición de tramos
6) Proposiciones y Varios

1420

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:05 am del 18 de junio de 2025 inicia el comité virtual de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 161-2025, en presencia del Ing. Alexis Celis, apoyo a la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS

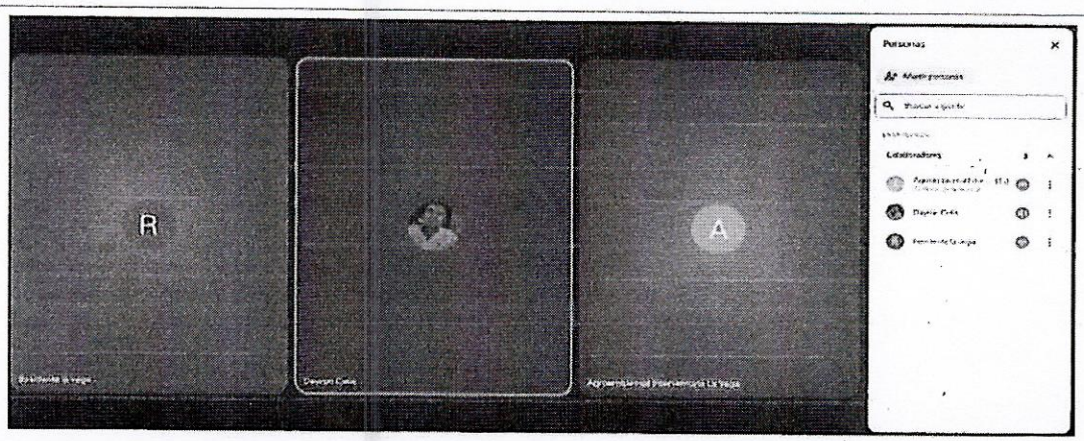

1) **Socialización Parametros Comunicaciones y varios Desarrollo Contrato**

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 154-2025, se establecen los correos oficiales para comunicaciones, solicitudes y demás.

2) **Documentación Inicial (Hojas de Vida - Documentación Maquinaria - Programación de Obra - Pólizas Iniciales, etc)**

El ing. Juan Carlos Pinto informa al Ing. Alexis Celis y a la interventoría que ya fue enviada y radicada la información inicial solicitada por la interventoría por medio del oficio CTO-179-154-001 del 17 de junio de 2025 y que este a su vez fue enviada por medio del oficio CTO-154-001 del 17 de junio de 2025 para que la interventoría haga su revisión y/o aprobación y/o observaciones. A lo que la Ing. Laura Galindo interviene comunicando que vienen trabajando en la revisión de esta información para enviar el aval y/u observaciones de esta información enviada y que el día del presente comité de seguimiento y control se enviará el concepto de la

3.) **Socialización del avance en la solicitud de las vallas informativas**

El ing. Juan Carlos Pinto pregunta al Ing. Alexis Celis sobre el estado de la solicitud hecha por el municipio al ICCU para el diseño de la Valla Informativa de cada uno de los convenios en referencia del presente contrato, a lo que el Ing. Alexis Celis informa que para el contrato C-OBRA No. 154-2025 no se han realizado las solicitudes al ICCU ya que a ninguno de los tramos se les ha hecho conformación de la vía para enviar el registro fotográfico de la vía. A su vez informa que se llevará la maquinaria para esta actividad hasta que el contratista de obra haga el trasiego del acero para que el personal de obra inicie con el corte, figurado y amarre de las parrillas considerando que no se puede hacer la conformación ya que se perdería el trabajo por las constantes lluvias que se vienen presentando en el municipio y cuando se entre a instalar las parrillas de refuerzo y la formaleta para fundir, posiblemente el terreno este afectado y se requiera pasar nuevamente la maquinaria.

3.) **Socialización del avance de actividades**

La Ing. Laura Galindo, solicita al Ing. Juan Carlos Pinto informe sobre los avances en las actividades de obra que se llevan hasta la fecha del presente comité, a lo que el Ing. Juan Carlos informa que se viene trabajando en el trasiego del material de varillas de acero para el Convenio 708-2024 (Vereda Ucrania Sector La Torre) el cual es el primer sector que se va a iniciar a construir y que se espera que la otra semana se inicie con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo para las parrillas de los carriles y cunetas.

4.) **Socialización de posible adición de tramos**

El ing. Alexis Celis menciona que de acuerdo con las solicitudes hechas por la comunidad del sector, es necesario ir evaluando una posible adición al contrato en referencia para ejecutar la construcción de un tramo de vía en la vereda La Huerta Sector La Mina y la vereda Bulucaima Sector Quebrada Honda.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

5.) Revisión de Documentos Iniciales Aportados por Contratista de Obra

El Ing. Alexis Celis comunica que ya fue recibida y revisada la información inicial solicitada por la interventoría así como el aval de la misma, sin embargo, en dicha revisión resalta que dentro de las obligaciones especificas del contrato de obra, solicitan la entrega del PAPSO y protocolos de Bioseguridad, a lo que el Ing. Juan Carlos Pinto responde que esta información ya no tiene validez ya que en la resolución 2624 de 2024 "Por la cual se deroga la resolución 676 de 2020 "Por lo cual se establece el sistema de información para el reporte y seguimiento de las personas afectadas por COVID-19 modificada por la resolución 992 de 2020"

Siendo las 9:44 am del 18 de junio de 2025 se da por finalizada el comité de seguimiento y control No. 01 para el contrato de obra C-OBRA-154-2025

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Próximo Comité de Seguimiento y Control de Obra No. 02	25/06/2025	Interventoría - Supervisión - Contratista de
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

1422

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
El Ing. Alexis Celis menciona que se hace necesario evaluar los tramos anteriormente para adicionar al contrato.

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadaclavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Gallndo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	Laura Gallndo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

1423

AGROAMBIENTAL	**ACTA COMITÉ TÉCNICO**	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 02	**FECHA: 25/06/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1				
2				
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Socialización de Subsanaciones del SG-SST
2) Socialización de avance en la solicitud de Vallas Informativas al ICCU por parte de la Supervisión
3) Ejecución Actividades de Obra
4) Socialización de Posible Adición de tramos
5) Proposiciones y Varios

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:32 a.m inicia el comite de seguimiento y control, No. 02 para el contrato de obra No. 154-2023 en presencia de la Arq. Laura Viviana Ortiz, Secretaria de Planeación e Infraestructura, el Ing. Juan Carlos Pinto, ductor de Obra, la Ing. Laura Galindo, residente de Interventoría.

1.) Socialización de Subsanaciones SG-SST

El Ing. Juan Carlos Pinto expresa que ya se realizó el envío de las subsanaciones a las observaciones hechas por la supervisión del contrato, a lo que, la Ing. Laura Galindo, informa que ya se revisó dicha infaymación y que a su vez, ya se le dió el aval y traslado a la Supervisión, para su revisión y aprobación.

La Arq. Laura Ortiz solicita, al contratista de obra que se aporte una certificación donde se comuniquen las razones por las cuales no se aporta el PAPSO, solicitado dentro de las obligaciones del contrato de obra en referencia.

2.) Solicitud de Vallas Informativas

La Arq. Laura Ortiz informa que no se han realizado las solicitudes correspondientes al ICCU para los convenios referenciados en el presente contrato, considerando que, el ICCU solicita que se envíe un registro fotográfico de la vía toda vez que esta se encuentre conformada. Sin embargo, de acuerdo con lo acordado con referencia a que primero el contratista de obra realizará primero el suministro del acero y que cuando este se tenga avanzado en un 60% se programará la maquinaria para que haga la conformación con la finalidad de no perder el trabajo realizado por posibles lluvias que afecten la base granular compactada y tener volver a conformar con maquinaria.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PE-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. de

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

3.) Ejecución de las actividades de obra.

El Ing. Juan Carlos Pinto informa que ya se viene trabajando en el trasiego del acero para la vereda Ogania, sector La Torre. A su vez, que ya se tiene contratado el personal de obra para iniciar con el corte, figurado y armado de parrillas para el refuerzo de los cunetes, cunetas y viguetas.

De igual forma, para la vereda La Alianza, sector Buenos Aires, una vez se finalice con el trasiego del acero a la vereda anteriormente mencionada se iniciará con el trasiego del acero para este sector, con la finalidad de tener dos frentes de trabajo activos.

1426

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PE-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __




ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Crear una carpeta Drive para subir el registro fotografico de los Convenios del contrato	02/07/25	
2	Realizar el trasiego total del material de acero para el convenio 708 - 2024	04/07/25	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1427

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. de

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma 
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma 
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabildad expresa de los que intervienen.

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÌA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 03	**FECHA: 09/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Crear una carpeta Drive para subir el registro fotografico de los convenios	02/07/2025	02/07/2025	Contratista
2	Realizar trasiego total del material de acero para el convenio 708	04/07/2025	04/07/2025	Contratista
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Ejecución Actividades.

Siendo las 9:37 a.m se inicia el comité de seguimiento No 3 del contrato de obra No 154 de 2025 en presencia de Drg. Laura Ortiz, secretaria de planeación, ing. Juan Carlos pinto director de obra e ing. Laura Giraldo residente interventoría

Ing. Juan Carlos pinto informa que a la fecha, en cuanto al convenio 708 se están ejecutando actividades de corte, figurado y amarrado de hierro

En el convenio 755 no se ha dado inicio de actividades teniendo pendiente el trasiego de materiales y conformación de la vía.

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En cuanto al convenio 644, se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos pinto que se llevará material el día 10 de julio de 2025

2) Valla informativa.

Se informa por parte de supervisión Arq. Laura ortiz que se hace necesario contar con una fotografía de alistamiento del terreno para poder solicitar el modelo de valla ante el ICCU

Ing. Juan Carlos Pinto contratista obra informa que una vez se realicen estas actividades en obra se allegará el registro fotográfico correspondiente.

3) Socialización solicitud adición.

Ing. Juan Carlos pinto director de obra informa que el día de hoy realizará entrega de información a interventoría correspondiente a solicitud de adición de contrato.

Interventoría informa que una vez realice el recibo y revisión de la información se efectuará el proceso pertinente ante la supervisión.

Arq. Laura Ortiz supervisión informa que es necesario se entreguen los documentos con los soportes correspondientes.

4) Proposiciones y varios.

Arq. Laura Ortiz supervisión informa que para el contrato de obra, dentro de los estudios previos se solicitaba los Protocolos de Bioseguridad, sin embargo

1430

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Debido a que la contingencia del COVID ya no aplica a la fecha, se debe efectuar una certificación al respecto de esta implementación o ya no aplicabilidad.

Además, se solicita por parte de la supervisión se incluya un registro fotográfico respecto a la señalización del PAT implementada en obra

1431

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega materiales en sector El Bolé	10/07/2025	Contratista obra.
2	Entrega documentos solicitud adicion	9/07/2025	contratista obra.
3	Entrega certificado no aplicacion Protocolo Bioseguridad	16/07/2025	Contratista obra
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1432

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Arq. Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	Laura Galindo.
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.plavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1433

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 04	**FECHA: 16/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrrega Materiales Sector Bolé	10/07/2025	10/07/2025	Contratista
2	Entrega Documentos Solicitud Adición	09/07/2025	16/07/2025	Contratista
3	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	16/07/2025	N/A	Contratista
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
2) Socialización Ejecución Obra
3) Adición Contrato
4) Proposiciones y Varios
Se da inicio a comité de obra del 16 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y sùpervisión municipal
1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos
Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de los compromisos pactados
Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha tan solo tiene pendiente la entrega del certificado en cuanto al protocolo de bioseguridad
2) Socialización Ejecución Obra
Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera
Convenio 644
Se entregó todo el hierro, se está cortando, amarrando, y figurando
Convenio 708
Se terminó con todo el amarrado del hierro, se está formaleteando
Convenio 755
No se han iniciado actividades por condiciones de logistica a desarrollar

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

3) Adición Contrato

Ing. Juan Carlos Pinto Chaves de contratista de obra informa que a la fecha realizó entrega de los documentos correspondientes
Ing. Laura Galindo de interventoría informa que efectivamente una vez recibida la información en cuanto a la adición, se realizó el aval correspondiente, por lo que a la fecha se encuentra radicado en la entidad contratante, radicado del 16 de julio de 2025
Supervisión Arq. Laura Ortiz Informa que en el entendido del recibo de la información el día de hoy, se realizará la revisión correspondiente

4) Proposiciones y Varios

Se aclara por parte de supervisión que se realizará la revisión de los valores que se incluiran dentro de las vallas informativas para la presentación de este documento y proceder a la instalación de este por parte del contratista de obra

1435

AROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Inicio Fundida en Convenio 644	**21/07/2025**	**Contratista Obra**
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	**16/07/2025**	**Contratista**
3	Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU	**23/07/2025**	**Contratista**
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	**23/07/2025**	**Contratista Interventoría Supervisión**
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1436

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Nombre	Arq Laura Viviana Ortiz	Firma
En representacion de	Séc Planeacion e Infraestructura	
Teléfono		
Correo eléctronico	planeacion@lavega-cundinamarca	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	Aasing SAS.	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 05	**FECHA: 23/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Inicio Fundida en Convenio 644**	**21/07/2025**	**10/07/2025**	**Contratista**
2	**Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad**	**16/07/2025**	**16/07/2025**	**Contratista**
3	**Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU**	**23/07/2025**	**N/A**	**Contratista**
4	**Comité Seguimiento Obra 9:00 AM**	**23/07/2025**		
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 23 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra tiene pendientes algunos documentos, los cuales se ha socializado se entregarán el día de hpy

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que en cuanto al compromiso correspondiente al inicio de fundida del convenio 644, a solicitud de la comunidad se aplazó el inicio de fundida que debia ser el dia 21 de julio de 2025, para el día 23 de julio de 2025, estas actividades empezaron esta mañana antes del comité de obra

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que en cuanto al certificado del protocolo de bioseguridad, este documento se entrega el dia de hoy

En cuanto a la solicitud de las vallas ingeniero Alexis Celis supervisión informa que se está pendiente de la entrega del registro fotográfico correspondiente para el trámite ante el ICCU

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 644

Se inició actividades de fundidas el dia 23 de julio de 2025

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	

Convenio 708

Se informa que se iniciaron actividades de fundida el día 16 de julio de 2025, a la fecha se tienen 75 metros aproximadamente de ejecución

Convenio 755

No se han iniciado actividades por condiciones de logistica a desarrollar

3) Adición Contrato

Ingeniero Alexis Celis de supervisión informa que se realizará la revisión en cuanto a la inclusión de items no previstos y efectuara la consulta correspondiente ante la oficina de contratación para el trámite pertinente

4) Proposiciones y Varios

Se informa por parte de Ing, Alexis Celis supervisión que una vez se entregue el registro fotográfico se efectuará el trámite pertinente ante el ICCU para la instalación de la valla

Se solicita además por parte de supervisión Ing. Alexis Celis de supervisión que se debe realizar seguimiento a diseño de mezcla y la toma de muestras respectivas para los concretos de las placahuellas

1439

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: [illegible]
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01 mar 13
		Pág. [illegible] de [illegible]

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega Registro Fotografico Para Valla ICCU	23/07/2025	Contratista Obra
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	23/07/2025	Contratista
3	Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU	30/07/2025	Supervisión
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	30/07/2025	Contratista Interventoria Supervisión
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1440

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-SEG-01 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-mar-14 Pág. ___ de ___
AGROAMBIENTAL	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	

PARTICIPANTES		
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Darron Alexis Celis Triana Sec. planeación e Infraestructura ingenieria.dactlaveja@gmail.com 3209323230	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Laura Rocio Galindo agroambiental agroambiental.interlaveja@gmail 3223892392	Firma Laura Galindo
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Fredy Alexander Martinez Agroambiental agroambiental.interlaveja@gmail.	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Juan Carlos Pinto. Aasing SAS. aasing.phlaveja25@gmail.com.	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma
Nombre **En representacion de** **Teléfono** **Correo eléctronico**		Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1441

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 06	**FECHA: 30/07/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Entrega Registro Fotográfico Para Valla ICCU	23/07/2025	26/07/2025	Contratista Obra
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	23/07/2025	23/07/2025	Contratista
3	Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU	30/07/2025	30/07/2025	Supervisión
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	30/07/2025	30/07/2025	Contratista Interventoría
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 30 de julio de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha el contratista de obra ha realizado entrega de la información correspondiente de los compromisos pactados

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que en cuanto al compromiso correspondiente a la entrega del protocolo de bioseguridad este se entregó el 23 de julio de 2025

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que en cuanto al certificado del protocolo de bioseguridad, este documento se entrega el día de hoy

En cuanto a la solicitud de las vallas ingeniero Alexis Celis supervisión informa que el día de hoy realizará la solicitud pertinente de las solicitudes de vallas

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

Convenio 644

Se informa que se cuentan con 30 ml completos de ejecución de placahuella

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PT-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Convenio 708

Se informa que se iniciaron actividades de fundida el día 16 de julio de 2025, a la fecha se tienen 150 metros aproximadamente de ejecución

Convenio 755

No se han iniciado actividades por condiciones de logistica a desarrollar

3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis de supervisión que ya se reviso la información en cuanto a la solicitud de adición del contrato de obra No. 154 de 2025, donde se manifiesta lo siguiente:
1) Se debe realizar un ajuste de presentación de la adición a los formatos oficiales de la alcaldía municipal
2) Se debe realizar una revisión y ajuste a las actividades y sectores a contemplar en la adición
3) Se encuentra pendiente revisión presupuestal por parte del municipio para la adición del contrato
4) Se solicitan los APU´s de los items no previstos presentados

4) Proposiciones y Varios

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se vinculen las actas de comité de seguimiento y control al drive que se tiene de consulta por parte de contratista de obra e interventoría

Se informa por parte de ing. Alexis Celis Supervisión que se recibio el documento correspondiente a la no aplicación del protocolo de bioseguridad, sin embargo aclara que este documento debe ser entregado en fisico, revisado y avalado por parte de la interventoría, este documento en fisico para que repose en el expediente del contrato

Se solicita por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que se programe una visita de seguimiento a los sectores para seguimiento correspondiente, el día martes 05 de agosto de 2025, donde se realizará además una verificación de manejo de aguas para el convenio 644

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Seguimiento Convenios	05/08/2025	Contratista Interventoria Supervisión

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	Interventoría
3	Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU	30/07/2025	Supervisión
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	06/08/2025	Contratista Interventoría Supervisión
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Plancación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadaciltavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambientalinterventoria@gmail.com	

1444

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Teléfono	3223892392	
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Fredy Alexander Martinez Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS agroambiental.interventoria@gmail.com	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**	Juan Carlos Pinto AASING SAS - Contratista de Obra aasing.plabvega25@gmail.com	Firma
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma
Nombre **En representacion de** **Teléfono**		Firma
Correo eléctronico		
Nombre **En representacion de** **Correo eléctronico** **Teléfono**		Firma

1445

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 07	**FECHA: 06/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	**Visita Seguimiento Convenios**	**05/08/2025**	**NO SE REALIZÓ**	**Contratista Obra Supervisión Interventoría**
2	**Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad**	**06/08/2025**	**N/A**	**Interventoría**
3	**Solicitud Vallas que cuenten con registro Fotográfico ante el ICCU**	**30/07/2025**	**30/07/2025**	**Supervisión**
4	**Comité Seguimiento Obra 9:00 AM**	**06/08/2025**	**30/07/2025**	**Contratista Interventoría**
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 06 de agosto de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha se cuenta con las siguientes acciones en cuanto a los compromisos pactados

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis Supervisión que por motivos ajenos a la supervisión se hace necesario realizar las visitas de convenios pactadas para el 05 de agosto de 2025, el día 09 de agosto de 2025

En cuanto a la entrega en fisico del aval correspondiente de la no aplicabilidad del protocolo de bioseguridad, se informa por parte de Ing. Laura Galindo interventoría que se realizará entrega del día de hoy 06 de agosto de 2025

En cuanto a la solicitud de las vallas ingeniero Alexis Celis supervisión informa que el dia 30 de julio de 2025 se realizó la solicitud pertinente de las solicitudes de vallas en cuanto al convenio 644 y convenio 708

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera:

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Convenio 644

Se informa que se cuentan con 60 ml completos, además de 30 ml sin cunetas de ejecución de placahuella, se espera que de aquí al 09 de agosto de 2025, contar con la totalidad de las cantidades contractuales para ejecución, por lo cual se puede realizar visita para revisión de estas actividades
Ingeniero Alexis Celis supervisión informa que en el transcurso de la semana del 11 al 16 de agosto de 2025 se puede realizar la visita correspondiente

Convenio 708

Respecto al avance del comité realizado la semana anterior a la fecha se tienen 21 metros, de los cuales falta ejecución de cunetas en esta zona

Convenio 755

No se han iniciado actividades por condiciones de logistica a desarrollar

3) Adición Contrato

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que el día viernes 01 de agosto de 2025 se realizó entrega del documento correspondiente de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión
A la fecha se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se encuentra en revisión, sin embargo de manera inicial se observa que es necesario que las adiciones se discriminen individualmente las cantidades de los tramos contemplados en la adición
Se informa por parte de contratista de obra Juan Carlos Pinto que se estará realizando el ejercicio solicitado, sin embargo en necesidad de trabajar un solo compilado de observaciones se solicita se realicen completas para la entrega general del documento


4) Proposiciones y Varios

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que es necesario contar con la visita a sitio para poder realizar revisión con supervisión respecto al manejo de aguas que debe efectuarse en la zona del convenio 644, debido a las condiciones de manejo de escorrentía.

Se informa por parte de ing. Alexis Celis Supervisión que respecto al manejo de aguas debido a las condiciones de vía, estas irán descargando sobre la vía principal

VALLA INFORMATIVAS

En cuanto a las vallas el ingeniero Alexis Celis informa que del convenio 644 y 708 ya se realizó la solicitud al ICCU, sin embargo no han dado respuesta para entrega al contratista de obra, además como del 755 no se ha podido intervenir la via, no hay registro fotográfico para poder solicitar la valla

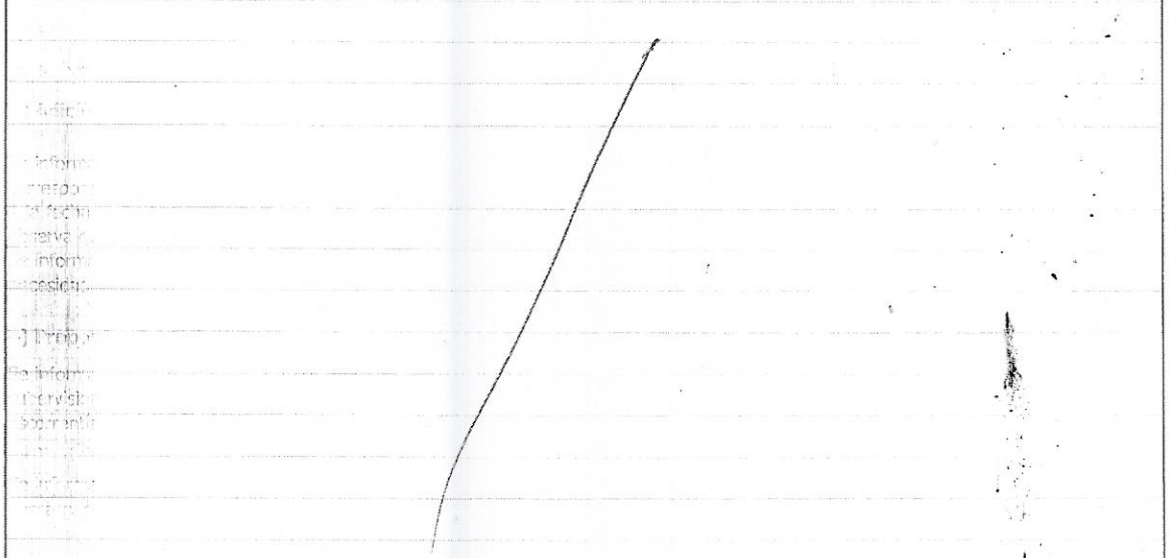

1447

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Seguimiento Convenios	**09/08/2025**	**Contratista Interventoría Supervisión**
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	**06/08/2025**	**Interventoría**
3	Subir información a Drive en cuanto a Actas Comité	**08/08/2025**	**Interventoría**
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	**13/08/2025**	**Contratista Interventoría Supervisión**
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1448

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 08	**FECHA: 13/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Seguimiento Convenios	09/08/2025	09/08/2025	Contratista Interventoría Supervisión
2	Entrega Certificado No aplicación Protocolo Bioseguridad	06/08/2025	11/08/2025	Interventoría
3	Subir información a Drive en cuanto a Actas Comité	08/08/2025	Aplazado	Interventoría
4	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	13/08/2025	13/08/2025	Contratista Interventoría
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

2) Socialización Ejecución Obra

3) Adición Contrato

4) Proposiciones y Varios

Se da inicio a comité de obra del 13 de agosto de 2025 en compañía de interventoría, contratista de obra y supervisión municipal

1) Lectura Acta Anterior y Verificación Compromisos

Se informa por parte de interventoría Ing. Laura Galindo que a la fecha se cuenta con las siguientes acciones en cuanto a los compromisos pactados

Se realizaron visitas el día 09 de agosto de 2025

En cuanto al protocolo de bioseguridad la interventoría radico de manera física el día 11 de agosto de 2025

En cuanto a subir las actas de comité la interventoría informa que estas actas se subirán al drive el día de hoy 13 de agosto de 2025

2) Socialización Ejecución Obra

Se informa por parte de ing. Juan Carlos Pinto de obra que a la fecha se tienen en ejecución de la siguiente manera

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F01
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Convenio 644

A la fecha se tienen 90 ml completos y 30 ml de solo centro y sobreancho, se espera esta terminar las actividades correspondientes a este tramo en ejecución

Convenio 708

A la fecha se tienen adicionales a la semana anterior 21 ml de solo centros y carriles, se está esperando terminar el día sabado las actividades de obra

Convenio 755

No se han iniciado actividades por condiciones de logistica a desarrollar

3) Adición Contrato

Se informa por parte de Ing. Alexis Celis supervisión que se emitieron observaciones el día viernes 08 de agosto de 2025
Se informa por parte de contratista de obra Juan Carlos Pinto que se está en proceso de revisión de la información y subsanación correspondiente de las observaciones realizadas

4) Proposiciones y Varios

Se informa por parte de Ing. Juan Carlos Pinto de obra que es necesario contar con la visita a sitio para poder realizar revisión con supervisión para el convenio 708,

Se informa por parte de ing. Alexis Celis Supervisión que esta visita se podrá realizar el día viernes 15 de agosto de 2025

VALLA INFORMATIVAS

En cuanto a las vallas el ingeniero Alexis Celis informa que del convenio 644 ya se recibió la valla por parte del ICCU por lo que se realiza envío de esta valla durante el comité para el proceso correspondiente, se tiene pendiente respuesta de 708

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita Seguimiento Convenios 708	13/08/2025	Contratista Interventoría Supervisión
2	Comité Seguimiento Obra 9:00 AM	20/08/2025	Contratista Interventoría Supervisión
3	Subir información a Drive en cuanto a Actas Comité	13/08/2025	Interventoría
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1452

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-[illegible]-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono	3202532390	
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 09	**FECHA: 20/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Visita de seguimiento Convenio ICCU 708-2024	13/08/2025	13/08/2025	
2	Comité de seguimiento	20/08/2025	20/08/2025	
3	Subir informacion a Drive en cuento a actas de comité	13/08/2025	13/08/2025	
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Siendo las 9:57 am del 20 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 154-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de Interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.
1. Lectura del acta anterior
Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 154-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion actas de comite en drive, visita el convenio 708-2024 y siguiente comite de control.
2. Desarrollo de actividades constructivas
Convenio 708-2024
Se realizo la visita de obra entre las partes donde se evidencio que el frente ya se culmino las actividades constructivas en relacion a los recusos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025
En relacion a la valla informativa ya se remitio la informacion solicitada por parte de ICCU, para lo cual se esta a la espera del respectivo modelo.
Convenio 644-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 82%
En relacion a la valla informativa ya se cuenta con el modelo y este esta en fabricacion para su instalacion.
Convenio 755-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se completo el suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, de lo cual ya se encuentran armadas las parrillas para su respectiva instalacion.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 10%
En relacion a la valla informativa se esta a la espera de que el contratista realice las actividades de conformacion para obtener el registro fotografico y de esta manera contar con la informacion para enviar al ICCU y realizar la solicitud del modelo de la valla
Vereda La Huerta Sector La Mina
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecuion de las actividades en el frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina ya se inicio las actividades de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.
- La interventoria informa que con base a la ejeculon de las actividaes constructivas de las obras en Vereda La Huerta Sector La Mina se tiene un avance del 31%
3. Acta parcial No,1

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No,1 el dia hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.

- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.

1456

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
ROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	**27/08/2025**	**Todas las partes**
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	**Semanal**	**Contratista de Obra e interventoría**
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabildad expresa de los que intervienen.

1458

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 10	**FECHA: 27/08/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Subir informacion a Drive RF y actas de comité	Semanal	27/08/2025	
2	Comité de seguimiento	27/08/2025	20/08/2025	
3				
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Siendo las 10:00 am del 27 de agosto de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 154-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.
1. Lectura del acta anterior
Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 154-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion actas de comite y registros fotograficos en drive y siguiente comite de control.
2. Desarrollo de actividades constructivas
Convenio 708-2024
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1
En relacion a la valla informativa se recibe el dia de hoy el modelo de la valla informativa, para lo cual el contratista se comprometa a realizar los tramites correspondientes para su instalacion.
Convenio 644-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se finalizo con la ejecucion de las actividades en el convenio tales como suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 100%
En relacion a la valla informativa ya se cuenta con el modelo y esta en fabricacion para su instalacion.
Convenio 755-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se completo el suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, de lo cual ya se encuentran armadas las parrillas para su respectiva instalacion y se estan realizando las gestiones para iniciar con las actividades de conformacion de calzada e instalacion de subbase granular y de esta forma iniciar con la instalacion de la formaleta y fundicion de concretos.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 26%
En relacion a la valla informativa se esta a la espera de que el contratista realice las actividades de conformacion para obtener el registro fotografico y de esta manera contar con la informacion para enviar al ICCU y realizar la solicitud del modelo de la valla

1460

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	**27/08/2025**	**Todas las partes**
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	**Semanal**	**Contratista de Obra e interventoría**
3	Instalacion de valla informativa convenio 708-2024	**5/09/2025**	**Contratista**
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

Vereda La Huerta Sector La Mina

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecuion de las actividades en el frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina ya se inicio las actividades de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias, conformacion de calzada, localizacion y replanteo, instalacion de subbase granular y el transporte de los materiales provenientes de las excavaciones.

- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda La Huerta Sector La Mina se tiene un avance del 91%


3. Acta parcial No,1

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que conforme a los avances de obra realizara la presentacion del acta parcial No,1 el dia hoy a la interventoria con base a las cantidades ya verificadas en campo por las dos partes.

- La interventoria señala que en caso de que la documentacion se encuentre completa conforme a lo ya solicitado se realizara tramite a la supervision del proyecto.

1462

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma 
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma 
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma 
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1463

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO FI-IN-F04
AGROAMBIENTAL		VERSION 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. ___ de ___

Marque con una (x) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORIA [x] **OBRA** [ ]

ACTA No. 11	**FECHA: 03/09/2025**
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	**CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.**
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Subir informacion a Drive RF y actas de comité	Semanal	3/09/2025	Contratista e interventoria
2	Comité de seguimiento	3/09/2025	3/09/2025	Todas las partes
3	Instalacion valla informativa convenio 708-2024	5/09/2025	Pendiente	Contratista
4				
5				

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

1464

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: FT-IN-[illegible]
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Siendo las 9:43 am del 03 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 154-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocio Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Celis como apoyo a la supervision de los contratos.
1. Lectura del acta anterior
Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 154-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion actas de comite y registros fotograficos en drive y siguiente comite de control., la instalacion de la valla informativa del convenio iccu 708-2025 aun no aplica fecha de cumplimiento.
2. Desarrollo de actividades constructivas
Convenio 708-2024
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante
En relacion a la valla informativael contratista se encuentra en los tramites correspondientes para su instalacion.
Convenio 644-2024
Ya se culminaron las actividades constructivas establecidas en el modificatorio No,1, para lo cual esta ejecucion ya fue reconocida en el acta parcial No,1 presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante
En relacion a la valla informativa el contratista indica que el dia de hoy 03 de septiembre de 2025 realizara su respectiva instalacion.
Convenio 755-2024
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se realizo la ejecucion de las actividades de conformacion de calzada e instalacion de subbase granular y localizacion y replanteo, durante el desarrollo de esta semana inician las actividades de instalacion de formaleta para continuar con la fundicion de concretos.
- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 42%
Teniendo en cuenta que ya se tiene el registro fotografico de maquinaria en el frente, ya que el contratista ejecuto las actividades de conformacion de la via e instalacion de subbase la supervision realizara la solicitud del modelo de la valla informativa al ICCU.
Vereda La Huerta Sector La Mina
- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que se continua con la ejecucion de las actividades en el frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina ya se inicio las actividades de suministro e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi, fundicion de cunetas, fundicion de ciclopeos 2000 psi, fundicion de huellas en concreto 3000 psi, excavaciones varias.
- La interventoria informa que con base a la ejecuion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda La Huerta Sector La Mina se tiene un avance del 96%

1465

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. ___ de ___

3. Acta parcial No.1
- Se informa por parte de la interventoria que una vez se recibio la cuenta de cobro No,1 presentada por el contratista de obra esta contaba con la informacion solicitada y las cantidades correspondian a las ejecutadas en campo, para lo cual se dio el respectivo aval y tramite al Municipio.
- La supervision del proyecto indica que una vez recibida la cuenta, revisada y aprobada se procedio con el respectivo tramite de pago, quedando el reporte y trazabilidad en el expediente del contrato.

1466

ROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO: PI-IH-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	17/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	Semanal	Contratista de Obra e interventoría
3	Instalacion de valla informativa convenio 708-2024	5/09/2025	Contratista
4	Realizar visita frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina	6/09/2025	Contratista de Obra, interventoría y supervision
5	Instalacion de valla informativa convenio 644-2024	3/09/2025	Contratista
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1467

AGROAMBIENTAL	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO PI-PI-F04
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	ingenieriadactlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	aasing.phlavega25@gmail.com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

1468

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO: PI-IN-FM
AGROAMBIENTAL		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. __ de __

Marque con una (X) dependiendo del tipo de contrato

INTERVENTORÍA [X] OBRA [ ]

ACTA No. 11	FECHA: 03/09/2025
CONTRATO No.: C-INTERV-179-2025	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA LOS CONTRATOS DE OBRAPUBLICA DE MEJORAMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	
CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA	CONTRATISTA: AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATO OBRA No. C-OBRA-154-2025	
MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE L... ...GA CUNDINAMARCA	
LUGAR: LA VEGA, CUNDINAMARCA	

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior

ITEM	COMPROMISO	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE COMPROMISO	FECHA DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Subir informacion a Drive RF y actas de comité	Semanal	3/09/2025	Contratista e interventoria
2	Comité de seguimiento	17/09/2025	10/09/2025	Todas las partes
3	Instalacion valla informativa convenio 708-2024	5/09/2025	Pendienté	Contratista
4	Realizar visita frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina	6/09/2025	Pendiente	Todas las partes
5	Instalacion de valla informativa convenio 644-2024	3/09/2025		Contratista

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura acta anterior y verificacion compromisos
2. Seguimiento ejecucion de frentes

1469

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-FR4
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pág. __ de __

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo las 9:40 am del 10 de septiembre de 2025 inicia el comité de seguimiento y control de obra para el contrato de obra No. 154-2025, en presencia de la supervisión del municipio de La Vega, Juan Carlos Pinto, en su calidad de director de obra de AASING SAS, La Ing. Laura Rocío Galindo, en su calidad de residente de interventoría de Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing. Fredy Martinez como auxiliar de interventoría de Agroamblental Interventoría y Obras Civiles SAS y el Ing Dayron Alexis Cells como apoyo a la supervision de los contratos.

1. Lectura del acta anterior

Dando inicio al comité de seguimiento y control para el contrato de obra C-OBRA No. 154-2025, se informa por parte de Ing, Laura Galindo de interventoría que en relacion a los temas tratados en el comité anterior y en relacion a los compromisos pactados estos de cumplieron los cuales son: actualizacion actas de comite y registros fotograficos en drive y siguiente comite de control., la instalacion de la valla informativa del convenio iccu 708-2025, visita frente de adicion La Mina, se reprograma por temas de agenda.

2. Desarrollo de actividades constructivas

Convenio 708-2024

En relacion a la valla informativael contratista el contratista señala que ya tiene la valla informativa y esta semana realizara su instalacion.

Convenio 644-2024

En relacion a la valla informativa el contratista indica que se realizo la instalacion de la valla informativa para lo cual el Rf fue cargado al Drive

Convenio 755-2024

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que esta semana inician las actividades de instalacion de formaleta para continuar con la fundicion de concretos.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas se tiene un avance en relacion a los recursos del convenio y los recursos de adicion aprobados mediante el modificatorio No,1 suscrito el 16 de agosto de 2025 del 42%

Teniendo en cuenta que ya se tiene el registro fotografico de maquinaria en el frente, ya que el contratista ejecuto las actividades de conformacion de la via e instalacion de subbase la supervision realizo la solicitud del modelo de la valla informativa al ICCU.

Vereda La Huerta Sector La Mina

- Se informa por parte de contratista de obra Ing. Juan Carlos Pinto que el dia 6 de septiembre de 2025 se finalizaron las actividades para lo cual se programara visita conjunta entre contratista, supervision e interventoria para la verificacion de cantidades.

- La interventoria informa que con base a la ejecucion de las actividaes constructivas de las obras en Vereda La Huerta Sector La Mina se tiene un avance del 100%

3. Acta parcial No.1

- Se informa por parte de la interventoria que una vez se recibio la cuenta de cobro No,1 presentada por el contratista de obra esta contaba con la informacion solicitada y las cantidades correspondian a las ejecutadas en campo, para lo cual se dio el respectivo aval y tramite al Municipio.

- La supervision del proyecto indica que una vez recibida la cuenta, revisada y aprobada se procedio con el respectivo tramite de pago, quedando el reporte y trazabilidad en el expediente del contrato.

1470

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CODIGO: PI-IN-FO
		VERSIÓN:
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01/mar/2024
		Pág. __ de __

ITEM	COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA	FECHA DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
1	Comité de seguimiento y control	17/09/2025	Todas las partes
2	Actualizar carpetas del Drive con Registros fotograficos y actas de comité	Semanal	Contratista de Obra e Interventoría
3	Realizar visita frente de adicion Vereda La Huerta Sector La Mina	15/09/2025	Contratista de Obra, interventoría y supervision
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

ANEXOS

1471

	ACTA COMITÉ TÉCNICO	CÓDIGO: PI-IN-504
		VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	VIGENCIA: 01-mar-14
		Pag. __ de __

PARTICIPANTES		
Nombre	Ing Dayron Alexis Celis Triana	Firma
En representacion de	Secretaria de Planeación e Infraestructura - La Vega	
Correo eléctronico	[illegible]@[illegible].com	
Teléfono		
Nombre	Laura Rocio Galindo Castro	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	Laura Galindo
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono	3223892392	
Nombre	Fredy Alexander Martinez	Firma
En representacion de	Agroambiental Interventoria y Obras Civiles SAS	
Correo eléctronico	agroambiental.interlavega@gmail.com	
Teléfono		
Nombre	Juan Carlos Pinto	Firma
En representacion de	AASING SAS - Contratista de Obra	
Correo eléctronico	[illegible].obralavega2[illegible].com	
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Teléfono		
Correo eléctronico		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		
Nombre		Firma
En representacion de		
Correo eléctronico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se infrma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Consecutivo	Versión	Fecha

1472

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

PLANO RECORD
VIA QUE COMUNICA LA
VEREDA BULUCAIMA CON LA
VEREDA SAN ANTONIO SECTOR
BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU
644 - 2024
CONTRATO DE OBRA 154-2025

Localizacion:

VEREDA SAN ANTONIO
SECTOR BOLE

1462
1460
1458
1456
1454



1473

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

PLANO RECORD

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 CONTRATO DE OBRA 154-2025

Localizacion:

VEREDA UCRANIA
SECTOR LA TORRE

INDUSTRIAS Beba Ref: 809910 COLOMBIA
PBX. 3691223 www.beba.com.co
21 10720 N

1474

2 110 275 N

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1


ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

PLANO RECORD MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES CONTRATO DE OBRA 154-2025

Localizacion:

VEREDA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES

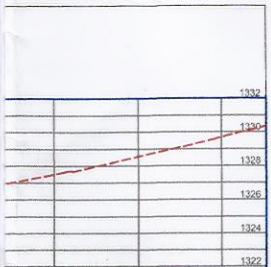

1475

MUNICIPIO DE LA VEGA

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VEGA CUNDINAMARCA

Producto

PLANO RECORD
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA

CONTRATO DE OBRA 154-2025

Localizacion:

VEREDA LA HUERTA
SECTOR LA MINA

INFORME DE SUPERVISION N°2
FECHA INFORME: 16-10-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA C-OBRA-No. 154-2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 28-08-2025 A 25-09-2025

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION:	C.C. N° 1.019.044.913 de Bogotá D.C.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 - 2024; MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGUN CONVENIO ICCU 755 - 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
VALOR: M/CTE.	CUATROCIENTOS DOS MILLONES SEIS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 402.006.307,02) M/CTE.
DURACION:	EL TERMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE OCTUBRE DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 200.866.496,00) M/CTE
FECHA DE LA ADICION:	16 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 602.872.803,02) M/CTE

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al pago No. 2 **del CONTRATO DE OBRA No. 154-2025, de fecha: 11/03/2025** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El avance financiero y el avance de obra en la ejecución del contrato es del 100 %,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dentro de las actividades desarrolladas en el presente contrato se encuentran actividades de:

- Conformación de la Calzada Existente
- Localización y Replanteo con Elementos de Precisión
- Demolición de Concreto Estructural (Incluye Cargue y Retiro de Sobrantes a una Distancia Máxima de 5 Km)
- Transporte de Material Provenientes de Explanación, Prestamos, Sobre Acarreos, Derrumbes, Excavación y/o Demolición
- Subbase Granular
- Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Concreto clase D, f´c = 3000 PSI (bases)
- Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases
- Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar
- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI

Dichas cantidades se encuentran expresadas en la memoria de cantidades entregadas anexa a este informe, las cuales fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.







REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS

Como soporte al registro fotográfico de actividades desarrollas del presente informe se anexa el informe de obra y registro fotográfico presentado por parte del contratista.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644-2024

135.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 4.5 mts, distribuidos en tres tramos permitiendo el empalme con las placas huellas existentes en el sector, para un total de 135.15 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.


PLACA HUELLA CONSTRUIDA

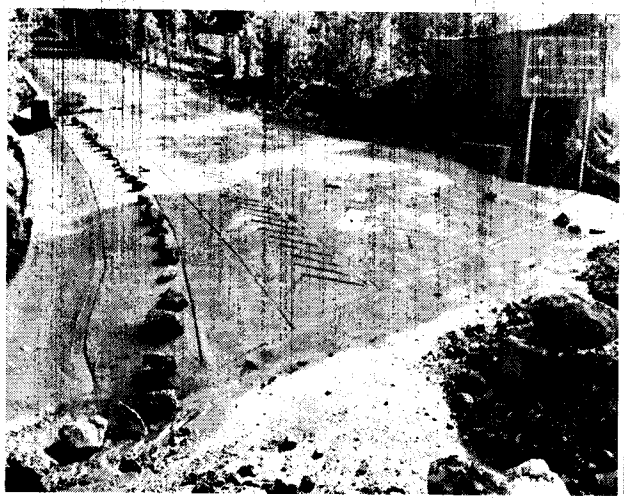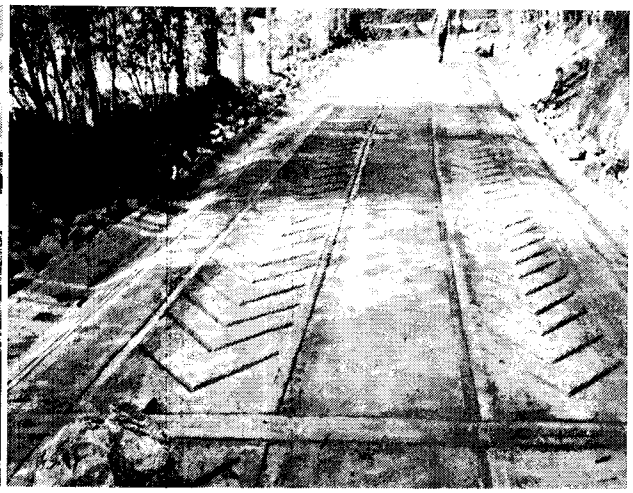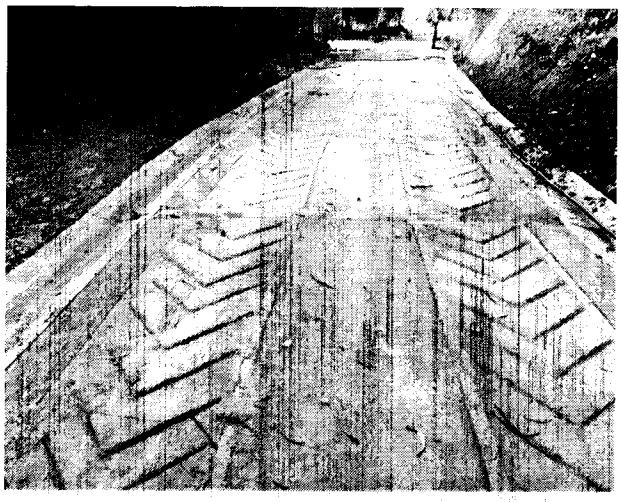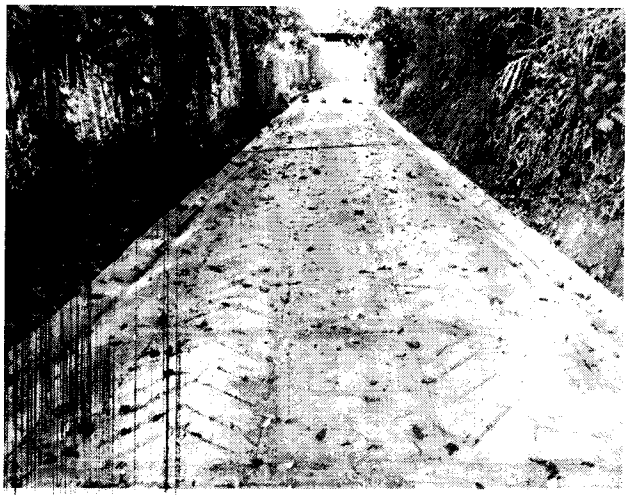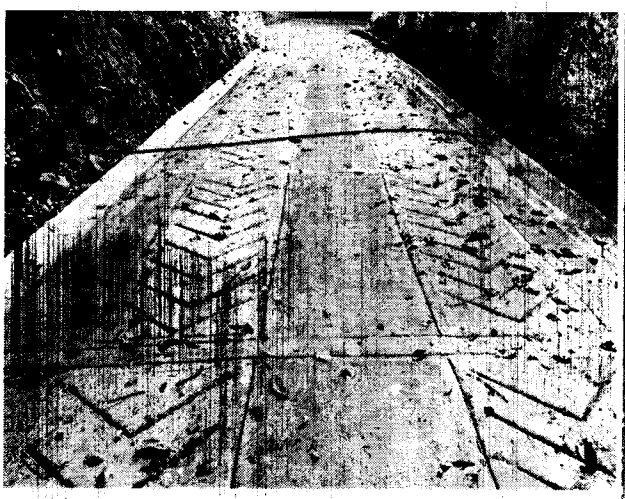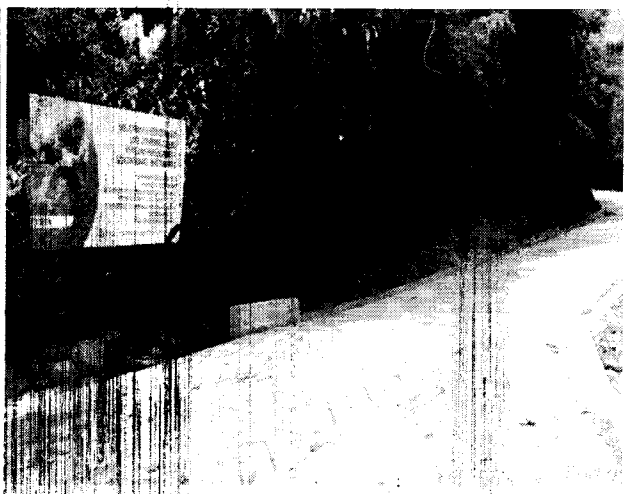







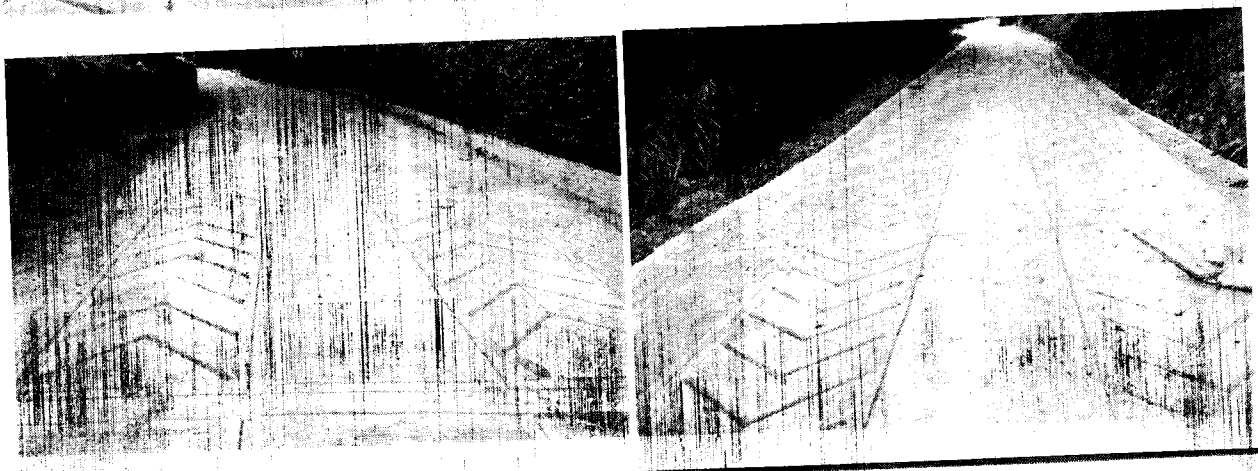
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGÚN CONVENIO 708-2021

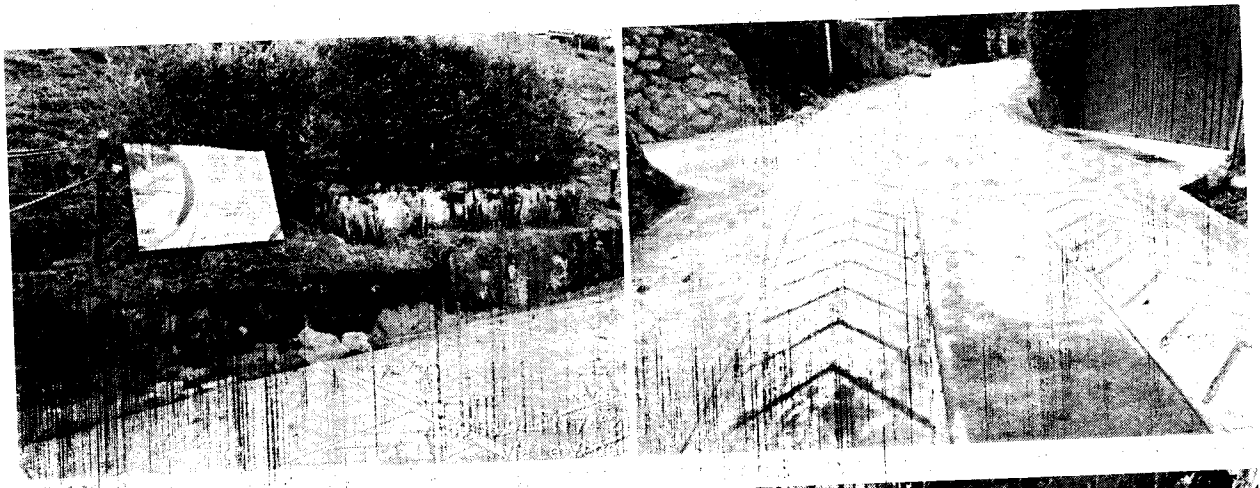165.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, permitiendo el empalme con las placas huellas existentes en el sector, para un total de 165.15 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.

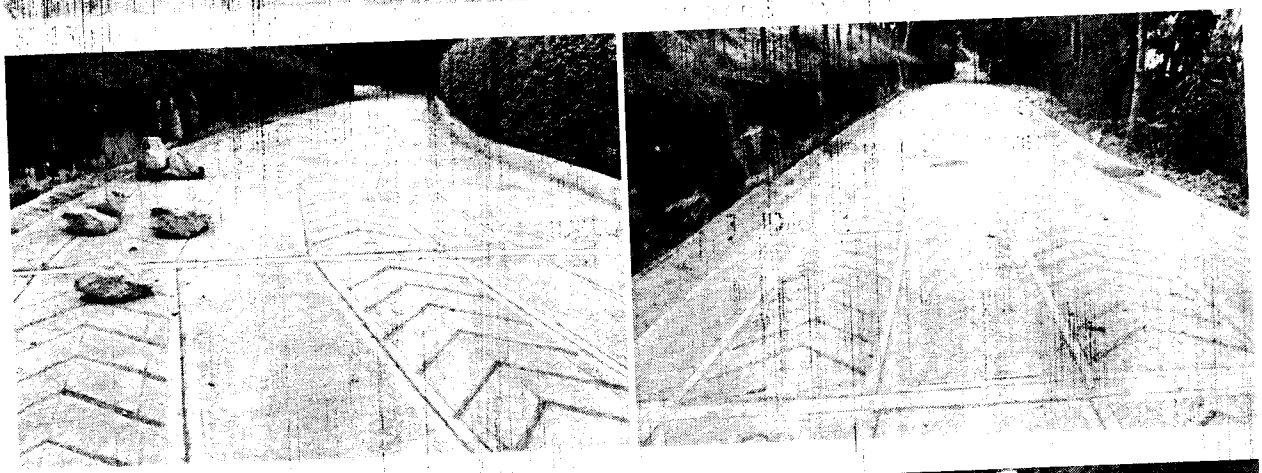PLACA HUELLA CONSTRUIDA









MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SEGÚN CONVENIO ICCU 755-2024

102.15 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 4.5 mts, permitiendo el empalme con placa huellas existentes y una rampa de salida de 1.5 mts para empalme con la vía existente, teniendo como resultado 103.65 ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.


CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

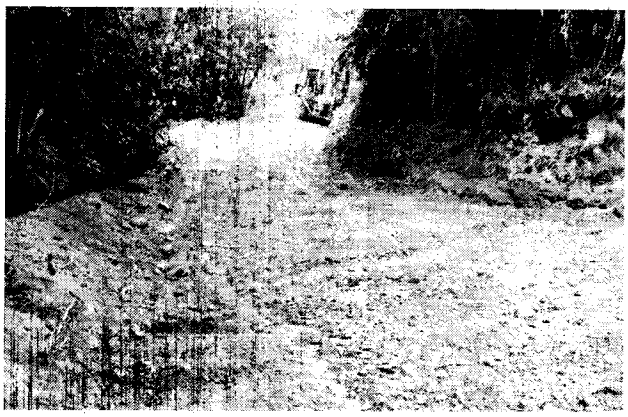LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

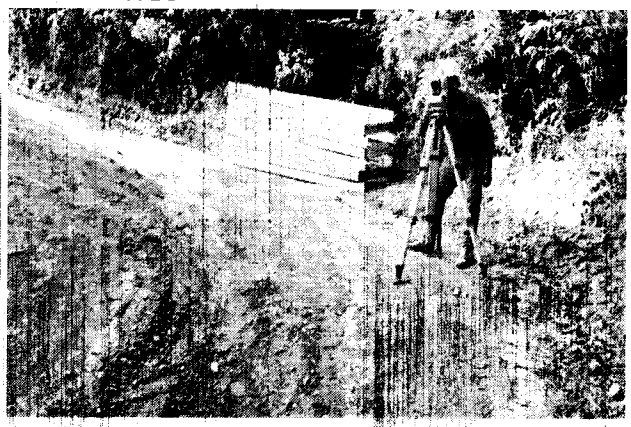



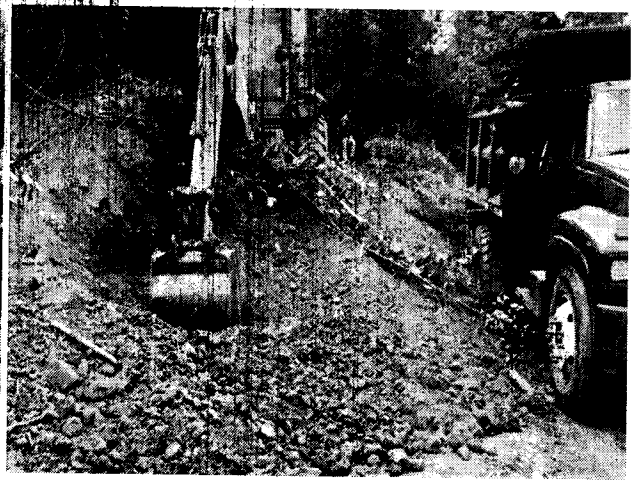
DEMOLICIÒN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM)

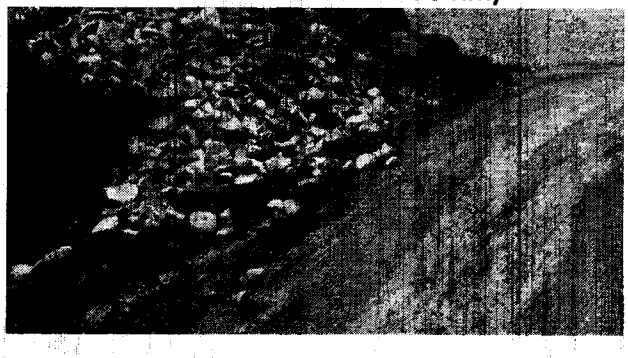


1481


TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÓN, PRESTAMOS, SOBRE ACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN

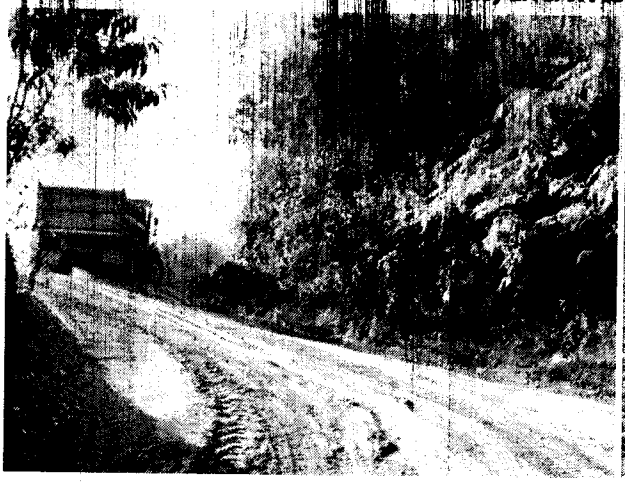





SUBBASE GRANULAR

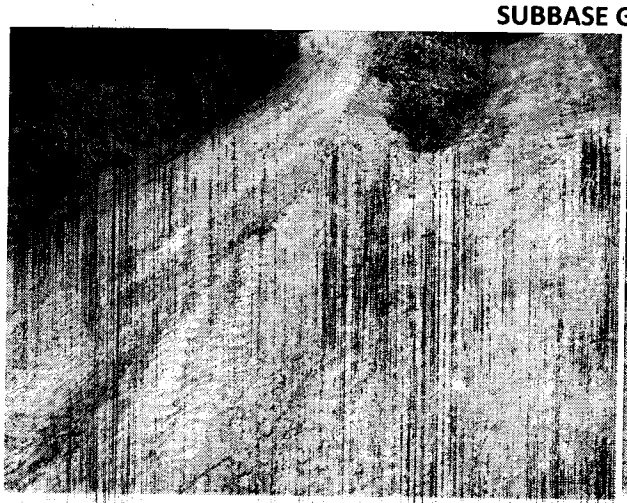

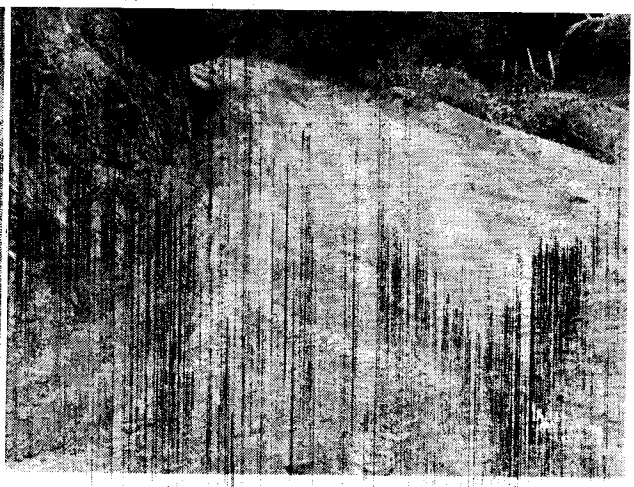


EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

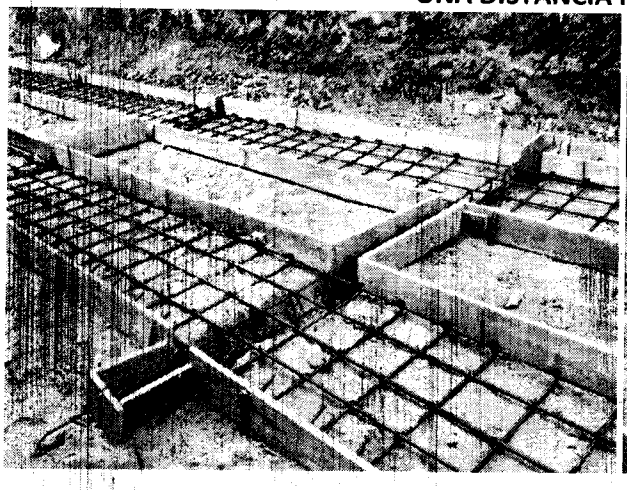

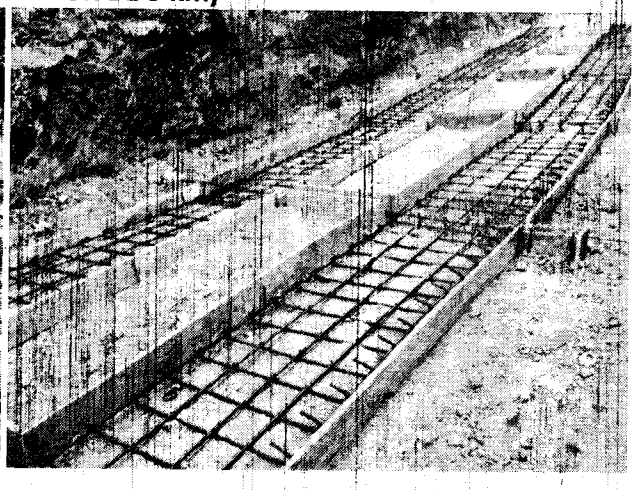


1482


CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA BASES

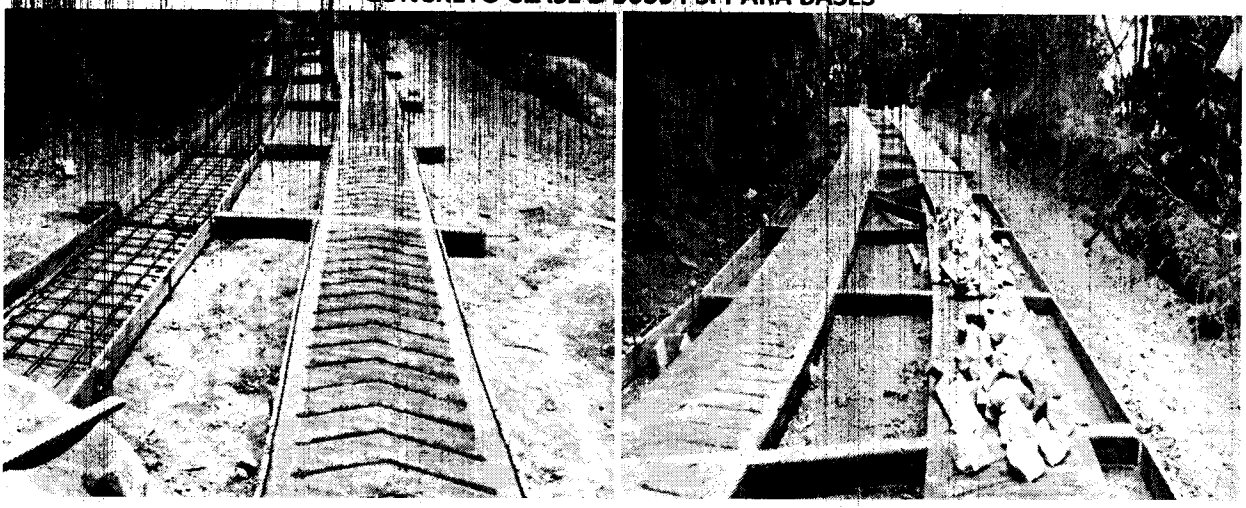

CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES

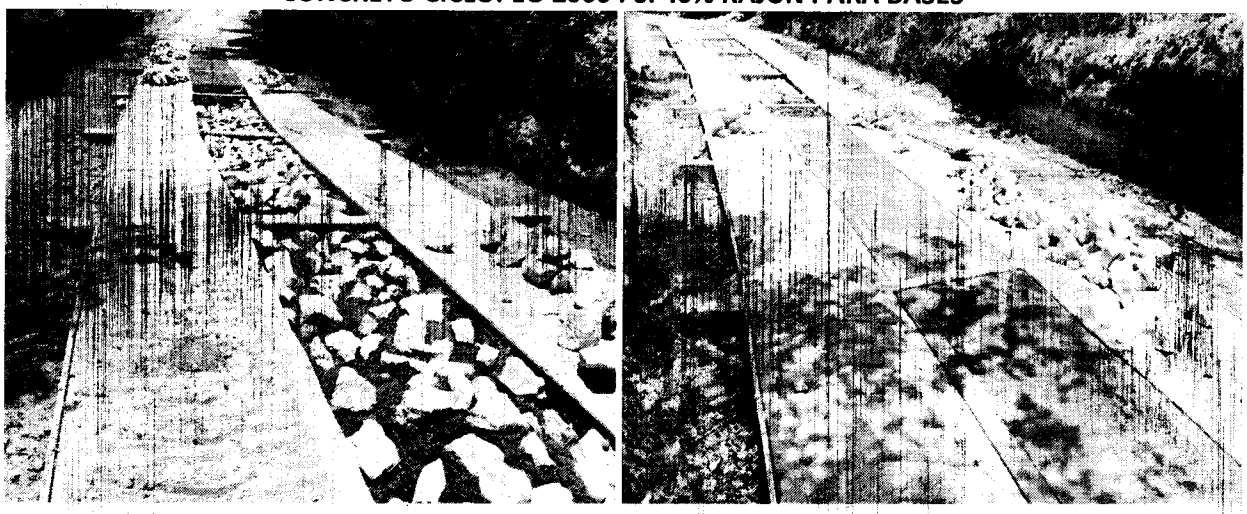




CUNETA EN CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN LUGAR

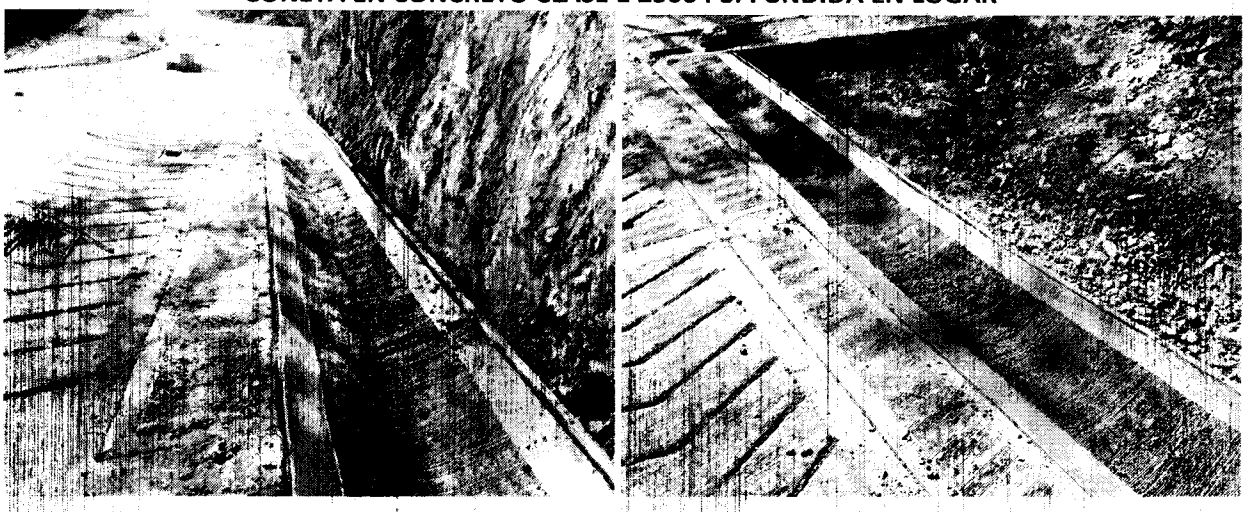

1483

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

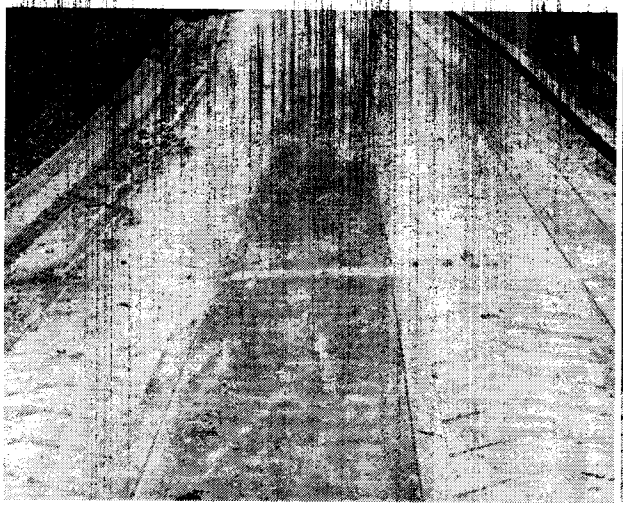

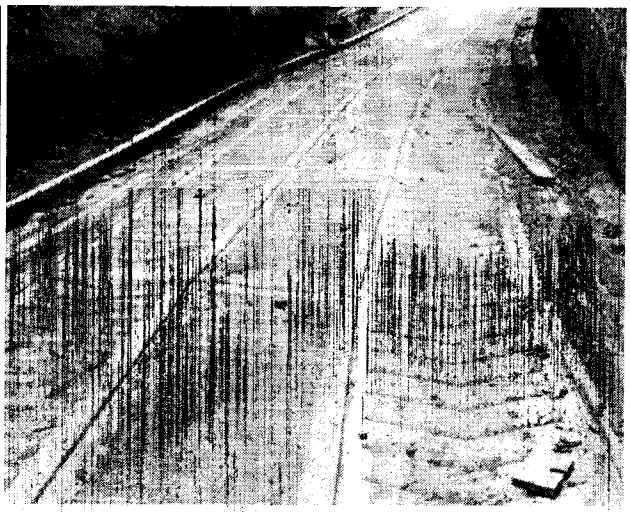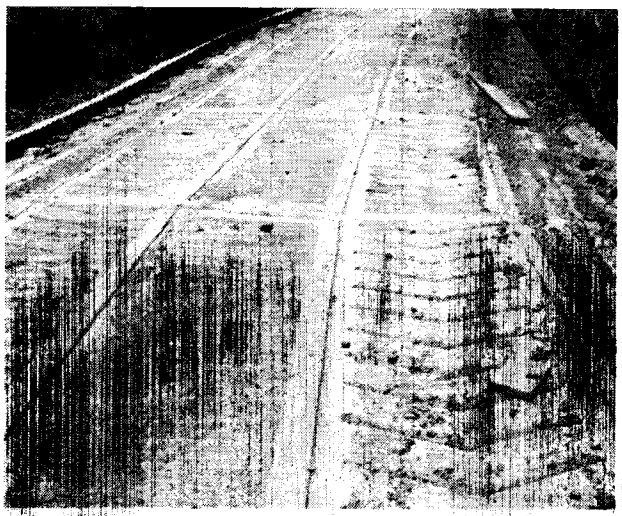

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA HUERTA SECTOR LA MINA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

96.30 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, con tres rampas de acceso, para un total de 100.80ml de vía mejorada, según el alcance del objeto contractual en el sector, la construcción de la placa huella en mención cumple con las características y especificaciones técnicas exigidas tanto en el convenio como en el contrato, las actividades desarrolladas fueron revisadas, recibidas y avaladas por parte de la interventoría.



TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE EXPLANACIÒN, PRESTAMOS, COBREACARREOS, DERRUMBES, EXCAVACIÒN Y/O DEMOLICIÒN




EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

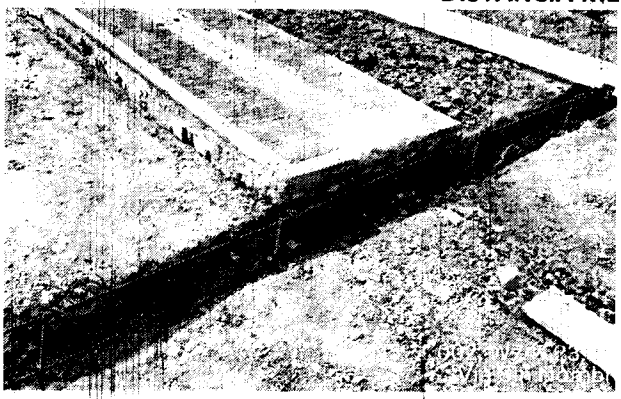



CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

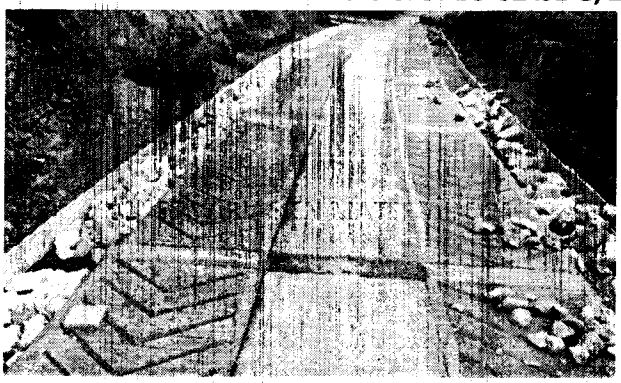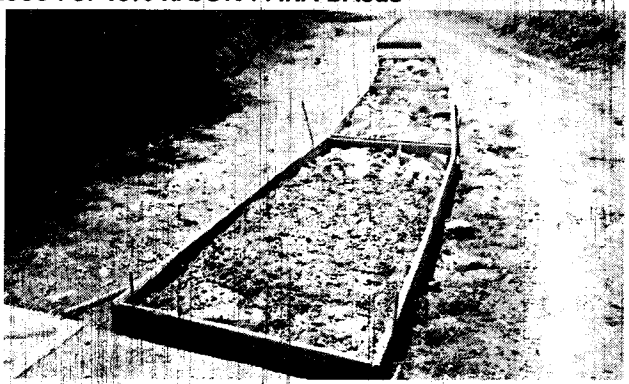



1485

CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

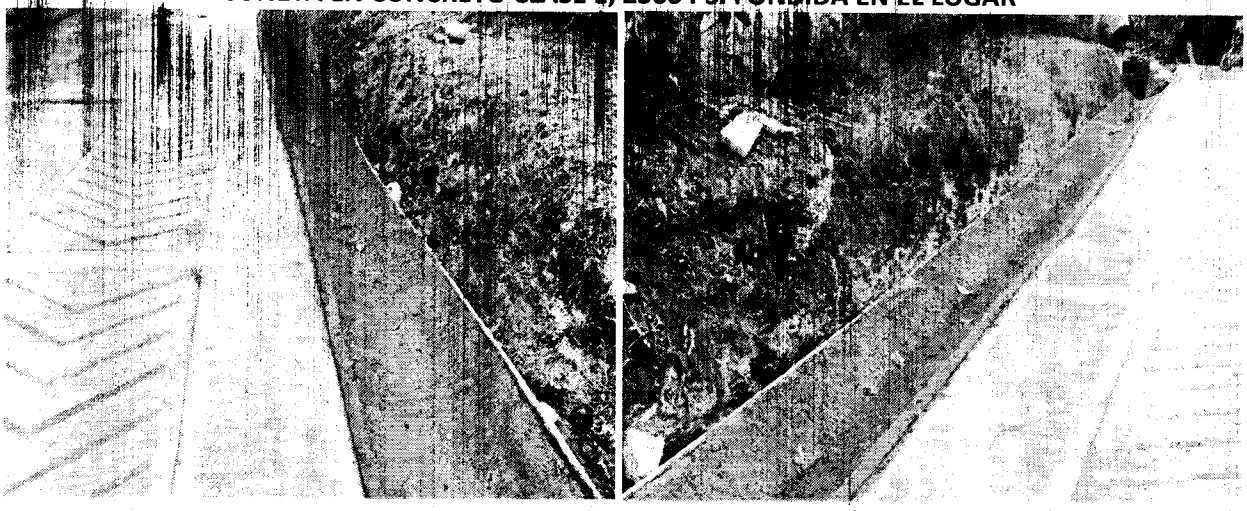

PLACA HUELLA CONSTRUIDA

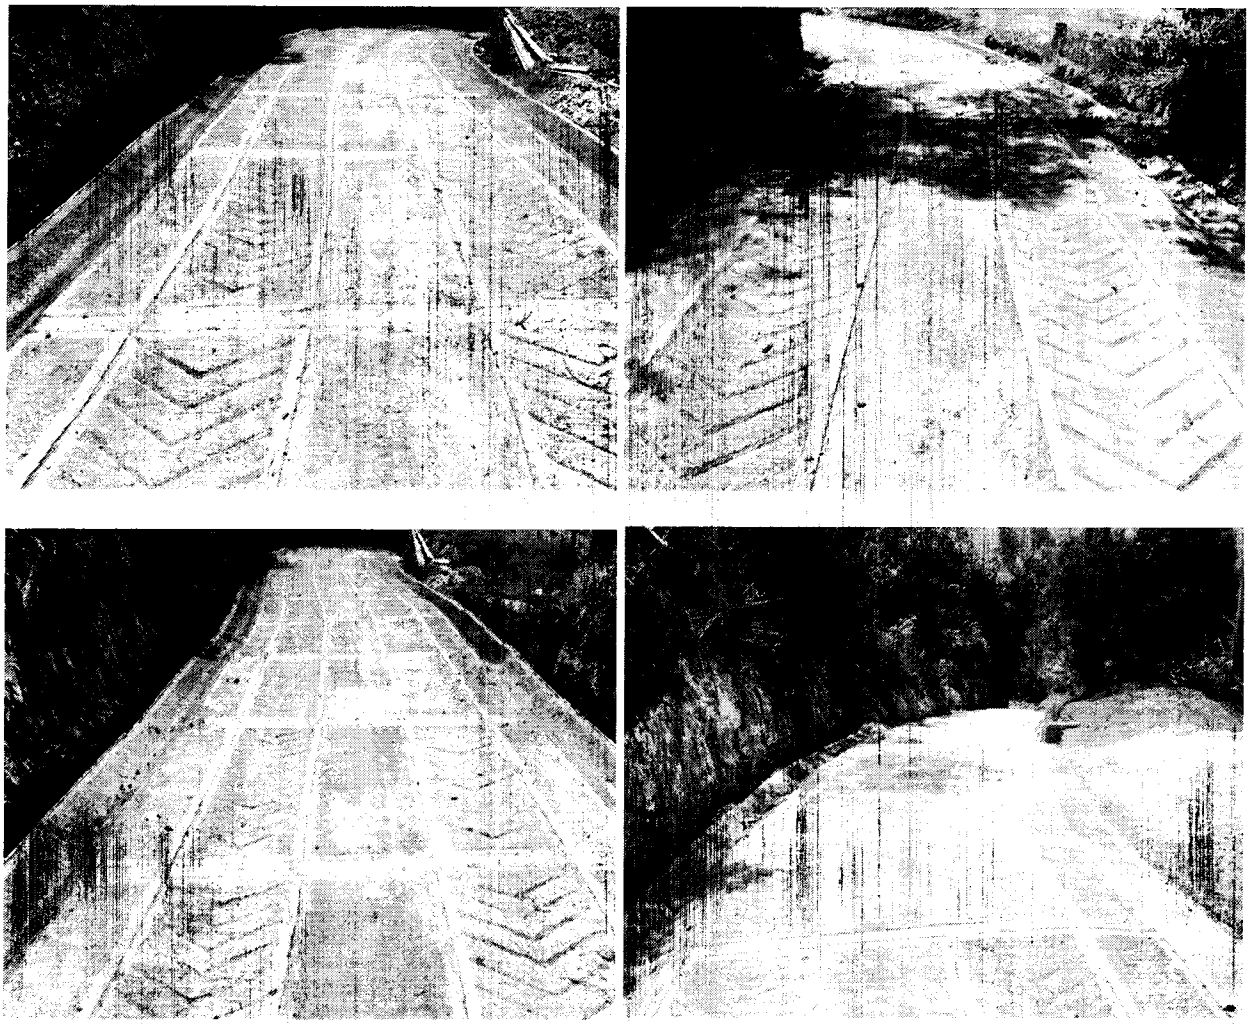

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (100%).

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo de agosto de 2025.

El contratista aporta dentro del informe de obra la respectiva certificación de parafiscales.

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2025000007 DIS-2025000008 DIS-2025000009
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000395 RES-2025000396 RES-2025000397
REDUCCIÓN DISPONIBILIDAD	DIS-2025000042 DIS-2025000043 DIS-2025000044
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 402.006.307,02
ADICIONES	$ 200.866.496,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS-2025000679
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000897
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 602.872.803,02

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	27-08-2025	$ 503.198.040,00
SEGUNDO PAGO	16-10-2025	$ 39.387.483,00
LIQUIDACION	16-10-2025	$ 60.287.280,02
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 602.872.803,02**

1 7487

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
EGR-2025000713	27-08-2025	$ 503.198.040,00
TOTAL PAGADO		**$ 503.198.040,00**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 402.006.307,02
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 200.866.496,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 602.872.803,02
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 602.872.803,02
SALDO POR EJECUTAR	$ 00,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 503.198.040,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA 90%	$ 39.387.483,00
VALOR PENDIENTE A PAGAR LIQUIDACION	$ 60.287.280,02
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$00,00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de ***TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 39.387.483,00) M/CTE***

Dado a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025.

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

1488

LA SUSCRITA SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el contratista **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS),** identificado con el NIT N° 900.976.357-7, una vez verificada la información para el trámite de pago Parcial N°2 cumplió con el OBJETO CONTRACTUAL **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR BOLE SEGÚN CONVENIO ICCU 644 – 2024, MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LA TORRE SEGUN CONVENIO ICCU 708 - 2024 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES SSEGUN CONVENIO ICCU 755 – 2024 Y OTRAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA**, durante el periodo comprendido entre el 28 de agosto del 2025 al 25 de septiembre de 2025, según contrato de obra pública **C-OBRA-No. 154-2025** con los Registros Presupuestales Iniciales No. **RES-2025000395 RES-2025000396 RES-2025000397** y Registro de Adición No. **RES-2025000897.**

Que el contratista cumple con el pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Correspondiente al periodo de agosto de 2025.

Se expide en el municipio de La Vega Cundinamarca, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025, con destino a la Secretaria de Hacienda para el segundo pago parcial por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 39.387.483,00) M/CTE**

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

1489

La Vega Cundinamarca, 16 de octubre de 2025.

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía de La Vega Cundinamarca

Asunto: Entrega de Documentos Pago No. 02 Contrato de Obra No. 154-2025

Por medio de la presente se hace entrega formal de los siguientes documentos, con el fin de adelantar el trámite de Pago Parcial No. 02 del Contrato de Obra No. 154-2025 del contratista PROYECTOS DE INGENIERIA – DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS AASING S.A.S. NIT. 900.976.357-7, representada por el señor JUAN CARLOS PINTO CHAVEZ Identificado con CC. No. 1.019.044.913 de Bogotá D.C.

Contrato No.	Nombre del Documento	Numero de Folios, medios magnéticos u otros
154-2025	Cronograma Actualizado	
	Aval Cronograma Interventoría	01
	Cronograma Actualizado	03
	Pago Parcial No. 01	
	Aval y Entrega Acta Parcial No. 02 Interventoría	02
	Radicado Acta Parcial No. 02	02
	Factura	03
	Rut	02
	Certificación Bancaria	02
	Resolución Facturación	03
	Cedula Representante Legal	02
	Documentos Contador	04
	Certificación Parafiscales	02
	Planillas Seguridad Social	23
	Acta Parcial No. 01	04
	Memorias de Cantidades	43
	Registro Fotográfico	52
	Control Estado del Tiempo	03
	Bitácoras de Obra	56
	Pago Sena Fic	04
	Certificados Calidad de Materiales y Disposición	08
	Ensayos de Laboratorio	04
	Pólizas Actualizadas	04
	Manual de Mantenimiento	24
	Informe Mensual No. 3	128
	Informe Acta de Terminación	42
	Actas de Comités Técnicos	53
	Planos Record	04

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

	Informe de Supervisión	12
	Certificado Supervisor	01

NOTA: ***En el caso de documentos para trámite de pago debe venir una copia para entregar a la secretaria de Hacienda donde van los siguientes documentos, los cuales deben también ser relacionados en el cuadro anterior:***

- *Certificación del supervisor*
- *Factura del Contratista*
- *Soportes Seguridad Social*
- *Certificación contratista pago seguridad social*
- *Certificación Bancaria*

Atentamente,

DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
Profesional Universitario
Secretaria De Planeación E Infraestructura
