ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

BOGOTÁ

PROGEN
PRODUCCIONES GENERALES S.A.

SEÑALVIAS S.A.S

Socinter

CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA SUR-OCCIDENTE

CONTRATO SDM 2024-3652

INFORME MENSUAL No.9.

23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE DE 2025

VERSIÓN 0

OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Francy Paola Duarte Porras	Directora De Proyecto	
REALIZÓ	Daniela Orejuela Cruz	Ingeniero Residente	Daniela Orejuela Cruz
REVISÓ	Kevin Amézquita Saavedra	Coordinador de obra	

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERMOVILIDAD

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Hugo Alfredo Posso Moncada	Director de interventoría	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
APROBÓ	Luis Arnaldo Grandas Olarte	Residente de interventoría	
MODIFICACIONES			

CONTENIDO

pág.

1. INTRODUCCIÓN....7

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO....8

2.1 PÓLIZAS....9

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....10

4. PERIODO DEL INFORME....12

5. COMPONENTE DE OBRA....13

5.1 RECURSO HUMANO....13
5.2 EQUIPOS....14
5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO....16
5.4 BALANCE ECONÓMICO....22
5.4.1 Suministro e instalación de la señalización....22
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO....23
5.6 GEORREFERENCIACIÓN....30

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL....33

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS....34

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS....35

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO....37

9. ASPECTOS TÉCNICOS....40

9.1 ESTADO DEL CLIMA....40
9.2 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES....42

10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN....42

10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS....42
10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA....44

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL....44

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL....44

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS....44

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS....44

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA)....44

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO....45

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS....45

18. ANEXOS....46

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Datos generales del Contrato....8
Tabla 2. Listado de Pólizas....9
Tabla 3. Localidades con UPZ....10
Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo....13
Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización....13
Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades....14
Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad....15
Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación....16
Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID:....19
Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes....21
Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID:....22
Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID:....30
Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato....33
Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente....34
Tabla 15. Porcentaje ejecutado por localidad....34
Tabla 16. Planes de manejo de tránsito vigentes....37
Tabla 17. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados....42

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente 10

Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-9.....20

ABREVIATURAS

SDM	Secretaría Distrital de Movilidad
CSB 2025	Consorcio señalizar Bogotá 2025
PMT	Plan de manejo de transito
UPZ	Unidad de Planificación Zonal

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de noviembre de 20181, se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en quince (15) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3652 con el Consorcio señalizar Bogotá 2025, el cual tiene por objeto "realizar actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS, o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 9, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por el Consorcio señalizar Bogotá 2025, durante el periodo 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3652.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla, se indica que a la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones de adición, suspensión o reinicio al contrato.

Tabla 1. Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM-2024-3652.
Objeto del Contrato	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	23 de enero 2025
Fecha de Terminación:	22 de noviembre de 2027
Valor total:	DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428) suma que se discrimina de la siguiente manera Vigencia 2024: $2.815.721.00 Vigencia 2025: $ 6.209.487.857 Vigencia 2026: $ 6.423.895.143 Vigencia 2027: $ 3.322.369.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS
Interventoría:	CONSORCIO INTEROBRAS POSSO-ALDEIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3667

Fuente: Elaboración propia

Respecto a aspectos del contrato como actas adicionales o modificaciones no se realizaron durante el periodo del presente Informe.

2.1 PÓLIZAS

Una vez firmado el contrato de Obra No. SDM-2024-3652 (del 23 de enero de 2025), entre el consorcio señalizar Bogotá 2025 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía Seguros del Estado SA., a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.
La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 2. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos, y se actualizaron con el acta de inicio:

Tabla 2. Listado de Pólizas

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA N°	ASEGURADORA
	INICIAL	FINAL			
Cumplimiento	23/01/2025	23/11/2030	$ 5,631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Prestaciones sociales	23/01/2025	23/11/2030	$ 3.754.294.686	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Estabilidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	$ 5.631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	$ 5.631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Amparo básico predios, labores y operaciones	27/12/2024	27/10/2027	$ 938.573.672	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Patronal	27/12/2024	27/10/2027	$ 469.286.836	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Contratistas y subcontratistas	27/12/2024	27/10/2027	$ 469.286.836	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.

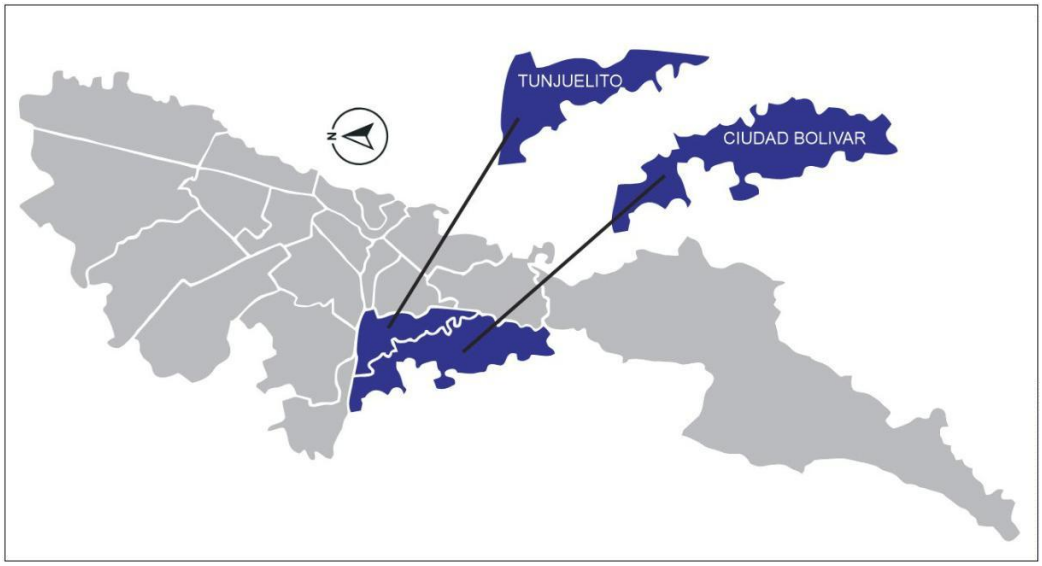
Fuente: Elaboración propia

Dada la suscripción del acta de inicio el 23 de enero de 2025, se remitieron a la interventoría las pólizas correspondientes al contrato SDM-2024-3652, del Consorcio señalizar Bogotá 2025, mediante comunicación SDM-CSB2025-004, en atención a las comunicaciones CINPOSAL-002-2025, CINPOSAL-003-2025 y respuesta al traslado de los radicados SDM 202531100012811, SDM 202531100026931, con los ajustes a las vigencias, de acuerdo con el acta de inicio del contrato.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la ZONA 6, ZONA SUR-OCCIDENTE, conformada por las localidades 19. Ciudad Bolívar, 06. Tunjuelito y en los corredores de la Autopista Sur Y AV Américas, en la siguiente figura, se pueden observar con detalle, las localidades que comprenden la zona 6:

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente



Fuente: Elaboración propia

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 3. Localidades con UPZ

19. Ciudad Bolívar	6. Tunjuelito
UPZ 63 El Mochuelo UPZ 64 Monte Blanco UPZ 65 Arborizadora UPZ 66 San Francisco UPZ 67 El Lucero UPZ 68 El Tesoro UPZ 69 Ismael Perdomo UPZ 70 Jerusalén	UPZ 42 Venecia UPZ 62 Tunjuelito

Fuente: Elaboración propia

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 2. descripción obra en lote o zona a intervenir, del Anexo No.1 – Anexo Técnico ADENDA 1, se tiene "…*Considerando*

situaciones extraordinarias y sobrevinientes la entidad podrá asignar implementación inmediata de ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, precisando que el valor de las obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del presupuesto oficial del lote,…", previa aprobación del Comité técnico y de los responsables de área señalados en el citado numeral.

4. PERIODO DEL INFORME

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el consorcio señalizar Bogotá 2025, en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3652, para el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

5. COMPONENTE DE OBRA

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo y como resultado de las actividades de obra ejecutadas se dispuso de los siguientes recursos durante el período del presente informe:

5.1 RECURSO HUMANO

A continuación, se relaciona el equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo para el desarrollo del proyecto durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo

Nombres	Apellidos	Cargo
Francy Paola	Duarte Porras	Directora del proyecto
Felix Leonardo	Pulido Bastidas	Especialista en transito
Daniela	Orejuela Cruz	Residente de obra
David Esteban	Castro Fuentes	Residente de obra
Clara Consuelo	García	Trabajador social
Jeny Natalia	Ramírez Esquivel	Profesional SST
Héctor Iván	Borda Molina	Profesional Georreferenciación
Steven Yesid	Orejuela Cardona	Conductor
Ricardo	Fernández Sáenz	Conductor
Cindy Tatiana	Cristancho	Secretaria

Fuente: Elaboración propia

También se relacionan las cuadrillas vinculadas laboralmente para la implementación de los ID de diseño de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.7 del anexo técnico, así:

Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización

N° Cuadrilla	Nombre Cuadrilla	Actividad Principal Por Desarrollar
1	Cuadrilla NM1	Señalización Horizontal
2	Cuadrilla NM2	Señalización Horizontal
3	Cuadrilla NM3	Señalización Horizontal
4	Cuadrilla NM4	Señalización Horizontal
5	Cuadrilla QR 1	Señalización Horizontal
6	Cuadrilla QR 2	Señalización Horizontal
7	Cuadrilla PG 1	Señalización Horizontal
8	Cuadrilla SV 1	Señalización Horizontal

N° Cuadrilla	Nombre Cuadrilla	Actividad Principal Por Desarrollar
9	Cuadrilla SV 2	Señalización Vertical
10	Cuadrilla SV 3	Emergencias y Compromisos Prioritarios
11	Cuadrilla SI1	Señalización Vertical
12	Cuadrilla SI2	Señalización Vertical

Fuente: Elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 8. Informe Sistema de seguridad y salud en el trabajo, se detalla el personal operativo que conforma las cuadrillas que laboraron en la implementación de la señalización durante el periodo del presente informe.

5.2 EQUIPOS

Se emplearon los siguientes equipos para la ejecución de los trabajos del periodo del presente informe:

Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Descripción	Cantidad	Identificación
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2	1	WEP027 y TBZ541
Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.2	1	STIMSONITE TITAN 1000 D
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2	1	SPT 943
Máquina manual para pintura líquida NTC 4744-2 numeral 5.1 3	3	TITAN 8900XLT
Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.1	1	THERMO MARK II FEATHERLITE

Descripción	Cantidad	Identificación
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método Spray. NTC 4744-2 Numeral 5.1	1	HYDRA 4000
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método extrusión. NTC 4744-2 Numeral 5.1		HYDRA 4000
Camión con capacidad mínima de tres puntos cinco (3,5), modelo superior al año 2015, este vehículo deberá ser el adecuado para el transporte de los materiales a utilizar.	1	WFR172
Vehículo tipo campero o camioneta con placas de servicio público, con cilindraje de 1300 c.c. o superior, modelo 2022 o superior y matriculado en la ciudad de Bogotá D.C., conforme a la normatividad vigente en materia de tránsito y transporte (Acuerdo 352 de 2008).	1	TTZ

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad

Descripción	Cantidad
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se informa que en el Anexo 4. Plan de Calidad, carpeta; 2_FORMATOS, se relacionan los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos y elementos de control de obra mínimos.

5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 1)	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar - 06_Tunjuelito	EJECUTADO
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)	28/01/2025	19_Ciudad Bolívar - 06_Tunjuelito	EN EJECUCIÓN
MV_AUTO_SUR_643_24_V0 (AUTO SUR)	29/01/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	30/01/2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCIÓN
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	31/01/2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	1/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
EX_19_339_1561_10 (SAN FRANCISCO)	2/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
EX_19_387_1561_10 (ACACIA)	3/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_1_PMT CL 68G N° 31A-16	4/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_2_PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	5/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_3_PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	6/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_4_PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	7/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_5_PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	8/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_6_PMT CL 68C SUR KR 38	9/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	10/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	11/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°3 (DISPOSITIVOS Y SEÑALES VERTICALES)	12/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°4 (SEÑALES VERTICALES)	13/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°5 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	14/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°6 (SEÑALES VERTICALES)	15/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°7 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	16/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°8 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	17/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°9 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	18/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°10 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	19/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°11 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	20/02/2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°12 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	21/02/2025	N/A	EJECUTADO

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
SUMINISTRO N°13 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	22/02/2025	N/A	EJECUTADO
EX_19_342_943_10 (ARBORIZADORA BAJA)	23/02/2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
EX_19_386_1561_10 (ESTANCIA)	24/02/2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
EX_06_404_1561_10 (ISLA DEL SOL 1)	25/02/2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	26/02/2025	06_Tunjuelito	EN EJECUCIÓN
CP_7_PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	27/02/2025	19_Ciudad Bolívar	NO EJECUTAR
CP_8_EX_19_209_1867_12	28/02/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_9_KR_72_CON_CL_63A_SUR	1/03/2025	19_Ciudad Bolívar	NO EJECUTAR
CP_10_PMT KR 75 CON DG 57Z SUR	2/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_11_CL 79B SUR CON KR 18Q	3/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_12_CL 75A SUR ENTRE DG 75 SUR Y TV 54	4/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_13_AUTOPISTA SUR DETECCIÓN ELECTRÓNICA	5/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_14_CL 69S CON TV 73D	6/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_15_AV. BOYACÁ	7/03/2025	06_Tunjuelito	NO EJECUTAR
CP_16_EX_18_235_937_09	8/03/2025	18_Rafael Uribe	NO EJECUTAR
CP_17_MV_AV_BOYACA_941_09_COMPROMISO RESALTOS	9/03/2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_18_PASACALLES_MV_02_335_946_10_V14_LA CALERA	10/03/2025	02_Chapinero	EJECUTADO
CP_19_PASACALLES_MV_03_001_1783_19_V11_VÍA A CHOACHI	11/03/2025	03_Santa Fe	EJECUTADO
CP_20_PASACALLES_MV_05_122_1867_12 (ENTRADA USME)	12/03/2025	05_Usme	EJECUTADO
CP_21_PASACALLES_MV_19_189_1556_10 (AC 13XKR137)	13/03/2025	19_Ciudad Bolívar - 06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_22_PASACALLES_MV_AUTO_SUR_643_24_TERMINAL DEL SUR	14/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_23_AV BOYACÁ – DG 49 SUR (N-S) y (S-N)	15/03/2025	06_Tunjuelito	NO EJECUTAR
CP_24_PASACALLES KR 7 ENTRE CL 29 Y CL 61	16/03/2025	02_Chapinero	EJECUTADO
CP_25_EX_19_184	17/03/2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
CP_26_19_1294	18/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_27_19_148_1244	19/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_28_1307. CP-AUTOSUR CON KR 63 Y CP_29_1308. CP-AUTOSUR CON KR 71	20/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_30_19_1361(Cl 68 sur con TV 70) - Ciudad Bolívar	21/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_31_SDM_08_1354 CICLORRUTA (Ciclomotor - Kennedy)	22/03/2025	08_Kennedy	EJECUTADO
CP_32_PMT DE EMERGENICA DG 73C S	23/03/2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
CP_33_19_1585_ACCIÓN POPULAR 2025-00102	24/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_34_06_1657	25/03/2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_35_06_1658	26/03/2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
CP_36_PMT_VILLAGLORIA_SIRE_5443806	27/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_37_19_1618 SIERRA MORENA	28/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT CIUDAD BOLIVAR SIRE CALLE 69F SURF	29/03/2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PASACALLES ANTONIO NARIÑO	30/03/2025	15_Antonio Nariño	EJECUTADO
PASACALLES BARRIOS UNIDOS	31/03/2025	12_Barrios Unidos	EJECUTADO
PASACALLES CHAPINERO	1/04/2025	02_Chapinero	EJECUTADO
PASACALLES ENGATIVA	2/04/2025	10_Engativá	EJECUTADO
PASACALLES FONTIBÓN	3/04/2025	09_Fontibon	EJECUTADO
PASACALLES KENNEDY	4/04/2025	08_Kennedy	EJECUTADO
PASACALLES LOS MARTIRES	5/04/2025	14_Los mártires	EJECUTADO
PASACALLES PUENTE ARANDA	6/04/2025	16_Puente Aranda	EJECUTADO
PASACALLES SANTA FE	7/04/2025	03_Santa Fe	EJECUTADO
PASACALLES SUBA	8/04/2025	11_Suba	EJECUTADO
PASACALLES TEUSAQUILLO	9/04/2025	13_Teusaqillo	EJECUTADO
PASACALLES USAQUEN	10/04/2025	01_Usaquén	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS CHAPINERO	11/04/2025	02_Chapinero	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS ENGATIVA	12/04/2025	10_Engativá	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS SANTAFE	13/04/2025	03 Santa fe	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS SUBA	14/04/2025	11_Suba	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS USAQUEN	15/04/2025	01_Usaquén	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS USME	16/04/2025	05_Usme	EJECUTADO
PENDONES BICIKENNEDY	17/04/2025	08_Kennedy	EJECUTADO
EX_19_142_1244_11	18/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_017_1561_10	19/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_041_1561_10	20/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_001_643_24	21/04/2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCIÓN
MV_19_414_937_09	22/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_06_054_1561_10	23/04/2025	06_Tunjuelito	EN EJECUCIÓN
MV_19_013	24/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_06_105_1867_12	25/04/2025	06_Tunjuelito	POR INSPECCIONAR
MV_19_080_1561_10	26/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_155_1244_11	27/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_151_1244_11	28/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_292_1561_10	29/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_318_1561_10	30/04/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_19_176_1244_11	1/05/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_152_1744_10	2/05/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_269_1744_10	3/05/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_202_1867_12	4/05/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_211_1867_12	5/05/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR

Fuente: Elaboración propia

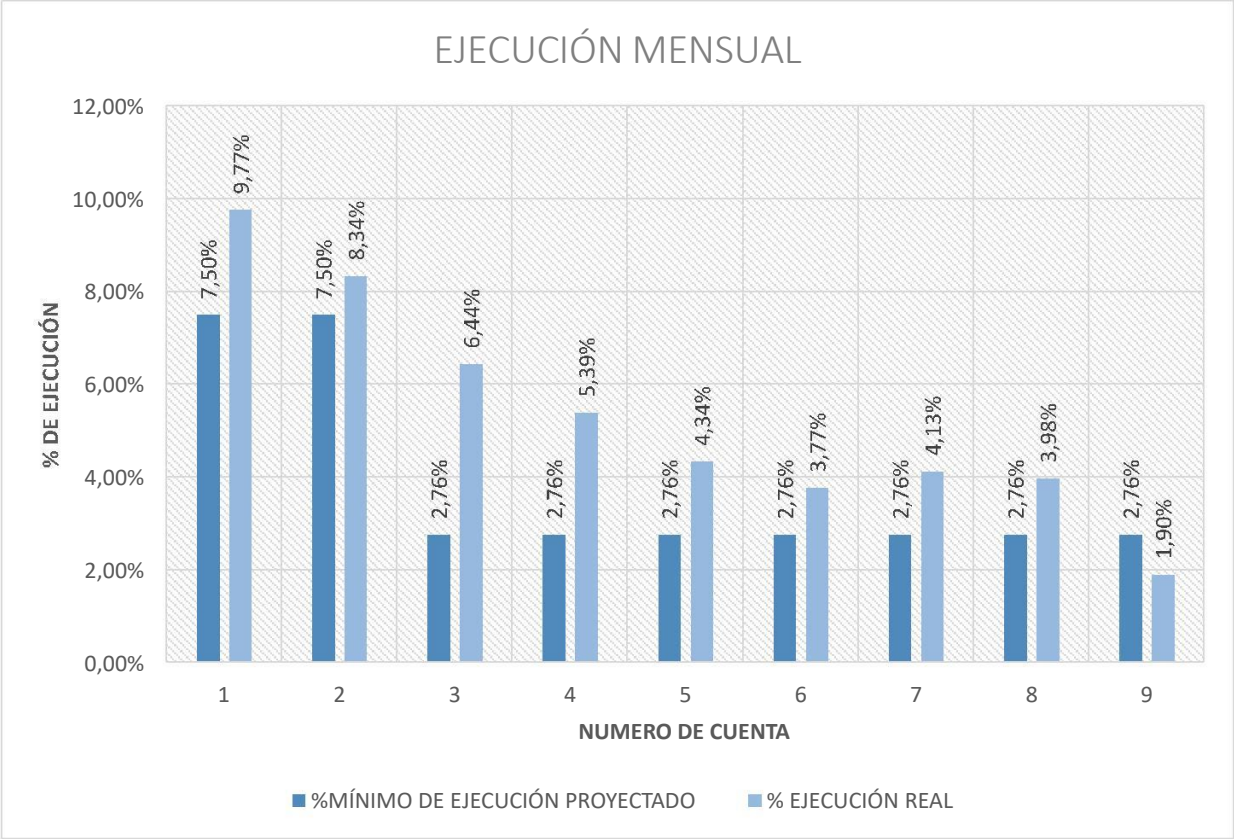
A continuación, se resume las cantidades de obra ejecutadas para cada ID:

Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID:

Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Ejecutado para Cobro cuenta 1	% Ejecutado
CP_06_1657	06_TUNJUELITO	$ 17.450.502	$ 17.450.502,00	100,00%
CP_19_1618 SIERRA MORENA	06_TUNJUELITO	$ 6.967.625,00	$ 6.967.625,00	100,00%
EX_19_001_643_24	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 860.178.801	$ 73.139.119,00	8,50%
MV_06_054_1561_10	06_TUNJUELITO	$ 408.322.507	$ 155.804.382,00	38,16%
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 824.943.132	$ 94.818.574,00	11,49%
CP_06_1658	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 4.130.133	$ 4.130.133,00	100,00%
PMT_VILLAGLORIA_SIRE 5443806	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	$ 2.422.810,00	100,00%
MI-FA-19-Suministro N°13 CSB2025	N/A	$ 1.809.961	$ 1.809.961,00	100,00%
CP_06_1657	06_TUNJUELITO	$ 17.450.502	$ 17.450.502,00	100,00%
TOTAL		**$ 3.718.864.739**	**$ 356.543.106**	

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-9



Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que en la cuenta número 9, comprendida del 23 de septiembre al 22 de octubre se ejecutó el 1,90 % del valor total del contrato, lo cual representa un 0,86 % inferior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.5 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 2,76 % para el noveno mes de ejecución.

Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes

MES DE EJECUCIÓN	PROYECTADO		EJECUCIÓN REAL		PROYECTADO VS EJECUCIÓN REAL
	%MÍNIMO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN REAL	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN
1	7,50%	7,50%	9,77%	9,77%	2,27%
2	7,50%	15,00%	8,34%	18,11%	3,11%
3	2,76%	17,76%	6,44%	24,55%	6,79%
4	2,76%	20,52%	5,39%	29,94%	9,42%
5	2,76%	23,28%	4,34%	34,28%	11,00%
6	2,76%	26,04%	3,77%	38,05%	12,01%
7	2,76%	28,80%	4,13%	42,18%	13,38%
8	2,76%	31,56%	3,98%	46,16%	14,60%
9	2,76%	34,32%	1,90%	48,06%	13,74%
10	2,76%	37,08%	0,00%	48,06%	0,00%
11	2,76%	39,84%	0,00%	48,06%	0,00%
12	2,76%	42,60%	0,00%	48,06%	0,00%
13	2,76%	45,36%	0,00%	48,06%	0,00%
14	2,76%	48,12%	0,00%	48,06%	0,00%
15	2,85%	50,97%	0,00%	48,06%	0,00%
16	2,85%	53,82%	0,00%	48,06%	0,00%
17	2,85%	56,67%	0,00%	48,06%	0,00%
18	2,85%	59,52%	0,00%	48,06%	0,00%
19	2,85%	62,37%	0,00%	48,06%	0,00%
20	2,85%	65,22%	0,00%	48,06%	0,00%
21	2,85%	68,07%	0,00%	48,06%	0,00%
22	2,85%	70,92%	0,00%	48,06%	0,00%
23	2,85%	73,77%	0,00%	48,06%	0,00%
24	2,85%	76,62%	0,00%	48,06%	0,00%
25	2,85%	79,47%	0,00%	48,06%	0,00%
26	2,85%	82,32%	0,00%	48,06%	0,00%
27	2,55%	84,87%	0,00%	48,06%	0,00%
28	2,55%	87,42%	0,00%	48,06%	0,00%
29	2,55%	89,97%	0,00%	48,06%	0,00%
30	2,55%	92,52%	0,00%	48,06%	0,00%
31	2,55%	95,07%	0,00%	48,06%	0,00%
32	2,25%	97,32%	0,00%	48,06%	0,00%
33	2,25%	99,57%	0,00%	48,06%	0,00%
34	0,43%	100,00%	0,00%	48,06%	0,00%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se muestra el avance parcial y acumulado respecto al mes 9 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.5 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se tiene acumulado el 48 ,06 % el cual representa un valor de 13,74 % superior al valor programado que equivale al 34,32 % acumulado para el noveno mes del contrato.

5.4 BALANCE ECONÓMICO

El detalle de las cantidades de obra de los puntos que se ejecutaron en el período se presenta en el Anexo 1. Acta Parcial de Obra, complementado con las planillas de obra de los IDs relacionados como ejecutados para el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

En el Anexo 1. se presentan las planillas de los puntos o ID ejecutados durante el periododel informe, cuyos totales se relacionan a continuación:

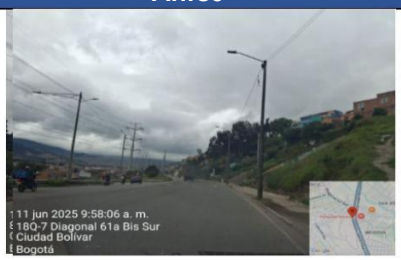
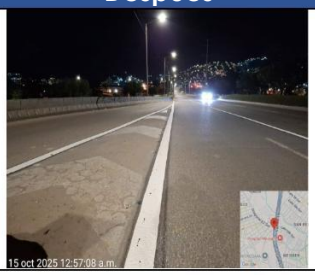
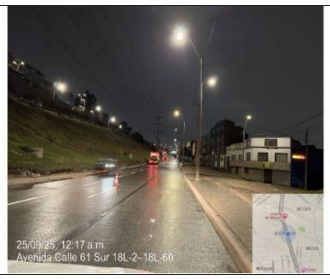
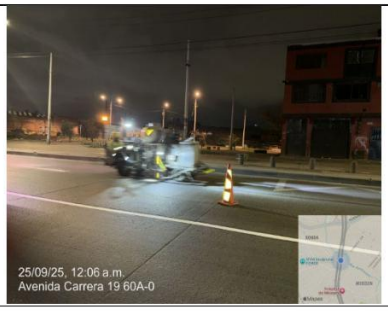
Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID:

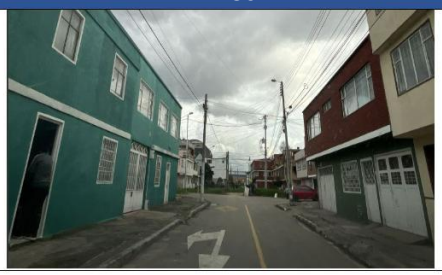
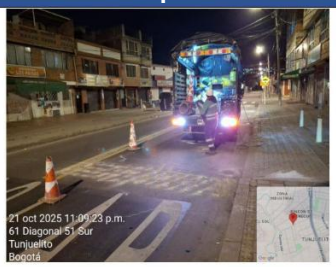
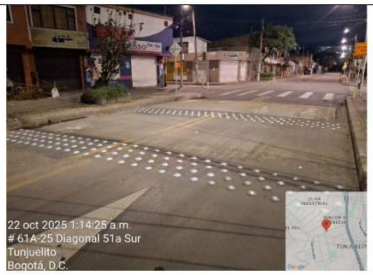
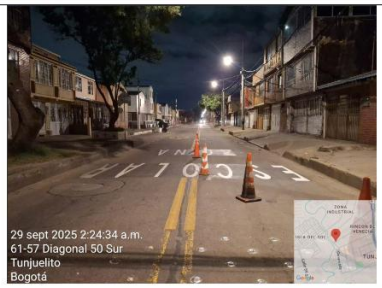
Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	% Cobrado Cuenta 1 a la Cuenta 8	% Cobrado Cuenta 9	Ejecutado para Cobro cuenta 9
CP_06_1657	06_TUNJUELITO	$ 17.450.502	0,00%	100,00%	$ 17.450.502
CP_19_1618 SIERRA MORENA	06_TUNJUELITO	$ 6.967.625	0,00%	100,00%	$ 6.967.625
EX_19_001_643_24	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 860.178.801	35,09%	8,50%	$ 73.139.119
MV_06_054_1561_10	06_TUNJUELITO	$ 408.322.507	16,53%	38,16%	$ 155.804.382
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 824.943.132	76,38%	11,49%	$ 94.818.574
CP_06_1658	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 4.130.133	0,00%	100,00%	$ 4.130.133
PMT_VILLAGLORIA_SIRE 5443806	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	0,00%	100,00%	$ 2.422.810
MI-FA-19-Suministro N°13 CSB2025	N/A	$ 1.809.961	0,00%	100,00%	$ 1.809.961
TOTAL		**$ 2.126.225.471**			**$ 356.543.106**

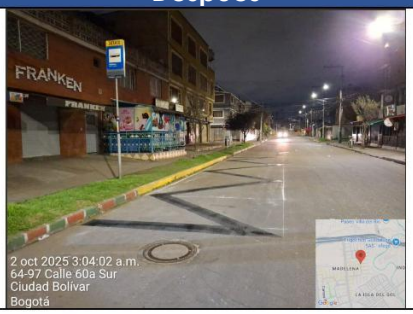
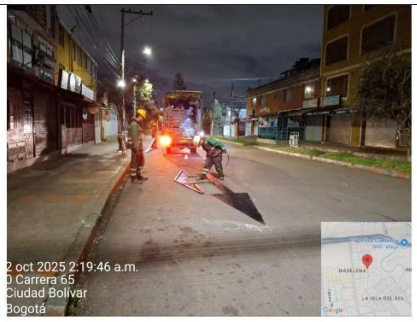
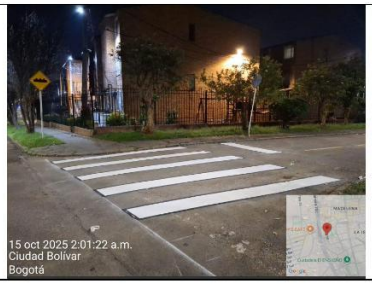
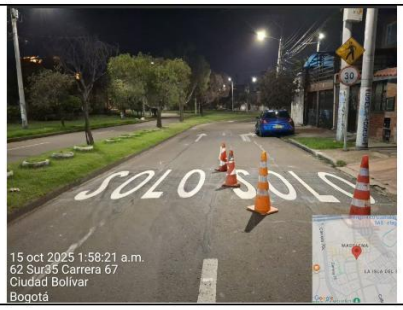
Fuente: Elaboración propia

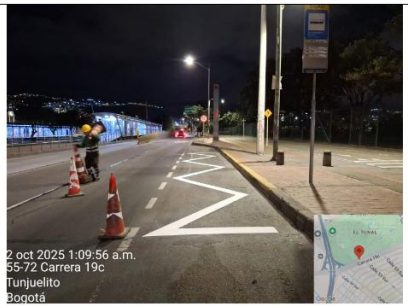
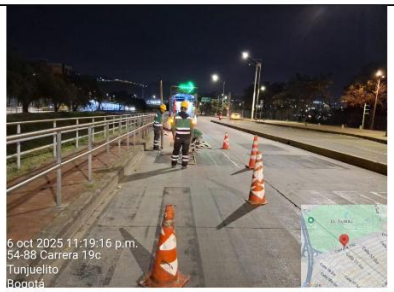
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

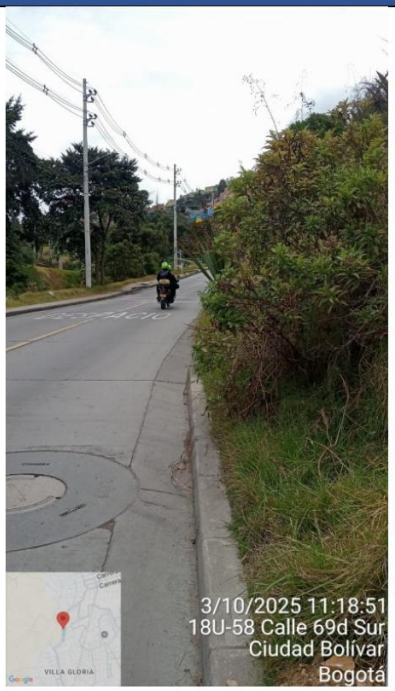
A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025:

<table>
<tr><th colspan="2">MV_AV_BOYACA_941_09_V30_TRAMO 2 (HORIZONTAL)</th></tr>
<tr><th>Antes</th><th>Después</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">DIAGONAL 61a BIS SUR</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">AV. CL 61 SUR 18L-2 18L 60</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">AV. KR 19 60A-0</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

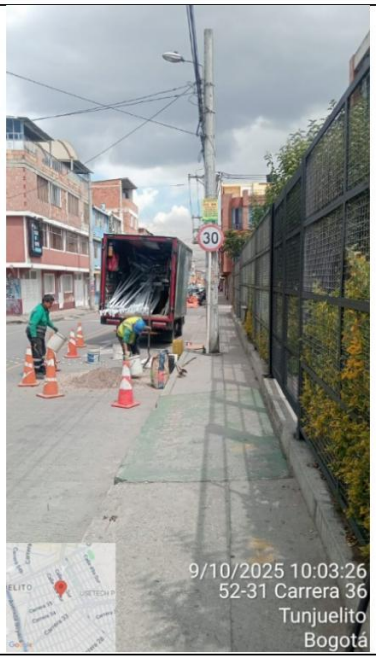
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2) (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
DIAGONAL 61 51 SUR	
	
DIAGONAL 51 a SUR #61A-25	
	
DIAGONAL 50 SUR 60-62	
	
DIAGONAL SUR 61-57	

EX_19_001_643_24 (MADELENA)	
Antes	**Después**
	
CL 60 A SUR 64-97	
	
KR 65 CL 51B	
	
KR 60B CL 49 A SUR	
	
KR 67 62 SUR 35	

MV_06_054_1561_10 AV. VILLAVICENCIO	
Antes	**Después**
	
KR 19C 55-06	
	
CL 55-72 KR 19 C	
	
KR 19C CL 54-88	
	
KR 19B CL 51 SUR	

PMT CIUDAD BOLIVAR SIRE CALLE 69F SUR	
Antes	**Después**
	
DIAG 96 A SUR ENTRE TV 18 W Y KR 18 U	
	
DIAG 96 A SUR ENTRE TV 18 W Y KR 18 U	

CP-06-1657 (MV_06_499_937_09)	
Antes	**Después**
	
DG 51 SUR KR 60	
	
CL 54 SUR # 37A-99	

CP-06-1658	
Antes	**Después**
	
KR 17 CALLE 74 SUR	
	

5.6 GEORREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación de obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 22 de octubre de 2025.

Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID:

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
MV_AV_BOYACA_941_09_C1.1	1	APROBADO SDM	4/04/2025
EX_19_387_1561_10	1	APROBADO SDM	25/04/2025
CPS_941_EM_19_111_C1	1	APROBADO SDM	7/04/2025
EX_19_194_1867_12	1	APROBADO SDM	12/03/2025
MV_19_041_1561_10	1	APROBADO SDM	17/03/2025
MV_19_292_1561_10	1	APROBADO SDM	18/03/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C1.2	1	APROBADO SDM	21/04/2025
EX_19_387_1561_10_C2	2	APROBADO SDM	28/04/2025
MV_19_324_943_10_V10_C2	2	APROBADO SDM	25/04/2025
CPS_941_EM_19_111_C2	2	APROBADO SDM	28/04/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C2	2	APROBADO SDM	8/05/2025
MV_19_178_1244_11_C2	2	APROBADO SDM	6/05/2025
MV_AV_BOYACA_941_09	3	APROBADO SDM	19/05/2025
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	3	APROBADO SDM	19/05/2025
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	3	APROBADO SDM	15/05/2025
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	3	REVISIÓN SDM	5/06/2025
MV_AUTO_SUR_643_24	3	APROBADO SDM	19/05/2025
EX_19_339_1561_10	3	REVISIÓN SDM	28/05/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	4	APROBADO SDM	17/06/2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0 (INCLUYE PASACALLES Y CP DETECCIÓN ELECTRÓNICA)	4	APROBADO SDM	17/06/2025
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	4	APROBADO SDM	11/06/2025
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	4	APROBADO SDM	9/06/2025
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	4	APROBADO SDM	19/06/2025
EX_19_339_1561_10 (SAN FRANCISCO)	4	APROBADO SDM	19/06/2025
EX_06_404_1561_10 (ISLA DEL SOL 1)	4	APROBADO SDM	30/05/2025
CP_10_PMT KR 75 CON DG 57Z SUR	4	APROBADO SDM	6/06/2025
CP_11_CL 79B SUR CON KR 18Q	4	APROBADO SDM	6/06/2025
CP_12_CL 75A SUR ENTRE DG 75 SUR Y TV 54	4	APROBADO SDM	6/06/2025

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
CP_14_CL 69S CON TV 79D	4	APROBADO SDM	6/06/2025
MV_02_335_946_10_V14_ (PASACALLES LA CALERA)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_03_001_1783_19_V11_ (PASACALLES VÍA BOGOTA-CHOACHI)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_19_189_1556_10 (PASACALLES AC 13 X KR137)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_05_122_1867_12 (BOYACÁ CON KR 1 ENTRADA USME)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C4.1	4	APROBADO SDM	8/07/2025
CPS_676_MV_01_04_C5 (PASACALLES KR 7)	5	APROBADO SDM	8/07/2025
EX_19_339_1561_10_C5	5	APROBADO SDM	8/07/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C5	5	APROBADO SDM	21/07/2025
EX_06_404_1561_10_C5	5	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_19_324_943_10_C5	5	REVISIÓN SDM	22/07/2025
MV_08_251_1244_11_V15 (CP_CICLOMOTORES)	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_19_178_1244_11_C6 (CP_CICLOMOTORES)	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_AUTO_SUR_643_24_C6	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C6	6	APROBADO SDM	22/08/2025
EX_19_339_1561_10_C6	6	APROBADO SDM	5/08/2025
EX_06_404_1561_10_C6	6	APROBADO SDM	14/08/2025
CP_8_EX_19_209_1867_12_C6	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_12_003_3652_24_C6 (PASACALLES BARRIOS UNIDOS)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_02_002_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS CHAPINERO)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_10_011_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS ENGATIVA)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_09_010_3652_24_C6 (PASACALLES FONTIBON)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_08_006_3652_24_C6 (PASACALLES KENNEDY)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_14_007_3652_24_C6 (PASACALLES LOS MARTIRES)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_16_005_3652_24_C6 (PASACALLES PUENTE ARANDA)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_15_009_3652_24_C6 (PASACALLES ANTONIO NARIÑO)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_03_001_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS SANTA FE)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_11_012_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS SUBA)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_13_004_3652_24_C6 (PASACALLES TEUSAQUILLO)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_01_013_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS USAQUEN)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_05_008_3652_24_C6 (SEÑALES ELEVADAS USME)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
EX_19_148_1244_11_C7 (CP COLEGIO AGUDELO)	7	APROBADO SDM	10/09/2025
MV_19_273_1561_10_C7 (CP SANTA MARGARITA)	7	APROBADO SDM	4/09/2025

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	7	APROBADO SDM	15/09/2025
EX_06_404_1561_10_ (ISLA DEL SOL 1)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
EX_19_209_1867_12_ (CP PARAISO)	7	APROBADO SDM	15/09/2025
EX_19_339_1561_10	7	APROBADO SDM	15/09/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_ (PARTE 2)	7	APROBADO SDM	23/09/2025
SV_02_002_3652_24_C7 (PASACALLES CHAPINERO)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
SV_03_001_3652_24_C7 (PASACALLES SANTA FE)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_ (PARTE 2)	8	APROBADO SDM	28/10/2025
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	8	APROBADO SDM	28/10/2025
EX_06_404_1561_10_ (ISLA DEL SOL 1)	8	APROBADO SDM	8/10/2025
MV_19_178_1244_11 (CP_19_1585_ACCIÓN POPULAR 2025-00102)	8	APROBADO SDM	8/10/2025
CPS_941_EM_19_111_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
EX_19_001_643_24_Madelena	8	APROBADO SDM	17/10/2025
MV_06_054_1561_10_AV_VILLAVICENCIO T2	8	APROBADO SDM	10/10/2025
SV_08_006_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	8/10/2025
SV_02_002_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
SV_13_004_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
EX_19_339_1561_10	8	APROBADO SDM	8/10/2025
MV_AV_BOYACÁ_941_09 (PARTE 2)	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-
EX_19_001_643_24 (MADELENA)	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-
MV_06_054_1561_10_AV_VILLAVICENCIO T2	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-
CP_06_1658	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-
DEM_CP_06_1657	9	DESARROLLO CONTRATISTA	-

Fuente: Elaboración propia

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

Durante el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025, el estado de avance presupuestal es el siguiente:

Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato

VALOR VIGENCIA 2024	$ 2.815.721.000
VALOR VIGENCIA 2025	$ 6.209.487.857
VALOR VIGENCIA 2026	$ 6.423.895.143
VALOR VIGENCIA 2027	$ 3.322.369.428
VALOR TOTAL	**$ 18.771.473.428**

Cuenta	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministros	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
N° 1	23/01/2025 a 22/02/2025	$1.388.326.935	$446.069.444	$ 0,00	$1.834.396.379	$91.719.819	$1.742.676.560	PAGO
N° 2	23/02/2025 a 22/03/2025	$1.118.356.078	$359.327.808	$87.896.288	$1.565.580.174	$ 78.279.009	$1.487.301.165	PAGO
N° 3	23/03/2025 A 22/04/2025	$ 914.429.716	$293.806.268	$ 0,00	$1.208.235.984	$60.411.799	$1.147.824.185	PAGO
N° 4	23/04/2025 A 22/05/2025	$ 765.617.145	$245.992.789	$ 0,00	$1.011.609.934	$50.580.497	$ 961.029.437,00	PAGO
N° 5	23/05/2025 A 22/06/2025	$ 616.413.251	$198.053.578	$ 0,00	$ 814.466.829	$ 40.723.341	$ 773.743.488,00	PAGO
N° 6	23/06/2025 A 22/07/2025	$ 536.383.839	$ 172.340.127	$ 0,00	$ 708.723.966	$ 35.436.198	$ 673.287.768,00	PAGO
N° 7	23/07/2025 A 22/08/2025	$ 586.768.424	$188.528.694	$ 0,00	$ 775.297.118	$38.764.856	$ 736.532.262	PAGO
Cuenta N° 8	23/08/2025 A 22/09/2025	$ 564.689.238,63	$ 181.434.652	$ 0,00	$ 746.123.891,00	$ 37.306.195	$ 708.817.696,00	PAGO
Cuenta N° 9	23/09/2025 A 22/10/2025	$ 269.842.659,50	$ 86.700.446	$ 0,00	$ 356.543.106,00	$ 17.827.155	$ 338.715.951,00	EN TRÁMITE
TOTAL		**$6.760.827.286**	**$2.172.253.807**	**$87.896.288**	**$9.020.977.381**	**$451.048.869**	**$8.569.928.512**	

TOTAL, FACTURADO OBRA + SUMINISTRO ACTA N° 9	**$ 356.543.106**
TOTAL, ACUMULADO	**$ 9.020.977.381**
SALDO POR FACTURAR	**$ 9.750.496.047**

Fuente: Elaboración propia

Se presenta para el noveno mes de ejecución del contrato, un valor ejecutado de **$356.543.106** que equivale al **1,90 %** del valor total del contrato y un valor total acumulado ejecutado de **$9.020.977.381** equivalente al **48,06 %** del valor total del contrato.

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	%ejecución vertical	Señalización Horizontal	%ejecución horizontal
CP_06_1657	06_TUNJUELITO	$ 2.111.897	12,10%	$ 15.338.605	87,90%
CP_19_1618 SIERRA MORENA	06_TUNJUELITO	-	0,00%	$ 6.967.625	100,00%
EX_19_001_643_24	19_CIUDAD BOLIVAR	-	0,00%	$ 73.139.119	100,00%
MV_06_054_1561_10	06_TUNJUELITO	-	0,00%	$ 155.804.382	100,00%
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)	19_CIUDAD BOLIVAR	-	0,00%	$ 94.818.574	100,00%
CP_06_1658	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 4.130.133,00	100,00%	-	0,00%
PMT_VILLAGLORIA_SIRE 5443806	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810,00	100,00%	-	0,00%
MI-FA-19-Suministro N°13 CSB2025	N/A	$ 1.809.961,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL		**$ 10.474.801,00**		**$ 346.068.305**	**-**

Fuente: Elaboración propia

Del valor total de señalización ejecutada durante el periodo del informe, Se distribuyo de la siguiente manera por localidades

Tabla 15. Porcentaje ejecutado por localidad

Orden	Localidad	PORCENTAJE EJECUTADO
1	06_TUNJUELITO	50,54%
2	19_CIUDAD BOLIVAR	48,95%
3	SUMINISTROS	0,51%

Fuente: Elaboración propia

0

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El plan de Calidad provee de mecanismos para asegurarse que las actividades que afectan la calidad, están siendo registradas usando la documentación necesaria aplicable de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 de 2015, a fin de cumplir la atención integral en temas de señalización en la zona 6 adjudicada, atención integral que involucra el desarrollo de todas las actividades de implementación de señalización vertical, horizontal y los dispositivos de seguridad vial.

Consiste en la aplicación de los siguientes procesos:

- De Dirección: planificación del servicio
- Operativos o de realización del producto: Ejecución de proyectos con los respectivos soportes de compras, así como gestión del talento humano.
- De seguimiento: Acciones correctivas, preventivas, auditorías internas y análisis de datos.

Conforme al documento de Plan de Calidad presentado, se realizó el respectivo control de calidad en las actividades adelantadas de señalización horizontal, señalización vertical, e implementación de dispositivos en los siguientes ID:

- CP_06_1657
- CP_19_1618 SIERRA MORENA
- EX_19_001_643_24
- MV_06_054_1561_10
- MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)
- CP_06_1658
- PMT_VILLAGLORIA_SIRE 5443806
- MI-FA-19-Suministro N°13 CSB2025

Para el periodo se realizaron entre otros las siguientes actividades conformes al plan de Calidad:

RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES HORIZONTALES

FECHA JUL 2021 | VERSION 1.1

CONTRATO No. SDM No. 2024- 3652 | PRACTICADO A: SEÑALES HORIZONTALES ID_MV_AV_BOY_941_09 | FECHA: 17/10/2025

OBJETO : REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR–OCCIDENTE

QUIEN REALIZO EL ENSAYO : CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTA 2025 Y CONSORCIO INTER OBRAS POSSO–ALDEIC (INTERVENTORIA)

INFORMACION DEL LABORATORIO

NOMBRE	SEÑALVIAS S.A.S	TELEFONO	7343968
DIRECCION	CARRERA 67 # 12 - 15	EQUIPO	RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL GEOMETRIA 15M SERIE SLH-002

REGISTRO FOTOGRAFICO





RESULTADOS DEL ENSAYO

SEÑAL No.	IDENTIFICACION DE LA SEÑAL			UBICACIÓN DE LA SEÑAL		CARACTERISTICAS DE LA PINTURA RETROREFLECTIVA		ANGULOS GEOMETRIA RETROREFLECTOMETRO		LECTURA				
	TIPO DE SEÑAL	CODIGO DE LA SEÑAL	COLOR DE LA SEÑAL	DIRECCION	COSTADO	TIPO DE PINTURA	MARCA DE LA PINTURA	GEOMETRIA 15	GEOMETRIA 30	No 1	No 2	No 3	PROMEDIO	CUMPLE
1	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AV BOYACA ENTRE KR 19C HASTA KR 4	N.A	TERMOPLÁSTICO	TERMOPIN	X		257	251	251	253	SI

OBSERVACIONES

ELABORADO POR :

NOMBRE: HECTOR IVAN BORDA MOLINA

CARGO: INGENIERO RESIDENTE

APROBADO POR

NOMBRE: JUAN JOSE PEREZ

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES HORIZONTALES

FECHA JUL 2021 | VERSION 1.1

CONTRATO No. SDM No. 2024- 3652 | PRACTICADO A: SEÑALES HORIZONTALES ID_MV_06_054_1561_10, EX_19_001_643_24, CP_06_1657_FATIMA | FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO : REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR–OCCIDENTE

QUIEN REALIZO EL ENSAYO : CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTA 2025 Y CONSORCIO INTER OBRAS POSSO–ALDEIC (INTERVENTORIA)

INFORMACION DEL LABORATORIO

NOMBRE	SEÑALVIAS S.A.S	TELEFONO	7343968
DIRECCION	CARRERA 67 # 12 - 15	EQUIPO	RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL GEOMETRIA 15M SERIE SLH-002

REGISTRO FOTOGRAFICO






RESULTADOS DEL ENSAYO

SEÑAL No.	IDENTIFICACION DE LA SEÑAL			UBICACIÓN DE LA SEÑAL		CARACTERISTICAS DE LA PINTURA RETROREFLECTIVA		ANGULOS GEOMETRIA RETROREFLECTOMETRO		LECTURA				
	TIPO DE SEÑAL	CODIGO DE LA SEÑAL	COLOR DE LA SEÑAL	DIRECCION	COSTADO	TIPO DE PINTURA	MARCA DE LA PINTURA	GEOMETRIA 15	GEOMETRIA 30	No 1	No 2	No 3	PROMEDIO	CUMPLE
1	LINEA DE BORDE	LB	BLANCO	KR 34 ENTRE CL 50A S Y CL 51 S	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		331	310	312	318	SI
2	LINEA DE CANAL	LDN	BLANCO	KR 34 ENTRE CL 51A S Y CL 52 S	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		327	323	348	333	SI
3	LINEA DE INICIO FIN CARRIL	LIC	BLANCO	AV BOYACÁ ENTRE DG 49BIS SUR Y DG 47A SUR	OCCIDENTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		357	321	361	346	SI
4	LINEA DE BORDE	LB	BLANCO	KR 33 ENTRE CL 47A S Y 44 S	SUR	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		332	345	378	352	SI
5	LINEA DE BORDE	LB	BLANCO	KR 33 ENTRE CL 47A S Y 44 S	NORTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		301	343	386	343	SI
6	LINEA DE CARRIL	LCA	BLANCO	KR 33 ENTRE CL 48 S Y 48A S	NORTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		306	325	343	325	SI
7	LINEA DE BORDE	LB	BLANCO	DG 69D S ENTRE TV 40A Y TV 41	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		298	367	349	338	SI
8	LINEA CAMELLON	LCM	AMARILLO	DG 69D S ENTRE TV 40A Y TV 41	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		410	385	349	381	SI
9	LINEA CAMELLON	LCM	AMARILLO	DG 69D S ENTRE TV 41 Y TV 42	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		383	378	350	370	SI

OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior se adjuntan los formatos que acreditan el cumplimiento de lo establecido en el plan de calidad, Anexo 4: Plan de calidad / certificados de calidad.

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 14 de enero de 2025, a su vez se remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la secretaria Distrital de Movilidad con radicado SDM - 202561200175182 del 17 de enero de 2025. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200369961 del 30 de enero de 2025, informo que "*…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de implementación de elementos de señalización vertical, horizontal y dispositivos viales, mediante el Contrato del Asunto, se emite autorización a la propuesta…*" e indica que la vigencia de la autorización es desde *la fecha de la firma del presente Oficio hasta el 01 de enero de 2026*, igualmente dichas comunicaciones se adjuntan en el Anexo 5. Plan de manejo de tránsito (COI).

En el periodo de este informe que comprende desde el 23 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2025, se solicitaron planes de manejo de tránsito, los cuales junto con los PMTs vigentes de los periodos anteriores se relacionan con el respectivo resumen de los COI publicados por la SDM:

Tabla 16. Planes de manejo de tránsito vigentes

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN				
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
39	25-sep-25	27422	50009179	19000043	KR 67 CL 65 S	KR 67 AC 57R S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27422	50009179	19000043	KR 67 CL 65 S	KR 67 AC 57R S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27957	19000093	19012947	CL 58 S KR 67	CL 58 S KR 64B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27958	19000107	19000170	KR 64B CL 58 S	KR 64B CL 59 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27959	19000242	N/A	TV 64B CL 59 S	TV 64B CL 59A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27960	19000299	19000482	KR 65 CL 59A S	KR 65 CL 61 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27961	19000488	19000533	CL 61 S KR 65	CL 61 S KR 67	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27962	19000186	N/A	KR 65 CL 58 S	KR 65 CL 59 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27963	19000192	N/A	KR 65A CL 58 S	KR 65A CL 59 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27964	19000428	N/A	CL 60B S KR 67	CL 60B S KR 68	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27965	19000540	N/A	CL 61S KR 67	CL 61 S KR 68	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27966	19000649	19000690	CL 62BIS S KR 67	CL 62BIS KR 68B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27967	19000759	30000851	CL 62A S KR 67	CL 62A S 19000753	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27967	19000759	30000851	CL 62A S KR 67	CL 62A S 19000753	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27969	19012951	30000850	KR 68B CL 62BIS S	KR 68B CL 61 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN				
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
39	25-sep-25	27970	19000563	19012954	CL 61 S KR 68C	CL 61 S KR 70	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27971	19012941	50001555	KR 70 CL 61 S	KR 70 CL 65 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27972	50001556	50001557	CL 65 S KR 69C	CL 65 S KR 68C	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27973	19001306	50001559	KR 68C CL 65 S	KR 68C DG 62A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27974	19001305	N/A	CL 65 S KR 68C	CL 65 S KR 67	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27975	19001159	N/A	CL 63 S KR 68C	CL 63 S KR 67	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27976	6000300	40002075	CL 62C S KR 65C	CL 62C S KR 63	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	26/09/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27424	6000070	6001904	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27425	6000070	6001904	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27426	6000070	6001904	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27427	6000070	6001904	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27428	6001841	6001973	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27429	6001841	6001973	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27430	6001841	6001973	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27431	6001841	6001973	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27432	6001970	6001978	CL 58A S KR 24	CL 58A S KR 19C	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27432	6001970	6001978	CL 58A S KR 24	CL 58A S KR 19C	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27977	19000942	N/A	CL 62B S KR 70C	CL 62B S KR 70	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27977	19000942	N/A	CL 62B S KR 70C	CL 62B S KR 70	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27979	19001659	50001540	TV 70C CL 68S	TV 70C DG 67A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27980	19013598	N/A	TV 70 CL 68S	TV 70 CL 67B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27981	19001926	N/A	TV 69 CL 68S	TV 69 CL 68B S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27981	19001926	N/A	TV 69 CL 68S	TV 69 CL 68B S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27983	19013604	N/A	TV 64 CL 68S	TV 64 CL 67B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27436	19002650	N/A	KR 49 CL 68S	KR 49 CL 68A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27984	19011042	19010235	KR 27 CL 75B S	KR 27 CL 73 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27985	19010369	N/A	CL 73CBIS S KR 27	CL 73CBIS S KR 27BISA	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27986	19010242	19010115	DG 73B S KR 27A	DG 73B S TV 27B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN				
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERÍSTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
39	25-sep-25	27987	19010115	19010376	TV 27B DG 73B S	TV 27B CL 74B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27988	19010378	19010324	CL 74B S KR 27F	CL 74B S TV 27H	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27989	19010274	19009831	TV 27H CL 74B S	TV 27H KR 27B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025
39	25-sep-25	27990	19010105	19010045	KR 27B DG 73B S	KR 27B CL 73 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	3/10/2025	25/12/2025

Fuente: Elaboración a partir de la información de los COI de la SPMT de la SDM

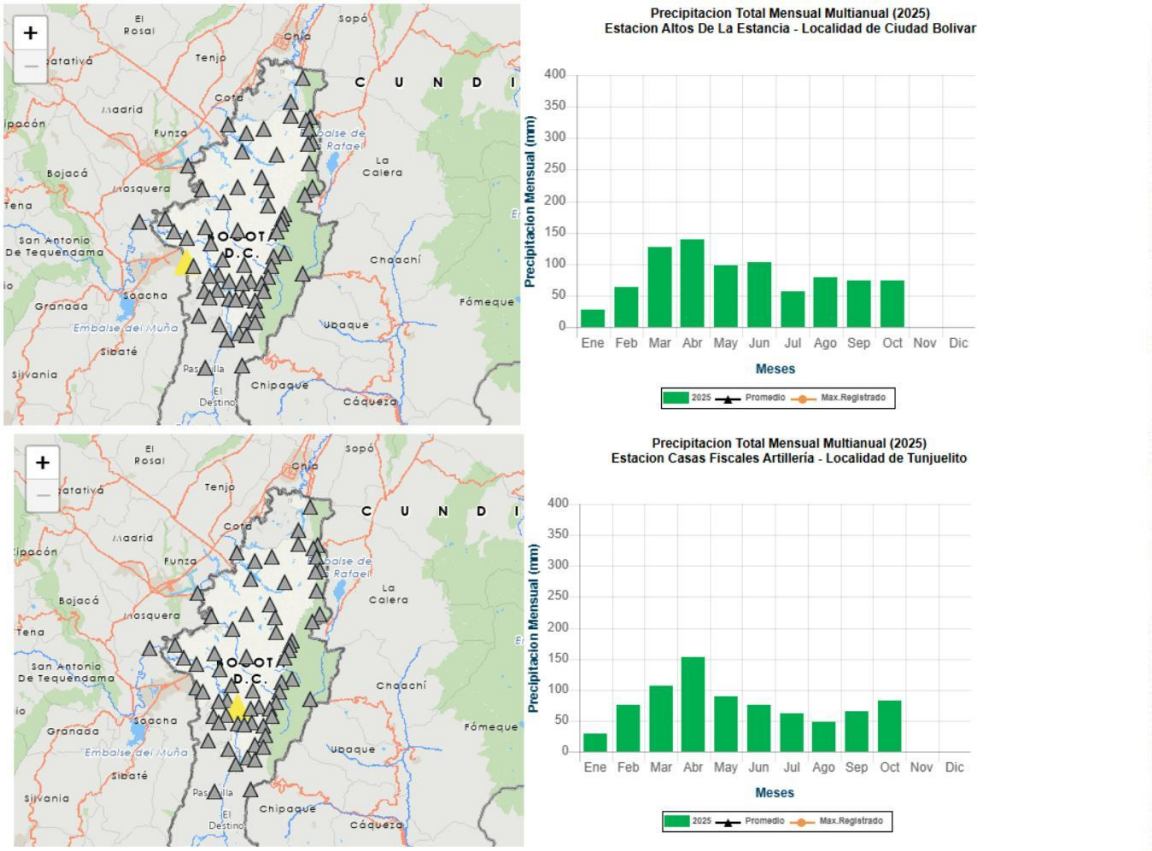
Igualmente, en el Anexo 5. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información complementaria.

9. ASPECTOS TÉCNICOS

9.1 ESTADO DEL CLIMA

En el periodo del presente informe se presentaron precipitaciones considerables en la zona de ejecución del contrato, lo cual generó afectación sobre las actividades de demarcación vial. En la figura 3, se muestran las estaciones ubicadas en las localidades del proyecto y la figura 4 muestra la distribución espacial de las precipitaciones durante el mes de octubre de 2025 en las localidades relacionadas.

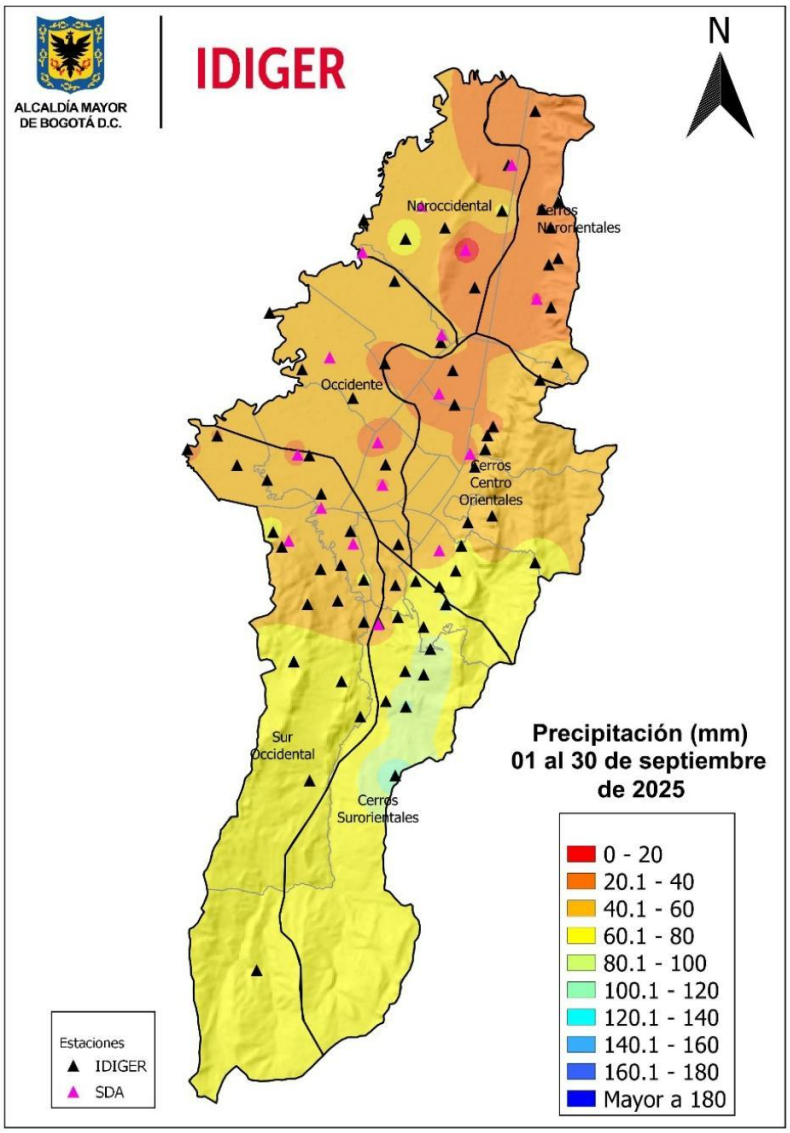
Figura 3. Precipitación mensual de la ciudad (Localidades Proyecto)



Fuente: tomado de IDIGER, agosto de 2025 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 3, que para el mes de octubre de 2025 se presentaron en la ciudad de Bogotá precipitaciones por encima de los 60 mm, para las localidades de intervención.

Figura 4. Precipitación mensual de la ciudad



Fuente: tomado de IDIGER, OCTUBRE de 2025 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 4, que para el mes de octubre de 2025 las precipitaciones en la ciudad de Bogotá estuvieron en promedio a los 60 mm, para las localidades de intervención. Cabe aclarar que las condiciones climáticas del presente periodo afecto de manera importante la ejecución de la señalización en los IDs asignados.

9.2 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES

Para el periodo del presente informe, en las inspecciones realizadas no se encontraron diseños que presentaran garantías inferiores o iguales a 6 meses

10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN

A continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS

En el Anexo 6. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2025:

Tabla 17. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	UNIDADES A INGRESAR A ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	2,58	$338.677	$108.817	N/A	$447.494	$1.154.535
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	10,00	$107.727	$34.613	10,00	$142.340	$1.423.400
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	7,00	$255.557	$82.111	7,00	$337.668	$2.363.676
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo	3,00	$404.556	$129.984	3,00	$534.540	$1.603.620

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	UNIDADES A INGRESAR A ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.						
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	4,00	$510.957	$164.170	4,00	$675.127	$2.700.508
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	1,00	$463.715	$148.991	1,00	$612.706	$612.706
15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	1,00	$276.409	$88.810	1,00	$365.219	$365.219
68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	550,96	$8.408	$2.701	550,96	$11.109	$6.120.615
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22	368,00	$10.967	$3.524	368,00	$14.491	$5.332.688

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	UNIDADES A INGRESAR A ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024						
TOTAL								**$ 21.676.966**

Fuente: Acta de Recibo a Satisfacción 9

10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA

Para el periodo del presente informe no se realizó la entrega de señales verticales retiradas.

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Este documento se incluye en el Anexo 7. y se denomina Informe de gestión social.

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

Este documento se incluye en el Anexo 8. y se denomina Informe de sistema de seguridad y salud en el trabajo.

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el periodo del presente informe no se presentaron afectaciones en redes de servicios públicos.

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

Durante el periodo del presente informe, se enviaron comunicados a las diferentes entidades observadas en la inspección de reservas, las cuales a la fecha aún no cuentan con respuesta.

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA)

En el Anexo 9. Bitácora de obra, se presenta copia de esta. en cada informe mensual y final, se tomará como evidencia de registro de las situaciones especiales y desarrollo en general del contrato.

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

En el Anexo 11. Hoja de vida del contrato, se presenta el formato de la hoja de vida del contrato de obra SDM-2024-3652, actualizado.

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

- Para el noveno mes del contrato, se ejecutó el 1,90 % del valor total del contrato, lo cual representa un 0,86 % inferior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.5 3.6. METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 2,76% para el noveno mes de ejecución.

- El avance parcial y acumulado respecto al mes 9 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.5 3.6. METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se tiene acumulado el 48,06 % el cual representa un valor de 13,74 % superior al valor programado que equivale al 34,32 % acumulado para el noveno mes del contrato.

- Durante el periodo de informe se realizó seguimiento a la vigencia de los PMT actuales y se gestionó la respectiva autorización por parte de la SPMT para los diseños que se asignaron y se programaron para ejecución, con el fin de que las implementaciones cuenten con los respectivos permisos de ejecución.

- A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado la entrega de 85 planos, 79 aprobados por SDM, 0 en revisión de SDM, 0 en revisión por interventoría, y 0 en atención de observaciones por el contratista. Actualmente se encuentran en desarrollo 8 planos de la cuenta N° 9.

18. ANEXOS

Anexo 1. Acta de obra y documentos para desembolso

Anexo 2. Pólizas

Anexo 3. Equipos mínimos

Anexo 4. Plan de Calidad

Anexo 5. Plan de manejo de Transito (COI)

Anexo 6. Comprobante ingreso a almacén y entrega de señalización retirada

Anexo 7. Informe de gestión social

Anexo 8. Informe sistema de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 9. Bitácora de obra

Anexo 10. Informe Ejecutivo Mensual 9

Anexo 11. Hoja de vida del contrato
