CONTRATO O CONVENIO No.	No. 052-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
NIT:	900431716-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2025 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II DE BUENAVENTURA, de conformidad con las especificaciones determinadas en el anexo técnico".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
No.001	01/10/2025	MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Desmonte de cielo raso (yeso cartón, superboard, pvc) y estructura existente en regular estado de conservación, retiro de iluminarias, aparatos electricos y redes electricas existentes. Los elementos retirados funcionales deberan ser entregados a la supervisión. Incluye disposición final de sobrantes.	M2	591,00	$ 15.353,28	$ 9.073.790,03	497,59	$ 7.639.639,90
1,2	Demolición y retiro de **piso de cerámica/granito**. Incluye: retiro de pega, plantilla, zócalos, doble enchape, lineales, aseo, retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	35,00	$ 24.452,28	$ 855.829,70	41,31	$ 1.010.001,30
1,3	Demolición y retiro de **enchape pared de cerámica**. Incluye: retiro de pega, zócalos, doble enchape, lineales,accesorios, desmonte y reinstalación de mediacaña pvc, aseo, retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	145,00	$ 18.665,92	$ 2.706.558,76	162,01	$ 3.024.066,10
1,4	Apertura de vano en muro mamposteria para puerta. Incluye perfilación de vano, filos, lista para instalación de ventana, aseo, retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.	M2	2,13	$ 86.144,68	$ 183.488,17	2,13	$ 183.488,17
2	**ACABADOS**						
2,1	Escarificación y/o raspado de pinturas o estuco o pañetes existente. Incluye: lineales, retiro puntillas, desmonte de elementos, retiro material sobrante y aseo de obra)	M2	20,00	$ 11.950,75	$ 239.015,06	40,00	$ 478.030,12
2,2	Suministro y aplicación de **pañete con relación 1:3** de baja permeabilidad Sika®-1 o similar, Incluye: metros lineales, mismo espesor que el existente para que quede nivelado, juntas, dilataciones, filos, resane y adecuación de zonas afectadas por humedades con producto impermeabilizante, sellante, aislante tipo sika impermuros o superior se debe garantizar una superficie uniforme lista para la posterior aplicación de estuco y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Aseo, retiro del material de la unidad a un	M2	20,00	$ 54.829,42	$ 1.096.588,32	48,73	$ 2.671.837,44

	lugar autorizado en el manejo de residuos o donde indique el supervisor.						
2,3	Suministro y aplicación de **estuco plástico acrílico** con resistencia al agua Incluye: filos, dilataciones, remates, lineales, preparación de la superficie materiales, herramientas necesarias para su correcta adherencia al muro y placa. Lijada y acabado superficie uniforme para aplicación pintura. Aseo, limpieza del sitio intervenido, protección de las zonas aledañas y retiro del material sobrante de la unidad	M2	20,00	$ 25.093,65	$ 501.872,96	48,73	$ 1.222.813,48
2,4	Suministro y aplicación de pintura antibacterial 100% acrílica, tipo corona / viniltex o superior color blanco, acabado satinado – máxima lavabilidad, alta resistencia a la humedad, vapor, grasa, manchas y a la formación de hongos, referencia de alta calidad. Procedimiento acuerdo ficha técnica de aplicación, acabado brillante, preparación de superficie, pintura minimo a 3 manos garantizando uniformidad y acabado liso. Incluye adecuación muros, alistado, resanes puntuales de superficie con estuco plastico, filos, dilataciones, lineales, remates, cortes, bordes. Incluye todas las actividades e insumos necesarios para su correcta ejecución.	M2	390,00	$ 34.329,65	$ 13.388.565,14	600,60	$ 20.618.390,31
2,5	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 tipo pintuco o superior, resistente al ataque de hongos y con alta lavabilidad minimo a tres manos. Asegurar uniformidad a la vista y tacto. Incluye: preparación de la superficie, lineales, materiales y herramientas necesarias para su correcta adherencia al muro y placa, aseo, limpieza del sitio y retiro del material sobrante de la unidad	M2	20,00	$ 24.412,84	$ 488.256,86	20,00	$ 488.256,86
2,6	Suministro, instalación y fijación de cielo raso en PVC color blanco liso unitono, uniforme, uniambiente, espesor 9mm promedio, a prueba de humedad, moho, humo, fuego, resistente a la corrosión, envejecimiento, debe contar con certificación de norma iso9001-2000 directamente por el fabricante. Incluye estructura metálica de soporte, por omegas máximo a cada 50cm, canal máximo cada 90cm, viguetas, acuerdo manual de instalación, con todos sus elementos, nivelada y anclada correctamente ,tornillería, uniones tipo "h", perfil perimetral tipo triangular para remate de uniones con muros existentes, tensores, soportes, perforaciones para la instalación de iluminación, uniones, terminaciones, sin dejar ningún luz, Incluye anclaje, soporte de cableado de iluminación existente que se encuentre en buen estado, los refuerzos metálicos que se requieran para mantener el cielo raso estable y no pierda nivelación, sin sobresaltos en toda su linealidad, sin ninguna dilatación, incluye tapa de inspección en lamina de PVC extraíble con reborde en marcos de color blanco aluminio en cada área acuerdo ubicación definida por la supervisión.Se debe garantizar la limpieza y cuidado de las areas intervenidas. Todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento. Disposición final de sobrantes.	M2	750,00	$ 119.748,04	$ 89.811.033,15	559,30	$ 66.974.937,42
2,7	Suministro, instalación y fijación de mediacañas rigidas - lisas 6cm color blanco ancladas a cielo raso y muros, sin dejar ninguna luz. Incluye soporte, sellado de filos, esquineros, lineales. Se debe garantizar la limpieza y cuidado de las areas intervenidas.	ML	1.000,00	$ 31.442,83	$ 31.442.832,00	565,58	$ 17.783.436,92
2,8	Suministro e instalación muro divisorio en lamina de superboard 10mm, vano de 17mm de ancho, acabado a dos caras, Incluye estructura en perfiles de apoyo en u, perfil c, viguetas, angulos, omegas, tornillería de fijación, cinta, acabados en estuco acrílico, lijado y pintura tipo 1 uniforme. Incluye fijación a piso, muros, vigas, refuerzos, remates, lineales, no se deben ver juntas o resaltos con los empalmes y muros existentes. Cualquier otro elemento necesario para su buen funcionamiento, limpieza del sitio y retiro del material sobrante de la unidad.	M2	2,13	$ 266.643,85	$ 567.951,40	5,07	$ 1.351.884,33
3	**PISOS Y ENCHAPES**						
3,1	Suministro e instalación de mediacaña prefabricada en granito pulido blanco o gris según referencia de piso, incluye demolición de lineal de pañete, corte para su instalación junta plástica o aluminio entre el piso existente y la mediacaña, debe quedar rasante contra el muro y el piso sin tropezón, se deben tener en cuenta todos los accesorios para su correcta instalación, los cortes deben quedar lineales y parejos.	ML	10,00	$ 73.138,48	$ 731.384,78	20,00	$ 1.462.769,56

	Posterior a su instalación se le debe dar un acabado sellado, pulido y cristalizado.						
3,2	Suministro y construcción de plantilla de nivelación E= 0.06mts promedio mortero 1:3 de baja permeabilidad con Sika®-1 o superior y Sikafloor-20N PurCem® NG o superior, acabado liso no esmaltado allanado para posterior instalación de piso, lineales, se debe garantizar los niveles hacia los sifones de desagüe. Incluye: lineales, juntas, sello impermeabilizado en borde sifones, mediacañas para cárcamos, cualquier material necesario requerido acuerdo ficha técnica para su buen funcionamiento, aseo y retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos.	M2	45,00	$ 63.136,61	$ 2.841.147,32	40,42	$ 2.552.107,93
3,3	Suministro y aplicación de impermeabilización a placa de piso con membrana plástica impermeable tipo sika o superior. Incluye juntas, bordes, rebordes, cortes y remates. Se debe contemplar previa limpieza y adecuación del área, limpieza y retiro de sobrantes.	M2	35,00	$ 49.786,77	$ 1.742.536,79	-	$ -
3,4	Suministro e instalación de enchape de piso cerámico antideslizante, color por definir, formato de 33.8x33.8cm, 45x45cm, 51x51cm o similar. Incluye: guardaescobas dentro de la misma área en planta, lineales, cortes, pega, boquilla, win aluminio, perfiles de dilataciones, cumplir norma sanitaria hospitalaria, el acabado final de la superficie del piso no debe tener ningún tipo de resalto en la junta con el piso del pasillo existente, aseo y retiro del material sobrante de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos.	M2	35,00	$ 151.592,39	$ 5.305.733,48	33,46	$ 5.072.584,39
3,5	Suministro e instalación rejilla de piso sifon en acero inoxidable para desague de 2”- 3"-4", anticucarachas y antiretorno cuadrada color plateado acabado brillante. Incluye corte enchape, resane, boquilla y remate.	UND	8,00	$ 75.302,65	$ 602.421,20	11,00	$ 828.329,14
3,6	Suministro e instalación de enchape de pared, color por definir, formato de 30x60cm, 30x90cm o similar. Incluye: lineales, bordes, rebodes, cortes, pega, boquilla, win aluminio, perfiles de dilataciones, adecuación y resane de muros con pañete impermeabilizado, aplomado, remates, se debe garantizar una superficie uniforme sin tropezones, aseo y retiro del material sobrante de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos.	M2	145,00	$ 151.703,19	$ 21.996.962,70	162,01	$ 24.577.433,97
3,7	Suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido blanco o gris según referencia de piso existente, incluye demolición de lineal de pplantilla, corte para su instalación junta plástica o aluminio entre el piso existente y la mediacaña, debe quedar rasante el piso sin tropezón, se deben tener en cuenta todos los accesorios para su correcta instalación, los cortes deben quedar lineales y parejos. Posterior a su instalación se le debe dar un acabado sellado, pulido y cristalizado.	ML	1,05	$ 91.680,88	$ 96.264,93	2,45	$ 224.618,17
3,8	Servicio de mantenimiento de mesón de dimensión 1.50m de ancho x .60m de profundidad x .10m de grosor, en concreto fundidas de con acabado en granito pulido. Consistente en: lavado general con producto desengrasante, desbaste, resane, retape zonas afectadas, destronque y nivelación mecánica, pulida, repulida mecánica hasta llegar a la pulida-brillada, quitando rayas, manchas, emboquillado, aplicación de producto protector, resina, cristalizada y cristalización química hasta llegar al brillo tipo espejo. Incluye el mantenimiento a los bordes, rebordes, lineales, remates, cantos.	UND	2,00	$ 283.405,90	$ 566.811,80	2,00	$ 566.811,80
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
4,1	Suministro e instalación de tanque almacenamiento de agua potable de 6,000Litros de dimensiones 220,5cm de ancho x 219,7 cm de alto, en material Polietileno, doble capa, resistente, higienico. Incluye tapa, flotador, automatico, conexiones, acoples, llave de paso, accesorios y todo lo necesario para su instalación y correcto funciona miento. Incluye, desmonte del tanque existente de 7,500litros y Disposición final de elementos acuerdo orden supervisor.	UND	1,00	$ 4.560.579,42	$ 4.560.579,42	1,00	$ 4.560.579,42
4,2	Suministro e instalación de red acomtida hidraulica a presión tuberia PVC pesada de 1/2" a 3/4". Incluye codos, uniones, llave de paso, cheque de paso, pegante, anclajes, reducción, tapón, accesorios, soportes en concreto cada 50cm y todo lo necesario para su instalación. Desmonte de red hidraulica existente y disposición de sobrantes.	ML	15,00	$ 26.538,04	$ 398.070,56	15,00	$ 398.070,56

4,3	Suministro e instalación de red acomtida hidraulica a presión tuberia PVC pesada de 1"a 2 1/2". Incluye codos, uniones, llave de paso, cheque de paso, pegante, anclajes, reducción, tapón, accesorios, soportes en concreto cada 50cm y todo lo necesario para su instalación. Desmonte de red hidraulica existente y disposición de sobrantes.	ML	20,00	$ 39.650,95	$ 793.018,99	20,00	$ 793.018,99
4,4	Suministro e instalación de red acomtida hidraulica a presión tuberia GALVANIZADA de 1/2" a 3/4". Incluye accesorios del mismo material, codos, uniones, llave de paso, cheque de paso, pegante, anclajes, reducción, tapón, soportes en concreto cada 50cm y todo lo necesario para su instalación.Desmonte de red hidraulica existente y disposición de sobrantes.	ML	15,00	$ 123.475,95	$ 1.852.139,24	15,00	$ 1.852.139,24
4,5	Suministro e instalación de red acomtida hidraulica a presión tuberia GALVANIZADA de 1"a 2 1/2". Incluye accesorios del mismo material, codos, uniones, llave de paso, cheque de paso, pegante, anclajes, reducción, tapón, soportes en concreto cada 50cm y todo lo necesario para su instalación. Desmonte de red hidraulica existente y disposición de sobrantes.	ML	20,00	$ 157.705,23	$ 3.154.104,52	20,00	$ 3.154.104,52
4,6	Servicio de mantenimiento de redes sanitarias. Consistente en: **sondeo**, desobstrucción y limpieza de tuberías de diámetro variable, desde el punto de desagüe hasta la caja de registro. Con equipo destape y sondas mecánicas para tuberías de sanitarios, orinales, lavamanos, sifones y alcantarillado, sin afectar la red y aparatos sanitarios. Incluye regata de piso y muro si es necesario, cambio de rejilla de piso, sifón y todo lo necesario para la ejecución y el funcionamiento del sistema sanitario. Incluye retiro de residuos y limpieza final.	UND	12,00	$ 204.659,33	$ 2.455.912,01	12,00	$ 2.455.912,01
4,7	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" de presión y accesorios, (uniones, codos, Tee, Yee, Pegante, limpiador, reductores, etc), la cual deben cumplir la NTC 1339 y NTC 382. Incluye: el suministro e instalación de hasta 3 metros de tubería para conexión, regata por muro y piso, resanes y todo lo necesario para su buen funcionamiento, aseo y retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos.	UND	6,00	$ 71.542,22	$ 429.253,32	9,00	$ 643.879,98
4,8	Suministro e instalación de punto hidráulico de 1" de presión y accesorios, (uniones, codos, Tee, Yee, Pegante, limpiador, reductores, etc), la cual deben cumplir la NTC 1339 y NTC 382. Incluye: el suministro e instalación de hasta 3 metros de tubería para conexión, regata por muro y piso, resanes y todo lo necesario para su buen funcionamiento, aseo y retiro del material de la unidad a un lugar autorizado en el manejo de residuos. Para instalación de fluxometro de palanca de sanitario.	UND	6,00	$ 98.842,86	$ 593.057,18	8,00	$ 790.742,90
4,9	Suministro e instalación de registro con válvula de bola de 1/2" en acero. Incluye: tapa plastica de registro de 20 X 20cm, accesorios,uniones, acoples y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incuye desmonte de valvula existente.	UND	6,00	$ 101.693,84	$ 610.163,02	-	$ -
4,10	Suministro e instalación de registro con válvula de bola de 3/4" en acero. Incluye: tapa plastica de registro de 20 X 20cm, accesorios, uniones, acoples y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Incuye desmonte de valvula existente.	UND	1,00	$ 115.248,02	$ 115.248,02	-	$ -
4,11	Suministro e instalación de **Sanitario institucional tipo corona Kit Taza Adriática Plus** o mejores características, entrada superior con fluxómetro palanca 4.8 Lts. compuesto por: Taza Adriática Plus Entrada Superior, alongada a piso de altura ADA, con sistema de conexión antivandálico (entrada superior) y alta eficiencia en consumo de agua 3.5 Lpf (0.92 gpf). con descarga por sistema jet, con capacidad de evacuación de 1000 grs. de sólidos y sifón 100 % esmaltado. Fluxómetro Palanca 4.8 Lts: con un consumo de agua de 4.8 litros por descarga sin importar las variaciones de presión. Su tipo de accionamiento es manual mediante palanca y es compatible con tazas de entrada superior. Asiento institucional Forte: Un asiento de aro abierto ergonómico, de fácil instalación, limpieza y mantenimiento. Con herrajes reforzados y con mayor grosor y ancho del aro. Incluye: Accesorios, herrajes, boquilla, silicona, desmonte aparato existente, conexión a punto sanitario e hidráulico, y todo lo necesario para su instalación y perfecto funcionamiento.Incluye desmonte del existente sin afectar el aparato sanitario y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios.	UND	6,00	$ 2.339.401,45	$ 14.036.408,71	8,00	$ 18.715.211,62

4,12	Suministro e instalación de Orinal tipo corona Arrecife o mejores características, de entrada superior dimensión de 57,2cm x 30cm, sifón cubierta dentro del aparato y Grifería para Orinal tipo corona push metálica, presión máxima 80PSI, vida útil de la unidad de cierre 150mil ciclos, o de mejor características, tipo institucional con kit de instalación, silicona, boquilla, así como todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye desmonte del existente sin afectar el aparato sanitario y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios.	UND	4,00	$ 1.005.460,16	$ 4.021.840,65	5,00	$ 5.027.300,81
4,13	Suministro e Instalación de lavamanos para discapacitado con semiPedestal blanco acabados y material en porcelana sanitaria, incluye kit de instalación y accesorios de conexión a red sanitaria y red hidráulica existente, grifería metálica tipo push anti vandálica para lavamanos institucional, acabado brillante Tráfico Pesado Institucional con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, soporta más de 150mil ciclos de uso, permite graduación de caudal en 7 posiciones. Incluye: boquilla, silicona, accesorios, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye desmonte del existente sin afectar el aparato sanitario y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios.	UND	4,00	$ 688.691,88	$ 2.754.767,52	6,00	$ 4.132.151,28
4,14	Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer blanco acabados y material en porcelana sanitaria, incluye kit de instalación y accesorios de conexión a red sanitaria y red hidráulica existente, grifería metálica tipo push anti vandálica para lavamanos institucional, acabado brillante Tráfico Pesado Institucional con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, soporta más de 150mil ciclos de uso, permite graduación de caudal en 7 posiciones. Incluye: boquilla, silicona, accesorios, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye desmonte del existente sin afectar el aparato sanitario y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios.	UND	2,00	$ 627.769,11	$ 1.255.538,22	2,00	$ 1.255.538,22
4,15	Suministro e instalación de juego de accesorios porcelanicos ref. astro x 3 unidades (Jabonera;Portarrollos;Gancho doble) color blanco acabados porcelanico sanitario. Incluye anclaje, silicona, boquilla, desmonte de accesorios existentes.	UND	6,00	$ 105.425,39	$ 632.552,35	8,00	$ 843.403,13
4,16	Suministro e instalación kit de barras de seguridad y apoyo en acero inoxidable 304 acabado satinado, consistente en 01 barra abatible dimensión 70cm, y 02 barras de seguridad con mango antideslzante de dimensión 60cm. Incluye accesorios de instalación.	UND	1,00	$ 628.032,11	$ 628.032,11	1,00	$ 628.032,11
4,17	Suministro e instalación de espejo biselado, pulido tipo flotante 5MM, dimensión ,80m x 1,00m aprox. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios, corte, cinta led perimetral luz calida, conexión electrica interruptor independiente, soportes y todos los accesorios requeridos para correcto funcionamiento.	UND	4,00	$ 473.274,85	$ 1.893.099,39	5,00	$ 2.366.374,24
4,18	Suministro e instalación de espejo biselado, pulido tipo flotante 5MM, dimensión 1,40m x 1,00m aprox. Incluye: desmonte existente, fijación, accesorios, corte, cinta led perimetral luz calida, conexión electrica interruptor independiente, soportes y todos los accesorios requeridos para correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 776.827,73	$ 1.553.655,46	3,00	$ 2.330.483,19
4,19	Suministro e instalación de llave metalica cromo tipo jardin 1/2" x 3/4" para lavadero. Incluye desmonte del existente y cierre de puntos hidráulicos y sanitarios.	UND	2,00	$ 76.456,14	$ 152.912,28	3,00	$ 229.368,42
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
5,1	Suministro, instalación y puesta en servicio de **acometida principal de red eléctrica** para iluminación compuesta cable de cobre 1N12 CU-AWG- HFFRLS fases + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS neutro + 1N12 CU-AWG-DESN tierra (libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), incluye tubería SCH40 de 3/4 pulgada rígida, accesorios de conexión SCH40 (caja de paso, curvas, conectores, adaptadores, terminal, prensa estopa, elementos de fijación, uniones) y accesorios para fijación grapas, abrazaderas a pared y/o techo. El contratista entregará certificado de conformidad de la distribución de las redes acuerdo norma Retie y los materiales a utilizar en la instalación.	ML	350,00	$ 30.365,18	$ 10.627.812,46	215,00	$ 6.528.513,37

5,2	Suministro e instalación de **salida de iluminación** en cable de cobre 1N12 CU-AWG- HFFRLS fases + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS neutro + 1N12 CU-AWG-DESN tierra (libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), Incluye hasta 5 metros de acometida y tubería SCH40 de 3/4 pulgada rígida, accesorios de conexión SCH40 (caja de paso, curvas, conectores, adaptadores, terminal, prensa estopa, elementos de fijación, uniones) y accesorios para fijación grapas, abrazaderas a pared y/o techo. El contratista entregará certificado de conformidad de la distribución de las redes acuerdo norma Retie y los materiales a utilizar en la instalación.	UND	108,00	$ 38.762,54	$ 4.186.353,91	101,00	$ 3.915.016,16
5,3	Suministro e instalación de **salida de corriente 110V** en cable de cobre 1N12 CU-AWG- HFFRLS fases + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS neutro + 1N12 CU-AWG-DESN tierra (libre de halógenos, retardante a la llama, baja emisión de humos), Incluye hasta 3 metros de acometida y accesorios de conexión SCH40. El contratista entregará certificado de conformidad de la distribución de las redes acuerdo norma Retie y los materiales a utilizar en la instalación.	UND	10,00	$ 68.947,40	$ 689.474,04	10,00	$ 689.474,04
5,4	Suministro, instalación y puesta en servicio de **luminaria led redonda de incrustar de 18 vatios** (100-227)v, eficacia 65 lm/w temperatura del color 6500k (blanco), flujo luminoso mínimo de 1170 lúmenes, fp>0.5, irc 70, ángulo de apertura 120°, vida útil de 25.000 horas, garantía en Colombia por defectos de fabricación, perdida prematura del nivel de luminosidad, cambio del matiz de color, incluye soporte en aluminio color y cable encauchetado hasta circuito ramal.	UND	86,00	$ 38.071,64	$ 3.274.160,87	52,00	$ 1.979.725,18
5,5	Suministro, instalación y puesta en servicio de **luminaria led redonda de incrustar de 24 vatios** (100-227)v, eficacia 65 lm/w temperatura del color 6500k (blanco), flujo luminoso mínimo de 1680 lúmenes, fp>0.5, irc 70, ángulo de apertura 120°, vida útil de 25.000 horas, garantía en colombia por defectos de fabricación, perdida prematura del nivel de luminosidad, cambio del matiz de color, incluye soporte en aluminio color y cable encauchetado hasta circuito ramal.	UND	22,00	$ 52.740,40	$ 1.160.288,73	49,00	$ 2.584.279,45
5,6	Suministro e instalación de sensor de movimiento techo 360°, sobreponer, color blanco. Incluye acometida y conexión a red electrica , anclaje en cielo raso.	UND	2,00	$ 64.886,69	$ 129.773,38	2,00	$ 129.773,38
5,7	Suministro e instalación de sistema de alarma emergencia tipo sirena 110V, PVC color negro, nivel de sonido 128DB, distancia de cobertura 120m. Incluye anclaje en muro o techo, red de conexión electrica y audio hasta el punto del amplificador(aprox 100m).	UND	3,00	$ 148.431,16	$ 445.293,47	3,00	$ 445.293,47
5,8	Suministro e instalación de sistema de audio tipo parlante de techo empotrar 6w/100v sonido ambiental, redondo color blanco, sensibilidad 90DB, unidad de altavoz de 5,25 pulgadas, carcada ABS y rejilla de malla de hierro, respuesta de frecuencia de 90HZ a 20kHZ. Incluye anclaje en techo, red de conexión electrica y audio hasta el punto del amplificador(aprox 100m).	UND	3,00	$ 532.069,23	$ 1.596.207,69	3,00	$ 1.596.207,69
5,9	Suministro, instalación, cambio y puesta en servicio de interruptor sencillo o doble referencia cygnus o superior color blanco fabricado con materiales 56%hierro, 32%policarbonato, 7%polipropileno y 5% cobre, antinfamable. Incluye desmonte del existente, conexión a red eléctrica y fijación del mismo.	UND	40,00	$ 37.237,33	$ 1.489.493,36	31,00	$ 1.154.357,35
5,10	Suministro, instalación, cambio y puesta en servicio de tomacorriente 110V color blanco de referencia cygnus o superior, color blanco fabricado con materiales policarbonato antinfamable. Incluye desmonte del existente, conexión a red eléctrica y fijación del mismo. Cambio de	UND	37,00	$ 39.055,86	$ 1.445.066,67	60,00	$ 2.343.351,36
5,11	Suministro, instalación, cambio y puesta en servicio de tomacorriente doble 110V regulado color naranja de referencia veto, o superior, fabricado con materiales policarbonato antinfamable. Incluye desmonte del existente, conexión a red eléctrica y fijación del mismo.	UND	7,00	$ 45.058,93	$ 315.412,54	20,00	$ 901.178,68
5,12	Suministro, instalación, cambio y puesta en servicio de tomacorriente 110V GFCI color blanco de 20amp. Incluye desmonte del existente, conexión a red eléctrica y fijación del mismo.	UND	4,00	$ 70.928,88	$ 283.715,50	2,00	$ 141.857,75
5,13	Suministro e instalación de canaleta eléctrica plástica para red electrica y de datos, color blanco referencia 100x45mm. Incluye accesorios de anclaje, soportes, tapa, esquineros, terminales, desmonte de la existente y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	ML	50,00	$ 80.960,08	$ 4.048.003,90	50,00	$ 4.048.003,90

5,14	Suministro e instalación de canaleta eléctrica plástica para red electrica y de datos, color blanco referencia 60x45mm. Incluye accesorios de anclaje, soportes, tapa, esquineros, terminales, desmonte de la existente y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	ML	10,00	$ 61.536,44	$ 615.364,38	10,00	$ 615.364,38
5,15	Suministro e instalación de sistema de presión tanque vertical hidroneumático vertical de 300 litros, con membrana intercambiable en goma butílica para uso alimenticio vt 300, flujo de salida 280 litros/minuto, potencia 5.5 hp, caudal máximo 280 l/min, presión máxima 87 psi, suministro e instalación de 01 electrobomba centrifuga de 5.5hp 220/440 v trifásico, motor bobinado en cobre con alta eficiencia premium y de trabajo continuo por 24 horas, incluye manómetro, presostato, conexiones. Suministro e instalación de tubería y accesorios para la instalación de los nuevos elementos incluye soportes cada 50cm para tubería de presión para conexión de tanques de almacenamiento a bombas, 09 valvulas pvc, 02 valvulas de cortina, kit de instalación y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento. Incluye acarreo, desmonte y disposición de sobrantes.	UND	1,00	$ 11.539.744,22	$ 11.539.744,22	1,00	$ 11.539.744,22
5,16	Servicio de mantenimiento preventivo y/correctivo al sistema de bombeo hidráulico existente, consistente en el mantenimiento a la bomba centrifuga de 5,5 hp existente mediante cambio de manómetro de presión, cambio de filtros, lubricación, verificación de fugas, cambio empaques, válvulas, verificación de presión de sellos, mejoramiento de sistema eléctrico, cambio de breaker afectado y todo lo necesario para su funcionamiento.	UND	1,00	$ 2.297.285,40	$ 2.297.285,40	1,00	$ 2.297.285,40
5,17	Servicio de mantenimiento general a todo costo de la estación de bombeo de agua nivel freático del establecimiento de sanidad, consistente en: Achique del pozo de recolección dimensión aproximada de 1.50m x 3.00m x 3.00m de profundidad. Incluye limpieza y remoción de residuos, verificación de tubería sanitaria y accesorios (incluye reemplazo de accesorios desgastados, con fugas, mal estado etc.), así mismo inspección y mantenimiento de 03 electrobombas sumergibles de achique entre 02 y 05 hp, el cual incluye: Inspección de Motor, Impulsor, Sellos, Conductos de succión. Mantenimiento consistente en Limpieza, Desmonte de los componentes de la bomba y limpiarlos, Lubricar las piezas que lo requieran, cambio de piezas rotas o desgastadas, Limpiar los conductos de succión, cambio de los cables y conexiones eléctricas afectadas. Comprobar si hay signos de desgaste o corrosión en el motor, Reemplazar cualquier pieza que esté desgastada o dañada. Asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado y funcionando correctamente, Reemplazo y engrase de sellos mecánicas de la electrobomba, Rebobinado en caso de ser requerido de las bombas cuyas mediciones eléctricas de amperajes presenten parámetros fuera de los establecidos. Se debe realizar pruebas de funcionamiento para garantizar el rendimiento óptimo de la bomba. Verificar el caudal, la presión y la eficiencia de la bomba. Asegurarse de que la bomba esté funcionando correctamente y cumpla con los requisitos de rendimiento. Incluye disposición de sobrantes y residuos.	UND	1,00	$ 5.178.886,68	$ 5.178.886,68	1,00	$ 5.178.886,68
5,18	Servicio de mantenimiento de redes de sanitaria de caja de inspección. Consistente en: sondeo, desobstrucción y limpieza de cajas de inspección, tuberías de diámetro variable, desde el punto de desagüe hasta el pozo de registro. Con equipo destape y sondas mecánicas para tuberías sanitarias y alcantarillado, sin afectar la red y aparatos sanitarios. Incluye regata de piso si es necesario ante posible taponamiento y todo lo necesario para la ejecución y el funcionamiento del sistema sanitario-alcantarillado. Incluye retiro de residuos y limpieza final.	UND	1,00	$ 197.342,23	$ 197.342,23	1,00	$ 197.342,23
6	**CARPINTERIA METALICA**						
6,1	Suministro e instalación de hoja de puerta batiente en PVC, semimaciza reforzada y acústica, medidas de (.80m a 1.00m x 2.00m a 2.10m de alto), color blanco, hospitalaria auto extinguible atóxico conforme norma d.i.n. 21.3.73/2.6.82 y 25.4.93, Acabado certificado para uso sanitario, color blanco, herrajes según norma, cerradura con frontal en acero inoxidable, 03 bisagras en acero inoxidable. Conformada por un tablero completo macizo en PVC, con lamina de protección de alta resistencia color blanco brillante. Incluye desmonte de	UND	10,00	$ 1.352.226,58	$ 13.522.265,81	11,00	$ 14.874.492,39

	hoja de puerta en madera y bisagras existente, adecuación de marco metálico existente, se debe dar acabado marco en pintura poliuretano color blanco. El contratista deberá verificar medidas en el sitio a instalar y garantizar que la hoja no quede con fricciones, en el piso o en el marco, no deseadas y debe cerrar de manera suave y no presentar obstrucciones a la apertura. Disposición de sobrantes.						
6,2	Suministro e instalación de puerta batiente en PVC, semimaciza reforzada y acústica, medidas de (.80m a 1.00m x 2.00m a 2.10m de alto), color blanco, hospitalaria auto extinguible atóxico conforme norma d.i.n. 21.3.73/2.6.82 y 25.4.93, Acabado certificado para uso sanitario, color blanco, herrajes según norma, cerradura con frontal en acero inoxidable, 03 bisagras en acero inoxidable. Conformada por marco y un tablero completo macizo en PVC, con lamina de protección de alta resistencia color blanco brillante. Incluye desmonte de marco y puerta en madera y bisagras existente, adecuación de vano. El contratista deberá verificar medidas en el sitio a instalar y garantizar que la hoja no quede con fricciones, en el piso o en el marco, no deseadas y debe cerrar de manera suave y no presentar obstrucciones a la apertura. Disposición de sobrantes.	UND	1,00	$ 1.970.691,19	$ 1.970.691,19	1,00	$ 1.970.691,19
6,3	Suminstro e instalación de puerta plomada metalica calibre 16, sistema abatible a una hoja de ,91 x 2,03m. Incluye plomo interno de 1,5mmPb, Marco Plomado metalico, Pintura electroesttica anticorrosiva color blanco, cerradura acero inoxidable, 04 bisagras acero inoxidable. Incluye desmonte de puerta en madera existente, marco metalico y adecución de vano.	UND	1,00	$ 5.554.294,15	$ 5.554.294,15	1,00	$ 5.554.294,15
6,4	Mantenimiento y adecuación de lavamanos en acero inoxidable instalado de dimensiones 2,10m largo x ,70m de profundidad x ,32m de alto. Consistente en limpieza del acero inoxidable con producto químico hasta quitar manchas, suministro e instalación de soportes complementarios de piso o pared en acero inoxidable que permitan su estabilidad y fijación. Suministro e instalación de 02 grifería metalica acabado cromo tipo lavaplatos mezclador nogal de manijas tipo palanca, incluye kit de instalación, mangueras, sifón, canastilla. Se debe contemplar el desmonte y monte, así mismo como adecuación, resane y acabados de las zonas afectadas.	UND	1,00	$ 418.605,51	$ 418.605,51	1,00	$ 418.605,51
7	**CARPINTERIA MADERA**						
7,1	Mantenimiento de protector de camilla en madera, consistente en desmonte, lijada, aplicación de masilla, tintilla y barniz acuerdo color elección, acabado brillante, cambio de tornillería, montaje y fijación en muro. Se debe garantizar la conservación del elemento y no afectar el acabado de pintura existente muro.	ML	60,00	$ 37.217,78	$ 2.233.066,80	60,00	$ 2.233.066,80
7,2	Mantenimiento de carpintería en madera de puertas dimensiones (,90 a 1,00 X 2,00 a 2,10m) consistente en cambio de hoja de puerta entamborada en madera acabado en pintura poliuretano color blanco, cerradura en acero inoxidable, 03 bisagras en acero inoxidable, adecuación de marco metálico existente, se debe dar acabado marco en pintura poliuretano color blanco. Los acabados deben ser óptimos con la superficie totalmente lisa y uniforme en color. Incluye desmonte de puerta existente y bisagras. Disposición de sobrantes.	UND	5,00	$ 472.603,89	$ 2.363.019,43	5,00	$ 2.363.019,43
8	**ACTIVIDADES ADICIONALES**						
AD 01	Desmonte y disposición de listones de madera (casetón de esterilla) existentes en placa de concreto de contrapiso. Incluye disposición final.	M2		$ 6.380,00		438,21	$ 2.795.779,80
AD 02	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para adecuación de lavamanos consultorio. Incluye accesorios, regata y resane.	UND		$ 188.025,00		2,00	$ 376.050,00
AD 03	Suministro e instalación de aislante térmico para red de tubería de cobre de 1/4". Incluye desmonte del aislante existente.	ML		$ 47.370,00		20,00	$ 947.400,00
AD 04	Suministro e instalación de división modular de dimensiones 6,50m x 2,35m en perfilería de aluminio pesado y paneles de pvc macizo color definido por la entidad, puerta en aluminio y vidrio templado 4mm con logo representativo de la entidad.	UND		$ 17.171.800,00		1,00	$ 17.171.800,00

	Incluye desmonte, limpieza y reinstalación de vidrios existentes, retiro y disposición final de sobrantes.						
AD 05	Suministro e instalación de tapa plastica de registro color blanca de dimensión de 20X20cm.	UND		$ 47.500,00		12,00	$ 570.000,00
AD 06	Suministro e instalación de extractor de techo 4" de incrustar color blanco. Incluye conexión electrica.	UND		$ 150.000,00		3,00	$ 450.000,00
AD 07	Suministro e instalación de enchape de piso porcelanato, color por definir, formato de 30x60cm o similar. Incluye: Lineales, rebordes, cortes, pega, boquilla, win aluminio, perfiles de dilataciones, el acabado final de la superficie del pso no debe tener ningún tipo de resalto en la unta con el piso del pasillo existente, aseo y retiro del material sbrante de la unidad a un lugar autorizado en el maneo de residuos.	UND		$ 169.745,02		6,96	$ 1.181.425,34
AD 08	Servicio de mantenimiento correctivo de motobomba sumergible marca IHM de 5.5 HP. Consistente en la rectificación de rotor y torno, encamisado de cunas de rodamiento y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND		$ 2.492.000,00		1,00	$ 2.492.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 301.711.019,77**		**$ 308.592.027,25**
	ADMINISTRACIÓN	21,67 %			$ 65.370.720,95	21,67%	$ 66.871.892,31
	IMPREVISTOS	2,00%			$ 6.034.220,40	2%	$ 6.171.840,55
	UTILIDAD	5,00%			$ 15.085.550,99	5%	$ 15.429.601,36
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00 %			$ 2.866.254,69	19%	$ 2.931.624,26
	TOTAL CONTRACTUAL				**$ 391.067.766,80**		**$ 399.996.985,72**

2.1. OBSERVACIONES

- Se realiza acta de inicio del contrato el día 01 de julio de 2025 con la asistencia de la señora Delegataria del Gasto, usuario y supervisor local en las instalaciones objeto a intervenir.
- Se realiza el inicio de las actividades de obra el día 07 de julio de 2025, acuerdo cronograma inicial establecido.
- Se realiza el nombramiento el día 08 de julio de 2025 del supervisor técnico del contrato al señor TF Munive Terán Alvaro Alfonso de profesión Arquitecto orgánico de la Oficina de Planeación de la Brigada de Infantería No.2.
- Se efectúa comité de seguimiento de avance de obra el día 24 de julio de 2025 con la asistencia del Director de Obra y Supervisores. Verificando las actividades acuerdo cronograma y generando compromisos.
- Se efectúa comité de seguimiento de avance de obra el día 15 de agosto de 2025 con la asistencia del Director de Obra y Supervisores. Verificando las actividades acuerdo cronograma y generando compromisos.
- Se efectúa comité de seguimiento de avance de obra el día 08 y 30 de septiembre de 2025 con la asistencia del Director de Obra y Supervisores. Verificando las actividades acuerdo cronograma y generando compromisos.
- Se realizó modificación #1 para la modificación del anexo técnico – económico y tiempo de ejecución de obra.
- Se efectúa comité de seguimiento de avance de obra el día 15 y 23 de octubre de 2025 con la asistencia del Director de Obra y Supervisores. Verificando las actividades acuerdo cronograma y generando compromisos.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 391,067,766.80
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 8.929.218,92
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 399.996.985,72

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
OBRA	$ 399.996.985,72

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2025	6025	29/01/2025	$400.000.000,00	10825	13/06/2025	$391,067,766.80
VIGENCIA 2025	6025	29/01/2025	$400.000.000,00	10825	01/10/2025	$399.996.985,72

4.1. OBSERVACIONES

Se realizó adición presupuestal del CDP inicial para comprometer el saldo pendiente adicionando un valor de $ 8.929.218,92 al contrato.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORRO	07983148373

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	04 MESES
FECHA FINALIZACIÓN INICIAL CONTRATO O CONVENIO	30 DE OCTUBRE 2025
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DIAS
FECHA FINALIZACIÓN FINAL CONTRATO O CONVENIO	14 DE NOVIEMBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101472530
FECHA EXPEDICIÓN:	16 DE OCTUBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2025	14/03/2026	$79.999.397,14
CALIDAD SERVICIO	01/07/2025	14/03/2026	$79.999.397,14

PAGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/07/2025	18/11/2028	$19.999.849,29
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	18/11/2025	18/11/2030	$79.999.397,14

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	21-40-101256762
FECHA EXPEDICIÓN:	17 DE OCTUBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PEDIDOS LABORALES Y OPERACIONES	01/07/2025	14/11/2025	$284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
001	FV 240	12/08/2025	N/A	$ 77.500.234,65
002	FV 243	09/09/2025	N/A	$ 74.698.765,61
003	FV 248	14/10/2025	N/A	$137.232.711,74
			VALOR TOTAL	$ 289.431.712,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				**PAGADO**			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
PARCIAL	2025	$ 77.500.234,65	-	-	-	-	$ 77.500.234,65

PARCIAL	2025	$ 74.698.765,61	-	-	-	-	$ 74.698.765,61
PARCIAL	2025	$137.232.711,74	-	-	-	-	$137.232.711,74
PARCIAL			-	-	-	-	

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 399.996.985,72
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 289.431.712,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 289.431.712,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 110.565.273,72
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

SE HAN EFECTUADO LOS TRAMITES DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL MES TRANSCURRIDO, ACUERDO PLANEAMIENTO DE FACTURACIÓN.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE HAN EFECTUADO Y TRAMITADO 03 ACTA DE PAGO PARCIAL ACUERDO ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL, ANEXOS TECNICOS Y CANTIDADES EJECUTADAS.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN:

- Verificación de los documentos administrativos iniciales presentados en el contrato.
- Verificación de los materiales acuerdo fichas técnicas
- Verificación informe semanales del contratista y actividades de seguridad y salud en el trabajo por parte del inspector de seguridad del contrato.
- Reunión semanal de comité obra con el contratista y usuario
- Verificación semanal de ejecución de actividades de obra
- Verificación de la calidad de los trabajos realizados
- Verificación del cronograma de obra
- Verificación de cantidades para el acta de recepción parcial
- Recorridos de obra con el usuario y actas de entrega parciales.
- Realización de actas de comité de obra, ponencia y oficios de seguimiento ejecución contractual.

ACTIVIDADES DE OBRA:

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas soportes del presente informe:

- Desmonte de cielo raso.
- Demolición y retiro de piso de cerámica.
- Demolición y retiro de enchape pared.
- Escarificación y/o raspado de pinturas o estuco o pañetes existente.
- Suministro, instalación y fijación de mediacañas rígidas - lisas 6cm color blanco.
- Suministro y construcción de plantilla de nivelación E= 0.06mts promedio.
- Suministro e instalación de enchape de piso cerámico antideslizante.
- Suministro e instalación de enchape de pared.
- Servicio de mantenimiento de mesón.
- Suministro e instalación de tanque almacenamiento de agua potable de 6,000Litros.

- Suministro e instalación de punto hidráulico de 1”.
- Suministro e instalación de Sanitario institucional.
- Suministro e instalación de Orinal tipo corona Arrecife.
- Suministro e Instalación de lavamanos para discapacitado.
- Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer blanco.
- Suministro, instalación y puesta en servicio de acometida principal de red eléctrica.
- Suministro e instalación de salida de iluminación.
- Suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led redonda de incrustar de 18 vatios.
- Suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria led redonda de incrustar de 24 vatios.
- Suministro e instalación de puertas pvc.
- Suministro e instalación de puerta plomada
- Suministro e instalación de puerta plomada.
- Suministro e instalación de sirenas tipo emergencia.
- Suministro e instalación de sensores de movimiento.
- Suministro e instalación de división modular.
- Suministro e instalación de parlantes con conexión a amplificador.
- Pañete impermeabilizado para muros.

12. APORTES PARAFISCALES

ACTUALIZADOS A LA FECHA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

ACTUALIZADOS A LA FECHA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A LA FECHA NO SE HAN PRESENTANDO SITUACIONES O NOVEDADES RELEVANTES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL **72,36 %**

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

SE ACTUALIZA CRONOGRAMA DE OBRA ACUERDO MODIF#1, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE VERIFICA EL AVANCE DE EJECUCIÓN ACUERDO CRONOGRAMA PROYECTADO Y NO SE EVIDENCIA NOVEDAD A LA FECHA.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PARA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME DE ACUERDO A SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SE EVIDENCIA UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUERDO EL PROGRAMADO. SE MANTIENE SEGUIMIENTO SEMANAL POR PARTE DE LA SUPERVSIÓN VERIFICANDO AVANCES Y EJECUCIÓN DE OBRA.

18. ANEXOS

CERTIFICADO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

19. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS INSTITUCIONALES



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS INSTITUCIONALES



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PVC



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PVC



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON SEMIDESTAL



APLICACIÓN DE ESTUCO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS NISCELADOS



APLICACIÓN DE ESTUCO



LIMPIEZA Y PULIDA DE MEDIACAÑA PREFABRICADA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLOMADA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLOMADA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES



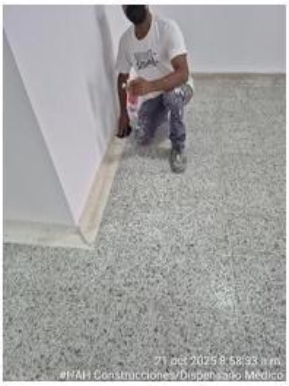
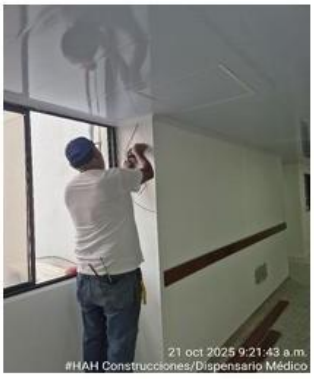
MANTENIMIENTO MESÓN GRANITO PULIDO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBATEX



SEGUIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO

		
LIMPIEZA Y BRILLADA DE MEDIACAÑA PREFABRICADA Y GRANITO BOCA PUERTAS	LIMPIEZA Y BRILLADA DE MEDIACAÑA PREFABRICADA Y GRANITO BOCA PUERTAS	PULIDA Y BRILLADA DE MESONES
		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENAS TIPO EMERGENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENAS TIPO EMERGENCIA	ILUMINACIÓN POSO DE ACHIQUE
		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO



SOPORTES DE CONCRETO PARA TUBERIA GALVANIZADA CUARTO DE MOTOBOMBAS



APLICACIÓN DE ESTUCO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y MEDIACAÑA BATERIAS SANITARIAS PRIMER PISO



SALIDAS DE ILUMINACIÓN AREA ALMACEN



SALIDAS DE ILUMINACIÓN AREA ALMACEN



SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO AREA ALMACEN



SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO AREA ALMACEN



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MODULAR



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN MODULAR



MANTENIMIENTO MESÓN ACERO INOXIDABLE



MANTENIMIENTO MESÓN ACERO INOXIDABLE



MANTENIMIENTO MESÓN ACERO INOXIDABLE



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTORIES DOBLES Y SENCILLOS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS



DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO Y PARED BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO



DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO Y PARED BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO



DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO Y PARED BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED



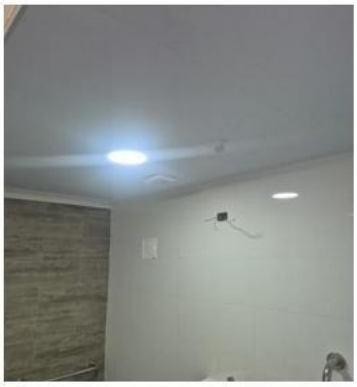
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTIDESLIZANTE



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE ANTIDESLIZANTE



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS INSTITUCIONALES

		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS INSTITUCIONALES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL
		
SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES BATERIAS SANITARIAS TERCER PISO

Atentamente,

Teniente de Fragata, Munive Terán Alvaro Alfonso
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO N° 052-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025

Suboficial Primero, **Duran Guzman Fabio Alberto**
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO N° 052-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
