OFICIO N° 181-SG-2024-ML–272

Bogotá D.C., 2 de octubre de 2025

CABA INTERVENTORIA
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ
CIUDAD


REFERENCIA: **CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."**

ASUNTO: ACTIVIDADES ELÉCTRICAS PISO 1

Teniendo en cuenta nuestros compromisos contractuales y debido a los compromisos adquiridos en comité, se explican las actividades a realizar por parte la eléctrica para sus conocimientos y fines pertinentes:

Para finalizar las actividades asociadas a la instalación del sistema de detección de incendios, se requiere realizar el enlace al tablero principal (ubicado en el pasillo de la morgue) de los lazos del sistema de detección de incendio que se encuentran en cada piso y para programar al personal que instaló el panel de control de detección par que realice la integración de la instalación realizada, así como la programación del nuevo lazo instalado. Para poder realizar esta instalación, se requiere realizar las siguientes actividades:

1. Corte de drywall para instalación de escotillas de inspección en el pasillo: debido a que en esta área no existe como hacer el pase de tubería hacia el cuarto donde está el panel de control de alarmas de incendios, se requiere de la apertura de dos escotillas de inspección para poder realizar las actividades de instalación de tubería, cableado, y acceso al cuarto donde está el panel. La apertura de las escotillas incluye la instalación de marco y tapa de escotillas. **Actividad a realizarse durante el sábado 04 de octubre desde las 08:00am**
2. Instalación de tubería EMT para la interconexión del sistema instalado con el panel de control. **Actividad a realizarse durante el sábado 04 de octubre a partir de las 08:00am**
3. Instalación de cableado para el sistema de detección e interconexión entre el sistema actual y la instalación realizada. **Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de las 08:00am hasta el martes 07 de octubre a las 04:00pm**
4. Instalación de estrobo y estación manual: Se realizará la instalación de la estación manual y la sirena con luz estroboscópica en el muro que se encuentra justo al lado de los ascensores. **Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de las 08:00am hasta el miércoles 08 de octubre a las 14:00**

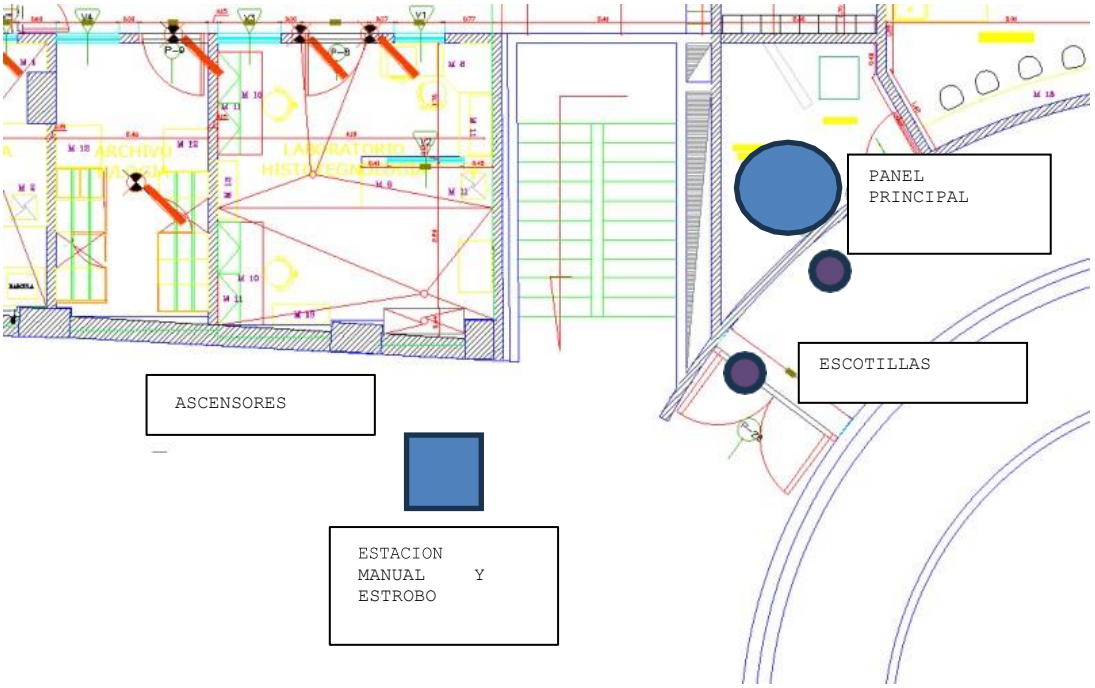

Se aclara que la estación manual quedará al lado de los ascensores, spor lo que se solicita autorización para realizar actividades también en este sector. No se puede incluir un trazado probable debido a que al hacer las escotillas se determinará la ruta debido a que no se tiene certeza de las bandejas que se encuentren en este sector. Igualmente solicitamos se nos facilite la entrada al cuarto técnico que se encuentra en la morgue.

Además de esta actividad, se propone el cambio de 20 lámparas en las oficinas del piso 1, para lo cual se solicita aprobación de esta actividad para poder coordinar la sustitución de estas lámparas.

Cualquier duda con gusto será atendida

Atentamente,

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C.79.450.592 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT. 901.778.196-2
