INFORME DE INTERVENTORIA



PERIODO:

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.

INTERVENTORIA:

EN IMPACTO S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA N° 3314-2024

CONSORCIO EL CARMEN

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3314-2024 **Contratista:** CONSORCIO EL CARMEN

Contrato de Interventoría No. 3428-2024 **Interventoría:** EN IMPACTO S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** SEPTIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		18
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	29
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	30
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	31
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	32
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	33
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	42
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	43
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	44
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		59
5.1	Información general del contrato		60
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		61
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	78
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	79
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	80
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	81
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas		
7	**Conclusiones y recomendaciones**		85
8	**Anexos**		85
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		85
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		85
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		101

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 065 de fecha 13/09/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 3314 DE 2024
OBJETO: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 23/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2025
PLAZO ACUMULADO: 6,74

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 716.666.457,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 257.733.543,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 974.400.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3428-2024 **INTERVENTOR** EN IMPACTO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Demoliciones de estructuras	m3	10
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	Und	8
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	5002
Remoción derrumbes incluye disposicion	m3	1000
Conformación de taludes existentes	m2	300
Conformación de calzada	m2	45000
Afirmado	m3	1346,5
Excavaciones varias sin clasificar	m3	250
Excavaciones varias en roca seco	m3	50
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	75
Relleno para estructuras con recebo	m3	1400
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	2,42
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	m3	25
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	1736,75
Tuberia de plastico tipo pvc, norma ntc 5055 astm f794 de diametro 900 mm	m	19,5
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; Recubrimiento de Zinc (Galvanizado)	m3	20
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	m3-km	1000
Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000m), medidos a partir de cien metros (100m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3-km	5000

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES ANTERIOR	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Demoliciones de estructuras	m3	0		
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	Und	1		1
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	0		0
Remoción derrumbes incluye disposicion	m3	0		0
Conformación de taludes existentes	m2	0		0
Conformación de calzada	m2	20865		20865
Afirmado	m3	133		133
Excavaciones varias sin clasificar	m3	0		0
Excavaciones varias en roca seco	m3	0		0
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	4876,68		4876,680121
Relleno para estructuras con recebo	m3	20		20
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0		0
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	m3	6,1	-6,1	0
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	0		0
Tuberia de plastico tipo pvc, norma ntc 5055 astm f794 de diametro 900 mm	m	6	-6	0
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; Recubrimiento de Zinc (Galvanizado)	m3	0		0
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	m3-km	0		0
Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000m), medidos a partir de cien metros (100m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	m3-km	1956,2		1956,16
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	515,0		515
Excavaciones varias sin clasificar	m3	4140,1	5,9	4146,02
Excavaciones varias en roca seco	m3	7623,5	6780,07	14403,57021

RELLENO CON ARENA (FILADELFIA)	m3	7,7	-7,7	0
TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) (FILADELFIA)	m3	45,0		45
Sacos suelo cemento para cuneta, canales de agua lluvia en tierra	m3	69,1		69,12
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	245,0	33,6	278,58
Tuberia de drenaje 4"	ml	136,1	-136,1	0
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	54,4	5,9	60,32
Excavación en material comun de la explanación y canales (sin botadero ni transporte)	m3	10764,6	22,5	10787,1
Remoción derrumbes incluye	m4	1413,9		1413,87

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA		TOTAL	ACUMULADO
OBRAS					
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					
ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					
VALOR EJECUTADO					

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 967.331.042,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 967.330.345,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERAD 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **6**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Samaria en el Municipio de Filadelfia






Alto del Volcán en el Municipio de Aguadas





Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

RIO MAIBA FILADELFIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre ARTURO JURADO ALVARAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 1720209860CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

La atención de los sitios críticos de las vías en el Departamento de Caldas es un tema fundamental en el contexto de la infraestructura vial, la seguridad y el desarrollo económico de la región. Caldas, ubicado en el corazón de Colombia, posee una topografía montañosa y una red vial que conecta importantes municipios, con otras regiones del país.

Las vías de Caldas son esenciales para el transporte de bienes y personas, pero también son susceptibles a una serie de factores que pueden poner en riesgo su funcionalidad y seguridad, tales como la geología, las condiciones climáticas, el crecimiento urbano desordenado y los fenómenos naturales como deslizamientos, inundaciones o desbordamientos de ríos.

En este sentido, la atención de los sitios críticos de las vías se convierte en una prioridad para las autoridades locales, regionales y nacionales. Se requiere un enfoque integral que combine el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial, así como la implementación de medidas para la reducción de riesgos y la mejora de la conectividad.

La identificación de estos puntos críticos, su monitoreo constante y la intervención oportuna son cruciales para garantizar la seguridad vial, evitar pérdidas humanas y materiales, y asegurar que el flujo comercial y turístico no se vea interrumpido.

El análisis y la coordinación efectiva de los sitios críticos en Caldas abarca aspectos como la estabilidad de taludes, el control de erosión, la adecuada señalización, la rehabilitación de puentes y la optimización de la red de drenaje, busca asegurar que las vías del departamento sean seguras, eficientes y resilientes ante los retos geográficos y climáticos que enfrentan.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($754.400.000).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en obras para realizar la **ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS**

Las obras se adelantan a través del contrato de obra N° 3314-2024. a cargo de CONSORCIO EL CARMEN identificado con NIT: 901.960.444 - 4 y representado legalmente por LUIS

URBANO SÁNCHEZ OLIVELLA identificado con C.c 1.010.208.191 de Bogotá D.C. El contrato de interventoría está a cargo de EN IMPACTO SAS. identificado con NIT 901798124-8 y representado legalmente por WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS a través del contrato N.º 3428-2024

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

El contrato será desarrollado en la red vial terciaria administrada por el Instituto Nacional de Vías, Dirección Territorial Caldas. Las vías objeto de atención están ubicadas en el departamento de Caldas, en lo referente a la Red Terciaria.

Dado que no existe una ubicación predecible de los sitios donde se requieran las obras, para el suministro de materiales se consideran distancias promedio en toda la red a los centros urbanos, siendo decisión final del contratista la escogencia de la fuente de los materiales en cada sitio intervenido.



Fuente: Anexo técnico SA-MC-DT-CAL-005-2024

2.2 MUNICIPIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN

Red Terciaria:

Red Terciaria:

49021	Aguadas	Armas - Salineros	3,80
49022	Aguadas	Coca de Huevo - Mermita	29,30
49023	Aguadas	Aguadas - Rio Arriba	25,75
47581	Anserma	Bellavista - Tamarbia - El Vergel	3,80
47584	Anserma	Anserma - La Rica	18,75

47701	Aranzazu	Aranzazu-San Rafael	7,80
46501	Belalcázar	Belalcázar-Patio Bonito-La Cascada-La Zainera-Alto Bonito	13,25
46621	Chinchina	La Estrella- Bajo Español	4,65
48181	Filadelfia	Samaria - Alto Mira	4,85
48187	Filadelfia	Maiba-Llanadas	13,20
49381	La Dorada	Guarinosito - Los Guaduales	3,35
49382	La Dorada	Km 12 - San Miguel	28,45
49383	La Dorada	El Pencil - Buenavita	9,70
47104	Manizales	Alto El Guamo-Hoyo Frio	9,75
48781	Marmato	El Llano - La Central	4,25
48782	Marmato	Marmato - Cabras - La Miel	12,50
47941	Marquetalia	La Quiebra - El Placer	10,15
47942	Marquetalia	Marquetalia - La Florida	4,10
47943	Marquet-Pensilvan	Marquetalia - Rio La Miel	10,20
47821	Marulanda	Marulanda-Manzanares	9,10
47822	Marulanda	Mesones - Monte Bonito	9,53
47341	Neira	Llano Grande - La Isla	9,90
47343	Neira	Neira - Pueblo Rico	4,70
47345	Neira	Cementos Caldas - Tapias - La Cristalina	15,45
47349	Neira	San Luis - Trocadero - Pan de Azucar	8,30
48901	Pacora	Las Coles - Mateguadua - San Lorenzo	13,05
48904	Pacora	Las Coles El Castillo	2,95
48905	Pacora	Pacora - La Mica	14,40
46981	Palestina-Chinchin	Santa Gueda-La Esmeralda	10,10
49141	Pensilvania	Bolivia- El Higueron- Rio La Miel	20,70
49142	Pensilvania	San Pablo - Morron - La Esperanza	6,15
49143	Pensilvania	Los Medios - Agua Bonita - La Palma	7,35
49144	Pensilvania	Pensilvania-Puente Linda (Sector Pensilvania - Pueblo Nuevo	42,25

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

48304	Rio Sucio	Sipirra - La Iberia-Portachuelo	8,00
48305	Rio Sucio	Rio Sucio - El Oro	3,85
48308	Rio Sucio	San Lorenzo - Pasmi	4,05
47223	Risaralda	Los Naranjos- El Paraiso	6,10
47224	Risaralda-Anserma	Risaralda - La Rica	7,35
48541	Salamina	La Amoladora - El Limon - Maciegal	3,00
48544	Salamina	San Felix - Valle Alto	21,80
49269	Samaná	Berlin - San Diego - San Roque - Rio Samana	24,95
49270	Samaná	Rancho Largo - Confines - Cañaveral	21,35

Las obras se adelantaron para este periodo en la red terciaria fueron las siguientes:

1. **FILADELFIA – SAMARIA ALTO MIRA**
2. **AGUADAS- RIO ARRIBA - EL VOLCAN**
3. **PENSILVANIA- PUEBLO NUEVO**

Mitigar el riesgo en los sitios críticos de **Caldas** ofrece varios **beneficios** tanto para la comunidad como para la infraestructura y el desarrollo económico de la región. Algunos de los principales beneficios incluyen:

1. Mejora de la seguridad vial: Reducir los riesgos de deslizamientos, inundaciones o fallas en la infraestructura vial mejora la seguridad de los conductores y peatones, reduciendo el número de accidentes y aumentando la confianza en las rutas.

2. Protección de vidas humanas: Al mitigar los riesgos en sitios críticos, se disminuye la probabilidad de desastres naturales, como deslizamientos de tierra o inundaciones, lo que contribuye a salvaguardar las vidas de los habitantes y usuarios de la vía.

3. Reducción de daños materiales: La intervención temprana en estos puntos críticos previene daños significativos a la infraestructura vial y edificaciones cercanas, evitando costos elevados de reparación o reconstrucción en el futuro.


4.Fortalecimiento del desarrollo económico: Al garantizar vías más seguras y estables, se facilita el transporte de bienes y servicios, lo que contribuye al crecimiento económico de la región y mejora la conectividad entre municipios, favoreciendo el comercio local y regional.

5. Menor interrupción de servicios: La mitigación de riesgos reduce la interrupción de los servicios básicos, como transporte, suministros de alimentos, y acceso a otras infraestructuras esenciales, permitiendo una mayor estabilidad en la región.

6. Aumento de la resiliencia frente a desastres naturales: Las obras de mitigación mejoran la capacidad de la región para hacer frente a eventos extremos, aumentando la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos climáticos y geológicos adversos.

7. Mejor calidad de vida: La reducción de riesgos y la mejora de la infraestructura contribuyen a un entorno más seguro y habitable, lo que eleva la calidad de vida de los residentes de las áreas afectadas por los puntos críticos.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA OBRA

SECTOR EL VOLCAN	       
FILADELFIA- SAMARIA ALTO MIRA	 

PENSILVANIA PUEBLO NUEVO	    

3. **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**

El contrato cuyo objeto es la **ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS** adjudicado al CONSORCIO EL CARMEN, representado legalmente por **LUIS URBANO SÁNCHEZ OLIVELLA** por valor de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($716.666.457); tuvo su acta de inicio el día 23 de septiembre de 2024.

3.1 **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
Contrato de Obra N.º:	3314-2024
Contratista:	CONSORCIO EL CARMEN NIT 901.960.444-4 LUIS URBANO SANCHEZ OLIVELLA C.C 1.010.208.191 de Bogotá D.C

Plazo Inicial:	3 meses
Fecha de Inicio:	23 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación:	22 de diciembre de 2024
Prórroga 1:	15 de Febrero de 2025
Prórroga 2:	6 de Julio de 2025
Prórroga 3:	22 de Agosto de 2025
Fecha de Suspensión 1:	Del 21 de Enero de 2025 al 10 de Febrero de 2025
Fecha de Suspensión 2:	Del 06 de Marzo de 2025 al 06 de Abril de 2025
Fecha de Suspensión 2 (ampliación 1 de la suspensión 2):	Del 04 de Abril de 2025 al 05 de Mayo de 2025
Fecha de Suspensión 3:	Del 04 de Julio de 2025 al 30 de Julio de 2025
Fecha de Suspensión 3 (ampliación 1 de la suspensión 3):	Del 29 de Julio de 2025 al 15 de Agosto de 2025
Fecha de Suspensión 3 (ampliación 2 de la suspensión 3):	Del 15 de Agosto de 2025 al 20 de Agosto de 2025
Valor Inicial:	$ 716.666.457
Adición No. 1:	$ 37.733.543
Adición No. 2:	$ 220.000.000
Valor actual:	$ 974.400.000
Nombre Interventor:	EN IMPACTO SAS NIT 901798124-8
Nombre Supervisor:	LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO Ingeniera en transporte y Vías Dirección territorial de Caldas

Las actividades contractualmente pactadas son las siguientes:

No.	DESCRIPCIÓN
1	Demoliciones de estructuras
2	Limpieza de Alcantarillas con diámetro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles
3	Excavación en material común de la explanación y canales
4	Remoción derrumbes incluye disposición
5	Conformación de taludes existentes
6	Conformación de calzada
7	Afirmado
8	Excavaciones varias sin clasificar
9	Excavaciones varias en roca seco
10	Relleno para estructuras con material de excavación
11	Relleno para estructuras con recebo
12	Concreto Resistencia 14MPa (F)
13	Concreto reforzada resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ
14	Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.
15	Tubería de plástico tipo PVC, norma ntc 5055 astm f794 de diámetro 900 mm
16	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; Recubrimiento de Zinc (Galvanizado)
17	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3
18	Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m), medidos a partir de cien metros (100m) (Analizado para volqueta de 6 m3)

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este lapso de tiempo han ejecutado las siguientes actividades de obra:

SEMANA del 01 al 06 de septiembre del 2025

Durante esta semana se ejecutaron actividades de excavación en roca seco en el sector de Pueblo Nuevo, con el objetivo de avanzar en la conformación de la vía y la adecuación de la plataforma vial. Se empleó maquinaria pesada tipo retroexcavadora y martillo hidráulico para la remoción del material rocoso, garantizando la estabilidad de los taludes y la seguridad de los trabajadores. Los trabajos se desarrollaron de manera continua en diferentes puntos del frente de obra, priorizando los sectores con mayor dureza del terreno. Adicionalmente, se realizaron labores de limpieza y retiro del material producto de la excavación para mantener las zonas de tránsito despejadas y permitir el ingreso de maquinaria y vehículos de apoyo.












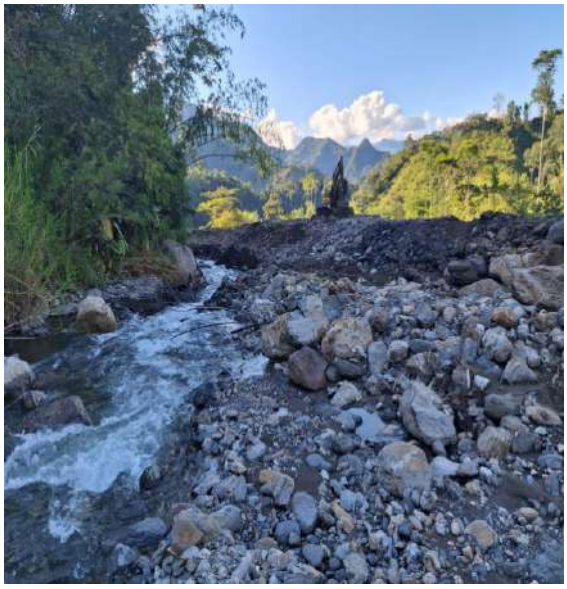






SEMANA del 08 al 13 de septiembre del 2025

En la segunda semana del mes se dio continuidad a las labores de excavación en roca en el sector de Pueblo Nuevo, con el propósito de completar la apertura de la vía en los tramos más críticos. Se mantuvo el trabajo con maquinaria especializada para la fragmentación del material rocoso, complementando con el retiro y transporte del material excedente hacia los puntos de disposición autorizados.
Paralelamente, se efectuaron actividades de perfilado y adecuación de taludes, con el fin de minimizar riesgos de deslizamiento y garantizar la estabilidad de la zona intervenida.

Durante este periodo también se adelantaron labores de limpieza del corredor vial y nivelación de la superficie, asegurando que los sectores intervenidos quedaran en condiciones óptimas para las siguientes fases constructivas.













EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

SEMANA del 15 al 20 de septiembre del 2025

En esta semana las actividades se enfocaron principalmente en la excavación de material común sobre la vía de acceso al sector de Samaria, en el municipio de Filadelfia. El material removido fue cargado y transportado de forma controlada hacia los sitios designados, con el propósito de mantener la limpieza y funcionalidad del frente de obra.
Se desarrollaron acciones de control topográfico para verificar los niveles de excavación y las pendientes requeridas, asegurando que los trabajos se ejecutaran conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Asimismo, se realizaron intervenciones menores en zonas aledañas donde se requería ajustar el perfil de la vía y mejorar el drenaje superficial, preparando el terreno para las actividades de conformación de base y subbase granular.

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

SEMANA del 22 al 30 de septiembre del 2025

Durante la última semana del mes se avanzó con la excavación de zanjas para la instalación de filtros y sistemas de drenaje, en la zona del Alto del Volcán en empleando material granular drenante y geotextil no tejido para garantizar la adecuada filtración y evacuación de aguas.

Las labores incluyeron la instalación de geotextil en la base de los filtros, extendido de capas de material filtrante, y compactación del mismo conforme a las especificaciones técnicas. Estas actividades se ejecutaron con acompañamiento del personal de interventoría, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y control de obra.

El cierre de mes dejó listos varios tramos con la estructura de drenaje completamente instalada y la plataforma vial preparada para recibir las capas de material granular en las siguientes etapas constructivas.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS O AJUSTADOS


Se incluyeron los siguientes ítems, los cuales ya fueron aprobados:

No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UN	VALOR UNITARIO
3P	210-13P	Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	$ 8.625,95
8P	600-13P	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 25.812,73
9P	600-13P	Excavaciones varias en roca seco	m3	$ 35.933,57
	610.10	RELLENO CON ARENA (FILADELFIA)	m3	$ 136.077,40
	630.1.7	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa) (FILADELFIA)	m3	$ 445.272,60
	NP-1F	Sacos suelo cemento para cuneta, canales de agua lluvia en tierra (FILADELFIA)	m3	$ 224.460,50
	232.1 F	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE (FILADELFIA)	m2	$ 10.588,45


	NP-3 FA	Tuberia de drenaje 4" (Filadelfia)	ml	$	30.208,59
	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	m3	$	104.850,00

3.4 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

AVANCE PRESUPUESTAL

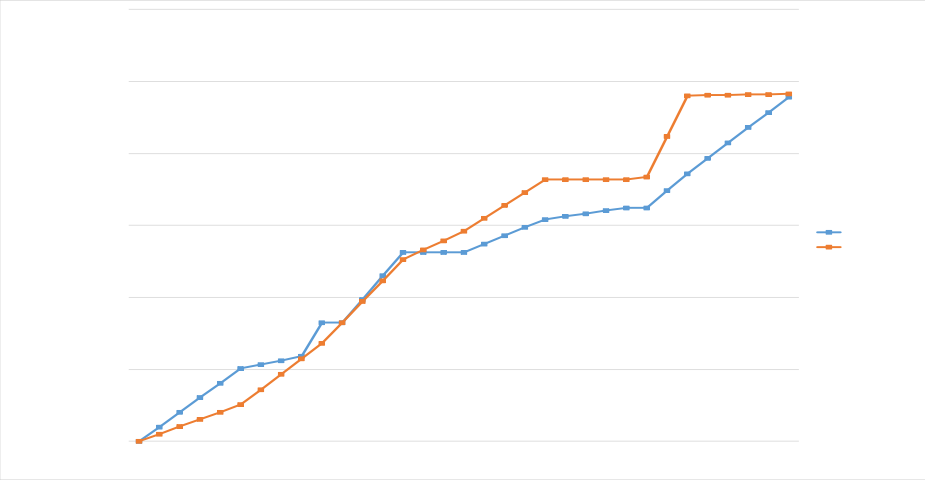

AVANCE FISICO PORCENTAJE

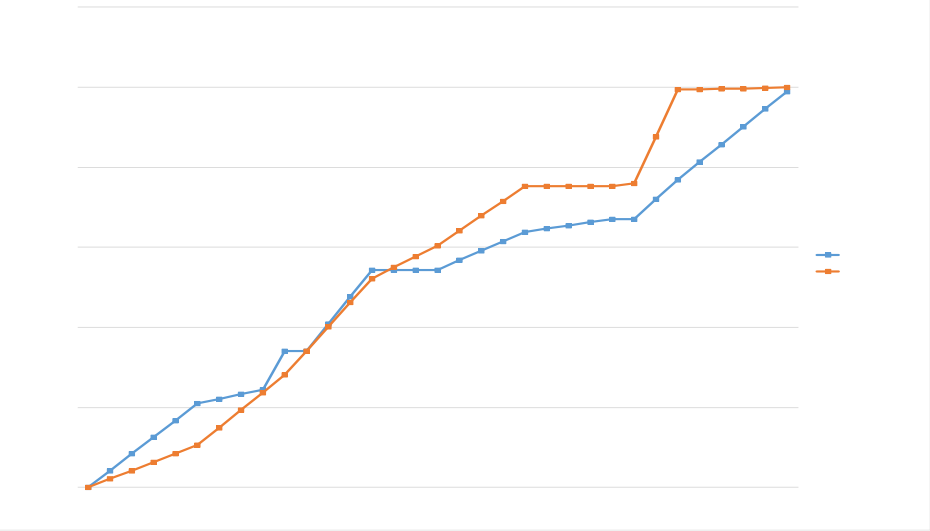

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se anexan al contenido de este informe los siguientes **formatos** suscritos por los responsables:

- MINFRA-MN-IN-15-FR-2: Resumen mensual estado general del proyecto.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-3: Informe Semanal.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-4: Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-6: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra Contrato de Obra.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-8: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-10: Estado General del Tiempo.
- MINFRA-MN-IN-15-FR-12: Garantías y seguros de obra.
- MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2: Seguimiento Programa de inversión.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 44 del 1 sep al 6 sep (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Intervenir los sitios críticos identificados durante la visita con INVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con este proyecto se busca mitigar los riesgos presentes en las vías terciarias del departamento de Caldas, mejorando la seguridad vial y contribuyendo a la protección de los usuarios de las rutas. La intervención permitirá reducir los peligros asociados a condiciones adversas de la infraestructura, promoviendo una circulación más segura y eficiente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN			INTERVENTOR:	EN IMPACTO SAS		
INTEGRANTES:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA - SOCAFER SAS			INTEGRANTES:	WILMER ARBEY ORTEGA CANAS		
CONTRATO No.	3314 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 716.666.457	CONTRATO No.	3428-2024	VALOR INICIAL:	$ 59.003.259,00
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 257.733.543	FECHA DE INICIO:	25/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 50.996.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 974.400.000	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 110.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 754.400.000	$ 220.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 749.770.188	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.629.812	$ 220.000.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 25.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 5.909.746		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 19.090.254		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.331.042	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 813.219.631	84,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 800.080.720,44	82,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 13.138.910,37	1,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 813.219.631	84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 800.080.720	83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 13.138.910,37	1,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.260.171,56	5,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.749.874,84	5,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/09/2025
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 95.911.238,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.437.567,30	75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.305.564,14	20%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.305.564,15	20%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Septiembre
VALOR FACTURA: $ 16.527.820,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,42% — Avance o Atraso Físico %: 0,91%
Meta Física Ejecutada %: 6,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,47			Prog			$ 87.117,96	$ 87.117,96	0,01%
					Ejec			$ 37.944,71	$ 37.944,71	0,00%
Excavaciones varias en roca seco	m3	1695,02			Prog		$ 51.582.639,74		$ 51.582.639,74	5,33%
					Ejec		$ 60.908.029,99		$ 60.908.029,99	6,30%
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA	m3	8,40			Prog			$ 243.004,93	$ 243.004,93	0,03%
					Ejec			$ 88.942,98	$ 88.942,98	0,01%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	m3	1,47			Prog			$ 353.868,75	$ 353.868,75	0,04%
					Ejec			$ 154.129,50	$ 154.129,50	0,02%
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	5,63			Prog	$ 174.344,25			$ 174.344,25	0,02%
					Ejec	$ 52.303,28			$ 52.303,28	0,01%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llanta	1	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Samaria en el Municipio de Filadelfia
TRAMO Y/O SECTOR (3): Alto del Volcán en el Municipio de Aguadas
TRAMO Y/O SECTOR 2: Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACION: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Según visita con Corpocaldas, se indicaron estas recomendaciones sobre el lugar a intervenir RIO MAIBA
- No se podra dragar el cauce, se podra usar material de áreas de depositos de sedimentos o islas dentro del cauce, pero no sepodrá remover más de 40cm de material.
- No se puede realizar cortes en la margenes tanto izquierda y derecha que afecte la rugosidad de la corriente o afecte la geomorfologia del cause o la rugosidad de la corriente.
-No talar arboles, guaduas o material vegetal forestal, que sean objetos de permiso de aprovechamientoforestal.
- No comercializar material extraido
- Se debe evitar aportes de sedimientos y vertimientos de cualquier tipo contaminante sobre el cauce y areas de protección ambiental.
- Avisar a los vecinos las actividades a los vecinos, coordinar actividades para no afectar a terceros.
-Obra debe ser por la orilla , evitando generar contracciones y obstrucciones en el cauce, que impida el libre transito del ag ua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

ON DE SOSTENIBILIDAD

ZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En la actividad

ALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara

SICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

STRO FOTOGRÁFICO





Alto del volcán en el Municipio de Aguadas



Samaria en el Municipio de Filadelfia



Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

cantidades y

DESCRIBIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: ARTURO JURADO ALVARÁN SERNA

Matrícula Profesional No.: 1720209860 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 45 del 8-sep al 13-sep (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI -1

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTERBLANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Intervenir los sitios críticos identificados durante la visita con INVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con este proyecto se busca mitigar los riesgos presentes en las vías terciarias del departamento de Caldas, mejorando la seguridad vial y contribuyendo a la protección de los usuarios de las rutas. La intervención permitirá reducir los peligros asociados a condiciones adversas de la infraestructura, promoviendo una circulación más segura y eficiente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN		
INTEGRANTES:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA - SOCAFER SAS		
CONTRATO No.	3314 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 716.666.457
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 257.733.543
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 974.400.000
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	EN IMPACTO SAS		
INTEGRANTES:	WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS		
CONTRATO No.	3428-2024	VALOR INICIAL:	$ 59.003.259,00
FECHA DE INICIO:	25/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 50.996.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 110.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 754.400.000	$ 220.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 749.770.188	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.629.812	$ 220.000.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 25.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 5.909.746		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 19.090.254		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.331.042	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 866.479.802	89,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 855.830.595,27	88,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10.649.207,10	1,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 866.479.802	90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 855.830.595	88%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 10.649.207,10	1,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.260.171,56	5,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.749.874,84	5,76%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/09/2025
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 95.911.238,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.437.567,30	75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 4.131.955,18	40%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.131.955,19	40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Septiembre
VALOR FACTURA: $ 16.527.820,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,42% — Avance o Atraso Físico %: 0,91%
Meta Física Ejecutada %: 6,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,47			Prog			$ 87.117,96	$ 87.117,96	0,01%
					Ejec			$ 37.944,71	$ 37.944,71	0,00%
Excavaciones varias en roca seco	m3	1695,02			Prog		$ 51.582.639,74		$ 51.582.639,74	5,33%
					Ejec		$ 60.908.029,99		$ 60.908.029,99	6,30%
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA	m3	8,40			Prog			$ 243.004,93	$ 243.004,93	0,03%
					Ejec			$ 88.942,98	$ 88.942,98	0,01%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	m3	1,47			Prog			$ 353.868,75	$ 353.868,75	0,04%
					Ejec			$ 154.129,50	$ 154.129,50	0,02%
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	5,63			Prog	$ 174.344,25			$ 174.344,25	0,02%
					Ejec	$ 52.303,28			$ 52.303,28	0,01%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llanta	1	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Samaria en el Municipio de Filadelfia
TRAMO Y/O SECTOR (3): Alto del Volcán en el Municipio de Aguadas
TRAMO Y/O SECTOR 2: Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Según visita con Corpocaldas, se indicaron estas recomendaciones sobre el lugar a intervenir RIO MAIBA
- No se podra dragar el cauce, se podra usar material de áreas de depositos de sedimentos o islas dentro del cauce, pero no sepodrá remover más de 40cm de material.
- No se puede realizar cortes en la margenes tanto izquierda y derecha que afecte la rugosidad de la corriente o afecte la geomrfologia del cause o la rugosidad de la corriente.
-No talar arboles, guaduas o material vegetal forestal, que sean objetos de permiso de aprovechamientoforestal.
- No comercializar material extraido
- Se debe evitar aportes de sedimientos y vertimientos de cualquier tipo contaminante sobre el cauce y areas de protección ambtental.
- Avisar a los vecinos las actividades a los vecinos, coordinar actividades para no afectar a terceros.
-Obra debe ser por la orilla , evitando generar contracciones y obstrucciones en el cauce, que impida el libre transito del ag ua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

ON DE SOSTENIBILIDAD

ZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En la actividad

ALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara

SICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

ISTRO FOTOGRÁFICO





Alto del volcán en el Municipio de Aguadas



Salamina en el Municipio de Filadelfia



Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

cantidades y

XII. DESCRIBIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ARTURO JURADO ALVARÁN SERNA

Matrícula Profesional No.: 1720209860 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 46 del 14-sep al 20-sep (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTERBLANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Intervenir los sitios críticos identificados durante la visita con INVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con este proyecto se busca mitigar los riesgos presentes en las vías terciarias del departamento de Caldas, mejorando la seguridad vial y contribuyendo a la protección de los usuarios de las rutas. La intervención permitirá reducir los peligros asociados a condiciones adversas de la infraestructura, promoviendo una circulación más segura y eficiente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN			INTERVENTOR:	EN IMPACTO SAS		
INTEGRANTES:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA - SOCAFER SAS			INTEGRANTES:	WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS		
CONTRATO No.	3314 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 716.666.457	CONTRATO No.	3428-2024	VALOR INICIAL:	$ 59.003.259,00
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 257.733.543	FECHA DE INICIO:	25/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 50.996.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 974.400.000	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 110.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 754.400.000	$ 220.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 749.770.188	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.629.812	$ 220.000.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 25.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 5.909.746		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 19.090.254		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.331.042	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 919.719.123	95,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 911.580.470,11	94,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 8.138.652,61	0,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	0,00%
(Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 919.719.123	95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 911.580.470	94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 8.138.652,61	0,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.239.320,35	5,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.749.874,84	5,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/09/2025
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 95.911.238,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.437.567,30	75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.509.273,57	60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.509.273,58	60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Septiembre
VALOR FACTURA: $ 16.527.820,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,42% — Avance o Atraso Físico %: 0,91%
Meta Física Ejecutada %: 5,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,47			Prog			$ 87.117,96	$ 87.117,96	0,01%
					Ejec			$ 37.944,71	$ 37.944,71	0,00%
Excavaciones varias en roca seco	m3	1695,02			Prog		$ 51.561.788,52		$ 51.561.788,52	5,33%
					Ejec		$ 60.908.029,99		$ 60.908.029,99	6,30%
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA	m3	8,40			Prog			$ 243.004,93	$ 243.004,93	0,03%
					Ejec			$ 88.942,98	$ 88.942,98	0,01%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	m3	1,47			Prog			$ 353.868,75	$ 353.868,75	0,04%
					Ejec			$ 154.129,50	$ 154.129,50	0,02%
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	5,63			Prog	$ 174.344,25			$ 174.344,25	0,02%
					Ejec	$ 52.303,28			$ 52.303,28	0,01%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llanta	1	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Samaria en el Municipio de Filadelfia
TRAMO Y/O SECTOR (3): Alto del Volcán en el Municipio de Aguadas
TRAMO Y/O SECTOR 2: Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Según visita con Corpocaldas, se indicaron estas recomendaciones sobre el lugar a intervenir RIO MAIBA
- No se podra dragar el cauce, se podra usar material de áreas de depositos de sedimentos o islas dentro del cauce, pero no sepodrá remover más de 40cm de material.
- No se puede realizar cortes en la margenes tanto izquierda y derecha que afecte la rugosidad de la corriente o afecte la geomrfologia del cause o la rugosidad de la corriente.
-No talar arboles, guaduas o material vegetal forestal, que sean objetos de permiso de aprovechamientoforestal.
- No comercializar material extraido
- Se debe evitar aportes de sedimientos y vertimientos de cualquier tipo contaminante sobre el cauce y areas de protección ambtental.
- Avisar a los vecinos las actividades a los vecinos, coordinar actividades para no afectar a terceros.
-Obra debe ser por la orilla , evitando generar contracciones y obstrucciones en el cauce, que impida el libre transito del ag ua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

ÓN DE SOSTENIBILIDAD

ZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En la actividad

ALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara

SICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

ISTRO FOTOGRÁFICO



Alto del volcán en el Municipio de Aguadas



Salamina en el Municipio de Filadelfia



Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

cantidades y

XII. DESCRIBIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ARTURO JURADO ALVARÁN SERNA

Matrícula Profesional No.: 1720209860 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 47 del 21-sep al 27-sep (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI -1

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTERBLANCO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Intervenir los sitios críticos identificados durante la visita con INVIAS.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Con este proyecto se busca mitigar los riesgos presentes en las vías terciarias del departamento de Caldas, mejorando la seguridad vial y contribuyendo a la protección de los usuarios de las rutas. La intervención permitirá reducir los peligros asociados a condiciones adversas de la infraestructura, promoviendo una circulación más segura y eficiente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL CARMEN			INTERVENTOR:	EN IMPACTO SAS		
INTEGRANTES:	JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA - SOCAFER SAS			INTEGRANTES:	WILMER ARSEY ORTEGA CAÑAS		
CONTRATO No.	3314 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 716.666.457	CONTRATO No.	3428-2024	VALOR INICIAL:	$ 59.003.259,00
FECHA DE INICIO:	23/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 257.733.543	FECHA DE INICIO:	25/09/2024	VALOR ADICIONES:	$ 50.996.741,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	22/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 974.400.000	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 110.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 754.400.000	$ 220.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 749.770.188	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.629.812	$ 220.000.000		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 25.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.000.000	$ 5.909.746		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 19.090.254		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 967.331.042	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 967.331.042	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 967.330.347,00	99,9999%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 695,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 967.331.042	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 967.330.347	99,9999%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 695,00	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 47.611.919,28	4,92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 55.749.876,89	5,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 10/09/2025
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 95.911.238,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.437.567,30	76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.263.910,35	0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.263.910,38	0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Septiembre
VALOR FACTURA: $ 16.527.820,75

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,42% — Avance o Atraso Físico %: 0,91%
Meta Física Ejecutada %: 5,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,47		
Excavaciones varias en roca seco	m3	1695,02		
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA	m3	8,40		
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	m3	1,47		
Excavación en material comun de la explanación y canales	m3	5,63		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Prog			$ 87.117,96	$ 87.117,96	0,01%
Ejec			$ 37.944,71	$ 37.944,71	0,00%
Prog		$ 51.582.639,74		$ 51.582.639,74	5,33%
Ejec		$ 60.908.029,99		$ 60.908.029,99	6,30%
Prog			$ 243.004,93	$ 243.004,93	0,03%
Ejec			$ 88.942,98	$ 88.942,98	0,01%
Prog			$ 353.868,75	$ 353.868,75	0,04%
Ejec			$ 154.129,50	$ 154.129,50	0,02%
Prog	$ 174.344,25			$ 174.344,25	0,02%
Ejec	$ 52.305,33			$ 52.305,33	0,01%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llanta	1	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Samaria en el Municipio de Filadelfia
TRAMO Y/O SECTOR (3): Alto del Volcán en el Municipio de Aguadas
TRAMO Y/O SECTOR 2: Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Según visita con Corpocaldas, se indicaron estas recomendaciones sobre el lugar a intervenir RIO MAIBA
- No se podra dragar el cauce, se podra usar material de áreas de depositos de sedimentos o islas dentro del cauce, pero no sepodrá remover más de 40cm de material.
- No se puede realizar cortes en la margenes tanto izquierda y derecha que afecte la rugosidad de la corriente o afecte la geomrfologia del cause o la rugosidad de la corriente.
-No talar arboles, guaduas o material vegetal forestal, que sean objetos de permiso de aprovechamientoforestal.
- No comercializar material extraido
- Se debe evitar aportes de sedimientos y vertimientos de cualquier tipo contaminante sobre el cauce y areas de protección ambèntal.
- Avisar a los vecinos las actividades a los vecinos, coordinar actividades para no afectar a terceros.
-Obra debe ser por la orilla , evitando generar contracciones y obstrucciones en el cauce, que impida el libre transito del ag ua

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

ON DE SOSTENIBILIDAD

ZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En la actividad

EALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara

SICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

ISTRO FOTOGRÁFICO



Alto del volcán en el Municipio de Aguadas



Salamina en el Municipio de Filadelfia



Pueblo Nuevo en el Municipio de Pensilvania

cantidades y

XII. DESCRIBIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ARTURO JURADO ALVARÁN SERNA

Matrícula Profesional No.: 1720209860 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:**

CONTRATO No. 3314-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3428-2024 **INTERVENTORÍA:** EN IMPACTO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Retroexcavadora oruga con martillo hidráulico	Caterpillar/CAT 320D L	6,7 m	Sector Pueblo Nuevo – Municipio de Pensilvania, Caldas	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A																	
Retroexcavadora de llantas	JCB/3CX Super	5,5 m	Vía Alto del Volcán – Municipio de Aguadas,									A	A	A	A	A																	
Volquetas	Hino 500 Series	7 m3	Pueblo Nuevo y Alto del Volcán (Pensilvania y Aguadas)	A	A	A	A	A	A	A																							
Compactador tipo vibrocompactador	Bomag/BW 213 D-5	12 Ton	Alto del Volcán (Aguadas)									A	A	A	A	A									A	A	A	A	A	A		A	A	
Cargador frontal	John Deere/544K-II	2,3 m3	Pueblo Nuevo y Alto del Volcán (Pensilvania y Aguadas)															A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	0	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2	2	2	0	3	3	3	3	3	0	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51	54,84
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	51	54,84
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): No fue requería.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202109351CND

Firma
Nombre: JHON HENRY MENDOZA MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202264540CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/10/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 3314-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMILIARES

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE CUPERTINO PARRA	4276950	OPERADOR	1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES MEGOM SAS	1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	1075933055	$ 57.000	PORVENIR	1075933055	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
2	JAIRO LUIS SOCARRAS	19427525	DIRECTOR DE OBRA	1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	CONSTRUCCIONES MEGOM SAS	1.423.500	$ 52.900	V	NUEVA EPS	1075933055	$ 30.400	COLPENSIONES	1075933055	$ 121.500	$ 30.400	$ -	$ -	
4	CAROLINA PIEDRAHITA SUAREZ	1053860494	AUX OBRA	1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES MEGOM SAS	1.423.500	$ 99.100	V	SALUD TOTAL EPS	80637971	$ 57.000	PROTECCIÓN	80637971	$ 227.800	$ 57.000			
5	BOTERO CARMONA LILIANA	30391804	SST	2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES MEGOM SAS - INDEPENDIENTE	2.000.000	$ 99.100	V	SANITAS	9490463133	$ 250.000	COLPENSIONES	9490463133	$ 320.000		$ -	$ -	
6	CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR	79910498	RESIDENTE DE OBRA	1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES MEGOM SAS	1.423.500	$ 99.100	V	EPS SURA	80637971	$ 57.000	SKANDIA	80637971	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha oct-25 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma
Nombre: JAIRO LUIS SOCARRAS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-18979



Firma
Nombre: ARTURO JURADO ALVARAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720209860CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 3314 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	808324	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 716.666.457	$ 4.629.813
		C-2402-0600-11-51102A-2402098-03	11	NACION	ADICION N° 1	$ 37.733.543	
2025	82925	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	NACION	ADICION N° 2	$ 220.000.000	$ 220.000.000
TOTAL						$ 974.400.000	$ 224.629.813

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 974.400.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	808324-27/08/2024	$ 716.666.457,00	$ 716.666.457,00	X	X		
2	PARCIAL	1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$ 202.565.585,00	$ 1.480.286,97	$ 204.045.871,97	$ -	$ 204.045.871,97	$ -	808324-27/08/2024	$ 512.620.585,03	$ 512.620.585,03	18964	X		
3	PARCIAL	1 AL 30 NOVIEMBRE 2024	$ 126.654.579,00	$ 925.552,69	$ 127.580.131,69	$ -	$ 127.580.131,69	$ -	808324-27/08/2024	$ 385.040.453,34	$ 385.040.453,34	18969	X		
								$ -				X			
								$ -		$ 37.733.543,00	$ 37.733.543,00	X			Se adiciona el contrato por un valor de $ 37,733,543,00
4	PARCIAL	1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$ 196.911.487	$ 1.438.968,56	$ 198.350.455,56	$ -	$ 198.350.455,56	$ -	808324-27/08/2024	$ 224.423.540,78	$ 224.423.540,78	18973	X		
5	PARCIAL	1 AL 20 DE ENERO 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	808324-27/08/2024	$ 224.423.540,78	$ 224.423.540,78			X	
6	PARCIAL	1 AL 31 DE MAYO 2025	$ 91.369.339	$ 667.699,00	$ 92.037.038,00	$ -	$ 92.037.038	$ -	808324-27/08/2024	$ 132.386.502,78	$ 132.386.502,78			X	
7	PARCIAL	1 AL 30 DE JUNIO 2025	$ 31.614.424	$ 231.028,00	$ 31.845.452,00	$ -	$ 31.845.452	$ -	808324-27/08/2024	$ 100.541.050,78	$ 100.541.050,78				
8	PARCIAL	1 AL 3 DE JULIO 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 100.541.051	$ 100.541.051				
9	PARCIAL	22 AL 31 DE AGOSTO	$ 95.215.433,00	$ 695.805,00	$ 95.911.238,00		$ 95.911.238	$ -	82925-30/04/2025	$ 4.629.812,78	$ 4.629.812,78	X			
								$ -	82925-30/04/2025	$ 220.000.000	$ 220.000.000	X			Se adiciona el contrato por un valor de $ 220,000,000,00
10	PARCIAL	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$ 222.999.500,00	$ 1.629.612,00	$ 224.629.112,00		$ 224.629.112,00	$ -	82925-30/04/2025	$ 700,78	$ 700,78				
TOTALES			**$ 967.330.347,00**	**$ 7.068.952,22**	**$ 974.399.299,22**	**$ -**	**$ 974.399.299,22**	**$ -**	**N/A**	**$ 700,78**	**$ 700,78**	**N/A**			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS No. 1	$ -	$ -	$ -
ACTA COSTOS No. 2	$ 202.565.585	$ 1.480.286,97	**$ 204.045.871,97**
ACTA COSTOS No. 3	$ 126.654.579	$ 925.553	**$ 127.580.131,69**
ACTA COSTOS No. 4	$ 196.911.487	$ 1.438.969	**$ 198.350.455,56**
ACTA COSTOS No. 5	$ -	$ -	$ -
ACTA COSTOS No. 6	$ 91.369.339	$ 667.699	**$ 92.037.038,00**
ACTA COSTOS No. 7	$ 31.614.424	$ 231.028	**$ 31.845.452,00**
ACTA COSTOS No. 8	$ -	$ -	$ -
ACTA COSTOS No. 9	$ 95.215.433	$ 695.805	**$ 95.911.238,00**
ACTA COSTOS No. 10	$ 222.999.500	$ 1.629.612	**$ 224.629.112,00**
*			
VALOR TOTAL	$ 967.330.347,00	$ 7.068.952	**$ 974.399.299,22**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-18979

Firma
Nombre: ARTURO JURADO ALVARAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720209860CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 3314 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	23	20	16	24	24	24	16	20	22	8	13	19	22	23	14	20	22	23	9	15	17	23	24	24	24	16	11	4	13		555
Lluvias moderadas		1	3	6				8	4		14	7	5		1	10		2		8	4	3	1				5	2	12	5		101
Lluvias intensas	2		1	2						2	2	4		2			4		1	7	5	4					3	11	8	6		64
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO MEJIA SALAZAR
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202109351CND

Firma
Nombre: JHON HENRY MENDOZA MARTINEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202264540CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO:
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

FECHA DE INICIO: 23/09/2024
PLAZO INICIAL: 23/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 716.666.457,00
VALOR ACUMULADO: $ 974.400.000,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10	$ 71.666.645,70	23/08/2024	23/05/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 143.333.291,40	23/08/2024	23/11/2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 214.999.937,10	23/08/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101235004
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/08/2024	23/11/2024
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/08/2024	23/11/2024
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/08/2024	23/11/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 71.666.645,70	23/09/2024	23/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 143.333.291,40	23/09/2024	24/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 214.999.937,10	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101235004

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	24/12/2024
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	24/12/2024
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	24/12/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	23/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	24/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-10-12-35-004

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

3+A150:O167

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	16/02/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	16/02/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	16/02/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	16/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	16/02/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/03/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/03/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/03/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/03/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/07/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/07/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	8/07/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	8/09/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	8/03/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/03/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	8/11/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	8/05/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/05/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	8/01/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	8/07/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/05/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	3/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	3/08/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	3/08/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	3/08/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	3/08/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** Ampliación 1 en Suspensión 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** Ampliación 1 en Suspensión 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 13
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** Ampliación 2 en Suspensión 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	17/08/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/08/2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** Ampliación 1 en Suspensión 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	17/08/2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/08/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	30/09/2025
Daño emergente y lucro cesante	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	30/09/2025
Perjucios extrapatrimoniales	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA-Mínimo: 1.00 SMMLV	$ 260.000.000,00	23/09/2024	30/09/2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101067943 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10	$ 75.440.000,00	23/09/2024	22/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20	$ 150.880.000,00	23/09/2024	22/08/2025
Calidad de Estudios y Diseños	N/A		N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 226.320.000,00	23/09/2024	5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1012355004

Certificado de modificación o anexo No.: 16
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto

Firma

Nombre: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
NIT: 901798124-8

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y REPROGRAMACIÓN
PROGRAMA DE INVERSIONES Y REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEN-FOR-I 39-V4-PR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PROGRAMA DE INVERSIONES** *

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.: 10
(Se debe iniciar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3314 DE 2024
OBJETO: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3429-2024 **INTERVENTOR:** ENVIMPACTO SAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según cantidad principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL incluido IVA) **(A):** $ **710.809.437** (Según cantidad principal)
VALOR ACUMULADO incluido IVA) **(C=A+B):** $ **974.459.808**

PLAZO ACUMULADO: 8,14 MESES (En meses según las prórrogas las suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES incluido IVA) **(B):** $ 263'.730.943,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA(Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADA OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado Valor Ejecutado $ De Lo anterior	1 sep-24	2 oct-24	3 nov-24	4 dic-24	5 ene-25	6 feb-25	7 mar-25	8 abr-25	9 may-25	10 jun-25	11 jul-25	12 ago-25	13 sep-25	
Demoliciones de estructuras	$1.619.890	0,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	100%
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E														
Limpieza de Alcantarillas con diámetro menor o igual a 36", incluye recitificación de descoles.	$3.041.776	0,41%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$360.222	0,04%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Excavación en material corton de la explanación y canales.	$81.142.446	11,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$4.642.369	0,66%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Remoción derrumbes incluye disposicion	$27.179.000	3,82%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Conformación de taludes existentes	$5.715.600	0,80%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Conformación de calzada	$44.911.400	6,43%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$31.024.586	3,27%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Afirmado	$206.521.749	29,04%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$20.480.490	2,14%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Excavaciones varias en disellar	$9.137.000	1,14%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$107.020.990	11,09%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Excavaciones varias en roca sana	$4.222.600	0,59%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$638.539.477	66,79%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Relleno para estructuras con material de excavación	$1.629.226	0,23%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$108.936.120	16,96%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Relleno para estructuras con recebo	$210.216.600	29,58%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$3.033.080	0,31%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$1.451.586	0,20%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Concreto vitrificado resistencia 21mpa (d) - recebo in situ	$21.693.350	3,04%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	-$5.283.417	-0,55%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	$14.460.658	2,03%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Tubería de plastico tipo pvc, norma ntc 5055 astm f794 de diametro 900 mm	$37.490.735	5,26%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	-$111.523.303	-1,19%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1, Recubrimiento de Zinc (Galvanizado)	$9.213.080	0,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m) transporte con volqueta de 6m3	$1.657.000	0,24%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$0	0,00%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, medido a partir de cien metros (100 m) hasta el primero (1) kilometro (1 km) y medido a partir de cien metros (100m) (Andlisis para volquetas de 6 m3)	$9.293.000	1,31%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$3.633.249	0,38%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Relleno con arena	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	-$1.047.796	-0,11%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$20.037.297	2,07%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Sisos sueltos cemento para cuneta, cunetes de agua lluvia en tierra.	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$16.514.710	1,65%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE (FLAGELFIN)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$2.649.730	0,36%		% E														
				$ P					1.365.424,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Tubería de drenaje 6" (Flagelfin)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	-$4.111.389	-0,43%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FLAGELFIN)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$6.024.502	0,63%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Excavación en material corton de la explanación y canales.	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$108.302.339	16,37%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
Remoción derrumbes incluye disposicion	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
	$26.555.555	2,95%		% E														
				$ P					682.712,00									
				$ E	-	-	-	-	-				-	-		-	-	
AJUSTE	$0.127			% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
VALOR BASICO DE OBRA (A):	$ 711.467.273,16	100%			PROGRAMACIÓN INICIAL			PROGRAMACIÓN 1					PROGRAMACIÓN 2			PROGRAMACIÓN 3		
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A'):	$ 967.330.365	100%																

SUSPENSIÓN 1
SUSPENSIÓN 2 / AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 2
SUSPENSIÓN 3 / AMPLIACIÓN N° 2 A SUSPENSIÓN N° 2 / AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. Para los contratos en los cuales se hayan considerado ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	2 Color	3 Color
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	15,64%	17,49%	24,66%	3,28%	3,00%	3,00%	6,00%	14,41%	8,00%	0,00%	0,00%	2,47%	22,62%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 151.896.481	$ 170.247.456	$ 232.777.864	$ 29.226.801	$ 28.000.000	$ 28.000.000	$ 56.000.000	$ 140.282.143	$ 76.000.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.963.872	$ 219.619.830
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	15,64%	33,13%	57,79%	61,07%	64,07%	67,07%	73,07%	87,48%	95,48%	95,48%	95,48%	97,95%	120,57%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 151.896.481	$ 322.143.937	$ 554.921.801	$ 584.148.602	$ 612.148.602	$ 640.148.602	$ 696.148.602	$ 836.430.745	$ 912.430.745	$ 912.430.745	$ 912.430.745	$ 936.394.617	$ 1.156.014.447
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

* Los provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluir N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR INICIAL (ACTUALIZADO CONSORCIO)	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B):	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO(B') (B'):	$ -		
VALOR ACUMULADO INICIAL CONTRATO (C=A+B)	$ 710.809.437		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C'=A'+B'):	$ -		

NOTAS

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo mal de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se hayan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Ajustó: Firma
Nombre: LUIS FERNANDO SANCHEZ OLIVELLA
Representante legal o apoderado del Contratista
NIT: 901.960.444 - 6

Ajustó: Firma
Nombre: WILMER ARBEY ORTEGA CASAS
Representante legal o apoderado del Interventor
NIT: 80778124-6

Revisó: Firma
Nombre
Título / Gerente
Matrícula Profesional No.:

Revisó: Firma
Nombre: LUIS CLAUDIO TIBATA CONTRERAS ARIZA
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 01 13-0006(CPT)

Revisó: Firma
Nombre: MAURICIO HERNANDEZ PEINADO
Matrícula Profesional No.: 17202-126478(CLD)

Original: Archivo de Gestión del PAINV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 222.999.500,00

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3314 DE 2024

OBJETO:
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,74 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/09/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 716.666.457 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 257.733.543,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 974.400.000

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programad / $ Valor Programad / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 sep-24	2 oct-24	3 nov-24	4 dic-24	5 ene-25	6 feb-25	7 mar-25	8 abr-25	9 may-25	10 jun-25	11 jul-25	12 ago-25	13 sep-25
Demoliciones de estructuras	$1.516.890	0,21%		% P	0,00%	0,00%	0,09%	0,05%	0,01%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 888.712,48	$ 449.356,24	$ 74.892,71				$ -	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$3.041.776	0,43%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 674.034,36	$ 217.188,85				$ -	$ -		$ -	$ -
	$380.222	0,04%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 380.222,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Excavación en material comun de la explanación y canales	$81.142.444	11,40%		% P	0,00%	0,09%	0,07%	0,07%	0,06%				0,07%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ 888.472,80	$ 710.778,24	$ 710.778,24	$ 533.083,68				$ 710.778,24	$ -		$ -	$ -
	$4.442.364	0,46%		$ E	$ -	$ 3.552.166,21	$ 27.603,04	$ 862.595,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,37%	0,00%	0,09%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Remoción derrumbes incluye disposicion	$27.179.000	3,82%		% P	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,49%				0,66%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 6.378.005,33	$ 6.378.005,33	$ 4.783.504,00				$ 6.378.005,33	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Conformación de taludes existentes	$5.715.600	0,80%		% P	0,00%	0,00%	0,34%	0,19%	0,03%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 3.295.279,11	$ 1.797.424,97	$ 314.549,37				$ -	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Conformación de calzada	$66.911.400	9,40%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	0,23%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 11.833.047,72	$ 2.246.781,21				$ -	$ -		$ -	$ -
	$31.024.586	3,21%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 468.379,80	$ -				$ 817.806,00	$ -		$ 29.738.400,00	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%				0,08%	0,00%		3,07%	0,00%
Afirmado	$209.421.145	29,44%		% P	0,00%	0,00%	5,01%	2,06%	0,39%				0,00%	0,00%		0,00%	0,13%
				$ P	$ -	$ -	$ 48.455.581,49	$ 19.892.918,56	$ 3.744.635,36				$ -	$ -		$ -	$ 1.224.798,75
	$20.685.490	2,14%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 9.798.390,00	$ -				$ 10.887.100,00	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,00%				1,13%	0,00%		0,00%	0,00%
Excavaciones varias sin clasificar	$8.137.000	1,14%		% P	0,00%	2,30%	1,84%	1,84%	1,38%				1,84%	0,00%		0,00%	0,04%
				$ P	$ -	$ 22.239.680,20	$ 17.791.744,16	$ 17.791.744,16	$ 13.343.808,12				$ 17.791.744,16	$ -		$ -	$ 348.471,96
	$107.020.095	11,06%		$ E	$ -	$ 46.615.209,11	$ 2.816.168,84	$ 57.436.938,03	$ -				$ -	$ -		$ -	$ 151.778,85
				% E	0,00%	4,82%	0,29%	5,94%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,02%
Excavaciones varias en roca seco	$4.232.800	0,59%		% P	0,00%	5,88%	4,71%	4,71%	3,53%				4,71%	0,00%		0,00%	21,33%
				$ P	$ -	$ 56.919.774,80	$ 45.535.019,84	$ 45.535.019,84	$ 34.151.264,89				$ 45.535.019,84	$ -		$ -	$ 206.309.707,73
	$539.535.477	55,78%		$ E	$ -	$ 102.770.010,20	$ 82.402.144,00	$ 41.767.565,12	$ -				$ 46.999.859,44	$ -		$ -	$ 243.632.119,95
				% E	0,00%	10,62%	8,52%	4,32%	0,00%				4,86%	0,00%		0,00%	25,19%
Relleno para estructuras con material de excavación	$1.629.225	0,23%		% P	0,00%	2,27%	1,81%	4,30%	0,77%				0,15%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ 21.943.563,19	$ 17.524.893,46	$ 41.603.843,80	$ 7.489.270,71				$ 1.497.854,14	$ -		$ -	$ -
	$105.936.120	10,95%		$ E	$ -	$ 48.175.097,10	$ 41.397.521,10	$ 15.206.100,00	$ -				$ 1.157.404,08	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	4,98%	4,28%	1,57%	0,00%				0,12%	0,00%		0,00%	0,00%
Relleno para estructuras con recebo	$210.215.600	29,55%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	0,39%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 40.292.276,42	$ 3.744.635,36				$ -	$ -		$ -	$ -
	$3.003.080	0,31%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 3.003.080,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$1.401.584	0,20%		% P	0,00%	0,00%	0,09%	0,05%	0,01%				0,01%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 823.619,78	$ 449.356,24	$ 74.892,71				$ 74.892,71	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	$21.653.350	3,04%		% P	0,00%	0,00%	0,77%	0,22%	0,01%				0,01%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 7.414.378,00	$ 2.096.996,80	$ 74.892,71				$ 74.892,71	$ -		$ -	$ -
	-$5.283.417	-0,55%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 5.283.417,40	$ -				$ -	$ -		$ -	$ (5.283.417,40)
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	-0,55%
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	$14.463.654	2,03%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,04%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 1.123.390,61	$ 374.463,54				$ -	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Tuberia de plastico tipo pvc, norma ntc 5055 astm f794 de diametro 900 mm	$37.450.725	5,26%		% P	0,00%	0,00%	2,21%	0,81%	0,08%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ 21.419.314,23	$ 7.788.841,54	$ 748.927,07				$ -	$ -		$ -	$ -
	-$11.523.300	-1,19%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 11.523.300,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ (11.523.300,00)
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	-1,19%
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; Recubrimiento de Zinc (Galvanizado)	$6.213.080	0,87%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,03%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 973.605,19	$ 299.570,83				$ -	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$1.857.000	0,26%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,02%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 599.141,86	$ 149.785,41				$ -	$ -		$ -	$ -
	$0	0,00%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Transporte de materiales provenientes de la Excavación de la Explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1000m), medidos a partir de cien metros (100m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	$9.285.000	1,31%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,07%				0,00%	0,00%		0,00%	0,21%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.246.781,21	$ 674.034,36				$ -	$ -		$ -	$ 2.051.985,00
	$3.632.589	0,38%		$ E	$ -	$ 1.453.102,50	$ 11.142,00	$ 2.168.344,62	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,15%	0,00%	0,22%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Rellenos con arena	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,02%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 823.619,78	$ 224.679,12				$ -	$ -		$ -	$ -
	-$1.047.796	-0,11%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.795,98	$ -				$ -	$ -		$ -	$ (1.047.795,98)
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	-0,11%
TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	0,15%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 12.432.189,38	$ 1.497.854,14				$ -	$ -		$ -	$ -
	$20.037.267	2,07%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 20.037.267,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Sacos suelo cemento para cuneta, canales de agua lluvia en tierra	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,31%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 9.586.266,61	$ 2.995.708,28				$ -	$ -		$ -	$ -
	$15.514.710	1,60%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 15.514.709,76	$ -				$ -	$ -		$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE (FILADELFIA)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,05%				0,00%	0,00%		0,00%	0,10%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.748,85	$ 524.248,95				$ -	$ -		$ -	$ 972.019,71
	$2.949.730	0,30%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 2.593.958,48	$ -				$ -	$ -		$ -	$ 355.771,92
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,04%
Tuberia de drenaje 4" (Filadelfia)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,09%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 2.546.352,04	$ 823.619,78				$ -	$ -		$ -	$ -
	-$4.111.389	-0,43%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 4.111.389,10	$ -				$ -	$ -		$ -	$ (4.111.389,10)
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	-0,43%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE (FILADELFIA)	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,12%				1,39%	0,00%		0,00%	0,15%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 3.518.957,23	$ 1.123.390,61				$ 13.480.687,28	$ -		$ -	$ 1.415.475,00
	$6.324.552	0,65%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ 5.708.034,00	$ -				$ -	$ -		$ -	$ 616.518,00
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,00%				0,00%	0,00%		0,00%	0,06%
Excavación en material comun de la explanación y canales	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				4,23%	0,00%		1,87%	0,07%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 40.912.794,00	$ -		$ 18.100.460,26	$ 697.377,00
	$100.302.339	10,37%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 10.763.781,54	$ 31.614.424,00		$ 57.714.920,52	$ 209.213,10
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				1,11%	3,27%		5,97%	0,02%
Remoción derrumbes incluye disposicion	$0	0,00%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				1,74%	0,00%		0,80%	0,00%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 16.906.494,69	$ -		$ 7.762.112,05	$ -
	$28.505.500	2,95%		$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 20.743.387,60	$ -		$ 7.762.112,05	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				2,14%	0,00%		0,80%	0,00%
AJUSTE	$2.127																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 711.467.273,14	100%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 967.330.345	100%															

SUSPENSIÓN 1 — SUSPENSIÓN 2 / AMPLIACIÓN N°1. A SUSPENSIÓN N° 2 — SUSPENSIÓN 3 / AMPLIACIÓN N°1. A SUSPENSIÓN N° 2 / AMPLIACIÓN N°1. A SUSPENSIÓN N° 3

PROGRAMACIÓN INICIAL — PROGRAMACIÓN 1 — PROGRAMACIÓN 2 — PROGRAMACIÓN 3

100% — 75% — 50% — 25%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - -	——

		sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	10,54%	17,60%	24,06%	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	14,81%	0,00%	0,00%	2,67%	22,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 101.990.491	$ 170.247.526	$ 232.717.594	$ 80.229.881	$ -	$ -	$ -	$ 143.263.143	$ -	$ -	$ 25.862.572	$ 213.019.835
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	10,54%	28,14%	52,20%	60,49%	60,49%	60,49%	60,49%	75,31%	75,31%	75,31%	77,98%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 101.990.491	$ 272.238.017	$ 504.955.611	$ 585.185.492	$ 585.185.492	$ 585.185.492	$ 585.185.492	$ 728.448.635	$ 728.448.635	$ 728.448.635	$ 754.311.207	$ 967.331.042
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	20,94%	13,09%	20,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,45%	3,27%	0,00%	9,84%	23,05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 202.565.585	$ 126.654.579	$ 196.911.487,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.369.339	$ 31.614.424	$ -	$ 95.215.433	$ 222.999.500
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	20,94%	34,03%	54,39%	54,39%	54,39%	54,39%	54,39%	63,84%	67,10%	67,10%	76,95%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 202.565.585	$ 329.220.164	$ 526.131.650	$ 526.131.650	$ 526.131.650	$ 526.131.650	$ 526.131.650	$ 617.500.989	$ 649.115.413	$ 649.115.413	$ 744.330.846	$ 967.330.347

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS URBANO SANCHEZ OLIVELLA
Representante legal o apoderado del Contratista
NIT. 901.960.444 - 4

Aprueba Firma:
Nombre: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Representante legal o apoderado del Interventor
NIT: 901798124-8

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Durante la lectura del acta del comité de obra anterior, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en el municipio de Filadelfia, específicamente en el sector El Columpio, donde se adelantaron labores de remoción de derrumbes. Estas actividades fueron desarrolladas conforme a lo programado, permitiendo mitigar los riesgos de taponamiento vial y afectación a la movilidad rural.

Asimismo, se revisó el avance de actividades en el municipio de Aguadas, donde se ejecutaron labores de remoción de derrumbes en dos sectores críticos: Cocahuevo y El Volcán. En ambos puntos, se identificaron mejoras significativas en las condiciones de transitabilidad.

De manera particular, se verificó el cumplimiento de las actividades y la habilitación de la vía en el sector El Volcán, lograda mediante la correcta conformación de la calzada, lo cual permitió restablecer el tránsito vehicular en condiciones seguras para los usuarios.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de los frentes de obra y definición de directrices para la ejecución de actividades en los municipios de Aguadas (vía Cocahuevo - Mermita) , Pensilvania(Pueblo Nuevo) y Filadelfia (vía Samaria, La Rica), con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las obras y atender las problemáticas viales actuales que afectan la conectividad de las zonas intervenidas.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Durante el comité, los asistentes expresaron la importancia de adelantar las acciones constructivas de manera oportuna en ambos municipios, priorizando la seguridad vial, la estabilidad del terreno y la funcionalidad de las vías rurales intervenidas.

Las conclusiones y directrices específicas por cada frente de trabajo son las siguientes:

1. MUNICIPIO DE AGUADAS

El volcan

Se solicita al contratista avanzar de forma inmediata en la conformacion de la calzada y en la instalacion del filtro

Se solicita al contratista verificar el desempeño de la instalacion del filtro en epoca de invierno

El contratista se compromete a organizar los recursos y la maquinaria necesaria para ejecutar ambas actividades de manera simultánea.

Se enfatiza en la importancia de implementar señalización temporal mientras se desarrollan los trabajos, para garantizar la seguridad de los usuarios viales.

2. MUNICIPIO DE FILADELFIA

SAMARIA - LA RICA

Se solicita verificar los permisos con la comunidad para la realizacion de la conformacion de la calzada y habilitar el paso de la comunidad de las veredas y el corregimiento de Samaria

Se recomienda al contratista avanzar de forma inmediata en la atencion del sitio critico

El contratista deberá fortalecer el frente de trabajo en esta zona e implementar medidas de contención de aguas lluvias para evitar la saturación del terreno.

La interventoría realizará inspección constante para asegurar que se sigan las especificaciones técnicas establecidas.

INVIAS reitera que esta intervención debe realizarse con celeridad y calidad, dada la importancia de la vía para la comunidad local.

3. MUNICIPIO DE FILADELFIA

Se solicita al contratista avanzar de forma inmediata en la conformacion de la habilitacion de la via Pensilvania - Pueblo Nuevo

Se solicita por parte de la interventoria la realziacion de visita de inspeccion con el corporado ambiental para la evaluacion del sitio

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Continuar con las labores en el municipio de Aguadas	12/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
2. Verificar las acciones a realizar en el municipio de Filaldelfia	13/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
3. Programacion de visita con el corporado Ambiental o la entidad	13/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA - INVIAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/09/2025
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS	INTERVENTORIA	EN IMPACTO SAS	
LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO	SUPERVISORA	INVIAS	
CARLOS AUGUSTO MEJIA	RESIDENTE	CONSORCIO EL CARMEN	
CAROLINA PIEDRAHITA	AXULIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO EL CARMEN	
JHON HENRY MENDOZA	RESIDENTE	EN IMPACTO SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Durante la lectura del acta del comité de obra anterior, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en el municipio de Aguadas, donde se ejecutaron labores de remoción de derrumbes en dos sectores críticos: Cocahuevo y El Volcán. En ambos puntos, se identificaron mejoras significativas en las condiciones de transitabilida

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de los frentes de obra y definición de directrices para la ejecución de actividades en los municipios de Aguadas (vía Cocahuevo - Mermita) , Pensilvania(Pueblo Nuevo) y Filadelfia (vía Samaria, La Rica), con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las obras y atender las problemáticas viales actuales que afectan la conectividad de las zonas intervenidas.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Durante el comité, los asistentes expresaron la importancia de adelantar las acciones constructivas de manera oportuna en ambos municipios, priorizando la seguridad vial, la estabilidad del terreno y la funcionalidad de las vías rurales intervenidas.

Las conclusiones y directrices específicas por cada frente de trabajo son las siguientes:

1. MUNICIPIO DE AGUADAS

El volcan

Se termina la conformacion de la calzada y la instalacion del filtro
Se solicita al contratista verificar el desempeño de la instalacion del filtro en epoca de invierno

2. MUNICIPIO DE FILADELFIA

SAMARIA - LA RICA

Se solicita verificar los permisos con la comunidad para la realizacion de la conformacion de la calzada y habilitar el paso de la comunidad de las veredas y el corregimiento de Samaria
Se recomienda al contratista avanzar de forma inmediata en la atencion del sitio critico
El contratista deberá fortalecer el frente de trabajo en esta zona e implementar medidas de contención de aguas lluvias para evitar la saturación del terreno.
La interventoría realizará inspección constante para asegurar que se sigan las especificaciones técnicas establecidas.
INVIAS reitera que esta intervención debe realizarse con celeridad y calidad, dada la importancia de la vía para la comunidad local.

3. MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Se inicia labores de habilitacion de la via Pensilvania - Pueblo Nuevo de acuerdo a las directrices dadas por la enrtidad
El contratista se compromete a organizar los recursos y la maquinaria necesaria para ejecutar ambas actividades de manera simultánea.

Se enfatiza en la importancia de implementar señalización temporal mientras se desarrollan los trabajos, para garantizar la seguridad de los usuarios viales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Continuar con las labores en el municipio de Aguadas	12/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
2. Verificar las acciones a realizar en el municipio de Filaldelfia	13/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
3. Programacion de visita con el corporado Ambiental o la entidad	13/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA - INVIAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/09/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS	INTERVENTORIA	EN IMPACTO SAS	
LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO	SUPERVISORA	INVIAS	
CARLOS AUGUSTO MEJIA	RESIDENTE	CONSORCIO EL CARMEN	
CAROLINA PIEDRAHITA	AXULIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO EL CARMEN	
JHON HENRY MENDOZA	RESIDENTE	EN IMPACTO SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Durante la lectura del acta del comité de obra anterior, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en el municipio de Aguadas, donde se ejecutaron labores de remoción de derrumbes en dos sectores críticos: Cocahuevo y El Volcán. En ambos puntos, se identificaron mejoras significativas en las condiciones de transitabilida

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Revisión de los frentes de obra y definición de directrices para la ejecución de actividades en los municipios de Aguadas (vía Cocahuevo - Mermita) , Pensilvania(Pueblo Nuevo) y Filadelfia (vía Samaria, La Rica), con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las obras y atender las problemáticas viales actuales que afectan la conectividad de las zonas intervenidas.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Durante el comité, los asistentes expresaron la importancia de adelantar las acciones constructivas de manera oportuna en ambos municipios, priorizando la seguridad vial, la estabilidad del terreno y la funcionalidad de las vías rurales intervenidas.

Las conclusiones y directrices específicas por cada frente de trabajo son las siguientes:

1. MUNICIPIO DE AGUADAS

El volcan

Se termina la conformacion de la calzada y la instalacion del filtro
Se solicita al contratista verificar el desempeño de la instalacion del filtro en epoca de invierno

2. MUNICIPIO DE FILADELFIA

SAMARIA - LA RICA

Se solicita verificar los permisos con la comunidad para la realizacion de la conformacion de la calzada y habilitar el paso de la comunidad de las veredas y el corregimiento de Samaria
Se recomienda al contratista avanzar de forma inmediata en la atencion del sitio critico
El contratista deberá fortalecer el frente de trabajo en esta zona e implementar medidas de contención de aguas lluvias para evitar la saturación del terreno.
La interventoría realizará inspección constante para asegurar que se sigan las especificaciones técnicas establecidas.
INVIAS reitera que esta intervención debe realizarse con celeridad y calidad, dada la importancia de la vía para la comunidad local.

3. MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Se inicia labores de habilitacion de la via Pensilvania - Pueblo Nuevo de acuerdo a las directrices dadas por la enrtidad
El contratista se compromete a organizar los recursos y la maquinaria necesaria para ejecutar ambas actividades de manera simultánea.

Se enfatiza en la importancia de implementar señalización temporal mientras se desarrollan los trabajos, para garantizar la seguridad de los usuarios viales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Continuar con las labores en el municipio de Aguadas	19/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
2. Verificar las acciones a realizar en el municipio de Filaldelfia	19/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
3. Programacion de visita con el corporado Ambiental o la entidad	19/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA - INVIAS

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 19/09/2025
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS	INTERVENTORIA	EN IMPACTO SAS	
LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO	SUPERVISORA	INVIAS	
CARLOS AUGUSTO MEJIA	RESIDENTE	CONSORCIO EL CARMEN	
CAROLINA PIEDRAHITA	AXULIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO EL CARMEN	
JHON HENRY MENDOZA	RESIDENTE	EN IMPACTO SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Durante la lectura del acta del comité de obra anterior, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en el municipio de Pensilvania y Filaldelfia, donde se ejecutaron labores de conformacion de calzada y habilitacion de la via.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de los frentes de obra y definición de directrices para la ejecución de actividades en los municipios de Pensilvania(Pueblo Nuevo) y Filadelfia (vía Samaria, La Rica), con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las obras y atender las problemáticas viales actuales que afectan la conectividad de las zonas intervenidas.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Durante el comité, los asistentes expresaron la importancia de adelantar las acciones constructivas de manera oportuna en ambos municipios, priorizando la seguridad vial, la estabilidad del terreno y la funcionalidad de las vías rurales intervenidas.

Las conclusiones y directrices específicas por cada frente de trabajo son las siguientes:

1. MUNICIPIO DE FILADELFIA

SAMARIA - LA RICA

Se avanza en la ejecucion de la obra: conformacion de la calzada y el transporte de material

3. MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Se continua con las labores de habilitacion de la via Pensilvania - Pueblo Nuevo de acuerdo a las directrices dadas por la enrtidad
El contratista se compromete a organizar los recursos y la maquinaria necesaria para ejecutar ambas actividades de manera simultánea.

Se enfatiza en la importancia de implementar señalización temporal mientras se desarrollan los trabajos, para garantizar la seguridad de los usuarios viales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Continuar con las acciones a realizar en el municipio de Filaldelfia	26/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA
2. Continuar con las acciones a realizar en el municipio de Pensilvania	26/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA - INVIAS

FECHA PRÒXIMO COMITÈ DE OBRA 26/09/2025
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS	INTERVENTORIA	EN IMPACTO SAS	
LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO	SUPERVISORA	INVIAS	
CARLOS AUGUSTO MEJIA	RESIDENTE	CONSORCIO EL CARMEN	
CAROLINA PIEDRAHITA	AXULIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO EL CARMEN	
JHON HENRY MENDOZA	RESIDENTE	EN IMPACTO SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Durante la lectura del acta del comité de obra anterior, se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en el municipio de Pensilvania y Filaldelfia, donde se ejecutaron labores de conformacion de calzada y habilitacion de la via.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de los frentes de obra y definición de directrices para la ejecución de actividades en los municipios de Pensilvania(Pueblo Nuevo) y Filadelfia (vía Samaria, La Rica), con el fin de garantizar la ejecución oportuna de las obras y atender las problemáticas viales actuales que afectan la conectividad de las zonas intervenidas.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Durante el comité, los asistentes expresaron la importancia de adelantar las acciones constructivas de manera oportuna en ambos municipios, priorizando la seguridad vial, la estabilidad del terreno y la funcionalidad de las vías rurales intervenidas.

Las conclusiones y directrices específicas por cada frente de trabajo son las siguientes:

1. MUNICIPIO DE FILADELFIA

SAMARIA - LA RICA

Se termina la ejecucion de la obra: conformacion de la calzada y el transporte de material

3. MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Se termina con las labores de habilitacion de la via Pensilvania - Pueblo Nuevo de acuerdo a las directrices dadas por la enrtidad

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Avanzar en la gestion documental para la terminacion del contrato	26/09/2025	INTERVENTORIA - CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/09/2025
(Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS	INTERVENTORIA	EN IMPACTO SAS	
LUZ LILIANA TIBATA CASTELBLANCO	SUPERVISORA	INVIAS	
CARLOS AUGUSTO MEJIA	RESIDENTE	CONSORCIO EL CARMEN	
CAROLINA PIEDRAHITA	AXULIAR DE INGENIERIA	CONSORCIO EL CARMEN	
JHON HENRY MENDOZA	RESIDENTE	EN IMPACTO SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORME DE INTERVENTORIA

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: **EN IMPACTO S.A.S**

NÚMERO DE CONTRATO: **3428-2024**

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.

VALOR CONTRATO: $ 85.000.000

FECHA DE INICIACIÓN: 25/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 24/12/2024
Prorroga 1: 12/12/2024
Suspensión 1: 20/01/2025
Suspensión 2: 06/03/2025
Ampliación suspensión 2: 03/04/2025
Prorroga 2: 06/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30/09/2025

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA

PERSONAL	CANTIDAD
Ingeniero Director	1
Ingeniero Residente	1
Profesional en Salud Ocupacional	1
Inspector de Interventoría	1
TOTAL	4

ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Control de Pólizas.

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO PÓLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-44- 1015640.7	29/11/2024	29/11/2029	$ 17.700.978
Cumplimiento del Contrato			29/08/2024	29/05/2029	$ 5.900.326
Pago Salarios, prestaciones sociales			29/08/2024	29/05/2029	$11.800.652

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

✓ Se realiza recorrido con el Supervisor, Contratista y la Interventoría, para determinar observaciones presentadas durante el proceso de ejecución de la obra.

Se establecieron nuevamente en el terreno todas las actividades necesarias para verificar la correcta ejecución de los trabajos.

✓ La interventoría en conjunto con el contratista hace las observaciones a la entidad, sobre las inquietudes presentadas en el transcurso de la obra, para que de esta manera se ejecute una obra que cumpla con las especificaciones técnicas.

✓ Control y seguimiento diario de las labores adelantadas por el contratista comprobando materiales, herramientas, procesos constructivos, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas del invias

✓ Revisión de las condiciones de funcionamiento de la maquinaria y la seguridad social del personal del contratista.

✓ Registro en el libro de obra (Bitácora).

✓ Se mantuvo relación directa con el invias para tratar los aspectos inherentes al contrato.
✓ Se ha dificultado el alquiler de maquinaria en el municipio, para agilizar el proceso de movimientos de tierras
✓ Se recuerda al contratista de obra CONSORCIO EL CARMEN No talar árboles, guaduas o material vegetal forestal, que sean objetos de permiso de aprovechamiento forestal
✓ Se recuerda al contratista de obra CONSORCIO EL CARMEN No comercializar material extraído del sitio de intervencion

✓ Se recuerda al contratista de obra CONSORCIO EL CARMEN que se debe evitar aportes de sedimentos y vertimientos de cualquier tipo contaminante sobre el cauce y áreas de protección ambiental.

✓ Se verifica que las señalizaciones en vía permanezcan en el sitio de intervención con el objetivo de evitar accidentes y/o pérdidas humanas

✓ Se realizó una visita por parte de INVIAS a comité de obra en sitio en los sectores: La El Columpio, Finca La Silvana,coca de huevo, Mermita, El volcán o Rio Arriba

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

INFORME DE INTERVENTORIA

Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la **ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS.**

Periodo informe: 01 de Mayo al 30 de Mayo de 2025.

Información del contrato N° 3314-2024
Contratista: **CONSORCIO EL CARMEN**

Valor contrato:	$ 716.666.660
Plazo:	90 días calendario
Plazo Total:	90 días calendario
Fecha de iniciación:	23/09/2024
Fecha de Terminación Inicial:	22/12/2024
Fecha Adición:	10/12/2024
Valor Adición:	$ 37.733.543
Nuevo valor con adición:	$ 754.400.000
Prorroga 1:	2/12/2024
Suspensión 1:	0/01/2025
Suspensión 2:	06/03/2025
Ampliación suspensión 2:	03/04/2025
Prorroga 2:	06/05/2025
Nueva fecha de terminación:	30/09/2025

Información del contrato N° 3428-2024
Contratista: **EM IMPACTO SAS**

Valor contrato:	$ 110.000.000
Plazo:	90 días calendario
Plazo Total:	90 días calendario
Fecha de iniciación:	25/09/2024
Fecha de Terminación:	24/12/2024
Valor Adición:	$ 25.996.741
Nuevo valor con adición:	$ 85.000.000
Prorroga 1:	12/12/2024
Suspensión 1:	20/01/2025
Suspensión 2:	06/03/2025
Ampliación suspensión 2:	03/04/2025
Prorroga 2:	06/05/2025
Nueva fecha de terminación:	30/09/2025

Actividades Ejecutadas:

Durante el presente mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas:

INFORME DE INTERVENTORIA

- Se realizaron intervenciones en el municipio de aguadas en el sector el volcán (Rio Arriba)
- Se realizaron intervenciones en el municipio de Pensilvania en el sector de Pueblo Nuevo
- Se realizaron intervenciones en el municipio de Filadelfia en el sector La RIca en Samaria
  Se consignan en bitácora de obra, el seguimiento de la obra por parte del ingeniero residente de la Interventoría.
- Verificación y control en campo de que todas las actividades realizadas.

Empleos generados:

A la fecha se cuenta con el siguiente personal en obra:

Empleos por la interventoría:

Cargo	Cantidad
Ingeniero Director	1
Ingeniero Residente	1
Residente siso	1
Inspector Topógrafo	1
TOTAL	**4**

Empleos Generados por el Contratista de obra:

Cargo	Cantidad
Ingeniero Director	1
Ingeniero Residente	1
Ingeniero Auxiliar	1
Maestro de Obra	0
Operarios	1
Ayudantes	2
TOTAL	**6**


Cronograma de Ejecución.

Se continua con el seguimiento a la programación de obra encontrando que a la fecha se han **ejecutado $794.399.299,22** correspondiente al **100%**


EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

INFORME DE INTERVENTORIA

AVANCE PRESUPUESTAL:

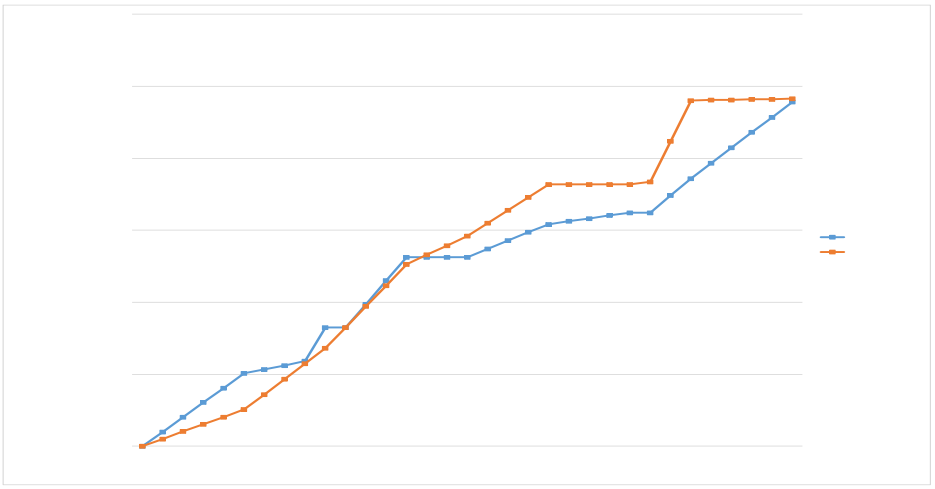

AVANCE PORCIENTAJE:

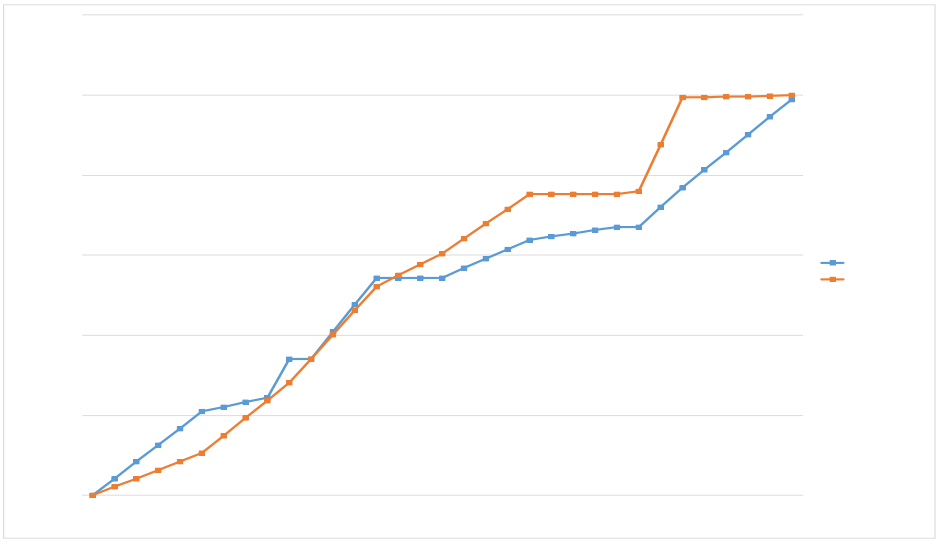

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

INFORME DE INTERVENTORIA

Salud Ocupacional:

Se realizan las siguientes actividades:

- Todo el personal que se encuentra se encuentra afiliado a seguridad social, esto se valida por medio de verificación de planilla de seguridad social y personal que se encuentra en obra.
- El personal cuenta con los elementos de protección personal requeridos en la reducción de los riesgos en las actividades que realizan de manera rutinaria y no rutinaria. Además, se valida el soporte de entrega de los EPP.
- Se verifica que la señalización permanezca en obra después de realizadas las diferentes actividades.
  - Obreros en la vía
  - Maquinaria en la Vía
  - Obra en la vía a 100 Metros
  - Cierre de vía mediante acto administrativo
- El personal que se encuentra en obra cuenta con los exámenes laborales de ingreso.
- Se capacitó al personal de interventoría de las acciones generadoras de riesgos en la zona
- Se deben analizar las diferentes necesidades de inspección que se deben adelantar en obra, para esto se cuenta con las inspecciones programadas de maquinaria y equipo.

Aspectos Técnicos:

Se realizan las siguientes actividades:

- Se verifica que las señalizaciones en vía permanezcan en el sitio de intervención con el objetivo de evitar accidentes y/o pérdidas humanas
- Se implementa acciones encaminadas a conformación de calzada y terrazeo
- Se sociliza con la comunidad las obras a llevar a cabo
- Se realizan actividades de verificación de transversales en la vía
- Se habilitan transversales que se encontraban sin funcionamiento por aumento de capa vegetal
- Se recupera calzada de la via que se encontraba en material vegetal

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORME DE INTERVENTORIA

Anexo Registro Fotográfico

INTERVENCION EN PENSILVANIA- PUEBLO NUEVO:










INTERVENCION EN FILADELFIA- SAMARIA - LA RICA:







EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORME DE INTERVENTORIA

INTERVENCION EN AGUADAS- EL VOLCAN











EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORME DE INTERVENTORIA

ARTURO JURADO ALVARAN
Ingeniero civil
Director de interventoría Em Impacto SAS

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

INTERVENTORIA:

EN IMPACTO SAS

Objeto:
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS.

Contrato:
N° 3314-2024

Profesional SST: YON FREIDER CASTRILLON YEPES

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la interventoría en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizada en la obra Atención de sitios críticos de la red terciaria a cargo de Invias, a través del sistema de monto agotable en las vías a cargo de la dirección territorial de Caldas. Con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales y técnicas relacionadas con la gestión de riesgos laborales. Este ejercicio se desarrolla en el marco del Decreto 1072 de 2015 y otras normativas aplicables, así como las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de SST de la organización.

Es una actividad que involucra condiciones de alto riesgo debido a la naturaleza de las tareas, las características del terreno y el uso de maquinaria especializada. Por esta razón, es fundamental realizar un seguimiento riguroso a los aspectos de seguridad en la obra, con el propósito de prevenir accidentes, minimizar incidentes y garantizar la protección de los trabajadores, los recursos materiales y el entorno

En este informe se detalla el alcance de la interventoría, los procedimientos aplicados, los hallazgos más relevantes y las medidas correctivas o preventivas recomendadas. Además, se evalúan aspectos clave como el cumplimiento del programa de prevención de riesgos, el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP), la capacitación del personal, la implementación de controles operativos y la preparación ante emergencias.

La información contenida en este documento busca servir de herramienta para fortalecer la gestión en SST, promover la mejora continua y garantizar el desarrollo de la obra en condiciones seguras y sostenibles.

OBJETIVOS

✓ Verificar que las actividades desarrolladas en la obra cumplan con la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como las disposiciones legales ambientales, técnicas y de construcción aplicables.
✓ Evaluar y promover la implementación de medidas preventivas que reduzcan los riesgos asociados a las actividades propias de la obra, protegiendo la integridad física y mental del personal.
✓ Revisar la implementación de políticas, procedimientos y programas de SST, identificando oportunidades de mejora.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	EN IMPACTO SAS
NIT	901.798.124-8
CLASE DE RIESGO	V
ARL	POSITIVA

PERSONAL EN OBRA INTERVENTORÍA

CARGO	NUMERO TRABAJADORES	NOMBRE TRABAJADOR
Represéntate Legal	1	WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Director de interventoría	1	ARTURO JURADO ALVARAN
Ingeniero Residente	1	JHON HENRY MENDOZA MARTÍNEZ
Profesional SST	1	YON FREIDER CASTRILLON
Topógrafo	1	YASSER IVÁN GONZALES

Relación de accidentes de trabajo

Durante el periodo evaluado, no se presentaron accidentes laborales en la obra. Este resultado refleja un adecuado cumplimiento de las medidas preventivas, establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como una correcta aplicación de los protocolos de seguridad, el uso de equipos de protección personal (EPP) y la capacitación del personal en prácticas seguras. Es importante continuar fortaleciendo estas acciones para mantener un entorno de trabajo seguro y prevenir la ocurrencia de incidentes en el futuro.

Ausentismo por enfermedad común

Durante este periodo no se han presentado incapacidades de origen de enfermedad común.

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo

Se verifica al contratista CONSORCIO EL CARMEN las actividades de capacitación realizadas, dando cumplimiento a las misma que se tienen programadas.

- Encuesta identificación de peligros en obra
- Operación segura de retroexcavadora
- Emergencia primeros auxilios
- Uso correcto EPP

Verificación de afiliación al sistema de seguridad social

Se verifica que todos los colaboradores estén vinculados a ARL, EPS, AFP, se verifican los exámenes de ingreso y la entrega de EPP

Acompañamiento en obra

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

VIA: AGUADAS - RIO ARRIBA INSTALACIÓN DEPIEDRA FILTRO








Se realizan las labores de instalación de piedra filtro, implementando las medidas preventivas y correctivas correspondientes en la vía. No se presentan accidentes ni se reportan inconvenientes durante la ejecución de las actividades.

EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

VIA: FILADELFIA, CALDAS - ALTO MIRA /SAMARIA














EN IMPACTO S.A.S
OBRAS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS

SECTOR: PUEBLO NUEVO- PENSILVANIA





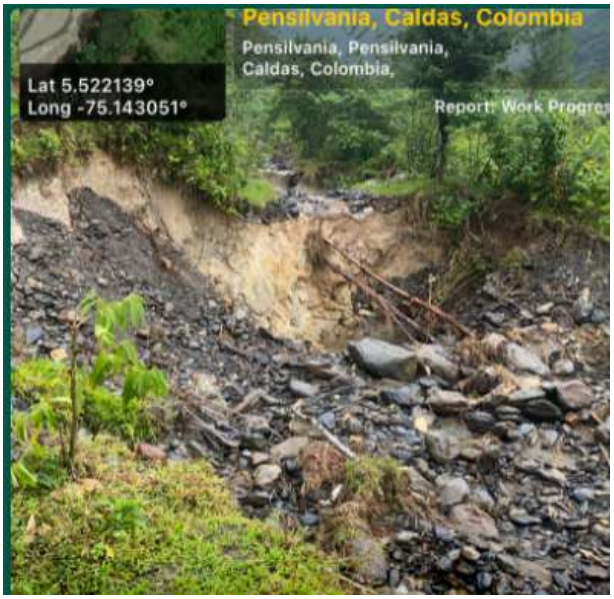







Recomendaciones

- Continuar con todas las medidas preventivas en las diferentes actividades que se ejecutan en la obra.
- Verificar los pre-operacionales de la maquinaria amarilla.
- Continuar con las inspecciones para verificar la estabilidad de taludes y evitar accidentes laborales
- Continuar con la verificación de la señalización de las obras en ejecución
- Fomentar en los colaboradores el reporte de actos y condiciones inseguras
- Sensibilizar a los colaboradores de manera constante sobre la identificación de peligros y riesgos en los diferentes frentes de trabajo
- Fomentar la cultura del autocuidado, como base fundamental para la prevención




YON FREIDER CASTRILLON YEPES
PROFESIONAL SISO


Cronograma de Ejecución

✓ Se continua con el seguimiento a la programación de obra encontrando que a la fecha se han ejecutado **$974.399.299.22** correspondiente al **100%,**

AVANCE PRESUPUESTAL

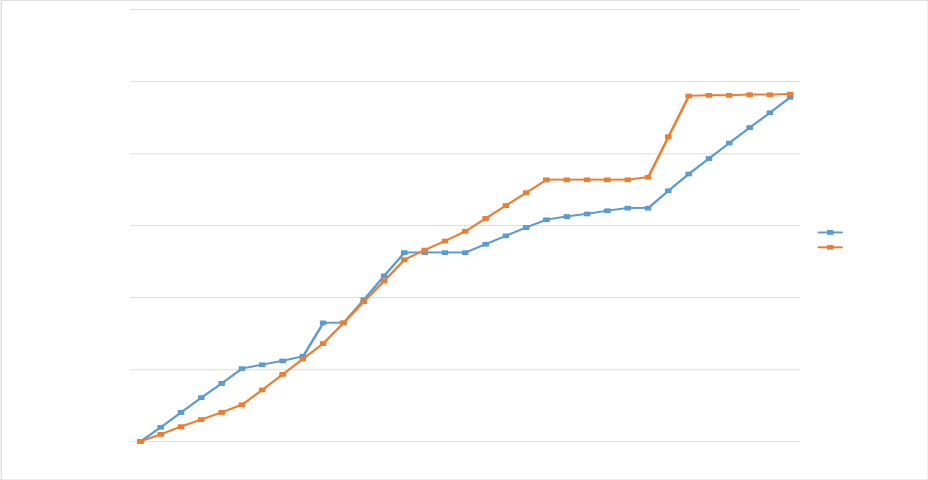

AVANCE FÍSICO PORCENTAJE

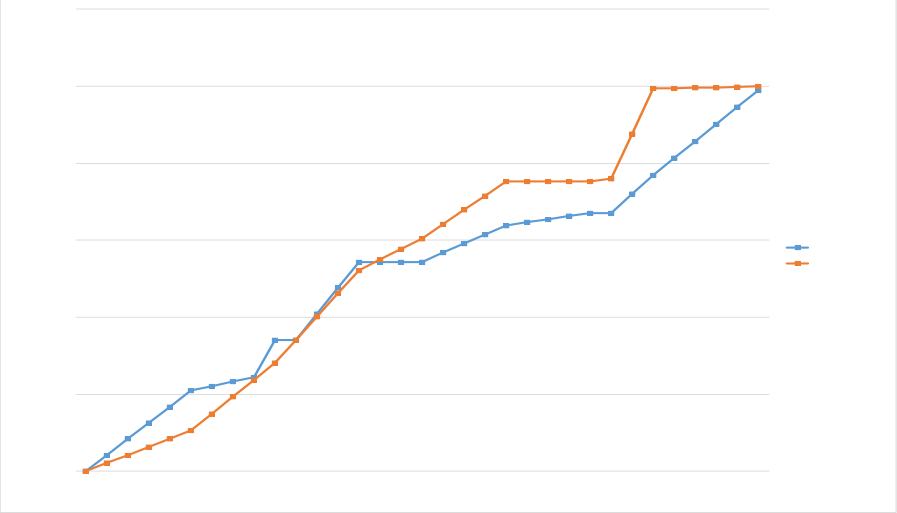

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

A continuación, se anexan al contenido de este informe los siguientes formatos suscritos por los responsables:

✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-5: Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-7: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-9: Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-13: Seguimiento Garantías Contrato Interventoría

✓MEPI-MN1-IN-15-FR-15: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. (No Aplica)

✓ MEPI-MN-IN-9-FR-2: Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/09/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3428-2024

INTERVENTORÍA: EN IMPACTO S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3314-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTO	SUZUKI GIXXER MODELO 2021	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ARTURO JURADO JURADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720209860CLD

Firma
Nombre: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:01 107-0905CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3428-2024

INTERVENTOR: EN IMPACTO S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025

PROYECTO: PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA

CONTRATO DE OBRA No.: 3314-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO EL CARMEN

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CCF DE CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARTURO JURADO ALVARAN	10.240.890,00	DIRECTOR	$ 594.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,3	EN IMPACTO SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100	V	nueva eps	35167109	$ 246.300						PENSIONADO
2	JHON HENRY MENDOZA	1.053.842.509,00	RESIDENTE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	EN IMPACTO SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100	V	nueva eps	35167404	$ 57.000	PORVENIR	35167404	$ 227.800	$ 57.000			
3	YASSER IVAN GONZALES	10.499.047,00	INSPECTOR	$ 1.350.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	EN IMPACTO SAS	$ 1.423.500,00	$ 99.100	V	nueva eps	35167178	$ 57.000	PROTECCION	35167178	$ 227.800	$ 57.000			
4	YON FREIDER CASTRILLON YEPES	1.053.812.079,00	SISO	$ 776.250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,5	INDEPENDIENTE	$ 2.200.000,00	$ 99.100	V	eps sura	35167109	$ 275.000	PROTECCION	33262840	$ 352.000				
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
N																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 4.920.250**																																									

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 dias del mes de SEPTIEMBRE a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ARTURO JURADO ALVARAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1720209860CLD

Firma

Nombre: ING LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.01 107-0905CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

MES INFORME MENSUAL: 22 AL 31 DE AGOSTO **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 3314-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO EL CARMEN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	947124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 59.003.259,00	$ 19.533.647,45
2024	947124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACION	ADICION N° 1	$ 25.996.741,00	
2025	112325	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	NACION	ADICION N° 2	$ 25.000.000,00	
		TOTAL				$ 110.000.000,00	$ 19.533.647,45

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 110.000.000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	sep-24	$ -	$ -	$ -		$ -		947124-24/09/2024	$ 59.003.259,00	$ 59.003.259,00		
2	oct-24	$ 11.074.800,00	$ 2.104.212,00	$ 13.179.012,00		$ 13.179.012,00		947124-24/09/2024	$ 45.824.247,00	$ 45.824.247,00		
3	nov-24	$ 15.731.600,00	$ 2.989.004,00	$ 18.720.604,00		$ 18.720.604,00		947124-24/09/2024	$ 27.103.643,00	$ 27.103.643,00		
									$ 25.996.741,00	$ 25.996.741,00		Se adiciona el contrato por un valor de $ 25.996.741
4	dic-24	$ 13.431.600,00	$ 2.552.004,00	$ 15.983.604,00		$ 15.983.604,00		947124-24/09/2024	$ 37.116.780,00	$ 37.116.780,00		
5	ene-25								$ 37.116.780,00	$ 37.116.780,00		
6	may-25	$ 13.019.265,00	$ 2.473.660,35	$ 15.492.925,35		$ 15.492.925,35		947124-24/09/2024	$ 21.623.854,65	$ 21.623.854,65		
7	jun-25	$ 16.468.200,00	$ 3.128.958,00	$ 19.597.158,00		$ 19.597.158,00		947124-24/09/2024	$ 2.026.696,65	$ 2.026.696,65		
8	jul-25								$ 2.026.696,65	$ 2.026.696,65		
9	ago-25	$ 1.641.624,29	$ 385.072,36	$ 2.026.696,65		$ 2.026.696,65			$ -	$ -		
								112325-04/07/2025	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00		Se adiciona el contrato por un valor de $ 25.000.000
9	ago-25	$ 4.655.055,71	$ 811.296,84	$ 5.466.352,55		$ 5.466.352,55		112325-04/07/2025	$ 19.533.647,45	$ 19.533.647,45		
10	sep-25	$ 13.854.425	$ 2.632.340,75	$ 16.486.765,75		$ 16.486.765,75		112325-04/07/2025	$ 3.046.881,70	$ 3.046.881,70		
TOTALES		$ 89.876.570,00	$ 17.076.548,30	$ 106.953.118,30		$ 106.953.118,30		112325-04/07/2025	$ 19.533.647,45	$ 19.533.647,45		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OCTUBRE 2024	$ 11.074.800	$ 2.104.212	$ 13.179.012
*NOVIEMBRE 2024	$ 15.731.600	$ 2.989.004	$ 18.720.604
*DICIEMBRE 2024	$ 13.431.600	$ 2.552.004	$ 15.983.604
*MAYO 2025	$ 13.019.265	$ 2.473.660	$ 15.492.925
*JUNIO 2025	$ 16.468.200	$ 3.128.958	$ 19.597.158
*AGOSTO 2025	$ 1.641.624	$ 385.072	$ 2.026.697
*AGOSTO 2025	$ 4.655.056	$ 811.297	$ 5.466.353
*SEPTIEMBRE	$ 13.854.425	$ 2.632.341	$ 16.486.766
VALOR TOTAL	**$ 89.876.570,00**	**$ 17.076.548,30**	**$ 106.953.118,30**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:01 107-0905CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3428-2024 **INTERVENTOR:** EN IMPACTO SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.

FECHA DE INICIO: 24/11/2024

PLAZO INICIAL: 3 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 59.003.259,00

VALOR ACUMULADO: $ 85.000.000,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUZ LILIANA TIBATA CASTEBLANCO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.900.326,00	29	8	24	29	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14%	$ 11.800.652,00	29	8	24	29	11	2027
Calidad del servicio	21%	$ 17.700.978,00	29	11	24	29	11	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.900.326,00	25	9	2024	25	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14%	$ 11.800.652,00	25	9	2024	26	12	2027
Calidad del servicio	21%	$ 17.700.978,00	26	12	2024	26	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	15	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	15	2	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	15	2	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	7	9	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	7	3	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	7	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	6	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	6	7	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	7	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	6	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	6	7	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	7	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	17	2	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	17	8	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	17	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.500.000,00	25	9	2024	22	2	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 17.000.000,00	25	9	2024	22	8	2028
Calidad del servicio	30%	$ 25.500.000,00	26	12	2024	22	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.000.000,00	25	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 22.000.000,00	25	9	2024	30	9	2028
Calidad del servicio	30%	$ 33.000.000,00	26	12	2024	22	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.000.000,00	25	9	2024	31	3	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 22.000.000,00	25	9	2024	30	9	2028
Calidad del servicio	30%	$ 33.000.000,00	26	12	2024	22	8	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156407

Certificado de modificación o anexo No.: 15
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Firma

Nombre: ARTURO JURADO ALVARAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:1720209860CLD

Firma

Nombre: LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:T.P: 0708-0906

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se tramitan actas de costos de la interventoría a la supervisión de INVIAS.

Se concilian y se aprueban actas de obra parciales del contratista, se verifican sus respectivos soportes para su trámite correspondiente.

8. ANEXOS Y OTROS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
26-9-2025		CONSTRUCCIONES MEGON - SUBCONTRATISTA	INFORME SEMANAL
24-9-2025			INFORME SEMANAL
21-9-2025			ACTA DE COSTOS

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	ASUNTO	ENVIADO A
26-09-2025 22-09-2025	INFORME SEMANAL Y COSTOS REPORTE CORPROCALDAS	SUPERVISOR
01-09-2025	SOLICITUD CONTRATISTA	SUPERVISOR

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales





























8.3 REGISTRO PREDIAL, AMBIENTAL

NO APLICA

EN IMPACTO SAS
Nombre del representante legal: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Dirección de correo: Carrera 63b – N° 11-03 B. Minitas- Manizales, Caldas.
Correo electrónico: admenimpactosas@gmail.com
Telefax: 310 391 7278
Ciudad: Manizales

Fecha: 1 de Septiembre del 2025.
Ubicación:
Actividad: - Excavación en roca Sector de pueblo nuevo, Municipio de Pensilvania, conformación de banco de la vía.
- Se uso retroexcavadora de orugas más 2 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 2 de septiembre de 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de pueblo nuevo, municipio de Pensilvania, conformación banco de la vía.
Se uso retroexcavadora de orugas más 2 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 3 de Septiembre del 2025.
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la vía.
Se uso retroexcavadora de orugas más 2 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 4 de Septiembre 2025.
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, Municipio de Pensilvania. Conformación de banco de la vía
Se uso retroexcavadora de orugas más 2 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 5 de Septiembre 2025.
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, Municipio de Pensilvania, Conformación de banco de la vía.
Se uso retroexcavadora de orugas, más 2 volquetas
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 6 de Septiembre 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la via.
Se uso retroexcavadora de orugas, más 2 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 8 de Septiembre 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca sector de pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la via.
Se uso retroexcavadora de orugas mas 3 volquetas
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 9 de Septiembre 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la via.
Se uso retroexcavadora de orugas mas 3 volquetas
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 10 de Septiembre 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la via.
Se uso retroexcavadora de orugas mas 3 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 11 de septiembre 2025
Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de la banco de la via.

Se use retroexcavadora de orugas más 3 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha 12 de Septiembre 2025

Ubicación
Actividad: Excavación en roca Sector de Pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la vía.
Se use retroexcavadora de orugas más 3 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha 13 de Septiembre 2025

Ubicación:
Actividad: Excavación en roca Sector de pueblo Nuevo, municipio de Pensilvania, conformación de banco de la vía.
Se use retroexcavadora de orugas más 3 volquetas.
Desalojo de material producto de excavación.

Fecha: 15 de Septiembre 2025

Ubicación:
Actividad: Excavación de material común en la vía del alto del Volcán, en Aguadas más retiro, uso de retroexcavadora de llantas y volqueta.
Extracción de material granular (afirmado) y cargue para transportar dentro del mismo tramo.
Extendido y compactado de material granular sobre áreas definidas por interventoría (sitios críticos).

Fecha: 16 de Septiembre 2025

Ubicación:
Actividad: Excavación de material común en la vía del alto del Volcán en Aguadas más retiro, uso de retroexcavadora de llantas y volqueta.
Extracción de material granular (afirmado) y cargue para transportar dentro del mismo tramo.

Extendido y compactado de material granular sobre sitios definidos por interventoría (sitios críticos)

Fecha: 17 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de material común en la vía del alto del volcán, en Aguadas vía retiro, uso de retroexcavadora de llantas y volqueta.
Extracción de material granular (afirmado) y cargue para transportar dentro del mismo tramo.
Extendido y compactado de material granular sobre sitios definidos por interventoría (sitios críticos).

Fecha: 18 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de material común en la vía del alto del volcán, en Aguadas vía retiro, uso de retroexcavadora de llantas y volqueta.
Extracción de material granular (afirmado) y cargue para transportar dentro del mismo tramo.
Extendido y compactado de material granular sobre sitios definidos por interventoría. (Sitios críticos)

Fecha: 19 de Septiembre 2025

Ubicación

Actividad: Excavación de material común en la vía del alto del volcán, en Aguadas vía retiro, uso de retroexcavadora de llantas y volqueta.
Extracción de material granular (afirmado) y cargue para transportar dentro del mismo tramo.
Extendido y compactado de material granular sobre sitios definidos por interventoría (sitios críticos)

Fecha: 20 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de material común en la vía del alto Volcán, en Aguadas más retiro, uso de retroexcavadora de llantas y cadena.
Extracción de material granular (arrimado) y cargue para transportar dentro del mismo frente.
Extendido y compactado de material granular sobre áreas definidas por interventoría (Sitios críticos)

Fecha: 22 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se uso retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la vía para manejo hidráulico y proteger los taludes
Instalación de piedra filtro para conformar diques laterales.

Fecha: 23 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se uso retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la vía para manejo hidráulico y proteger los taludes
Instalación de piedra filtro para conformar diques laterales

Fecha: 24 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se uso retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la vía para manejo hidráulico y proteger los taludes.

Instalacion de pieda filtro para conformar drenes laterales

Fecha: 25 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se usa retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalacion de geotextil en la base de filtros laterales de la via para manejo hidraulico y proteger los taludes.
Instalacion de piedra filtro para conformar drenes laterales.
Instalacion de geotextil para estabilizar rasante.

Fecha 26 de Septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se uso retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la via para manejo hidraulico y proteger los taludes.
Instalacion de piedra filtro para conformar drenes laterales
Instalación de geotextil para estabilizar rasante.

Fecha: 27 de septiembre 2025

Ubicación:

Actividad: Excavación de zanja para filtro, se uso retroexcavadora de llantas sector alto del volcán.
Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la via para manejo hidraulico y proteger los taludes.
Instalacion de piedra filtro para conformar drenes laterales.
Instalación de geotextil para estabilizar rasante.

Fecha 24 de Septiembre 2025

Ubicación

Actividad Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la eso para manejo hidraulico y proteger los taludes
Instalación de piedra filtro para confinar dichos laterales.
Instalación de geotextil para estabilizar rasante.

Fecha 30 de septiembre 2025.

Ubicación

Actividad Instalación de geotextil en la base de filtros laterales de la eso para manejo hidraulico y proteger los taludes
Instalación de piedra filtro para confinar dichos laterales.
Instalación de geotextil para estabilizar rasante.
