INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL _____ FINAL ___X___

PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2025 AL 28 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO No.	: C-042-2024 / 12 de diciembre de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Selección Abreviada
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: SAMCSI 008 de 2024
OBJETO	: Realizar la compra e instalación de elementos de señalética para los despachos judiciales y sede administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta; de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalética de la Rama Judicial
LOCALIZACIÓN	: El indicado en el contrato
VALOR	: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($240.116.263,00)
PLAZO INICIAL	: La duración del contrato será a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
ADICIÓN EN PLAZO N°1	: Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 31 de diciembre de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025.
ADICIÓN EN PLAZO N°2	: Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 01 de marzo de 2025, hasta el 28 de abril de 2025
PLAZO TOTAL	: Cuatro (4) meses y doce (12) días.
PLAZO FINAL	: Hasta el 28 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	: 16 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	: 28 de abril de 2025

CONTRATISTA : ALVEM S.A.S

SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

- El día dieciséis (16) de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del contrato C-042-2024, con fecha de terminación inicial el 31 de diciembre de 2024.

- El día 30 de diciembre de 2024, se realiza prorroga 01 al contrato N° C-042-2024 por un tiempo adicional de Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 31 de diciembre de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025.

- El día 28 de febrero de 2025, se realiza prorroga 02 al contrato N° C-042-2024 por un tiempo adicional de Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 01 de marzo de 2025, hasta el 28 de abril de 2025.

- El día 28 de abril de 2025 se suscribe el Acta de Recibo Final del contrato de N° C-042-2024.

- El Contratista presentó un informe acompañado de un registro fotográfico que evidencia las obras ejecutadas durante el periodo correspondiente a este informe.

1.1. GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 14-44-101226179– SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Anexo	Fecha de Expedición	Amparos	%	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Observación
0	13/12/2024	Cumplimiento del contrato	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	Según Firma Contrato
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	
		Calidad del servicio	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	12/12/2024	31/12/2027	$12.005.812,1	
1	31/12/2024	Cumplimiento del contrato	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	Según Prorroga del 30/12/2024
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	
		Calidad del servicio	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	
		Pago de salarios,	5	12/12/2024	28/02/2028	$12.005.812,1	

		prestaciones sociales e indemnizaciones					
2	03/03/2025	Cumplimiento del contrato	10	12/12/2024	30/10/2025	$24.011.626,3	Según Prorroga del 28/02/2025
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	12/12/2024	30/10/2025	$24.011.626,3	
		Calidad del servicio	10	12/12/2024	30/10/2025	$24.011.626,3	
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	12/12/2024	28/04/2028	$12.005.812,1	

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 01 de abril al 28 de abril de 2025 se llevó acabo la ejecución de las actividades que se detallan a continuación:

- Se relaciona lo desarrollado en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 28 de abril de 2025:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA	% AVANCE
1	OFICINAS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (20 cm * 30 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	202	202	100%
2	SALAS DE AUDIENCIAS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (20 cm * 30 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	67	67	100%
3	BAÑOS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (15 cm * 20 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	123	123	100%

4	DIRECTORIO	Directorio de piso tipo cartelera, fabricado lámina de acrílico cristal 3mm de espesor, con sistema deslizable, decorado con vinilo adhesivo impreso y vinilo adhesivo imitación acero inoxidable. Sistema para instalación en muro, vidrio o madera (120 cm * 180 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	8	8	100%
5	SALIDA DE EMERGENCIA	Señalización en poliestireno que contenga logo de la rama Judicial, calibre 40, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 10 horas de duración, textos y pictogramas en impresión digital en alta resolución sobre vinilo transparente brillante cubriendo la impresión (36 cm * 18 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	57	57	100%
6	RUTAS DE EVACUACIÓN	Señalización en poliestireno que contenga logo de la rama Judicial, calibre 40, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 10 horas de duración, textos y pictogramas en impresión digital en alta resolución sobre vinilo transparente brillante cubriendo la impresión (36 cm * 18 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	158	158	100%
7	FACHADA MUNICIPIOS	Aviso de fachada principal con letras independientes, cada una tendrá una base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta. Incluye logo circular de la Rama Judicial con base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta (200 cm * 60 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander, Arauca, Cesar y Boyacá según corresponda	UND	12	12	100%

- Para el periodo del informe el avance de las actividades del contrato de consultoría corresponde al 100%.

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas









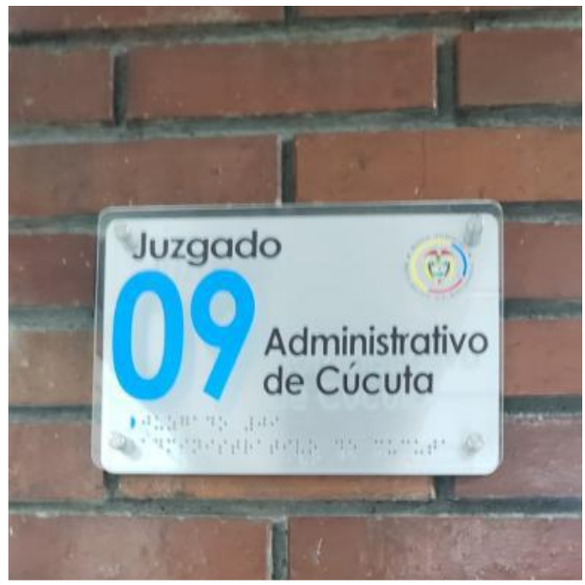





Centro de
Servicios Judiciales
Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta


Sala de
Audiencias
06


Juzgado
03
Laboral del
Circuito


Juzgado
09
Administrativo
de Cúcuta


Juzgado
05
Laboral del
Circuito


Juzgado
08
Administrativo
de Cúcuta


Sala de
Audiencias
28


GABINETE
CONTRA
INCENDIO
EXTINTOR
MULTIPROPÓSITO
INSTRUCCIONES DE MANEJO
MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR


RUTA DE
EVACUACIÓN


W.C. Femenino


Juzgado Promiscuo Municipal
Fortul - Arauca


Juzgado 001 Promiscuo Municipal
Tame - Arauca
14-03


Juzgado 002 Promiscuo Municipal
Tame - Arauca


Juzgado 003 Promiscuo Municipal
Tame - Arauca
FISCALÍA

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-02-017
FECHA	31/07/2024
No. DE DISPONIBILIDAD	6724
VALOR INICIAL	$243.966.700
VALOR OPERACIÓN	$0,00
SALDO POR COMPROMETER	$243.966.700
VALOR TOTAL CDP	$243.966.700

REGISTRO PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-02-017
FECHA	13/12/2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	35824
VALOR INICIAL – CSF	$240.116.263
VALOR OPERACIÓN – CSF	$0,00
VALOR ACTUAL – CSF	$240.116.263
SALDO POR OBLIGAR	$240.116.263
VALOR TOTAL RP	$240.116.263

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

En el presente periodo no se realizaron pagos al contratista.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El presente contrato no conto con anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El presente contrato no presenta rendimientos financieros.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa ALVEM S.A.S, no acredito personal discapacitado en su oferta, la cual fue presentada en el marco del proceso de Selección Abreviada SAMCSI 008 de 2024.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes ni reclamaciones laborales.

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Hasta la fecha, no se han presentado riesgos que afecten el desarrollo del contrato o del proyecto. Inicialmente se contempló como posible riesgo la dificultad en los traslados hacia algunos municipios del departamento de Arauca, debido a condiciones de inseguridad y estado de las vías. No obstante, esta situación fue gestionada oportunamente mediante la solicitud de una prórroga, lo cual ha permitido cumplir con las actividades de instalación de los letreros sin contratiempos.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el presente periodo no se generaron residuos.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades se llevaron a cabo cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, se realizan los controles de calidad previamente establecidos. No se reportaron incidentes ni accidentes durante el periodo evaluado, lo que refleja el compromiso del equipo con el cumplimiento de las normativas vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los veintiocho (28) días, del mes de abril de 2025.



MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisor del Contrato
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
