INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL __X___ FINAL _____

PERIODO DE 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO No. : C-042-2024 / 12 de diciembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección Abreviada

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : SAMCSI 008 de 2024

OBJETO : Realizar la compra e instalación de elementos de señalética para los despachos judiciales y sede administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta; de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalética de la Rama Judicial

LOCALIZACIÓN : El indicado en el contrato

VALOR : DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($240.116.263,00)

PLAZO INICIAL : La duración del contrato será a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

ADICIÓN EN PLAZO N°1 : Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 31 de diciembre de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025.

ADICIÓN EN PLAZO N°2 : Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 01 de marzo de 2025, hasta el 28 de abril de 2025

PLAZO TOTAL : Cuatro (4) meses y doce (12) días.

PLAZO FINAL : Hasta el 28 de abril de 2025

FECHA DE INICIO : 16 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 31 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : 28 de abril de 2025

CONTRATISTA : ALVEM S.A.S

SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

- El día dieciséis (16) de diciembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del contrato C-042-2024, con fecha de terminación inicial el 31 de diciembre de 2024.

- El día 28 de febrero de 2025, se realiza prorroga 02 al contrato N° C-042-2024 por un tiempo adicional de Cincuenta y nueve (59) días, contados a partir del 01 de marzo de 2025, hasta el 28 de abril de 2025.

- Durante el periodo del 7 al 28 de febrero de 2025, la supervisión fue ejercida por JUAN CARLOS BLANCO RINCON, en calidad de supervisor delegado, dado que la supervisora titular, MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON, se encontraba en periodo de vacaciones.

- El Contratista presentó un informe acompañado de un registro fotográfico que evidencia las obras ejecutadas durante el periodo correspondiente a este informe.

1.1. GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 14-44-101226179– SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Anexo	Fecha de Expedición	Amparos	%	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Observación
0	13/12/2024	Cumplimiento del contrato	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	Según Firma Contrato
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	
		Calidad del servicio	10	12/12/2024	30/06/2025	$24.011.626,3	
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	12/12/2024	31/12/2027	$12.005.812,1	
1	31/12/2024	Cumplimiento del contrato	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	Según Prorroga del 30/12/2024
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	
		Calidad del servicio	10	12/12/2024	30/08/2025	$24.011.626,3	
		Pago de salarios, prestaciones	5	12/12/2024	28/02/2028	$12.005.812,1	

		sociales e indemnizaciones					

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2025 se llevó acabo la ejecución de las actividades que se detallan a continuación:

- Se relaciona lo desarrollado en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2025:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA	% AVANCE
1	OFICINAS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (20 cm * 30 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	202	111	55%
2	SALAS DE AUDIENCIAS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (20 cm * 30 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	67	37	55%
3	BAÑOS	Señalización en acrílico cristal 3mm con impresión digital, dilatadores, base acrílico con vinilo metalizado (15 cm * 20 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	123	67	54%
4	DIRECTORIO	Directorio de piso tipo cartelera, fabricado lámina de acrílico cristal 3mm de espesor, con sistema deslizable, decorado con vinili adhesivo impreso y vinilo adhesivo imitación acero inoxidable. Sistema para instalación en muro, vidrio o madera (120 cm * 180 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	8	4	50%

5	SALIDA DE EMERGENCIA	Señalización en poliestireno que contenga logo de la rama Judicial, calibre 40, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 10 horas de duración, textos y pictogramas en impresión digital en alta resolución sobre vinilo transparente brillante cubriendo la impresión (36 cm * 18 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	57	28	49%
6	RUTAS DE EVACUACIÓN	Señalización en poliestireno que contenga logo de la rama Judicial, calibre 40, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo foto luminiscente 10 horas de duración, textos y pictogramas en impresión digital en alta resolución sobre vinilo transparente brillante cubriendo la impresión (36 cm * 18 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander y Arauca según corresponda	UND	158	79	50%
7	FACHADA MUNICIPIOS	Aviso de fachada principal con letras independientes, cada una tendrá una base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta. Incluye logo circular de la Rama Judicial con base en acrílico de 3mm, con una lámina de acero inoxidable sobrepuesta (200 cm * 60 cm). Incluye retiro señalización existente, resanes e instalación en los diversos municipios de Norte de Santander, Arauca, Cesar y Boyacá según corresponda	UND	12	6	50%

- Para el periodo del informe el avance de las actividades del contrato de consultoría corresponde al 53%.

Registro fotográfico de las actividades ejecutadas


OF-B302
Juzgado
002
Promiscuo de
Familia del Circuito
de Pamplona


B-203
OF-B203
Juzgado
001
Civil
Municipal
de Pamplona


405-C
Edgar Enrique
Bernal Jauregui
Magistrado Tribunal
Administrativo de Norte de Santander


403-C
Hernando
Ayala Peñaranda
Magistrado Tribunal Administrativo
de Norte de Santander


Sala de
Audiencias
23

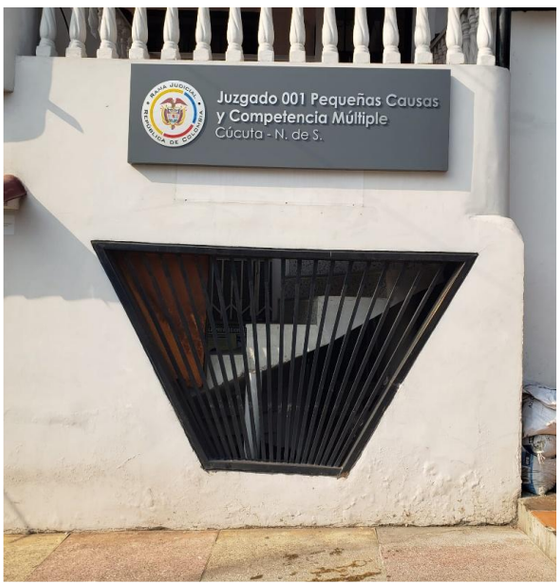

Juzgado
07
Civil
del Circuito


Sala de
Audiencias
12


W.C. Femenino


GABINETE
CONTRA
INCENDIO


RUTA DE
EVACUACIÓN


Juzgado 001 Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple
Cúcuta - N. de S.


SALIDA DE
EMERGENCIA


Sala de
Audiencias
09


Juzgado
01
Civil
Municipal


W.C. Masculino


Juzgado 002 Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple
Cúcuta - N. de S.


RUTA DE
EVACUACIÓN


Juzgado
11
Penal
Municipal
con Función de
Conocimiento de Cúcuta

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-02-017
FECHA	31/07/2024
No. DE DISPONIBILIDAD	6724
VALOR INICIAL	$243.966.700
VALOR OPERACIÓN	$0,00
SALDO POR COMPROMETER	$243.966.700
VALOR TOTAL CDP	$243.966.700

REGISTRO PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-02-017
FECHA	13/12/2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	35824
VALOR INICIAL – CSF	$240.116.263
VALOR OPERACIÓN – CSF	$0,00
VALOR ACTUAL – CSF	$240.116.263
SALDO POR OBLIGAR	$240.116.263
VALOR TOTAL RP	$240.116.263

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

En el presente periodo no se realizaron pagos al contratista.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El presente contrato no conto con anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El presente contrato no presenta rendimientos financieros.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa ALVEM S.A.S, no acredito personal discapacitado en su oferta, la cual fue presentada en el marco del proceso de Selección Abreviada SAMCSI 008 de 2024.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes ni reclamaciones laborales.

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

El contratista solicitó una prórroga debido a que, los elementos están listos para su entrega y se encuentran en la fase de instalación la cual se ha visto afectada por la situación de seguridad actual en los municipios donde deben ejecutarse los trabajos. Esta condición externa ajena a la voluntad del contratista, representa un riesgo tanto para el personal encargado de la instalación como para la integridad de los elementos a instalar, lo que puede comprometer el desarrollo optimo del

proyecto. Por lo tanto, estableciendo que el plazo actual de ejecución del contrato No. C – 042 DE 2024, no será suficiente, solicitó ampliar el plazo de este hasta el 28 de abril de 2025.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el presente periodo no se generaron residuos.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades se llevaron a cabo cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, se realizan los controles de calidad previamente establecidos. No se reportaron incidentes ni accidentes durante el periodo evaluado, lo que refleja el compromiso del equipo con el cumplimiento de las normativas vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los veintiocho (28) días, del mes de febrero de 2025.

MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisor del Contrato
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
