ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	220 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	220 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE TERMINÓ EL LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS Y SE CONTINÚAN ENTREGANDO LOS PRODUCTOS TOPOGRÁFICOS A LA INTERVENTORÍA

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

- LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN LOS APIQUES
- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)

- LABORATORIO A LAS MUESTRAS TOMADAS EN LOS APIQUES
- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DE ORIENTE:

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FÓMEQUE)

- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

FOSCA (FOSCA-QUINCHITA-SANAME)

- ENSAYOS DE SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL TRAMO

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME TÉCNICO

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME TÉCNICO

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE
- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE ALCANTARILLAS DE DESCOLE POR NO CONFORMIDAD

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	15-nov-25	220	0	-130
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	15-nov-25	220	7	-87
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	15-nov-25	76	-54	46

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	55,32%	9,88%	-45,44%
Durante el periodo	3,01%	1,03%	-1,98%
Acumulado Actual	13,58%	10,91%	-2,67%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	220,00	47	-7,13

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

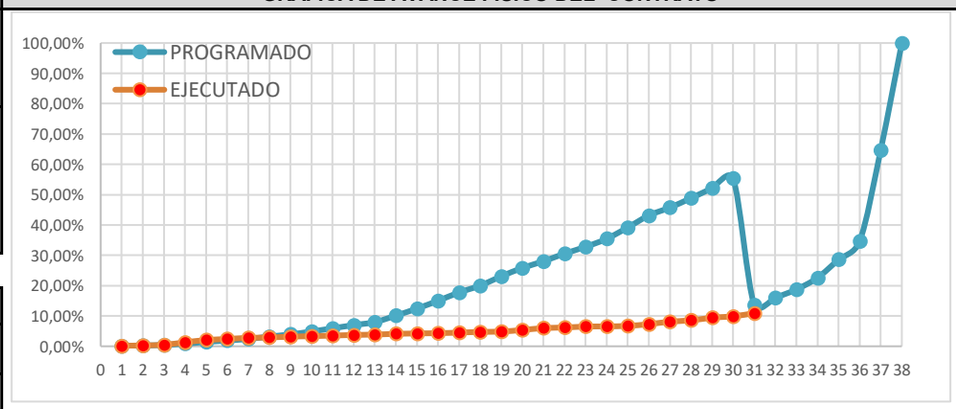

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL


CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	15-nov-25	SEMANA No.	31	DEL	8-nov-25	AL	14-nov-25

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 19.555.104.458	$ 3.492.187.056	18%
Durante el periodo	$ 1.062.632.583	$ 363.269.476	34%
Acumulado Actual	$ 4.798.839.913	$ 3.855.456.532	80%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

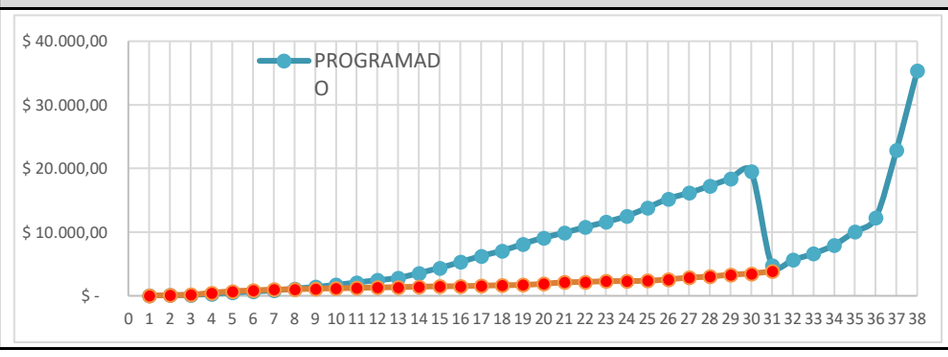


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 943.383.381

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

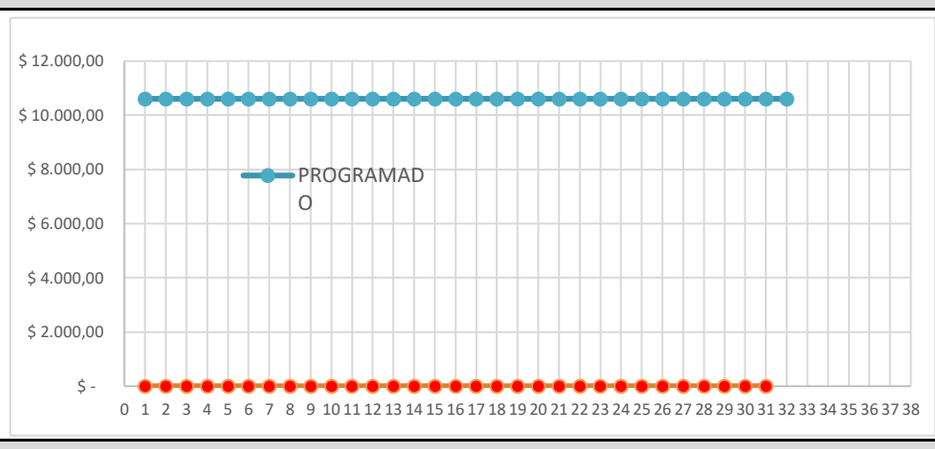

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-2,67%

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Se realizó apremio por incumplimiento del entregable de la fase 1 del municipio de Choachí mediante oficio 766-388, dado que a la fecha del 10-11 se continua la realización de actividades de levantamiento con coordenadas arbitrarias. Se emitió la aprobación condicionada del informe de caracterización geotécnica del municipio de Ubalá, mediante oficio 766-390

Se realizó la validación técnica y financiera des desglose del presupuesto del AIU, mediante oficio de viabilidad 766-395. Por otro lado, se realizó la aprobación del informe de caracterización del municipio de Sibaté mediante oficio 766-412.

Se realizó el comité de seguimiento N° 26 el día 13 de noviembre, donde se dejó constancia de la revisión y conclusión del comportamiento de los geomateriales estabilizado con solo cemento versus la resistencia con la adición del químico no tradicional. El contratista realiza el compromiso de entregar los informes de caracterización de los municipios de Medina, Paratebueno, Fosca y Quetame para el 13 y 14 de noviembre del 2025.

Mediante oficio 766-391 con asunto Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-394 – Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia y Respuesta Oficio SOFANFOR-CO-03-ICCU031-399, contratista dio entrega de al plan de contingencia y reprogramación del contrato en una versión 4, por lo cual la interventoría realizo las respectivas observaciones y a su vez dio aprobación de esta.

Mediante oficio 766-394 con asunto Validación y Aceptación de Aclaraciones al Procedimiento Constructivo del Sello de Arena-Asfalto (SAA - INV 432-22), en el cual se da aprobación a las aclaraciones que en contratista entrego en relación con el proceso constructivo del sello de arena asfalto.

Mediante oficio 766-395 con asunto Validación y Viabilidad Técnica y Financiera del Desglose del AIU (31.5%) V3 para el Contrato ICCU-CTO-138-2025 del 10 de noviembre del 2025, donde la interventoría dio vialidad técnica y financiera al desglose del AIU habiendo cumplido con las observaciones realizadas.

Mediante oficio 766-400 Notificación Validación y Aceptación de Aclaraciones al Procedimiento Constructivo del Sello de Arena-Asfalto (SAA - INV 432-22), mediante el cual se dio aprobación al proceso constructivo de la capa de protección de las vías a intervenir.

Mediante oficio 766-401 con asunto entrega informe semanal N°30 de interventoría al ICCU, por lo cual se remite la información general del contrato de obra, con los valores de avance y retraso de la obra.

Mediante oficio 766-402 con asunto Segunda revisión, observaciones informe mensual N°6 correspondiente al mes de septiembre, en el cual la interventoría remite las observaciones v2 realizadas al informe mensual de obra.

Mediante oficio 766-409 con asunto Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-408-Respuesta al Oficio No. 766-Tipología y detalle constructivo de cuneta vial a implementar incluido el presupuesto. Del 11 de noviembre del 2025, Emitió algunas condiciones a fin de que el contratista subsane lo solicitado.

Mediante oficio 766-410 con asunto Rta. SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-417 Observaciones informe Anticipo N° 2, se realizaron las observaciones al informe del anticipo del mes de agosto a fin de que el contratista subsane lo solicitado en un plazo de 2 días.

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-389 con asunto Observaciones Informe Diseño de Estabilización y Estructura de Pavimento Provincia del Guavio Tramo – Clemente-Palenque-Río Sucio – Gama En Versión 4 del 10 de noviembre del 2025 en Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-381, Radicación Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Gama, mediante el cual se realizan no se da aprobación a el informe debido a que presenta diferentes observaciones por lo cual se remite para subsanación al contratista de obra.

Mediante oficio 766-390 con asunto Aprobación condicionada informe diseño de estabilización y estructura de pavimento provincia del Guavio tramo – Casa Rosada-San Luis – Ubalá en versión 4-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-378 del 10 de noviembre del 2025, dando aprobación del informe de laboratorio del diseño y estabilización de la estructura de pavimento sin embargo se solicitan observaciones menores y de forma con solicitud a un día de respuesta.

Mediante oficio 766-396 Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-402-Respuesta al Oficio No. 766-315-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín v4, la interventoría realiza la revisión de el presupuesto preliminar presentado por el contratista, verificando la corrección de las observaciones solicitadas, verificando que no todas se cumplieron por lo tanto contratista envía oficio a fin de que se subsane en su totalidad.

Mediante oficio 766-405 con asunto Observaciones situación presentada alcantarilla PR1+670, provincia Guavio, municipio de Junín, tramo suevo – Junín, vereda san Francisco, mediante este oficio la interventoría solicita se analice la alcantarilla ubicada el en PR 1+670 a fin de que se tenga en cuenta para su reconstrucción debido a que a la estructura presenta diferentes daños.

Mediante oficio 766-406 con asunto Análisis de resultados reportados por el contratista de obra a la fecha de resistencia del concreto del municipio de Ubalá, provincia Guavio-oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-405, del 11 de noviembre del 2025, se solicita la entrega de nuevos resultados de laboratorio debido a que los presentados están especificando a que tipo de estructura o modulo pertenece de igual manera se reitera la entrega de resultados de laboratorio que el contratista realice en obra.

PROVINCIA ORIENTE

Mediante comunicado 766-373 se envía al Consorcio Sofán C-031 el REQUERIMIENTO SOBRE LA TOPOGRAFÍA (REPLANTEO, NIVELACIÓN y ABSCISADO) TRAMO CHOACHÍ.

Mediante comunicado 766-388 se envía al Consorcio Sofán C-031 APREMIO DE INCUMPLIMIENTO GRAVE por no subsanación y entrega definitiva de productos topográficos del tramo Choachí (Fase I)-RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-385 TOPOGRAFÍA CHOACHÍ.

Mediante comunicado 766-397 se envía respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-379-Respuesta al Oficio No. 766-275-ICCU – Requerimientos para inicio de intervenciones en Choachí y Junín.

Mediante comunicado 766-392 se da Alcance oficio 766-310– Viabilidad NP1 Sello Arena-Asfalto- Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-396-Respuesta al Oficio No. 766-310-ICCU – Remisión Ítem NP1 suscrito y en archivo PDF – Provincia del Oriente.

Mediante comunicado 766-403 se hacen observaciones comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-380, Radicación Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Chipaque.

Para esta semana comprendida del sábado 08 al viernes 14 de noviembre se continúa la intervención del afirmado de la vía correspondiente al segundo tramo de Choachí desde la abscisa K2+145 hacia la abscisa K2+760 para un total de 615,00m intervenidos.

Con respecto a actividades de caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- Ensayos de suelos estabilizantes a la muestras tomadas: en el tramo de Quetame 0,50 Km y en el tramo de Fosca 0,82 Km.

PROVINCIA MEDINA

Mediante comunicado 766-393 se envía respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-404 GEOPOSICIONAMIENTO GNSS MEDINA en el cual se dan por recibidos y aprobados.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

Mediante comunicado 766-404 se envía respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-409 GEOPOSICIONAMIENTO GNSS PARATEBUENO en el cual se dan por recibidos y aprobados.

Con respecto a actividades de caracterización del suelo se realizó lo siguiente:

- Laboratorio a las muestras tomadas en los equipos: en el tramo de Medina 4,06 Km y en el tramo de Paratebueno 3,82 Km.

- Ensayos de suelos estabilizantes a la muestras tomadas: en el tramo de Medina 20,30 Km y en el tramo de Paratebueno 8,19 Km.

PROVINCIA SOACHA

Mediante oficio 766-411 con asunto Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-410-Respuesta al Oficio No. 766-370-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Sibaté del 13 de noviembre del 2025, una vez revisada cada una de las alternativas planteadas en el documento PRESUPUESTO SIBATE – V3 la interventoría menciono varias consideraciones, a fin de que el contratista de obra subsane a la mayor brevedad lo solicitado.

Mediante oficio 766-412 con asunto Aprobación informe de caracterización Sibaté-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403-Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2748-CM467-2025 del 14 de noviembre del 2025.

Mediante oficio 766-413 con asunto Notificación Aprobación informe de caracterización Sibaté-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403-Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2748-CM467-2025, con el cual la interventoría da aprobación al informe de caracterización.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 8 al 14 de Noviembre del 2025

1.El día 14 de noviembre del 2025, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2.Se asiste a comité integral el día 13 de noviembre del 2025. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio y Oriente.
3.El día 10 de noviembre, el contratista remite el informe semanal vía correo electrónico.
4.Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5.Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio y Oriente donde se realizan las siguientes actividades:
•Verificación de delimitación y señalización.
•Inspección de campamento.
•Supervisión y acompañamiento en obra.
•Inspección baterías sanitarias campamento.
•Capacitación ambiental.
•Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.
6.Durante la semana, se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra habilitados, como lo es en el municipio de Junín y Choachí.
7.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
8.El día 11 de noviembre del 2025, se realiza capacitación Seguimiento y monitoreo ambiental en el Municipio de Choachí.
9.El día 11 de noviembre del 2025, se realiza capacitación Seguimiento y monitoreo ambiental Agua en el Municipio de Junín.
10.Comunicados de la semana:
Oficios remitidos por Interventoría:
•766-402, Segunda revisión, observaciones informe mensual N°6 correspondiente al mes de septiembre. 11 noviembre 2025.
•766-408, RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-352. Desglose Presupuesto PAGAS por provincia. 12 noviembre 2025.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 8 de noviembre, el Contratista envió la carta personalizada No. 33 con la invitación a la reunión de inicio No. 5 de Ubalá, dirigida a la alcaldía, para revisión de la Interventoría.

El 8 de noviembre, el Contratista envió la carta personalizada No. 34 con la invitación a la reunión de inicio No. 5 de Ubalá, dirigida a la Secretaría de Planeación, para revisión de la Interventoría.

El 8 de noviembre, el Contratista envió mediante correo electrónico el volante No. 17. Invitación a la reunión de inicio No. 5. Municipio de Ubalá, para revisión de la Interventoría.

El 10 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta No. 33, actualizada de acuerdo a los cambios establecidos en el comité de seguimiento semanal No. 25 realizado el 6 de noviembre.

El 10 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta No. 34, actualizada de acuerdo a los cambios establecidos en el comité de seguimiento semanal No. 25 realizado el 6 de noviembre.

El 10 de noviembre, el Contratista realizó la revisión de los buzones satelitales del municipio de Junín, ubicados en el campamento y en la alcaldía municipal.

El 10 de noviembre, el Contratista realizó la instalación del buzón satelital del municipio de Gama en la tienda Panami – PR 00.

El 11 de noviembre, Contratista realizó la radicación virtual de la carta No. 33. Invitación a la reunión de inicio No. 5 del municipio de Ubalá (primera parte), dirigida a la alcaldía.

El 11 de noviembre, Contratista realizó la radicación virtual de la carta No. 34. Invitación a la reunión de inicio No. 5 del municipio de Ubalá (primera parte), dirigida a la Secretaría de Planeación.

El 11 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación para la reunión de inicio No. 5, del municipio de Ubalá, la cual se realizará el 12 de noviembre. A través del mismo medio y en la misma fecha, se remiten desde la Interventoría las observaciones a la presentación proyectada. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la presentación subsanada.

El 11 de noviembre, la comunidad del municipio de Ubalá, preguntó a través del grupo de WhatsApp acerca de la fecha de la reunión de inicio No. 5. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista aclara las programaciones y la logística de la misma.

El 12 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión extraordinaria No. 2 del municipio de Ubalá con el Visto Bueno de la Interventoría para que ésta sea remitida a los asistentes.

El 12 de noviembre, se remitió mediante correo electrónico el visto bueno de la presentación para la reunión de inicio No. 5, sin embargo, se hizo un llamado de atención por el incumplimiento en los tiempos de entrega de los insumos para revisión de las partes.

El 14 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el Volante No. 17, con las modificaciones solicitadas en el comité de seguimiento semanal No. 25. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió observaciones del volante No, 17. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el volante No. 17 subsanado. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la pieza mencionada a la Supervisión Social de la Entidad para su revisión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión Social de la Entidad manifestó no tener observaciones sobre el Volante No. 17.

El 14 de noviembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 1. Provincia del Guavio, para que el Contratista realice la respectiva entrega a los participantes.

El 14 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación de la reunión de inicio No. 5 con los ajustes de los errores identificados en el desarrollo de la primera parte del encuentro. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la presentación para revisión de la Supervisión Social de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión social del ICCU remitió observaciones a la presentación.

El 14 de noviembre, se realizó la mesa de trabajo No. 31 del componente social, con la participación de los profesionales sociales del ICCU, la Interventoría y el Contratista.

El 14 de noviembre, se dio apertura al Punto SAU de la provincia del Guavio, en el municipio de Gachetá.

Provincia de Oriente

El 8 de noviembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-407 a través del cual dieron respuesta al comunicado 766-379-ICCU - Aprobación condicionada punto SAU Provincia de Oriente.

El 11 de noviembre, se radicó al Contratista el comunicado 766-402 con la segunda revisión y observaciones aplicables al informe mensual No. 6 del mes de septiembre del 2025.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

El 11 de noviembre, el Contratista realizó la socialización a través del grupo de WhatsApp de la apertura del Punto SAU en el municipio de Choachí para atención de la comunidad, indicando los datos de contacto del mismo.

El 11 de noviembre, a través del grupo de WhatsApp de Choachí el señor Javier Santiago, integrando de la JAC de La Caja, indicó que había un predio sin agua en el sector, por un daño con la maquinaria del Contratista.

El 12 de noviembre, se remitieron a través de correo electrónico las observaciones al acta de la reunión de inicio No. 1 del municipio de Choachí, para atención por parte del Contratista.

El 12 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 5 del municipio de Choachí con el Visto Bueno de la Interventoría para que ésta sea remitida a los asistentes.

El 12 de noviembre, se dio apertura a la atención presencial del Punto SAU de Choachí

El 14 de noviembre, a través del grupo de WhatsApp de Choachí, la señora Sandra García líder comunitaria de la vereda la Caja, notificó el arreglo de la tubería reportada el 11 de noviembre por parte del Contratista.

Provincia de Medina

El 12 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 2 del municipio de Paratebueno con el Visto Bueno de la Interventoría para que ésta sea remitida a los asistentes.

El 12 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 3 del municipio de Medina con el Visto Bueno de la Interventoría para que ésta sea remitida a los asistentes.

Provincia de Soacha

El 12 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la reunión preliminar No. 4 del municipio de Sibaté con el Visto Bueno de la Interventoría para que ésta sea remitida a los asistentes.

El 12 de noviembre, se realizó la difusión del volante No. 13. Contratación de Mano de Obra No Calificada a través del grupo de WhatsApp de Sibaté.

El 12 de noviembre, se recibieron cuatro (4) hojas de vida a través del teléfono del Punto SAU para el municipio de Sibaté.

Generales - componente social.

El 8 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el informe semanal No. 20 reportando las actividades realizadas entre el 1 al 8 de noviembre.

El 10 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el informe semanal No. 19 subsanado atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría.

El 10 de noviembre, se realizó la mesa de trabajo No. 30 del componente social, con la participación de los profesionales sociales del ICCU, Contratista e Interventoría.

El 13 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el envío del acta de la mesa de trabajo No. 28, con sus respectivas firmas.

El 13 de noviembre, los componente sociales del ICCU, Interventoría y Contratista asistieron y participaron en el comité de seguimiento semanal No. 26.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL
DEL 08 AL 14 NOVIEMBRE 2025
1. Comités: Internos 7 de nov-25
Externo 13 de nov-25
Actividades desarrolladas en los municipios de Junín y Choachí.
- Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección de maquinaria en general.
- Instalación PMT.
- Jornada de Orden y aseo en frentes de trabajo y zonas comunes.
- Entrega de EPP y dotación.

Charlas de seguridad y salud en el trabajo
10/11/2025 Riesgo Osteomuscular
11/11/2025 Primeros Auxilios
12/11/2025 Resbalones, Tropezones y Caídas
13/11/2025 Beber y Conducir
14/11/2025 Prevención de Caídas
15/11/2025 Cuidados con la Maquinaria

1. Gestión y apoyo administrativo.
- Recepción de carpetas personal Choachí y Junín.
- Inducción personal nuevo.
- Informe semanal.
- Implementación formatos SST y ambiental.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se realizó la solicitud para la evaluación de intervención de la alcantarilla del PR 1+670 del municipio de Junín, por fallas estructurales y de los cabezales, y fracturas en los tubos existentes. Se emitió a través del oficio 766-394 la validación y aclaración del procedimiento constructivo del sello de arena según los requerimientos realizados por la entidad

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizaron las observaciones al informe del buen manejo del anticipo N° 2 de contrato de obra ICCU-138-2025

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un atraso del -2,67%, ya que de acuerdo a la nueva programación aprobada el avance programado era del 13,58% y solo se ha ejecutado el 10,91%. El incumplimiento de los entregables correspondientes a la Fase I y II del contrato de obra ICCU-138-2025 ha repercutido en el avance de las actividades de obra de intervención sobre la rasante de los tramos a intervenir, generándose así un aumento el porcentaje de atraso del avance físico y financiero del contrato.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

Durante este periodo semanal no se han realizado aprobaciones para el tramite de giros del anticipo de obra correspondiente al mes de agosto del 2025

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Durante este periodo no se han realizado gestiones para el tramite de actas parciales de pago de la fase de caracterización y para la fase de intervención.

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

NA

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suministro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del proyecto, se solicitó al contratista cronograma de posibles visitas para identificación de permisos ambientales a solicitar ante las Autoridades Ambientales Competentes.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2025 se evidencian varias situaciones problemáticas relacionadas principalmente con la gestión y coordinación interinstitucional y la comunicación con las comunidades rurales. Persisten retrasos en la instalación de vallas informativas y en la atención de observaciones realizadas por la Interventoría, lo que refleja demoras en los procesos administrativos y de revisión documental. Asimismo, la suspensión de actividades en el tramo Casa Rosada – Laguna Azul (Ubalá) generó inconformidad comunitaria por la falta de avance visible, evidenciando débil socialización de los motivos y cronogramas de obra. Estas dificultades derivan de problemas de articulación entre Contratista, Entidad e Interventoría, tiempos prolongados en las aprobaciones y falta de información oportuna hacia la comunidad, lo que afecta la percepción social y el cumplimiento del Plan de Gestión Social.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Remisión de informes de buen manejo del anticipo de septiembre	Consorcio Sofán C-031	Inmediato

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*El contratista de obra consorcio SOFAN C-031 continúa con actividades e informes de la fase II de caracterización en el municipios de Quetame. Continúan detenidas las actividades de instalación de tubería de concreto de 36" y la construcción de las alcantarillas de encole y descole en el tramo Casa Rosada – San Luis - Laguna Azul en el municipio de Ubalá, sin embargo el contratista en comité realizado el 30 de octubre se comprometió a reiniciar actividades en este municipio debido a que la alcaldía ya finalizo con las placa huellas que la comunidad venia construyendo; se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K1+882 al K2+570 del municipio de Junín en la provincia del Guavio de igual manera se realizo la limpieza de las alcantarillas PR0+021, PR0+070, PR1+350 y PR1+630; y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K2+145 a la k2+760 en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente.
*Para la Fase I el Contratista de obra ha completado el levantamiento topográfico de los 11 tramos viales, después de superar las restricciones de acceso a la zona por la afectación de la ola invernal.
Durante la semana se adelantaron las actividades de seguimiento y control establecidas en el contrato. Se requirió al contratista por el incumplimiento del entregable de la fase 1 del municipio de Choachí, debido a la continuidad de levantamientos con coordenadas arbitrarias. Se emitió la aprobación condicionada del informe geotécnico del municipio de Ubalá y se validó técnicamente y financieramente el desglose del presupuesto del AIU. También se aprobó el informe de caracterización del municipio de Sibaté.

En el Comité de Seguimiento N.° 26 se revisó el comportamiento de los geomateriales estabilizados y se dejó constancia del compromiso del contratista de entregar los informes de Medina, Paratebueno, Fosca y Quetame. Adicionalmente, se solicitó la evaluación de la alcantarilla del PR 1+670 en Junín por fallas estructurales y se emitieron aclaraciones al procedimiento del sello de arena. Se realizaron observaciones al informe del manejo del anticipo N.° 2.

Finalmente, se revisó la versión 4 del Plan de Contingencia y reprogramación del contrato remitida por el contratista, se emitieron observaciones y se otorgó aprobación. La interventoría continúa con el seguimiento para el cumplimiento de los compromisos establecidos.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE GEOPOSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS


9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

MEDINA (HUMEA SAN CRISTOBAL GAZATAVENA SAN LUIS DEL RETIRO)

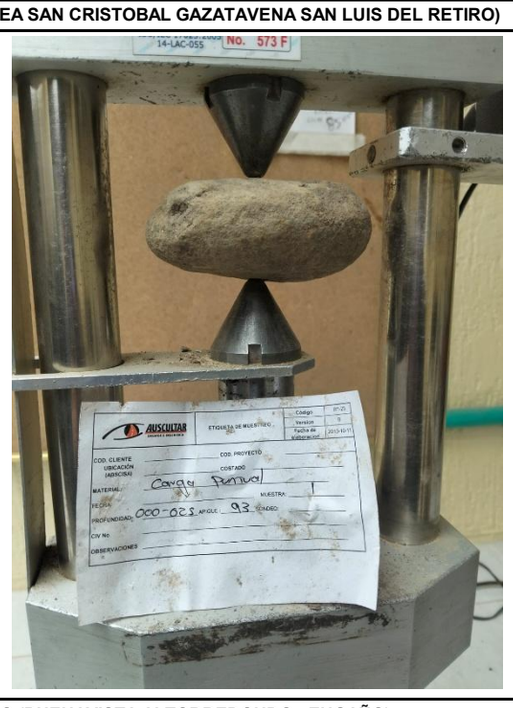



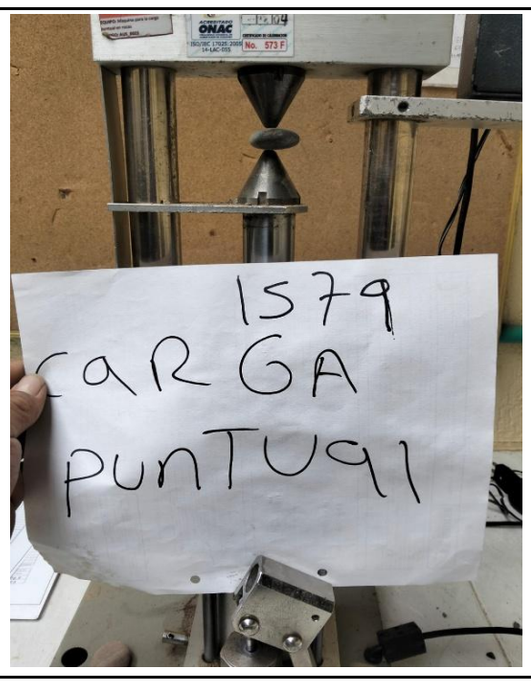

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)








PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

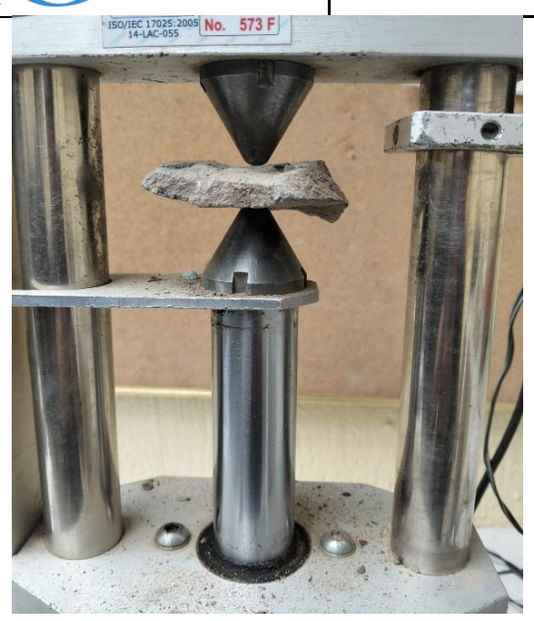







PROVINCIA DE ORIENTE:

QUETAME (QUETAME YERBABUENA HACIA FÓMEQUE)

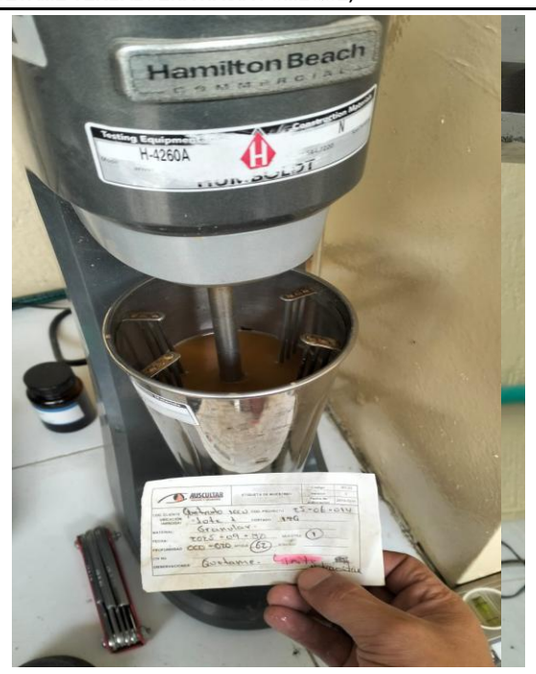

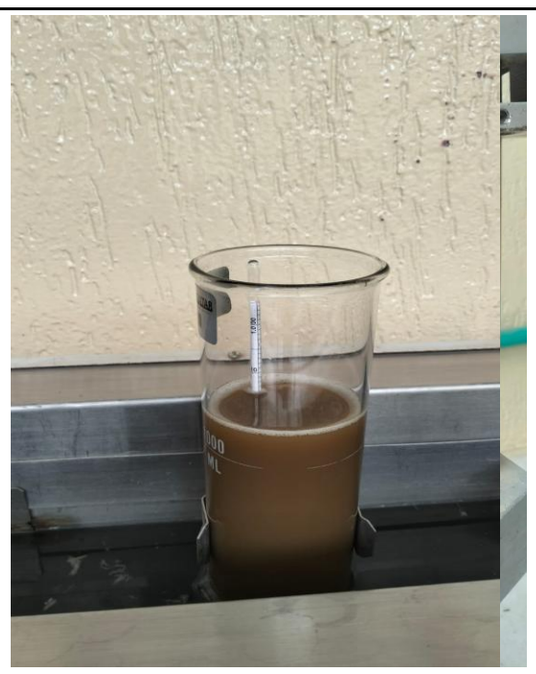







9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

ACOPIO DE CEMENTO Y LLEGADA DE MOTONIVELADORA





SUPERVISIÓN DE PMT Y DEMOLICIÓN DE SOBRETAMAÑOS

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA Y LIMPIEZA DE CUNETAS





ESCARIFICACIÓN Y TOMA DE HUMEDADES





EXTENDIDA DE CEMENTO





HOMOGENIZACIÓN CON FAE Y VERIFICACIÓN DE ESPESOR ESTABILIZADO





ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**





RIEGO DE ADITIVO CON AGUA Y CEREO CON MOTONIVELADORA





NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN





TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DE INTERVENTORÍA






PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**





VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN DE ADITIVO PROES







LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS





SUPERVISIÓN DE PMT





LIMPIEZA DE CUNETAS Y ESCARIFICADO PREVIO DE AFIRMADO





ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**





RETIRO DE SOBRETAMAÑOS Y NIVELACIÓN DE MATERIAL





EXTENDIDO DE CEMENTO





HOMOGENIZACIÓN CON RECICLADORA Y ACANALADO CON MOTONIVELADORA





RIEGO DE ADITIVO PROES MEZCLADO EN AGUA Y MEZCLADO CON RECICLADORA





ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**





VERIFICACIÓN DE ESPESOR ESTABILIZADO





CEREO CON MOTONIVELADORA Y COMPACTACIÓN CON VIBRO





RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 25- 6 DE NOVIEMBRE



ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**15-nov-25**	**SEMANA No.**	**31**	DEL	**8-nov-25**	AL	**14-nov-25**

Ya no se realizarán más reuniones preliminares.



2	Ubalá	24	Aprobadas
3	Choachí	21	Aprobadas
4	Junín	31	Aprobadas
5	Choachí	30	Aprobadas
	Junín	2	Aprobadas





REVISIÓN DE BUZONES SATELITALES - MUNICIPIO DE JUNÍN - INSTALACIÓN BUZÓN SATELITAL - MUNICIPIO DE GAMA






MESAS DE TRABAJO No. 30 Y 31 - COMPONENTE SOCIAL

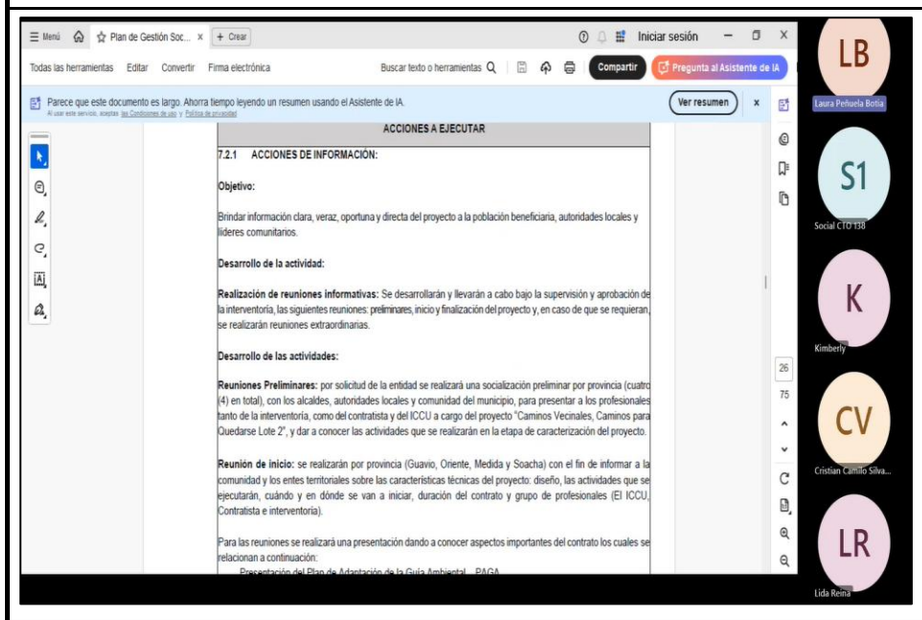

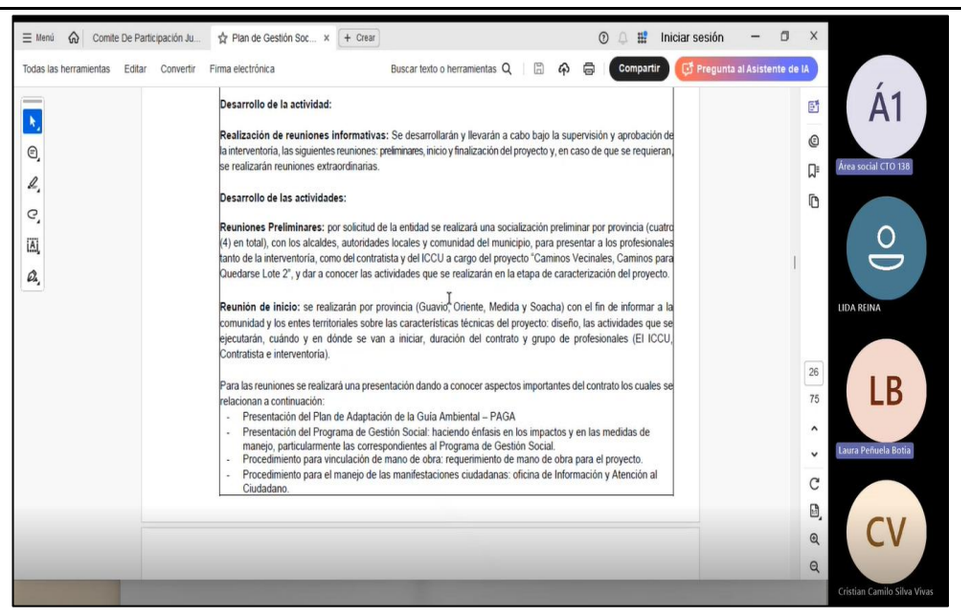

APERTURA PUNTO SAU - PROVINCIAS DE ORIENTE Y GUAVIO



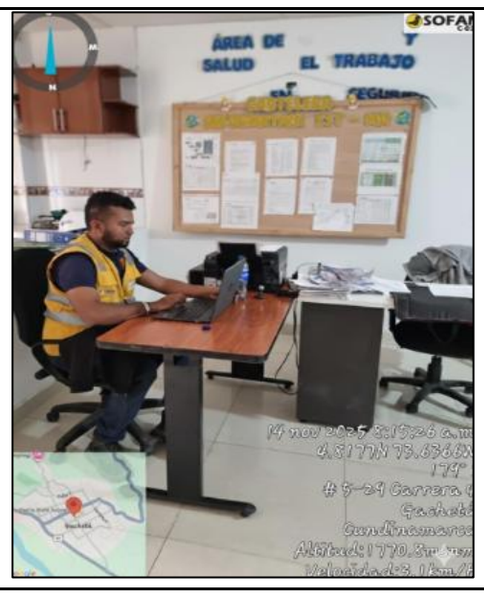

Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.11.19 16:38:32 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio
