SOLIUN	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN	28	oct	2025	2. INFORME No.	31	3. SEMANA No.	31	4. PERIODO	21	oct	AL	27	oct

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA	SOLIUN S.A.S.	6. NIT	900.768.458-0

7. CONTRATO No:	1728 DE 2024	8. FECHA CONTRATO:	27/12/2024	9. VALOR CONTRATO:	$ 205.747.593,00
10. FECHA ACTA INICIO:	19/02/2025	11. FECHA DE TERMINACIÓN:	19/10/2025	12. PLAZO:	8 Meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ANTARES IP	16. NIT	901901686-7

17. CONTRATO No:	1753 DE 2024	18. FECHA CONTRATO:	30/12/2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 846.230.302,00
20. FECHA ACTA INICIO:	19/02/2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	19/10/2025	22. PLAZO:	8 Meses

23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT

24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - OBRA

CONTRATO DE OBRA

Valor Inicial	$ 846.230.302,00
Valor Adicional 1	$ -
valor Adicional 2	$ -
Valor Actualizado	$ 846.230.302,00
Plazo Inicial	8 Meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de suspensión No.1	18/07/2025
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1	
Fecha de reinicio No.1	18/08/2025
Fecha de Terminación Inicial	19/10/2025
Fecha de Terminación Actual	19/11/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor Inicial	$ 205.747.593,00
Valor Adicional 1	$ -
valor Adicional 2	$ -
Valor Actualizado	$ 205.747.593,00
Plazo Inicial	8 Meses
Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación	
Fecha de suspensión No.1	18/07/2025
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1	
Fecha de reinicio No.1	18/08/2025
Fecha de Terminación Inicial	19/10/2025
Fecha de Terminación Actual	19/11/2025

25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA

VR. CONTRATO	0%	$ 741.453.666,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ -	$ -	
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	
Acta No. 9	$ -	$ -	
Acta No. 10	$ -	$ -	
Acta No. 11	$ -	$ -	
Acta No. 12	$ -	$ -	
Acta No. 13	$ -	$ -	
Acta No. 14	$ -	$ -	
Acta No. 15	$ -	$ -	
Acta No. 16	$ -	$ -	
Acta No. 17	$ -	$ -	
Acta No. 18	$ -	$ -	
Acta No. 19	$ -	$ -	
Acta No. 20	$ -	$ -	

VALOR EJECUTADO	$ -	% Avc.	0,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 741.453.666,00	% Falt.	100,00%
VALOR RETEGARANTIA	$ 37.072.683,30	% Avc.	5,00%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ -	% Falt.	0,00%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	0%	$ 153.144.339,00

No. Acta	Valor Acumulado	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ -	$ -	
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	
Acta No. 9	$ -	$ -	
Acta No. 10	$ -	$ -	
Acta No. 11	$ -	$ -	
Acta No. 12	$ -	$ -	
Acta No. 13	$ -	$ -	
Acta No. 14	$ -	$ -	
Acta No. 15	$ -	$ -	
Acta No. 16	$ -	$ -	
Acta No. 17	$ -	$ -	
Acta No. 18	$ -	$ -	
Acta No. 19	$ -	$ -	
Acta No. 20	$ -	$ -	

VALOR EJECUTADO	$ -	% Avc.	0,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 153.144.339,00	% Falt.	100,00%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ -	% Falt.	0,00%

SOLIUN	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	1 de 1


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

ETAPA DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	41,65%	32,62%	+9,03%
Durante la Semana	8,79%	7,43%	+1,36%
Actual Acumulado	50,44%	40,05%	+10,39%
Valor Etapa		$	741.453.666,00

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Programada	7,43%	40,05%
Valor de la Obra Programada	$ 55.090.007,38	$ 296.952.193,23

EJECUCIÓN	SEMAMA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,79%	50,44%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 65.173.777,24	$ 373.989.229,13

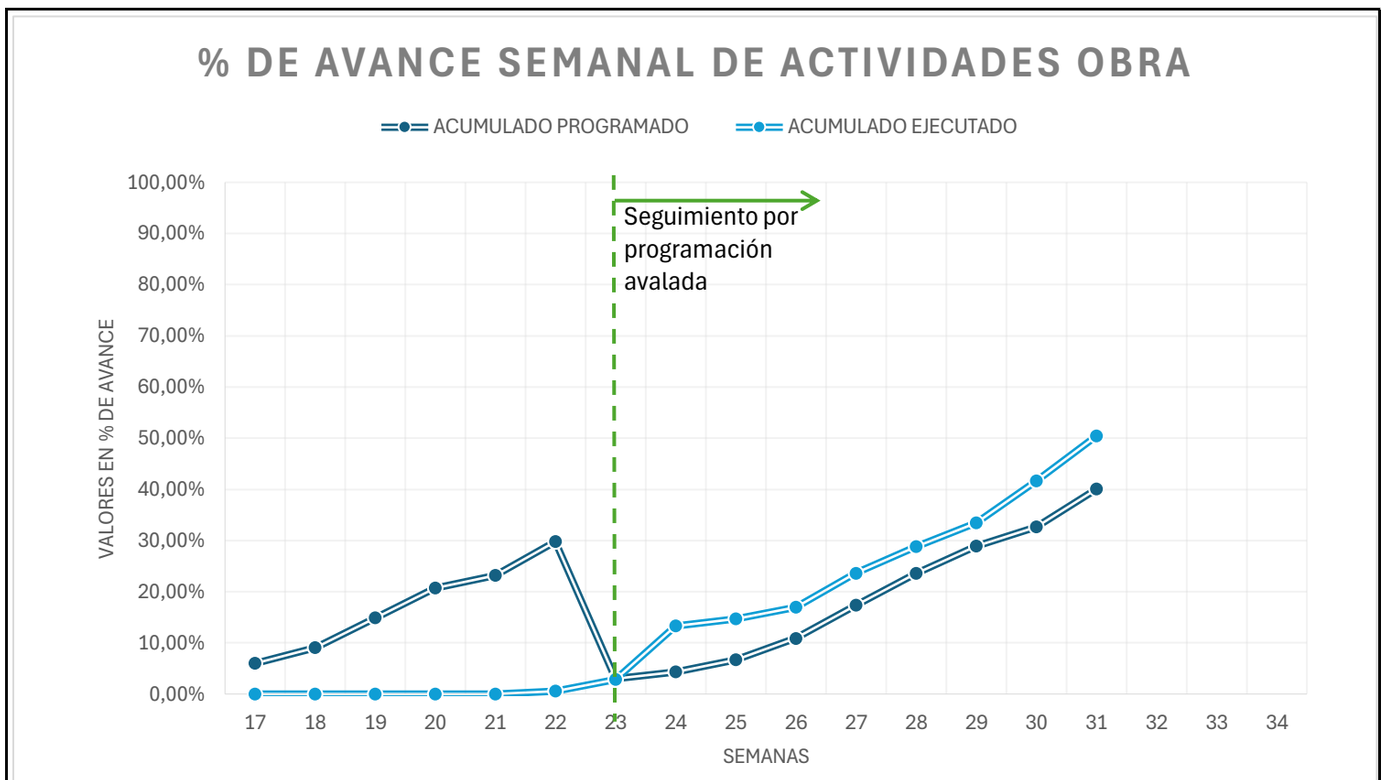

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Avance Programado: Obra: 40,05%

Avance Ejecutado: Obra: 50,44%

Para el comité # 30 de la semana entrante se reportará los porcentajes programados y de avance aquí registrados.
La medición semanal se realiza con mediciones periódicas de las actividades realizadas y junto con las cantidades ya acumuladas se determina el valor ejecutado de acuerdo al presupuesto vigente

LOTE A

Actividades programadas	Actividades ejecutadas
* Inicio de Instalación de bordillo A-80	* Instalación de Geotextil, SBG y BG en plazoleta de acceso en adoquín * Instalación de Bordillo A-80 en plazoleta de acceso en adoquín * Instalación de Bordillo B-30 * Inicio de jardines de infiltración junto a plazoleta infantil

LOTE B

Actividades programadas	Actividades ejecutadas
* Inicio de Instalación de adoquín de arcilla * Inicio de Losa en concreto táctil * Inicio de Instalación de bordillo A-80 * Inicio de Aseo General	* Excavación para grava con geocelda junto a plazoleta infantil * Instalación de Geotextil, SBG y BG en plazoleta de acceso en adoquín * Instalación de Bordillo A-80 en plazoleta de acceso en adoquín * Instalación de Bordillo B-30 * Continuación de reinstalación de adoquín en sendero occidental del Aula Ambiental * Continuación de instalación de loseta guía en sendero occidental del Aula Ambiental * Fabricación en taller de baranda M-83 * Verificación en bodega de Juego Carrusel Trébol * Inicio de reinstalación de adoquín en plazoleta de acceso

Nombre de tarea	Unidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
PROYECTO ECOBARRIOS (PARQUE NUEVA CASTILLA)		**$ 741.453.665**	**67 días**	**lun 18/08/25**	**mar 18/11/25**
LOTE A		**$ 377.811.998**	**67 días**	**lun 18/08/25**	**mar 18/11/25**
OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO		**$ 105.045.216**	**59 días**	**jue 28/08/25**	**mar 18/11/25**
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	$ 14.389.722	11 días	jue 23/10/25	jue 6/11/25
LOTE B		**$ 363.641.667**	**67 días**	**lun 18/08/25**	**mar 18/11/25**
OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO		**$ 125.613.971**	**19 días**	**jue 23/10/25**	**mar 18/11/25**
AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	$ 1.137.646	11 días	lun 27/10/25	lun 10/11/25
Losa Concreto Tactil A-50 Discapacidad+Arena (A=0.40m)	ML	$ 6.861.204	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	$ 18.855.025	11 días	jue 23/10/25	jue 6/11/25
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS		**$ 198.279**	**20 días**	**mié 22/10/25**	**mar 18/11/25**
ASEO GENERAL CDRC	M2	$ 198.279	20 días	mié 22/10/25	mar 18/11/25

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

•Componente Ambiental :

Asistencia a comité de segumiento el dia 21 de Octubre de 2025.
Se remitieron observaciones por medio de cooreo electronico a la certificacion recibida y soportes de gestion de disposicion final de juegos infantiles y baranda el dia el dia 21 de Octubre de 2025, asi mismo se rebicio subsanacion de soportes de gestion de disposicion de residuos juegos infantiles y baranda el dia 24 de Octubre de 2025 por medio de correo electronico dando alcance al comunicado INC-400-2025-CANTARESIP Remision certificado- ASONDRA.
El dia 24 de Octubre se realiza recorrido en obra y se dan recomendaciones por parte de interventoria, relacionadas con orden y aseo, señalizacion , retiro de rcd , organizacion de materiales, se solicita mediante comunicado SDHT-1728-2024-459 Solicitud Componente Ambiental, estamos a la espera de la atencion de observaciones por parte del contratista.
A continucion se adjunta las cantidades de ingresa y salida de materiales y/o RCD:

# VALE	PLACA DE VOLQUETA	FECHA	MATERIAL	VOLUMEN	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
70358	HYA-567	21/10/2025	ARENA DE PEÑA	7	GRECO	INGRESO
70395	HYA-567	21/10/2025	EXCAVACION	7	MAQUINAS AMARILLAS	SALIDA
70397	HYA-567	22/10/2025	EXCAVACION	7	MAQUINAS AMARILLAS	SALIDA
70396	HYA-567	22/10/2025	RAJON 20-30	7	GRECO	INGRESO
72108	HYA-567	23/10/2025	BASE TIPO B	7	GRECO	INGRESO
70398	SPS-241	23/10/2025	TRITURADO 1	14	GRECO	INGRESO
70399	HAY-567	23/10/2025	EXCAVACION	7	MAQUINAS AMARILLAS	SALIDA

•Componente SST :

Se remite solicitud al contratista referente a señalización, orden y aseo por medio de oficio SDHT-1728-2024-456 el día miercoles 22 de octubre de 2025 y notas en bitacora N° 156 del 23-10-2025, N° 167 del 27-10-2025.
Se recibio repueta del oficio SDHT-1728-2024-456 la subsanación por medio de oficio INC-410-2025-CANTIP el 29 de octubre de 2025.
Se recibe de parte del contratista registro fotografico de actividades del simulacro nacional del día 22 de octubre de 2025 dando cumplimiento con lo solicitado en comite y seguimiento actividades del Plan de Emergencias.
Se participa en comité de obra el día martes 21 de octubre de 2025, con el respectivo reporte SST del Personal de obra y actividades SST durante el período.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

ESTADO DE ACTAS DE VECINDAD		
TOTALES	4	**% DE AVANCE**
REALIZADAS	4	100,00%
POR REALIZAR	0	0,00%

21/10/2025: PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANIA: El contratista cumple con lo establecido en el cronograma mediante la atencion enPunto de atención atención a la comunidad: Los días jueves y martes de 8 am a 5:00 pm, se atiende de manera presencial en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Lote B.
21/10/2025: Se da cumplimiento a actividad establecida en el cronograma y Programa de seguimiento. Se asiste a comité integral de obra, donde se establecen una serie de compromisos.

21/10/2025: Se da cumplimiento al cronograma mediane el desarrollo de la actividad en el programa de formacion: Se realiza recorrido y taller de formacion con la asistencia de funcionario del Acueducto, comunindad, contratista e interventoria.

21/10/2025: Se da cumplimiento al cronograma mediane el desarrollo de la actividad en el programa de formacion:Se realiza recorrido con administradoras de los conjuntos 4-7-8 con el objetivo de identificar puntos criticos de afectacion de los desagues y establecer acciones por el contratista para dar respuesta a la comunidad.

22/10/2025: De acuerdo a correo rebicido por la entidad el contratista subsana informe social # 7 y lo remite a la interventoria quien lo revisa y remite por correo electronico junto con el informe de interventoria el dia 24 de octubre a la entidad para proceso de revision.

23/10/2025: De acuerdo a compromiso de comite del dia 16 de octubre El contratista radican oficios sobre alcance del registro footgrafico de las materas y ocupacion de espacio de la obra a la señora Monica Gomez quien manfiesta no estar de acuerdo con el oficio y hace una observacion en el mismo

24/10/2025: PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANIA: El contratista cumple con lo establecido en el cronograma mediante la atencion enPunto de atención atención a la comunidad: Los días jueves y martes de 8 am a 5:00 pm, se atiende de manera presencial en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en el Lote B.

24/10/2025: De acuerdo a comité integral de obra y programa de informacion y servicio. Se envia la subsanación de la Metodología de reunion de avance taller de formación 5. La interventoria remite observaciones

25/10/2025: El contratista da cumplimiento a programa de informacion y servicio presentado en el cronograma. Convocatoria a reunion de avance y taller de formacion # 5: Se realiza la convocatoria por medio de llamadas, grupos de whatsapp y entrega de manera presencial.

24-25/10/2025: El contratista e interventoria realizan visita a la casa 94 del conjunto residencial Nueva Castilla etapa IV y se verifica que no es un daño estructural si no es posible daño por humedad, de acuerdo con la información de la parte tecnica del contratista e interventoria se llego a un acuerdo con los propietarios del inmueble que se realizara un registro fotografico y se hara un seguimiento finalizar el contrato.

27/10/2025: De acuerdo a correo recibido por la entidad el dia 27 de octubre, se recibe aprobacion de oficio respuesta a la señora Monica y Asociacion de la hueta, se remite al contratista para proceso de radicacion

SOLIUN	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	1 de 1

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Durante el periodo el contratista de obra conto con 2 baños con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales y protocolos de bioseguridad, el contratista realiza jornada de orden y aseo. Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad.
Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y equipos de protección personal (EPP), el contratista mantiene el lugar de trabajo limpio, el contratista cuenta con la clasificación de Residuos y con tanque de agua en obra para limpieza.

REPORTE DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**No. DE CASOS**
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADM	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

REPORTE DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**No. DE CASOS**
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Actualmente, el PMT (02/10/2025) ya se encuentra aprobado en por SDM en su segunda versión de acuerdo a la actualización enviada por el contratista, en obra se encuentra totalmente implementado de acuerdo a esta nueva actualización

32. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA		32. PERSONAL DE OBRA		33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			34. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN (CIV/TRAMO)**	**DIA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR	1	MINICARGADOR	1		MARTES	0	F
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	RESIDENTE	1	BENITIN	1		MIÉRCOLES	0	F
SST DE INTERVENTORÍA	1	SST-AMBIENTAL	1				JUEVES	0	F
AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	1	FORESTAL	1				VIERNES	0	F
FORESTAL	1	ING. APOYO	1				SÁBADO	0	F
APOYO AMBIENTAL	1	INSPECTOR SST-MA	1				DOMINGO	0	F
SOCIAL	1	SOCIAL	1				LUNES	1	F
ESP ELÉCTRICO	1	ESP ELÉCTRICO	1				**TOTAL DE Hr.**	1,00 Hr/semana	
ESP. HIDRÁULICO	1	ESP. HIDRÁULICO	1						
PROF. PRESUPUESTO	1	ESTRUCTURAL	1						
ESP.GEOTECNIA	1	ING PRESUPUESTO	1						
TOPÓGRAFO	1	TOPÓGRAFO	1						
CADENERO	1	CADENERO	1						
ING. DE APOYO	1	INSPECTOR SST-MA	1						
ING DE CALIDAD	1	OFICIAL	1						
		AYUDANTES	3						
		OPERADOR	1						
		BOAL	2						
TOTAL DE PERSONAL	**15**	**TOTAL DE PERSONAL**	**21**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	**2**				

ESTADO

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
23 de octubre de 2025	1. Remitir la versión subsanada de las memorias y cantidades de obra con base en las observaciones de la Entidad	Contratista	Interventoría
Permanente / Seguimiento semanal	2. Fortalecer las jornadas diarias de limpieza y organización en los frentes de trabajo, con registro fotográfico semanal.	Contratista	Interventoría
23 de octubre de 2025	3. Reponer y mantener la señalización y delimitación en buen estado	Contratista	Interventoría
21 de octubre de 2025	4. Remitir a la Interventoría las observaciones subsanadas del Informe de Calidad No. 7.	Contratista	Interventoría
21 de octubre de 2025	5. Retirar residuos y sobrantes de concreto en los Lotes A y B.	Contratista	Interventoría
24 de octubre de 2025	6. Realizar la visita técnica a vivienda en Castilla Etapa 4 para verificar afectación estructural.	Contratista / Interventoría	SDHT
23 de octubre de 2025	7. Imprimir y exhibir los cuadros informativos de áreas duras y verdes en el punto de atención a la ciudadanía.	Contratista	Interventoría

23 de octubre de 2025	8. Radicar oficios de acompañamiento institucional ante Alcaldía y Policía.	Contratista	Interventoría
21 de octubre de 2025	9. Radicar oficio sobre ocupación de áreas no autorizadas	Contratista	Interventoría
22 de octubre de 2025	10. Subsanar y remitir la metodología de reunión social del 28 de octubre.	Contratista	Interventoría
21 de octubre de 2025	11. Ajustar el reporte del informe de desagüe solicitado por la EAAB y remitirlo a la Interventoría.	Contratista	Interventoría
21 de octubre de 2025	12. Subsanación observaciones realizadas a la señalética en reunión del 20 de octubre.	Contratista	Interventoría
22 de octubre de 2025	13. Evaluar y definir la modificación del aula ambiental del Lote B, de acuerdo con la respuesta del IDRD.	SDHT	Interventoría
23 de octubre de 2025	14. Coordinar la visita al taller de fabricación de barandas e iniciar la fabricación de las barandas del Lote B.	Contratista / Interventoría	SDHT
28 de octubre de 2025	15. Realizar recorrido técnico en campo para evaluar zonas con colmatación y definir soluciones viables.	Contratista / Interventoría	SDHT
Fecha por confirmar (antes del próximo comité)	16. Reunión para la verificación del descuento aplicable por ANS de la Fase II al contratista	Interventoría / SDHT	SDHT
28 de octubre de 2025	17. Seguimiento: Evaluar alternativas frente al retraso en la llegada de los juegos interactivos (tableros) y presentar propuesta formal si aplica.	Contratista	Interventoría


36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES

Se evidencia que el Contratista no cumplió con la fecha pactada para la subsanación del Informe de Calidad No. 7, lo cual afecta el cierre formal de actividades y la trazabilidad documental del proyecto.
A pesar de compromisos anteriores, se observa en campo material granular disperso, áreas de acopio desorganizadas y señalización en mal estado o afectada por las lluvias, lo que impacta la seguridad y la imagen de la obra.
El Contratista solicitó un cambio de fecha base para el cobro de los ANS de la Fase II, pero no presentó respaldo técnico ni contractual que justifique dicha modificación, generando incertidumbre en el proceso administrativo y financiero.

39. RECOMENDACIONES

Dado el retraso en la llegada de los juegos interactivos importados, se sugiere que el Contratista establezca un protocolo con alternativas preaprobadas (como cambio de proveedor o especificaciones equivalentes) para evitar impactos en la ruta crítica del proyecto.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la obra y deslindar responsabilidades futuras por mal uso, se propone desarrollar un manual que incluya frecuencias de mantenimiento, responsables y condiciones de operación de los sistemas de desagüe y otras instalaciones.
Para aprovechar los espacios de participación ciudadana, se recomienda que los equipos técnico, ambiental y SST del Contratista participen activamente en los talleres sociales, no solo como apoyo logístico, sino para resolver inquietudes técnicas in situ y fortalecer la confianza de la comunidad.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No.	0
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	1 de 1
		PÁGINA:	1 de 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

Descripción: Excavación para grava y geocelta en Lote B



Descripción: Instalacción de Geotextil para plazoleta de acceso Lote A



Descripción: Instalación de material granular en plazoleta de acceso Lote B



Descripción: Instalación de bordillo en plazoleta de acceso en Lote B




Descripción: reinstalación de adoquín en sendero de Lote B



Descripción: Instalación de material granular en plazoleta de acceso Lote A



Descripción: Jardines de infiltración en Lote A

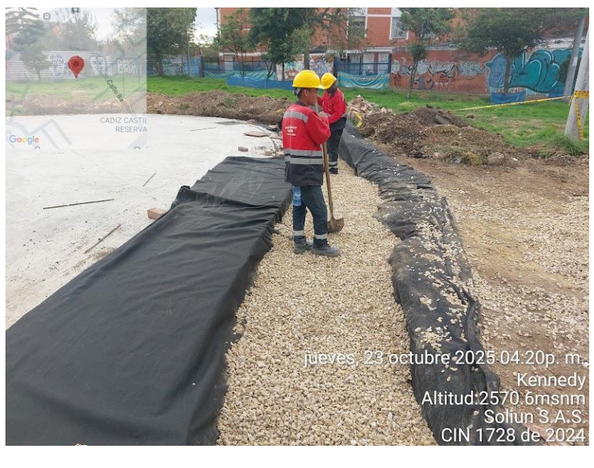

Descripción: Fabricación en taller de baranda M-83



Descripción: Juego Carrusel Trébol en Bodega

