INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.1

PERIODO: del 20 de junio al 19 de julio de 2025

FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT. 901.825.725 – 0

CONTRATO No. MC 06 DE 2025

"Interventoría al contrato reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de Coloso - Sucre"

Email: interventoriacoloso2025@gmail.com

"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONTRATISTA: CONSORCIO MTTO COLOSO

REP. LEGAL. ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

INTERVENTORIA: FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.

REP. LEGAL. JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA

SUPERVISOR DE CONTRATO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME DE INTERVENTORIA No.1

20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA No.1

20 DE JUNIO DE 2025 AL 28 DE JULIO DE 2025

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:



ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
Representante Legal (e)
Interventoría

APROBO:

ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisión

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 6
INFORMACIÓN GENERAL 6
CUADRO DE RESPONSABILIDADES 6
CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
CONTRATOS SUSCRITOS 9
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS 11
CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 11
CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 13
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 14
CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 14
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 14
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 14
CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS 15
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 15
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15
ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 16
CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 16
CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA 16
FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA 16
ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA 17
ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA 17
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 17
ESTADO INICIAL DE LA OBRA 19
ANEXO FOTOGRAFICO 20

.....20

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.....27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....31

ANEXOS.....32

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura del palacio de justicia del municipio de Coloso, en el departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto denominado "**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** En el marco del **Contrato de Obra No. SAMC 02 de 2025** suscrito el 29 de mayo de 2025 entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo** y el **Consorcio MTTO COLOSO (NIT: 901.950.642-2),** con acta de inicio 20 de junio de 2025.

Para ejercer las actividades de seguimiento, verificación y control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y legal de la ejecución del mencionado contrato, se celebró el **Contrato de Interventoría No. MC 06 de 2025** suscrito **el 09 de junio de 2025** entre la **Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y FORMULACION Y CONSTRUCION S.A.S. (NIT: 901.825.725-0), cuyo objeto es "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE".** El cual tuvo acta de inicio el 20 de junio de 2025

En desarrollo de las obligaciones contractuales de interventoría, se presenta el **Informe de Interventoría No.1,** correspondiente al periodo comprendido entre el **20 de junio de 2025 al 19 de julio de 2025.** En este informe reporta el estado actual de la obra, abordando aspectos generales y específicos del proyecto en los componentes técnico, administrativo, operativo, financiero y socioambiental. Se describe el seguimiento efectuado a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra, incorporando el registro fotográfico, la medición de cantidades, el cálculo del avance porcentual de ejecución y demás aspectos relacionados con el desarrollo y ejecución del proyecto durante dicho periodo mencionado.

Asimismo, se presentan conclusiones y recomendacione**s** relacionadas con el avance del proyecto, los imprevistos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y otros aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública objeto de esta interventoría.

Es importante resaltar que, a partir de las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe, se sugiere al ente contratante adoptar las acciones pertinentes que contribuyan al adecuado desarrollo de la obra, considerando que las labores de ejecución, seguimiento y control deben enmarcarse dentro de principios de integridad moral y ética profesional**.**

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	**"INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
INFORME No.1	**INFORME DE INGTERVENTORIA A LAS OBRAS CIVILES DE "INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"**			
PERIODO	ENTRE	20 de junio de 2025	Y	19 de julio de 2025
LOCALIZACION DE PROYECTO	COLOSO, SUCRE – PALACIO DE JUSTICIA			

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS Residente de interventoría
REVISÓ	ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA Representante Legal (e) de Interventoría
APROBÓ	ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA Representante Legal (e) de Interventoría

CUADRO LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISORA	No. COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBERVACIONES
ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	28 de julio de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad ejecutar un conjunto de intervenciones estructurales y arquitectónicas orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Colosó, Sucre**.** Las obras comprenden actividades de reforzamiento estructural, adecuaciones funcionales y reparaciones tanto arquitectónicas como estructurales, sobre una edificación existente que presenta deterioro y condiciones técnicas que requieren intervención inmediata para garantizar su estabilidad, operatividad y servicio adecuado a la comunidad.

Estas intervenciones buscan prolongar la vida útil de la infraestructura, mejorar su comportamiento ante cargas sísmicas y optimizar los espacios físicos, con el propósito de ofrecer un entorno seguro y digno para el desarrollo de la función judicial. Las actividades contempladas abarcan: revisión y adecuación de elementos estructurales (vigas, columnas, losas y cimentación), mejoras en cubiertas, fachadas, redes internas (eléctrica, hidráulica y sanitaria), así como obras de urbanismo y accesibilidad.

El desarrollo del proyecto se enmarca en los lineamientos técnicos, normativos y legales vigentes, y su ejecución está a cargo del CONSORCIO MTTO COLOSO, bajo la supervisión y control de la firma interventora Formulación y Construcción S.A.S**.**, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las especificaciones del contrato de obra y garantizar la calidad de los trabajos realizados.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La intervención se desarrolla en la edificación del **Palacio de Justicia de Colosó**, ubicada en el casco urbano del municipio de **Colosó**, departamento de **Sucre**, cuya localización corresponde a una infraestructura pública destinada al funcionamiento de las instituciones judiciales de la región.



Imagen 1. Palacio de Justicia Coloso – Sucre

CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	SAMC 02 DE 2025.
Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Proceso de contratación No.	SAMC 02 DE 2025.
Objeto	"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."
Contratista	CONSORCIO MTTO COLOSO.
Representante legal	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
NIT	901.950.642-2
Valor total inicial del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP).
Valor adicional	N/A.
Valor total acumulado del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP).
Fecha de suscripción del contrato	29 DE MAYO DE 2025.
Plazo inicial	CUATRO (04) MESES.
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga	N/A
Fecha de terminación actual	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2025.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	MC 06 DE 2025
Modalidad de selección	MÍNIMA CUANTÍA
Proceso de contratación No.	MC 06 DE 2025
Objeto	**“**INTERVENTORIA AL CONTRATO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE”
Contratista	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal	JOSE PASTOR MAESTRE SABALA
NIT	901.825.725-0
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.748.369 COP)
Valor adicional	N/A
Valor total acumulado del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48.748.369 COP)
Fecha de suscripción	09 DE JUNIO DE 2025
Plazo inicial	CUATRO MESES Y/O HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMRE DE 2025
Fecha de inicio	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.
Prórroga	N/A
Fecha de terminación actual	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2025.
Supervisor del contrato	ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA.
Entidad contratante	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO.

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y AMPAROS

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 0

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	29/05/2025	03/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	29/05/2025	03/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	04/10/2025	04/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 1

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	29/05/2025	04/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.75-44-101145873. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$87.176.339,00	20/06/2025	25/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago de salarios y prestaciones sociales	15 %	$65.382.254,25	20/06/2025	25/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Estabilidad y calidad de la obra	30 %	$130.764.508,50	26/10/2025	26/10/2030	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.75-40-101055135. ANEXO 2

Amparos	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Predios labores y operaciones	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Contratistas y subcontratistas	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vehículos propios y no propios	200 SMMLV	$284.700.000,00	20/06/2025	26/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. M-100267228. Anexo 0

Amparo	% asegurado	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Aseguradora
Cumplimiento	20 %	$9.749.674,00	09/06/2025	09/05/2026	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del servicio	20%	$9.749.674,00	09/10/2025	09/10/2028	SEGUROS MUNDIAL
Pago de salarios y prestaciones sociales	10 %	$4.874.837,00	09/06/2025	09/11/2028	SEGUROS MUNDIAL

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Pólizas vigentes	**X**		Se anexan pólizas
Presenta reclamaciones		**X**	
Certificación de parafiscales	**X**		Se anexan planillas de pago
Exámenes ocupacionales de ingreso	**X**		Se anexan exámenes ocupacionales

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista de obra, cuya presencia fue verificada de manera permanente en el frente de trabajo durante el periodo reportado.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Magier Aldair Dupperley Medina	Director de obra	30 %
2	1	María Claudia Hernández Leclerc	Residente de obra	100 %
3	1	Mauricio Junior Agustín Hernández	Profesional siso	100%

DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en el frente de obra durante el periodo reportado, dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

No.	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	Carlos Acosta Medina	Director de interventoría	32 %
2	1	Juan Diego Pérez Cabarcas	Residente de interventoría	100 %

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El **contrato de obra** fue suscrito el día **29 de mayo de 2025**. Posteriormente, se suscribió el **acta de inicio** con fecha **20 de junio de 2025**, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato.

El contrato cuenta con un **plazo de ejecución de cuatro (4) meses**, estableciéndose como fecha estimada de finalización el **20 de octubre de 2025**.

Hasta la fecha, no se han registrado modificaciones contractuales en cuanto al plazo o valor del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
4 MESES	1 MES	3 MESES

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El **contrato de interventoría** fue suscrito el día **09 de junio de 2025**. Posteriormente, se suscribió el **acta de inicio** con fecha **20 de junio de 2025**, a partir de la cual se dio inicio formal a la ejecución del contrato de interventoría.

El contrato de interventoría cuenta con un **plazo de ejecución de cuatro (4) meses**, estableciéndose como fecha estimada de finalización el **20 de octubre de 2025**.

Hasta la fecha, no se han registrado modificaciones contractuales en cuanto al plazo o valor del contrato de interventoría.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
4 MESES	1 MES	3 MESES

ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Durante el período evaluado, la Interventoría adelantó el seguimiento y control a los aspectos financieros del contrato de obra, mediante las siguientes acciones:

- **Control de la inversión contractual:** Revisión y análisis de la ejecución presupuestal del contrato de obra, verificando la adecuada aplicación de los recursos conforme al avance físico reportado y a los ítems establecidos en el presupuesto oficial.
- **Seguimiento financiero:** Evaluación del comportamiento financiero del contrato, mediante la verificación de los pagos efectuados, su correspondencia con las actas de obra, y el cumplimiento del flujo de caja proyectado.

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
325	$ 500.351.334,80	04-02-2025	$ 500.351.334,80

CERTIFICADOS DE DISPINIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO	VALOR INICIAL	FECHA	VALOR ACTUAL
1325	$ 88.274.676	16-05-2025	$ 88.274.676

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al contratista mediante actas parciales, las cuales estarán sujetas al avance real y comprobado de las obras, previa verificación y aprobación por parte de la Interventoría.

FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA

ACTAS PARCIALES	El contratante efectuará pagos al interventor mediante actas parciales de avance de obra.

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante este periodo, no se presentaron Actas Parciales de obra por parte del contratista.


ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

Durante este periodo, no se emitieron Actas Parciales de interventoría.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de SELECCIÓN ABREVIADA No. SAMC 02 DE 2025 tiene un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($435.881.695 COP) y tiene como objeto: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA ESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE."


Para el periodo que ocupa este informe, se alcanzó un **avance de obra correspondiente al 8.04%,** lo que equivale en monto presupuestal a **TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($35.061.998,03).** Representado gráficamente se tiene lo siguiente:

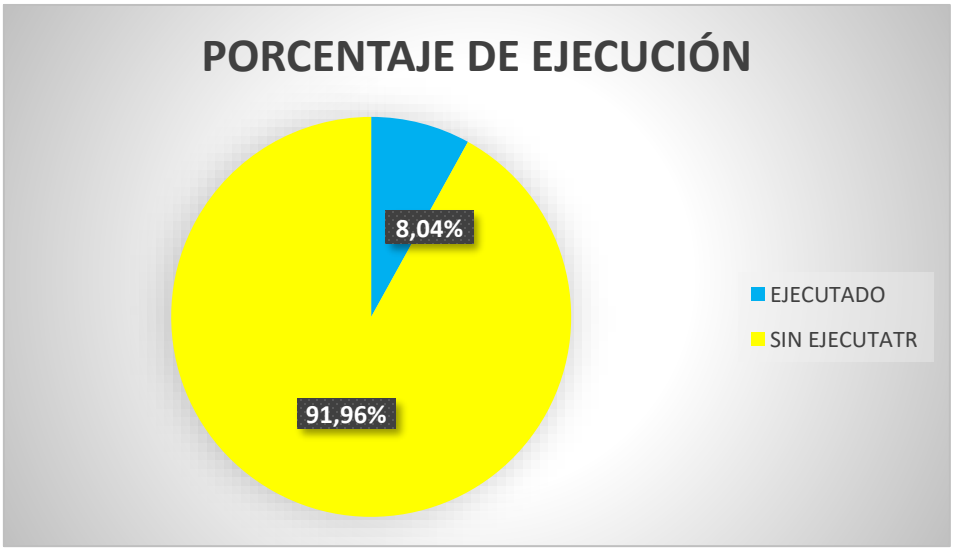

Grafica 1. Porcentaje de ejecución

El porcentaje y monto de avance real de la obra presentado anteriormente obedece al avance físico real ejecutado en obra, quedando un 91.96% sin ejecutar del proyecto.

De manera gráfica se tiene lo siguiente para el estado general del avance del proyecto respecto a lo programado en el cronograma:

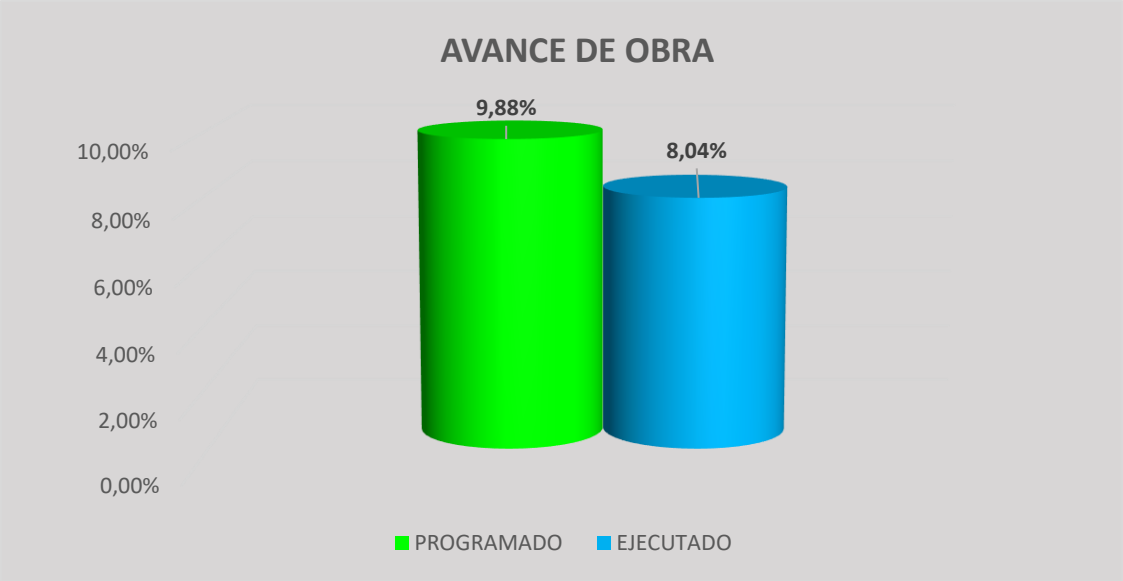


Grafica 2.1 Programación de obra vs obra ejecutada.

De la gráfica anterior, evidenciamos que el avance programado para la obra era de 9,88%, sin embargo, **el avance ejecutado fue del 8.04%**, evidenciando que en la actualidad **el contrato de obra muestra un atraso de 1.83% en su ejecución**. En la tabla a continuación se muestra el monto presupuestal que corresponde a estos porcentajes:

	MONTO PRESUPUESTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO	$ 43.052.463,00	17.39 %
EJECUTADO	$ 35.061.998,02	8.04 %
ATRASO	$7.990.464,98	1.83 %

La siguiente gráfica corresponde al total programado vs total ejecutado del presente proyecto, en el periodo actual, teniendo un **1.83% de atraso** en general:

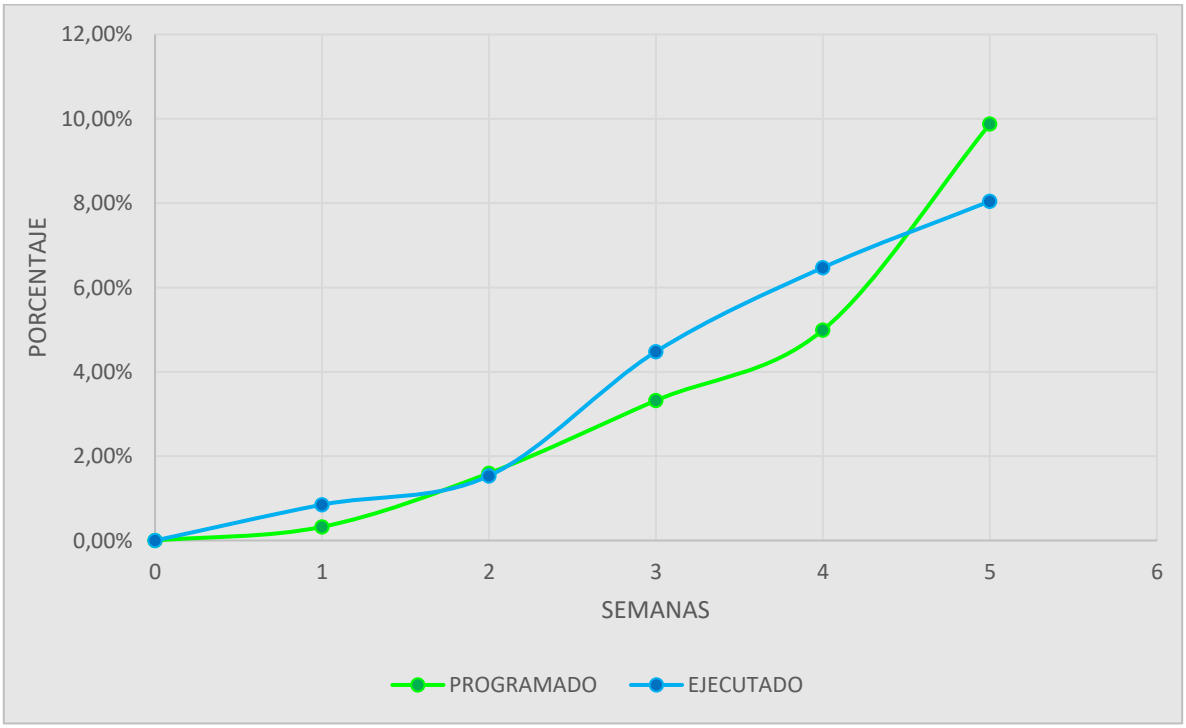

Grafica 2.2 Curva "S" del proyecto

ESTADO INICIAL DE LA OBRA

En cumplimiento de las actividades preliminares del contrato de obra, se realizó una visita técnica al Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el fin de documentar el estado actual de la infraestructura previo al inicio de las intervenciones.

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidenciaron fisuras y grietas en los muros y pisos del inmueble**,** las cuales afectan tanto elementos estructurales como no estructurales del edificio. Estas patologías constructivas fueron debidamente registradas mediante registro fotográfico, el cual se adjunta al presente documento como soporte del diagnóstico inicial.

Las condiciones observadas reflejan el deterioro progresivo de la edificación y justifican la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales**.**

Este registro tiene como propósito establecer un punto de referencia técnico del estado inicial de la obra, sobre el cual se medirá el avance y la efectividad de las intervenciones proyectadas.

ANEXO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Fachada Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 2. Fachada Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 3. Ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 3 y 4. Ventana exterior y enchape de piso en área de secretaria - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 5 y 6. Fisura esquina muro de ventana exterior Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 7 y 8. Ventana interior y Fisura muro ventana interior – recepción - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 9 y 10. Fisura muro y cielo raso – Sala de estar - Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 11. Sala de audiencia - Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 12 y 13. Fisura muro – Pasillo Palacio de Justicia Coloso - Sucre





Imagen 14 y 15. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 16 y 17. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre



Imagen 18 y 19. Fisuras muros – Oficina Juez Palacio de Justicia Coloso - Sucre




Imagen 20. Cámara de aire Palacio de Justicia Coloso – Sucre



Imagen 21 y 21. Fisuras muros – Baño principal Palacio de Justicia Coloso – Sucre,

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 de junio del 2022 al 19 de julio del 2025:

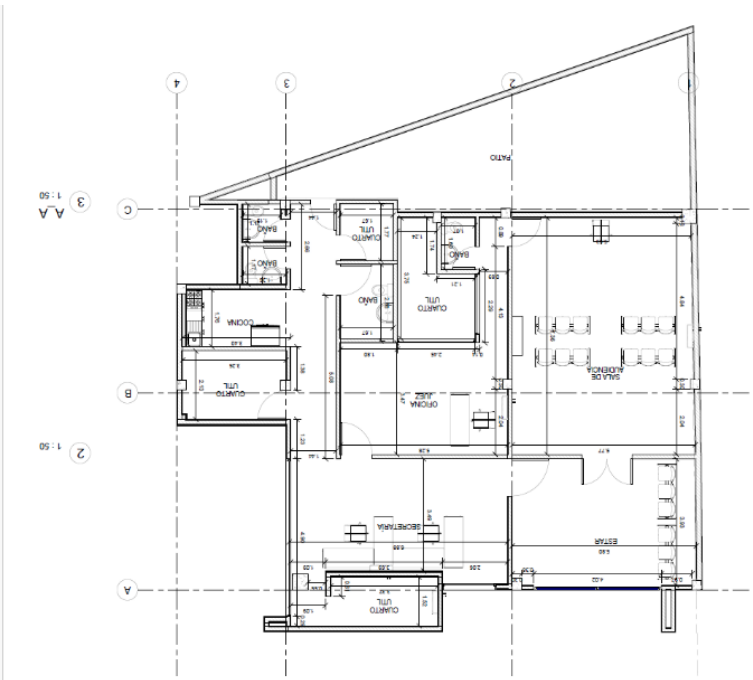

ITEM 1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO. Para este periodo el contratista desarrollo la actividad de localización y replanteo, la cual consiste en la identificación y marcación precisa de los puntos de referencia del proyecto en el terreno, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.



ITEM 1.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE H=2.1 M. Se evidencia la ejecución del cerramiento provisional perimetral utilizando malla de polipropileno color verde con una altura de 2.10 metros, instalada con el fin de delimitar el área de trabajo y garantizar la seguridad del personal y de terceros durante el desarrollo de las actividades constructivas.



ITEM 2.01 DEMOLICION DE ENCHAPE PISO. Se realiza la demolición manual del enchape existente en el piso, utilizando herramientas menores y equipos eléctricos como el rotomartillo demoledor y taladro percutor liviano. Esta labor se realiza de manera controlada, con el fin de retirar el revestimiento cerámico.



ITEM 2.02 DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO. Se lleva a cabo la demolición controlada de la losa de contrapiso existente, mediante el uso de herramientas manuales y equipos mecánicos livianos como rotomartillos y demoledores eléctricos. Esta actividad se realiza con el objetivo de permitir la adecuación y reconstrucción de la estructura.



ITEM 2.03 DEMOLICION DE CIELORRASO. Se ejecuta la demolición manual del cielorraso existente, compuesto por placas de Drywall soportadas sobre una estructura metálica liviana (perfil galvanizado).



ITEM 2.07 DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE RETIRO). Se realiza la demolición manual de los zócalos existentes, utilizando herramientas como cinceles y su adherencia al paramento vertical. La actividad se ejecuta de manera controlada, evitando daños en los muros y superficies adyacentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 19 de julio de 2025, en el frente de obra se desarrollaron actividades correspondientes a **trabajos preliminares**, **desmontes** y **demoliciones**, como parte del cronograma establecido.

Finalizado el primer mes dentro del plazo contractual, y con base en las actividades ejecutadas, se concluye que la obra presenta un **avance físico acumulado del 8,04%**. Cabe resaltar que el contrato se está ejecutando conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. No obstante, se evidencia un **atraso del 1,83%** respecto al avance programado para este mismo periodo.

Dicho desfase obedece a inconsistencias detectadas por el equipo contratista entre los estudios, diseños y planos inicialmente entregados por la entidad contratante, y las condiciones reales encontradas en el sitio de intervención. Estas discrepancias han afectado directamente la planificación, ejecución y presupuestación de las actividades previstas, generando un bajo rendimiento en obra.

Sin embargo, la entidad contratante ya ha remitido un nuevo plano estructural debidamente aprobado, lo cual permitirá reorientar el desarrollo de la obra conforme a los lineamientos técnicos actualizados. En ese sentido, esta interventoría prevé que el atraso identificado podrá mitigarse durante el siguiente periodo, sin embargo, se recomienda al contratista la implementación de un plan de contingencia que optimice la ejecución de las actividades reprogramadas.

Adicionalmente, es importante señalar que se presentarán a la entidad contratante modificaciones al presupuesto inicial, derivadas de los ajustes requeridos por los nuevos planos estructurales. Estos ajustes serán formalizados a través de un nuevo balance de mayores y menores cantidades**,** así como la inclusión de ítems no previstos**,** el cual será elaborado por el contratista y revisado por esta interventoría para su posterior envío y análisis por parte de la entidad contratante.

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro de las condiciones técnicas, presupuestales y de plazo definidas.

ANEXOS

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**29/05/2025**	**03/02/2026**	**$87,176,339.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**29/05/2025**	**03/10/2028**	**$65,382,254.25**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**04/10/2025**	**04/10/2030**	**$130,764,508.50**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247600(3900)000002688350(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724760-0

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/05/2025**	**04/10/2025**	**$284,700,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107247553(3900)000000300594(96)20260529

REFERENCIA PAGO:

1101310724755-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO: 3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO 2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,239,118.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(429,232.00)	$ *******(2,688,350.00)	$ ****(283,323,101.75)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**29**	**05**	**2025**	**00:00**	**04**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR


ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(249,600.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(47,994.00)	$ *********(300,594.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	29	05	2025	00:00	04	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
NOTA: LA VIGENCIA DEL APARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/06/2025**	**25/02/2026**	**$87,176,339.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/06/2025**	**25/10/2028**	**$65,382,254.25**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**26/10/2025**	**26/10/2030**	**$130,764,508.50**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-44-101145873**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO MTTO COLOSO	**NIT: 901.950.642-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	**NIT: 800.165.944-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,239,118.00	$ ******20,000.00	$ *****429,232.00	$ *********2,688,350.00	$ ******283,323,101.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284098(3900)000002688350(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728409-8

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101145873	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-44-101145873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-40-101055135**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**06**	**2025**	**20**	**06**	**2025**	**00:00**	**26**	**10**	**2025**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO:	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	2754780
BENEFICIARIO:	800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.7927844 CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA- DIRRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO NIT: 800.165.944-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

ACLARACIONES

DE ACUERDO LA ACTA DE INICIO DE FECHA 20/06/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL ACTA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/06/2025**	**26/10/2025**	**$284,700,000.00**	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO MTTO COLOSO	NIT: 901.950.642-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	SINCELEJO, SUCRE	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO	NIT: 800.165.944-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 22 NRO. 16 - 40	SINCELEJO, SUCRE	2754780

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****249,600.00	$ *******3,000.00	$ ******47,994.00	$ **********300,594.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	200201	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107284113(3900)000000300594(96)20260620

REFERENCIA PAGO:

1101310728411-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101055135	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2025	20	06	2025	00:00	26	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO MTTO COLOSO		**NIT: 901.950.642-2**
DIRECCIÓN: CL 7 A # 24 E - 11 AP 201 P 2	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	3226513192

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		**NIT: 800.165.944-8**
DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40	**CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO:**	2754780

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ENCIVILES S.A.S.	901346188-1	40.00
LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS	901789233-4	60.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-40-101055135

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.12 17:35:04 -05:00

Código de Seguridad: YXSFmsvN51QkGCunAMxr8g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14984078	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.825.725-0
DIRECCIÓN	CR 24 F 2 C 70	**TELÉFONO**	3004103610
ASEGURADO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 40	**TELÉFONO**	2754780
BENEFICIARIO	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCI	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.165.944-8
DIRECCIÓN	CALLE 22 NO. 16 - 40	**TELÉFONO**	2754780

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.06 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE CON
NIT.: 800.165.944-8

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/05/2026	9.749.674,00	26.765,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/06/2025	24:00 Horas Del 09/11/2028	4.874.837,00	50.044,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/10/2025	24:00 Horas Del 09/10/2028	9.749.674,00	87.827,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 24.374.185,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H&A SEGUROS Y FIANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	164.636,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	164.636,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	32.231,00
TOTAL A PAGAR	$	201.867,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100267228	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14984078	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/06/2025	24:00 Horas Del	09/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL- OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612020293	9487902907	I	2025/07/03	2025/07/08	BANCOLOMBIA	5	$528,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102837708	DUPPERLEY MAGIER																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	CCF41	30	$1,600,000	$32,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0	No	$527,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0		$527,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102837708		DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO	SINCELEJO-SUCRE	2821531	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612020293	9487902907	I	2025/07/03	2025/07/08	BANCOLOMBIA	5	$528,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$800	$0	$256,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$800	$0	$256,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$100	$0	$32,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,000	$100	$0	$32,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				**1**	**$527,000**	**$1,800**	**$0**	**$528,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102858517		HERNANDEZ LECLERC MARIA CLAUDIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25b #12a 92	SINCELEJO-SUCRE	2810000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1602283535	9487940316	I	2025/07/04	2025/07/04	BANCOLOMBIA	0	$699,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102858517	HERNANDEZ MARIA	230301	30	$1,972,000	$315,600	EPS005	30	$1,972,000	$246,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,972,000	$137,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,972,000**	**$315,600**			**$1,972,000**	**$246,500**			**$0**	**$0**			**$1,972,000**	**$137,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,600	$0	$0	$315,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$315,600	$0	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$137,300	$0	$0	$137,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$137,300	$0	$0	$137,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,500	$0	$0	$246,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$246,500	$0	$0	$246,500
TOTAL				1	$699,400	$0	$0	$699,400

2025/07/04 08:05 AM

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL- INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124025939		CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 120 No42b-112	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7264412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1634393216	9488982551	I	2025/07/09	2025/07/17	BANCOLOMBIA	8	$671,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																													
1	CC	1124025939	ACOSTA CARLOS						X											25-14	30	EPS005	30		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124025939		CARLOS CARLOS ACOSTA MEDINA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 120 No42b-112	BARRANQUILLA-ATLANTICO	7264412	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1634393216	9488982551	I	2025/07/09	2025/07/17	BANCOLOMBIA	8	$671,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$301,200	$1,500	$0	$302,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$301,200	$1,500	$0	$302,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$131,100	$700	$0	$131,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$131,100	$700	$0	$131,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,300	$1,200	$0	$236,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$235,300	$1,200	$0	$236,500
TOTAL				**1**	**$667,600**	**$3,400**	**$0**	**$671,000**

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Jul 2025 23:14:43

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1634393216

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.6

Fecha
16 Jul 2025 23:14:43

Referencia 2
CC

Número de factura
9488982551

Referencia 3
1124025939

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488982551

Valor del Pago
$671,000

Número de comprobante
TR2313573216

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7659**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENTREGA DE EPP Y ATS

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jhon Hector de la Rosa Martinez			CEDULA	1005665254
CARGO	Residente. Auxiliar			CIUDAD	Colosó.
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA			PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco con Barbuquejo	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	04-07-25	X		
Prot. Auditivo	1	04-07-25	X		
Gafas	1	04-07-25	X		
Camisas	2	07-07-25	X		
Botas de Seguridad	1	07-07-25	X		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1.140.852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005665254

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MITO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Skarleth Díaz Perez			CEDULA	1103121026
CARGO	SSO			CIUDAD	Colón
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco de Seguridad	1	04-07-25	X		
Gafas.	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	04-07-25	X		
Protector Auditivo	1	04-07-25	X		
Mascarilla	1	23-07-25		X	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SSO.	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1103121026

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	**ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION** CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Edut Antonio Beltrán Hernández			CEDULA	92530749
CARGO	Oficial			CIUDAD	Colosó
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	04-07-25	X		EdutA
Gafas	1	04-07-25	X		EdutA
Guantes	1	04-07-25	X		EdutA
Buzo	2	04-07-25	X		EdutA
Mascarilla	1	04-07-25	X		EdutA
Protector Auditivo	1	04-07-25	X		EdutA
Mascarilla	2	07-07-25		X	EdutA
Protector Auditivo	1	07-07-25		X	EdutA
Mascarilla	1	22-07-25		X	EdutA
Mascarilla	1	26-07-25		X	EdutA

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Edut Antonio B

CEDULA No: 92530749

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MTTO COLISO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Miguel Emiro Tamara Toscano	CEDULA	92542624
CARGO	Ayudante	CIUDAD	Coloxó
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA	PLANTA	

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Gafas	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Guante Nitrilo	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Buso	2	04-07-25	X		Miguel Tamara
Mascarilla	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Protector Aud.	1	04-07-25	X		Miguel Tamara
Mascarilla	2	07-07-25		X	Miguel Tamara
Mascarilla	1	21-07-25		X	Miguel Tamara

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustin Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SISO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Miguel Tamara Toscano

CEDULA No: 92.542624

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION CONSORCIO MTTO COLOSO	REGISTRO VERSION 1 17/01/2024

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION

NOMBRE	Jairo Andrés támara			CEDULA	1005605 323
CARGO	Ayudante			CIUDAD	Coloso
TIPO DE VINCULACION	CONTRATISTA		PLANTA		

ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL

DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	CONCEPTO		FIRMA TRABAJADOR
			ENTREGA	REPOSICIÓN	
Casco	1	04-07-25	X		Jairo
Gafas	1	04-07-25	X		Jairo
Guantes Nitrilo	1	04-07-25	X		Jairo
Buso	2	04-07-25	X		Jairo
Mascarilla	1	04-07-25	X		Jairo
Prot. Auditivo	1	04-07-25	X		Jairo
Mascarilla	2	07-07-25		X	Jairo
Gafas	1	12-07-25		X	Jairo.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION

NOMBRE	Mauricio Agustín Hernández	CEDULA No.	1140852655
CARGO	SSO	FIRMA	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por Salud Ocupacional como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jairo

CEDULA No: 1005.605.323

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal - Colosó		FECHA 04-07-25
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de Apiques		Desde 09:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. P/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	Mascarilla.

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Toma de medidas, trazados y corte	1 Pulidora
2 Retiro de cerámica - Porcelanato.	2 Taladro Metabo
3 Corte y Demolición de losa	3 Taladro Makita
4 Remoción de escombros	4 Pala - Palin
5 Retiro de poliestireno	5 Cometilla
6	6 Flexometro

	1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
	2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
X	3	Caída a un mismo nivel	X	8	Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17	
	4	Caída a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18	
	5	Caída de objetos	X	10	Golpés, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar area de trabajo - Señalizar	Oficial - SST
8-9-10	Uso de Elementos de protección Personal	Oficial
11	Desenergizar el circuito completamente	Electrico
13	Pausas Activas - Hidratación	SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Edet Martinez	Edet M	9		
2	Jairo Tamara	Jairo T.H	10		
3	Miguel Tamara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Leclerc	Nombre:	Skarleth Díaz Pérez
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:	M. Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Cabrera		FECHA 05-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Demolición de muros afectados.		Desde 07:00 am Hasta 06:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. PIES/PIERNAS	Otros:
X	X	X	X	X						Mascarilla

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Corte de muro con máquina	1 Pulidora
2 Retro de estructura de cielo falso	2 Cincel
3 Inicio de demolición con mona	3 Mona
4 Remoción de escombros	4 Escalera
5	5 Carretilla
6	6

1	Aplastamiento	X	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	X	8	Exposición a partículas extrañas		13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	X	10	Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
6	Corte de muro por secciones – demolición controlada	Operador
8-9-10	Uso de Elementos de protección personal – inspección	Operador – SST
11	Desenergizar circuitos	Electricista

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Edut Martinez	Edut B	9		
2	Jairo tamara	Jairo T. H	10		
3	Miguel tamara	miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones: Por temas de seguridad se retrá la corriente electrica del sitio de trabajo de los tomas existents y se deja una conexión alterna.

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Skarleth Ojeda Pérez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLFED	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal José		FECHA 07-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creacion de Apiques		Desde 07:00 am
		Hasta 05:00 PM

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT P. CUERPO	Otros:
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Manilla

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Trazado y corte de Cerámicas	1	Pulidora
2	Retiro de Cerámica	2	Taladro Metabo
3	Demolicion de losa post tratado	3	Taladro Makita.
4	Remocion de escombros	4	Palas – Palin.
5	Retiro de poliestireno	5	Carretilla
6		6	flexometro

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16		
X	3 Caída a un mismo nivel	X	8 Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17		
4	Caída a diferente nivel	X	9 Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18		
5	Caída de objetos	X	10 Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19		

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar el area de trabajo – Señalar.	Operador – SST
8-9-10	Uso de Elementos de Proteccion personal.	Operador
11	Desenergizar el circuito completamente.	Electrico
13	Pausas Activas – Hidratacion	SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Edet Martinez	EDCMTB	10		
3	Yairo Tamara	YAIRO T. H	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc.	Nombre:	Skarleth Diaz Paez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso.		FECHA 08-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de Apiques.		Desde 07:00 am Hasta 06:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. P. CUERPO	Otros:
☑	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Mascarilla

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Toma de medidas, trazado y corte	1	Pulidora
2	Retiro de Cerámica - Porcelanato	2	Taladro Metabo
3	Corte y demolición de losa	3	Taladro Makita
4	Remoción de escombros	4	Palas - Palin
5	Retiro de poliestireno	5	Carretilla
6		6	Flexometro

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	Y	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16		
X	3 Caída a un mismo nivel	Y	8 Exposición a partículas extrañas	Y	13	Esfuerzo Excesivo	17		
4	Caída a diferente nivel	Y	9 Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18		
5	Caída de objetos	X	10 Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19		

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar área de trabajo - Señalizar	Oficial - SST
8-9-10	Uso de Elementos de protección personal	Oficial
11	Desenergizar el circuito completamente	Electrico
13	Pausas Activas - Hidratacion	SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Edut Medina	Edut M	9		
2	Jairo Tamara	JairoTA	10		
3	Miguel Tamara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernández Lecterc	Nombre:	Skarleth Díaz Parra
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:	MHLecterc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso		FECHA 09 - 04 - 2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creacion de Apiques.		Desde 07:00 am
		Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. P/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X						Mascarilla.

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Trazado y corte de enchape	1	Pulidora
2	Retiro de enchape de piso	2	Taladro Makito
3	Demolición de losa	3	Talade Makita
4	Remocion de escombros	4	Pala - Palin
5	Retiro de poliestireno	5	Carretilla
6		6	Flexometro

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito		Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16		
X	3 Caída a un mismo nivel	X	8 Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17		
4	Caída a diferente nivel	X	9 Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18		
5	Caída de objetos	X	10 Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19		

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar área de trabajo - Señalizar	Oficial - SST
8-9-10	Uso de Elementos de protección personal	Oficial
11	Desenergizar el circuito completamente	Eléctrico o SST.
13	Pausas Activas - Hidratacion.	

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Tamara	Miguel Tamara	9		
2	Edut Betran	EdutB	10		
3	Jairo Tamara	Jairo TH	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc.	Nombre:	Skarleth Díaz Pérez
Cargo:	Residente	Cargo:	SSO
Firma:	MLeclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MTTO COLISO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 10-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creacion de Apiqes		Desde 07 00 am
		Hasta 05 00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



Otros: Mascarilla

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS	
1	Tratado y corte de enchape	1	Pulidora
2	Retiro de enchape de piso	2	Taladro Metabo y Makita
3	Demolición de losa	3	Palas
4	Remoción de escombros	4	Carretilla
5	Retiro de poliestireno.	5	Flexómetro
6		6	

	1	Aplastamiento		6	Atrapamiento / Aprisionamiento	X	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)
	2	Choque y/o Atropello		7	Exposición a gases y/o Vapores		12	Contacto de sustancias peligrosas	16
X	3	Caída a un mismo nivel	X	8	Exposición a partículas extrañas	X	13	Esfuerzo Excesivo	17
	4	Caída a diferente nivel	X	9	Exposición a ruidos		14	Exposición a calor o frio	18
	5	Caída de objetos	X	10	Golpes, cortes o contusiones		15	Incendio y/o explosiones	19

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar área de trabajo - Señalizar	Oficial - SST
8-9-10	Uso de elementos de protección personal	Oficial
11	Cortar fluido electrico	Electrico
13	Pausas Activas - Hidratación	SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Edet Beltrán	EDETB	9		
2	Miguel Tamara	Miguel Tamara	10		
3	Jairo Tamara	JairoT.H	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Hernandez Leclerc	Nombre:	Skarleth Diaz Pérez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	M-Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024

LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Coloso

FECHA 10 - 07 - 2025

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Demolición de muros afectados

Desde 07:00 am

Hasta 06:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT AUDIT	RESPIRADOR	PROT FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT P.CUERPO
X	X	X	X	X					

Otros: Mascarilla

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Corte de muro con máquina	1 Pulidora
2 Retiro de estructura de cielo raso	2 Cincel
3 Inicio de demolición	3 Mona
4 Remoción de escombros	4 Escalera
5	5 Carretilla
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
6	Corte de muro por secciones - demolición controlada	Oficial - SST
8-9-10	Uso de elementos de protección personal - Inspección	Oficial - SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Miguel Támara	Miguel Tamara	9		
2	Edut Beltrán	Edut B	10		
3	Jairo Támara	Jairo T. H	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Maria Hernandez Leclerc	Nombre:	Skuleth Diaz Perez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	M Hleclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal – Calasú		FECHA 11-07-2025
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Demolición de enchape de pvo		Desde 07 00 am
		Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		

CASCO	BOTAS	LENTES	GUANTES	PROT. AUDIT.	RESPIRADOR	PROT. FACIAL	ARNÉS	CARETA DE SOLDAR	PROT. P/CUERPO	Otros:
X	X	X	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	Mascarilla

	ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)		EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1	Demarcación de area a intervenir	1	Taladro
2	Demolición con taladro	2	Carretilla
3	Recolección de residuos	3	Pala
4	Transporte en carretilla	4	
5	Acopio de material	5	
6		6	

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	X 8	Exposición a partículas extrañas	X 13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	X 9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caída de objetos	X 10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
8-9-10	Uso de elementos de protección personal	Operador
13	Pausas Activas – Hidratación	SST.

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara	Jairo T.H	9		
2	Miguel Tamara	Miguel Tamara	10		
3	Edut Beltrán	Edut B	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	Monica Hernandez Leclerc.	Nombre:	Skaleth Diaz Perez
Cargo:	Residente	Cargo:	SIGO
Firma:	Leclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

Licita Civil Especializada	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO MITO COLOSO	Versión 001 17/01/2024
LUGAR: Juzgado Promiscuo Municipal Colosó		FECHA 12-07-2024
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Creación de Aljibes		Desde 07:00 am Hasta 05:00 pm

PERMISO REQUERIDO PARA TRABAJOS ESPECIALES

	Trabajos en Espacio Confinado		Trabajos en Caliente		Otros: (Especificar)
	Trabajos en altura	X	No requiere permiso		



CASCO	☒
BOTAS	☑
LENTES	☒
GUANTES	☐
PROT AUDIT	☑
RESPIRADOR	☐
PROT FACIAL	☐
ARNÉS	☐
CARETA DE SOLDAR	☐
PROT P/CUERPO	☐

Otros:

ACTIVIDADES A REALIZAR (Describa la secuencia de las actividades)	EQUIPOS / MÁQUINAS / HERRAMIENTAS
1 Demolición de losa	1 Taladro Metabo - Makita
2 Remocion de escombros	2 Palas
3 Retro de poliestireno	3 Cuerdilla
4	4
5	5
6	6

1	Aplastamiento	6	Atrapamiento / Aprisionamiento	11	Choque eléctrico y/o corto circuito	Otros (Especificar)	
2	Choque y/o Atropello	7	Exposición a gases y/o Vapores	12	Contacto de sustancias peligrosas	16	
3	Caída a un mismo nivel	8	Exposición a partículas extrañas	13	Esfuerzo Excesivo	17	
4	Caída a diferente nivel	9	Exposición a ruidos	14	Exposición a calor o frio	18	
5	Caida de objetos	10	Golpes, cortes o contusiones	15	Incendio y/o explosiones	19	

N° RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	RESPONSABLE
3	Despejar el área de trabajo y señalizar	Oficial - SST
8-9-10	Uso de Elementos de protección personal	Oficial
13	Pausas Activas Hidratación	SST

RELACIÓN DE TRABAJADORES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Jairo Tamara H	Jairo T. H	9		
2	Edet Berta	Edet B	10		
3	Miguel Tamara	Miguel Tamara	11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

Observaciones:

Responsable del Trabajo		Área de SST	
Nombre:	María Fernanda Leclerc	Nombre:	Skarleth Díaz Pérez
Cargo:	Residente	Cargo:	SISO
Firma:	MLeclerc.	Firma:	

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

Licita Civil Especializada


Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. SAMC 02 DE 2025

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE"

CONSORCIO MTTO COLOSO
NIT: 901.950.642-2

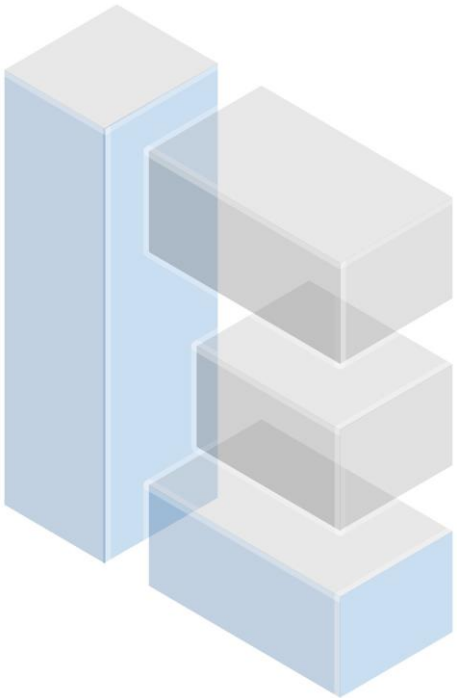

JULIO DE 2025

Enciviles
Empresa Nacional de Obras Civiles
Estudios, Diseño, Suministro, Aseo, Construcción e Interventoría
Edificaciones, Vías, Urbanismo, Agua Potable y Saneamiento Básico

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Viernes, 20 de junio de 2025

Se lleva a cabo la firma del Acta de Inicio del contrato de obra, con la participación del contratista, la interventoría y la supervisión técnica del proyecto.

Se realiza un recorrido de reconocimiento a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó – Sucre, con el propósito de identificar las condiciones físicas iniciales del inmueble.

Durante la inspección visual, se evidenciaron diversas patologías constructivas, entre ellas fisuras y grietas en muros y pisos. Estos hallazgos fueron debidamente documentados mediante registro fotográfico, el cual será anexado como soporte del estado inicial de la infraestructura.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 21 de junio de 2025

Se adelanta la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Domingo, 22 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 23 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 24 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 25 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 26 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 27 de junio de 2025

Se continua con la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y de detalle del proyecto con el propósito de verificar la coherencia entre los diseños y el estado actual de la infraestructura, así como aclarar aspectos técnicos relacionados con las intervenciones proyectadas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 28 de junio de 2025

En la fecha se realiza visita a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**,** con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de obra. Sin embargo, no fue posible dar apertura a las labores programadas, debido a que no se contaba con las llaves de acceso al inmueble**,** situación que impidió el ingreso del personal técnico y operativo a las áreas de intervención.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 29 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA	JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Lunes, 30 de junio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra

Se envía oficio de solicitud a la entidad para acceder a las instalaciones el día martes 31 de junio de 2025 con su respectiva afiliación a ARL.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 01 de julio de 2025

Se continúa a la espera de la aceptación formal por parte de la Entidad para el ingreso del personal técnico y operativo a las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó, así como de la entrega de las llaves de acceso por parte del personal de vigilancia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 02 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra

- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el ingreso de herramientas al área de trabajo dentro del Palacio de Justicia de Colosó.
- Se efectúa la des energización del circuito eléctrico principal, con el fin de garantizar condiciones seguras para la intervención.
- Se implementa una alimentación eléctrica provisional al tablero, permitiendo la continuidad de las labores programadas.
- Se procede con el desmonte de luminarias existentes.
- Se inicia el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 03 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se realiza el desmonte de puertas internas del inmueble.
- Se da inicio a la demolición del enchape de piso existente
- Se continua el desmonte del cielo raso existente y su respectiva estructura de soporte.
- Se acopia el material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 04 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores – Taladro demoledor makita – Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.
- Se realiza trazado y replanteo.
- Se hace corte y demolición de la plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

Esta exploración se realiza con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de las vigas de cimentación, teniendo en cuenta que se ha detectado una discrepancia entre los planos entregados por la consultoría y las condiciones reales encontradas en obra a nivel de cimentación.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 05 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

Se inicia demolición de muros existentes con afectaciones estructurales, conforme a lo establecido en la visita técnica realizada en conjunto con representantes de la

entidad contratante e interventoría donde se deja constancia de la deterioro avanzado de los muros, concluyéndose que no es viable su reparación, por lo que se procederá con su demolición total y reconstrucción desde cero, según las especificaciones técnicas del proyecto.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 06 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 07 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- 2 Instaladores de puertas y ventanas

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se hace el desmonte de la puerta principal, ventanas de fachada, ventas de interiores y ventana lateral.

- Se inicia con una nueva exploración en cimentación con el objetivo de verificar la existencia y ubicación de vigas de cimentación, debido a inconsistencias previamente detectadas entre los planos entregados y las condiciones reales observadas en obra.

- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.

.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 08 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores

Actividades desarrolladas:

- Se hace la instalación del cerramiento y señalización en el área a intervenir.
- Se realiza corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa
- Se continua con la demolición de muros existentes con afectaciones.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 09 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia exploración de cimentación en una nueva área
- Se realiza corte y demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 10 de julio de 2025

Eventualidad: Se presentaron fuertes lluvias en la zona de intervención, lo cual ocasionó la suspensión del fluido eléctrico en las instalaciones del Palacio de Justicia de Colosó**.**

El servicio fue restablecido hacia las 11:30 a.m**.**, una vez solucionada la falla, lo que generó retrasos en el inicio de las actividades programadas para la mañana, específicamente aquellas que requerían el uso de herramientas eléctricas.

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición de muros existentes con afectaciones.
- Se retira moldura de madera en el área de recepción.
- Se realiza corte de plantilla de concreto existente para nueva exploración.

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 11 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades desarrolladas:

- Se realiza demolición de plantilla de concreto existente.
- Se hace corte y retiro de casetón de poliestireno existente en placa.
- Acopio de material en las instalaciones del palacio de justicia que se encontraba obstruyendo el paso de los peatones.

De acuerdo a lo encontrado en obra se realiza comité en conjunto con la interventoría para exponer las novedades e informar a la entidad sobre las discrepancias de los estudios y diseños presentados por la consultoría, las cuales imposibilitan la continuidad de las actividades

Se envía solicitud de suspensión de obra hasta tanto no se definan las actividades a ejecutar conforme los ajustes técnicos que sean aprobados por la interventoría.

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Sábado, 12 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra
- Ingenieras de supervisión

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita

Actividades desarrolladas:

- Se continua con la demolición del enchape de piso existente.

- Se continua con el desmonte de cielo raso existen y su estructura de soporte.

Durante la jornada se contó con la **visita de la supervisión técnica** al área de trabajo, con el fin de verificar el avance de las actividades y revisar en sitio las condiciones encontradas en obra.

Observaciones:
No fue posible avanzar con actividades relacionadas con elementos estructurales, en tanto se está a la espera de que la Entidad contratante remita los planos y diseños actualizados, ajustados a las condiciones reales identificadas en obra. Esta documentación es necesaria para garantizar la correcta ejecución de las intervenciones y evitar reprocesos o afectaciones técnicas futuras.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 13 de julio de 2025

Clima: soleado.

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Lunes, 14 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Se inicia con excavación manual para ampliación de zapatas y pilotes.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Martes, 15 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Oficial de obra
- 2 Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores – Taladro demoledor makita - Martillo demoledor Metabo.

Actividades:

- Se continua con excavación manual para ampliación de zapatas y pilotes.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Miércoles, 16 de julio de 2025

Se recibe planos estructurales actualizados y especificaciones técnicas correspondientes al nuevo frente de trabajo, remitidos por la Entidad contratante.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Con base en esta información, se iniciaron las acciones necesarias para la organización logística y técnica del área, incluyendo la planificación de recursos, personal y equipos requeridos para el desarrollo de las nuevas actividades constructivas.

Se inicia con el calculo de cantidades de obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Jueves, 17 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Viernes, 18 de julio de 2025

Se continua con el cálculo de cantidades de obra, con base en los planes estructurales actualizados y las especificaciones técnicas recibidas.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sábado, 19 de julio de 2025

Personal en obra:

- Residente de obra
- SISO de obra
- Residente de interventoría
- Ayudante de obra

Estado del tiempo: Soleado

Herramientas y equipo: Herramientas menores.

Actividades desarrolladas:

- Acopio de material estructural (acero) en las instalaciones del palacio de justicia.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Domingo, 20 de julio de 2025

Jornada no laboral por ser día feriado, conforme al calendario oficial. No se realizaron actividades en obra.

MARIA CLAUDIA HERNANDEZ LECLERC
INGENIERA CIVIL – ESPECIALISTA
RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO PEREZ CABARCAS
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	19 de julio de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO:1	PRELIMINARES		**Cantidad Acta**		227,18
1.01	**Localizacion y replanteo**	**Unidad** ML	**Cantidad Acumulada Anterior**		227,18

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
SALA DE AUDIENCIA		7,36	5,74		**42,25**
SALA DE ESTAR		5,80	3,93		**22,79**
SECRETARÍA		6,88	3,49		**24,01**
		2,06	0,40		**0,82**
		0,14	1,15		**0,16**
CUARTO UTIL #1		4,62	1,52		**7,02**
OFICINA JUEZ		3,47	5,28		**18,32**
PASILLO PATIO		7,91	1,44		**11,39**
CUARTO UTIL #2		3,26	2,13		**6,94**
COCINA		1,76	3,40		**5,98**
PASILLOOFICINA JUEZ		3,88	0,89		**3,45**
BAÑO #1		1,36	1,17		**1,59**
BAÑO #2		1,19	1,17		**1,39**
BAÑO #3		1,07	1,60		**1,71**
BAÑO #4		1,67	2,38		**3,97**
CUARTO UTILI #3		1,77	1,67		**2,96**
PATIO		15,41	5,44		**41,92**
JARDINERA		2,77	7,70		**21,29**
TERRAZA		1,34	6,86		**9,19**
SUB-TOTAL					**227,18**

FOTO

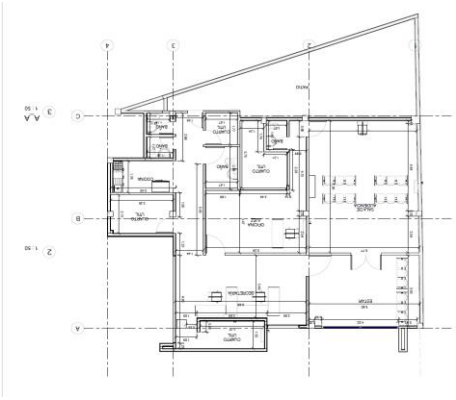

OBSERVACIONES:

Firma:
ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:
ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	19 de julio de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO:1	PRELIMINARES		**Cantidad Acta**		42,27
1,02	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE H=2.1 M**	**Unidad** ML	**Cantidad Acumulada Anterior**		42,27

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
FRENTE DE OBRA	1	42,27			**42,27**
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					**42,27**

FOTO



02



OBSERVACIONES:

Firma:

ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:

ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO: 2	DESMONTES Y DEMOLICIONES		**Cantidad Acta**		143,15
2,01	**DEMOLICION DE ENCHAPE PISO**	**Unidad** M2	**Cantidad Acumulada Anterior**		143,15

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
SALA DE AUDIENCIA		7,36	5,74		**42,25**
SALA DE ESTAR		5,80	3,93		**22,79**
SECRETARÍA		6,88	3,49		**24,01**
		2,06	0,40		**0,82**
		0,14	1,15		**0,16**
CUARTO UTIL #1		4,62	1,52		**7,02**
OFICINA JUEZ		3,47	5,28		**18,32**
PASILLO PATIO		7,91	1,44		**11,39**
CUARTO UTIL #2		3,26	2,13		**6,94**
COCINA		1,76	3,40		**5,98**
PASILLOOFICINA JUEZ		3,88	0,89		**3,45**
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					**143,15**

FOTO





OBSERVACIONES:

Firma:
ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:
ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	19 de julio de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO: 2	DESMONTES Y DEMOLICIONES		**Cantidad Acta**		29,42
2,02	**DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO**	**Unidad** M2	**Cantidad Acumulada Anterior**		29,42

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
SALA DE ESTAR		2,89	2,85		**8,24**
SECRETARÍA		2,89	3,23		**9,33**
CUARTO UTIL #1		2,75	1,00		**2,75**
PACILLO - OFICINA JUEZ		3,17	2,87		**9,10**
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					**29,42**

FOTO





OBSERVACIONES:

Firma:
ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:
ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	19 de julio de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO: 2	DESMONTES Y DEMOLICIONES		**Cantidad Acta**		107,67
2,03	**DEMOLICION DE CIELORRASO**	**Unidad** M2	**Cantidad Acumulada Anterior**		107,67

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
SALA DE ESTAR		5,80	3,93		**22,79**
SECRETARÍA		6,88	3,49		**24,01**
		2,06	0,40		**0,82**
		0,14	1,15		**0,16**
CUARTO UTIL #1		4,62	1,52		**7,02**
OFICINA JUEZ		3,47	5,28		**18,32**
PASILLO PATIO		7,91	1,44		**11,39**
CUARTO UTIL #2		3,26	2,13		**6,94**
COCINA		1,76	3,40		**5,98**
PASILLOOFICINA JUEZ		3,88	0,89		**3,45**
BAÑO #1		1,36	1,17		**1,59**
BAÑO #2		1,19	1,17		**1,39**
CUARTO UTIL #3		1,77	1,17		**2,07**
BAÑO #3		1,07	1,60		**1,71**
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					**107,67**

FOTO





OBSERVACIONES:

Firma:
ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:
ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DEL CORTE		**CORTE DE OBRA N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTUAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUTECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE	**PERIODO DE CORTE**	20 de junio de 2025	A	19 de julio de 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MTTO COLOSO	**CONTRATO DE OBRA**	SAMAC 02 DE 2025		
SUPERVISOR	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	**MUNICIPIO**	COLOSO - SUCRE		
CAPITULO: 2	DESMONTES Y DEMOLICIONES		**Cantidad Acta**		114,34
2,07	**DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE RETIRO)**	**Unidad** M	**Cantidad Acumulada Anterior**		114,34

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
SALA DE AUDIENCIA		23,91			**23,91**
SALA DE ESTAR		13,44			**13,44**
SECRETARÍA		15,46			**15,46**
CUARTO UTIL #1		13,00			**13**
OFICINA JUEZ		11,63			**11,63**
PASILLO - OFICNA JUEZ		7,09			**7,09**
PASILLO - PATIO		10,74			**10,74**
CUARTO UTIL #2		10,50			**10,5**
COCINA		8,57			**8,57**
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
SUB-TOTAL					**114,34**

FOTO





OBSERVACIONES:

Firma
ANDRES FELIPE MISERQUE BELENO
CONSORCIO MTTO COLOSO
Representante legal
Contratista de Obra

Firma:
ING. ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S.
Representante legal (e)
Interventoría

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Sincelejo – Sucre, 28 de junio de 2025

OF-001-MC06-2025

Señores

CONSORCIO MTTO COLOSO
RL. Andres Miserque Beleño

Referencia: Invitación Pública Nº MC 06 de 2025, "Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"

Asunto: Solicitud de documentacion inicial

Cordial saludo,

En el ejercicio de nuestras funciones como interventoría cabe recordar que el **EL CONTRATISTA** se obliga a encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato y que debe contar con todos los elementos de protección personal para los obreros acorde al tipo de trabajo que ejerza y deben estar amparados en salud, seguridad social y riesgos profesionales, asi mismo el contratista debe adoptar e implementar el plan de manejo ambiental, por lo tanto se le solicita enviar la siguiente documentación inicialmente:

1. Enviar copia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2. Enviar copia del plan de manejo ambiental.
3. Enviar listado actualizado de profesionales y personal de mano de obra no calificada donde indiquen nombre, número de identificación, cargo y afiliación al sistema general de seguridad social integral (SALUD, PENSION Y ARL).
4. Al momento de ingresar a un trabajador nuevo deben presentar afiliaciones completas: Copia de ARL, radicado de EPS, pensiones y afiliaciones a caja de compensación familiar, radicado de EPS, pensiones y afiliaciones a caja de compensación familiar, de lo contrario no se permitirá iniciar la labor de empleado.

5. Enviar soporte de entrega de elementos de protección personal.

6. Enviar soporte de capacitaciones iniciales en seguridad y salud en el trabajo realizadas a los trabajadores.

Atentamente



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

CC: ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Sincelejo – Sucre, 07 de julio de 2025

OF-002-MC06-2025

Señores

CONSORCIO MTTO COLOSO
RL. Andres Miserque Beleño
Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública Nº MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*

Asunto: Requerimiento entrega de la programación de obra

Respetados señores:

En el ejercicio de nuestras funciones como interventoría del contrato de obra No. SAMC 02 de 2025, nos permitimos solicitar la **programación de obra**, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales y los lineamientos técnicos de seguimiento y control.

Dicha programación es fundamental para establecer el plan de ejecución, seguimiento y verificación del avance físico y financiero del proyecto, por lo cual agradecemos su entrega a la mayor brevedad posible.

Atentamente



FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S
RL JOSÉ PASTOR MAESTRE SABALZA

CC: ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Sincelejo – Sucre, 16 de julio de 2025

OF-003-MC06-2025

Señores

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora de contratos SAMAC 02 de 2025 y MC 06 de 2025
Profesional Universitario
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

Coloso - Sucre

Referencia: Invitación Pública Nº MC 06 de 2025, "*Interventoría al contrato de reforzamiento estructural, adecuaciones y reparaciones arquitectónicas y estructurales a la infraestructura del palacio de justicia de coloso sucre"*


Asunto: Informe de inactividad en obra

Respetada ingeniera:

En el ejercicio de nuestras funciones como interventoría del contrato de obra No. SAMC 02 de 2025, nos permitimos informar que en el día de hoy 16 de julio de 2025, no se registraron actividades en el frente de obra. Durante la visita realizada, se verificó que no se encontraba presente el personal operativo del contratista.

Se deja la constancia correspondiente para los fines pertinentes.

Atentamente



ING. RAMON LOPEZ CAMARGO
Representante Legal (e)
FORMULACION Y CONSTRUCCION S.A.S

CC: ANDRÉS FELIPE MISERQUE BELEÑO
CONSORCIO MTTO COLOSO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sincelejo, 30 de junio de 2025

Señores
FORMULACION Y CONSTRUCCION SASS
JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA
INTERVENTORIA

ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

Referencia: Contrato **No SAMC 02 DE 2025** Cuyo Objeto es: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE

Asunto: Solicitud Ingreso del Personal

Estimados señores:

ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO MTTO COLOSO** por medio de la presente solicitamos permiso para el ingreso a las instalaciones del complemento judicial de Sincelejo al siguiente personal para laborar dentro de las instalaciones:

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	1005605323	OBRERO
TAMARA TOSCANO MIGUEL EMIRO	92542624	OBRERO

Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO	
Dirección	Cra 42 numero 8 – 26 Casa 37 Conjunto Bella Vista	
Teléfono	3014027559	3014027559
e-mail	Andres3093@outlook.co	

Nombre del Representante Legal del Proponente: ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

Firma del Representante Legal del Proponente:_____

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 097691468 **Documento** N901950642

Empresa CONSORCIO MTTO COLOSO

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1005605323	TAMARA HERNANDEZ JAIRO ANDRES	M	0000000001 - PRINCIPAL SUCRE	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	SINCELEJO	28-06-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C92542624	TAMARA TOSCANO MIGUEL EMIRO	M	0000000001 - PRINCIPAL SUCRE	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	SINCELEJO	28-06-2025	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

Total trabajadores 2

Total coberturas 2

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sincelejo, 07 de julio de 2025

Señores
FORMULACION Y CONSTRUCCION SASS
JOSE PASTOR MAESTRE SABALZA
INTERVENTORIA

ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
SUPERVISOR

Referencia: Contrato **No SAMC 02 DE 2025** Cuyo Objeto es: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE

Asunto: Solicitud Ingreso del Personal

Estimados señores:


ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO MTTO COLOSO** por medio de la presente solicitamos amablemente a la interventoría y entidad la posibilidad de ubicar ventanas y puertas las cuales se desmontaron el día de hoy, en un lugar seguro donde puedan estar seguras y no sean afectadas por la magnitud de los trabajos que se están realizando en el palacio de justicia. Sugerimos respetuosamente que se puedan ubicar en el lugar donde están guardados los mobiliarios del palacio de justicia que fueron desmontados en días anteriores.

Muchas gracias,

Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO	
Dirección	Cra 42 numero 8 – 26 Casa 37 Conjunto Bella Vista	
Teléfono	3014027559	3014027559
e-mail	Andres3093@outlook.co	

Nombre del Representante Legal del Proponente: ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

Firma del Representante Legal del Proponente: 

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

ANEXOS











Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sincelejo, 15 de julio de 2025

Señores
FORMULACION Y CONSTRUCCION SAS
Att: Ing. Ramón Andrés López Camargo
Representante de Interventoría
E. S. D.
INTERVENTORIA

Referencia: Contrato **No SAMC 02 DE 2025** Cuyo Objeto es: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra SAMC 02 DE 2025

Estimados señores:

ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal del Consorcio MTTO COLOSO, contratista del Contrato de Obra SAMC 02 DE 2025, y en atención al desarrollo del Comité de Obra No. 002 llevado a cabo el pasado 11 de julio de 2025 en las instalaciones del Palacio de Justicia de Coloso, me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato de obra, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Durante las actividades iniciales de demolición y excavación previstas en el alcance contractual, se evidenciaron serias discrepancias entre los diseños estructurales entregados por la entidad y las condiciones reales del sitio, entre las que se destacan:

- Existencia de casetones de poliestireno expandido bajo la plantilla de piso, en contravía de lo indicado en los planos, donde se mostraba apoyo directo sobre terreno.
- Presencia de vigas de aproximadamente 40 cm de peralte no contempladas en los planos.
- Condiciones estructurales en muros internos que comprometen la seguridad del personal en obra.
- Comprobación, mediante cortes estratégicos, de que la losa de contrapiso es aérea y no en contacto directo con el terreno, situación no prevista por la consultoría.

Estas anomalías técnicas comprometen directamente el cronograma, el presupuesto y el alcance inicial del contrato, impidiendo continuar con la ejecución de los trabajos conforme al marco contractual vigente. A la fecha, se encuentra pendiente la reunión con el consultor para definir las soluciones y ajustes correspondientes, y se requiere la elaboración de planos récord y un nuevo presupuesto.

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

En virtud de lo anterior y para evitar posibles incumplimientos o afectaciones a la calidad, seguridad y legalidad del proyecto, solicitamos de manera respetuosa:

1. La suspensión temporal del contrato, hasta tanto:


- Se adelanten las reuniones necesarias con el consultor para resolver las inconsistencias;
- Se elaboren y aprueben los planos y presupuestos ajustados;
- Se acuerde un nuevo cronograma de obra.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a la respuesta que se sirvan brindar a la presente solicitud.

Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO	
Dirección	Cra 42 numero 8 – 26 Casa 37 Conjunto Bella Vista	
Teléfono	3014027559	3014027559
e-mail	Andres3093@outlook.co	

Nombre del Representante Legal del Proponente: ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

Firma del Representante Legal del Proponente:

Licita Civil Especializada

Nit. 901789233-4
322 651 31 92
Carrera 24E # 7 A 11
Barrio 6 de Enero
LICITACIVILESPECIALIZADASAS@GMAIL.COM

Sincelejo, 16 de julio de 2025

Señores
FORMULACION Y CONSTRUCCION SAS
Att: Ing. Ramón Andrés López Camargo
Representante de Interventoría
E. S. D.
INTERVENTORIA

Referencia: Contrato No SAMC 02 DE 2025 Cuyo Objeto es: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACIONES Y REPARACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE

Asunto: Respuesta al oficio OF-003-MC06-2025 – Informe de inactividad en obra.

Cordial Saludo,

En atención al informe citado en la referencia, en el cual se deja constancia de la inactividad en el frente de obra el día 16 de julio de 2025, me permito realizar las siguientes precisiones con el fin de justificar dicha situación, dentro del marco técnico y contractual del proyecto:

1. Situación técnica expuesta en el Comité de Obra No. 002 (11 de julio de 2025): Tal como fue documentado en el acta de comité, el equipo contratista evidenció múltiples inconsistencias entre los estudios, diseños y planos entregados por la entidad y las condiciones reales encontradas en sitio. Dichas discrepancias afectan directamente la planificación, ejecución y presupuestación de las actividades previstas, lo cual fue reconocido por la interventoría y quedó plasmado como hecho relevante del comité.

2. Entrega tardía de información técnica ajustada: El día 16 de julio de 2025, fecha del informe de inactividad, la entidad apenas remitió un plano estructural aprobado que permite iniciar con la definición de nuevos frentes de trabajo. Dicha información es fundamental para el reinicio seguro y técnico de la obra, ya que sin estos planos actualizados no se podían ejecutar actividades conforme al alcance contractual y normativo.

3. Necesidad de organización logística posterior a la recepción del plano:

Una vez recibido el plano aprobado, era necesario dar inicio a la logística de alistamiento de obra, lo cual incluye:

- Compra y transporte de materiales.
- Reorganización y movilización del personal técnico y operativo.
- Adecuación de condiciones mínimas de seguridad y acopio.

Lo anterior requiere tiempo y coordinación, máxime considerando que la obra se ejecuta en el municipio de Colosó – Sucre, zona de difícil acceso y con limitaciones logísticas.

Por lo tanto, la inactividad en obra registrada el 16 de julio de 2025 responde a causas plenamente justificadas y ajenas a la voluntad del contratista, relacionadas con la espera de información técnica por parte de la entidad y la preparación operativa que requiere su ejecución.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a la respuesta que se sirvan brindar a la presente solicitud.

Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto	ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO	
Dirección	Cra 42 numero 8 – 26 Casa 37 Conjunto Bella Vista	
Teléfono	3014027559	3014027559
e-mail	Andres3093@outlook.co	

Nombre del Representante Legal del Proponente: ANDRES FELIPE MISERQUE BELEÑO

Firma del Representante Legal del Proponente: 
