ACTA 003

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Contrato No. C-019 DE 2025

Objeto del contrato:

“REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

FACTURA ELECTRÓNICA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

CR 53 # 131 A - 72 BL 3 AP 302
ing.nalvarez@gmail.com
TEL: (601) 6145878

NIT 901961696-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764097517634
Fecha 25/08/2025 - 25/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FEV-1 al FEV-500 - No somos Grandes Contribuyentes; No somos Autorretenedores de Renta, Iva e Ica
Actividad Económica 4330 Tarifa ICA 6.9 x 1000
Email: 901961696@recepciondefacturas.co
Teléfono: 3163477044

Departamento	Fecha		
Norte de Santander	10	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV - 4

Nombre o Razón Social:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	**NIT:**	800165874-0	**Fecha de firmado:**	10/12/2025 18:51:43
Dirección:	AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ETA P 2	**Departamento:**	Norte de Santander	**Teléfono:**	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Diciembre 08 del 2025	**Hora emisión:**	18:51:38-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/12/2025				
Nombre Comercial:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	Costo Directo Contrato C-019 DE 2025OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	WSD				$389.626.535,00	$389.626.535,00
2	02	1,00	Administración Administración 26%	WSD				$101.302.899,00	$101.302.899,00
3	03	1,00	Imprevistos Imprevistos 4%	WSD				$15.585.061,00	$15.585.061,00
4	04	1,00	Utilidad Utilidad 6%	WSD	IVA	19%	$4.441.742,00	$23.377.592,00	$23.377.592,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	AMORTIZACION ANTICIPO 30%	30,00	$160.300.148,00

Notas:
#$27-01-02-017;C0192025;jbautistc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

SON: (trescientos setenta y cuatro millones treinta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos)
CUFE: 4ef7a94a6aa1517b88c815c2ff64ab76a4e6e04aa0559fe6911731f18ab93bd1455234c1d844c78940780cbe52c36bb7

Subtotal:	$529.892.087,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.441.742,00
Total de la operación:	$534.333.829,00
Descuentos globales:	$160.300.148,00
Total:	$374.033.681,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.377.592,00	19,00%	$4.441.742,00

Firma Digital: R9YWl05lu7lb5Rl4qnRxwa1OEjC6b3R8eVr4PpRt/nTatE/vgFD+WKnnTcarZlSP jU1AlYb+EFlOF0f84QVagJIzAgISaVMSS95XoiqcBhlcig2FSA mt5EbkhlagU+qA mz7cbgBL7ZH94922jl3JBjMKsPBAJOlUE8ZnECP0KwYuTyf78VgJkmYFFEnZFDZs YjMz/xHrtHjfD7+GrkUjUaiuqYKizi3VKNq z8BVKenP6q/kXtdyzNoUATXd0Jmwr EWEktMl16/h00D36lGzsLTKpr+DcsghStXu8z94PERaG+gEYDFR4biBbbpTWoeuK P3TiMqDQVnbNKgL19Aa6 MQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141189058658

(415)7707212489984(8020) 000014118905865 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 53 # 131 A - 72 BL 3 AP 302

42. Correo electrónico: ing.nalvarez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 6 1 4 5 8 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 3 0	2 0 2 5 0 6 2 7	4 2 9 0	2 0 2 5 0 6 2 7			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 1 8 2 7 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	GONZALEZ	NICOLAS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 9 1 6 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRIETO	MUÑETON	CARLOS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141189058658

(415)7707212489984(8020) **000014118905865 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 1 6 9 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 1 9 7 3 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OBRICON S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 6 5 0 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TAYFER DE COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 9 3 3 6	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PRIMUTAF S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 1 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO BANCARIO.

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Principal - Bogota

CERTIFICA QUE:

El Cliente CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA, identificado con Nit. 901.961.696:

Tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No. 051204388301, con apertura el día 2025/07/09, la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 09 de mes de Julio del año 2025.

Atentamente,



_____

Colaborador Bancoomeva
Usuario:JJBC5178

ACTA PARCIAL DE OBRA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

OBRA: OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTA 003

CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
	TRABAJOS PRELIMINARES				**$ 469,824,659.32**		**$ 442,493,447.13**		**$ 442,493,447.13**		**$ 442,517,835.09**		**$ 447,193,402.89**									
1.1	Demoliciones	m2	798.40	$60,486.00	$ 48,292,215.96	798.00	$ 48,267,828	798.00	$ 48,267,828	798.40	$ 48,292,216	875.703	$ 52,967,784	742.76	$ 44,926,745.00	132.94	$ 8,041,009	875.70	$ 52,967,784	100%	0.0	$ -
1.2	Construcción, Montaje, Manteniemiento y Desmonte de Campamentos y Cerramientos (incluye todas las adecuaciones provisionales en obra, incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado)	Und	1.00	$96,677,827.00	$ 96,677,827.00	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827	1.00	$ 96,677,827.00		$ -	1.00	$ 96,677,827	100%	0.0	$ -
1.3	Construcción de provisionales de energia y acueducto, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$73,341,428.00	$ 73,341,428.00	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428	1.00	$ 73,341,428.00		$ -	1.00	$ 73,341,428	100%	0.0	$ -
1.4	Obras Plan de Manejo de Ambiental, incluye todo lo necesario, contemplado el PGAS	gb	1.00	$11,029,422.00	$ 11,029,422.00	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422	1.00	$ 11,029,422.00		$ -	1.00	$ 11,029,422	100%	0.0	$ -
1.5	Obras Plan de Manejo de Tráfico	gb	1.00	$5,839,106.00	$ 5,839,106.00	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106	1.00	$ 5,839,106.00		$ -	1.00	$ 5,839,106	100%	0.0	$ -
1.6	Señalización de zonas intervenidas	un	50.00	$14,381.00	$ 719,050.00	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050	50.00	$ 719,050.00		$ -	50.00	$ 719,050	100%	0.0	$ -
1.7	Barrera de delimitación con delineador tubular, tela sintética verde y cinta reflectiva plástica de seguridad	m	200.00	$70,321.00	$ 14,064,200.00	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,901	201.56	$ 14,173,900.76		$ -	201.56	$ 14,173,901	100%	0.0	$ -
1.8	Desmonte de puertas (todos los materiales y estructuras - incluye marcos) incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	un	21.00	$43,968.00	$ 923,328.00	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328	21.00	$ 923,328.00		$ -	21.00	$ 923,328	100%	0.0	$ -
1.9	Desmonte de cielo-raso (todos los materiales y estructuras) incluye cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1762.00	$18,003.00	$ 31,721,286.00	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547	495.67	$ 8,923,547.01		$ -	495.67	$ 8,923,547	100%	0.0	$ -
1.10	Desmonte teja fibro-cemento y otros materiales, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	461.00	$22,434.00	$ 10,342,074.00	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,199	452.67	$ 10,155,198.78		$ -	452.67	$ 10,155,199	100%	0.0	$ -
1.11	Demolición placa de contrapiso hasta e<0.15m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	390.00	$60,759.00	$ 23,696,010.00	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804	422.14	$ 25,648,804.26		$ -	422.14	$ 25,648,804	100%	0.0	$ -
1.12	Demolición de vigas y columnas (vigas de cubierta), incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m3	80.00	$341,516.00	$ 27,321,280.00	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	80.00	$ 27,321,280	37.66	$ 12,861,492.56		$ -	37.66	$ 12,861,493	47%	42.3	$ 14,459,787.44
1.13	Demolición de muros con mamposteria de arcilla o cemento espesor máx. de 0.20m, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1735.00	$18,814.00	$ 32,642,290.00	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,290	1735.00	$ 32,642,242.97		$ -	1735.00	$ 32,642,243	100%	0.0	$ 47.03
1.14	Desmonte de aparatos sanitarios	un	20.00	$35,313.00	$ 706,260.00	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878	6.00	$ 211,878.00		$ -	6.00	$ 211,878	100%	0.0	$ -
1.15	Reparación afectacion reforz columnas internas incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	27.00	$533,933.00	$ 14,416,191.00	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	27.00	$ 14,416,191	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	27.0	$ 14,416,191.00
1.16	Demolicion de Tortas placas aereas, incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado	m2	1139.64	$68,524.00	$ 78,092,691.36	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368	1053.68	$ 72,202,368.32		$ -	1053.68	$ 72,202,368	100%	0.0	$ -
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 26,018,278.77**		**$ 26,018,278.77**		**$ 26,018,278.77**		**$ 30,614,624.84**		**$ 30,614,624.84**	0.00	$ -							
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	431.75	$56,031.00	$ 24,191,384.25	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	431.75	$ 24,191,384	0.00	$ -	346.37	$ 19,407,457	346.37	$ 19,407,457	80%	85.4	$ 4,783,926.78
2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	9.36	$107,633.00	$ 1,007,444.88	9.36	$ 1,007,445	9.36	$ 1,007,445	52.96	$ 5,700,244	52.96	$ 5,700,244	8.42	$ 906,269.86	16.65	$ 1,792,089	25.07	$ 2,698,359	47%	27.9	$ 3,001,884.37
2.3	Relleno material seleccionado	m3	30.84	$26,571.00	$ 819,449.64	30.84	$ 819,450	30.84	$ 819,450	27.21	$ 722,997	27.21	$ 722,997	4.70	$ 124,883.70	8.32	$ 221,071	13.02	$ 345,954	48%	14.2	$ 377,042.49
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 149,493,472.89**		**$ 167,157,070.71**		**$ 167,157,070.71**		**$ 101,418,037.81**		**$ 109,515,611.35**	0.00	$ -							
3.1	Zapata en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	9.16	$1,143,096.00	$ 10,470,759.36	9.16	$ 10,470,759	9.16	$ 10,470,759	3.05	$ 3,486,443		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
3.2	Pedestal en concreto de 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	0.25	$1,143,096.00	$ 285,774.00	0.25	$ 285,774	0.25	$ 285,774	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	kg	7170.00	$5,889.00	$ 42,224,130.00	7170.00	$ 42,224,130	7170.00	$ 42,224,130	5202.94	$ 30,640,114	7170.00	$ 42,224,130	0.00	$ -	1308.59	$ 7,706,287	1308.59	$ 7,706,287	18%	5861.4	$ 34,517,843.49
3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	68.21	$49,177.00	$ 3,354,363.17	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	68.21	$ 3,354,363	0.00	$ -	15.30	$ 752,408	15.30	$ 752,408	22%	52.9	$ 2,601,955.07
3.5	Localizacion y replanteo, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$9,783.00	$ 1,206,830.88	1928.90	$ 18,870,429	1928.90	$ 18,870,429	128.76	$ 1,259,659	128.76	$ 1,259,659	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	128.8	$ 1,259,659.08
3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$49,663.00	$ 6,126,427.68	123.36	$ 6,126,428	123.36	$ 6,126,428	86.77	$ 4,309,259	86.77	$ 4,309,259	0.48	$ 23,838.24	37.15	$ 1,844,980	37.63	$ 1,868,819	43%	49.1	$ 2,440,439.82
3.7	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m3	56.84	$1,493,039.00	$ 84,864,336.76	56.84	$ 84,864,337	56.84	$ 84,864,337	38.45	$ 57,407,350	38.45	$ 57,407,350	0.00	$ -	15.30	$ 22,843,497	15.30	$ 22,843,497	40%	23.2	$ 34,563,852.85
3.8	Perfilada Excavación, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	123.36	$7,789.00	$ 960,851.04	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	123.36	$ 960,851	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	123.4	$ 960,851.04
4	**ESTRUCTURA**				**$ 468,325,806.23**		**$ 468,325,806.23**		**$ 468,325,806.23**		**$ 424,854,128.56**		**$ 424,854,128.56**	0.00	$ -							
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	17143.00	$5,889.00	$ 100,955,127.00	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	17143.00	$ 100,955,127	2866.60	$ 16,881,418.12	2103.33	$ 12,386,510	4969.93	$ 29,267,928	29%	12173.1	$ 71,687,198.51
4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	40.00	$8,113.00	$ 324,520.00	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	40.00	$ 324,520	8.00	$ 64,904.00	16.00	$ 129,808	24.00	$ 194,712	60%	16.0	$ 129,808.00
4.3	Bombeo de concreto	m3	54.00	$49,177.00	$ 2,655,558.00	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	54.00	$ 2,655,558	12.24	$ 601,926.48	28.05	$ 1,379,415	40.29	$ 1,981,341	75%	13.7	$ 674,216.67
4.4	Placa aérea vigas descolgadas H=0.40 m en concreto de 28 Mpa (4000 psi). , Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación.	m2	399.11	$413,492.00	$ 165,028,792.12	399.11	$ 165,028,792	399.11	$ 165,028,792	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	13.00	$2,242,852.00	$ 29,157,076.00	13.00	$ 29,157,076	13.00	$ 29,157,076	13.29	$ 29,807,503	13.29	$ 29,807,503	4.04	$ 9,061,122.08	1.56	$ 3,498,849	5.60	$ 12,559,971	42%	7.7	$ 17,247,531.88
4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	32.65	$1,326,092.00	$ 43,296,903.80	32.65	$ 43,296,904	32.65	$ 43,296,904	110.45	$ 146,466,861	110.45	$ 146,466,861	0.00	$ -	1.17	$ 1,551,528	1.17	$ 1,551,528	1%	109.3	$ 144,915,333.76
4.7	Conector empalme mecánico	un	60.00	$22,002.00	$ 1,320,120.00	60.00	$ 1,320,120	60.00	$ 1,320,120	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.8	Localizacion y replanteo	m2	108.15	$9,783.00	$ 1,058,031.45	108.15	$ 1,058,031	108.15	$ 1,058,031	1928.90	$ 18,870,429	1928.90	$ 18,870,429	100.00	$ 978,300.00		$ -	100.00	$ 978,300	5%	1828.9	$ 17,892,128.70
4.9	Escaraficiación de superficies de elementos estructurales (vigas y columnas). Incluye todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m2	1630.00	$8,278.00	$ 13,493,140.00	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	1630.00	$ 13,493,140	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1630.0	$ 13,493,140.00
4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	16.82	$1,131,650.00	$ 19,034,353.00	16.82	$ 19,034,353	16.82	$ 19,034,353	7.77	$ 8,792,921	7.77	$ 8,792,921	0.00	$ -	**6.89**	$ 7,797,069	6.89	$ 7,797,069	89%	0.9	$ 995,852.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
4.11	Concreto recalce columnas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	1.89	$1,272,098.00	$ 2,404,265.22	1.89	$ 2,404,265	1.89	$ 2,404,265	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	11.69	$1,279,624.00	$ 14,958,804.56	11.69	$ 14,958,805	11.69	$ 14,958,805	34.37	$ 43,980,677	34.37	$ 43,980,677	8.15	$ 10,428,935.60	**25.75**	$ 32,950,318	33.90	$ 43,379,254	99%	0.47	$ 601,423.28
4.13	Anclaje de acero de vigas en columnas (Incluye perforación hasta 0.15m y epóxico) Ø 7/8. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1263.00	$24,835.00	$ 31,366,605.00	1263.00	$ 31,366,605	1263.00	$ 31,366,605	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.14	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	2730.60	$5,889.00	$ 16,080,503.40	2730.60	$ 16,080,503	2730.60	$ 16,080,503	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
4.15	Suministro y aplicación de imprimante epóxico bicomponente de alta adherencia para unión de concretos endurecido con concreto fresco, de consistencia líquida, color contrastante, resistente a humedad y de aplicación con brocha o rodillo, con un rendimiento aproximado de 0.5 kg/m². Incluye preparación de superficies, herramientas, aplicación, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	60.00	$146,570.00	$ 8,794,200.00	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	60.00	$ 8,794,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 8,794,200.00
4.16	Suministro y aplicación de inhibidor migratorio de corrosión para acero embebido en concreto, base aminas orgánicas, compatible con estructuras de concreto armado, de baja viscosidad, aplicación por aspersión o brocha, con capacidad de penetración mínima de 20 mm, que actúe por migración hacia la superficie del acero, formando una capa protectora que reduzca la velocidad de corrosión. Incluye preparación de superficies, aplicación y materiales auxiliares.	kg	60.00	$30,329.00	$ 1,819,740.00	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	60.00	$ 1,819,740	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 1,819,740.00
4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	1061.00	$10,927.00	$ 11,593,547.00	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	1061.00	$ 11,593,547	531.00	$ 5,802,237.00	529.00	$ 5,780,383	1060.00	$ 11,582,620	100%	1.0	$ 10,927.00
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	783.36	$6,363.00	$ 4,984,519.68	783.36	$ 4,984,520	783.36	$ 4,984,520	5862.00	$ 37,299,906	5862.00	$ 37,299,906	0.00	$ -	1062.54	$ 6,760,942	1062.54	$ 6,760,942	18%	4799.5	$ 30,538,963.98
5	**INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA - HYS**													0.00	$ -							
5.1	**CUARTO DE BOMBAS**				**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**		**$ 40,008,414.00**	0.00	$ -							
5.101	TUBERIA POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	13.00	$83,167.00	$ 1,081,171.00	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	13.00	$ 1,081,171	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.0	$ 1,081,171.00
5.102	ACCESORIOS POLIPROPILENO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$59,362.00	$ 534,258.00	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	9.00	$ 534,258	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 534,258.00
5.103	TUBERIA POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	16.00	$69,306.00	$ 1,108,896.00	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	16.00	$ 1,108,896	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,108,896.00
5.104	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	28.00	$49,468.00	$ 1,385,104.00	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	28.00	$ 1,385,104	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	28.0	$ 1,385,104.00
5.105	TUBERIA POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	2.00	$55,445.00	$ 110,890.00	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	2.00	$ 110,890	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 110,890.00
5.106	ACCESORIOS POLIPROPILENO 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	5.00	$39,574.00	$ 197,870.00	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	5.00	$ 197,870	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 197,870.00
5.107	TUBERIA POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	ML	4.00	$46,524.00	$ 186,096.00	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	4.00	$ 186,096	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 186,096.00
5.108	ACCESORIOS POLIPROPILENO 6.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación	UN	9.00	$36,236.00	$ 326,124.00	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	9.00	$ 326,124	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 326,124.00
5.109	VALVULA DE PIE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,397,234.00	$ 1,397,234.00	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	1.00	$ 1,397,234	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,397,234.00
5.110	VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	3.00	$2,006,350.00	$ 6,019,050.00	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	3.00	$ 6,019,050	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 6,019,050.00
5.111	VALVULA PASO DIRECTO 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$1,561,626.00	$ 6,246,504.00	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	4.00	$ 6,246,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 6,246,504.00
5.112	VALVULA PASO DIRECTO 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$959,042.00	$ 959,042.00	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	1.00	$ 959,042	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 959,042.00
5.113	VALVULA PASO DIRECTO 6.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$597,491.00	$ 1,194,982.00	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	2.00	$ 1,194,982	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,194,982.00
5.114	VALVULA CHEQUE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,452,897.00	$ 4,905,794.00	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	2.00	$ 4,905,794	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 4,905,794.00
5.115	VALVULA CHEQUE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$453,550.00	$ 453,550.00	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	1.00	$ 453,550	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 453,550.00
5.116	JUNTA DE EXPANSIÓN 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$474,908.00	$ 949,816.00	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	2.00	$ 949,816	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 949,816.00
5.117	JUNTA DE EXPANSIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$474,908.00	$ 1,424,724.00	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	3.00	$ 1,424,724	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,424,724.00
5.118	BRIDA 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$126,789.00	$ 507,156.00	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	4.00	$ 507,156	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 507,156.00
5.119	BRIDA 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$105,659.00	$ 633,954.00	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	6.00	$ 633,954	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 633,954.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.120	SOPORTE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$21,369.00	$ 235,059.00	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	11.00	$ 235,059	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 235,059.00
5.121	SOPORTE 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$20,586.00	$ 288,204.00	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	14.00	$ 288,204	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 288,204.00
5.122	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$20,287.00	$ 40,574.00	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	2.00	$ 40,574	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 40,574.00
5.123	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$19,527.00	$ 78,108.00	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	4.00	$ 78,108	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 78,108.00
5.124	MANÓMETRO. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$127,217.00	$ 381,651.00	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	3.00	$ 381,651	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 381,651.00
5.125	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$952,503.00	$ 952,503.00	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	1.00	$ 952,503	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 952,503.00
5.126	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,145,096.00	$ 2,145,096.00	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	1.00	$ 2,145,096	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,145,096.00
5.127	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,608,822.00	$ 4,826,466.00	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	0.00	$ -	3.00	$ 4,826,466	3.00	$ 4,826,466	100%	0.0	$ -
5.128	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,072,548.00	$ 1,072,548.00	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	1.00	$ 1,072,548	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,072,548.00
5.129	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$365,990.00	$ 365,990.00	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	1.00	$ 365,990	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 365,990.00
5.1	**ACOMETIDA**				**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**		**$ 4,367,385.00**	0.00	$ -							
5.201	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	26.00	$10,126.00	$ 263,276.00	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	26.00	$ 263,276	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	26.0	$ 263,276.00
5.202	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$2,435.00	$ 29,220.00	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	12.00	$ 29,220	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 29,220.00
5.203	TUBERIA POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$12,016.00	$ 192,256.00	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	16.00	$ 192,256	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 192,256.00
5.204	ACCESORIOS POLIPROPILENO 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	23.00	$10,901.00	$ 250,723.00	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	23.00	$ 250,723	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	23.0	$ 250,723.00
5.205	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	4.00	$120,668.00	$ 482,672.00	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	4.00	$ 482,672	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 482,672.00
5.206	VALVULA CHEQUE 1/2. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$109,992.00	$ 109,992.00	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	1.00	$ 109,992	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 109,992.00
5.207	MEDIDOR 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,203,935.00	$ 1,203,935.00	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	1.00	$ 1,203,935	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,203,935.00
5.208	FILTRO Y 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,604.00	$ 184,604.00	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	1.00	$ 184,604	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 184,604.00
5.209	CAJA PARA MEDIDOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$855,619.00	$ 855,619.00	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	1.00	$ 855,619	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 855,619.00
5.210	VALVULA Y FLOTADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$397,544.00	$ 795,088.00	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	2.00	$ 795,088	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 795,088.00
5.3	**RED DE AGUA FRIA**				**$ 7,527,146.00**		**$ 7,527,146.00**		**$ 7,527,146.00**		**$ 7,849,398.00**		**$ 7,849,398.00**	0.00	$ -							
5.301	TUBERÍA PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$43,177.00	$ 604,478.00	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	14.00	$ 604,478	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 604,478.00
5.302	TUBERÍA PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	14.00	$35,347.00	$ 494,858.00	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	14.00	$ 494,858	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 494,858.00
5.303	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	17.00	$23,695.00	$ 402,815.00	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	17.00	$ 402,815	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	17.0	$ 402,815.00
5.304	TUBERÍA PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	91.00	$18,956.00	$ 1,724,996.00	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	91.00	$ 1,724,996	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	91.0	$ 1,724,996.00
5.305	TUBERÍA PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	7.00	$18,956.00	$ 132,692.00	7.00	$ 132,692	7.00	$ 132,692	24.00	$ 454,944	24.00	$ 454,944	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 454,944.00
5.306	TUBERÍA PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	53.00	$10,126.00	$ 536,678.00	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	53.00	$ 536,678	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	53.0	$ 536,678.00
5.307	ACCESORIO PVC-P Ø=2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$48,410.00	$ 629,330.00	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	13.00	$ 629,330	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.0	$ 629,330.00
5.308	ACCESORIO PVC-P Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$16,721.00	$ 183,931.00	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	11.00	$ 183,931	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 183,931.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.309	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$14,603.00	$ 146,030.00	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	10.00	$ 146,030	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 146,030.00
5.310	ACCESORIO PVC-P Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	153.00	$10,431.00	$ 1,595,943.00	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	153.00	$ 1,595,943	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	153.0	$ 1,595,943.00
5.311	ACCESORIO PVC-P Ø=1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$5,524.00	$ 110,480.00	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	20.00	$ 110,480	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 110,480.00
5.312	ACCESORIO PVC-P Ø=1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	79.00	$2,435.00	$ 192,365.00	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	79.00	$ 192,365	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	79.0	$ 192,365.00
5.313	SOPORTE 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$14,878.00	$ 59,512.00	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	4.00	$ 59,512	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 59,512.00
5.314	SOPORTE 1.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$13,143.00	$ 78,858.00	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	6.00	$ 78,858	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 78,858.00
5.315	SOPORTE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	35.00	$12,881.00	$ 450,835.00	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	35.00	$ 450,835	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.0	$ 450,835.00
5.316	SOPORTE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$12,623.00	$ 37,869.00	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	3.00	$ 37,869	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 37,869.00
5.317	SOPORTE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$12,123.00	$ 145,476.00	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	12.00	$ 145,476	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 145,476.00
5.4	**VALVULAS**				**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**		**$ 6,825,748.00**	0.00	$ -							
5.401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$289,640.00	$ 4,054,960.00	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	14.00	$ 4,054,960	0.00	$ -	3.00	$ 868,920	3.00	$ 868,920	21%	11.0	$ 3,186,040.00
5.402	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$231,712.00	$ 926,848.00	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	4.00	$ 926,848	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 926,848.00
5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13.00	$120,668.00	$ 1,568,684.00	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	13.00	$ 1,568,684	0.00	$ -	1.00	$ 120,668	1.00	$ 120,668	8%	12.0	$ 1,448,016.00
5.404	VALVULA EXPULSORA DE AIRE Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$68,814.00	$ 275,256.00	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	4.00	$ 275,256	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 275,256.00
5.5	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE**				**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**		**$ 4,661,409.00**	0.00	$ -							
5.501	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$51,859.00	$ 829,744.00	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	16.00	$ 829,744	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 829,744.00
5.502	PUNTO HIDRAULICO PARA SANITARIO DE PUSH ANTIVANDALICO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$138,319.00	$ 2,213,104.00	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	16.00	$ 2,213,104	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 2,213,104.00
5.503	PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$51,859.00	$ 155,577.00	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	3.00	$ 155,577	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 155,577.00
5.504	PUNTO HIDRAULICO PARA POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 207,436.00
5.505	PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	2.00	$51,859.00	$ 103,718.00	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	2.00	$ 103,718	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 103,718.00
5.506	PUNTO HIDRAULICO PARA RECAMARA DE AIRE pvcp 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	41.00	$23,034.00	$ 944,394.00	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	41.00	$ 944,394	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	41.0	$ 944,394.00
5.507	PUNTO HIDRAULICO PARA ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$51,859.00	$ 207,436.00	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	4.00	$ 207,436	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 207,436.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.6	**SALIDAS SANITARIAS**				**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**		**$ 7,201,369.00**	0.00	$ -							
5.601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$123,508.00	$ 1,976,128.00	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	16.00	$ 1,976,128	0.00	$ -	10.00	$ 1,235,080	10.00	$ 1,235,080	63%	6.0	$ 741,048.00
5.602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$145,486.00	$ 2,327,776.00	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	16.00	$ 2,327,776	0.00	$ -	10.00	$ 1,454,860	10.00	$ 1,454,860	63%	6.0	$ 872,916.00
5.603	PUNTO SANITARIO PARA LAVAPLATOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$123,508.00	$ 247,016.00	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	2.00	$ 247,016	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 247,016.00
5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$123,508.00	$ 494,032.00	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	4.00	$ 494,032	0.00	$ -	3.00	$ 370,524	3.00	$ 370,524	75%	1.0	$ 123,508.00
5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	0.00	$ -	3.00	$ 379,863	3.00	$ 379,863	60%	2.0	$ 253,242.00
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$95,207.00	$ 1,523,312.00	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	16.00	$ 1,523,312	0.00	$ -	10.00	$ 952,070	10.00	$ 952,070	63%	6.0	$ 571,242.00
5.7	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**				**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**		**$ 1,583,942.00**	0.00	$ -							
5.701	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	49.00	$21,086.00	$ 1,033,214.00	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	49.00	$ 1,033,214	0.00	$ -	25.50	$ 537,693	25.50	$ 537,693	52%	23.5	$ 495,521.00
5.702	TUBERÍA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$30,596.00	$ 550,728.00	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	18.00	$ 550,728	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 550,728.00
5.8	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**				**$ 32,324,270.00**		**$ 32,324,270.00**		**$ 32,324,270.00**		**$ 32,358,256.00**		**$ 32,358,256.00**	0.00	$ -							
5.801	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	95.00	$40,442.00	$ 3,841,990.00	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	95.00	$ 3,841,990	0.00	$ -	9.75	$ 394,310	9.75	$ 394,310	10%	85.3	$ 3,447,680.50
5.802	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	38.00	$32,308.00	$ 1,227,704.00	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	38.00	$ 1,227,704	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	38.0	$ 1,227,704.00
5.803	TUBERÍA PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	60.00	$22,284.00	$ 1,337,040.00	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	60.00	$ 1,337,040	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 1,337,040.00
5.804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	120.00	$30,875.00	$ 3,705,000.00	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	120.00	$ 3,705,000	0.00	$ -	42.00	$ 1,296,750	42.00	$ 1,296,750	35%	78.0	$ 2,408,250.00
5.805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	15.00	$19,951.00	$ 299,265.00	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	15.00	$ 299,265	0.00	$ -	10.00	$ 199,510	10.00	$ 199,510	67%	5.0	$ 99,755.00
5.806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	144.00	$12,234.00	$ 1,761,696.00	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	144.00	$ 1,761,696	0.00	$ -	54.00	$ 660,636	54.00	$ 660,636	38%	90.0	$ 1,101,060.00
5.807	TUBERÍA PVC-ALC Ø=6". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	13.00	$68,382.00	$ 888,966.00	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	13.00	$ 888,966	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	13.0	$ 888,966.00
5.808	ABRAZADERAS Ø=2 Y 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	20.00	$6,640.00	$ 132,800.00	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	20.00	$ 132,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 132,800.00
5.809	ABRAZADERAS Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	25.00	$14,777.00	$ 369,425.00	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	25.00	$ 369,425	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 369,425.00
5.810	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$45,316.00	$ 362,528.00	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	8.00	$ 362,528	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.0	$ 362,528.00
5.811	JUNTA EXPANSIÓN Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$33,986.00	$ 101,958.00	3.00	$ 101,958	3.00	$ 101,958	4.00	$ 135,944	4.00	$ 135,944	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 135,944.00
5.812	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$40,785.00	$ 244,710.00	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	6.00	$ 244,710	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 244,710.00
5.813	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MINIVENT Ø2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$172,150.00	$ 688,600.00	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	4.00	$ 688,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 688,600.00
5.814	TUBERÍA PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$115,340.00	$ 2,076,120.00	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	18.00	$ 2,076,120	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 2,076,120.00
5.815	ACCESORIO PVC-P Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	22.00	$89,821.00	$ 1,976,062.00	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	22.00	$ 1,976,062	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	22.0	$ 1,976,062.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.816	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$3,570,884.00	$ 7,141,768.00	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	2.00	$ 7,141,768	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 7,141,768.00
5.817	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$2,356,643.00	$ 4,713,286.00	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	2.00	$ 4,713,286	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 4,713,286.00
5.818	VÁLVULA UNIVERSAL ø4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$727,676.00	$ 1,455,352.00	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	2.00	$ 1,455,352	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,455,352.00
5.9	**RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS**				**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**		**$ 27,518,763.00**	0.00	$ -							
5.901	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	136.00	$40,442.00	$ 5,500,112.00	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	136.00	$ 5,500,112	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	136.0	$ 5,500,112.00
5.902	TUBERÍA PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$32,308.00	$ 2,261,560.00	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	70.00	$ 2,261,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.0	$ 2,261,560.00
5.903	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	74.00	$30,875.00	$ 2,284,750.00	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	74.00	$ 2,284,750	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	74.0	$ 2,284,750.00
5.904	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	42.00	$19,951.00	$ 837,942.00	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	42.00	$ 837,942	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	42.0	$ 837,942.00
5.905	TUBERÍA PVC-C Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	3.00	$40,442.00	$ 121,326.00	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	3.00	$ 121,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 121,326.00
5.906	GRAVA PARA FILTRO	M3	3.00	$253,503.00	$ 760,509.00	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	3.00	$ 760,509	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 760,509.00
5.907	GEOTEXTIL NO TEJIDO REF. 1600. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	10.00	$31,636.00	$ 316,360.00	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	10.00	$ 316,360	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 316,360.00
5.908	GEODREN H TOTAL 4.50m. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5.00	$286,554.00	$ 1,432,770.00	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	5.00	$ 1,432,770	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 1,432,770.00
5.909	ABRAZADERAS Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	30.00	$6,640.00	$ 199,200.00	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	30.00	$ 199,200	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 199,200.00
5.910	ABRAZADERAS Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$14,777.00	$ 236,432.00	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	16.00	$ 236,432	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 236,432.00
5.911	JUNTA EXPANSIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	18.00	$45,316.00	$ 815,688.00	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	18.00	$ 815,688	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 815,688.00
5.912	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$40,785.00	$ 81,570.00	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	2.00	$ 81,570	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 81,570.00
5.913	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$30,588.00	$ 91,764.00	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	3.00	$ 91,764	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 91,764.00
5.914	TUBERÍA PVC-P Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	24.00	$58,032.00	$ 1,392,768.00	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	24.00	$ 1,392,768	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 1,392,768.00
5.915	ACCESORIO PVC-P Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	48.00	$67,366.00	$ 3,233,568.00	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	48.00	$ 3,233,568	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.0	$ 3,233,568.00
5.916	CODO 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$145,486.00	$ 436,458.00	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	3.00	$ 436,458	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 436,458.00
5.917	SIFONES 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$145,486.00	$ 872,916.00	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	6.00	$ 872,916	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 872,916.00
5.918	SIFONES 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 633,105.00
5.919	CODO 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$126,621.00	$ 633,105.00	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	5.00	$ 633,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 633,105.00
5.920	VALVULA PASO DIRECTO TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,248,415.00	$ 2,496,830.00	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	2.00	$ 2,496,830	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,496,830.00
5.921	VALVULA CHEQUE TIPO PESADO ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$894,258.00	$ 1,788,516.00	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	2.00	$ 1,788,516	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,788,516.00
5.922	VÁLVULA UNIVERSAL ø3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$545,757.00	$ 1,091,514.00	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	2.00	$ 1,091,514	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,091,514.00
5.10	**ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**		**$ 5,998,949.00**	0.00	$ -							
5.101	CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70. Incluye tapa en concreto y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	2.00	$818,423.00	$ 1,636,846.00	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	2.00	$ 1,636,846	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,636,846.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
5.102	POZO DE BOMBEO CUARTO DE BOMBAS. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$3,690,043.00	$ 3,690,043.00	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	1.00	$ 3,690,043	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,690,043.00
5.103	CONEXIÓN A RED EXISTENTE. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta fabricación o instalación.	UN	1.00	$672,060.00	$ 672,060.00	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	1.00	$ 672,060	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 672,060.00
5.11	**MONTAJE DE APARATOS**				**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**		**$ 4,106,674.00**	0.00	$ -							
5.111	LAVAMANOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$84,890.00	$ 1,358,240.00	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	16.00	$ 1,358,240	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,358,240.00
5.112	SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$102,804.00	$ 1,644,864.00	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	16.00	$ 1,644,864	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,644,864.00
5.113	LLAVE MANGUERAØ=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$84,890.00	$ 254,670.00	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	3.00	$ 254,670	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 254,670.00
5.114	POCETAS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 339,560.00
5.115	LAVAPLATOS Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$84,890.00	$ 169,780.00	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	2.00	$ 169,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 169,780.00
5.116	ORINAL ø1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$84,890.00	$ 339,560.00	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	4.00	$ 339,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 339,560.00
5.12	**EXCAVACIONES**				**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**		**$ 14,976,552.00**	0.00	$ -							
5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	103.00	$28,358.00	$ 2,920,874.00	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	103.00	$ 2,920,874	0.00	$ -	9.30	$ 263,729	9.30	$ 263,729	9%	93.7	$ 2,657,144.60
5.122	RELLENO EN ARENA	M3	66.00	$109,967.00	$ 7,257,822.00	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	66.00	$ 7,257,822	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	66.0	$ 7,257,822.00
5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	32.00	$48,785.00	$ 1,561,120.00	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	32.00	$ 1,561,120	0.00	$ -	9.30	$ 453,701	9.30	$ 453,701	29%	22.7	$ 1,107,419.50
5.124	RETIRO DE SOBRANTES	M3	128.00	$25,287.00	$ 3,236,736.00	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	128.00	$ 3,236,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	128.0	$ 3,236,736.00
5.13	**EQUIPOS**				**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ 8,962,377.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
5.131	EQUIPO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS 2 BOMBAS SUMERGIBLES TIPO PIRAÑA AUTOCEBANTES PARA EL 100% CON ALTERNANCIA AUTOMÁTICA QT=7,9 L/S; CDT= 9 M.C.A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	GL	1.00	$8,962,377.00	$ 8,962,377.00	1.00	$ 8,962,377	1.00	$ 8,962,377	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.14	**DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ 1,390,408.00**		**$ -**	0.00	$ -							
5.141	DESINFECCIÓN	GL	1.00	$1,390,408.00	$ 1,390,408.00	1.00	$ 1,390,408	1.00	$ 1,390,408	1.00	$ 1,390,408	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.15	**ELABORACIÓN DE PLANOS RÉCORD**				**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ 4,865,928.00**		**$ -**	0.00	$ -							
5.151	PLANOS RÉCORD SEGÚN ESPECIFICACIONES	UN	18.00	$250,273.00	$ 4,504,914.00	18.00	$ 4,504,914	18.00	$ 4,504,914	18.00	$ 4,504,914	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
5.152	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UN	1.00	$361,014.00	$ 361,014.00	1.00	$ 361,014	1.00	$ 361,014	1.00	$ 361,014	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													0.00	$ -							
6.1	**SALIDAS DE ALUMBRADO**				**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**		**$ 63,078,821.00**	0.00	$ -							
6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	481.00	$131,141.00	$ 63,078,821.00	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	481.00	$ 63,078,821	0.00	$ -	32.00	$ 4,196,512	32.00	$ 4,196,512	7%	449.0	$ 58,882,309.00
6.20	**SALIDAS PARA TOMAS**				**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**		**$ 45,480,648.00**	0.00	$ -							
6.201	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica normal, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH(FASE-NEUTRO-TIERRA), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conectores tipo resortemarquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	253.00	$116,728.00	$ 29,532,184.00	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	253.00	$ 29,532,184	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	253.0	$ 29,532,184.00
6.202	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasicaregulada, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, TC LS-ZH TC(FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipohospitalario conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte marquillas deidentificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	112.00	$118,511.00	$ 13,273,232.00	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	112.00	$ 13,273,232	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	112.0	$ 13,273,232.00
6.203	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica conproteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto EMT, de ½", conductor de cobre CABLE 3No12 AWG, TC LS-ZH TC LS-ZH (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A,120V, conectores tipo resorte marquillas de identificacion y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LASALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO)	UN	16.00	$167,202.00	$ 2,675,232.00	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	16.00	$ 2,675,232	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 2,675,232.00
6.3	**ALIMENTADORES A TABLEROS ELECTRICOS**				**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**		**$ 83,745,090.00**	0.00	$ -							
6.301	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N°4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 625,655.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.302	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-2	ML	20.00	$125,131.00	$ 2,502,620.00	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	20.00	$ 2,502,620	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 2,502,620.00
6.303	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-3	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 3,128,275.00
6.304	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaTI-4	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,753,930.00
6.305	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA	ML	25.00	$125,131.00	$ 3,128,275.00	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	25.00	$ 3,128,275	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 3,128,275.00
6.306	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-1	ML	5.00	$101,526.00	$ 507,630.00	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	5.00	$ 507,630	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 507,630.00
6.307	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-2	ML	20.00	$101,526.00	$ 2,030,520.00	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	20.00	$ 2,030,520	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 2,030,520.00
6.308	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-3	ML	25.00	$101,526.00	$ 2,538,150.00	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	25.00	$ 2,538,150	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 2,538,150.00
6.309	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1½" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-GEN hastaTT-4	ML	30.00	$101,526.00	$ 3,045,780.00	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	30.00	$ 3,045,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,045,780.00
6.310	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-1	ML	5.00	$125,131.00	$ 625,655.00	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	5.00	$ 625,655	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 625,655.00
6.311	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-2	ML	30.00	$125,131.00	$ 3,753,930.00	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	30.00	$ 3,753,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 3,753,930.00
6.312	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-3	ML	35.00	$125,131.00	$ 4,379,585.00	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	35.00	$ 4,379,585	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.0	$ 4,379,585.00
6.313	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1No4+1No8TA+1No8TD, AWG, THHN-THHWcobre en 1Ø1½", incluyendo conductores, ducto de EMT,conexionado,accesorios y pruebas desde, CD-REG hasta TR-4	ML	40.00	$125,131.00	$ 5,005,240.00	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	40.00	$ 5,005,240	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.0	$ 5,005,240.00
6.314	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaTN-BOMBAS	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 778,680.00
6.315	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2No8+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaT-CASILLA	ML	10.00	$77,868.00	$ 778,680.00	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	10.00	$ 778,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 778,680.00
6.316	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-JOCKEY	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.317	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-EYEC	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.318	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No8+1N"8+1No8T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1¼" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BOMBAS hastaT-BO-AGPO	ML	10.00	$101,526.00	$ 1,015,260.00	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	10.00	$ 1,015,260	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,015,260.00
6.319	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No2+1No2+1No6T AWG, THHN-THHW, cobre en 1Ø2"incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hasta T-BOMBAS	ML	10.00	$229,872.00	$ 2,298,720.00	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	10.00	$ 2,298,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 2,298,720.00
6.320	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No1/0+1No4/0+1No2T AWG, THHN-THHW, cobreinstalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas desde, CD-PLANTA hastaCD-REG, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	10.00	$330,086.00	$ 3,300,860.00	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	10.00	$ 3,300,860	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 3,300,860.00
6.321	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW cobre, instalado en carcamo, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde,PLANTA ELECTRICA hasta CD-PLANTA	ML	10.00	$513,699.00	$ 5,136,990.00	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	10.00	$ 5,136,990	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 5,136,990.00
6.322	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 2(3No250kcmil+1No250kcmil+1No2T, AWG,THHN-THHW, Ø3" cobre), incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas desde, BORNES DETRASFORMADOR hasta CD-GEN	ML	25.00	$513,699.00	$ 12,842,475.00	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	25.00	$ 12,842,475	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 12,842,475.00
6.323	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N"10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-EYEC hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,643,080.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901961496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.324	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No10+1N°10+1No10T AWG, THHN-THHW cobre, en1Ø1" incluyendo conductores, ducto de EMT, conexionado, accesorios y pruebas desde, T-BO-AGPO hastaBOMBAS	ML	20.00	$82,154.00	$ 1,643,080.00	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	20.00	$ 1,643,080	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,643,080.00
6.325	Suministro, transporte e instalación de cable siete hilos 3No12 cobre, AWG, TC LS-ZH instalado enDUCTO PORTACABLES, desde tableros de distribucion circuitos ramales tomas e iluminacion hasta caja depaso para salida de circuitos ramales, incluyendo conductores, conexionado,accesorios y pruebas.	ML	3500.00	$4,929.00	$ 17,251,500.00	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	3500.00	$ 17,251,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3500.0	$ 17,251,500.00
6.4	**TABLEROS DE DISTRIBUCION**				**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**		**$ 2,473,544.00**	0.00	$ -							
6.401	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 18circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$254,788.00	$ 1,019,152.00	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	4.00	$ 1,019,152	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,019,152.00
6.402	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución trifasico con espacio para totalizador de 24circuitos de 5 hilos, 220V con cerradura,chapa y tapa, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$262,282.00	$ 1,049,128.00	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	4.00	$ 1,049,128	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,049,128.00
6.403	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución monofasico de 6 circuitos de 3 hilos, 125V, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$202,632.00	$ 405,264.00	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	2.00	$ 405,264	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 405,264.00
6.5	**BREAKERS**				**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ 4,831,726.00**		**$ -**	0.00	$ -							
6.501	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x15A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	32.00	$19,783.00	$ 633,056.00	32.00	$ 633,056	32.00	$ 633,056	32.00	$ 633,056	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.502	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo enchufable de 1x20A 10KA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	62.00	$23,881.00	$ 1,480,622.00	62.00	$ 1,480,622	62.00	$ 1,480,622	62.00	$ 1,480,622	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.503	Suministro, transporte e instalacion Breaker tipo industrial de 3x40A 25kA, incluye accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$339,756.00	$ 2,718,048.00	8.00	$ 2,718,048	8.00	$ 2,718,048	8.00	$ 2,718,048	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.6	**TABLEROS GENERALES**				**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**		**$ 21,273,669.00**	0.00	$ -							
6.601	Suministro, transporte e instalación de gabinetes metálicos construidos en lámina Cold Rolled calibre No16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidaciónly lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno de los siguientestableros segun el diagrama unifilar:		0.00	$0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
6.602	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-GEN con totalizador general de 3X500A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x200A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kACaracterísticas DPS clase I Tablero general (Protección contra rayos)Corriente de descarga =12,5 kACorriente de impulso 50kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =2,5kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KAUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..4 reservasUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$8,530,780.00	$ 8,530,780.00	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	1.00	$ 8,530,780	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 8,530,780.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901961496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.603	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución CD-PLANTA con totalizador general de 3X200A, TERMICO AJUSTABLE 0,8-1In 25kA1 breaker tipo industrial de 3x100A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x80A 25kA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KACaracterísticas DPS clase II Tableros de distribución (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 10kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,8 kV3 X DPS con Uc =132Vac1 X DPS con Uc =132VacCorriente interna admisible de cortocircuito: 25 KA4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$6,426,674.00	$ 6,426,674.00	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	1.00	$ 6,426,674	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 6,426,674.00
6.604	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado CD-REG dos totalizadores entrada y salida UPS, de 3X100A, 25kA, TIPO INDUSTRIAL 4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 breaker tipo industrial de 3x30A 25kAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Un control de transferencia manual de 125A Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.4 reservasUn sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..Características DPS clase II Tableros regulados (Protección contra sobre tensiones)Capacidad de derivación 1,5kATensión máxima de operación continua =132VacNivel de protección =1,5 kV3 X DPS con Uc 132V1 X DPS con Uc 120V, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$3,672,406.00	$ 3,672,406.00	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	1.00	$ 3,672,406	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,672,406.00
6.605	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución IP65, T-BOMBAS con totalizador generalTIPO INDUSTRIAL de 3X80A, 25KA4 breaker tipo industrial de 3x40A 25kA1 Breaker tipo RIEL de 1x30A 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico	UN	1.00	$2,643,809.00	$ 2,643,809.00	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	1.00	$ 2,643,809	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,643,809.00
6.7	**TABLEROS REGULADOS**				**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**		**$ 7,167,059.00**	0.00	$ -							
6.701	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-1 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 9 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico9 reservas	UN	1.00	$1,659,125.00	$ 1,659,125.00	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	1.00	$ 1,659,125	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,659,125.00
6.702	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-2 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,747,551.00
6.703	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-3 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 10 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico8 reservas	UN	1.00	$1,747,551.00	$ 1,747,551.00	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	1.00	$ 1,747,551	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 1,747,551.00
6.704	Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado TR-4 totalizadorde 3X40A, 25kA, TIPO RIEL 13 breaker tipo riel de 1x20A, 10KAUn barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico5 reservas	UN	1.00	$2,012,832.00	$ 2,012,832.00	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	1.00	$ 2,012,832	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,012,832.00
6.8	**CANALETA**				**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**		**$ 25,186,700.00**	0.00	$ -							
6.801	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todoslos elementos de fijacion y cable desnudo No 10 todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	350.00	$71,962.00	$ 25,186,700.00	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	350.00	$ 25,186,700	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	350.0	$ 25,186,700.00
6.9	**DUCTO PORTACABLES CERRADO**				**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**		**$ 28,523,340.00**	0.00	$ -							
6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	150.00	$158,463.00	$ 23,769,450.00	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	150.00	$ 23,769,450	0.00	$ -	32.40	$ 5,134,201	32.40	$ 5,134,201	22%	117.6	$ 18,635,248.80
6.902	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , sin division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para circuitos alimentadores , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	30.00	$158,463.00	$ 4,753,890.00	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	30.00	$ 4,753,890	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 4,753,890.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

		OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
6.10	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**				**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**		**$ 21,678,431.00**	0.00	$ -							
6.101	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA CD-GENERAL Malla de puesta a tierra para el CD-GEN, independiente según ART 15 RETIE, incluyendo 4 varillas de cobrede 5/8" x 2.44 m, 50m de conductor de cobre desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell	UN	1.00	$21,678,431.00	$ 21,678,431.00	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431	1.00	$ 21,678,431.00		$ -	1.00	$ 21,678,431	100%	0.0	$ -
6.11	**SISTEMA DE PARARRAYOS**				**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**		**$ 26,932,187.00**	0.00	$ -							
6.111	Tendido de tubería Ø 3/4" IMC, desde la cubierta hasta el terreno. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	80.00	$41,672.00	$ 3,333,760.00	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	80.00	$ 3,333,760	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	80.0	$ 3,333,760.00
6.112	Tendido de conductor de cobre THHN # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	100.00	$61,586.00	$ 6,158,600.00	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	100.00	$ 6,158,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	100.0	$ 6,158,600.00
6.113	Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	120.00	$9,954.00	$ 1,194,480.00	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	120.00	$ 1,194,480	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.0	$ 1,194,480.00
6.114	Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 " . Abrazadera para fijación de cable, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	11.00	$127,694.00	$ 1,404,634.00	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	11.00	$ 1,404,634	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 1,404,634.00
6.115	Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparacion del terreno, canalizacion, y soldaduras tipo cadwell, y todoslos acccesorios y todos	ML	120.00	$88,561.00	$ 10,627,320.00	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	120.00	$ 10,627,320	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.0	$ 10,627,320.00
6.116	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector. Incluye suministro, instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$442,577.00	$ 2,212,885.00	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	5.00	$ 2,212,885	2.00	$ 885,154.00		$ -	2.00	$ 885,154	40%	3.0	$ 1,327,731.00
6.117	Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$291,103.00	$ 1,455,515.00	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	5.00	$ 1,455,515	2.00	$ 582,206.00		$ -	2.00	$ 582,206	40%	3.0	$ 873,309.00
6.118	Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8" x 8' . Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$331,825.00	$ 331,825.00	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825	1.00	$ 331,825.00		$ -	1.00	$ 331,825	100%	0.0	$ -
6.119	Via de chispas de separacion para interconectar la puesta a tierra del pararrayos y la puesta a tierra del sistema electrico	UN	1.00	$48,035.00	$ 48,035.00	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	1.00	$ 48,035	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 48,035.00
6.120	Suministro un barraje de 5mm x 50mm x 400mm, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, las conexiones al barraje serán con conectores certificados de compresión de dos huecos o soldadura exotérmica, y debe ser aislada de su soporte por lo menos 50mm. Incluye suministro, instalación, acccesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$165,133.00	$ 165,133.00	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	1.00	$ 165,133	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 165,133.00
6.12	**CANALIZACIONES**				**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**		**$ 1,281,520.00**	0.00	$ -							
6.121	Canalización subterránea en dos (2) ductos de P.V.C. DB de 3" con excavación rellenos y compactación, según norma del operador de red, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	ML	20.00	$64,076.00	$ 1,281,520.00	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	20.00	$ 1,281,520	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 1,281,520.00
6.13	**REGATAS**				**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**		**$ 4,977,000.00**	0.00	$ -							
6.131	Construccion de regatas. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	ML	600.00	$8,295.00	$ 4,977,000.00	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	600.00	$ 4,977,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	600.0	$ 4,977,000.00
6.14	**CERTIFICACION RETIE Y DERECHOS DE CONEXIÓN**				**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**		**$ 22,481,370.00**	0.00	$ -							
6.141	Certificacion RETIE y RETILAP	UN	1.00	$15,736,959.00	$ 15,736,959.00	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	1.00	$ 15,736,959	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 15,736,959.00
6.142	Derechos de conexión ante el operador de red	UN	1.00	$6,744,411.00	$ 6,744,411.00	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	1.00	$ 6,744,411	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 6,744,411.00
7	**RED CONTRA INCENDIO**													0.00	$ -							
7.1	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**				**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 56,575,895.00**		**$ 61,878,679.00**	0.00	$ -							
7.101	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19.00	$149,026.00	$ 2,831,494.00	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	19.00	$ 2,831,494	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 2,831,494.00
7.102	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16.00	$119,133.00	$ 1,906,128.00	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	16.00	$ 1,906,128	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 1,906,128.00
7.103	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2.1/2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	2.00	$130,345.00	$ 260,690.00	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	2.00	$ 260,690	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 260,690.00
7.104	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$90,252.00	$ 90,252.00	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 90,252.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.105	TUBERIA ACERO SCH 40 ASTM A 53 DE 2" . Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	6.00	$73,527.00	$ 441,162.00	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	6.00	$ 441,162	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 441,162.00
7.106	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$54,288.00	$ 325,728.00	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	6.00	$ 325,728	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 325,728.00
7.107	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$27,417.00	$ 109,668.00	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	4.00	$ 109,668	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 109,668.00
7.108	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 3/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$5,456.00	$ 10,912.00	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	2.00	$ 10,912	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 10,912.00
7.109	TUBERIA ACERO GALVANIZADO DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	18.00	$27,417.00	$ 493,506.00	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	18.00	$ 493,506	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 493,506.00
7.110	ACCESORIOS ROSCADOS ASME B.16.3 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$5,456.00	$ 54,560.00	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	10.00	$ 54,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 54,560.00
7.111	TUBERIA CU TL ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	16.00	$59,047.00	$ 944,752.00	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	16.00	$ 944,752	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 944,752.00
7.112	ACCESORIOS CU TK ASTM B 88 DE 1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	11.00	$13,761.00	$ 151,371.00	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	11.00	$ 151,371	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 151,371.00
7.113	VALVULA OS&Y 3" LISTADA UL CON SUPERVISIÓN. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,098,176.00	$ 8,392,704.00	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	4.00	$ 8,392,704	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 8,392,704.00
7.114	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$799,708.00	$ 1,599,416.00	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	2.00	$ 1,599,416	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,599,416.00
7.115	VALVULA CHEQUE LISTADA UL 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$623,369.00	$ 623,369.00	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	1.00	$ 623,369	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 623,369.00
7.116	VALVULA CHEQUE BRONCE DE CORTINA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$311,751.00	$ 311,751.00	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	1.00	$ 311,751	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 311,751.00
7.117	VALVULA BRONCE DE ALIVIO 3/4" x 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$470,365.00	$ 470,365.00	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	1.00	$ 470,365	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 470,365.00
7.118	JUNTA ACERO INOXIDABLE 3" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,891,306.00	$ 3,782,612.00	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	2.00	$ 3,782,612	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 3,782,612.00
7.119	JUNTA ACERO INOXIDABLE 2" UNION BRIDA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$1,162,967.00	$ 2,325,934.00	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	2.00	$ 2,325,934	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,325,934.00
7.120	CHEQUE PERFORADO (3/32") DE CORTINA 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$93,178.00	$ 372,712.00	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	4.00	$ 372,712	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 372,712.00
7.121	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 2" PARA 200 PSI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$660,559.00	$ 1,321,118.00	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	2.00	$ 1,321,118	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 1,321,118.00
7.122	COPA EXCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$777,215.00	$ 777,215.00	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	1.00	$ 777,215	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 777,215.00
7.123	COPA CONCENTRICA 3"x2.1/2" HF (SEGÚN BOMBA). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$741,888.00	$ 741,888.00	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	1.00	$ 741,888	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 741,888.00
7.124	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$16,380.00	$ 81,900.00	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	5.00	$ 81,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 81,900.00
7.125	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST	UN	1.00	$16,380.00	$ 16,380.00	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	1.00	$ 16,380	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 16,380.00
7.126	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$15,527.00	$ 15,527.00	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	1.00	$ 15,527	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 15,527.00
7.127	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 3/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$14,066.00	$ 28,132.00	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	2.00	$ 28,132	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 28,132.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT: 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

OBRA: OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.128	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZINCADA Y CHAZO EXPANSIVO). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$13,747.00	$ 164,964.00	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	12.00	$ 164,964	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 164,964.00
7.129	PINTURA ANTICORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 349,581.00
7.130	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 36,798.00
7.131	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$16,760.00	$ 100,560.00	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	6.00	$ 100,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 100,560.00
7.132	PINTURA ANTICORROSIVA 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$15,420.00	$ 61,680.00	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	4.00	$ 61,680	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 61,680.00
7.133	PINTURA ANTICORROSIVA 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$15,239.00	$ 518,126.00	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	34.00	$ 518,126	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 518,126.00
7.134	PINTURA ESMALTE ROJO 3" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	19.00	$18,399.00	$ 349,581.00	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	19.00	$ 349,581	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	19.0	$ 349,581.00
7.135	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	2.00	$18,399.00	$ 36,798.00	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	2.00	$ 36,798	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 36,798.00
7.136	PINTURA ESMALTE ROJO 2" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	6.00	$17,796.00	$ 106,776.00	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	6.00	$ 106,776	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 106,776.00
7.137	PINTURA ESMALTE ROJO 3/4" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	4.00	$12,848.00	$ 51,392.00	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	4.00	$ 51,392	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 51,392.00
7.138	PINTURA ESMALTE ROJO 1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$12,848.00	$ 436,832.00	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	34.00	$ 436,832	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 436,832.00
7.139	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 3" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$183,901.00	$ 735,604.00	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	4.00	$ 735,604	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 735,604.00
7.140	BRIDA ACERO ANSI B 16.5 PARA 150 PSI 2" RANURADA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$151,416.00	$ 605,664.00	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	4.00	$ 605,664	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 605,664.00
7.141	SIAMESA BRONCE 4" X 2.1/2" X 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,735,972.00	$ 2,735,972.00	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	1.00	$ 2,735,972	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,735,972.00
7.142	VALVULA CHEQUE LISTADA UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$905,651.00	$ 905,651.00	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	1.00	$ 905,651	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 905,651.00
7.143	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$2,190,674.00	$ 6,572,022.00	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	3.00	$ 6,572,022	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 6,572,022.00
7.144	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$1,643,006.00	$ 4,929,018.00	3.00	$ 4,929,018	3.00	$ 4,929,018	3.00	$ 4,929,018	6.00	$ 9,858,036	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 9,858,036.00
7.145	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 3/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$422,774.00	$ 422,774.00	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	1.00	$ 422,774	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 422,774.00
7.146	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE DE 1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$373,766.00	$ 373,766.00	1.00	$ 373,766	1.00	$ 373,766	1.00	$ 373,766	2.00	$ 747,532	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 747,532.00
7.147	DESFOGUE MOTOR DIESEL ACERO ø4"	ML	18.00	$339,160.00	$ 6,104,880.00	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	18.00	$ 6,104,880	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.0	$ 6,104,880.00
7.148	RECUBRIMIENTO DESFOGUE MOTOR DIESEL EN FRIBRA DE VIDRIO, FORRADO CON LIENCILLO	ML	10.00	$147,421.00	$ 1,474,210.00	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	10.00	$ 1,474,210	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,474,210.00
7.149	LÁMINA DE ALUMINIO PARA DESFOGUE MOTOR DIESEL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	10.00	$102,200.00	$ 1,022,000.00	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	10.00	$ 1,022,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.0	$ 1,022,000.00
7.2	**RED INTERNA**				**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**		**$ 219,911,154.00**	0.00	$ -							
7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	68.00	$236,030.00	$ 16,050,040.00	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	68.00	$ 16,050,040	0.00	$ -	5.90	$ 1,392,577	5.90	$ 1,392,577	9%	62.1	$ 14,657,463.00
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	65.00	$158,845.00	$ 10,324,925.00	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	65.00	$ 10,324,925	0.00	$ -	13.00	$ 2,064,985	13.00	$ 2,064,985	20%	52.0	$ 8,259,940.00
7.203	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	34.00	$149,026.00	$ 5,066,884.00	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	34.00	$ 5,066,884	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 5,066,884.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.204	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14.00	$119,133.00	$ 1,667,862.00	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	14.00	$ 1,667,862	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 1,667,862.00
7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	122.00	$130,345.00	$ 15,902,090.00	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	122.00	$ 15,902,090	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	122.0	$ 15,902,090.00
7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	145.00	$90,252.00	$ 13,086,540.00	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	0.00	$ -	145.00	$ 13,086,540	145.00	$ 13,086,540	100%	0.0	$ -
7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	70.00	$130,345.00	$ 9,124,150.00	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	70.00	$ 9,124,150	0.00	$ -	36.85	$ 4,803,213	36.85	$ 4,803,213	53%	33.2	$ 4,320,936.75
7.208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	57.00	$90,252.00	$ 5,144,364.00	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	57.00	$ 5,144,364	0.00	$ -	1.00	$ 90,252	1.00	$ 90,252	2%	56.0	$ 5,054,112.00
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	128.00	$67,490.00	$ 8,638,720.00	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	128.00	$ 8,638,720	0.00	$ -	9.73	$ 656,678	9.73	$ 656,678	8%	118.3	$ 7,982,042.30
7.210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	160.00	$35,054.00	$ 5,608,640.00	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	160.00	$ 5,608,640	0.00	$ -	55.00	$ 1,927,970	55.00	$ 1,927,970	34%	105.0	$ 3,680,670.00
7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	98.00	$49,396.00	$ 4,840,808.00	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	98.00	$ 4,840,808	0.00	$ -	19.54	$ 965,198	19.54	$ 965,198	20%	78.5	$ 3,875,610.16
7.212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	152.00	$29,038.00	$ 4,413,776.00	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	152.00	$ 4,413,776	0.00	$ -	89.00	$ 2,584,382	89.00	$ 2,584,382	59%	63.0	$ 1,829,394.00
7.213	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	232.00	$35,678.00	$ 8,277,296.00	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	232.00	$ 8,277,296	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.0	$ 8,277,296.00
7.214	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	208.00	$25,857.00	$ 5,378,256.00	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	208.00	$ 5,378,256	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	208.0	$ 5,378,256.00
7.215	VALVULA MARIPOSA LISTADA UL CON SUPERVISIÓN E INDICADOR DE POSICIÓN 2.1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$892,849.00	$ 3,571,396.00	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	4.00	$ 3,571,396	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,571,396.00
7.216	VALVULA RISER CHECK + TRIM LISTADA UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,574,865.00	$ 10,299,460.00	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	4.00	$ 10,299,460	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 10,299,460.00
7.217	SENSOR DE FLUJO PARA TUBERIA DE ACERO DE 2.1/2". LISTADO UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$771,305.00	$ 3,085,220.00	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	4.00	$ 3,085,220	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,085,220.00
7.218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$2,027,455.00	$ 8,109,820.00	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	4.00	$ 8,109,820	0.00	$ -	1.90	$ 3,852,165	1.90	$ 3,852,165	48%	2.1	$ 4,257,655.50
7.219	VALVULA de ANGULO 2,1/2". ENTRADA ROSCA HEMBRA NPT, SALIDA ROSCA MACHO NH, BRONCE PARA 300 PSI, BRONCE LISTADA UL. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8.00	$814,437.00	$ 6,515,496.00	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	8.00	$ 6,515,496	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.0	$ 6,515,496.00
7.220	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN PENDIENTE O MONTANTE. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	182.00	$85,679.00	$ 15,593,578.00	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	182.00	$ 15,593,578	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	182.0	$ 15,593,578.00
7.221	REGADERA ESTANDAR 1/2 LISTADA UL, K=5.6 RESPUESTA RAPIDA ORIENTACIÓN LATERAL. TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN 68°C. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	5.00	$106,209.00	$ 531,045.00	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	5.00	$ 531,045	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 531,045.00
7.222	PUNTO ROCIADOR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	187.00	$86,806.00	$ 16,232,722.00	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	187.00	$ 16,232,722	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	187.0	$ 16,232,722.00
7.223	VALVULA DE ANGULO DE BRONCE PARA DRENAJE 1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00	$580,383.00	$ 2,321,532.00	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	4.00	$ 2,321,532	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 2,321,532.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.224	VALVULA BOLA DE BRONCE PARA 200 PSI EN 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$624,533.00	$ 1,873,599.00	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	3.00	$ 1,873,599	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,873,599.00
7.225	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y	UN	3.00	$859,206.00	$ 2,577,618.00	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	3.00	$ 2,577,618	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 2,577,618.00
7.226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	23.00	$16,618.00	$ 382,214.00	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	23.00	$ 382,214	0.00	$ -	4.00	$ 66,472	4.00	$ 66,472	17%	19.0	$ 315,742.00
7.227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	41.00	$16,380.00	$ 671,580.00	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	41.00	$ 671,580	0.00	$ -	36.00	$ 589,680	36.00	$ 589,680	88%	5.0	$ 81,900.00
7.228	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	24.00	$15,527.00	$ 372,648.00	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	24.00	$ 372,648	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 372,648.00
7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	43.00	$14,377.00	$ 618,211.00	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	43.00	$ 618,211	0.00	$ -	29.00	$ 416,933	29.00	$ 416,933	67%	14.0	$ 201,278.00
7.230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	59.00	$14,268.00	$ 841,812.00	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	59.00	$ 841,812	0.00	$ -	20.00	$ 285,360	20.00	$ 285,360	34%	39.0	$ 556,452.00
7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	134.00	$14,066.00	$ 1,884,844.00	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	134.00	$ 1,884,844	0.00	$ -	10.00	$ 140,660	10.00	$ 140,660	7%	124.0	$ 1,744,184.00
7.232	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00	$131,443.00	$ 262,886.00	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	2.00	$ 262,886	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 262,886.00
7.233	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3.00	$129,785.00	$ 389,355.00	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	3.00	$ 389,355	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 389,355.00
7.234	SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	9.00	$131,443.00	$ 1,182,987.00	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	9.00	$ 1,182,987	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.0	$ 1,182,987.00
7.235	SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL UL DE 2,1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	12.00	$129,785.00	$ 1,557,420.00	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	12.00	$ 1,557,420	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 1,557,420.00
7.236	SOPORTE SISMORESISTENTE 4 VIAS UL DE 4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6.00	$197,165.00	$ 1,182,990.00	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	6.00	$ 1,182,990	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 1,182,990.00
7.237	PINTURA ANTICCORROSIVA 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.0	$ 1,343,748.00
7.238	PINTURA ANTICCORROSIVA 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 625,566.00
7.239	PINTURA ANTICORROSIVA 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.0	$ 2,667,855.00
7.240	PINTURA ANTICORROSIVA 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.0	$ 1,245,720.00
7.241	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	160.0	$ 2,681,600.00
7.242	PINTURA ANTICORROSIVA 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.0	$ 1,618,960.00
7.243	PINTURA ANTICORROSIVA 1". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.0	$ 2,980,736.00
7.244	PINTURA ESMALTE ROJO 4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	68.00	$19,761.00	$ 1,343,748.00	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	68.00	$ 1,343,748	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	68.0	$ 1,343,748.00
7.245	PINTURA ESMALTE ROJO 3". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	34.00	$18,399.00	$ 625,566.00	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	34.00	$ 625,566	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	34.0	$ 625,566.00
7.246	PINTURA ESMALTE ROJO 2.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	145.00	$18,399.00	$ 2,667,855.00	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	145.00	$ 2,667,855	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	145.0	$ 2,667,855.00
7.247	PINTURA ESMALTE ROJO 2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	70.00	$17,796.00	$ 1,245,720.00	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	70.00	$ 1,245,720	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	70.0	$ 1,245,720.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
7.248	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/2". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	160.00	$16,760.00	$ 2,681,600.00	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	160.00	$ 2,681,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	160.0	$ 2,681,600.00
7.249	PINTURA ESMALTE ROJO 1.1/4". Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	98.00	$16,520.00	$ 1,618,960.00	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	98.00	$ 1,618,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	98.0	$ 1,618,960.00
7.250	PINTURA ESMALTE ROJO 1" . Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ML	232.00	$12,848.00	$ 2,980,736.00	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	232.00	$ 2,980,736	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	232.0	$ 2,980,736.00
7.3	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				**$ 14,016,777.00**		**$ 14,016,777.00**		**$ 14,016,777.00**		**$ 7,520,516.00**		**$ 7,520,516.00**	0.00	$ -							
7.301	MANUAL DE MANTENIMIENTO	UN	1.00	$519,253.00	$ 519,253.00	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	1.00	$ 519,253	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 519,253.00
7.302	PLANOS RECORD DE OBRA	UN	11.00	$340,236.00	$ 3,742,596.00	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	11.00	$ 3,742,596	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 3,742,596.00
7.303	GABINETE PARA ROCIADORES DE RESERVA. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$456,993.00	$ 456,993.00	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	1.00	$ 456,993	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 456,993.00
7.304	PRUEBAS	GL	1.00	$720,286.00	$ 720,286.00	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	1.00	$ 720,286	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 720,286.00
7.305	EXTINTOR PQS 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10.00	$217,967.00	$ 2,179,670.00	10.00	$ 2,179,670	10.00	$ 2,179,670	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.306	EXTINTOR CO2 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$1,967,733.00	$ 1,967,733.00	1.00	$ 1,967,733	1.00	$ 1,967,733	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.307	EXTINTOR AFFF 40B. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$2,164,506.00	$ 2,164,506.00	1.00	$ 2,164,506	1.00	$ 2,164,506	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.308	EXTINTOR H2O 20 LB. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1.00	$184,352.00	$ 184,352.00	1.00	$ 184,352	1.00	$ 184,352	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
7.309	CÁRCAMO PROTECCIÓN TUBERÍAS RCI. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	4.00	$520,347.00	$ 2,081,388.00	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	4.00	$ 2,081,388	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 2,081,388.00
8	**MAMPOSTERIA**				**$ 223,584,269.44**		**$ 223,584,269.44**		**$ 223,584,269.44**		**$ 204,843,412.22**		**$ 204,843,412.22**	0.00	$ -							
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	445.82	$63,838.00	$ 28,460,257.16	445.82	$ 28,460,257	445.82	$ 28,460,257	573.00	$ 36,579,174	573.00	$ 36,579,174	0.00	$ -	136.74	$ 8,729,208	136.74	$ 8,729,208	24%	436.3	$ 27,849,965.88
8.2	Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (ml). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	115.00	$41,800.00	$ 4,807,000.00	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	115.00	$ 4,807,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	115.0	$ 4,807,000.00
8.3	Dinteles en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	591.30	$39,964.00	$ 23,630,713.20	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	591.30	$ 23,630,713	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	591.3	$ 23,630,713.20
8.4	Bordillos concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	278.61	$37,028.00	$ 10,316,371.08	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	278.61	$ 10,316,371	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	278.6	$ 10,316,371.08
8.5	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	3388.00	$5,889.00	$ 19,951,932.00	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	3388.00	$ 19,951,932	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3388.0	$ 19,951,932.00
8.6	Ensayos (Morteros, muretes, ladrillo, bloque, acero, elementos no estructurales)	un	1.00	$7,308,265.00	$ 7,308,265.00	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	1.00	$ 7,308,265	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 7,308,265.00
8.7	Enchape ladrillo borde placa H=0.40m Gran Formato. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	60.00	$160,349.00	$ 9,620,940.00	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	60.00	$ 9,620,940	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	60.0	$ 9,620,940.00
8.8	Grafil 4.0 mm. Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	1445.00	$5,810.00	$ 8,395,450.00	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	1445.00	$ 8,395,450	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1445.0	$ 8,395,450.00
8.9	Muro en concreto 28 Mpa (4000 psi) no estructural fundido en sitio. Incluye refuerzo y anclaje y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m3	4.00	$1,712,454.00	$ 6,849,816.00	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	4.00	$ 6,849,816	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 6,849,816.00
8.10	Muro en Ladrillo en gran formato (ml). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	162.00	$118,323.00	$ 19,168,326.00	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	162.00	$ 19,168,326	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	162.0	$ 19,168,326.00
8.11	Muro bloque Cemento gris 12x19x39cm tipo "Decoblock bloque liso divisorio de 9cm" o similar, incluye refuerzo y anclaje según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	325.98	$82,397.00	$ 26,859,774.06	325.98	$ 26,859,774	325.98	$ 26,859,774		$ -		$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
8.12	Enchape Ladrillo Gran Formato - m2. Incluye angulos y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	71.05	$201,472.00	$ 14,314,585.60	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	71.05	$ 14,314,586	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	71.1	$ 14,314,585.60
8.13	Muro en Ladrillo Gran Formato (M2). Muro en mamposteria a la vista de arcilla de fachada extruida gran formato tipo "santafe" ladrillo gran formato cobrizo 39cmx11cmx5cmo similar. Incluye anclajes según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	82.14	$191,931.00	$ 15,765,212.34	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	82.14	$ 15,765,212	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	82.1	$ 15,765,212.34
8.14	Dovelas en Grouting. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1216.00	$15,329.00	$ 18,640,064.00	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	1216.00	$ 18,640,064	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1216.0	$ 18,640,064.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
8.15	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	869.00	$10,927.00	$ 9,495,563.00	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	869.00	$ 9,495,563	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	869.0	$ 9,495,563.00
9	**CUBIERTA**				**$ 271,920,299.30**		**$ 271,920,299.30**		**$ 271,920,299.30**		**$ 253,267,965.29**		**$ 253,267,965.29**	0.00	$ -							
9.1	Marquesina en cubierta policarbonato incluye Estructura. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	27.99	$574,040.00	$ 16,067,379.60	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	27.99	$ 16,067,380	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	28.0	$ 16,067,379.60
9.2	Canal metalica tipo amazonas. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	112.10	$179,980.00	$ 20,175,758.00	112.10	$ 20,175,758	112.10	$ 20,175,758	3.50	$ 629,930	3.50	$ 629,930	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.5	$ 629,930.00
9.3	Flanche metalico con pintura Electrostatica. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	139.02	$101,737.00	$ 14,143,477.74	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	139.02	$ 14,143,478	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	139.0	$ 14,143,477.74
9.4	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	250.20	$794,567.00	$ 198,800,663.40	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	250.20	$ 198,800,663	0.00	$ -	78.88	$ 62,675,445	78.88	$ 62,675,445	32%	171.3	$ 136,125,218.44
9.5	Media caña con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$13,243.00	$ 3,284,264.00	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	248.00	$ 3,284,264	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	248.0	$ 3,284,264.00
9.6	Regata con mortero. Incluye instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	248.00	$20,044.00	$ 4,970,912.00	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	248.00	$ 4,970,912	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	248.0	$ 4,970,912.00
9.7	Bordillo fundido en sitio - Cubierta en concreto 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes	ml	23.72	$29,398.00	$ 697,320.56	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	23.72	$ 697,321	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	23.7	$ 697,320.56
9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$76,959.00	$ 10,158,588.00	132.00	$ 10,158,588	132.00	$ 10,158,588	143.61	$ 11,052,082	143.61	$ 11,052,082	0.00	$ -	113.27	$ 8,717,146	113.27	$ 8,717,146	79%	30.3	$ 2,334,936.06
9.9	Gancho Anclajes certificados. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	12.00	$301,828.00	$ 3,621,936.00	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	12.00	$ 3,621,936	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	12.0	$ 3,621,936.00
10	**PAÑETES, REVOQUES Y RESANES**				**$ 193,001,244.53**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**		**$ 151,760,585.33**	0.00	$ -							
10.1	Filos y Dilataciones en pañete Fachada	ml	246.43	$9,120.00	$ 2,247,441.60	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	246.43	$ 2,247,442	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	246.4	$ 2,247,441.60
10.2	Pañete borde placa h=0.50. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	436.21	$27,073.00	$ 11,809,513.33	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	436.21	$ 11,809,513	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	436.2	$ 11,809,513.33
10.3	Pañete Muros de fachada (m2). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	283.25	$41,239.00	$ 11,680,946.75	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	283.25	$ 11,680,947	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	283.3	$ 11,680,946.75
10.4	Pañete Muros de fachada (ml). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	192.90	$30,096.00	$ 5,805,518.40	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	192.90	$ 5,805,518	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	192.9	$ 5,805,518.40
10.5	Pañete Bajo Escalera. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	40.60	$39,030.00	$ 1,584,618.00	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	40.60	$ 1,584,618	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.6	$ 1,584,618.00
10.6	Repello Interior Tanque. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	51.04	$26,340.00	$ 1,344,393.60	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	51.04	$ 1,344,394	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	51.0	$ 1,344,393.60
10.7	Filos y Dilataciones en Revoque/pañete Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	1137.95	$7,216.00	$ 8,211,476.07	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	1137.95	$ 8,211,476	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1138.0	$ 8,211,476.07
10.8	Pañete/Revoque Muros - Impermeable Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	49.62	$45,547.00	$ 2,260,042.14	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	49.62	$ 2,260,042	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.6	$ 2,260,042.14
10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	2479.16	$39,038.00	$ 96,781,448.08	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	2479.16	$ 96,781,448	192.55	$ 7,516,766.90	85.56	$ 3,340,091	278.11	$ 10,856,858	11%	2201.1	$ 85,924,589.90
10.10	Pañete/Revoque Muros (ml) Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	337.76	$29,711.00	$ 10,035,187.36	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	337.76	$ 10,035,187	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	337.8	$ 10,035,187.36
10.11	Pañete bajo placa. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1056.64	$39,030.00	$ 41,240,659.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
11	**ENCHAPES CERAMICOS Y PORCELANATO**				**$ 119,658,065.82**		**$ 119,658,065.82**		**$ 119,658,065.82**		**$ 146,366,417.51**		**$ 146,366,417.51**	0.00	$ -							
11.1	Enchape Muros en Porcelanato de 30x60cm, incluye pega, boquilla y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.66	$189,616.00	$ 15,294,426.56	80.66	$ 15,294,427	80.66	$ 15,294,427	218.73	$ 41,474,708	218.73	$ 41,474,708	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	218.7	$ 41,474,707.68
11.2	Piso en marmol Royal veta 20mm, instalado según despiece de planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	93.05	$234,479.00	$ 21,818,270.95	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	93.05	$ 21,818,271	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	93.1	$ 21,818,270.95
11.3	Piso Terrazo grano de marmol fundido en sitio, destroncado, pulido y brillado, espesor 30mm, con dilatadores en bronce. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	324.62	$237,838.00	$ 77,206,971.56	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	324.62	$ 77,206,972	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	324.6	$ 77,206,971.56
11.4	Guardaescoba Marmol royal veta 20x70mm acabado pulido sobre puesto en muro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	38.59	$44,413.00	$ 1,713,897.67	38.59	$ 1,713,898	38.59	$ 1,713,898	50.48	$ 2,241,968	50.48	$ 2,241,968	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	50.5	$ 2,241,968.24

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
11.5	Mediacaña Granito fundido en sitio, pulida y brillada. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	84.06	$43,118.00	$ 3,624,499.08	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	84.06	$ 3,624,499	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	84.1	$ 3,624,499.08
12	**PISOS**				**$ 204,736,415.10**		**$ 204,736,415.10**		**$ 204,736,415.10**		**$ 153,747,565.84**		**$ 153,747,565.84**	0.00	$ -							
12.1	Afinado pisos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	1097.88	$56,266.00	$ 61,773,316.08	1097.88	$ 61,773,316	1097.88	$ 61,773,316	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
12.2	Afinado Tanque con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	58.46	$56,266.00	$ 3,289,310.36	58.46	$ 3,289,310	58.46	$ 3,289,310	25.01	$ 1,407,213	25.01	$ 1,407,213	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 1,407,212.66
12.3	Afinado escalera Descansos con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.77	$56,266.00	$ 1,056,112.82	18.77	$ 1,056,113	18.77	$ 1,056,113	124.08	$ 6,981,485	124.08	$ 6,981,485	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	124.1	$ 6,981,485.28
12.4	Afinado paso escalera con mortero seco. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	28.56	$22,226.00	$ 634,774.56	28.56	$ 634,775	28.56	$ 634,775	137.92	$ 3,065,410	137.92	$ 3,065,410	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	137.9	$ 3,065,409.92
12.5	Piso Vinilo de 2mm de espesor, referencia "Imparck Pixel clear". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	736.54	$148,091.00	$ 109,074,945.14	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	736.54	$ 109,074,945	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	736.5	$ 109,074,945.14
12.6	Concreto 21 Mpa (3000 psi) endurecido pisos, pulido, esmaltado y brillado. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, malla electrosoldada, retiro y disposición de los sobrantes, y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	257.71	$101,530.00	$ 26,165,296.30	257.71	$ 26,165,296	257.71	$ 26,165,296	190.58	$ 19,349,587	190.58	$ 19,349,587	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	190.6	$ 19,349,587.40
12.7	Guardaescobas madera pieza en aglomerado MDF 70x10mm sellada con acabado en pintura esmalte color blanco mate instalada sobrepuesta en muro fijada con tornilleria oculta. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	108.56	$25,264.00	$ 2,742,659.84	108.56	$ 2,742,660	108.56	$ 2,742,660	548.96	$ 13,868,925	548.96	$ 13,868,925	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	549.0	$ 13,868,925.44
13	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 57,804,106.99**		**$ 57,804,106.99**		**$ 57,804,106.99**		**$ 71,713,791.83**		**$ 71,713,791.83**	0.00	$ -							
13.1	Impermeabilización Foso de Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	18.58	$115,256.00	$ 2,141,456.48	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	18.58	$ 2,141,456	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	18.6	$ 2,141,456.48
13.2	Impermeabilizacion piso/muro zonas humedas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	120.05	$41,652.00	$ 5,000,322.60	120.05	$ 5,000,323	120.05	$ 5,000,323	288.62	$ 12,021,600	288.62	$ 12,021,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	288.6	$ 12,021,600.24
13.3	Impermeabilizacion cubiertas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	132.00	$151,904.00	$ 20,051,328.00	132.00	$ 20,051,328	132.00	$ 20,051,328	148.95	$ 22,626,101	148.95	$ 22,626,101	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	149.0	$ 22,626,100.80
13.4	Impermeabilización Interior Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	109.50	$138,840.00	$ 15,202,980.00	109.50	$ 15,202,980	109.50	$ 15,202,980	133.23	$ 18,497,653	133.23	$ 18,497,653	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	133.2	$ 18,497,653.20
13.5	Impermeabilización Exterior Igol denso Tanque según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta	m2	51.04	$24,146.00	$ 1,232,411.84	51.04	$ 1,232,412	51.04	$ 1,232,412	93.24	$ 2,251,373	93.24	$ 2,251,373	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	93.2	$ 2,251,373.04
13.6	Impermeabilización Muros Ladrillo según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	146.53	$19,565.00	$ 2,866,859.45	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	146.53	$ 2,866,859	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	146.5	$ 2,866,859.45
13.7	Impermeabilizacion de Balcones y terrazas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	77.87	$145,226.00	$ 11,308,748.62	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	77.87	$ 11,308,749	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	77.9	$ 11,308,748.62
14	**CIELO RASOS Y PARTICIONES LIVIANAS**				**$ 246,349,058.40**		**$ 246,349,058.40**		**$ 246,349,058.40**		**$ 323,047,568.00**		**$ 256,329,364.49**	0.00	$ -							
14.1	Cielos rasos fibrocemento/superboard 6mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	162.81	$134,271.00	$ 21,860,661.51	162.81	$ 21,860,662	162.81	$ 21,860,662	90.62	$ 12,167,638	90.62	$ 12,167,638	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	90.6	$ 12,167,638.02
14.2	Dilatacion cielos Z. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	378.00	$14,324.00	$ 5,414,472.00	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	378.00	$ 5,414,472	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	378.0	$ 5,414,472.00
14.3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	293.27	$106,783.00	$ 31,316,250.41	293.27	$ 31,316,250	293.27	$ 31,316,250	1154.29	$ 123,258,549	1154.29	$ 123,258,549	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1154.3	$ 123,258,549.07
14.4	Tapas inspeccion cielo raso 20x20cm. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	16.00	$229,389.00	$ 3,670,224.00	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	16.00	$ 3,670,224	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 3,670,224.00
14.5	Dinteles Especiales en Estructura Metalica 0.10 x 0.32. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	85.00	$164,224.00	$ 13,959,040.00	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	85.00	$ 13,959,040	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	85.0	$ 13,959,040.00
14.6	tapas cielo rasos. Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	120.00	$36,182.00	$ 4,341,840.00	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	120.00	$ 4,341,840	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	120.0	$ 4,341,840.00
14.7	Muro Super board - fibrocemento dos cara 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	361.20	$157,143.00	$ 56,760,051.60	361.20	$ 56,760,052	361.20	$ 56,760,052	424.57	$ 66,718,204	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
14.8	Muro Super board - fibrocemento una cara 8mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	763.11	$112,781.00	$ 86,064,308.91	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	763.11	$ 86,064,309	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	763.1	$ 86,064,308.91
14.9	Cielo raso en yeso perforado 12,5mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	83.91	$184,828.00	$ 15,508,917.48	83.91	$ 15,508,917	83.91	$ 15,508,917	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
15.10	Superboad de fachada 10mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	47.43	$157,143.00	$ 7,453,292.49	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	47.43	$ 7,453,292	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	47.4	$ 7,453,292.49
15	**VENTANERIA Y VIDRIO**				**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**		**$ 519,867,712.69**	0.00	$ -							
15.1	Rejillas en aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	45.00	$498,647.00	$ 22,439,115.00	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	45.00	$ 22,439,115	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	45.0	$ 22,439,115.00
15.2	Ventaneria en vidrio en Aluminio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	264.30	$855,984.00	$ 226,236,571.20	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	264.30	$ 226,236,571	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	264.3	$ 226,236,571.20
15.3	Puertas Ventanas y puertas en Vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	74.94	$966,492.00	$ 72,428,910.48	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	74.94	$ 72,428,910	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	74.9	$ 72,428,910.48
15.4	Fachada vidrio Ascensor según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	100.09	$1,207,069.00	$ 120,815,536.21	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	100.09	$ 120,815,536	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	100.1	$ 120,815,536.21
15.5	Divisiones En vidrio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	80.65	$966,492.00	$ 77,947,579.80	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	80.65	$ 77,947,580	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	80.7	$ 77,947,579.80
16	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**		**$ 130,441,622.34**	0.00	$ -							
16.1	Pasamanos metalico según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	51.62	$152,266.00	$ 7,859,970.92	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	51.62	$ 7,859,971	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	51.6	$ 7,859,970.92
16.2	Baranda metalica Escalera según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	24.84	$327,782.00	$ 8,142,104.88	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	24.84	$ 8,142,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.8	$ 8,142,104.88
16.3	Escotilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	3.00	$370,765.00	$ 1,112,295.00	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	3.00	$ 1,112,295	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 1,112,295.00
16.4	Puertas de emergencia Cortafuego (0.9-1.2 X 2.4) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	11.00	$2,414,625.00	$ 26,560,875.00	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	11.00	$ 26,560,875	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 26,560,875.00
16.5	Puerta Metalicas Sencillas según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	22.00	$954,688.00	$ 21,003,136.00	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	22.00	$ 21,003,136	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	22.0	$ 21,003,136.00
16.6	Puerta Metalicas Doble hoja (1.10 - 2.55) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	und	14.00	$1,459,140.00	$ 20,427,960.00	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	14.00	$ 20,427,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 20,427,960.00
16.7	Puerta Metalica Emergencia Doble cortafuego según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$5,028,457.00	$ 5,028,457.00	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	1.00	$ 5,028,457	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 5,028,457.00
16.8	Puerta metalica Corrediza según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	4.00	$1,134,076.00	$ 4,536,304.00	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	4.00	$ 4,536,304	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 4,536,304.00
16.9	Puerta acceso Peatonal según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$3,325,247.00	$ 3,325,247.00	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	1.00	$ 3,325,247	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,325,247.00
16.10	Escalera Gato según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	2.00	$1,430,665.00	$ 2,861,330.00	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	2.00	$ 2,861,330	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.0	$ 2,861,330.00
16.11	Barandas terrazas/vacios según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	ml	9.78	$851,155.00	$ 8,324,295.90	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	9.78	$ 8,324,296	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9.8	$ 8,324,295.90
16.12	Fachadas metalicas/celosia según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	39.12	$543,447.00	$ 21,259,646.64	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	39.12	$ 21,259,647	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	39.1	$ 21,259,646.64
17	**CARPINTERIA MADERA**				**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**		**$ 11,866,063.00**	0.00	$ -							
17.1	Puerta sencilla en madera sencilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	11.00	$1,078,733.00	$ 11,866,063.00	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	11.00	$ 11,866,063	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 11,866,063.00
18	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 96,293,982.00**		**$ 96,293,982.00**		**$ 96,293,982.00**		**$ 81,669,637.00**		**$ 77,544,033.00**	0.00	$ -							
18.1	Rejilla piso -baño redonda 3" X 2" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	30.00	$15,230.00	$ 456,900.00	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	30.00	$ 456,900	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 456,900.00
18.2	Sanitario Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$995,321.00	$ 15,925,136.00	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	16.00	$ 15,925,136	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 15,925,136.00
18.3	Lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$735,934.00	$ 11,774,944.00	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	16.00	$ 11,774,944	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 11,774,944.00
18.4	Griferia lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	16.00	$332,857.00	$ 5,325,712.00	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	16.00	$ 5,325,712	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	16.0	$ 5,325,712.00
18.5	Meson Baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$803,180.00	$ 20,079,500.00	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	25.00	$ 20,079,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 20,079,500.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

OBRA: OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTA 003

CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
18.6	Rejilla ventilacion. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	6.00	$31,318.00	$ 187,908.00	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	6.00	$ 187,908	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 187,908.00
18.7	Sensor Lavamanos/Sanitario/Orinal. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	32.00	$587,755.00	$ 18,808,160.00	32.00	$ 18,808,160	32.00	$ 18,808,160	32.00	$ 18,808,160	35.00	$ 20,571,425	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	35.0	$ 20,571,425.00
18.8	Extractor baños. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5.00	$229,389.00	$ 1,146,945.00	5.00	$ 1,146,945	5.00	$ 1,146,945	5.00	$ 1,146,945	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.9	Orinal institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$793,811.00	$ 3,175,244.00	4.00	$ 3,175,244	4.00	$ 3,175,244	4.00	$ 3,175,244	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.10	Secador de manos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$550,512.00	$ 7,156,656.00	13.00	$ 7,156,656	13.00	$ 7,156,656	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.11	Barras de seguridad en L. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$391,670.00	$ 1,566,680.00	4.00	$ 1,566,680	4.00	$ 1,566,680	4.00	$ 1,566,680	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.12	Dispensador De Jabon. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$164,843.00	$ 2,142,959.00	13.00	$ 2,142,959	13.00	$ 2,142,959	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.13	Percha. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	15.00	$33,515.00	$ 502,725.00	15.00	$ 502,725	15.00	$ 502,725	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.14	Dispensador de papel higienico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	14.00	$174,843.00	$ 2,447,802.00	14.00	$ 2,447,802	14.00	$ 2,447,802	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.15	Dispensador de toallas de papel. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	13.00	$182,631.00	$ 2,374,203.00	13.00	$ 2,374,203	13.00	$ 2,374,203	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
18.16	Poceta de aseo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.00	$805,627.00	$ 3,222,508.00	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	4.00	$ 3,222,508	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 3,222,508.00
19	**COCINAS**				**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 5,885,880.60**		**$ 2,601,185.30**	0.00	$ -							
19.1	Meson cocina quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2.4	$ 2,601,185.30

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
19.2	Salpicadero en quarztone. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	2.38	$1,092,935.00	$ 2,601,185.30	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	2.38	$ 2,601,185	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
19.3	Griferia lavaplatos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$361,065.00	$ 361,065.00	1.00	$ 361,065	1.00	$ 361,065	1.00	$ 361,065	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
19.4	lavaplatos submontar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1.00	$322,445.00	$ 322,445.00	1.00	$ 322,445	1.00	$ 322,445	1.00	$ 322,445	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20	**OBRAS EXTERIORES**				**$ 142,537,851.00**		**$ 142,537,851.00**		**$ 142,537,851.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
20.1	Paisajismo	un	1.00	$64,093,890.00	$ 64,093,890.00	1.00	$ 64,093,890	1.00	$ 64,093,890	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.2	Obra de Urbanismo Externo	un	1.00	$48,292,509.00	$ 48,292,509.00	1.00	$ 48,292,509	1.00	$ 48,292,509	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.3	Bordillo en concreto 21 Mpa (3000 psi) fundido en sitio -Pisos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$29,398.00	$ 2,851,606.00	97.00	$ 2,851,606	97.00	$ 2,851,606	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.4	Andenes en Adoquin en Concreto 10cm x 8cm x 20cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	M2	135.00	$150,385.00	$ 20,301,975.00	135.00	$ 20,301,975	135.00	$ 20,301,975	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
20.5	Sardineles prefabricado bordillos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	ml	97.00	$72,143.00	$ 6,997,871.00	97.00	$ 6,997,871	97.00	$ 6,997,871	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
21	**EQUIPOS ESPECIALES**				**$ 481,589,895.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 408,995,346.00**		**$ 373,290,826.00**		**$ 373,290,826.00**	0.00	$ -							
21.1	Equipo Presion Agua potable según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$35,704,520.00	$ 35,704,520.00	1.00	$ 35,704,520	1.00	$ 35,704,520	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
21.2	Desmontaje y reinstalación de ascensor existente. Incluye el desmontaje cuidadoso del ascensor existente, compuesto por cabina, motor, rieles, puertas, contrapesos y demás componentes mecánicos y eléctricos. Se realizarán las labores de almacenamiento temporal en sitio o área designada, garantizando la integridad de los elementos. Posteriormente, se llevará a cabo la reinstalación en la misma ubicación, con ajuste y nivelación de rieles, conexión eléctrica, pruebas de funcionamiento y calibración del sistema, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad y operatividad del equipo.	un	1.00	$22,470,021.00	$ 22,470,021.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
21.3	Equipo Incendio según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$373,290,826.00	$ 373,290,826.00	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	1.00	$ 373,290,826	0.95	$ 354,626,284.70		$ -	0.95	$ 354,626,285	95%	0.1	$ 18,664,541.30
21.4	UPS 30 KVA 208-120V según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	un	1.00	$50,124,528.00	$ 50,124,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22	**ILUMINACION**				**$ 70,970,829.00**		**$ 70,970,829.00**		**$ 70,970,829.00**		**$ 45,160,179.00**		**$ 26,980,269.00**	0.00	$ -							
22.1	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL DE 60x60cm, 40W, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	173.00	$144,285.00	$ 24,961,305.00	173.00	$ 24,961,305	173.00	$ 24,961,305	173.00	$ 24,961,305	47.00	$ 6,781,395	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	47.0	$ 6,781,395.00
22.2	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED PANEL CIRCULAR DE 18W, color 4000K RD 18W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	120.00	$25,861.00	$ 3,103,320.00	120.00	$ 3,103,320	120.00	$ 3,103,320	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.3	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED HERMETICA DE SOBREPONER 40W, IP65, color 4000K (VER ESPECIFICACIONES TECNCIAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	43.00	$128,463.00	$ 5,523,909.00	43.00	$ 5,523,909	43.00	$ 5,523,909	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.4	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 100W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	3.00	$214,236.00	$ 642,708.00	3.00	$ 642,708	3.00	$ 642,708	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.5	Suministro, transporte e instalación de proyector LED 70W 120V. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$108,527.00	$ 434,108.00	4.00	$ 434,108	4.00	$ 434,108	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.6	Suministro, transporte e instalación de Luminaria APLIQUE DE PARED LED 7W, IP 65 para uso exterior, TIPO TORTUGA. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	4.00	$128,146.00	$ 512,584.00	4.00	$ 512,584	4.00	$ 512,584	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.7	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED 4W 120V.(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	109.00	$117,444.00	$ 12,801,396.00	109.00	$ 12,801,396	109.00	$ 12,801,396	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.8	Suministro, transporte e instalación de luminaria de EVACUACION Y EMERGENCIA , LED CON AVISO DE SALIDA LUMINOSO Fabricada por SYLVANIA REF: P33718 (VER ESPECIFICACIONES TECNCIAS). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	un	25.00	$111,705.00	$ 2,792,625.00	25.00	$ 2,792,625	25.00	$ 2,792,625	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
22.9	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR SENCILLO, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor sencillo 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correctainstalación	un	48.00	$113,161.00	$ 5,431,728.00	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	48.00	$ 5,431,728	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	48.0	$ 5,431,728.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

		OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
22.10	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR DOBLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	15.00	$116,728.00	$ 1,750,920.00	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	15.00	$ 1,750,920	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	15.0	$ 1,750,920.00
22.11	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de INTERRUPTOR TRIPLE, incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZH(FASE-TIERRA), interruptor doble 15A, 120V conectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO Y CABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	6.00	$118,511.00	$ 711,066.00	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	6.00	$ 711,066	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 711,066.00
22.12	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo, infrarrojo-ultrasonico, amplitud de 360º, 1000W (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) incluyendo ducto EMT, de ½", cajas, conductor CABLE de cobre 3No12 AWG, THHN, TC LS-ZHconectores tipo resorte y demás accesorios. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO). Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta instalación	un	56.00	$219,735.00	$ 12,305,160.00	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	56.00	$ 12,305,160	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	56.0	$ 12,305,160.00
23	**COMUNICACIONES**													0.00	$ -							
23.1	**SALIDAS**				**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**		**$ 30,823,171.00**	0.00	$ -							
23.101	Salida de Datos	Und	281.00	$109,691.00	$ 30,823,171.00	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	281.00	$ 30,823,171	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 30,823,171.00
23.200	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 155,325,571.00**		**$ 155,325,571.00**		**$ 119,548,877.04**		**$ 152,345,146.00**		**$ 152,345,146.00**	0.00	$ -							
23.201	Cable UTP Cat 6A LZOH. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	9760.00	$ 10,556.00	$ 103,026,560.00	9760.00	$ 103,026,560	6370.77	$ 67,249,866	9760.00	$ 103,026,560	9760.00	$ 103,026,560	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	9760.0	$ 103,026,560.00
23.202	Toma RJ45 Cat 6A para Puestos de trabajo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 3,929,504.00
23.203	Toma RJ45 Cat 6A para herraje en Rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 13,984.00	$ 3,929,504.00	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	281.00	$ 3,929,504	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 3,929,504.00
23.204	Faceplate doble para cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 16,731.00	$ 2,927,925.00	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	175.00	$ 2,927,925	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.0	$ 2,927,925.00
23.205	Modulo Angulado para faceplete doble. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	175.00	$ 7,578.00	$ 1,326,150.00	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	175.00	$ 1,326,150	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	175.0	$ 1,326,150.00
23.206	Herraje de 24 Puertos Cat 6A. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 273,448.00	$ 3,828,272.00	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	14.00	$ 3,828,272	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 3,828,272.00
23.207	Organizador de 2UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	14.00	$ 129,926.00	$ 1,818,964.00	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	14.00	$ 1,818,964	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	14.0	$ 1,818,964.00
23.208	Patch Cord Cat 6A de 1,5 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 31,173.00	$ 8,759,613.00	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	281.00	$ 8,759,613	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 8,759,613.00
23.209	Patch Cord Cat 6A de 3 mts azul para rack. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	281.00	$ 39,017.00	$ 10,963,777.00	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	281.00	$ 10,963,777	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 10,963,777.00
23.210	Certificación de punto de red e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equipo debidamente calibrado)	Und	281.00	$ 23,532.00	$ 6,612,492.00	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	281.00	$ 6,612,492	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 6,612,492.00
23.211	Marcación	Und	281.00	$ 18,585.00	$ 5,222,385.00	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	281.00	$ 5,222,385	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	281.0	$ 5,222,385.00
23.212	Rack de cableado de 60x60cm de 40UR. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 993,475.00	$ 2,980,425.00	3.00	$ 2,980,425	3.00	$ 2,980,425	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.300	**SALAS DE AUDIENCIA**				**$ 11,339,800.00**		**$ 11,339,800.00**		**$ 11,339,800.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

		OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.301	Rack para salas de Audiencia de piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 524,707.00	$ 3,148,242.00	6.00	$ 3,148,242	6.00	$ 3,148,242	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.302	Cámaras para grabación salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	6.00	$ 273,760.00	$ 1,642,560.00	6.00	$ 1,642,560	6.00	$ 1,642,560	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.303	Micrófonos de salas de audiencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	31.00	$ 211,258.00	$ 6,548,998.00	31.00	$ 6,548,998	31.00	$ 6,548,998	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.400	**EQUIPOS IT**				**$ 19,117,917.00**		**$ 19,117,917.00**		**$ 19,117,917.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
23.401	Switch de 48 Puertos administrable para montaje en Rack (debe contar con puertos POE para alimentar las cámaras). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	7.00	$2,731,131.00	$ 19,117,917.00	7.00	$ 19,117,917	7.00	$ 19,117,917	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.500	**BACKBONE FIBRA**				**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**		**$ 3,040,138.00**	0.00	$ -							
23.501	Fibra Óptica multimodo de 6 Hilos para interior OM4 - Back bone en Piso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	30.00	$ 40,470.00	$ 1,214,100.00	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	30.00	$ 1,214,100	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	30.0	$ 1,214,100.00
23.502	Conector SC para fibra óptica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	24.00	$ 8,647.00	$ 207,528.00	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	24.00	$ 207,528	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	24.0	$ 207,528.00
23.503	Bandeja de Fibra óptica para tres módulos cada uno con 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 132,822.00	$ 398,466.00	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	3.00	$ 398,466	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 398,466.00
23.504	Modulo para fibra óptica de 6 espacios. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4.00	$ 305,011.00	$ 1,220,044.00	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	4.00	$ 1,220,044	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	4.0	$ 1,220,044.00
23.600	**CCTV**				**$ 12,136,697.00**		**$ 6,661,497.00**		**$ 6,661,497.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
23.601	Cámara tipo domo de interior verificar. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	36.00	$ 273,760.00	$ 9,855,360.00	16.00	$ 4,380,160	16.00	$ 4,380,160	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.602	Cámara tipo PTZ para exterior ubicada en piso 4. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 335,950.00	$ 335,950.00	1.00	$ 335,950	1.00	$ 335,950	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.603	NVR con disco duro para grabación de mínimo 2 meses. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 617,211.00	$ 617,211.00	1.00	$ 617,211	1.00	$ 617,211	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.604	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 1,328,176.00	$ 1,328,176.00	1.00	$ 1,328,176	1.00	$ 1,328,176	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.700	**CONTROL DE ACCESO**				**$ 20,559,776.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
23.701	Lectora de pared para control de acceso. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	20.00	$ 202,351.00	$ 4,047,020.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.702	Electroimán. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 471,893.00	$ 4,718,930.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.703	Botón para Salida de Emergencia. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	10.00	$ 273,760.00	$ 2,737,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

OBRA: OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
23.704	Controladora para 4 puertas, incluye fuentes de poder (2 fuentes por controladora). Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 648,774.00	$ 1,946,322.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.705	Tarjeta de proximidad para controladora. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	100.00	$ 21,094.00	$ 2,109,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.706	Estación de enrolamiento para tarjetas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 1,484,744.00	$ 1,484,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.707	Puesta en marcha por personar cetificado por el fabricante	Und	1.00	$ 3,515,760.00	$ 3,515,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
23.800	**CANALIZACION**				**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**		**$ 25,843,303.00**	0.00	$ -							
23.801	Tubería EMT de 1" para red de cableado estructurado, incluye accesorios de montaje. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	719.00	$ 32,488.00	$ 23,358,872.00	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	719.00	$ 23,358,872	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	719.0	$ 23,358,872.00
23.802	Tubería EMT de 1-1/2" para ingreso proveedores. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	25.00	$ 43,719.00	$ 1,092,975.00	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	25.00	$ 1,092,975	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	25.0	$ 1,092,975.00
23.803	Caja de paso de 15x15cm. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	5.00	$ 74,221.00	$ 371,105.00	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	5.00	$ 371,105	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 371,105.00
23.804	Gabinete de 60x60 ingreso de proveedores telecomunicaciones, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 336,419.00	$ 336,419.00	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	1.00	$ 336,419	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 336,419.00
23.805	Caja de piso exterior de 60x60 para ingreso de proveedores de telecomunicaciones. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1.00	$ 586,272.00	$ 586,272.00	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	1.00	$ 586,272	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 586,272.00
23.806	Tubería PVC para comunicación de caja exterior con Gabinete de ingreso proveedores 1-1/2".Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	5.00	$ 19,532.00	$ 97,660.00	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	5.00	$ 97,660	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	5.0	$ 97,660.00
24	**SEGURIDAD Y CONTROL**													0.00	$ -							
24.100	**DETECCIÓN DE INCENDIO**				**$ 72,415,173.00**		**$ 72,415,173.00**		**$ 72,415,173.00**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
24.101	Detector de humo fotoeléctrico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	90.00	$ 316,722.00	$ 28,504,980.00	90.00	$ 28,504,980	90.00	$ 28,504,980	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.102	Detector de Temperatura. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2.00	$ 257,621.00	$ 515,242.00	2.00	$ 515,242	2.00	$ 515,242	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.103	Estación Manual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	12.00	$ 666,784.00	$ 8,001,408.00	12.00	$ 8,001,408	12.00	$ 8,001,408	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.104	Alarma Audición visual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	19.00	$ 530,397.00	$ 10,077,543.00	19.00	$ 10,077,543	19.00	$ 10,077,543	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.105	Modulo de Relé simple para integración con control de acceso, Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3.00	$ 507,968.00	$ 1,523,904.00	3.00	$ 1,523,904	3.00	$ 1,523,904	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
24.106	Panel de incendio, incluye baterías y accesorios para su correcto funcionamiento, debe contar con al menos 2 nacs 1 loops para 250 equipos y tarjeta expansora para un loop adiciona para 250 equipos, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	Und	1.00	$ 10,911,025.00	$ 10,911,025.00	1.00	$ 10,911,025	1.00	$ 10,911,025	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.107	Puesta en marcha por ingeniero certificado	GL	1.00	$ 12,881,071.00	$ 12,881,071.00	1.00	$ 12,881,071	1.00	$ 12,881,071	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
24.200	**INFRAESTRUCTURA**				**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**		**$ 37,884,966.00**	0.00	$ -							
24.201	Cableado 2x16. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	920.00	$ 10,238.00	$ 9,418,960.00	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	920.00	$ 9,418,960	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	920.0	$ 9,418,960.00
24.202	Tuberías EMT de 3/4" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	580.00	$ 26,519.00	$ 15,381,020.00	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	580.00	$ 15,381,020	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	580.0	$ 15,381,020.00
24.203	Salidas para sensor, incluye cajas y accesorios de conexión. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	92.00	$ 106,382.00	$ 9,787,144.00	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	92.00	$ 9,787,144	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	92.0	$ 9,787,144.00
24.204	Salidas para estación manual o señal audiovisual, incluye cajas y accesorios de conexión	Und	31.00	$ 106,382.00	$ 3,297,842.00	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	31.00	$ 3,297,842	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	31.0	$ 3,297,842.00
25.000	**VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO**				**$ 101,065,840.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
25.100	Minsplit 24000 BTU. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	20.00	$ 5,053,292.00	$ 101,065,840.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
26.000	**CERRADURAS**				**$ 4,245,669.00**		**$ 4,245,669.00**		**$ 4,245,669.00**		**$ 1,737,747.00**		**$ 1,737,747.00**	0.00	$ -							
26.100	Tope Puertas. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	113.00	$ 22,194.00	$ 2,507,922.00	113.00	$ 2,507,922	113.00	$ 2,507,922	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
26.200	Cerraduras puertas en madera. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	11.00	$ 157,977.00	$ 1,737,747.00	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	11.00	$ 1,737,747	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	11.0	$ 1,737,747.00
27.000	**VIDRIOS Y ESPEJOS**				**$ 12,616,418.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
27.100	Espejos 4 mm dilatado con marco negro. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	38.00	$ 332,011.00	$ 12,616,418.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -		0.0	$ -
28	**PINTURA**				**$ 173,074,001.23**		**$ 172,877,528.64**		**$ 172,877,528.64**		**$ 167,278,496.39**		**$ 167,215,457.05**	0.00	$ -							
28.1	Pintura Bajo Escalera, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	40.60	$ 11,142.00	$ 452,365.20	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	40.60	$ 452,365	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	40.6	$ 452,365.20
28.2	Filos y dilataciones en pintura (Fachada). Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	246.43	$ 9,473.00	$ 2,334,431.39	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	246.43	$ 2,334,431	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	246.4	$ 2,334,431.39
28.3	Filos y dilataciones en pintura. Incluye todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	1137.95	$ 8,477.00	$ 9,646,402.15	1114.77	$ 9,449,930	1114.77	$ 9,449,930	1114.77	$ 9,449,905	1107.33	$ 9,386,866	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1107.3	$ 9,386,865.95
28.4	Estuco y pintura 3 manos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	2462.14	$ 38,571.00	$ 94,967,201.94	2462.14	$ 94,967,202	2462.14	$ 94,967,202	2316.98	$ 89,368,194	2316.98	$ 89,368,194	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	2317.0	$ 89,368,193.96
28.5	Pintura bajo placa y cielo rasos. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	1762.00	$ 23,008.00	$ 40,540,096.00	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	1762.00	$ 40,540,096	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1762.0	$ 40,540,096.00
28.6	Pintura borde placa (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	ml	436.21	$ 17,053.00	$ 7,438,689.13	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	436.21	$ 7,438,689	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	436.2	$ 7,438,689.13
28.7	Pintura (Fachadas). Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	283.25	$ 27,068.00	$ 7,667,011.00	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	283.25	$ 7,667,011	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	283.3	$ 7,667,011.00
28.8	Demarcaciones. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	un	1.00	$ 7,105,633.00	$ 7,105,633.00	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	1.00	$ 7,105,633	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 7,105,633.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
28.9	Pintura antihongo. Incluye suministro, aplicación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta aplicación.	m2	49.62	$ 58,891.00	$ 2,922,171.42	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	49.62	$ 2,922,171	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	49.6	$ 2,922,171.42
29	**ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO**				**$ 53,441,316.52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	0.00	$ -							
29.1	Limpieza escaleras	tra	6.00	$ 978,374.00	$ 5,870,244.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.2	Limpieza 3 manos	m2	1762.00	$ 13,546.00	$ 23,868,052.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.3	Limpieza vidrios	m2	1415.00	$ 13,095.00	$ 18,529,425.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.4	Limpieza Cubierta	m2	410.00	$ 6,906.00	$ 2,831,460.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
29.5	Limpieza aseo ladrillo	m2	146.53	$ 15,984.00	$ 2,342,135.52	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	0.0	$ -
30	**NO PREVISTOS**				$ -		**$ 316,857,845.68**		**$ 352,634,539.64**		**$ 746,914,848.85**		**$ 832,298,437.67**	0.00	$ -							
NP01	DESMONTE DE LAMPARAS, consiste en el desmote técnico de las luminarias, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad	Und		$ 25,069.00		54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726	54.00	$ 1,353,726.00		$ -	54.00	$ 1,353,726	100%	0.0	$ -
NP02	DESMONTE DE VENTANERIA, consiste en el desmote técnico de las ventanas existentes, y su posterior traslado a sitio de recolección por parte del contratante, incluye mano de obra, Epp, Andamios y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M2		$ 27,576.00		132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,546	132.35	$ 3,649,545.72		$ -	132.35	$ 3,649,546	100%	0.0	$ -
NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M		$ 19,070.00		1132.37	$ 21,594,296	1132.37	$ 21,594,296	1132.37	$ 21,594,296	1301.54	$ 24,820,368	702.53	$ 13,397,247.10	429.98	$ 8,199,719	1132.51	$ 21,596,966	87%	169.0	$ 3,223,402.10
NP04	RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO EN VIGUETAS, debido a problemas constructivos evidenciados en el momento de retirar la torta inferior de las placas aligeradas de entrepiso existentes, como hormigueos por vibrado, y otros derivados del retiro de los casetones, y por recomendación del Ing. Consultor se deben hacer reparaciones puntuales en la sección de las viguetas para resolver los aceros expuestos mediante la aplicación de un mortero de reparación que garantice el recubrimiento mínimo, según las evidencias encontradas en obra las viguetas deben ser reparadas en aproximadamente el 30% de su área superficial, la tarea consiste en aplicación de Mortero tixotrópico, para la reparación del concreto, que no requiere puente de adherencia, en espesor minimo de 2.5 cm sobre aceros expuestos, esta intervencion no garantiza niveles hilos o filos por lo que su finalidad es unicamente la proteccion de los aceros en un area que luego sera recubierta por cielorasos, incluye limpieza y retiro de material suelto, aplicacion de mortero de reparacion con llana de madera, mano de obra Epp, Andamios, y demás elementos necesarios para su correcta aplicación, se pagara por el total de las viguetas existentes en el proyecto.	M		85513.0		1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	1301.54	$ 111,298,590	683.80	$ 58,473,789		$ -	683.80	$ 58,473,789	53%	617.7	$ 52,824,800.62
NP05	DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS EXISTENTES, consiste en la desconexión y retiro de conductores existentes en el proyecto.	GL		$ 1,003,080.00		1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080	1.00	$ 1,003,080.00		$ -	1.00	$ 1,003,080	100%	0.0	$ -
NP06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ACABADOS DE PISO Y AFINADOS, consiste en la demolición técnica de acabados de tableta de granito o cerámicos y su consecuente afinado de piso, en las placas de la edificación existente que buscan llegara el nivel original de la placa de entrepiso o contrapiso existentes para lograr las alturas de máximas, esta labor incluye herramienta menor y equipos y retiro de escombros	M2		$ 46,105.53		1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,364	1259.77	$ 58,082,363.53		$ -	1259.77	$ 58,082,364	100%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2		$ 85,749.00		1397.99	$ 119,876,245	1397.99	$ 119,876,245	1397.99	$ 119,876,245	1000.00	$ 85,749,000	512.28	$ 43,927,497.72	334.26	$ 28,662,461	846.54	$ 72,589,958	85%	153.5	$ 13,159,041.54
NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2		$ 48,574.00				736.54	$ 35,776,694	756.42	$ 36,742,345	756.42	$ 36,742,345	428.68	$ 20,822,702.32	190.37	$ 9,247,032	619.05	$ 30,069,735	82%	137.4	$ 6,672,610.38
NP009	Construcción de cárcamo porta cable en concreto de 3000 psi, con sección libre de 30x30, espesor de muros 10cm, incluye excavación manual, relleno en material seleccionado y compactación, concreto de limpieza, acero de refuerzo formaletas y en general todos los materiales y accesorios para su correcta construcción, se paga por ml a eje de cárcamo construido.	ML		$ 344,171.00						10.55	$ 3,631,004	10.55	$ 3,631,004	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	10.6	$ 3,631,004.05
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3		$ 4,280,157.00						3.25	$ 13,910,510	3.25	$ 13,910,510	0.00	$ -	0.48	$ 2,054,475	0.48	$ 2,054,475	15%	2.8	$ 11,856,034.89
NP011	Demolicion controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3		$ 2,171,554.00						3.25	$ 7,057,551	3.25	$ 7,057,551	0.00	$ -	0.48	$ 1,042,346	0.48	$ 1,042,346	15%	2.8	$ 6,015,204.58
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML		$ 75,548.00						400.00	$ 30,219,200	400.00	$ 30,219,200	0.00	$ -	52.50	$ 3,966,270	52.50	$ 3,966,270	13%	347.5	$ 26,252,930.00
NP013	Placa aérea vigas descolgadas H= 0.30 a 0.40 m en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Edificio ampliado. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M2		$ 403,984.73						156.10	$ 63,062,016	156.10	$ 63,062,016	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	156.1	$ 63,062,016.36
NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	M2		$ 2,625.00						388.10	$ 1,018,763	388.10	$ 1,018,763	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	388.1	$ 1,018,762.50
NP015	CONCRETO DE 3000 P.S.I PLACA DE CONTRAPISO 10CM	M2		$ 132,935.00						388.10	$ 51,592,074	388.10	$ 51,592,074	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	388.1	$ 51,592,073.50
NP016	Recuperación de equipo ascensor	UND		$ 3,539,363.45						1.00	$ 3,539,363	1.00	$ 3,539,363	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,539,363.45
NP017	Acompañamiento certificación equipo	UND		$ 2,690,818.48						1.00	$ 2,690,818	1.00	$ 2,690,818	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,690,818.48
NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 5,205,000.00						1.00	$ 5,205,000	1.00	$ 5,205,000	0.00	$ -	1.00	$ 5,205,000	1.00	$ 5,205,000	100%	0.0	$ -
NP019	Suministro e instalación de estructura de paso sencillo pin trifásica en bandera 523A para 13.2kv. Trabajos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 2,902,800.00						1.00	$ 2,902,800	1.00	$ 2,902,800	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 2,902,800.00
NP020	Desmonte de estructuras y postes existentes con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 3,785,000.00						1.00	$ 3,785,000	1.00	$ 3,785,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,785,000.00
NP021	Traslado de estructura de derivación alimentador transformador Davivienda, con cuadrilla de línea energizada	UN		$ 3,415,000.00						1.00	$ 3,415,000	1.00	$ 3,415,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 3,415,000.00
NP022	Cierre de puentes de cortacircuitos con cuadrilla de línea energizada.	UN		$ 905,000.00						3.00	$ 2,715,000	3.00	$ 2,715,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	3.0	$ 2,715,000.00
NP023	Fundida de bases de postes de concreto de 12 mts	UN		$ 186,836.00						1.00	$ 186,836	1.00	$ 186,836	0.00	$ -	1.00	$ 186,836	1.00	$ 186,836	100%	0.0	$ -
NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UN		$ 27,454,400.00						1.00	$ 27,454,400	1.00	$ 27,454,400	0.00	$ -	0.95	$ 26,081,680	0.95	$ 26,081,680	95%	0.1	$ 1,372,720.00
NP025	Suministro e instalación de protecciones para transformador trifásico tipo 711 hasta 13.2 KV y SPT. Incluye cortacircuitos con camara apagachispa.	UN		$ 4,750,500.00						1.00	$ 4,750,500	1.00	$ 4,750,500	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 4,750,500.00
NP026	Suministro e instalación de dos (2) ductos conduit galvanizados imc de 4"	ML		$ 610,080.00						6.00	$ 3,660,480	6.00	$ 3,660,480	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	6.0	$ 3,660,480.00
NP027	Suministro e instalación de banco de tres (3) ductos conduit pvc de 4". Incluye demolición de piso de concreto, excavación, compactación y resanes.	ML		$ 106,200.00						8.00	$ 849,600	8.00	$ 849,600	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	8.0	$ 849,600.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
NP028	Suministro e instalación de ocho 2x(3F+1N) conductores en cable de cobre THHN 2x(3No. 4/0 +1No. 4/0 awg) + 1No. 2T awg, desde bornes del transformador hasta protección principal en celda de dsitribución general de BT.	ML		$ 1,103,600.00						20.00	$ 22,072,000	20.00	$ 22,072,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	20.0	$ 22,072,000.00
NP029	Suministro e instalación de grupo de medida indirecta para nivel 2, 3 elementos para 13.2 KV, uso exterior y calibrado.	UN		$ 33,131,000.00						1.00	$ 33,131,000	1.00	$ 33,131,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 33,131,000.00
NP030	Elaboración de memorias de calculo, planos eléctricos y tramites de aprobacion diseño ante el operador de red.	UN		$ 7,740,000.00						1.00	$ 7,740,000	1.00	$ 7,740,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	1.0	$ 7,740,000.00
NP031	Antepechos cubierta, en panel Kinwall E=60mm 28/26 acanalado y/o liso, incluye perfil de soporte inferior e intermedio en Angulo Gal C-16 de 5x5 ctms	M2		$ 375,000.00						180.00	$ 67,500,000	180.00	$ 67,500,000	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	180.0	$ 67,500,000.00
NP032	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3		$ 156,285.00						199.80	$ 31,225,743	199.80	$ 31,225,743	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0%	199.8	$ 31,225,743.00
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3		$ 913,101.00								27.15	$ 24,790,692	0.00	$ -	27.15	$ 24,790,692	27.15	$ 24,790,692	100%	0.0	$ -
NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2		$ 154,810.00								424.57	$ 65,727,682	0.00	$ -			0.00	$ -	0%	424.6	$ 65,727,681.70
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3		$ 459,448.00								9.21	$ 4,231,516	0.00	$ -	9.21	$ 4,231,516	9.21	$ 4,231,516	100%	0.0	$ -
NP036	Revisión integral y validacion cambios en recorridos para la red contraincendios, apoyo técnico en la definición de los parámetros hidráulicos y constructivos requeridos para mantener el sistema, en consecuencia de cambios en el diseño arquitectónico de cielorrasos y validación de alturas libres de la edificación. Incluye Planos de nuevo recorrido de RCI- Memorias de Cálculo (verificación de la presión y caudal del punto crítico de la red).	UN		$ 9,579,500.00								1.00	$ 9,579,500	0.00	$ -			0.00	$ -	0%	1.0	$ 9,579,500.00
NP037	Zapata en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$ 1,210,150.00								3.05	$ 3,690,958	0.00	$ -			0.00	$ -	0%	3.1	$ 3,690,957.50
NP038	Vigas de Cimentación en concreto de 21 Mpa (3000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	M3		$ 1,433,053.00								3.00	$ 4,299,159	0.00	$ -			0.00	$ -	0%	3.0	$ 4,299,159.00
NP039	Suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	ML		$ 113,293.00								35.00	$ 3,965,255	0.00	$ -	12.22	$ 1,384,440	12.22	$ 1,384,440	35%	22.8	$ 2,580,814.54
														0.00	$ -			0.00	$ -	0%	0.0	$ -

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT. 901361496-7

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ACTA 003

OBRA:	OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATO No:	C-019 DE 2025	MUNICIPIO:	OCAÑA
VALOR INICIAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA INICIO:	25 de julio de 2025
VALOR ADICIÓN:	$ -	FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL:	$ 7,467,318,989.00	FECHA DEL ACTA:	4 de diciembre de 2025

1. ÍTEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICATORIO 1		MODIFICATORIO 2		MODIFICATORIO 3		MODIFICATORIO 4		4. OBRA EJECUTADA						%	5. SALDO	
														ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
	Descripción	Und	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial		Cant.	Vr. Parcial
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 5,445,033,535.00		$ 1,041,480,794.00		$ 389,626,535.00		$ 1,431,107,329.00			$ 4,013,926,206.00
	Administracion			26%	$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 1,415,708,719.00		$ 270,785,006.00		$ 101,302,899.00		$ 372,087,905.00			$ 1,043,620,814.00
	Imprevistos			4%	$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 217,801,341.00		$ 41,659,232.00		$ 15,585,061.00		$ 57,244,293.00			$ 160,557,048.00
	Utilidad			6%	$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 326,702,012.00		$ 62,488,848.00		$ 23,377,592.00		$ 85,866,440.00			$ 240,835,572.00
	IVA sobre Utilidad			19%	$ 62,073,382.00		$ 62,073,382		$ 62,073,382		$ 62,073,382		$ 62,073,382.00		$ 11,872,881.12		$ 4,441,742.48		$ 16,314,623.60			$ 45,758,758.68
	Total Obras				**$ 7,467,318,989.00**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 7,467,318,989**		**$ 1,428,286,761.12**		$ 534,333,829.48		$ 1,962,620,590.60			$ 5,504,698,398.68

VALOR TOTAL			$	7,467,318,989
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		30%	$	2,240,195,696.00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO			$	-
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN			$	7,467,318,989.00
SALDO DEL CONTRATO			$	5,504,698,398.68
SALDO POR AMORTIZAR			$	1,651,409,519.00

VALOR DEL CONTRATO INICIAL			$	7,467,318,989
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$	-
PORCENTAJE DEL ANTICIPO				30%
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO			$	2,240,195,696.00

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$		374,033,681.48

$ 534,333,829.48		**$ 1,962,620,590.60**	
$ 160,300,148.00		**$ 588,786,177.00**	26.28%
$ 5,504,698,398.40		**$ 5,504,698,398.40**	
$ 1,651,409,519.00		**$ 1,651,409,519.00**	

VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 1,428,286,761.12	**VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA**	$ 374,033,681.48
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$ 428,486,028.34	**SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:**	$ 5,504,698,398.68
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 534,333,829.48	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ 1,651,409,519.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 160,300,148.00	**SALDO POR LIBERAR:**	$ -

ING. NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C.C. 80.182.734 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

ABO. JULIO ANDRES CASTRO GONZÁLEZ
C.C. 79.696.673
INTERVENTOR

ING. JONATHAN JADYR BAUTISTA CABALLERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: 1.1	Demoliciones	UNIDAD: M2	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	TRABAJOS PRELIMINARES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	ESCALERA PRINCIPAL FALTANTE DEL ACTA 002				11.4		3.00	34.20
EJE A-D Y 8	MURO DE CONTENCION	17.60	0.50	1.50	26.40		1.00	26.40
	ANDEN	17.34	1.20		20.81		1.00	20.81
	ANDEN	17.34	2.70		46.82		1.00	46.82
	SOBRE PLACA ANDEN	3.65	1.10		4.02		1.00	4.02
	CUBIERTA							
	BORDILLO DE FACHADA EN CUBIERTA	6.8	0.17	0.15		0.17	1.00	0.17
	BORDILLO DE FACHADA EN CUBIERTA	5.8	0.17	0.15		0.15	1.00	0.15
	TERCER PISO							
	VIGA ENTRE EJE A ENTRE 2-3	0.46	2.80	0.3		0.39	1.00	0.39
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								132.95
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		132.95

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander

CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
2.1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025


CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







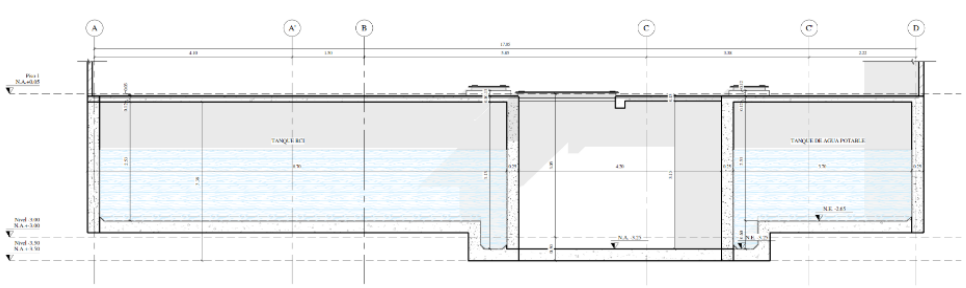

2 DET. TANQUE RCI + TANQUE AGUA POTABLE
AD-901 1 : 50

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AD 901	EJE B-D Y 7-8	11.60	6.00	3.50		243.60		243.60
		6.00	4.30	3.50		90.30		90.30
						-		-
		2.77	5.00	0.9		12.47		12.47
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								346.37
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		346.37

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	2.2	Excavacion manual vigas/zapatas	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

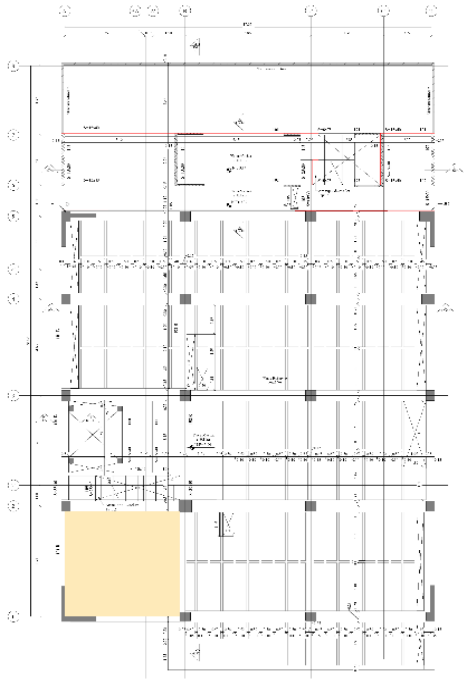



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	AREA PLANTA ELECTRICA							
	EJE A-B Y 1-2	5.44	5.10	0.60		16.65	1.00	16.65
								16.65
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		16.65

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 2.3	Relleno material seleccionado		UNIDAD: M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MOVIMIENTO DE TIERRA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

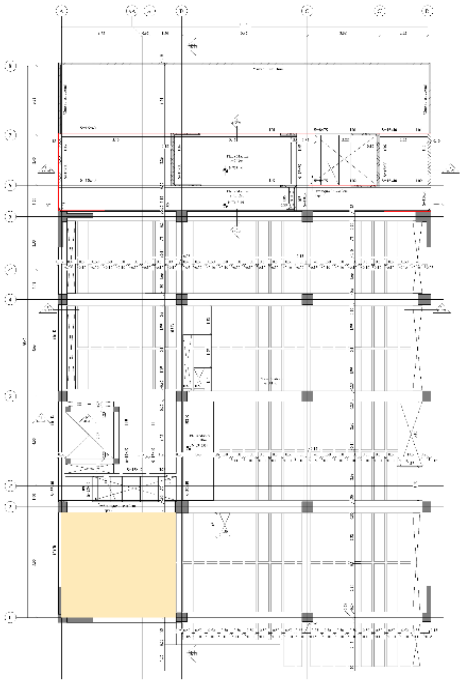



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	AREA PLANTA ELECTRICA							
	EJES (A-B) Y (1-2)	5.44	5.10	0.30		8.32	1.00	8.32
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								8.32
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**8.32**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.3	Suministro, transporte e instalción de Acero Figurado 1/4" - 1", incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD: KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	CIMENTACIÓN

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Peso total (kg)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Peso (kg)	Alto				
	ER-203	TANQUE DE AGUA POTABLE							
		ACERO #4. PLACA FONDO	2.70	0.99			2.67	46.00	122.96
		ACERO #4. PLACA FONDO	3.75	0.99			3.71	22.00	81.68
		ACERO #4. ESQUINA FONDO	0.95	0.99			0.94	65.00	61.13
		ACERO #4. CÁRCAMO	1.30	0.99			1.29	22.00	28.31
		ACERO #4. CÁRCAMO	1.10	0.99			1.09	22.00	23.96
		ACERO #4. MURO CORTO	3.20	0.99			3.17	22.00	69.70
		ACERO #4. MURO CORTO	2.70	0.99			2.67	26.00	69.50
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAM	3.80	0.99			3.76	22.00	82.76
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAM	2.70	0.99			2.67	32.00	85.54
		ACERO #4. MURO LARGO	3.20	0.99			3.17	68.00	215.42
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAM	3.80	0.99			3.76	16.00	60.19
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAM	4.45	0.99			4.41	52.00	229.09
		ACERO #4. MURO CORTO CÁRCAM	1.30	0.99			1.29	12.00	15.44
		ACERO #4. TAPA	4.45	0.99			4.41	14.00	61.68
		ACERO #4. TAPA	2.70	0.99			2.67	22.00	58.81
		ACERO #5. REF. PASAMUROS	0.60	1.56			0.94	40.00	37.44
		ACERO #5. REF. PASAMUROS	0.40	1.56			0.62	8.00	4.99
									1,308.59
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,308.59

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.4	Bombeo de concreto. incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD M3	FECHA:	

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	TRABAJOS PRELIMINARES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

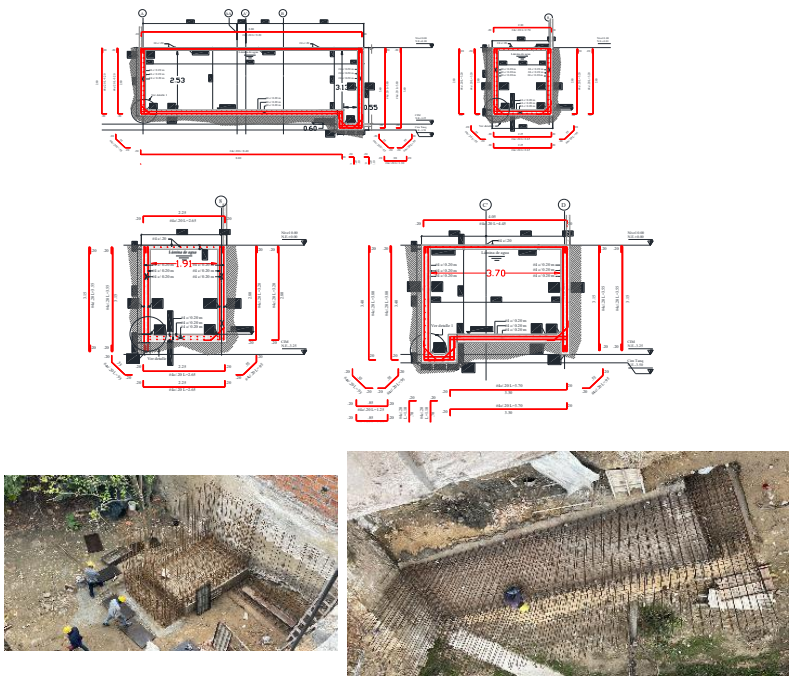

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200, ER-202	**TANQUE RED CONTRA INCENDIOS EJ(7'-8)(A-B')**							
	PLACA FONDO	8.95	2.42	0.25		5.41	1.00	5.41
	MEDIA CAÑA FONDO	11.12	0.10	0.050		0.06	2.00	0.11
	MURO CORTO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	8.45	0.25	0.95		2.01	2.00	4.01
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.55	0.25	0.60		0.08	2.00	0.17
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01		-
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02		-
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	22.56	0.10	0.050		0.11	2.00	0.23
	TAPA TANQUE	8.95	2.42	0.12		2.60		-
ER-200, ER-202	**TANQUE AGUA POTABLE EJ(7'-8)(C-D)**							
	PLACA FONDO	4.20	2.42	0.25		2.54	1.00	2.54
	MEDIA CAÑA FONDO	5.62	0.10	0.050		0.03	2.00	0.06
	MURO CORTO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.95		0.57	1.00	0.57
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	3.70	0.25	0.35		0.32	2.00	0.65
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.50	0.25	0.60		0.08	2.00	0.15
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01		-
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02		-
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	13.16	0.10	0.050		0.07	2.00	0.13
	TAPA TANQUE	4.20	2.42	0.12		1.22		-
ER-200, ER-202	**POZO EYECTOR EJ (C-D)(6-7)**							
	PLACA FONDO	2.90	1.15	0.25		0.83		-
	MURO CORTO	1.15	1.50	0.25		0.43		-
	MURO LARGO TANQUE	2.40	0.25	1.50		0.90		-
	MEDIA CAÑA FONDO	3.05	0.10	0.050		0.02		-
								15.30
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		15.30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 3.6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD: M2	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	TRABAJOS PRELIMINARES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

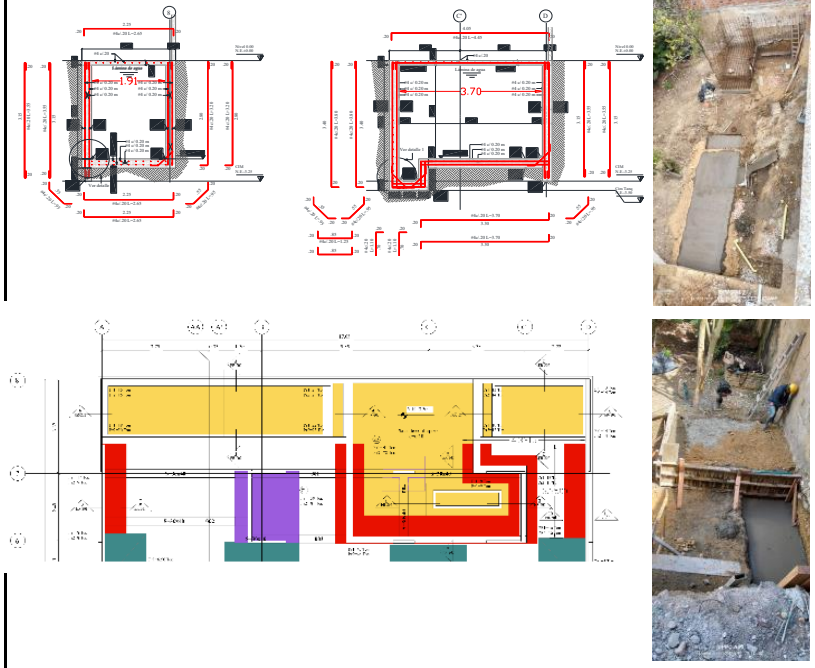

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TANQUE AGUA POTABLE EJ(7'-8)(C-D)							
ER-200, ER-202	PLACA FONDO	4.20	2.42		10.16	-	1.00	10.16
	TANQUE RCI							
	PLACA FONDO	3.95	1.20		4.74		1.00	4.74
	EJE D(6-7')			-				
	ZARPA MURO	8.9	2.50		22.25		1.00	22.25
								37.15
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		37.15

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Concreto Tanque 28 Mpa (4000 psi), incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UNIDAD	FECHA:
	3.7		M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	TRABAJOS PRELIMINARES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

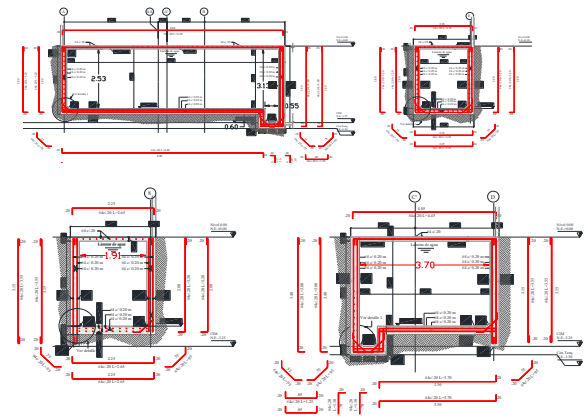





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-200, ER-202	**TANQUE RED CONTRA INCENDIOS EJ(7'-8)(A-B')**							
	PLACA FONDO	8.95	2.42	0.25		5.41	1.00	5.41
	MEDIA CAÑA FONDO	11.12	0.10	0.050		0.06	2.00	0.11
	MURO CORTO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	8.45	0.25	0.95		2.01	2.00	4.01
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.55	0.25	0.60		0.08	2.00	0.17
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01		-
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02		-
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	22.56	0.10	0.050		0.11	2.00	0.23
	TAPA TANQUE	8.95	2.42	0.12		2.60		-
ER-200, ER-202	**TANQUE AGUA POTABLE EJ(7'-8)(C-D)**							
	PLACA FONDO	4.20	2.42	0.25		2.54	1.00	2.54
	MEDIA CAÑA FONDO	5.62	0.10	0.050		0.03	2.00	0.06
	MURO CORTO	2.42	0.25	0.30		0.18	1.00	0.18
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.95		0.57	1.00	0.57
	MURO CORTO CÁRCAMO	2.42	0.25	0.60		0.36	1.00	0.36
	MURO LARGO TANQUE	3.70	0.25	0.35		0.32	2.00	0.65
	MURO TAPA LATERAL CÁRCAMO	0.50	0.25	0.60		0.08	2.00	0.15
	MEDIA CAÑA MUROS	2.53	0.10	0.050		0.01		-
	MEDIA CAÑA MUROS	3.13	0.10	0.050		0.02		-
	MEDIA CAÑA FONDO TANQUE	13.16	0.10	0.050		0.07	2.00	0.13
	TAPA TANQUE	4.20	2.42	0.12		1.22		-
ER-200, ER-202	**POZO EYECTOR EJ (C-D)(6-7)**							
	PLACA FONDO	2.90	1.15	0.25		0.83		-
	MURO CORTO	1.15	1.50	0.25		0.43		-
	MURO LARGO TANQUE	2.40	0.25	1.50		0.90		-
	MEDIA CAÑA FONDO	3.05	0.10	0.050		0.02		-
								15.30
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		15.30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	UNIDAD KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO













REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER 103	**COLUMNA 2B DEL 2 AL 3 PISO. CARA A EJE 1**							
	GRAPAS 3/8" (1 CARA)	0.60	0.560			0.34	23.00	7.73
	ACERO LONGITUDINAL #5	1.90	1.552			2.95	4.00	11.80
ER-600, ER-601	**VIGA 402R (S=20X30) (ES 1).CUBIERTA**							
	ACERO LONGITUDINAL #4	3.20	0.994			3.18	2.00	6.36
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.40	1.560			5.30	2.00	10.61
	ACERO LONGITUDINAL #4	3.30	0.994			3.28	4.00	13.12
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.30	1.552			5.12	2.00	10.24
	ACERO LONGITUDINAL #4	3.20	0.994			3.18	2.00	6.36
	ACERO LONGITUDINAL #4	2.10	0.994			2.09	2.00	4.17
	ACERO LONGITUDINAL #4	4.10	0.994			4.08	2.00	8.15
	ACERO LONGITUDINAL #4	1.90	0.994			1.89	2.00	3.78
	ACERO LONGITUDINAL #4	4.60	0.994			4.57	2.00	9.14
	ACERO LONGITUDINAL #4	2.00	0.994			1.99	2.00	3.98
	ACERO LONGITUDINAL #4	4.30	0.994			4.27	2.00	8.55
	ACERO ESTRIBOS #3	0.88	0.560			0.49	109.00	53.72
ER-600, ER-601	**VIGA 409R (20X30) (ES 1). CUBIERTA**							
	ACERO LONGITUDINAL #4	3.20	0.994			3.18	2.00	6.36
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.40	1.552			5.28	2.00	10.55
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.50	1.552			5.43	4.00	21.73
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.30	1.552			5.12	2.00	10.24
	ACERO LONGITUDINAL #5	3.30	1.552			5.12	2.00	10.24
	ACERO LONGITUDINAL #4	3.20	0.994			3.18	2.00	6.36
	ACERO LONGITUDINAL #4	2.10	0.994			2.09	2.00	4.17
	ACERO LONGITUDINAL #4	4.10	0.994			4.08	2.00	8.15
	ACERO LONGITUDINAL #4	1.90	0.994			1.89	2.00	3.78
	ACERO LONGITUDINAL #4	4.60	0.994			4.57	2.00	9.14
	ACERO ESTRIBOS #3	0.88	0.560			0.49	109.00	53.72
								-
								302.16
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	302.16

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	UNIDAD: KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		VIGA VC001 (15X65) (SON 2). CUBIERTA							
	ER-600, ER-601	ACERO LONGITUDINAL #5	7.80	1.552			12.11	4.00	48.42
		ACERO LONGITUDINAL #5	6.00	1.552			9.31	4.00	37.25
		ACERO LONGITUDINAL #5	6.70	1.552			10.40	4.00	41.59
		ACERO LONGITUDINAL #6	5.30	2.235			11.85	4.00	47.38
		ACERO LONGITUDINAL #6	8.60	2.235			19.22	4.00	76.88
		ACERO LONGITUDINAL #6	6.20	2.235			13.86	4.00	55.43
		ACERO ESTRIBOS #3	1.58	0.560			0.88	174.00	153.96
							-		-
	ER-602	**VIGA 406 (15X30) CUBIERTA**					-		-
		ACERO LONGITUDINAL #4	3.60	0.994			3.58	2.00	7.16
		ACERO LONGITUDINAL #4	1.50	0.994			1.49	2.00	2.98
		ACERO LONGITUDINAL #4	4.31	0.994			4.28	2.00	8.57
		ACERO LONGITUDINAL #4	5.00	0.994			4.97	2.00	9.94
		FLEJES #3	0.78	0.560			0.44	35.00	15.29
							-		-
	ER-602	**V 414R (15X30) CUBIERTA**					-		-
		ACERO LONGITUDINAL #4	4.00	0.994			3.98	4.00	15.90
		FLEJES #3	0.78	0.560			0.44	25.00	10.92
							-		-
	ER-602	**V 407R (12X30) CUBIERTA**					-		-
		ACERO LONGITUDINAL #4	3.70	0.994			3.68	1.00	3.68
		ACERO LONGITUDINAL #5	3.70	1.552			5.74	1.00	5.74
		FLEJES #3	0.42	1.552			0.65	22.00	14.34
							-		-
	ER-602	**V 419R (12X30) CUBIERTA**					-		-
		ACERO LONGITUDINAL #4	3.00	0.994			2.98	2.00	5.96
		ACERO LONGITUDINAL #6	1.80	2.235			4.02	1.00	4.02
		ACERO LONGITUDINAL #6	4.30	2.235			9.61	1.00	9.61
		FLEJES #3	0.42	0.560			0.24	33.00	7.76
									-
									582.79
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	884.95

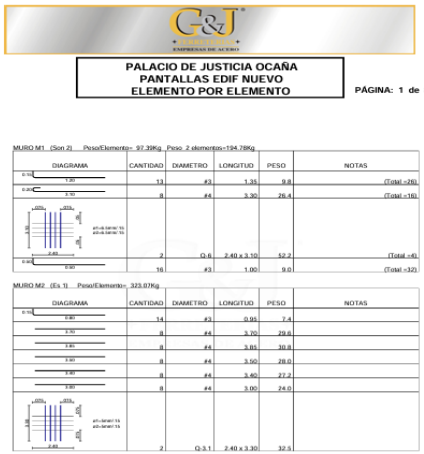
PALACIO DE JUSTICIA OCAÑA
PANTALLAS EDIF NUEVO
ELEMENTO POR ELEMENTO

PÁGINA: 1 de 8

MURO M1 (Son 2) Peso/Elemento= 97.39Kg Peso 2 elementos=194.78Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	13	#3	1.35	9.8	(Total =26)
	8	#4	3.30	26.4	(Total =16)
	2	Q 6	2.40 x 3.10	52.2	(Total =4)
	16	#3	1.00	9.0	(Total =32)

MURO M2 (Es 1) Peso/Elemento= 323.07Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	14	#3	0.95	7.4	
	8	#4	3.70	29.6	
	8	#4	3.85	30.8	
	8	#4	3.50	28.0	
	8	#4	3.40	27.2	
	8	#4	3.00	24.0	
	2	Q 3.1	2.40 x 3.30	32.5	

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	UNIDAD: KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
  	ER-600, ER-601	**CANAL EJE D(1-5) (ES 1). CUBIERTA**							
		ACERO. GANCHO BORDILL EXTERN0 #3	0.50	0.560			0.28	98.00	27.44
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.80)	6.00	0.560			3.36	3.00	10.08
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.80)	1.30	0.560			0.73	1.00	0.73
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.75	0.560			0.42	89.00	37.38
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.37	0.560			0.21	89.00	18.44
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=19.60)	6.00	0.560			3.36	6.00	20.16
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=19.60)	1.75	0.560			0.98	2.00	1.96
	ER-600, ER-601	**CANAL EJE 5(A-D) (ES 1). CUBIERTA**							
		ACERO. GANCHO BORDILL EXTERN0 #3		0.560			-	87.00	-
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.35)	6.00	0.560			3.36	3.00	10.08
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.35)	1.45	0.560			0.81	0.85	0.69
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.35	0.560			0.20	80.00	15.68
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.37	0.560			0.21	80.00	16.58
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.60)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.90)	2.10	0.560			1.18	2.00	2.35
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=8.75)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.90)	2.40	0.560			1.34	2.00	2.69
	ER-600, ER-601	**CANAL EJE A(3-5) (ES 1). CUBIERTA**							
		ACERO. GANCHO BORDILL EXTERN0 #3	0.50	0.560			0.28	46.00	12.88
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=9.00)	6.00	0.560			3.36	1.00	3.36
		ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=9.00)	4.50	0.560			2.52	1.00	2.52
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.75	0.560			0.42	43.00	18.06
		ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.37	0.560			0.21	43.00	8.91
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=8.30)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
		ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=8.30)	3.80	0.560			2.13	2.00	4.26
									234.40
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,119.35**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		KG	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CANAL EJE A(1-2') (ES 1). CUBIERTA							
ER-600, ER-601	ACERO. GANCHO BORDILL EXTERN0 #3	0.50	0.560			0.28	46.00	12.88
	ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=7.12)	6.00	0.560			3.36	1.00	3.36
	ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=7.12)	4.50	0.560			2.52	1.00	2.52
	ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.75	0.560			0.42	43.00	18.06
	ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.37	0.560			0.21	43.00	8.91
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.03)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.03)	3.80	0.560			2.13	2.00	4.26
	CANAL EJE 1(A-D) (ES 1). CUBIERTA							
ER-600, ER-601	ACERO. GANCHO BORDILL EXTERN0 #3	0.37	0.560			0.21	87.00	18.03
	ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.35)	6.00	0.560			3.36	3.00	10.08
	ACER LONGTD BORD EXTERN #3 (L=17.35)	1.45	0.560			0.81	0.85	0.69
	ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.35	0.560			0.20	80.00	15.68
	ACERO. GANCHO BORDILL INTERNO #3	0.37	0.560			0.21	80.00	16.58
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.60)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.90)	2.10	0.560			1.18	2.00	2.35
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=8.75)	6.00	0.560			3.36	2.00	6.72
	ACER LONGITL BORDE INTERN #3 (L=6.90)	2.40	0.560			1.34	2.00	2.69
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO							
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO	2.25	0.994			2.2365	7	15.6555
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO	6.65	0.994			6.6101	7	46.2707
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO	1.9	0.994			1.8886	7	13.2202
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO	1.44	0.560			0.8064	50	40.32
								-
								-
								-
								251.70
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,371.06

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	UNIDAD: KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
  	ER-500, ER-501	CUARTO PISO. EJES (2'-3)(A-B)							
		VIGA 301 R (33X40) #5	3.2	1.552			4.97	3	14.90
		VIGA 301 R (33X40)#5	3	1.552			4.66	2	9.31
		VIGA 301 R (33X40) #5	1.7	1.552			2.64	3	7.92
		VIGA 301 R (33X40) #5	4.1	1.552			6.36	3	19.09
		VIGA 301R (33X40)FLEJES #3	1.34	0.560			0.75	33	24.76
							0.00		0.00
		VIGA 302R (30X40) #6	3.2	2.235			7.15	3	21.46
		VIGA 302 R (30X40) #6	3.2	2.235			7.15	2	14.30
		VIGA 302 R (30X40)#5	1.7	1.552			2.64	3	7.92
		VIGA 302 R (30X40)#5	4.1	1.552			6.36	3	19.09
		VIGA 302 R(30X40) FLEJES #3	1.28	0.560			0.72	33	23.65
							0.00		0.00
		VIGA 302 (15X40) #4	5.7	0.994			5.67	2	11.33
		VIGA 302 (15X40) #4	5.7	0.994			5.67	2	11.33
		VIGA 302 (15X40) FLEJES #3	0.98	0.560			0.55	35	19.21
							0.00		0.00
		VIGA 303 (25X30) #4	1.6	0.994			1.59	6	9.54
		VIGA 303 (25X30)FLEJES #3	0.98	0.560			0.55	35	19.21
							0.00		0.00
		VIGA 308 #4	1.60	0.994			1.59	6	9.54
		VIGA 308 FLEJES #3	1.18	0.560			0.66	8	5.29
		VIGA 304 (15X40) #5	10.10	1.560			15.76	1	15.76
		VIGA 304 (15X40) #3	6.10	2.235			13.63	1	13.63
		VIGA 304 (15X40) #5	5.10	1.552			7.92	1	7.92
		VIGA 304 (15X40)#5	6.30	1.552			9.78	5	48.89
		VIGA 304 (15X40) FLEJES #3	0.98	0.560			0.55	54	29.64
		VIGA 304 (15X40) FLEJES #3	0.87	0.560			0.49	60	29.23
									-
									-
									392.91
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,763.97

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	UNIDAD: KG	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUARTO PISO. EJES (2'-3)(A-B)							
ER-500, ER-501	VIGA 305(15X40) #4	2.50	0.994			2.49	2	4.97
	VIGA 304 (15X40) #4	2.30	0.994			2.29	2	4.57
	VIGA 304 (15X40) #5	1.30	1.552			2.02	2	4.04
	VIGA 304 (15X40)#5	3.50	1.552			5.43	2	10.86
	VIGA 304 (15X40) FLEJES #3	0.98	0.560			0.55	25	13.72
	LOSA MACIZA E=10 CM							
	ACERO #3	0.50	0.560			0.28	41	11.48
	ESCAL (2-2) (A-B) 3 AL 4 PISO							
ER-700	ACERO #4	2.15	0.994			2.1371	7	14.9597
	ACERO #4	5.55	0.994			5.5167	7	38.6169
	ACERO #4	1.95	0.994			1.9383	7	13.5681
	ACERO #3	1.44	0.560			0.8064	51	41.1264
	VIGUETAS (15X30) BAÑO 2do PISO							
	ACERO #3	3.3	0.560			1.848	4	7.392
	ACERO #3. FLEJES	0.9	0.560			0.504	23	11.592
	ACERO #3	2.85	0.560			1.596	4	6.384
	ACERO #3. FLEJES	0.9	0.560			0.504	19	9.576
	VIGUETAS (15X25). BAÑO 3ER PISO							
	ACERO #3	3.3	0.560			1.848	4	7.392
	ACERO #3. FLEJES	0.8	0.560			0.448	20	8.96
	ACERO #3	2.85	0.560			1.596	4	6.384
	ACERO #3. FLEJES	0.8	0.560			0.448	14	6.272
	VIGUETAS (15X25). BAÑO 4to PISO							
	ACERO #3	3.3	0.560			1.848	4	7.392
	ACERO #3. FLEJES	0.8	0.560			0.448	20	8.96
	ACERO #3	2.85	0.560			1.596	4	6.384
	ACERO #3. FLEJES	0.8	0.560			0.448	14	6.272
								-
								250.87
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2,014.84

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.		KG	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	VIGUETAS (13X17) CUARTO PISO							
	ACERO #3	3.15	0.560			1.764	4	7.056
	ACERO #3. FLEJES	0.11	0.560			0.0616	25	1.54
	ACERO #3	2.6	0.560			1.456	4	5.824
	ACERO #3. FLEJES	0.11	0.560			0.0616	20	1.232
	VIGAS BORDE PLACA 4to PISO ENTRE EJE (C-D)(1-2)							
		2.3	0.560			1.29	2	2.58
		0.5	1.552			0.78	4	3.10
	COLUMNETAS DEL 2 PISO							
		2.68	0.560			1.5008	22	33.0176
		1	1.552			1.552	22	34.144
								-
								88.49
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2,103.33

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: 4.2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	UNIDAD: UND	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		ENSAYOS DE RECISTENCIA DE COMPRENSION.					16.00	16.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									16.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		16.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES GAITRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto		UNIDAD: M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

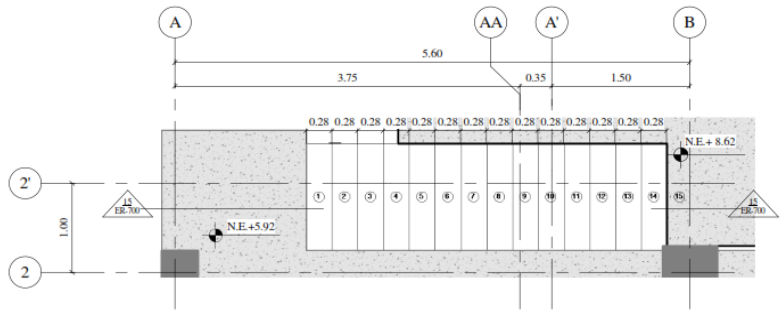

PLANTA ESCALERA TIPO 3
Escala 1 : 50

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 3 a 4 PISO**							
	CAMA TRAMO	4.70	1.20	0.20		1.13	1.00	1.13
	PASOS TRAMO 1	1.20	0.28	0.093		0.03	14.00	0.44
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 1 a 2 P**							
	ZARPA	0.80	0.60	0.30		0.14	1.00	0.14
	CUELLO ZARPA	0.80	0.15	0.61		0.07	1.00	0.07
	CAMA TRAMO 1	0.80	1.18	0.15		0.14	1.00	0.14
	PASOS TRAMO 1	1.18	0.28	0.088		0.03	3.00	0.09
	DESCANSO	1.18	1.22	0.15		0.22	1.00	0.22
	DESCANSO	1.35	1.50	0.15		0.30	1.00	0.30
	CAMA TRAMO 2	4.73	1.23	0.20		1.16	1.00	1.16
	PASOS TRAMO 1	1.23	0.28	0.088		0.03	14.00	0.42
ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 2 a 3 P**							
	CAMA TRAMO	4.38	1.20	0.20		1.05	1.00	1.05
	PASOS TRAMO 1	1.20	0.28	0.093		0.03	14.00	0.44
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								5.60
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		5.60

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto		UNIDAD: M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

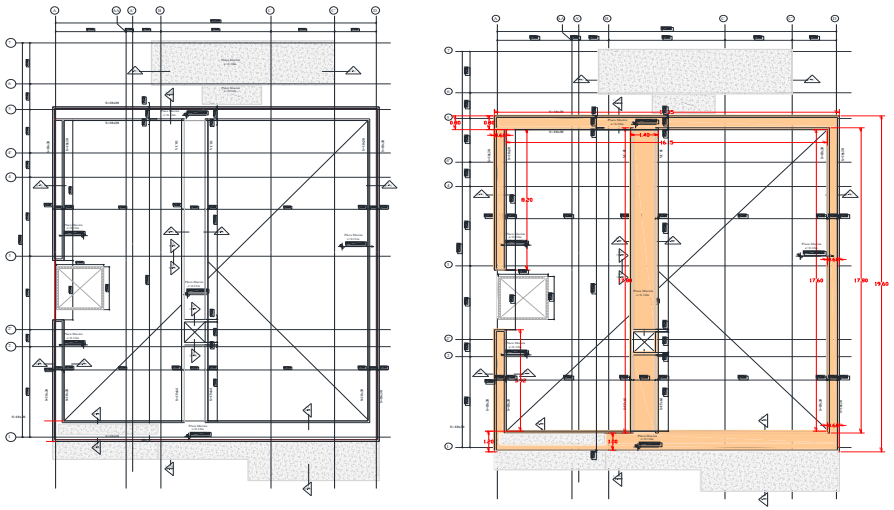

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUO. EJES (1-5)(A-D)							
ER-600	V 402R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 402R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 402R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 409R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 409R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 409R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 406R EJE 2'(A-B)	5.27	0.15	0.30		0.24	2.00	0.47
ER-600	V 414R EJE A'(2'-3)	3.58	0.15	0.30		0.16	2.00	0.32
ER-600	V 407R EJE 2'(C'-D)	3.28	0.15	0.30		0.15	2.00	0.30
ER-600	V 419R EJE C'(2-3)	5.00	0.12	0.30		0.18	2.00	0.36
ER- 501	V 301R EJE 2-3 A-B	4.80	0.40	0.20		0.38	1.00	0.38
	EJE (0-1')(A-B). VOLADIZO	5.75	1.10	0.12		0.76	1.00	0.76
	EJE (0-1)(B-C). VOLADIZO	6.00	1.45	0.12		1.04	1.00	1.04
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 1(A-D)	15.25	0.10	0.30		0.46	1.00	0.46
		17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 5(A-D)	17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		14.75	0.10	0.30		0.44	1.00	0.44
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE D (1-5)	19.25	0.10	0.30		0.58	1.00	0.58
		17.80	0.10	0.30		0.53	1.00	0.53
		17.60	0.40	0.12		0.84	1.00	0.84
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (1-2')	7.02	0.10	0.30		0.21	1.00	0.21
		5.92	0.10	0.30		0.18	1.00	0.18
		5.92	0.40	0.12		0.28	1.00	0.28
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
								-
								14.32
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		19.92

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.3	Bombeo de concreto	UNIDAD: M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	ESTRUCTURA	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (3-5)	8.81	0.10	0.30		0.26	1.00	0.26
		8.21	0.10	0.30		0.25	1.00	0.25
		8.21	0.40	0.12		0.39	1.00	0.39
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
ER-600 y ER-602	PASARELA CENTRAL EJE B'(1-5)							
	VIGA VC 001	17.80	0.15	0.64		1.71	2.00	3.42
		17.80	1.10	0.12		2.35	1.00	2.35
	ESCOTILLA	1.10	1.20	0.12		0.16	-1.00	-0.16
	BORDE ESCOTILLA	1.10	0.15	0.20		0.03	2.00	0.07
	PLACA VOLADIZO. EJE 1(A-B)	5.75	2.25	0.12		1.55	1.00	1.55
								-
								8.14
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		28.05

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	4.5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

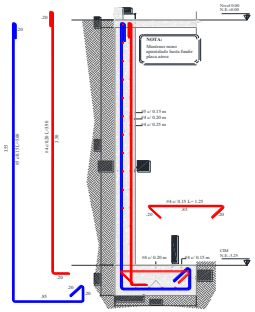
CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
	ER-700	**ESCALER EJ(2-2')(A-B) 3 a 4 P**							
		CAMA UN TRAMO	4.70	1.20	0.20		1.13	1.00	1.13
		PASOS TRAMO 1	1.20	0.28	0.093		0.03	14.00	0.44
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.6	Muros en concreto y columnas en concreto de 31 Mpa (4500 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	UNIDAD	M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
	ER-200 y ER-201	**MURO EJE D(5-7')**							
		ZARPA MURO	3.90	1.00	0.30		1.17	1.00	1.17
		CUELLO MURO	3.90	1.00	3.10		12.09		-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.17
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.17

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	UNIDAD: M3	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

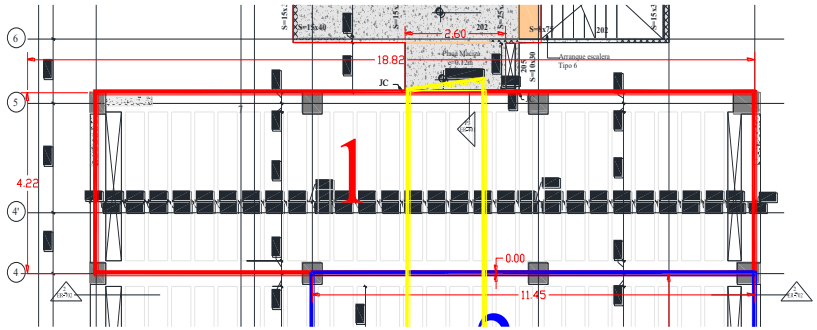

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO3							
	SOBRE PLACA (A-D)(4-5) (1)							
	EJES (A-B)(4-5). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.80	3.47	0.05		0.83	1.00	0.83
	EJES (B-C)(4-5). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.75	3.47	0.05		0.82	1.00	0.82
	EJES (B-C)(4-5). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.76	3.47	0.05		0.83	1.00	0.83
								-
								2.48
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2.48

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	UNIDAD	M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

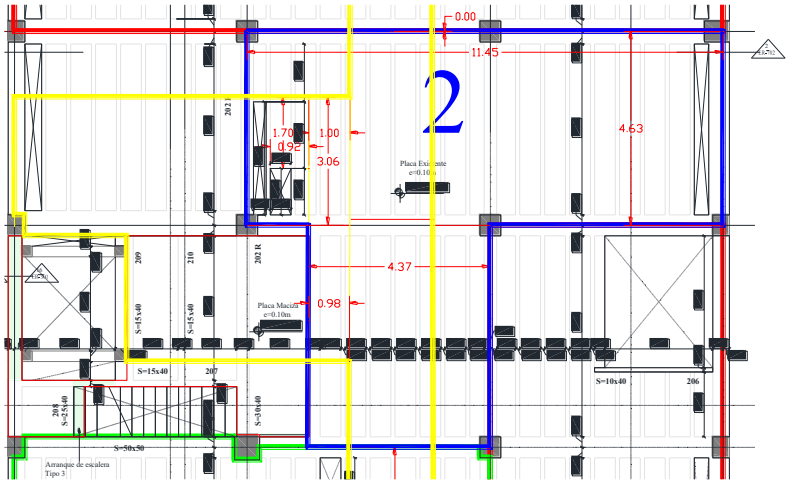

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO3							
	SOBRE PLACA (B-D)(3-4) + (B'-C)(2-3) (2)							
	EJES (B-C)(3-4). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.75	4.63	0.050		1.10	1.00	1.10
	EJES (C-D)(3-4). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.76	4.63	0.050		1.10	1.00	1.10
	EJES (B'-C)(2-3). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.80	4.22	0.050		1.01	1.00	1.01
								-
								3.21
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		5.70

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.10	Concreto recalce placas/Losas/Escaleras. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	UNIDAD: M3	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

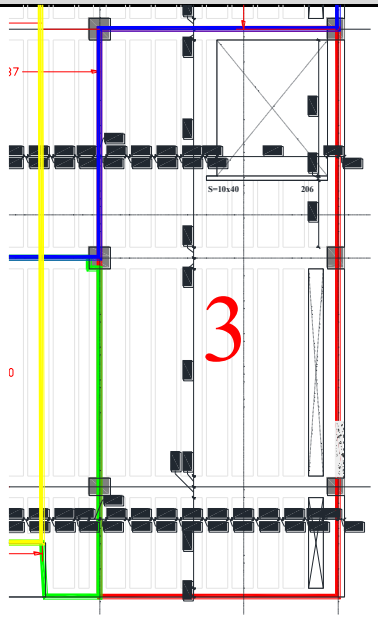

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO3							
	SOBRE PLACA (C-D)(2-3) + (C-D)(1-2) + (C-D)(0-1) (3)							
	EJES (B-C)(2-3). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	5.20	4.80	0.023		0.57	1.00	0.57
	VACIO	3.15	2.60	0.024		0.20	-1.00	-0.20
	EJES (C-D)(1-2). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.80	4.86	0.024		0.56	1.00	0.56
	EJES (C-D)(0-1). DEPRIMIDO ENTRE VIGAS	4.76	2.30	0.023		0.25	1.00	0.25
								-
								1.19
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6.89

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 4.12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	UNIDAD: M3	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

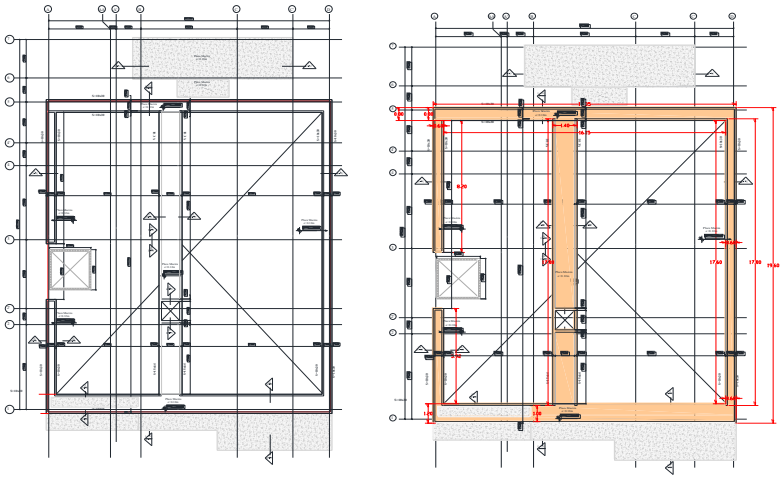

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUO. EJES (1-5)(A-D)							
ER-600	V 402R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 402R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 402R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 409R EJ 5(A-B)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
	V 409R EJ 5(B-C)	5.55	0.20	0.30		0.33	1.00	0.33
	V 409R EJ 5(C-D)	5.30	0.20	0.30		0.32	1.00	0.32
ER-600	V 406R EJE 2'(A-B)	5.27	0.15	0.30		0.24	2.00	0.47
ER-600	V 414R EJE A'(2'-3)	3.58	0.15	0.30		0.16	2.00	0.32
ER-600	V 407R EJE 2''(C'-D)	3.28	0.15	0.30		0.15	2.00	0.30
ER-600	V 419R EJE C'(2-3)	5.00	0.12	0.30		0.18	2.00	0.36
ER- 501	V 301R EJE 2-3 A-B	4.80	0.40	0.20		0.38	1.00	0.38
	EJE (0-1')(A-B). VOLADIZO	5.75	1.10	0.12		0.76	1.00	0.76
	EJE (0-1)(B-C). VOLADIZO	6.00	1.45	0.12		1.04	1.00	1.04
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 1(A-D)	15.25	0.10	0.30		0.46	1.00	0.46
		17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 5(A-D)	17.35	0.10	0.30		0.52	1.00	0.52
		14.75	0.10	0.30		0.44	1.00	0.44
		17.35	1.00	0.12		2.08	1.00	2.08
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE D (1-5)	19.25	0.10	0.30		0.58	1.00	0.58
		17.80	0.10	0.30		0.53	1.00	0.53
		17.60	0.40	0.12		0.84	1.00	0.84
						-		-
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (1-2')	7.02	0.10	0.30		0.21	1.00	0.21
		5.92	0.10	0.30		0.18	1.00	0.18
		5.92	0.40	0.12		0.28	1.00	0.28
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
								-
								14.32
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		14.32

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	**Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.**	**UNIDAD**	**FECHA:**	
4.12		M3		

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	**ESTRUCTURA**

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO











REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (3-5)	8.81	0.10	0.30		0.26	1.00	0.26
		8.21	0.10	0.30		0.25	1.00	0.25
		8.21	0.40	0.12		0.39	1.00	0.39
		0.40	0.10	0.15		0.01	1.00	0.01
ER-600 y ER-602	PASARELA CENTRAL EJE B'(1-5)							
	VIGA VC 001	17.80	0.15	0.64		1.71	2.00	3.42
		17.80	1.10	0.12		2.35	1.00	2.35
	ESCOTILLA	1.10	1.20	0.12		0.16	-1.00	-0.16
	BORDE ESCOTILLA	1.10	0.15	0.20		0.03	2.00	0.07
	PLACA VOLADIZO. EJE 1 (A-B)	5.75	2.25	0.12		1.55	1.00	1.55
								-
								8.14
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**22.45**

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	UNIDAD	FECHA:
	4.12		M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPITULO	ESTRUCTURA	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

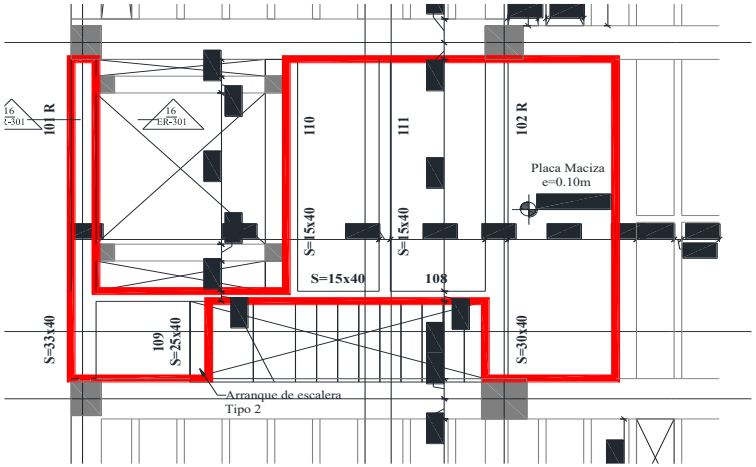

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-300, ER-301	**PLAC 2do PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 101R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 102R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 108 EJ 2(A-B)	5.20	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA 110 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 111 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 109 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
ER-400, ER-401	**PLAC 3ER PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 201R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 202R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 208 EJ 2(A-B)	5.17	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA 210 EJ A'(2-3)	3.45	0.25	0.40		0.35	1.00	0.35
	VIGA 211 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 209 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
ER-500, ER-501	**PLAC 4TO PIS EJES (2-3)(A-B)**							
	VIGA 301R EJ A(2-3)	4.80	0.33	0.40		0.63	1.00	0.63
	VIGA 302R EJ B(2-3)	4.80	0.30	0.40		0.58	1.00	0.58
	VIGA 308 EJ 2(A-B)	5.17	0.15	0.40		0.31	1.00	0.31
	VIGA310 EJ A'(2-3)	3.45	0.25	0.40		0.35	1.00	0.35
	VIGA311 EJ A'(2-3)	3.45	0.15	0.40		0.21	1.00	0.21
	VIGA 309 EJ A'(2-2')	1.15	0.25	0.40		0.12	1.00	0.12
	PLAC E=0.12	3.45	1.26	0.12		0.52	1.00	0.52
		3.45	1.08	0.12		0.45	1.00	0.45
		1.25	1.15	0.12		0.17	1.00	0.17
		4.75	1.43	0.12		0.82	1.00	0.82
	DESCONTAR POR MAYOR CANTIDAD RESPECTO A LO QUE SE PUEDE COBRAR CON EL MODIFICATORIO No. 4							-9.00
								-
								3.29
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		25.75

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 4.17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	UNIDAD: M2	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	COLUMNA 2B CARA 1(VISTA EJE 1). REFUERZ VERTICAL						4.00	4.00
	COLUMNA 2B CARA 1. 16 GRAPAS						32.00	32.00
	CUBIERTA							-
	EJE A ENTRE 3 Y 5. VIGA CANAL						40.00	40.00
	EJE D ENTRE 1-5. VIGA CANAL						178.00	178.00
	EJE 5 ENTRE A-D VIGA CANAL PARTE EXTERIOR VISTA EJE 6						87.00	87.00
	EJE 5 ENTRE A-D VIGA CANAL PARTE INTERIOR ENTRE EJES A-B						7.00	7.00
	EJE 5 ENTRE A-D VIGA CANAL PARTE INTERIOR ENTRE EJES B´Y D						9.00	9.00
	EJE A ENTRE 1´Y 2´ CARA EXTERIOR						36.00	36.00
	EJE A ENTRE 1´Y 2´ CARA INTERIOR						30.00	30.00
	EJE 1 ENTRE A Y B´CARA INTERNA						7.00	9.00
	EJE 1 ENTRE B´Y D CARA INTERNA						9.00	9.00
	PASARELA CENTRAL VIGA VC001 ENTRE EJES 1-2 (DOS VIGAS)						8.00	8.00
	PASARELA CENTRAL VIGA VC001 ENTRE EJES 2-3 (DOS VIGAS)						8.00	8.00
	PASARELA CENTRAL VIGA VC001 ENTRE EJES 3-4 (DOS VIGAS)						12.00	12.00
	PASARELA CENTRAL VIGA VC001 ENTRE EJES 4-5 (DOS VIGAS)						4.00	4.00
	VIGA 402 ENTRE A-B						8.00	8.00
	VIGA 402 ENTRE B-C						8.00	8.00
	VIGA 402 ENTRE C-D						8.00	8.00
	VIGA 409 ENTRE A-B						8.00	8.00
	VIGA 409 ENTRE B-C						8.00	8.00
	VIGA 409 ENTRE C-D						8.00	8.00
	ANCLAJES EN CUBIERTA ENTRE EJE A-B						7.00	7.00
	CUARTO PISO (EJES 2-3 Y A-B´)							
	VIGA 301 R						12.00	12.00
	VIGA 304						4.00	4.00
	VIGA 305						4.00	4.00
	VIGA 302R						11.00	11.00
	VIGA 303						6.00	6.00
	ANCLAJE LOSA						41.00	41.00
	ANCLAJES ESCALERA						7.00	7.00
	VIGA 419R						4.00	4.00
	VIGA 406 R						4.00	4.00
	VIGA 414 R						4.00	4.00
	VIGA 407 R						2.00	2.00
								-
	DESCONTAR POR MAYOR CANTIDAD RESPECTO A LO QUE SE PUEDE COBRAR CON EL MODIFICATORIO No. 4							-98.00
								-
								529.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	529.00

ELABO

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASIRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.:			UNIDAD	FECHA:
4.18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.		KG	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	ESTRUCTURA	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

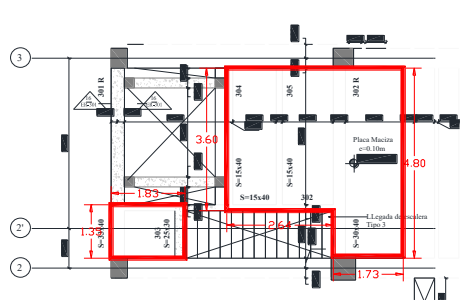

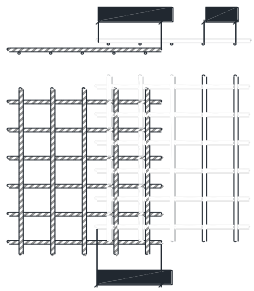











REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 2do PISO. EJES (2'-3)(A-B)							
	Ejes (2-2")(A-A'). MALLA 6MM 15X15	1.83	1.35	2.99		7.39	2.00	14.77
	Ejes (2-2")(A'-B')	3.60	2.64	2.99		28.42	2.00	56.83
	Ejes (2-2")(A'-B')	4.80	1.73	2.99		24.83	2.00	49.66
	PLACA 3er PISO. EJES (2'-3)(A-B)							
	Ejes (2-2")(A-A'). MALLA 6MM 15X15	1.83	1.35	2.99		7.39	2.00	14.77
	Ejes (2-2")(A'-B')	3.60	2.64	2.99		28.42	2.00	56.83
	Ejes (2-2")(A'-B')	4.80	1.73	2.99		24.83	2.00	49.66
	PLACA 4to PISO. EJES (2'-3)(A-B)							
	Ejes (2-2")(A-A'). MALLA 6MM 15X15	1.83	1.35	2.99		7.39	2.00	14.77
	Ejes (2-2")(A'-B')	3.60	2.64	2.99		28.42	2.00	56.83
	Ejes (2-2")(A'-B')	4.80	1.73	2.99		24.83	2.00	49.66
ER-600, ER-601	**CANAL EJE D(1-5) (ES 1). CUBIERTA**							
	Ejes D(1-5). L=17.80. MALLA 6.5 MM 15X1	6.00	0.55	3.52		11.62	6.25	72.55
	CANAL EJE A(3-5) (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes A(3-5). L=8.20. MALLA 6.5 MM 15X15	6.00	0.55	3.52		11.62	2.88	33.42
	CANAL EJE A(1-2') (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes A(1-2'). L=6.02. MALLA 6.5 MM 15X15	6.00	0.55	3.52		11.62	2.11	24.54
	CANAL EJE 5(A-D) (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes 5(A-D). L=17.35. MALLA 6.5 MM 15X1	6.00	0.72	3.52		15.21	6.09	92.57
	CANAL EJE B'(1-5) (ES 1). PASARELA CUBIERTA							
	Ejes D(3-5). L=17.80. MALLA 6.5 MM 15X1	6.00	1.32	3.52		27.88	6.25	174.12
	CANAL EJE 1(A-D) (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes 1(A-D). L=17.35. MALLA 6.5 MM 15X1	6.00	1.12	3.52		23.65	6.09	144.00
	VOLADIZO EJE 1(A-B) (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes 1(A-B). L=5.75. MALLA 6.5 MM 15X15	6.00	2.20	3.52		46.46	2.02	93.74
	VOLADIZO EJE 1(B-C) (ES 1). CUBIERTA							
	Ejes 1(B-C). L=6.15. MALLA 6.5 MM 15X15	6.00	1.40	3.52		29.57	2.16	63.80
								1,062.54
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**1,062.54**

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.127		UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

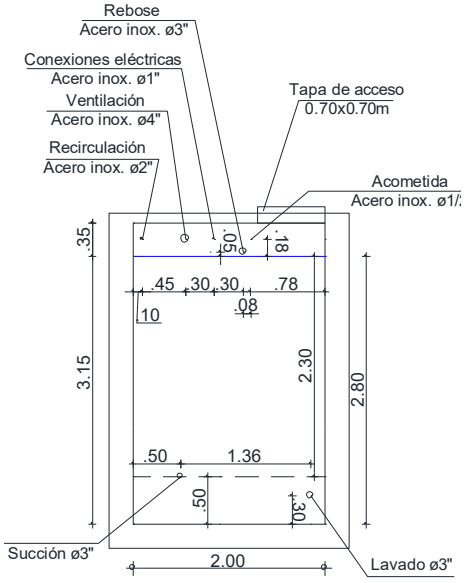

NIPLES PASAMURO EN TANQUE DE AGUA POTABLE

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		TANQUE DE AGUA POTABLE		3				3	3
									3.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.401		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	und por piso	Alto				
	2 PISO		3				3	3
								3.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	5.403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2 PISO		1				1	1
									1.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.601		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

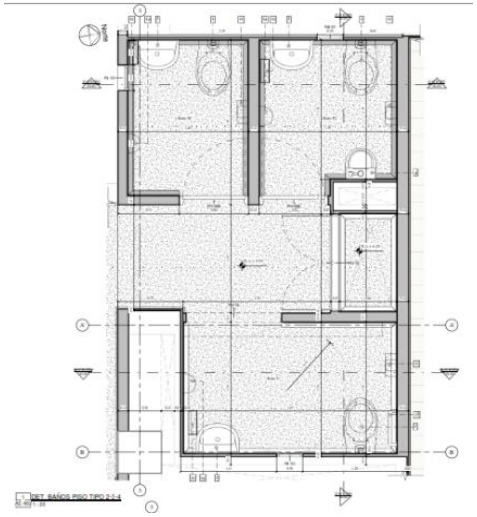DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 PISO		3				3	9
		3 PISO		1				1.00	1
									
									10.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	10.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.602		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



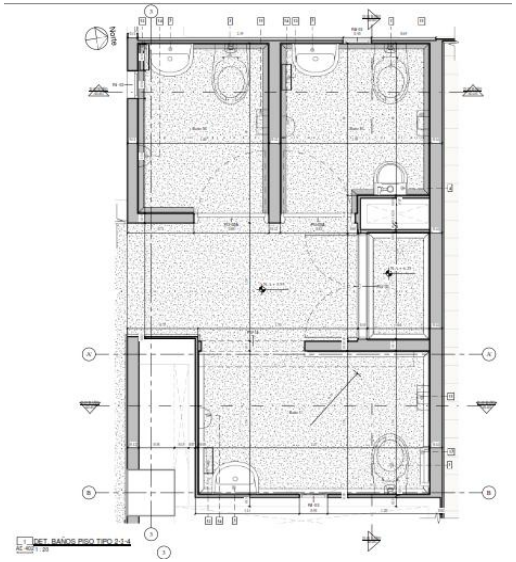

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	und por piso	Alto				
	2-3-4 PISO		3				3	9
	3 PISO		1				1.00	1.00
								10.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	10.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	5.604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

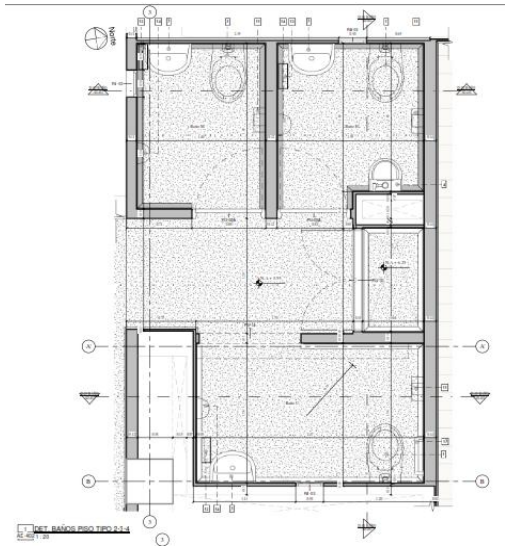



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	und por piso	Alto				
	2-3-4 PISO		1				3	3
								3.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	5.605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

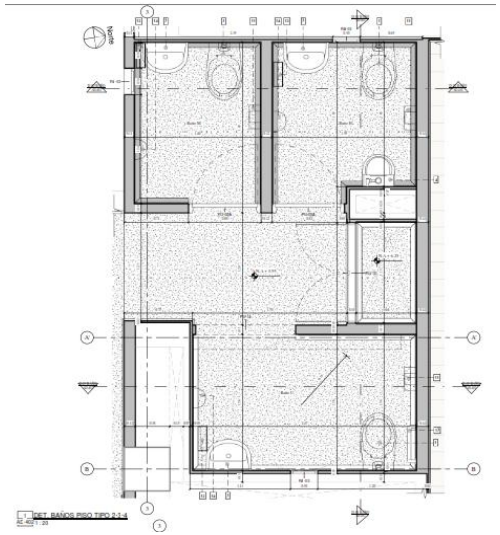DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 PISO		1				3	3
									3.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3.00

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
5.606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS SANITARIAS

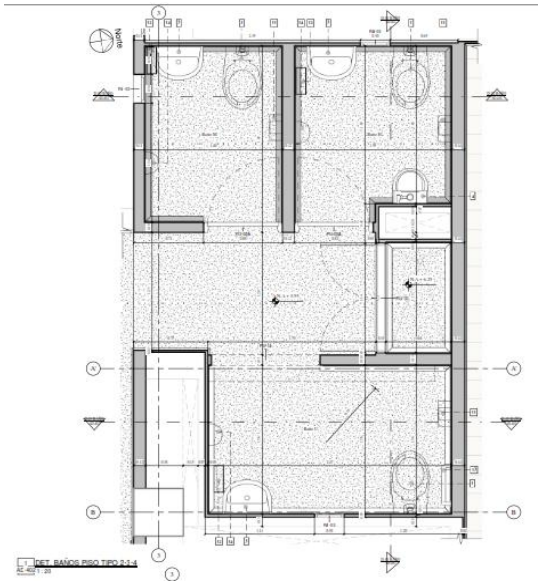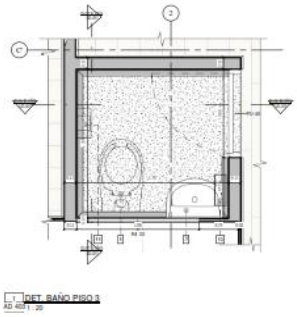DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones						
			Longitud	und por piso	Alto	Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
 1 DET. BAÑOS PISO TIPO 2-3-4 AD 402 1 : 20		2-3-4 PISO		3				3	**9**
		3 PISO		**1**				1.00	1.00
 2 DET. BAÑO PISO 3 AD 402 1 : 20									
									10.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**10.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.701		ML		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 PISO (8.5MTS) POR PISO		8.5				3	**25.5**
									25.50
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**25.50**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	TUBERÍA PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.801		ML		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 PISO (3,25MTS) POR PISO		3.25				3	9.75
									
									9.75
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		9.75

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	5.804		UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 PISO		14				3	42
									42.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	42.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.805		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

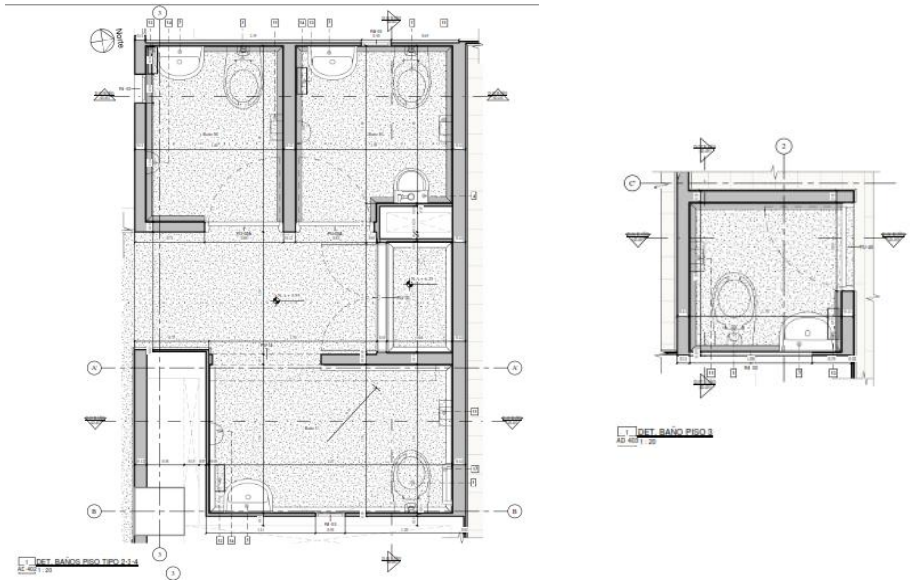

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	und por piso	Alto				
	2-3-4 piso		3				3	**9**
	3 PISO		**1**				1.00	1.00
								10.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**10.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
5.806		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	und por piso	Alto				
		2-3-4 piso		18				3	54
									54.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	54.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	UNIDAD: M3	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	EXCAVACIONES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		Excavacion para inspeccion de cajas en el 1 piso.	31	0.4	0.75		9.3		9.3
									
									9.30
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		9.30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 5.123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO		UNIDAD M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	EXCAVACIONES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		Relleno de excavacion para inspeccion de cajas en el 1 piso.	31	0.4	0.75		9.3		9.3
									
									9.30
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	9.30

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	6.101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	SALIDAS DE ALUMBRADO

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO







REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJE 5-4 Y B-C						6	**6**
	EJE 4-3 Y B-C						6	**6**
	EJE 3-2 Y B-C						6	**6**
	EJE 2-1 Y B-C						6	**6**
						24.6		
	TERCER PISO							
	EJE 5-4 Y B-C						2	**2**
	EJE 4-3 Y B-C						2	**2**
	EJE 3-2 Y B-C						2	**2**
	EJE 2-1 Y B-C						2	**2**
						8.7		
								32.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**32.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 6.901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	UNIDAD: ML	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	DUCTO PORTACABLES CERRADO

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJE 5-4 Y B-C	3.6					1	**3.6**
	EJE 4-3 Y B-C	3.6					1	**3.6**
	EJE 3-2 Y B-C	4.5					1	**4.5**
	EJE 2-1 Y B-C	4.5					1	**4.5**
	TERCER PISO							
	EJE 5-4 Y B-C	3.6					1	**3.6**
	EJE 4-3 Y B-C	3.6					1	**3.6**
	EJE 3-2 Y B-C	4.5					1	**4.5**
	EJE 2-1 Y B-C	4.5					1	**4.5**
								32.40
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**32.40**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7.201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UND	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		BAJANTE DE 2 -3 y 4 PISO							
								5.90	5.90
									5.90
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		5.90

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
7.202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		BAJANTE DE 2 -3 y 4 PISO							
								13.00	13.00
									13.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	13.00



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7.205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPITULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO							
								33.25	33.25





	33.25
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	33.25

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7.206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: UND	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDIO PISO							
								145	145.00
									145.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	145.00



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASERO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7.207	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ML	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO	36.85					1	36.85
									36.85
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	36.85

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	7.208	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO	28					1	28
								28.00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		28.00

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
7.209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO	9.73					1	**9.73**
								9.73
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**9.73**

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	7.21	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		SEGUNDO PISO						55	21

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	7.211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	RED INTERNA	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TUBERIA 2							19.54
								19.54
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		19.54

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
7.212		ML		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (ml)	Área total (m3)		
		SEGUNDO PISO							89
									89.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	89.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander				
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER				
	ÍTEM No.:	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los	UNIDAD	FECHA:	
	7.218		und		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		instalacion de gabinetes en 2 y 3 piso						2	2
									
									2.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	2.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:	
7.226		ML		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
 		2 piso						3	3
		3 piso						1	1
									4.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:	
7.227		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		2 PISO						36	**36**
									36.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**36.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 7.229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD: UND	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		2 PISO						29	**29**
									29.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**29.00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD	FECHA:	
7.230		UND		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		2 PISO						20	20

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 7.231	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UNIDAD: UND	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	RED INTERNA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (ml)	Área total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		2 PISO						10	20

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
8.1		M2		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	SEGUNDO PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 1	7.95		2.30	18.29			18.29
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	7.00		2.30	16.10			16.10
	EJES (A-B´) Y (1-2. MURO 12	1.35		2.30	3.11			3.11
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 13	0.70		2.30	1.61			1.61
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 14	1.35		2.30	3.11			3.11
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 2	3.49		2.30	8.02			8.02
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 3	2.00		2.30	4.60			4.60
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 4	7.50		2.30	17.25			17.25
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 5	1.50		2.30	3.45			3.45
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 6	2.82		2.30	6.49			6.49
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 7				-			-
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 8	3.40		2.30	7.82			7.82
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 9	2.00		2.30	4.60			4.60
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 15	1.88		2.30	4.32			4.32
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 16	1.23		2.30	2.83			2.83
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								101.58
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		101.58

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander


CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
8.1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

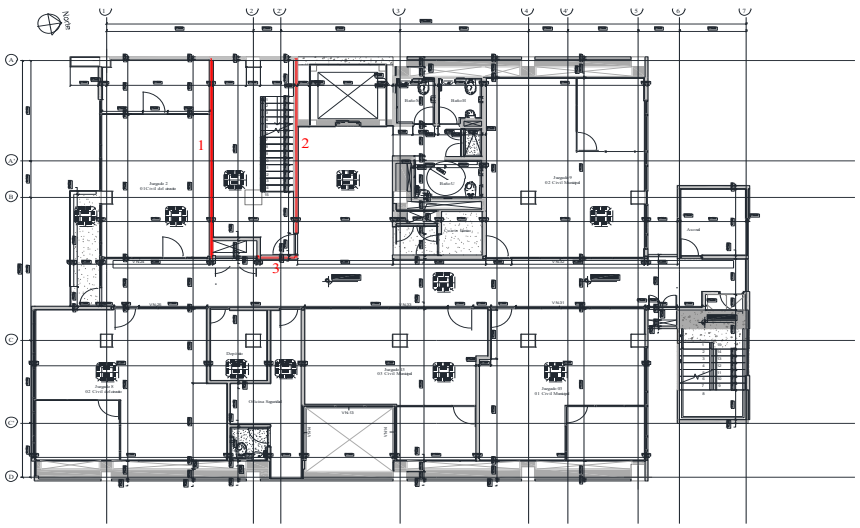

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	TERCER PISO							
	EJES (A-B´) Y (1-3). MURO 1	7.90		2.20	17.38			17.38
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO2	6.78		2.20	14.92			14.92
	EJES (A-B´) Y (1-2. MURO 12	1.30		2.20	2.86			2.86
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								35.16
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**136.74**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Suministro e instalación de cubierta liviana, sistema compuesto de cubierta en teja metálica sin traslapo tipo "Metal roof Grado 40" o similar, con cama de	UNIDAD	FECHA:
	9.4	aislamiento termoacústico en poliuretano y capa superior de impermeabilización con membrana TPO. Incluye estructura y todos los materiales, insumos,	M2	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	CUBIERTA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

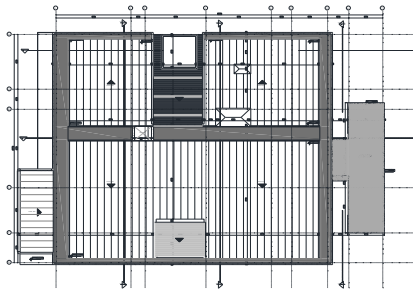

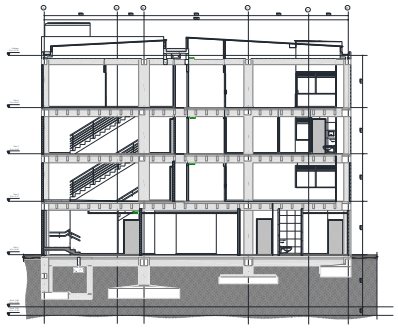

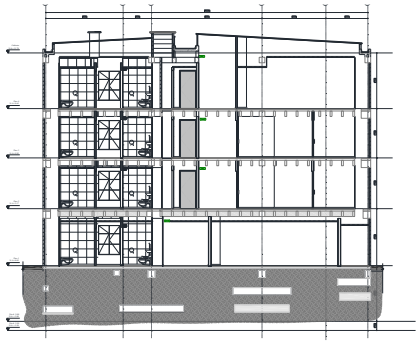

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CUBIERTA							
A-105, A-301, A-303	EJES (B'-C')(1-2'). CUBIERTA	8.82	6.30		55.57		1.00	55.57
	EJES (B'-C')(2'-3). CUBIERTA	6.17	3.39		20.92		1.00	20.92
	EJES (B'-C')(3-5). CUBIERTA	8.82	8.25		72.77		1.00	72.77
	EJES (A-B')(1-2'). CUBIERTA	6.04	6.50		39.26		1.00	39.26
	EJES (A-B')(3-5). CUBIERTA	8.37	6.50		54.41		1.00	54.41
	EJES (B'-D)(0-1). CUBIERTA	7.15	2.80		20.02		1.00	20.02
	DESCONTAR EL 70%							-184.05
								78.88
								78.88

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ITEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	9.8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	CUBIERTA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

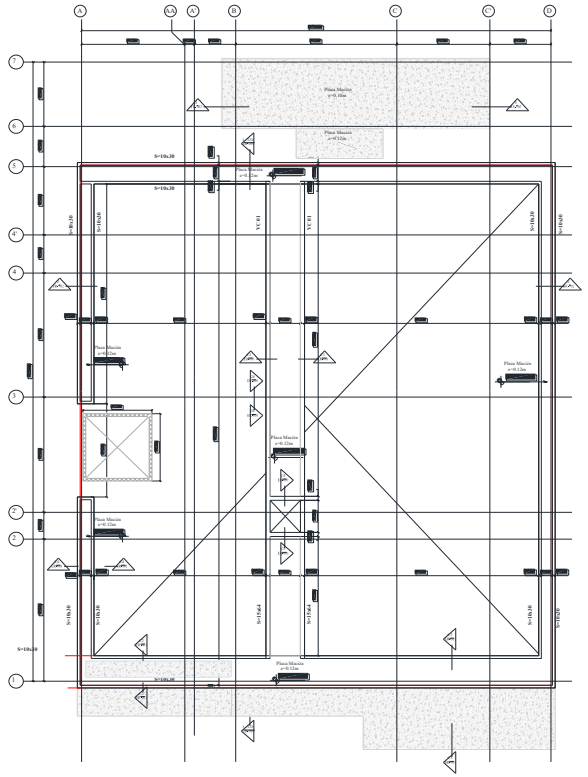

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (mL)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 1(A-D). Cama	17.15	0.60		10.29		1.00	10.29
	Borde Exterior	17.35	0.30		5.21		1.00	5.21
	Borde interior	15.24	0.30		4.57		1.00	4.57
					-			
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE 5(A-D). Cama	17.15	0.60		10.29		1.00	10.29
	Bordilo exterior	17.15	0.30		5.15		1.00	5.15
	Bordilo interior	14.75	0.30		4.43		1.00	4.43
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE D (1-5). Cama	18.65	0.40		7.46		1.00	7.46
	Bordilo exterior	19.65	0.30		5.90		1.00	5.90
	Bordilo interior	18.65	0.30		5.60		1.00	5.60
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (1-2´). Cama	5.92	0.40		2.37		1.00	2.37
	Bordilo exterior	6.77	0.30		2.03		1.00	2.03
	Bordilo interior	5.92	0.30		1.78		1.00	1.78
	Tapa	0.40	0.30		0.12		1.00	0.12
ER-600 y ER-602	VIGA CANAL EJE A (3-5)	8.21	0.40		3.28		1.00	3.28
	Bordilo exterior	8.81	0.10		0.88		1.00	0.88
	Bordilo interior	8.21	0.40		3.28		1.00	3.28
	Tapa	0.40	0.10		0.04		1.00	0.04
ER-600 y ER-602	PASARELA CENTRAL EJE B'(1-5). Cama	16.70	1.10		18.37		1.00	18.37
	Bordillos	17.80	0.30		5.34		2.00	10.68
	BORDE ESCOTILLA	1.10	0.30		0.33		2.00	0.66
	EJE 1 (A-D). VOLADIZO	10.38	1.05		10.90		1.00	10.90
								-
								-
								113.27
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	113.27

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: 10.9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD M2	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	PAÑETES, REVOQUES Y RESANES

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

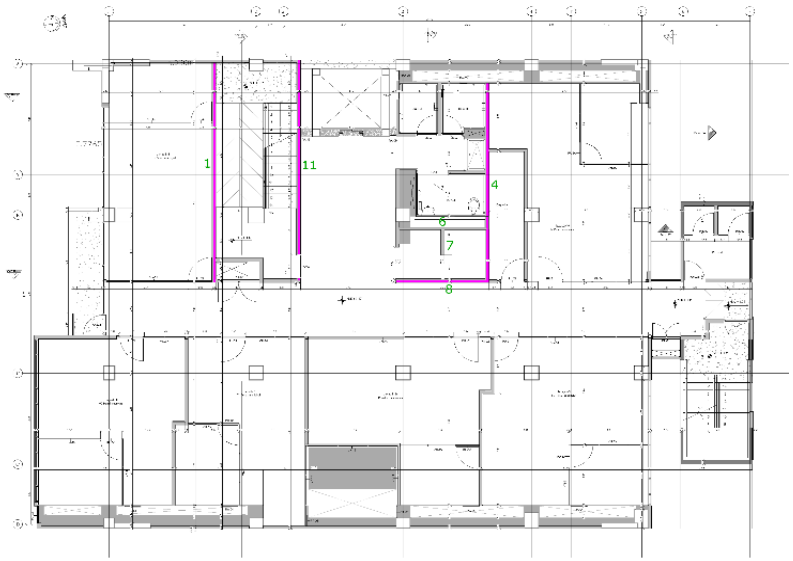

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	SEGUNDO PISO							
	EJE S (A-B´) Y (1-2) . MURO 1	7.95		2.30	18.29		2.00	36.57
	EJES (A-B´) Y (3-4). MURO 8	3.40		2.30	7.82		2.00	15.64
	EJE (A-B´) Y (3-4). MURO 4	7.50		2.30	17.25		1.00	17.25
	EJES (A-B´) Y (1-2). MURO 11	7.00		2.30	16.10		1.00	16.10
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								85.56
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		85.56

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:		**UNIDAD**	**FECHA:**
NP03	**RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.**	ML	

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

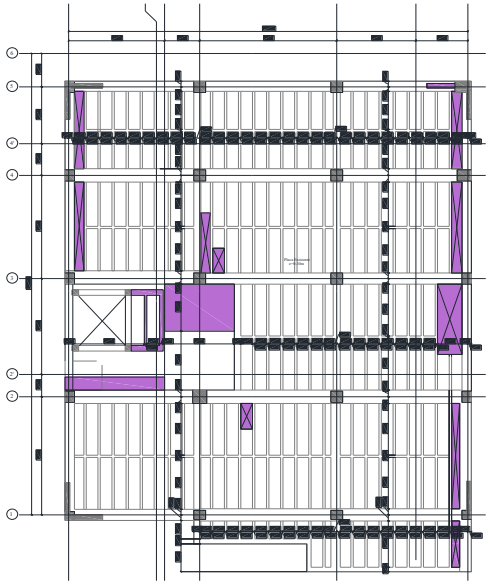

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CIELO RASO 1ER PISO							
	EJE 1(B-B")	0.90					7.00	6.30
	EJE 1(B"-D)	2.20					10.00	22.00
	EJES (1-2)(C-D)	4.85					9.00	43.65
	EJES (1-2)(B-C)	4.85					9.00	43.65
	EJES (1-2)(A-B)	4.85					8.00	38.80
	EJES (2-3)(C-D)	4.82					5.00	24.10
	EJES (2-3)(B-C)	4.82					7.00	33.74
	EJES (3-4)(C-D)	3.83					9.00	34.47
	EJES (3-4)(B-C)	3.83					9.00	34.47
	EJES (3-4)(A-B)	3.83					3.00	11.49
	EJES (4-5)(C-D)	3.82					10.00	38.20
	EJES (4-5)(B-C)	3.82					9.00	34.38
	EJES (4-5)(A-B	3.82					9.00	34.38
								-
								399.63
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**399.63**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

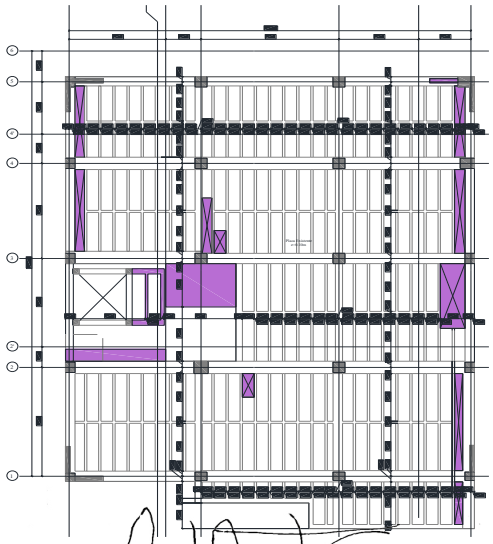

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	CIELO RASO 2DO PISO							
	EJE 1(B-B")	0.90					7.00	6.30
	EJE 1(B"-D)	2.20					10.00	22.00
	EJES (1-2)(C-D)	4.82					8.00	38.56
	EJES (1-2)(B-C)	4.82					5.00	24.10
		3.40					3.00	10.20
	EJES (1-2)(A-B)	1.30					3.00	3.90
		4.82					5.00	24.10
	EJES (2-3)(C-D)	4.84					4.00	19.36
	EJES (2-3)(B-C)	4.84					6.00	29.04
	EJES (3-4)(C-D)	3.83					8.00	30.64
	EJES (3-4)(B-C)	3.83					8.00	30.64
	EJES (3-4)(A-B)	3.83					3.00	11.49
	EJES (4-5)(C-D)	4.84					8.00	38.72
	EJES (4-5)(B-C)	4.84					8.00	38.72
	EJES (4-5)(A-B	4.84					8.00	38.72
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								366.49
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		766.12

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP03	RETIRO CASETON EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

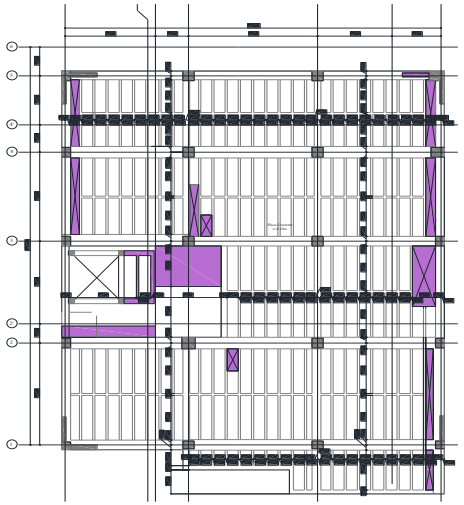DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		CIELO RASO 3ER PISO							
		EJE 1(B-B")	0.90					7.00	6.30
		EJE 1(B"-D)	2.20					10.00	22.00
		EJES (1-2)(C-D)	4.82					8.00	38.56
		EJES (1-2)(B-C)	4.82					5.00	24.10
			3.40					3.00	10.20
		EJES (1-2)(A-B)	1.30					3.00	3.90
			4.82					5.00	24.10
		EJES (2-3)(C-D)	4.84					4.00	19.36
		EJES (2-3)(B-C)	4.84					6.00	29.04
		EJES (3-4)(C-D)	3.83					8.00	30.64
		EJES (3-4)(B-C)	3.83					8.00	30.64
		EJES (3-4)(A-B)	3.83					3.00	11.49
		EJES (4-5)(C-D)	4.84					8.00	38.72
		EJES (4-5)(B-C)	4.84					8.00	38.72
		EJES (4-5)(A-B	4.84					8.00	38.72
		DESCONTAR PAGADO EN ACTA 2							-702.53
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-336.04
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		430.08

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		**UNIDAD**	**FECHA:**
	NP07	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicacion de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava comun de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2	

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	**NO PREVISTOS**	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		**PLACA 4 PISO**							
		EJE 1-2 Y A-D	15.75	4.90		77.18			77.18
		EJE A-5	0.52	0.40		0.21			0.21
		EJE A-4	0.50	0.58		0.29			0.29
		EJE 3" -4 Y B-D	1.03	10.58		10.90			10.90
		EJE 3´Y 3" Y B-D	1.63	10.08		16.43			16.43
		EJE 3 Y 3´Y B-D	1.11	9.50		10.55			10.55
		EJE 3 Y C´-D	0.30	2.62		0.79			0.79
		EJE 3-4 Y B" D	6.42	5.74		36.85			36.85
		EJE 1-2 Y A-B´	7.13	5.68		40.50			40.50
		EJE 1-2 Y B´-D	8.85	5.68		50.27			50.27
		EJE 0-1 Y B-B´	4.65	1.14		5.30			5.30
		EJE 0-1 Y B"-D	5.94	2.20		13.07			13.07
		EJE 3-4 Y A-B	4.40	5.10		22.44			22.44
		EJE C´-D Y 2-3	1.65	2.80		4.62			4.62
		PLACA 3 PISO AREA DE BAÑO							
		EJE 3-4 Y A-B	4.40	5.10		22.44			22.44
									-
		PLACA 2 PISO AREA DE BAÑO							-
		EJE 3-4 Y A-B	4.40	5.10		22.44			22.44
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									334.26
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**334.26**

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
NP08	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

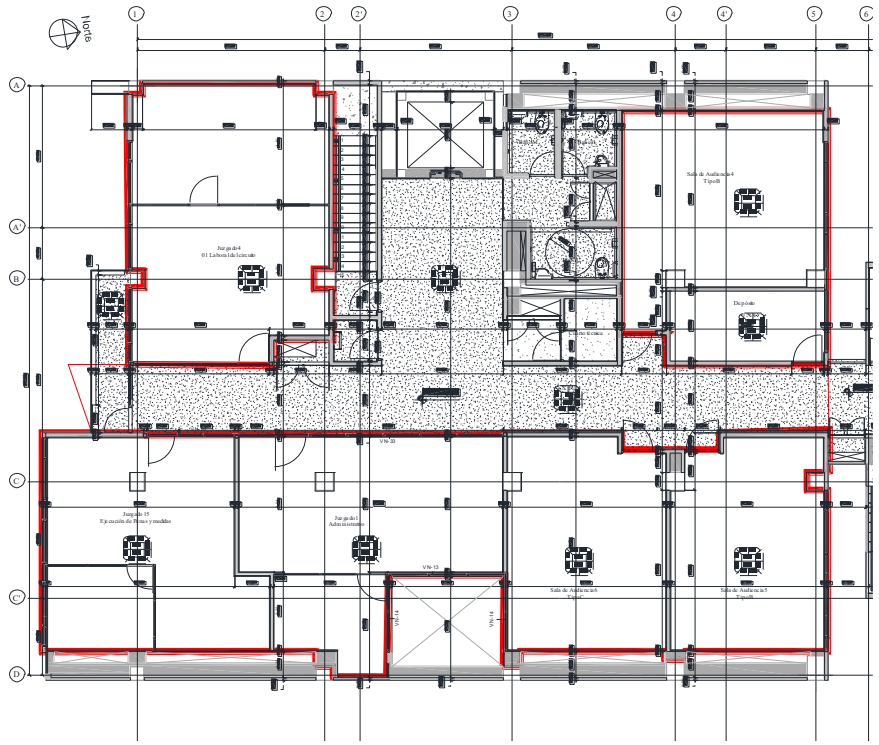

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PLACA 4 PISO							
	EJES (3"-5) (A-B')	5.84	6.49		37.90		1.00	37.90
		4.56	0.90		4.10		1.00	4.10
	EJES (B'-D) (1-5)	22.24	6.33		140.78		1.00	140.78
	EJES (C'-D) (2'-3)	3.15	2.20		6.93		-1.00	-6.93
	EJES B' (3'-4')	2.77	0.48		1.33		-1.00	-1.33
	EJES (C"-D)(2'-2")	1.41	0.78		1.10		1.00	1.10
	EJES (B-B') (1-2)	4.78	2.06		9.85		1.00	9.85
		1.48	0.50		0.74		1.00	0.74
		2.25	0.50		1.13		1.00	1.13
		3.65	0.83		3.03		1.00	3.03
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								190.37
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		190.37

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PRIMER PISO							
	COLUMNA 2B. 1ra CARA	2.95	0.40	0.12		0.14	1.00	0.14
	COLUMNA 2 B . 2da CARA	2.95	0.40	0.05		0.06	1.00	0.06
	COLUMNA 1A. 1ra CARA	3.6	0.45	0.05		0.08	1.00	0.08
	COLUMNA 1C. 1ra CARA	3.30	0.25	0.05		0.04	1.00	0.04
	COLUMNA 1C. 2da CARA	3.00	0.25	0.05		0.04	1.00	0.04
	MURO PANTALLA 5A. 1ra CARA	4.00	0.40	0.04		0.06	1.00	0.06
	MURO PANTALLA 5A. 2da CARA	4.00	0.37	0.04		0.06	1.00	0.06
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								0.48
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0.48

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP011	Demolición controlada de superficies de concreto para llegar a aceros de refuerzo en elementos a reforzar	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO













REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
PRIMER PISO								-
COLUMNA 2B. 1ra CARA	2.95	0.40	0.12		0.14	1.00	0.14	0.14
COLUMNA 2 B . 2da CARA	2.95	0.40	0.05		0.06	1.00	0.06	0.06
COLUMNA 1A. 1ra CARA	3.6	0.45	0.05		0.08	1.00	0.08	0.08
COLUMNA 1C. 1ra CARA	3.30	0.25	0.05		0.04	1.00	0.04	0.04
COLUMNA 1C. 2da CARA	3.00	0.25	0.05		0.04	1.00	0.04	0.04
MURO PANTALLA 5A. 1ra C	4.00	0.40	0.04		0.06	1.00	0.06	0.06
MURO PANTALLA 5A. 2da C	4.00	0.37	0.04		0.06	1.00	0.06	0.06
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12		ML	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
			2.5					21.00	52.50
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP018	Suministro e instalación de poste de concreto de 12mts x 1500kg. Trabajos con cuadrilla de línea energizada	UNIDAD	M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	30. NO PREVISTOS	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

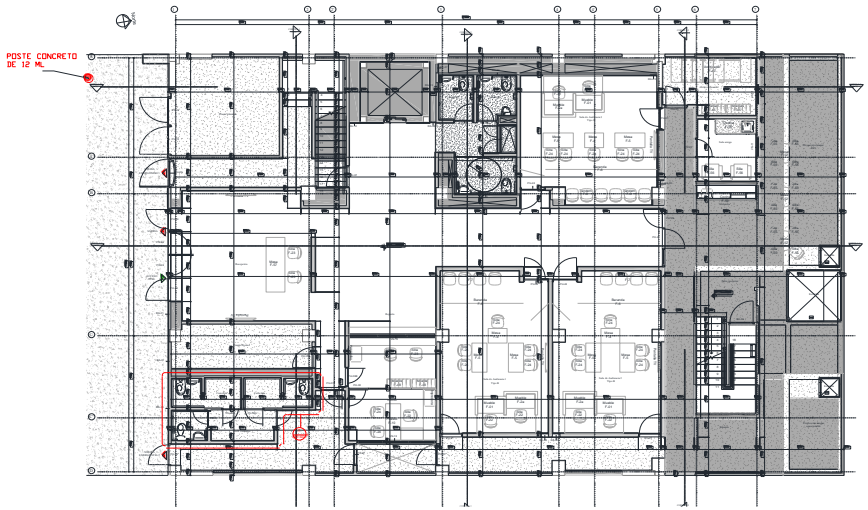

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	EDIFICIO ANTIGUO							
	ANDÉN FRENTE a EJES (A-B). POSTE						1.00	1.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								1.00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP024	Suministro e instalacion de transformador trifásico convencional de 150 KVA 13200/220-127V. Incluye estructura para montaje de equipo separado de fachada para cumplimiento de distancias de seguridad.	UNIDAD	M3	FECHA:

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	30. NO PREVISTOS	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		EDIFICIO ANTIGUO							
		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN POSTE						1.00	1.00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1.00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1.00



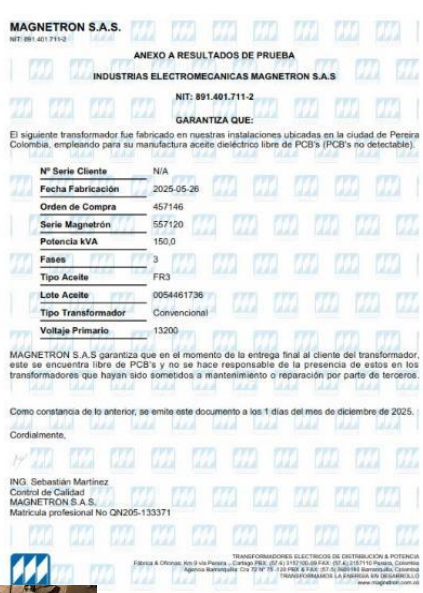



ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	UNIDAD: M3	FECHA:	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO









REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	ZAPATA EJE A	1.4	1.4	1.3		2.55	1.00	2.55
	VIGA CONTRA PESO ENTRE EJE A-A´Y 7	2.8	0.6	0.6		1.01	1.00	1.01
	BLOQUE DE CONCRETO EJE 7-8	1.20	1.4	1.3		2.18	1.00	2.18
	VIGA DE PARED ENTRE EJE 7-8 Y A	4.00	0.6	0.6		1.44	2.00	2.88
	COLUMNA	1.1	0.45	0.5		0.25	1.00	0.25
	VIGA DE PARED EJE A-B Y 8	5.3	0.4	0.3		0.64	2.00	1.27
								-
	ZAPATA 2 EJE B-8	1.4	1.4	1.3		2.55	1.00	2.55
	VIGA DE CONTRAPESO EJE B ENTRE 8-	3.4	0.7	0.7		1.67	1.00	1.67
	COLUMNA	1.1	0.45	0.5		0.25	1.00	0.25
	VIGA EJE B-C Y 8	5.55	0.4	0.3		0.67	2.00	1.33
	ZAPATA 3 EJE C - 8	1.4	1.4	1.3		2.55	1.00	2.55
	COLUMNA	1.1	0.45	0.5		0.25	1.00	0.25
	VIGA DE CONTRAPESO DE EJE C ENTRE	3.2	0.7	0.7		1.57	1.00	1.57
	VIGA EJE C-D Y 8	5.30	0.4	0.3		0.64	2.00	1.27
	ZAPATA 4 EJE D - 8	1.4	1.4	1.3		2.55	1.00	2.55
	COLUMNA	1.1	0.45	0.5		0.25	1.00	0.25
	VIGA DE CONTRAPESO ENTRE ZAPATA	3	0.7	0.7		1.47	1.00	1.47
	VIGA EJE D Y 7-8	5.50	0.4	0.3		0.66	2.00	1.32
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								27.15
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		27.15

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	UNIDAD	FECHA:	
		M3		

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	Ejes (A-A´) y (3-4)							
	RELLENO 2 PISO	2.90	3.50	0.30		3.05		3.05
	RELLENO 3 PISO	2.90	3.50	0.20		2.03		2.03
	RELLENO 4 PISO	2.90	3.50	0.20		2.03		2.03
	Ejes (C´-D) y (2´-3)					-		-
	RELLENO 3 PISO	1.65	2.80	0.20		0.92		0.92
		0.20	3.15	0.20		0.13		0.13
	RELLENO 4 PISO					-		-
		1.65	2.80	0.20		0.92		0.92
		0.20	3.15	0.20		0.13		0.13
								9.21
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		9.21

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP039	suministro e instalacion cinta PVC O22 o similar	M3	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	NO PREVISTOS

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		TANQUE DE AGUA POTABLE							
			3.95					2.00	7.90
			2.16					2.00	4.32
									12.22
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		12.22

ELABORO:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044

Bogotá, 5 de diciembre de 2025

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA.
Ing. Jonathan Bautista
Supervisión cto
PALACIO DE JUSTICIA, CARRERA 12 No. 12 - 43
Cúcuta, Norte de Santander

Referencia:

1. **CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025**
   "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
2. **CONTRATO INTERVENTORIA C-020 DE 2025**
   "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
3. **ASUNTO: CERTIFICACIÓN AVAL ANTICIPO**

Yo, JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ, actuando como interventor para el contrato de obra N. C-019 de 2025; para ejecución del proyecto "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER", me permito certificar que, he revisado la documentación del anticipo correspondiente al patrimonio Autónomo Anticipo Consorcio Adecuaciones Cúcuta- Código 316300, administrado por la Fiduciaria Popular S.A.

De acuerdo con la información emitida por la Fiduciaria, se consta que durante el periodo de octubre se registraron rendimientos financieros por valor de $ 5,543,584,18, sin que se evidencien inconsistencia o movimientos no autorizados en el manejo de los recursos del anticipo.

Por lo anterior, la interventoría avala la documentación presentada y certifica que la información financiera suministrada corresponde a los movimientos del fondo fiduciario destinados a la administración del anticipo del contrato mencionado.

En constancia, se firma el día 05 de diciembre de 2025 a solicitud de la parte interesada, para los fines pertinentes.

ARQ. JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Interventor

2002 JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ ARQUITECTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Octubre 2025 **al** 31 Octubre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXX6067-8

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Octubre 2025		$ 1.286.333.925,88
Aportes	$ 0,00	
Retiros	$ -334.298.418,68	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -659.693,17	
Rendimientos	$ 5.543.584,18	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 31 Octubre 2025		$ 956.919.398,21

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/10/2025 al 31/10/2025	F NEG FIDU	14.039,002442	91.625,735602	14.117,334343	67.783,292154	956.919.398,21

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/10/2025	SALDO ANTERIOR		1.286.333.925,88	14.039,002442	91.625,735602	1.286.333.925,88
03/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-12.058,401683	-169.375.127,00	14.046,233610	79.520,163901	1.116.958.798,88
03/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.198,485918	-44.926.680,41	14.046,233610	76.321,677983	1.072.032.118,47
03/10/2025	GMF-4x1000	-12,793944	-179.706,72	14.046,233610	76.308,884039	1.071.852.411,75
03/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-783,920965	-11.011.137,00	14.046,233610	75.524,963075	1.060.841.274,75
03/10/2025	GMF-4x1000	-3,135684	-44.044,55	14.046,233610	75.521,827391	1.060.797.230,20
03/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.810,711860	-53.526.149,00	14.046,233610	71.711,115531	1.007.271.081,20
03/10/2025	GMF-4x1000	-15,242848	-214.104,60	14.046,233610	71.695,872683	1.007.056.976,60
08/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3.279,166539	-46.108.982,00	14.061,189469	68.340,448488	960.947.994,60
08/10/2025	GMF-4x1000	-13,116666	-184.435,93	14.061,189469	68.327,331821	960.763.558,67
09/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-664,808110	-9.350.343,27	14.064,725041	67.645,347679	951.413.215,40
09/10/2025	GMF-4x1000	-2,659232	-37.401,37	14.064,725041	67.642,688446	951.375.814,03

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2,00%	$1.789.602.242.082,79

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	8.149	8.747	8.886	8.813	10.222	11.620	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F ANTICIPOS	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Octubre 2025 **al** 31 Octubre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6067-8

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F INV DIREC	7.508	8.104	8.242	8.169	9.570	10.959	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F NEG FIDU	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
OFICIAL ESPECIAL	8.041	8.640	8.778	8.705	10.113	11.509	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA - RESERVA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Octubre 2025 **al** 31 Octubre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6066-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Octubre 2025		$ 5.628.700,74
Aportes	$ 1.200.000,00	
Retiros	$ 0,00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0,00	
Rendimientos	$ 37.871,44	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 31 Octubre 2025		$ 6.866.572,18

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/10/2025 al 31/10/2025	F NEG FIDU	14.039,002442	400,933098	14.117,334343	486,392970	6.866.572,18

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/10/2025	SALDO ANTERIOR		5.628.700,74	14.039,002442	400,933098	5.628.700,74
07/10/2025	APORTES	85,367120	1.200.000,00	14.056,934412	485,788760	6.828.700,74

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F NEG FIDU	2,00%	$1.789.602.242.082,79

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	8.149	8.747	8.886	8.813	10.222	11.620	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F ANTICIPOS	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F INV DIREC	7.508	8.104	8.242	8.169	9.570	10.959	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F NEG FIDU	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA
P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA - RESERVA
CR 7 156 10 OF 1707
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 316300

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Octubre 2025 **al** 31 Octubre 2025 **Número de Encargo:** XXXXXXX6066-0

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
OFICIAL ESPECIAL	8.041	8.640	8.778	8.705	10.113	11.509	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA POPULAR S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ANTICIPO CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
CODIGO 316300
NIT. 830.053.691-8

INFORMA:

Que en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos celebrado entre **CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA** y **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, suscrito el día 1 de agosto de 2025, denominado **PATRIMONIO AUTÓNOMO ANTICIPO CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA CODIGO – 316300** constituido para la administración del anticipo derivado del Contrato No **C - 019 DE 2025** , cuyo objeto es: *"(...) "***REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTEDE SANTANDER** *" (...)"* Se registraron en el fondo fiduliquidez No 70083606067 en el cual se administran los recursos del anticipo, los rendimientos financieros que se relacionan a continuación:

PERIODO	RENDIMIENTOS GENERADOS
Octubre 2025	5,543,584,18
TOTAL	**5,543,584,18**

Conforme a lo anterior, informamos que los rendimientos generados antes mencionados fueron girados el 11 de Noviembre de 2025 por sistema Sebra en la cuenta corriente del banco de la Republica No 6101109-4 a favor de la Direccion del Tesoro Nacional de acuerdo con la instrucción que se recibió del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO** (Entidad Otorgante).

Se expide en la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del mes de Noviembre de 2025, por solicitud del Fideicomitente.

Cordialmente,

DIANA KARINA ARIAS AVELLANEDA
Coordinador de Negocios Fiduciarios

Elaboro: Leidy Michell Vergara Vasquez
Adjunto: Extracto Bancario, soporte bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores;

Martha Yolanda García, identificada con C.C. 39.658.586 de Bogotá D.C. en mi calidad de contadora del CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificado con Nit. 901.961.696 – 7 me permito certificar que durante el periodo del mes de OCTUBRE de 2025, se presentaron los siguientes movimientos en el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA cuyo número de identificación es 316300 como se puede evidenciar en los extractos adjuntos; además el patrimonio autónomo antes citados genero rendimientos financieros por $5,543,584.18 los que la fiduciaria consignó según instrucciones de la entidad.

Fecha	CONCEPTOS	VALOR RETIROS	VALOR RENDIMIENTOS	SALDO
31/08/2024	SALDO INICIAL			$ 2,240,195,696.00
31/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 1,906,102.04	$ 2,242,101,798.04
10/09/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$ 1,906,102.04		$ 2,240,195,696.00
10/09/2025	4X1000	$ 7,624.41		$ 2,240,188,071.59
10/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 1	$ 820,636,488.98		$ 1,419,551,582.61
24/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 2	$ 142,000,000.00		$ 1,277,551,582.61
24/09/2025	4X1000	$ 568,000.00		$ 1,276,983,582.61
30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 9,350,343.27	$ 1,286,333,925.88
3/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 3	$ 278,839,093.41		$ 1,007,494,832.47
3/10/2025	4X1000	$ 437,855.87		$ 1,007,056,976.60
8/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 4	$ 46,108,982.00		$ 960,947,994.60
8/10/2025	4X1000	$ 184,435.93		$ 960,763,558.67
9/10/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$ 9,350,343.27		$ 951,413,215.40
9/10/2025	4X1000	$ 37,401.37		$ 951,375,814.03
31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5543584.18	$ 956,919,398.21

Cordialmente,

MARTHA YOLANDA GARCÍA
CONTADORA
C.C. 39.658.586 de Bogotá D.C.
T.P. 98932-T

Bogotá D.C., 19 de Noviembre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Estimados señores;

Nicolas Álvarez González, identificado con C.C. 80.182.734 de Bogotá D.C. en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificado con Nit. 901.961.696 – 7 me permito certificar que durante el periodo del mes de OCTUBRE se presentaron los siguientes movimientos en el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. ANT. CONS. ADECUACIONES CUCUTA cuyo número de identificación es 316300 como se puede evidenciar en los extractos adjuntos; además el patrimonio autónomo antes citados genero rendimientos financieros por $5,543,584.18 los que la fiduciaria consignó según instrucciones de la entidad.

Fecha	CONCEPTOS	VALOR RETIROS	VALOR RENDIMIENTOS	SALDO
31/08/2024	SALDO INICIAL			$ 2,240,195,696.00
31/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 1,906,102.04	$ 2,242,101,798.04
10/09/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$ 1,906,102.04		$ 2,240,195,696.00
10/09/2025	4X1000	$ 7,624.41		$ 2,240,188,071.59
10/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 1	$ 820,636,488.98		$ 1,419,551,582.61
24/09/2025	ORDEN DE GIRO No. 2	$ 142,000,000.00		$ 1,277,551,582.61
24/09/2025	4X1000	$ 568,000.00		$ 1,276,983,582.61
30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 9,350,343.27	$ 1,286,333,925.88
3/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 3	$ 278,839,093.41		$ 1,007,494,832.47
3/10/2025	4X1000	$ 437,855.87		$ 1,007,056,976.60
8/10/2025	ORDEN DE GIRO No. 4	$ 46,108,982.00		$ 960,947,994.60
8/10/2025	4X1000	$ 184,435.93		$ 960,763,558.67
9/10/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATISTA	$ 9,350,343.27		$ 951,413,215.40
9/10/2025	4X1000	$ 37,401.37		$ 951,375,814.03
31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5543584.18	$ 956,919,398.21

Cordialmente,

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

Bogotá D.C., лп de ŘλŎΛŜϒōℕŜ del 2025

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander
Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia.
Cúcuta-Norte de Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Certificación vinculación personal en condición de discapacidad.

Estimados señores:

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ y JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO, identificados con cedula de ciudadanía 80.182.734 de Bogotá D.C y 79.716.353 de Bogotá D.C, en nuestra calidad de Representante Legal y Contador respectivamente, en representación de OBRICON S.A.S, identificada con NIT 900.119.732 - 0 certificamos que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
5	1

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C. a los 04 días del mes de diciembre de 2025

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
REP. LEGAL OBRICON S.A.S
NIT: 900.119.732-0
C.C. 80.182.734 de Bogotá D.C

JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO
C.C. 79.716.353 de Bogotá D.C
Contador Público
T.P 99032-T

Trabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000031018
FECHA RADICADO:	04/07/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	OBRICON SAS
IDENTIFICACIÓN:	900.119.732-0

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	00.00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01681

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 24 de julio de 2025



CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR LA INTERVENTORÍA

Bogotá, 5 de diciembre de 2025

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA.
Ing. Jonathan Bautista
Supervisión cto
PALACIO DE JUSTICIA, CARRERA 12 No. 12 - 43
Cúcuta, Norte de Santander

Referencia:

1. **CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025**
   "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
2. **CONTRATO INTERVENTORIA C-020 DE 2025**
   "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
3. **ASUNTO: CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El suscrito, Julio Andrés Castro González, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.696.673, en calidad de representante legal de la Interventoría del **Contrato de Obra No. 019 de 2025**, suscrito con el Consorcio Adecuaciones Cúcuta RL, representado legalmente por el señor Nicolás Álvarez, **CERTIFICA**, que las especificaciones técnicas, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados y relacionados en el Acta Parcial No. 3, correspondiente al periodo del mes de Noviembre de 2025, del citado contrato fueron verificadas en obra por el equipo de trabajo de esta Interventoría, y que dichas actividades se encuentran conformes con lo contratado en el mencionado Contrato de Obra.

ARQ. JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Interventor

2002
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
ARQUITECTO

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

Bogotá D.C., 04 de diciembre del 2025

Señores
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander
Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia.
Cúcuta-Norte de Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: Certificación pagos de seguridad social.

Estimados señores:

Nicolas Álvarez González identificado con CC 80.182.734 de Bogotá en mi condición de representante legal de CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA identificada con NIT 901.961.696 - 7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 04 días del mes de diciembre de 2025

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA
NIT: 900.119.732-0
Rep. Leg. NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C.C. 80.182.734 de BOGOTÁ

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
NIT: 901.961.696-7

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS.

Los suscritos, por una parte, **MARTHA YOLANDA GARCIA CASTELLANOS,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 39.658.589** de Bogotá, y con tarjeta profesional **No. 98931-T** de la junta central de contadores de Colombia, en condición de **CONTADORA** y por otra **NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.182.734 de Bogotá, ambos en representación de **CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA**, identificado con **Nit, 901.961.696-7,** manifestamos, que luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estrados financieros del consorcio, se certifica el pago de los aportes y salarios relacionados por la compañía durante los últimos seis(6) meses calendario, por los conceptos de salarios, y aportes a salud , pensiones , riesgos laborales (ARL), caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior según corresponda de conformidad con la ley 43 de 1990 los artículos 50 de la ley 789 de 2002, 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C, a los (04) cuatro días del mes de diciembre de 2025.

MARTHA YOLANDA GARCÍA CASTELLANOS
C.C. 39.658.586 de Bogotá
T.P. 98932-T
Contadora

NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
C.C. 80.182.734 de Bogotá
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80182734**

ALVAREZ GONZALEZ

APELLIDOS

NICOLAS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-DIC-1981**

SANTAFE DE BOGOTA DC

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500111-43080852-M-0080182734-20001003 **05797** 00245H 02 089662296

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.658.586

GARCIA CASTELLANOS
APELLIDOS

MARTHA YOLANDA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1972

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-DIC-1990 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00277788-F-0039658586-20110118 0025561945A 2 36008459



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

98932 -T

MARTHA YOLANDA
GARCIA CASTELLANOS
C.C. 39658586
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE MIGUEL TIQUE PEÑA

108690

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

18533

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CAE0EB64E32687 4F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA YOLANDA GARCIA CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39658586 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91697023	$6.984.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	70.300	0		0		0	0	0	0	70.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	292.600	0		0		0	0	0	0	292.600	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	205.200	0		0		0	0	0	0	205.200	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	247.000	0		0		0	0	0	0	247.000	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	698.700	0	0	0	0	0	0		698.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.298.600	0	0	0	0	0	0		1.298.600	8
231001	Colfondos	800227940-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.000	0	0	0	0	0	0		1.139.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.576.100				1.576.100	0	0	1.576.100			15.761	1.576.100	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	906.300	0	0	906.300	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91697023	$6.984.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	910.100	910.100
Pensión	4	3.591.900	3.591.900
Riesgos Laborales	1	1.576.100	1.576.100
CCF	1	906.300	906.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.984.400	6.984.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91697023	$6.984.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002954218	MONTOYA FLOREZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003232173	VANEGAS BALLESTERO CRISTIAN RODOLFO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007283619	OMAÑA BARBOSA DUVAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	5	95.800	CCF36	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
4	CC	1007283619	OMAÑA BARBOSA DUVAN FELIPE	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
5	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S																	25-14	1.281.150	205.000	0	0	0	0	CCFC50	1.281.150	51.300	14-4	1.281.150	5	89.200	CCF36	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
6	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	CCFC50	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
7	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	CCFC50	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	1007961194	TELLEZ TORRES DEIMER DAVID	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	CCFC50	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
9	CC	1049620968	BARON SUAREZ JHON EDISON	1	0			S		X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS005	521.950	20.900	14-4	521.950	5	36.400	CCF36	521.950	20.900	0	0	0	0	0
10	CC	1049622190	SANCHEZ MENDOZA MARCO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1091671779	CARREÑO LEON JHON ALEXANDER	1	0			S		X															230201	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS037	759.200	30.400	14-4	759.200	5	52.900	CCF36	759.200	30.400	0	0	0	0	0
12	CC	1091671779	CARREÑO LEON JHON ALEXANDER	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-4	94.900	5	0	CCF36	94.900	0	0	0	0	0	0
13	CC	1091671779	CARREÑO LEON JHON ALEXANDER	1	0			S									X								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
14	CC	1091671779	CARREÑO LEON JHON ALEXANDER	1	0			S									X								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1091677841	ARENAS GARNICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1193592594	PARADA GONZALEZ DARWIN ESTIVENSON	1	0			S		X															230201	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC24	474.500	19.000	14-4	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
17	CC	1193592594	PARADA GONZALEZ DARWIN ESTIVENSON	1	0			S									X								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
18	CC	1193592594	PARADA GONZALEZ DARWIN ESTIVENSON	1	0			S									X								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
19	CC	17158340	AVELLA VARGAS FERNANDO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF36	806.650	32.300	0	0	0	0	0
20	CC	1049622192	SUAREZ RUIZ JAMER ERIXON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1065864914	LEAL TRUJILLO MARCO ANTONIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1072961009	ACOSTA BEJARANO CARLOS EDUARDO	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS017	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF36	806.650	32.300	0	0	0	0	0
23	CC	1091659115	PEREZ RUEDA CRISTO HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	7176649	CRUZ BARAJAS FREDY ARTURO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS041	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF36	616.850	24.700	0	0	0	0	0
25	CC	80408767	CABEZA ROMERO JAIME	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	CCFC50	474.500	19.000	14-4	474.500	5	33.100	CCF36	474.500	19.000	0	0	0	0	0
26	CC	1091680166	HINCAPIE GUERRERO OSCAR SNEIDER	1	0			S																	230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS041	1.281.150	51.300	14-4	1.281.150	5	89.200	CCF36	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
27	CC	1091680166	HINCAPIE GUERRERO OSCAR SNEIDER	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-4	47.450	5	0	CCF36	47.450	0	0	0	0	0	0
28	CC	1091680166	HINCAPIE GUERRERO OSCAR SNEIDER	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	0	14-4	94.900	5	0	CCF36	94.900	0	0	0	0	0	0
29	CC	1124015452	GONZALEZ URIANA EDECIO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	1134174874	GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1193219408	MALDONADO SANCHEZ ELIUD KALETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF36	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA	CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	25/11/2025	91694954	$991.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	991.000				991.000	0	0	991.000			9.910	991.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	991.000	991.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	991.000	991.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901961696-7	CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA		CR 53#131A-72	6016145878	C.ADECUACIONES.CUCUTA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	25/11/2025	91694954	$991.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033761080	PARRA DUARTE JUAN SEBASTIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1049626361	SALAMANCA JIMENEZ FABIAN HUMBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1049638990	MOGROVEJO MARTINEZ DANIEL EDUARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1094269839	MONTAGUT AREVALO YULIETH TATIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1098658750	CARRASCAL SANCHEZ EDUARD ALEJANDRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	19355328	ARIZA MARTINEZ PABLO DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	19385162	ROMERO DIMATE HECTOR RAUL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	52072479	VERANO PINEDA MARIA DEL PILAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	7187216	VASQUEZ ESPITIA LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	93355232	GALLARDO ORJUELA ORLANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.	KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91184917	$1.565.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	312.300				312.300	0	0	312.300			3.123	312.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	285.000	285.000
Pensión	2	683.400	683.400
Riesgos Laborales	1	312.300	312.300
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.565.700	1.565.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900119732-0	OBRICON S.A.S.	KR 53 # 131A - 72 INT 3 OF 302	6145878	contabilidad.obricon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91184917	$1.565.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030550522	RODRIGUEZ SAZA YUMNA YISSELL	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1067960995	BARRERA BEGAMBRE YULIETH ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1109069798	TRIANA ANGEL JAIVEY EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79140793	ALVAREZ CAMERA ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80182734	ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE OBRA

Kr 53 #131a – 72 Int 3 Of 302 Bogotá D.C.
Tel. (601) 6145878
Cel. 3163477044



INFORME MENSUAL

NOVIEMBRE 01 AL 30

DEL 2025

Contrato No. C-019 DE 2025

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
ARQ. RESIDENTE CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA	ING. DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA	Interventoría ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
Arq. Orlando Gallardo	Ing. Raúl Romero	

INFORME MENSUAL

NOVIEMBRE 01 AL 30 DEL 2025

Actividades ejecutadas en

PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA

Contrato No. C-019 DE 2025

Objeto del contrato:

"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

Presentado por

ARQUITECTO RESIDENTE

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORME ADMINISTRATIVO 5
2.1. DATOS DEL CONTRATO 5
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 6
4. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN OBRA 11
5. RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES 11
6. PERSONAL DE OBRA 11
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 12
8. ANEXOS 12
9. RESULTADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL 12
10. INFORME MENSUAL SST. 12
11. INFORME MENSUAL PGAS 12
12. BITACORA DE OBRA ..... _
13. INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ..... _
14. INFORME MENSUAL DE INVERSION DE ANTICIPO ..... _
15. INFORME MENSUAL DE INVERCION DE ANTICIPO ..... _

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin resumir las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de noviembre del año en curso, en el desarrollo del contrato C-019 DE 2025 celebrado entre CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA y Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta**,** cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"

A continuación, se resume el desarrollo administrativo, técnico y financiero del proyecto durante el periodo de ejecución de la obra.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1. DATOS DEL CONTRATO

Contratante	Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
Contrato Número	CONTRATO DE OBRA No. C-019 DE 2025
Objeto	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor del Contrato	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.467.318.989)
Contratista:	**CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA**
Nit. Contratista:	901.961.696-7
Representante Legal	ING. NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ
Identificación	CC. No. 80.182.734 de BOGOTÁ
Interventoría:	**ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ**
Nit. Interventoría:	79696673-0
Representante Legal	ARQ. JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
Avance de obra	24.29%
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	62-40-101012361 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2025
Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal	62-44-101021629 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2030
Póliza de seguro todo riesgo construcción	62-18-101000020 Anexo 0 Vigencia hasta 31-12-2025

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la elaboración de las obras requeridas para el reforzamiento estructural, así como la remodelación y adecuación del palacio de justicia del municipio de Ocaña, Norte de Santander, esto con el fin de dar

cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos de la entidad, garantizando un espacio óptimo para el desarrollo de su objeto social, así como cesar el pago de arriendo en instalaciones provisionales.

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la Cr.12 # 12-41/49 de la ciudad de Ocaña, norte de Santander.

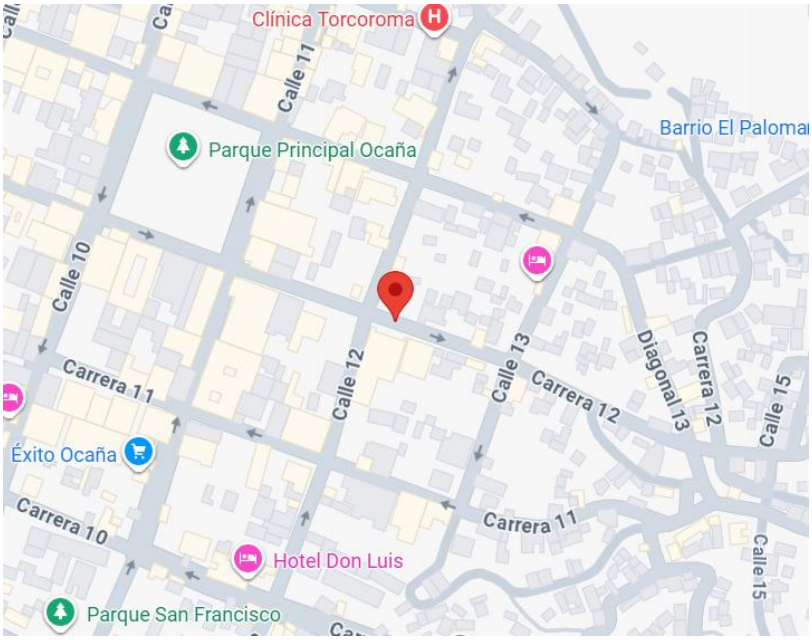


Ilustración 1. Ubicación del Laboratorio de Salud Pública departamental.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1,1	Demoliciones	m2	132,95
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2,1	Excavacion mecanica a cielo abierto Sotano 1	m3	346,37
2,2	Excavacion manual vigas/zapatas	m3	16,65
2,3	Relleno material seleccionado	m3	8,32
3	**CIMENTACIÓN**		
3,6	Concreto de Limpieza 1500 PSI, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	m2	40,86
4	**ESTRUCTURA**		

4,1	Acero Figurado 1/4" - 1". Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación.	kg	3470,35
4,2	Ensayo Rotura Cilindros a compresión	un	16,00
4,3	Bombeo de concreto	m3	16,50
4,5	Escaleras en concreto de 21 Mpa (3000 psi). Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, formaleta, retiro y disposición de los sobrantes.	m3	1,56
4,12	Concreto recalce vigas aéreas. Incluye el suministro, colocación y curado del concreto, todos los elementos de SST, cargue y retiro a centro de disposición autorizado.	m3	26,60
4,17	Anclajes Epoxicos. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución.	un	627,00
4,18	Malla electrosoldada estandar.Incluye suministro, corte, amarre y colocación.	kg	1062,54
5	**INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA - HYS**		
5,4	**VALVULAS**		
5,401	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1.1/4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00
5,403	REGISTRO PASO DIRECTO O COMPUERTA Ø=1/2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00
5,6	**SALIDAS SANITARIAS**		
5,601	PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10,00
5,602	PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø=4". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10,00
5,604	PUNTO SANITARIO PARA ORINAL Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00
5,605	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00
5,606	PUNTO SANITARIO PARA SIFONES 2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10,00
5,7	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**		
5,701	TUBERÍA PVC-L Ø=2". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	25,50

5,702	TUBERÍA PVC-L Ø=3". Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	9,75
5,8	**RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES**		
5,804	ACCESORIOS PVC-S Ø=4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	42,00
5,805	ACCESORIOS PVC-S Ø=3". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	10,00
5,806	ACCESORIOS PVC-S Ø=2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	54,00
5,12	**EXCAVACIONES**		
5,121	EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN	M3	9,30
5,123	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	9,30
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
6,1	**SALIDAS DE ALUMBRADO**		
6,101	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tuberíaEMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con polo a tierra,15 A, 120V,y seguro de giro, cable encauchetado 3x14AGW, para derivacion del tomacorriete a la clavija de conexión de la luminaria ,conductor de cobre CABLE 3No12 AWG THHN TC LS-ZH, (FASE-NEUTRO-TIERRA) para elcircuito ramal según lo mostrado en los planos, conectores tipo resorte, marquillas de identificacion y demásaccesorios que hagan parte de esta actividad. (LONGITUD PROMEDIO DE LA SALIDA 5m PARA DUCTO YCABLEADO)	UN	80,00
6,9	**DUCTO PORTACABLES CERRADO**		
6,901	Suministro, transporte e instalacion de ducto portacables, galvanizado de 80x300mm , con division según lo mostrado en planos incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para tomas e iluminacion , incluyendo cable desnudo No 6.	ML	32,40
7,2	**RED INTERNA**		
7,201	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	5,90
7,202	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	13,00
7,205	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	33,25

7,206	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	145,00
7,208	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	28,00
7,209	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	9,73
7,210	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/2". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	55,00
7,211	TUBERIA ACERO ASTM A 795 SCH 40 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19,54
7,212	ACCESORIOS HD RANURADOS ASTM A -536 DE 1.1/4". Incluye suministro e instalación y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	89,00
7,218	GABINETE CLASE III, INCLUYE, CAJA EN LAMINA DE ACERO, VIDRIO TEMPLADO DE 4mm, VALVULA ANGULO UL/FM 1.1/2", VALVULA DE ANGULO UL/FM DE 2.1/2", HACHA DE 2LBS, LLAVE PARA LAS VALVULAS, EXTINTOR DE 20 LBS. 30METROS DE MANGUERA DE POLIURETANO Y BOQUILLA DE POLICARBONATO DE 1.1/2" y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2,00
7,226	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	4,00
7,227	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	36,00
7,228	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	29,00
7,229	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/2" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	20,00
7,230	SOPORTES TIPO PERA UL, FM, 1.1/4" (INCLUYE VARILLA ROSCADA ZONCADA Y CHAZO EXPANSIVO, suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	UN	10,00

8	**MAMPOSTERIA**		
8,1	Muro en Bloque Arcilla No. 3 y No.4 (m2). Incluye refuerzo y anclaje, según indicaciones de plano de elementos no estructurales, y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	155,12
9	**CUBIERTA**		
9,8	Afinado pisos impermeabilizado - Cubierta. Incluye suministro, nivelación, vaciado y extendida de mortero, impermeabilizante y todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	113,27
10	**PAÑETES, REVOQUES Y RESANES**		
10,9	Pañete/Revoque Muros Interior. Incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	85,86
14	**CIELO RASOS Y PARTICIONES LIVIANAS**		
14,3	Cielo Raso en drywall egún indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	se incia actividad
14,8	Muro Super board - fibrocemento una cara 8mm según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	m2	se inicia actividad
30	**NO PREVISTOS**		
NP003	RETIRO CASETÓN EN GUADUA EXISTENTE, consiste en el desmote técnico de los casetones de guadua incrustados en las placas de contrapiso existentes, incluye mano de obra, Epp, Andamios, retiro y disposición final de los residuos y demás elementos para el desarrollo de la actividad.	M	154,00
NP007	CONTRAPLACA EN LOSAS DE ENTREPISO, se requiere la construcción de contraplaca para garantizar una losa resistente toda vez que las existentes en el proyecto carecen de aceros de refuerzo, esta actividad consiste en aplicación de concreto para recalce de placas de 3.000 PSI grava común de concreto bombeable, en espesor de 50 mm, incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada Q2 (4mmX4mm 150mmX150mm) y mano de obra, sobre la misma se requiere pendientados afinados de piso pues no es de acabado final	M2	334,26

NP008	ESPESOR ADICIONAL EN CONCRETO PARA FUNDIR PLACAS MONOLÍTICAS AL ÍTEM NP007 CONTRAPLACA LOSAS DE ENTREPISOS, AJUSTANDO NIVELES EN ÁREAS CON PISOS VINÍLICOS, INCLUYE AFINADO CON LLANA DE MADERA Y LECHADA DE CEMENTO	M2	214,34
NP010	Concreto superfluido para recalce, concreto grava fina 1/2", con plastificante y acelerante resistencia a la compresión de 4.000 psi mezclado en obra.	M3	0,29
NP012	Construcción de columnetas o vigas de coronación en concreto de 3000 psi con sección base menor a 0.12 altura menor a 0.12	ML	52,50
NP033	Demolición y retiro de elementos masivos de comcreto en cimentaciones profundas	M3	27,15
NP035	Relleno en bloque de arcilla No 4 / 5 como material aligerante en placas de contrapiso	M3	9,21

4. NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En la ejecución de las excavaciones para los tanques se evidenciaron la existencia de elementos de cimentación tipo contrapeso amarrados al muro de contención perimetral que no estaban previstos en planos además de que no fueron identificados en la etapa de estudios y diseños, sumado a lo anterior se identifico un relleno abundante en material de escombro lo que dificultó la ejecución de las actividades; estas novedades modificaron los rendimientos y estrategias previstas inicialmente evidenciándose en un tiempo invertido para la ejecución adicional al previsto cercano al mes y medio.

5. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN OBRA

No se presentaron imprevistos en obra

6. RELACIÓN DE PAGOS PARCIALES

A la fecha se realizó el pago del acta 001 por un valor de $ 492,126,493.77 y del acta 002 por un valor de $ 936,160,267.35

7. PERSONAL DE OBRA

Ver anexo 2 Informe SST

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS

Ver anexo 2 Informe SST

9. ANEXOS

10. RESULTADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL

Ver Anexo 1 Ensayos de laboratorio

11. INFORME SG-SST

Ver Anexo 2 Informe SST

12. INFORME PGAS

Ver Anexo 3 Informe PGAS

13. REGISTRO BITÁCORA DE OBRA.

Ver Anexo 4 Bitácora de Obra

14. INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO


Ver Oficio OF-084-2025 - Informe de anticipo mes de octubre y sus anexos.

15. INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Ver Oficio OF-084-2025 - Informe de anticipo mes de octubre y sus anexos.

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTALACION DE GABINETES EN EL 1 Y 2 PISO	ARMADA DE VIGAS EN PLACA DE 4 PISO
	
AFINADO DE CUBIERTA	RELLENO DE BLOQUE DE ARCILLA EN PLACAS BAÑO
	
INSTALACION DE BLOQUE EN 2 Y 3 PISO	INSTALACION DE PAÑETE EN 2 PISO
	
DEMOLICION DE VIGAS Y ZAPATAS ENTRE EJES 7 Y 8	FUNDIDA CON CONCRETO FLUIDO DE COLUMNAS A REFORZAR EN EL 1 PISO

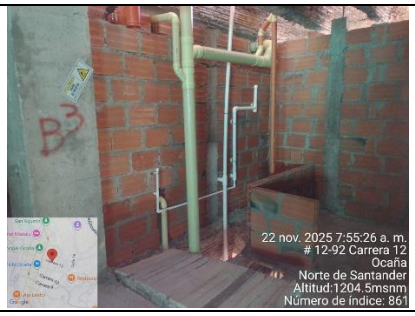	
INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN 2 Y 3 PISO	ESTRUCTURA PARA MUROS EN SUPER BOAR
	
COMPACTACION EN AREA DE TANQUES	FUNDIDA PLACA DEL 4 PISO
	
INSTALACION DUCTOS METALICOS	INSTALACION TUBERIA RCI
	
CONCRETO DE LIMPIEZA EN TANQUE RCI Y AGUA POTABLE	ARMADA DE HIERRO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE

CERTIFICACIONES ADICIONALES

Bogotá D.C., 04 de dicimbre de 2025.

Señor
JULIO ANDRÉS CASTRO GONZÁLEZ
INTERVENTOR
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. C-019 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"
ASUNTO: Relación de personal de contratista

Estimados señores;

Por medio del presente nos permitimos certificar la siguiente información relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	Acreditación
HÉCTOR RAÚL ROMERO DIMATÉ	19.385.152 de Bogotá	Director de obra	ADULTO MAYOR
ORLANDO GALLARDO ORJUELA	93.355.232 de Ibague, Tolima	Residente de obra	
FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMÉNEZ	1.049.626.361de Tunja	Especialista en estructuras	
DANIEL EDUARDO MOGROVEJO MARTÍNEZ	1.049.638.990 de Tunja	Especialista en Geotecnia	
PABLO DAVID ARIZA MARTÍNEZ	19.355.328 de Bogotá	Ingeniero Electricista	ADULTO MAYOR
JUAN SEBASTIAN PARRA DUARTE	1.033.761.080 de Bogotá D.C.	Ingeniero sanitario	
YULIETH TATITANA MONTAGUT AREVALO	1.094.269.839 de Pamplona	Arquitecta	
EDUARD ALEJANDRO CARRASCAL SANCHEZ	1.098.658.750 de Bucaramanga	Ingeniero Ambiental	
MARIA DEL PILAR VERANO PINEDA	52.072.479 de Bogotá D.C.	Especialista SST	
YULIETH ANDREA BARRERA BEGAMBRE	1.067.960.995 de Montería	Auxiliar Contable	PERSONAL TÉCNICO

Cordialmente,

CONSORCIO ADECUACIONES CÚCUTA
R/L NICOLAS ÁLVAREZ GONZÁLEZ
C. C. No. 80.182.734 DE BOGOTÁ D.C.

Elaboró: NAG
Revisó: NAG
Aprobó: NAG

Bogotá D.C. 25 de julio de 2025

Señora:
YULIETH ANDREA BARRERABEGAMBRE
C.C. No. 1.067.960.995

Asunto: Modificación de Responsabilidades y Obligaciones Laborales

Respetada señora:

Por medio de la presente, y en atención a las necesidades operativas del contrato de obra no C-019 DE 2025, nos permitimos informarle que, a partir de la fecha, se modifican sus responsabilidades y obligaciones laborales, con el fin de optimizar la gestión administrativa y contable del proyecto.

A partir del 25 de julio de 2025, su labor se enmarca en el cargo de Auxilios Contables y Administrativos, donde deberá desarrollar funciones relacionadas con:

- Apoyo en la elaboración, revisión y archivo de documentos contables.
- Gestión y control de facturas, soportes y comprobantes.
- Apoyo en tareas administrativas generales del proyecto.
- Colaboración con el área contable en la preparación de reportes y estados financieros parciales.

Esta reasignación tiene carácter inmediato y constituye una declaración formal de sus nuevas responsabilidades, las cuales se desarrollarán en concordancia con los lineamientos y políticas de Obricon S.A.S.

Agradecemos su compromiso y disposición para asumir estas funciones, que contribuirán al buen desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

Nicolas Álvarez González
Representante Legal
NIT: 900.119.732-0
Cúcuta, 25 de julio de 2025

Obricon S.A.S
Construcciones civiles y arquitectonicas
Kr 53 # 131a - 72 Int 3 Of 302 Bogotá
(571)6145878
(571)4030505 ext 1184
obricon@gmail.com

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.067.960.995



Apellidos
BARRERA BEGAMBRE

Nombres
YULIETH ANDREA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
F

Fecha de nacimiento
29 JUL 1998

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
MONTERIA (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
03 AGO 2016, MONTERIA

Fecha de expiración
20 JUN 2033

Firma

Yulieth Barrera

Powered by CamScanner

.CO

0252782 79



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0252782798130 01<<<<<<<<<<<<
9807291F3306208COL1067960995<3
BARRERA<BEGAMBRE<<YULIETH<ANDR

Powered by CamScanner

LIBERTAD Y ORDEN
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la ley 119 de 1994 y en atención a que

YULIETH ANDREA BARRERA BEGAMBRE.

Con Tarjeta de Identidad No. 98072961773

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNICO EN

CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Montería a los veintiún (21) dias del mes de noviembre del dos mil catorce(2014)

Firmado Digitalmente por
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá – Colombia.
AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.
REGIONAL CORDOBA

Este certificado no es válido como documento
